**CONTRATO No. SA-MC-01-2024**

**OBJETO DEL CONTRATO:**
**AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA**




# INFORME MENSUAL No. 8

**PERIODO DEL PRESENTE INFORME:**
**01 DE MARZO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2025**

**PUEBLO RICO - RISARALDA**

**BOGOTA D.C., MARZO DE 2025**

## TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ..... 2
1. OBJETIVOS ..... 4
1.1. Objetivo General ..... 4
1.2. Ubicación del Proyecto ..... 4
1.3. Documentos suscritos para el inicio del contrato. ..... 5
1.4. Control de Pólizas de cumplimiento ..... 6
1.5. Contrato de obra ..... 7
2. AVANCE DEL CONTRATO ..... 8
2.1. Descripción del Avance del Contrato. ..... 8
2.2. Avance General del Contrato ..... 10
2.3. Estado financiero ..... 11
3. INFORMACION TECNICA ..... 12
3.1. Información Climática ..... 12
3.2. Control de Personal ..... 13
3.3. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida ..... 14
4. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES ..... 15
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 16
6. ANEXOS ..... 17
6.1. Registro fotográfico. ..... 17
6.2. Bitácora ..... 17
6.3. Documentos Contractuales ..... 17
6.4. Pólizas Contractuales ..... 17

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados, avances de la obra civil que se está ejecutando en el PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO RISARALDA Cuyo objeto es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"

El informe comprende el periodo de Marzo 01 de 2025 a Marzo 31 de 2025, en el cual está consignada la vistita donde se recibe el inmueble, el inicio de labores, las soluciones implementadas ante las diferentes falencias y necesidades de la infraestructura y el alcance de las actividades a desarrollar.

Todo lo anterior bajo el punto de vista técnico, administrativo y financiero.


# 1. OBJETIVOS.

## 1.1. Objetivo General

EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA DE REALIZAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA.

## 1.2. Ubicación del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la carrera 3 N°. 7-24/26 de la ciudad de Pueblo Rico - departamento de Risaralda.

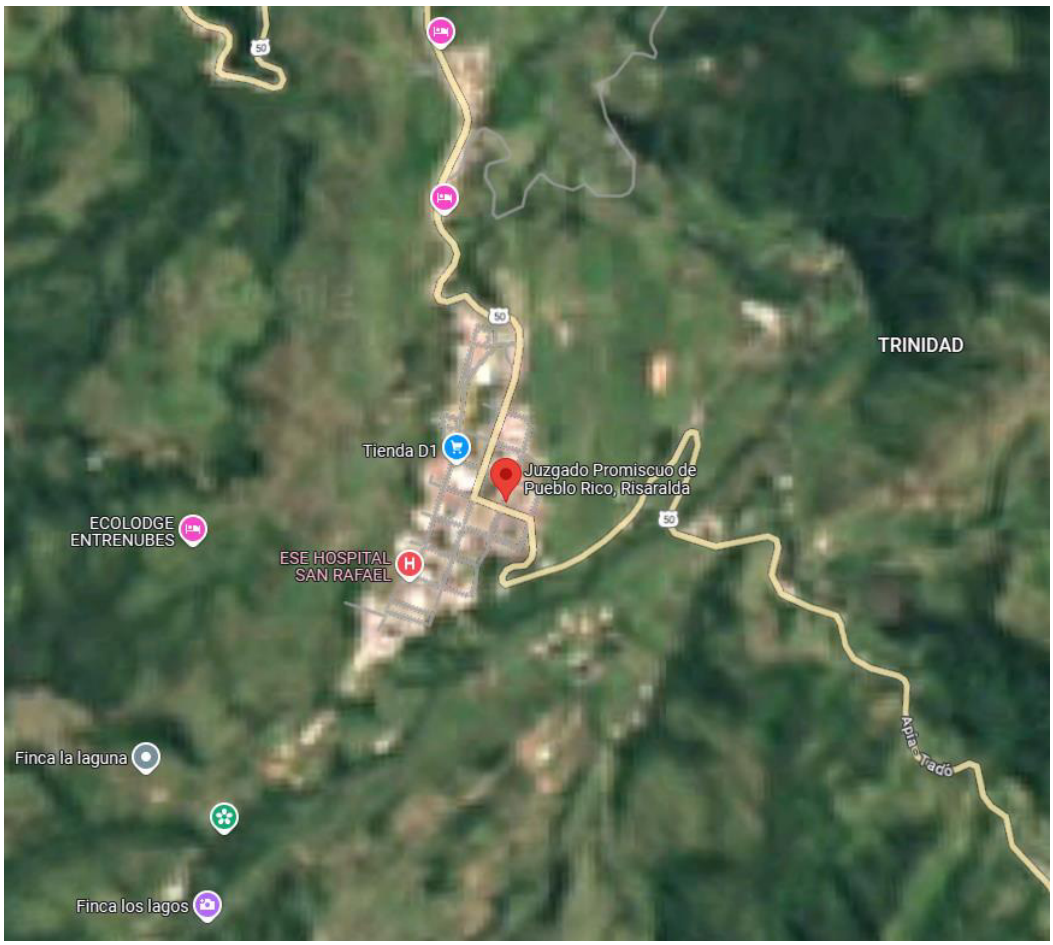

### 1.3. Documentos suscritos para el inicio del contrato.

Los siguientes documentos contractuales se adjuntan en el anexo 6.6., del presente informe, así:

- Contrato No. SA-MC-01-2024
- Acta de inicio
- Adición y Prorroga No. 01 al Contrato No. SA-MC-01-2024

## 1.4. Control de Pólizas de cumplimiento

| Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia | CONTROL DE POLIZAS | | HACER DE COLOMBIA arquitectura para el futuro |
|---|---|---|---|
| **Objeto General** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA | | |
| **Contrato de Obra No.** | SA-MC-01-2024 | | |
| **Contratista** | HACER DE COLOMBIA SAS | | |
| **Interventoria** | EJE GROUP SAS | | |
| **DESCRIPCION** | **CONTRATO** | **ACTA DE INICIO** | **ADICION Y PRORROGA No. 1** |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO** | 17/07/2024 | 12/08/2024 | 27/12/2024 |
| **POLIZA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL | RESPONSABILIDAD CIVIL | RESPONSABILIDAD CIVIL |
| **No. DE POLIZA** | 540 47 994000031286 | 540 47 994000031286 | 540 47 994000031286 |
| **ANEXO No.** | **0** | **1** | **2** |
| **No. DE POLIZA** | 540 74 994000006606 | 540 74 994000006606 | 540 74 994000006606 |
| **ANEXO No.** | **0** | **1** | **2** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | 855.577.641,00 | 855.577.641,00 | 117.113.081,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | 855.577.641,00 | 855.577.641,00 | 972.690.722,00 |
| **FECHA INICIAL CONTRACTUAL** | - | 12/08/2024 | 12/08/2024 |
| **FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL** | - | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| **FECHA DE INCIO SEGÚN MODIFICACIONES** | - | 01/01/2025 | 01/01/2025 |
| **FECHA FINAL DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES** | - | 09/05/2025 | 09/05/2025 |

En el anexo 6.6. – Se adjuntan las pólizas del contrato.

### 1.5. Contrato de obra

**NFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO.** | SA-MC-01-2024 |
| **CONTRATISTA** | HACER DE COLOMBIA SAS |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | OSCAR TAMAYO PERALTA |
| **NIT** | 800.028.222 – 2 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA |
| **VALOR INICIAL** | OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SISTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE. ($855.577.641,00) |
| **ADICION No. 1** | CIENTO DIESICIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE (117.113.081,00) |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTI DOS PESOS MCTE (972.690.722,00) |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 150 DIAS SIN EXCEDER EL 31/12/2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA DEL CONTRATO** | 129 DÌAS |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 09 DE MAYO DE 2025 |

## 2. AVANCE DEL CONTRATO


### 2.1. Descripción del Avance del Contrato.

Durante el Periodo se desarrollan las siguientes actividades:

- Se realiza la Construcción de las zapatas en el Eje A2 y C2.
- Se continua con el amarre de la viga VC entre las columnas C-10 a C-7 y VC C-12 a C-9, se realiza el arme total de (7) columnas las cuales se dejan paradas (C-10, C-11, C12, C4, C6, C7 y C9) en compañía de la Interventoría, Residente y SST.
- Se realiza el armado del hierro para zapatas C-1, C-3 y vigas de amarre de Centro C - 1 a C – 4 y C - 3 a C – 1, se realiza el retiro de escombro, se inicia la actividad de excavación manual eje B-2, en compañía de la Interventoría, residente y SST, y trabajadores.
- Se realiza el armado de la columna C - 7 y C – 8 del Eje se continua con el retiro de escombro.
- Se inicia la excavación para la Zapata No. 5 del eje 2-B, se realiza amarre de columnas con flejes cada uno de 0.5CM (C-10, C-11, C-12 y C – 8).
- Se continua con la actividad de excavación y zapatas, amarre de hierro.
- Se continua con la actividad de arme de hierro y el descargue del material triturado.
- Se continua con el amarre de las formaletas “Viga, Eje 1 y 2, se sostiene reunión con Planeación para verificar el tema de la Queja de la Vecina de la casa vecina, la cual se concluye que Planeación debe realizar la verificación de los Linderos en su Registro Catastral para realizar la debida aclaración.
- Se inicia la actividad de mezcla de concreto para fundir el Eje 1 y 2, Zapatas 10,11 y 12, 8 y 9, con sus respectivas vigas.
- Se realizan cilindros de prueba 6x12” (3) unidades y el cono de 5”-
- Se realiza fundida de zapata 4,5,6 y 8.
- Se continua con la actividad de excavación para la zapata 2, cuello de columnas ejes 2, columnas C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10.

- Se realiza la armada de hierro, zapata, viga del eje 4, Columna No. 2.
- Se realiza la fundida de pedestales C11 y C12, llega material a la obra.
- Se realiza la actividad de fundida de zapata Z1, Z2 y Z3 con viga eje No. 4

## 2.2. Avance General del Contrato

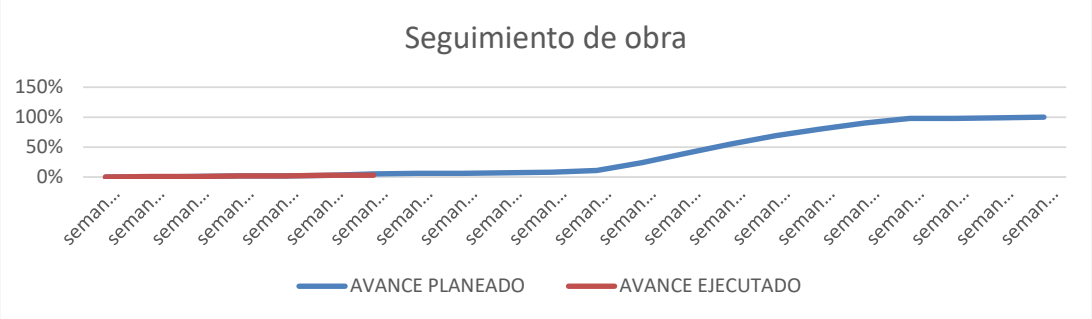


En el periodo del presente informe las actividades que se debían ejecutar corresponden a las actividades antes mencionadas, para dar continuidad a la ejecución del Contrato.

.

## 2.3. Estado financiero

El estado financiero corresponde al periodo entre el 01 de Febrero al 31 de marzo de 2025.

| PALACIO DE JUSTICIA PUEBLO RICO - RISARALDA | VALOR CONTRACTUAL | | VALOR AJUSTADO SEGÚN ADICION No. 1 |
|---|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO** | | **707.381.266,00** | **96.827.682,00** |
| ADMINISTRACION | 15% | 106.107.190,00 | 14.524.152,00 |
| UTILIDAD | 5% | 35.369.063,00 | 4.841.384,00 |
| IVA DE UTILIDAD | 19% | 6.720.122,00 | 919.863,00 |
| **COSTO TOTAL** | | **855.577.641,00** | **117.113.081,00** |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | | | **972.690.722,00** |

# 3. INFORMACION TECNICA

## 3.1. Información Climática

| INFORMACION CLIMATICA DEL 01 A 31 DE MARZO DE 2025 - PUEBLO RICO RISARALDA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| MES | | | | | | | | | | |
| MARZO | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES |
| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TEMP. MAXIMA | 29° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 26° | 27° | 26° | 27° |
| TEMP. MINIMA | 16° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| | | | | | | | | | | |
| MES | | | | | | | | | | |
| MARZO | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES |
| DIA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TEMP. MAXIMA | 26° | 25° | 27° | 26° | 25° | 26° | 24° | 26° | 27° | 28° |
| TEMP. MINIMA | 18° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° |
| | | | | | | | | | | |
| MES | | | | | | | | | | |
| MARZO | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| DIA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TEMP. MAXIMA | 27° | 28° | 29° | 28° | 22º | 21º | 20º | 19º | 21º | 19º |
| TEMP. MINIMA | 18° | 18° | 19° | 20° | 14º | 13º | 13º | 12º | 13º | 13º |
| | | | | | | | | | | |
| MES | | | | | | | | | | |
| MARZO | LUNES | | | | | | | | | |
| DIA | 31 | | | | | | | | | |
| TEMP. MAXIMA | 19º | | | | | | | | | |
| TEMP. MINIMA | 13º | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.2. Control de Personal

| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **CARGO** | **NOMBRE** |
| 1 | Subgerente Tecnica y Administrativa | Vanessa Tamayo Bernal |
| 2 | Director de Obra | Oscar Tamayo Peralta |
| 3 | Residente de Obra | Ricardo Barrera |
| 4 | Residente SST | Claudia Piza Murcia |
| 5 | Apoyo SST | Alba Rios |
| **PERSONAL OPERATIVO** | | |
| **Nº** | **CARGO** | **NOMBRE** |
| 1 | Maestro de Obra | Ergidio Chica Sepulveda |
| 2 | Ayudante de Obra | Ricaurte Chica |
| 3 | Ayudante de Obra | Carlos Hernandez Chica |

## 3.3. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida

| CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA | | | |
|---|---|---|---|
| **ENVIADA** | | **RECIBIDA** | |
| **No. DE OFICIO** | **ASUNTO** | **No. DE OFICIO** | **ASUNTO** |
| HC-CPR-COE-2025-026 | Respuesta Comunicado OF-INTER-PUEB-54 | OF-INTER-PUEB-59 | SOLICITUD INFORMES AMBIENTALES |
| HC-CPR-COE-2025-027 | Acta Parcial No. 2 | OF-INTER-PUEB-60 | Comité virtual de obra. |
| HC-CPR-COE-2025-029 | Escalera en Concreto | OF-INTER-PUEB-63 | Observaciones y recomendaciones referentes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato de Obra |
| HC-CPR-COE-2025-030 | Remisión Informes Ambientales | OF-INTER-PUEB-64 | Comité virtual de obra No. 8. |
| HC-CPR-COE-2025-031 | Reiteración solicitud de servicios públicos | OF-INTER-PUEB-65 | Respuesta oficio HC-CPR-COE-2025-029 (Escalera en concreto) |
| HC-CPR-COE-2025-032 | Cotizaciones Diseño Estructural Escalera | OF-INTER-PUEB-68 | Comité virtual de obra No. 9. |
| HC-CPR-COE-2025-033 | Cambio de Cemento | OF-INTER-PUEB-69 | Respuesta oficio HC-CPR-COE-2025-033 Cambio de cemento. |
| HC-CPR-COE-2025-034 | Redistribución arquitectónica | OF-INTER-PUEB-70 | Solicitud Plan de Manejo de Tránsito |
| HC-CPR-COE-2025-035 | APU Escalera en concreto | OF-INTER-PUEB-71 | Remisión comunicado visita contraloría. |
| | | OF-INTER-PUEB-72 | Solicitud redistribución arquitectónica – Palacio de Justicia. |

## 4. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES

No se han tenido dificultades en el desarrollo de los trabajos, todas las partes involucradas en el mismo, han estado en constante comunicación y trabajando en pro de sacar adelante el proyecto y poder cumplir a cabalidad con lo solicitado, dentro de las posibilidades del mismo.

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el desarrollo de estos trabajos de ampliación y mejoramiento, se mejoran las condiciones de prestación de un mejor servicio a la comunidad, aumenta la imagen y fortalece la presencia institucional en la región, ayuda con la generación de empleo en estas poblaciones, apartadas de los grandes centros urbanos, contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad, igualitaria que tanto necesita el país.

## 6. ANEXOS

**6.1.** Registro fotográfico.
**6.2.** Bitácora
**6.3.** Documentos Contractuales
**6.4.** Pólizas Contractuales

# 6.1. REGISTRO FOTOGRAFICO

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**
















**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

## REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**












**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**
















**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

## REGISTRO FOTOGRAFICO


HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**







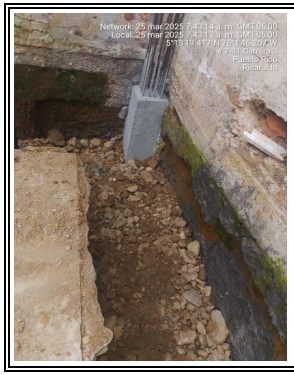

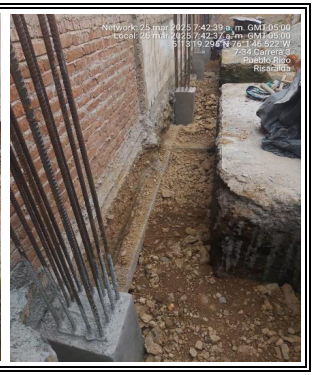



**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**

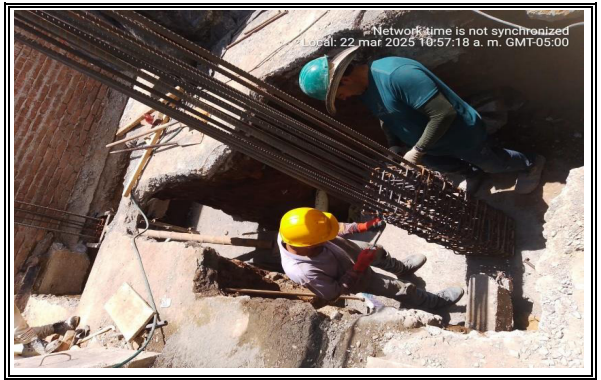










**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**


## REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**





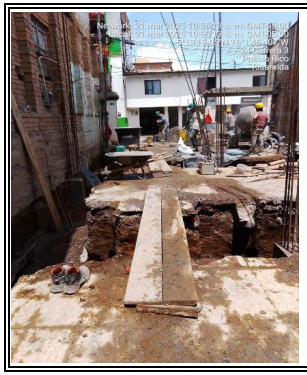




**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**













**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**












**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**OBJETO DEL CONTRATO: SA-MC-01-2024**
**"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO – RISARALDA"**










**OBSERVACIONES:** **PALACIO DE JUSTICIA - PUEBLO RICO - RISARALDA**

# 6.2. BITACORA

28 febrero en compañía de interventoría se hacen vigas y dados. también tenemos la visita de Salud Judicial.

MARZO 2025

Lu Sabado 01 marzo, se construye las zapatas en eje A-2 y C2

Lunes 03 Marzo, se continua con el armado de Viga Vc. entre columnas C-10 a C-7 y Vc C-12 a C-9. Hoy se deja en total 7 sietes columnas Parados C-10, C11, C12 C4, C6, C7 y C9 en compañía de interventoría, R. Ricardo, SST Se Solicito equipos como Mezcladora dos bultos, tablero metalico .60 x 1.20 tablero metalico 400x400 A CENTRAL DE EQUIPOS

Martes 04 Marzo, Armado de hierro zapatas C-1, C-3 y Vigas Vc entre C-1 a C-4 y C-3, a C1, se realizo sacada del escombro con ayuda del bobcat con 4 horas de servicio y tres viajes de volqueta, se amanca excavación manual eje B-2., en compañía de interventor, la residente SST, Residente. Ricardo. y los 7 trabajadores

Miercoles 5 Marzo. Solicite dias 7 de la mañana con los 8 soldadores residente. SST y residente. M. Ricardo y interventoria se hacen columna C8. Eje 2 y se retiro el combo. llovio q/q 4 pm.

Jueves 6 Marzo
Ingreso de personal 7:00 AM.
3 oficiales, 5 ayudantes. Aux. SST.
Residente de obra. se inicia excavación
zapata #5 eje 2-B, se realiza amarre
columnas con flejes de Ø5 a C10 - C11 - C12
C8.

Viernes 7 marzo.

Ingreso de personal 7:00 AM
2 oficiales, 5 ayudante, Aux SST
Residente de obra., se inicia
excavacion y zapata. amarre hierro
carga de volqueta.

Vic Sabado 8. Ingreso de personal
2 oficiales 5 ayudantes, Aux SST
Residente de obra, amarre de
hierro.

Lunes 10 Marzo. Ingresa el personal
7:00 A.M. 2 oficiales, 4 ayudantes.
Aux. SST. Residente de obra.
se inicia. amarre de hierro
y descarge de trompo,
excavacion 2 a 6, iniciadores 6.4.
pernos: 48 Formaletas. 1:20
13 Excavacion. 12 formaleta.
1:20 a 40, 24 y siguen con las
formaletas, en cada extremo
para poder vaciar material

Martes 11 de Marzo. se da
inicio a las 7:00 AM
con. 2 oficiales ayudantes. y aux: SSI: IN Practi
armare de fierro y descarge
de material de triturado y
arena llevo a las 3 de la
tarde.

Miércoles 12 Marzo se da
inicia a las 7:00 AM.
con 2 oficiales ayudantes y AUX SSI
ING. Ricardo interventoria. armare
de formaletas. "vigas, EJE 1 y 2".
REUNION a las 3 pm. con planeación.
DE pueblo Rico tema. casa.
vecino
INTERVENTORIA CONTRATISTA RECIBEN VISITA DE SECRETARIA DE
PLANEACIÓN, INSPECCIÓN A POLICIA Y VECINA QUE INTERPUSO
SOLICITUD ACLARACIÓN DE LINDEROS CONCLUYENDO QUE LA SECRETARIA
DE PLANEACIÓN REVISARA EN SU REGISTRO CATASTRAL LA DELIMITACIÓN
DE LINDEROS ENTRE PALACIO DE JUSTICIA Y CASA VECINA A FIN
DE ACLARAR LA SITUACIÓN.

MARZO 12/2025
INTERVENTORIA.

Jueves 13 Marzo.
Se inicia Mezcla de concreto para fundir
eje 1 y 2 zapatas 10, 11, 12, 8 y 9.
con sus Respectivas Vigas.
Se Realizo cilindros de prueba 6" x 1
3 unidades y el cono slump 5".
Hoy se Mezclo 98 bultos cemento.

Viernes 14 marzo en compañia de [illegible]. Encofrado [illegible] Eje 4 y Eje [illegible] y Septimo Eje 3 en compañia de Interventoria. y [illegible]

Sabado 15 Marzo. se cargo. Cemento del almacen a lacobio. Descarge de. Material arena y [illegible] Nuevo

Lunes 17 de Marzo, hoy se realizo, fundida zapata 4, 5, 6 y 8 quedo listo ejes 1, 2, 3. Llovio en la tarde se dejo limpio la via de drena y grava.

Martes 18 de Marzo, excavacion eje 4 zapata 2, cuello de columnas ejes 2, columnas C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 limpio la via de Materiales

Miercoles 19 de Marzo, Armada hierro zapata, Viga eje 4. columna # 2

Jueves 20 Marzo, se realizo fundida pedestales C11 y C12, llegada Material gravilla y Arena.

Viernes 21 Marzo, fundida zapata Z1, Z2 y Z3 con viga eje 4 Apoyo GENERAL DE OBRA
