INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM-19

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CERETÉ, CÓRDOBA

ENERO DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 2276 de 2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM-19

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

CERETÉ, CÓRDOBA

ENERO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 104-2022 **Contratista:** CONSORCIO CORDOBA 2022

Contrato de Interventoría No. 2276-2021 **Interventoría:** CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

INFORME MENSUAL No. 19 **MES O PERIODO:** ENERO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	18
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	19
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	22
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	22
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	22
	• Seguimiento Programa de Obra		22
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	22
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	22
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	22
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	22
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		22
5.1	Información general del contrato		22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		24
5.3	Informes especialistas y profesionales		24
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		24
5.5	Informe matriz de riesgos.		24
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		25
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de		25
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		25
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	25
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	25
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	26
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	26
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	26
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		26
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	26
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	26
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	26
7	**Conclusiones y recomendaciones**		27
8	**Anexos**		28
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		28
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		28
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		28
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de febrero de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 104-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.321.717.210,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 403.558.223,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 16.725.275.433,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 5.017.582.629,90
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 2.831.077.245,74

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	7673,35
	Mejoramiento	ML	7673,35
	Rehabilitación	ML	7673,35
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	799,51	6067,72
	Mejoramiento	ML	799,51	6067,72
	Rehabilitación	ML	799,51	6067,72
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	16.629.514.105,00		16.629.514.105,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	57.851.736,00		57.851.736,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16.719.222.641,00	6.052.792,00	16.725.275.433,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1.148.494.577,81		1.148.494.577,81	10.688.795.221,32
AJUSTES	0,00		0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00		0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00		0,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	1.148.494.577,81		1.148.494.577,81	10.726.704.813,32

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 11.255.592.164,91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.726.704.813,32
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	64,13%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	12
	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**33**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de pavimento T16 hasta el pr 0+070



Foto 2.. Construcción de cuneta anden del tramo T1



Foto 3. Instalación de pavimento del tramo A7 hasta el PR 0´+115



Foto 4. Instalación de pavimento T12 hasta el PR 0+000

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El día 21 de noviembre de 2023 mediante Radicado No. SAL-23-017515 esta interventoría envió informe de proceso de sancionatorio y/o incumplimiento al municipio.

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa "Colombia Rural" por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El Instituto Nacional de vías INVIAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la Interventoría cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El presente documento contiene el informe Mensual de Interventoría No. 19, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la Interventoría, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Martínez (barrio Alberto Saibis, 20 de julio, la lucha) y Chuchurubí.

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR del departamento y se encuentra ubicada en la vía hacia Planeta Rica.

Es preciso aclarar que no será necesario montaje de plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Así mismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas

A continuación, se muestra una imagen general y especifica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Figura 1 Localización General del Proyecto.

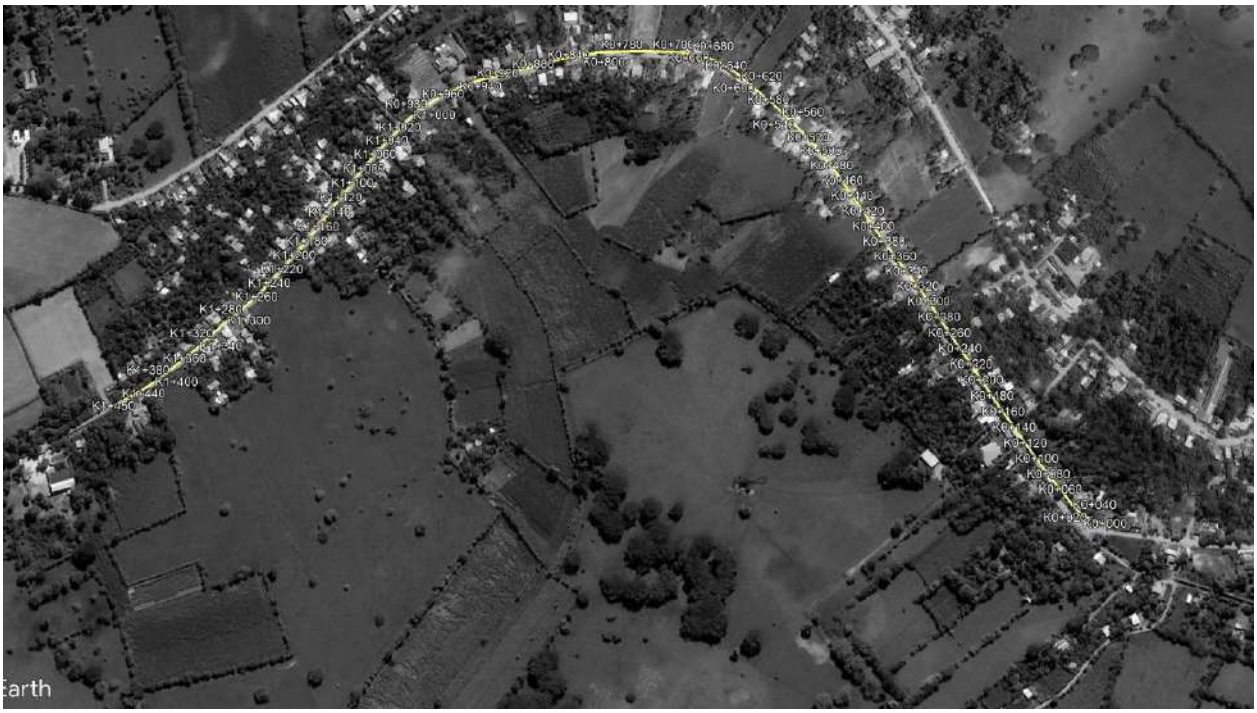


Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar sector Chuchurubí.



Figura 3 Localización específica de la vía a diseñar sector Martínez.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos, los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales.

De esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los PLAN D operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, perdida de grava, baches.

	
PR K0+818 al K0+830 Sector Chuchurubí	PR K0+092 Sector Martínez. Calle 8 vía media tapa.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste en la construcción de 7673,35 metros lineales de pavimento de 20 cm de espesor y 38Mpa, la estructura con anchos de diseño de 5.50 m, 5.00 m, 4.50 m, y 4.00 m con bombeos normales del 2% y bombeos transicionales ajustados a las condiciones actuales de drenaje y empalmes viales, con bordillo prefabricados en ambos lados, una capa en afirmado con un espesor de 0.25 metros para el tramo 1 y 3 y 0.45 metros para el tramo 2; y subbase granular con un espesor de 0.15 metros para los 3 tramos.

Los 7673,35 metros lineales de pavimento están distribuidos de la siguiente forma en los 3 sectores:

SECTOR	No.	Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Longitud del tramo (m)	Espesor de Concreto (m)	Espesor de Subbase (m)	Espesor de Mejoramiento (m)	Bordillo Prefabricado (cm)
ALBERTO SAIBIS	1	A1 - CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5,50	244,17	20	15	25	20x80x60
	2	A2 - CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5,50	242,73				
20 DE JULIO	3	A3 - CARRERA 7AC ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	5,50	455,67	20	15	25	
	4	A4 - DIAGONAL 3 ENTRE CARRERA 7AC Y CARRERA 7a	5,00	410,50				
	5	A7 - CALLE 2aE ENTRE CARRERA 7aC Y CARRERA 7aA	5,50	168,16				
LA LUCHA	6	T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10	5,00	420,48	20	15	25	
	7	T19 - VARIANTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aA	5,00	25,37				
MARTINEZ	8	T12 - CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y FIN DE TRAMO	4,50	151,38	20	15	25	
	9	T13 - CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CALLE 10	4,00	231,13				
MARTINEZ	10	T1 - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	6,00	1858,30	20	15	45	20x80x60
	11	T2 - CARRERA 3 VIA LA CEIBITA HASTA LA Y	6,00	240,00				
	12	T2' - VARIANTE ENTRE CALLE 8 Y LA CARRERA 3	6,00	15,52				
	14	T4 - CARRERA 6 ENTRE CALLE 10 ENTRE TRANSVERSAL 5	6,00	75,19				
	15	T5 - CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y CALLE 10	6,00	261,10				
	16	T6 - CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6	4--5	163,00				
	17	T7 - CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3	5,00	137,75				
	18	T8 - TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL 4A	4,00	105,62				
	19	T9 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLE 7A Y CARRERA 4	5,00	177,12				
	20	T10 - CALLE 7 ENTRE TRANVERSAL 4 Y CARRERA 4	5,00	101,37				
	21	T14 - CARRERA 5A ENTRE CALLE 7A SECTOR MATAPERRO	4,00	200,00				
	22	T15 - CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4	5,00	344,18				
	23	T16 - TRANSVERSAL 4 ENTRE CARRERA 5C Y CALLE 7A	5,00	172,64				
	24	T17 - CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	5,00	21,97				
CHUCHURUBI	25	P14 - CARRERA 27 VIA PRINCIPAL	5,00	1450,00	20	15	25	20x80x60
				7673,35				

Parámetros de Diseño

Longitud:	**K7+673,35**
Tipo de terreno:	**Plano**
Velocidad de diseño:	**30 Km/h**
Ancho de Calzada:	**4.00m - 4.50m - 5.00m - 5.50m - 6.0m**
Ancho de Carril:	**2.00m - 2.25m - 2.50m - 2.75m - 3.00m**
Bombeo Normal:	**2,00%**
Peralte Maximo	**-**

Adicionalmente se construirán 3 box culvert de sección transversal de 1mx1m ubicados así:

TRAMO	SECTOR	NOMENCLATURA	ABSCISA
A3	20 DE JULIO	CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	K0+310
T1	MEDIA TAPA	CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	K0+922
			K1+467
T18	LA LUCHA	CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10	K0+420

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

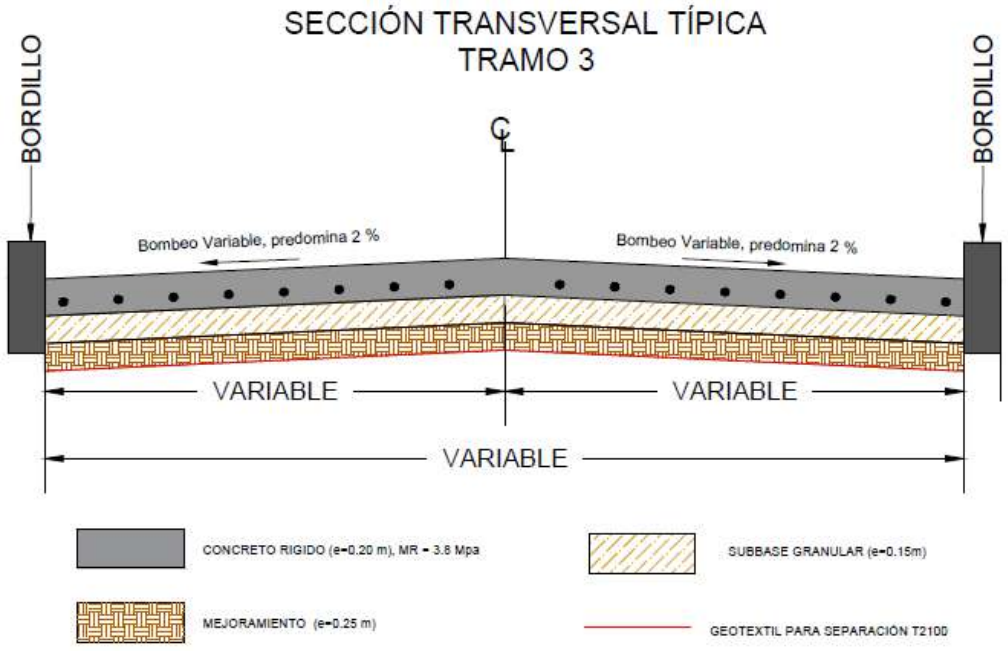


Figura 4. Tramo 1 y Tramo 3

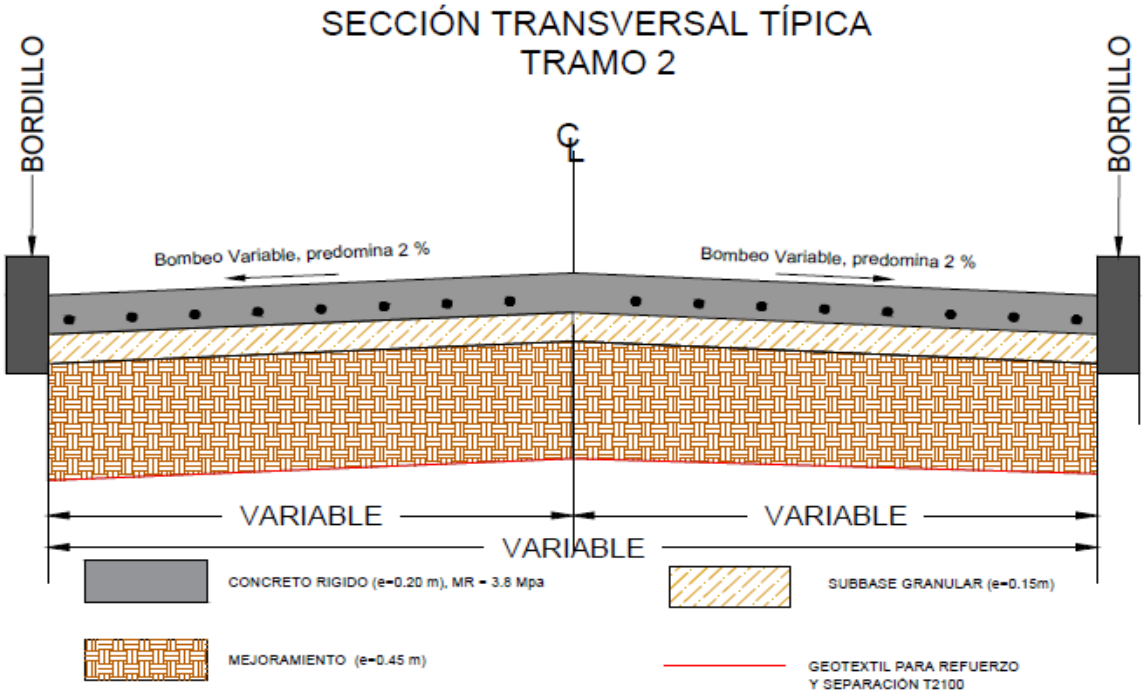


Figura 5. Tramo 2

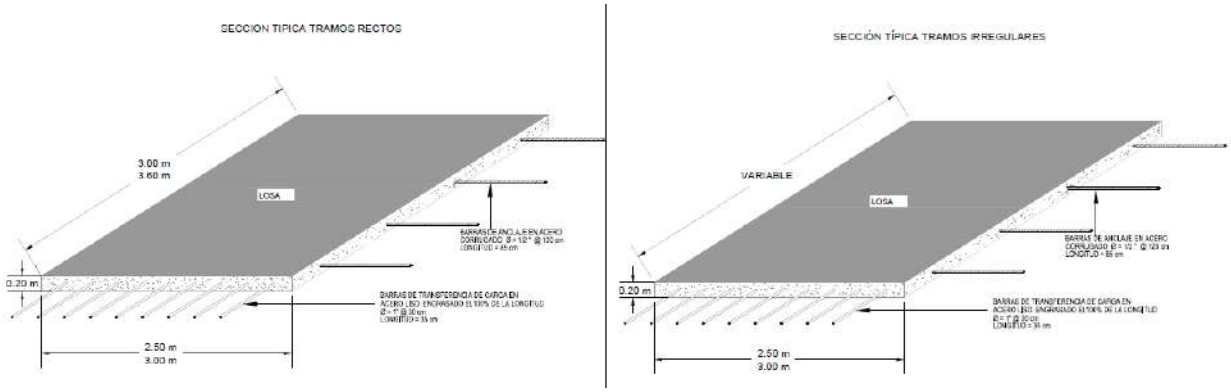


Figura 6. Sección típica

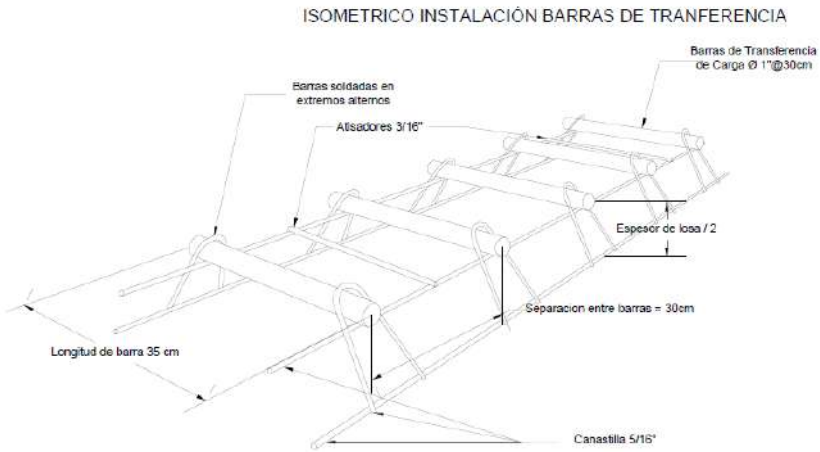


Figura 7. Canastillas de Instalación de barras de transferencia.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CERETE – CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL RURAL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE OBRA No	No. 104-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO CÓRDOBA 2022 INTEGRANTES: CONSTRULATINA S.A.S Nit No. 829002616-3 (95%) LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No. 6.640.311 (5%)
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ CC 15.370.151
NIT	901598916-6
DIRECCIÓN	Carrera 6#65-24 OFIC 317 Montería
TELÉFONO	3185162227
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 3	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 4	31 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.321.717.210,00
VALOR ADICIÓN N° 1	$403.558.223,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.725.275.433,00

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- TRAMO T1 MEDIA TAPA: Se realizó el 100% del sello de juntas de pavimento, 100% de instalación de bordillos prefabricados y 100% de bordillos in situ. Se han terminado 66,6 ml de anden cuneta.
- TRAMO T13: Se realizó el 100% de excavaciones, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento. Se realizó instalación de bordillos prefabricados entre el PR 0+040 y el PR 0+231 de ambos lados. Se instaló sello de juntas de pavimento.
- TRAMO T18: Se instaló el 100% de bordillos del lado derecho y del lado izquierdo del PR 0+420 al PR 0+360.
- TRAMO T12: Se realizó el 100% de excavaciones, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento.
- TRAMO T15: Se realizó excavaciones, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento entre el PR 0+000 y el PR 0+191. Se continúa instalación de bordillos. Se instaló sello de juntas de pavimento.
- T16: Se realizó excavaciones, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento entre el PR 0+000 y el PR 0+070.
- TRAMO T6: Se realizó excavaciones, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento entre el PR 0+000 y el PR 0+060
- TRAMO A7 Se realizó excavaciones, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento entre el PR 0+000 y el PR 0+115.

CANTIDAD MES DE ENERO 2024

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.148.494.577,8		$ 1.148.494.577,8	$ 10.688.795.221,3
AJUSTES	$ -		$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -	$ 37.909.592,0
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 1.148.494.577,8		$ 1.148.494.577,8	$ 10.726.704.813,3

3.3 ÍTEMS NO PREVISTOS

- En este período no se generaron nuevos ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

* Se realizan actas de reunión y actas de comités de obra para pactar compromisos de ambas partes.

* Se continúa haciendo estricto seguimiento a los compromisos y obligaciones del Contratista, tal como lo establece el contrato de obra y sus pliegos de condiciones.

* Se realiza toma de densidades de afirmado y subbase como control de calidad por parte de la Interventoría, y chequeo de espesores con topografía.

*Se realizan toma de muestras de concreto en campo para elaboración de viguetas y fallarlas en laboratorio como control de calidad.

* Se realizan levantamientos topográficos en conjunto con el contratista e interventoría en tramos antes de iniciar excavaciones para así llevar un mejor control de los volúmenes ejecutados.

* Se realiza chequeo de cada capa de material conforme a la estructura de diseño del pavimento antes de continuar con la siguiente. Se chequean cotas de excavación, afirmado, subbase granular y rieles ya instalados.

* Se realiza acompañamiento en la parte social en el SAU del proyecto.

* Se realizan veedurías de seguimiento.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron cinco (05) informes semanales correspondientes al periodo en mención, los cuales se encuentra relacionados en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. (Ver página 29-38)

INFORMES SEMANALES	FECHA
76	Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de Enero de 2024
77	Del 05 al 11 de enero de 2024
78	Del 12 al 18 de enero de 2024
79	Del 19 al 25 de enero de 2024
80	Del 26 de enero al 01 de febrero de 2024

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionan la maquinaria y los equipos en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (ver página 39)

MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**
ESTACIÓN TOTAL	GOWIN	Alcance 2000m	Martínez
Volqueta doble troque	International	14 m3	Martínez
Vibro compactador	Caterpillar	12 ton	Martínez
Motoniveladora	Caterpillar	12 Ton	Martínez
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Martínez
Pajarita	Caterpillar 420E	11ton	Martínez
Vibro compactador	Caterpillar	0.96m3	Martínez
Motoniveladora	Caterpillar	8 Ton	Martínez
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Martínez
Cortadora de concreto	MT - CNMT	13 HP	Martínez
Vibrador de aguja	EQUIPMASTER	3.1HP	Martínez
Planta eléctrica	BAUKER	2200 W	Martínez
Mezcladora de concreto	EQUIPMASTER	2 BTOS / 390 LTS	Martínez

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el personal de este período. (ver página 40-42)

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
JUAN CABALLERO.	78.027.851	OFICIOS VARIOS
DAIRO CORONADO.	1.064.988.482	OFICIOS VARIOS
JOVER ALEAN.	1.069.493.792	INGENIERO R.
LUIS ESPINOZA	78.029.892	PLOMERO
JOSE ALMANZA.	1.064.981.032	TOPOGRAFO
KEVIN DIAZ	92.527.941	INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
JUAN DURANGO	1.067.939.423	INGENIERO ESPECIALISTA HADRAULICO
JORGE FLOREZ	1.067.840.601	INGENIERO AMBIENTAL
DARIO GHISAYDS	1.032.371.247	PROFESIONAL EN HIGIENE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUTRIAL
LUIS JIMENEZ	1.003.188.639	OFICIOS VARIOS
OSWALDO JIMENEZ	7.919.051	AYUDANTE
DANIELA MONTERROZA	1.104.422.240	TRABAJADORA SOCIAL
HUGO ESPITIA	7.385.982	INGENIERO
JAIDYS MAUSSA	34.998.916	INGENIERO
ADRIANA MUÑOS MARTINEZ	1.064.981.749	SOCIAL

JOSE SALABARRIA	1.003.457.633	TOPOGRAFO
CESAR HERNADEZ	153.700.151	DIRECTOR DE OBRA
LUIS IZQUIERDO	1.067.836.256	INGENIERO RESIDENTE
GABRIEL MEDELLIN	1.003.193.364	OFICIOS VARIOS
CARLOS PRETELT	1.065.006.168	OPERADOR
GUSTAVO REYES	1.071.354.099	CADENERO
JAIRO POMARES	73.159.265	PLOMERO
JANCARLOS ALCALA	1.068.821.040	OFICIOS VARIOS
ALEXANDER GONZALEZ	78.034.248	OFICIOS VARIOS
JAIME PETRO	1.064.982.064	OFICIOS VARIOS
MAYKOL SANDON	1.065.000.276	OFICIOS VARIOS
ANDRES RODRIGUEZ	1.005.489.007	OPERADOR
MANUEL MONTERROZA	1.100.338.551	OPERADOR
MARIO CAUSIL	1.068.661.925	OPERADOR
JAVIER ORTEGA	1.064.997.508	OPERADOR

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra (ver página 43)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se relacionan el estado general del tiempo del presente mes. (Ver página 44)

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este período se relacionan laboratorios en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Ver página 45-55)

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimientos Garantías y Seguros Contrato de Obra se adjuntan en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Ver página 56-74).

Pólizas iniciales:

Amparo		Valor Asegurado ($)	VIGENCIA

	% Amparo		Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	31/05/2022	31/05/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	31/05/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	31/05/2022	31/07/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad de la revisión de estudios y diseños.	30%	$ 9.557.040,00	31/05/2022	31/05/2027
Predios, labores y operaciones		$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Contratistas y subcontratistas		$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Vehículos propios y no propios		$ 326.434.344,00	31/05/2022	31/07/2022

Pólizas actualizadas por prórroga 1:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	100%	$ 443.142.106,00	25/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.329.426.318,00	25/07/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 886.284.212,00	25/07/2022	31/12/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	$ 1.329.426.318,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	$ 4.778.556,00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prórroga 2:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	100%	$ 1.632.171.721,00	25/07/2022	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/06/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 3.264.343.442,00	25/07/2022	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prorroga 3:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25/07/2022	30/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25/07/2022	30/06/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	30%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prorroga 4 y adición 1:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25/07/2022	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.345.055.086,60	25/07/2022	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 5.017.582.629,9	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	30%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$836.263.771,65	25/07/2022	31/02/2024

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el Contratista hizo entrega del Plan de calidad correspondiente.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: a este contrato le desembolsado al Contratista el anticipo asignado según contrato del 30%. Adjunto se anexa (Ver Página 75).

Seguimiento Programa de Inversiones: Se hizo entrega del Programa de Inversiones actualizado, razón por la cual se relaciona su seguimiento en el formato MEPI-MN-IN-6-FR-2. (Ver página 76)

Actas de Comité de Obra: en el presente mes se realizaron dos (02) Comités de Obra, por lo cual se relacionan en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1 (ver página 77-82)

Actas de Reunión: en el presente se realizó un (01) acta de reunión de veeduría por lo cual se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. (ver página 83-85)

Acta de mayores y menores cantidades: no se realizó el acta de mayores y menores en este período, por lo cual no se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1.

Acta parcial de obra: No se realizó acta parcial de obra para este período.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B INTEGRADO POR: ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%

NIT	901.551.292-6
TELÉFONO	601-74060460
DIRECCIÓN	Oficina. Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal – North Point
CONTRATO No	2276 DE 2021
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4"
LOCALIZACIÓN:	"CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (BARRIO ALBERTO SAIBIS, 20 DE JULIO, LA LUCHA Y CHUCHURUBÍ) CERETÉ CÓRDOBA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.930.530.773,00
VALOR ADICIÓN 1	$965.265.286,00
VALOR ADICIÓN 2	$250.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.145.796.059,00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 3	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 4	31 DE MARZO DE 2024

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación entregada por el Contratista.
- Seguimiento de las actividades de excavación, retiro y colocación de material de afirmado.
- Verificación de afiliaciones del personal.
- Realización de Comités de obra.
- Realización de Comités de seguimiento del convenio.
- Realización de informes semanales y mensuales
- Requerimientos escritos al Contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En este mes no se relaciona informe de especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El Informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

El Informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

La Interventoría se encuentra recopilando y actualizando los documentos electrónicos en la plataforma CIFRA de acuerdo al Sistema de Gestión Documental implementado por INVIAS.

6. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se encuentran relacionados los equipos y vehículos para este período. (Ver página 86)

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Ver página 87)

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**
Leonardo Toro Niño	Director de Obra
María José Teherán Guerra	Inspector SST
Ivanna Rocío Charrasquiel Rivero	Secretaria
Sandra Mireya Cepeda Sanabria	Ing. Ambiental
Katherine Paola Lopesierra Arteaga	Profesional Social
Nohemí Sofía Padrón Torres	Ing. Residente de Interventoría
Said Mauricio Soto Martínez	Ing. Auxiliar
Lina María Ramos Benavides	Ing. Auxiliar
Luis Miguel Orozco Olivares	Topógrafo
Deimer Enrique López Medina	Cadenero
Darío Enrique Cantero Mendoza	Conductor

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver página 88)

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver página 89-90)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo del Anticipo	27/01/2022	01/10/2024	$ 811.147.384
Calidad de Servicio	01/07/2023	31/03/2029	$ 943.738.817,7
Cumplimiento	27/01/2022	01/10/2024	$ 314.579.605,9
Salarios y prestaciones Sociales	27/01/2022	31/03/2027	$ 629.159.211,8

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, se encuentra en elaboración del Plan de Calidad. En el presente informe no se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: el Contrato de Interventoría no contempla anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para enero de 2024, se tenía previsto una Inversión Programada Acumulada de $11.255.592.164,91 la cual representa un porcentaje del 67,30% versus una Inversión Ejecutada Acumulada de $ 10.726.704.813,32 la cual representa un porcentaje del 64,13% para un atraso del -3,16%.
- Se solicitó al contratista plan de contingencia por atrasos y aumentar rendimientos y cumplir con los tres frentes de trabajo para obras hidráulicas solicitado.
- Continuaron actividades de sello de juntas de pavimento en los tramos pendientes, a la fecha se va al día con esta actividad de acuerdo a los tiempos de espera para poder instalarlo.
- Se tomaron densidades en campo por parte del contratista y la interventoría, tanto al material de afirmado como al material de subbase granular.
- Se hicieron ensayos de laboratorio a las viguetas tomadas en campo por parte de la interventoría para verificar resistencia del concreto instalado.
- En media tapa se inició con las obras hidráulicas con la construcción de andén cuneta.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Se adjunta correspondencia recibida por parte del Contratista de obra y enviada por parte de Interventoría. (Ver página 91-146).

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas. (Ver página 147-199)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

No Se adjunta registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta la Bitácora de Obra, libro donde se registran todas las actividades que se realizaron durante el periodo. (Ver página 200-226).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 76 del 29/12/2023 al 04/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673.35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: CONSTRULATINA S A S Nit No 829002616-3 CON 95% y LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No 6640311 CON 5%
CONTRATO No.: 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ 403.558.223,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/23 — $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No.: 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 1.215.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 3.145.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/23 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	$ 16.725.275.433
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 6.605.846.907	$ 6.605.846.907
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 9.715.870.303	$ 10.119.428.526
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 3.145.796.059	$ 3.145.796.059
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.310.039.722	$ 2.918.726.442
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 835.756.337	$ 227.069.617

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.872.607.826,92	59,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	#¡REF!	#¡REF!
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	#¡REF!	#¡REF!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.592,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.872.607.826,92	59,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	#¡REF!	#¡REF!
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	#¡REF!	#¡REF!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 310.989.271,41	1,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.911.925,00	0,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 20/12/2023
VALOR FACTURAS: $ 6.605.846.906,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.909.863.268,00	92,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.918.726.442,20	92,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.948.631,00	0,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.948.631,00	0,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 130.118.241,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.017.582.629,90
Amortizado $	$ 2.831.077.245,74
Saldo $	$ 2.186.505.384,16

INDICADOR I/C	
En el mes:	6,12
Acumulado:	#¡REF!

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 59,03% — Avance o Atraso Físico %: #¡REF!

Meta Física Ejecutada %: #¡REF!

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad tramo 1 y tramo 2	Cantidad tramo 3	TOTAL	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog	1	1	1	1	100,00%
					Ejec	1	1	1	1	100,00%
* Explanaciones	M3	30.274,11	4.592,90	34.867,01	Prog		30.274,11	4.592,90	34.867,01	100,00%
					Ejec		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
* Subbases	M3	19.013,36	2.900,00	21.913,36	Prog		19.013,36	2.900,00	21.913,36	100,00%
					Ejec		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
* Pavimentos de concreto	M3	3.847,20	4.463,13	8.310,33	Prog		3.847,20	4.463,13	8.310,33	100,00%
					Ejec		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
* Estructuras de drenaje	M3	5.039,38		5.039,38	Prog		5.039,38		5.039,38	100,00%
					Ejec				-	
* Transporte	M3/KM	395.247,06	48.103,25	443.350,31	Prog		395.247,06	48.103,25	443.350,31	100,00%
					Ejec		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
* Señalización y seguridad	M	18.862,05	4.365,00	23.227,05	Prog		18.862,05	4.365,00	23.227,05	100,00%
					Ejec		-	-	-	
* Caracterizacion vial	KM	6,23	1,45	7,68	Prog		6,23	1,45	7,68	100,00%
					Ejec		-	-	-	
Items no previstos	M3	3876,44	1501,65	5.378,09	Prog		3.876,44	1.501,65	5.378,09	100,00%
					Ejec		#¡REF!	1.501,65	#¡REF!	#¡REF!

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP,	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP,	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora pajarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3: Chuchurubí (P14)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el día 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO MEDIA TAPA: Se realizó sello d ejuntas de pavimento del PR 1+600 al PR 1+858
MARTINEZ TRAMO T13: Se realizó instalación de subbase y pavimento del PR 0+105 al PR 0+160
TRAMO T18: Se continuó actividad de instalación de bordillos del lado derecho.
TRAMO T19: Se terminó actividad de instalación de bordillos.


MARTINEZ
MARTINEZ

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MARTINEZ- TRAMO T5: Se tiene previsto iniciar relleno de espaldar a bordillos.
Se tiene previsto iniciar relleno de espaldar a bordillos.
terminar sellado de juntas de pavimento y fundir un tramo de andenes cunetas.
cunetas.
y relleno de espaldares
MARTINEZ TRAMO T7: Se tiene previsto realizar instalación de bordillos/cunetas y relleno de espaldares
TRAMO T9: Se tiene previsto iniciar instalacion de bordillos y/o cunetas.
previsto iniciar bordillos/cunetas y relleno de espaldares
bordillos/cunetas y relleno de espaldares
el PR0+231.
MARTINEZ TRAMO A1: Se tiene previsto llegar con pavimento al PR 0+000
tiene previsto fundir pavimento entre el PR 0+125 al PR 0+140.
pavimento del PR 0+140 al PR 0+000

MARTINEZ TRAMO T4:
TRAMO MEDIA TAPA: Se tiene previsto
TRAMO A3: Se tiene programado iniciar sello de juntas e iniciar
TRAMO T2 MARTINEZ: Se tiene previsto realizar la instalacion de bordillos/cunetas
TRAMO CHUCHURUBI: se tiene previsto hacer entrega de plan de trabajo de bocacalles y otros pendientes.
MARTÍNEZ
MARTINEZ TRAMO T18: Se tiene
MARTÍNEZ TRAMO T2`: Se tiene previsto iniciar instalación de
MARTÍNEZ TRAMO T13: Se tiene previsto instalar subbase y pavimento hasta
MARTÍNEZ TRAMO T9: Se tiene previsto instalación bordillos/cunetas y relleno de espaldares
MARTINEZ TRAMO A2: Se
MARTÍNEZ TRAMO T15: Se tiene previsto fundir

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

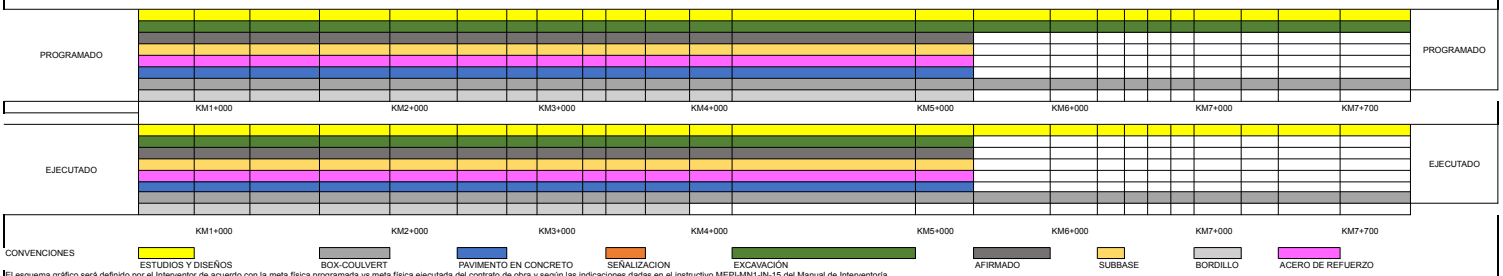

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de subbase del tramo T13 del PR 0+105 al PR 0+160



Foto 2. Instalación de pavimento del del tramo T13 del PR 0+105 al PR 0+160



Foto 2. Instalación de bordillos tramo T19

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El atraso del proyecto disminuyó del -41,32%, al -1,35% por la reprogramación entregada por la prórroga 3 y el adicional 1, Sin embargo siguen los bajos los rendimientos de trabajo por parte del contratista. Se ha solicitado aumentar el rendimiento por medio de oficios y comités de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 77 del 05/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: CONSTRULATINA S A S Nit No 829002616-3 CON 95% y LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No 6640311 CON 5%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ 403.558.223,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/23 — $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% ; 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 1.215.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 3.145.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/23 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	$ 16.725.275.433
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 6.605.846.907	$ 6.605.846.907
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 9.715.870.303	$ 10.119.428.526
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 3.145.796.059	$ 3.145.796.059
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.310.039.722	$ 2.934.071.509
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 835.756.337	$ 211.724.550

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.209.267.758,85	61,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.609.341.577,99	57,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (599.946.186,85)	-3,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.592,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.209.267.758,85	61,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.647.251.163,99	57,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (562.036.594,85)	-3,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 336.679.931,92	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 187.496.955,15	1,12%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 20/12/2023
VALOR FACTURAS: $ 6.605.846.906,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.924.799.065,00	92,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.934.071.509,00	93,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.158.905,00	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.158.905,00	0,61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 130.118.241,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.017.582.629,90
Amortizado $	$ 2.831.077.245,74
Saldo $	$ 2.186.505.384,16

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,10
Acumulado:	0,31

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,04% — Avance o Atraso Físico % -3,36%

Meta Física Ejecutada % 57,68%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad tramo 1 y tramo 2	Cantidad tramo 3	TOTAL	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog	1	1	1	1	100,00%
					Ejec	1	1	1	1	100,00%
* Explanaciones	M3	30.274,11	4.592,90	34.867,01	Prog		30.274,11	4.592,90	34.867,01	100,00%
					Ejec		17.643,33	4.186,90	21.830,23	62,61%
* Subbases	M3	19.013,36	2.900,00	21.913,36	Prog		19.013,36	2.900,00	21.913,36	100,00%
					Ejec		12.607,53	2.900,00	15.507,53	70,77%
* Pavimentos de concreto	M3	3.847,20	4.463,13	8.310,33	Prog		3.847,20	4.463,13	8.310,33	100,00%
					Ejec		4.362,28	1.450,00	5.812,28	69,94%
* Estructuras de drenaje	M3	5.039,38		5.039,38	Prog		5.039,38		5.039,38	100,00%
					Ejec				-	
* Transporte	M3/KM	395.247,06	48.103,25	443.350,31	Prog		395.247,06	48.103,25	443.350,31	100,00%
					Ejec		229.342,27	48.103,25	277.445,52	62,58%
* Señalización y seguridad	M	18.862,05	4.365,00	23.227,05	Prog		18.862,05	4.365,00	23.227,05	100,00%
					Ejec		-	-	-	
* Caracterizacion vial	KM	6,23	1,45	7,68	Prog		6,23	1,45	7,68	100,00%
					Ejec		-	-	-	
Items no previstos	M3	3876,44	1501,65	5.378,09	Prog		3.876,44	1.501,65	5.378,09	100,00%
					Ejec		355,68	1.501,65	1.857,33	34,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP,	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP,	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora pajarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3: Chuchurubí (P14)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el día 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MARTINEZ TRAMO T13: Se realizó instalación de subbase y pavimento del PR 0+160 al pr 231,13 y se hizo excavación del pr 0+015 al pr 0+000
MARTINEZ TRAMO T18: Se continuó actividad de instalación de bordillos del lado derecho.
MARTINEZ TRAMO T12: Se realizó instalación de afirmado, subbase y pavimento del PR 0+151,39 al pr 0+110.
realizó instalación de afirmado, subbase y pavimento del PR 0+151,39 al pr 0+110.
afirmado del pr 0+060 al pr 0+030. Se realizó instalación de subbase y pavimento del PR 0+140 al pr 0+090.

MARTINEZ TRAMO T12: Se
MARTINEZ TRAMO T15: se realizó instalación de


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MARTÍNEZ- TRAMO T5: Se tiene previsto iniciar relleno de espaldar a bordillos.
Se tiene previsto iniciar relleno de espaldar a bordillos.
previstofumdir el tramo de bordillos in situ pendiente y fundir un tramo de andenes cunetas.
TRAMO T2 MARTINEZ: Se tiene previsto realizar la instalacion de anden-cunetas y relleno de espaldares
CHUCHURUBI: se tiene previsto hacer entrega de plan de trabajo de bocacalles y otros pendientes.
previsto realizar instalación de anden-cunetas y relleno de espaldares
MARTINEZ TRAMO T18: Se tiene previsto terminar bordillos e iniciar relleno de espaldares
MARTÍNEZ TRAMO T13: Se tiene previsto terminar instslacion de bordillos de ambos lados.
MARTINEZ TRAMO A1: Se tiene previsto llegar con pavimento al PR 0+000
tiene previsto fundir pavimento entre el PR 0+125 al PR 0+140.
pavimento del PR 0+090 al PR 0+000

MARTINEZ TRAMO T4:
TRAMO MEDIA TAPA: Se tiene
TRAMO A3: Se tiene programado iniciar cunetas.
TRAMO
MARTINEZ TRAMO T7: Se tiene

MARTINEZ TRAMO A2: Se
MARTÍNEZ TRAMO T15: Se tiene previsto fundir

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

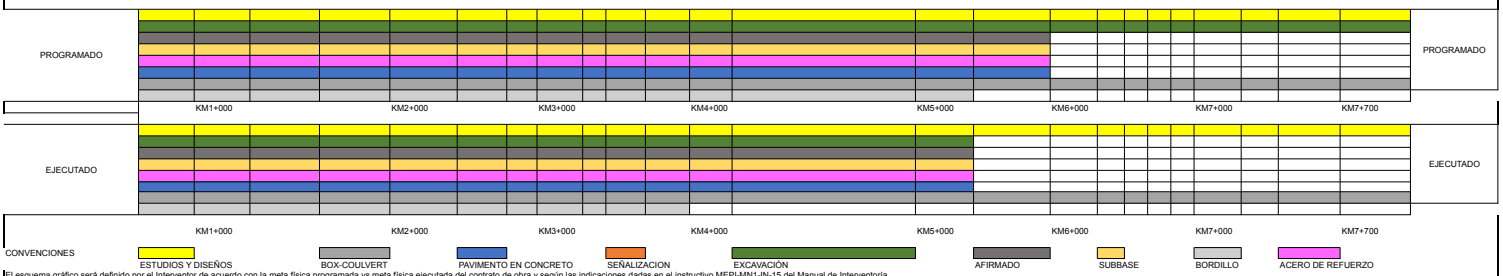

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de pavimento T13 del pr0+150 al pr 0+231,13



Foto 2. Instalación de pavimento del tramo T15. del pr 0+090 al pr0+140



Foto 2. Instalación de pavimento del tramo T12 del PR 0+151,39 al PR 0+110

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El atraso del proyecto disminuyó del -1,35% al -3,36% por los bajos los rendimientos de trabajo por parte del contratista. Se ha solicitado aumentar el rendimiento por medio de oficios y comités de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 78 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: CONSTRULATINA S A S Nit No 829002616-3 CON 95% y LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No 6640311 CON 5%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ 403.558.223,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/24 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 1.215.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 3.145.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	$ 16.725.275.433
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 6.605.846.907	$ 6.605.846.907
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 9.715.870.303	$ 10.119.428.526
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 3.145.796.059	$ 3.145.796.059
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.310.039.722	$ 2.953.230.414
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 835.756.337	$ 192.565.645

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.545.967.690,77	63,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.087.762.786,17	60,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (458.204.904,60)	-2,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.592,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.545.967.690,77	63,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.125.672.378,17	60,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (420.295.312,60)	-2,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 336.679.931,92	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 260.485.303,98	1,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 20/12/2023
VALOR FACTURAS: $ 6.605.846.906,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.943.391.351,00	93,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.953.230.414,00	93,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.158.905,00	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.158.905,00	0,61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 130.118.241,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.017.582.629,90
Amortizado $	$ 2.831.077.245,74
Saldo $	$ 2.186.505.384,16

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,07
Acumulado:	0,29

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 63,05% — Avance o Atraso Físico % -2,51%

Meta Física Ejecutada % 60,54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad tramo 1 y tramo 2	Cantidad tramo 3	TOTAL	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog	1	1	1	1	100,00%
					Ejec	1	1	1	1	100,00%
* Explanaciones	M3	33.627,83	4.592,90	38.220,73	Prog		22.194,37	4.592,90	26.787,27	70,09%
					Ejec		19.017,25	4.186,90	23.204,15	60,71%
* Subbases	M3	18.154,03	2.900,00	21.054,03	Prog		13.978,60	2.900,00	16.878,60	80,17%
					Ejec		13.069,03	2.900,00	15.969,03	75,85%
* Pavimentos de concreto	M3	6.860,33	4.463,13	11.323,46	Prog		4.459,21	4.463,13	8.922,34	78,80%
					Ejec		4.616,62	1.450,00	6.066,62	53,58%
* Estructuras de drenaje	M3	5.801,65		5.801,65	Prog		406,12		406,12	7,00%
					Ejec				-	
* Transporte	M3/KM	439.306,92	48.103,25	487.410,17	Prog		316.300,98	48.103,25	364.404,23	74,76%
					Ejec		242.896,07	48.103,25	290.999,32	59,70%
* Señalización y seguridad	M	18.862,05	4.365,00	23.227,05	Prog		-	4.365,00	4.365,00	18,79%
					Ejec		-		-	
* Caracterizacion vial	KM	6,23	1,45	7,68	Prog		-	1,45	1,45	18,88%
					Ejec		-		-	
Items no previstos	M3	3876,44	1501,65	5.378,09	Prog		969,11	1.501,65	2.470,76	45,94%
					Ejec		405,68	1.501,65	1.907,33	35,46%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP,	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora pajarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3: Chuchurubí (P14)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el dia 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO T13: Se realizó instalación de afirmado, subbase y pavimento del PR 0+040 al PR 0+000
instalación de afirmado del PR 0+100 al PR 0+000. Se instaló subbase granular y pavimento del PR 0+050 al PR 0+000
TRAMO T12: Se realizó excavación mecánica del PR 0+090 al PR 0+000
T16: Se iniciaron actividades de excavación del PR 0+000 al PR 0+070
instalación de afirmado del pr 0+030 al pr 0+000. Se realizó instalación de subbase y pavimento del PR 0+090 al pr 0+000.
en los tramos A1, T15, T13, T19 y T18.
del LD del PR 0+971 al PR 0+921.

TRAMO T8: Se realizó

TRAMO
TRAMO T15: se realizó
Se realizó instalación de bordillos prefabricados
Se realizó instalación de bordillos fundidos in situ en el tramo T1


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO T5: Se tiene previsto iniciar relleno de espaldar a bordillos.
TRAMO T4: Se tiene previsto iniciar relleno de espaldar a bordillos.
tiene previsto terminar de fundir los bordillos in situ pendiente y fundir un tramo de andenes cunetas.
TRAMO T13: Se tiene previsto terminar instslacion de bordillos de ambos lados.
TRAMO A7: Se tiene previsto iniciar actividades de excavación mecánica.
tiene previsto fundir pavimento del PR 0+050 al PR 0+100
tiene previstos fundir pavimento hasta el PR 0+000
tiene previsto iniciar con las excavaciones mecánicas.

TRAMO T1: Se

TRAMO T8: Se
TRAMO T12: Se
TRAMO T6: se

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

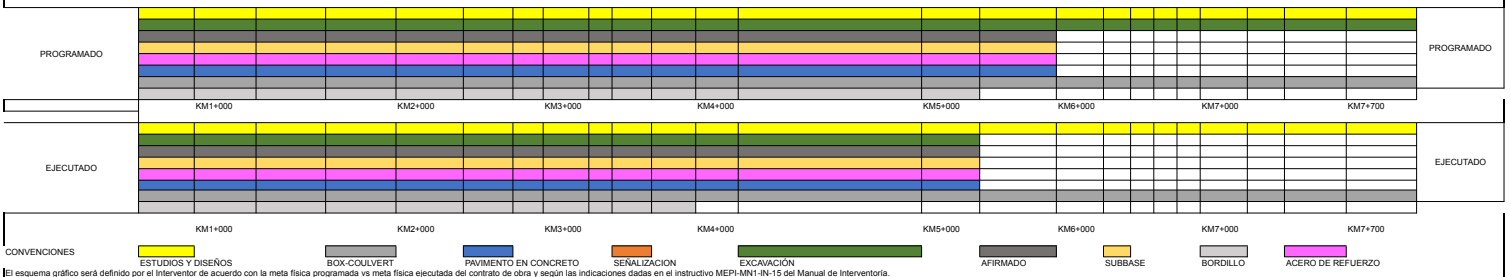

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de pavimento T13 del pr0+040 al pr 0+000



Foto 2. Instalación de pavimento del tramo T15. del pr 0+090 al pr0+000



Foto 2. Instalación de pavimento del tramo T8 del PR 0+100 al PR 0+050

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El atraso del proyecto disminuyó del -3,36% al -2,51%, sin embargo, se la ha solicitado al contratista aumentar rendimientos e iniciar obras hidráulicas (9,5% del valor del ctto) para subsanar estos atrasos y evitar que se incremente.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 79 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: CONSTRULATINA S A S Nit No 829002616-3 CON 95% y LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No 6640311 CON 5%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ 403.558.223,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/24 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 1.215.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 3.145.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	$ 16.725.275.433
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 6.605.846.907	$ 6.605.846.907
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 9.715.870.303	$ 10.119.428.526
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 1.930.530.773	$ 3.145.796.059	$ 3.145.796.059
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.310.039.722	$ 2.972.389.319
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 835.756.337	$ 173.406.740

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	10.895.411.373,97	65,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	10.369.916.994,35	62,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(525.494.379,62)	-3,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	37.909.592,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	10.895.411.373,97	65,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	10.407.826.586,35	62,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(487.584.787,62)	-2,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	349.443.683,20	2,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	308.417.622,69	1,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 20/12/2023
VALOR FACTURAS: $ 6.605.846.906,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	2.962.550.256,20	94,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2.972.389.319,00	94,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	19.158.905,00	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	19.158.905,00	0,61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 130.118.241,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.017.582.629,90
Amortizado $	$ 2.831.077.245,74
Saldo $	$ 2.186.505.384,16

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,06
Acumulado:	0,29

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 55,14% — Avance o Atraso Físico %: -2,92%
Meta Física Ejecutada %: 62,23% — 4,41%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad tramo 1 y tramo 2**	**Cantidad tramo 3**	**TOTAL**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog	1	1	1	1	100,00%
					Ejec	1	1	1	1	100,00%
* Explanaciones	M3	33.627,83	4.592,90	38.220,73	Prog		22.194,37	4.592,90	26.787,27	70,09%
					Ejec		19.579,16	4.186,90	23.766,06	62,18%
* Subbases	M3	18.154,03	2.900,00	21.054,03	Prog		13.978,60	2.900,00	16.878,60	80,17%
					Ejec		13.408,93	2.900,00	16.308,93	77,46%
* Pavimentos de concreto	M3	6.860,33	4.463,13	11.323,46	Prog		4.459,21	4.463,13	8.922,34	78,80%
					Ejec		4.820,82	1.450,00	6.270,82	55,38%
* Estructuras de drenaje	M3	5.801,65		5.801,65	Prog		406,12		406,12	7,00%
					Ejec				-	
* Transporte	M3/KM	439.306,92	48.103,25	487.410,17	Prog		316.300,98	48.103,25	364.404,23	74,76%
					Ejec		250.163,07	48.103,25	298.266,32	61,19%
* Señalización y seguridad	M	18.862,05	4.365,00	23.227,05	Prog		-	4.365,00	4.365,00	18,79%
					Ejec		-		-	
* Caracterizacion vial	KM	6,23	1,45	7,68	Prog		-	1,45	1,45	18,88%
					Ejec		-		-	
Items no previstos	M3	3876,44	1501,65	5.378,09	Prog		969,11	1.501,65	2.470,76	45,94%
					Ejec		538,28	1.501,65	2.039,93	37,93%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP,	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora paiarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3: Chuchurubí (P14)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A		
EMISIONES:	SI	NO X	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el dia 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO T6: Se realizó excavación, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento del PR 0+000 al PR 0+050
TRAMO T8: Se terminó instalación de subbase granular y pavimento del PR0+100 al PR0+000
TRAMO T12: Se realizó instalación de afirmado, subbase granular y pavimento del PR 0+110 al PR 0+000
TRAMO A7: se realizó excavacion mecanica del PR0+115 al PR 0+000
Se realizó instalación de bordillos prefabricados en el tramo T15.
Se realizó la instalación del 100% de bordillos fundidos in situ en el tramo T1 de los PR 0+921- PR0+981, PR0+920 - PR0+891,7, PR 1+467-PR1+416,6 y PR1+468- PR1+512,9
Se realizó excavación manual, instalación de acero y fundida de losa de fondo para andén cuneta del tramo T1 del PR 0+090 al PR 0+126,6 y del PR 0+140 al PR 0+157,9.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO T1: Se tiene previsto terminar el tramo de andenes cunetas.
TRAMO T6: se tiene previsto fundir pavimento del PR 0+050 al PR 0+150
TRAMO T12: Se tiene previstos fundir pavimento hasta el PR 0+000
TRAMO T13: Se tiene previsto terminar instslacion de bordillos de ambos lados.
TRAMO T8: Se tiene previsto realizar instalación de bordillos.
TRAMO A7: Se tiene previsto fundir pavimento del PR 0+000 al PR 0+115.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

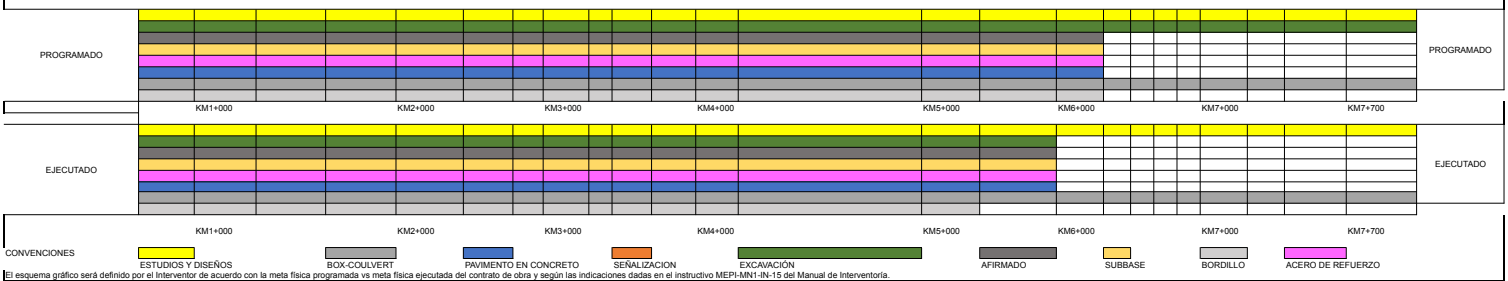

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de pavimento T12 hasta el PR 0+000



Foto 2.. Construcción de cuneta anden del tramo T1 del LD PR 0+090 al Pr 0+126.6



Foto 3. Instalación de pavimento del tramo T6 del PR 0+000 al PR 0+050

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El atraso del proyecto aumentó del -2,51% al -2,92%, por los bajos rendimientos en obra y porque no se está cumpliendo con el % de obra programado semanalmente. Se la ha solicitado al contratista aumentar rendimientos con mas frentes de trabajo para subsanar estos atrasos y evitar que siga incrementando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 80 del 26/01/2024 al 01/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: CONSTRULATINA S A S Nit No 829002616-3 CON 95% y LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No 6640311 CON 5%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ 403.558.223,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/24 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 1.215.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 3.145.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/24 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	$ 16.725.275.433
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 6.605.846.907	$ 6.605.846.907
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 9.715.870.303	$ 10.119.428.526
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 3.145.796.059	$ 3.145.796.059
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.310.039.722	$ 2.991.548.224
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 835.756.337	$ 154.247.835

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.255.592.164,91	67,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.688.795.221,32	63,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (566.796.943,59)	3,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.592,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.255.592.164,91	67,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.726.704.813,32	64,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (528.887.351,59)	3,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 360.180.790,84	2,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 235.131.949,90	1,41%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 20/12/2023
VALOR FACTURAS: $ 6.605.846.906,73

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.981.709.161,00	94,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.991.548.224,00	95,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.158.905,00	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.158.905,00	0,61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 130.118.241,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 5.017.582.629,90
Amortizado $	$ 2.831.077.245,74
Saldo $	$ 2.186.505.384,16

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,08
Acumulado:	0,28

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67,30% — Avance o Atraso Físico %: -3,16%
Meta Física Ejecutada %: 64,13%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad tramo 1 y tramo 2	Cantidad tramo 3	TOTAL	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog	1	1	1	1	100,00%
					Ejec	1	1	1	1	100,00%
* Explanaciones	M3	33.627,83	4.592,90	38.220,73	Prog		22.194,37	4.592,90	26.787,27	70,09%
					Ejec		20.572,27	4.186,90	24.759,17	64,78%
* Subbases	M3	18.154,03	2.900,00	21.054,03	Prog		13.978,60	2.900,00	16.878,60	80,17%
					Ejec		13.632,59	2.900,00	16.532,59	78,52%
* Pavimentos de concreto	M3	6.860,33	4.463,13	11.323,46	Prog		4.459,21	4.463,13	8.922,34	78,80%
					Ejec		4.997,72	1.450,00	6.447,72	56,94%
* Estructuras de drenaje	M3	5.801,65		5.801,65	Prog		406,12		406,12	7,00%
					Ejec				-	
* Transporte	M3/KM	439.306,92	48.103,25	487.410,17	Prog		316.300,98	48.103,25	364.404,23	74,76%
					Ejec		268.193,49	48.103,25	316.296,74	64,89%
* Señalización y seguridad	M	18.862,05	4.365,00	23.227,05	Prog		-	4.365,00	4.365,00	18,79%
					Ejec		-		-	
* Caracterizacion vial	KM	6,23	1,45	7,68	Prog		-	1,45	1,45	18,88%
					Ejec		-		-	
Items no previstos	M3	3876,44	1501,65	5.378,09	Prog		969,11	1.501,65	2.470,76	45,94%
					Ejec		538,28	1.501,65	2.039,93	37,93%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP,	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora paiarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3: Chuchurubí (P14)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el dia 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO T16: Se realizó excavación, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento hasta el PR 0+070
TRAMO A7: Se realizó excavación, instalación de afirmado, subbase granular y pavimento del PR 0+000 al PR 0+115 . Se realizó excavación mecánica hasta el PR 0+160
TRAMO T12: Se realizó instalación de afirmado, subbase granular y pavimento del PR 0+110 al PR 0+000
TRAMO T13: Se realizó instalación de bordillos prefabricados en el tramo T13 hasta el pr 0+231
Se terminó anden cuneta incluido losa superior del T1 del PR 0+090 al PR 0+126,6 y del PR 0+140 al PR 0+170. Faltan tapas removibles de la losa superior.
TRAMO T10: Se iniciaron excavaciones mecánicas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO T10: Se tiene previsto terminar excavaciones mecánicas e instalar afirmado y subbase en todo el tramo
TRAMO T6: se tiene previsto fundir pavimento del PR 0+050 al PR 0+150
TRAMO T8: Se tiene previsto realizar instalación de bordillos.
TRAMO A7: Se tiene previsto fundir pavimento del PR 0+115 al PR 0+168,16

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

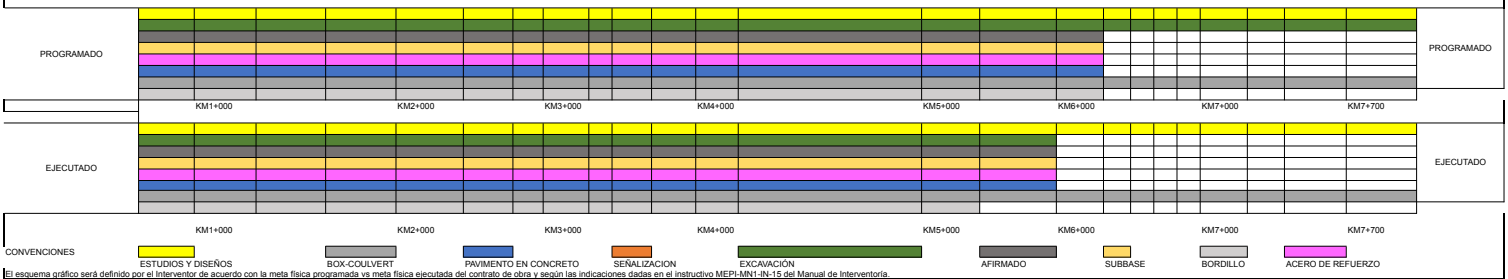

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de pavimento T16 hasta el pr 0+070



Foto 2.. Construcción de cuneta anden del tramo T1



Foto 3. Instalación de pavimento del tramo A7 hasta el PR 0´+115

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El atraso del proyecto aumentó del -2,92% al - 3,16%, por los bajos rendimientos en obra y porque no se está cumpliendo con el % de obra programado semanalmente. Se la ha solicitado al contratista aumentar rendimientos con mas frentes de trabajo para subsanar estos atrasos y evitar que siga incrementando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO ZEPEDA NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

CONTRATO No. 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTACION TOTAL	GOWIN	Alcance 2000m	Martínez	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volqueta dobletroque	International	14 m3	Martínez	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Vibrocompactador	Caterpillar	12 ton	Martínez	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Motoniveladora	Caterpillar	12 Ton	Martínez	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Martínez	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Recicladora	Caterpillar RM-350B	4,5ton	Martínez	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO		6	6	6	6	6			6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO	6						6	6						6							6							6			

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	186	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	150	80,65%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	36	19,35%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los días inactivos corresponden a los días que no se realizaron trabajos en obra por ser dominical y/o feriado.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Luis Jerónimo Izquierdo Argel
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-175762 COR

Firma
Nombre: Nohemi Sofía Padron Torres
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-328519COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CABALLERO.	78.027.851	OFICIOS VARIOS	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Mutual Ser	9462237317	$ 145.000	Colfondos	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
2	DAIRO CORONADO.	1.064.988.482	OFICIOS VARIOS	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Nueva Eps	9462237317	$ 145.000	Colfondos	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
3	JOVER ALEAN.	1.069.493.792	INGENIERO R.	$ 3.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 233.200	V	Sanitas	9462237317	$ 418.800	Porvenir	9462237317	$ 536.000	$ 134.000	$ -	$ -	
4	LUIS ESPINOZA	78.029.892	PLOMERO	$ 1.121.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		29	$ 78.100	V	Mutual Ser	9462237317	$ 140.200	Colfondos	9462237317	$ 179.500	$ 44.900	$ -	$ -	Ret
5	JOSE ALMANZA.	1.064.981.032	TOPOGRAFO	$ 2.416.667	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		29	$ 168.300	V	Salud Total	9462237317	$ 302.100	Porvenir	9462237317	$ 386.700	$ 96.700	$ -	$ -	
6	KEVIN DIAZ	92.527.941	INGENIERO ESPECIALISTA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Nueva Eps	9462237317	$ 145.000	Colpensiones	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
7	JUAN DURANGO	1.067.939.423	INGENIERO ESPECIALISTA HADRAULICO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Sanitas	9462237317	$ 145.000	Colpensiones	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
8	JORGE FLOREZ	1.067.840.601	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Eps Sura	9462237317	$ 145.000	Porvenir	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
9	DARIO GHISAYDS	1.032.371.247	PROFESIONAL EN	$ 2.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CORDOBA 2022	30	$ 160.100	V	Salud Total	9462237317	$ 287.500	Porvenir	9462237317	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	
10	LUIS JIMENEZ	1.003.188.639	OFICIOS VARIOS	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Caiacopi	9462237317	$ 145.000	Porvenir	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
11	OSWALDO JIMENEZ	7.919.051	AYUDANTE	$ 1.933.334	X X X X X X X X X n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		29	$ 134.600	V	Salud Total	9462237317	$ 241.700	Porvenir	9462237317	$ 309.400	$ 77.400	$ -	$ -	Ret
12	DANIELA MONTERROZA	1.104.422.240	TRABAJADORA	$ 2.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 160.100	V	Sanitas	9462237317	$ 287.500	Porvenir	9462237317	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	
13	HUGO ESPITIA	7.385.982	INGENIERO	$ 3.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 233.200	V	Salud Total	9462237317	$ 418.800	Protección	9462237317	$ 536.000	$ 134.000	$ -	$ -	Ret
14	JAIDYS MAUSSA	34.998.916	INGENIERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 139.200	V	Sanitas	9462237317	$ 250.000	Colfondos	9462237317	$ 250.000	$ 80.000	$ -	$ -	
15	ADRIANA MUNOS	1.064.981.749	SOCIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 139.200	V	Nueva Eps	9462237317	$ 250.000	Protección	9462237317	$ 250.000	$ 64.000	$ -	$ -	
16	JOSE SALABARRIA	1.003.457.633	TOPOGRAFO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Salud Total	9462237317	$ 145.000	Porvenir	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	Ret
17	CESAR HERNADEZ	153.700.151	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 170.600	V	Salud Total	9462237317	$ 306.300	Protección	9462237317	$ 392.000	$ 40.200	$ -	$ -	
18	LUIS IZQUIERDO	1.067.836.256	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 174.000	V	Salud Total	9462237317	$ 312.500	Protección	9462237317	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
19	GABRIEL MEDELLIN	1.003.193.364	OFICIOS VARIOS	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 114.900	V	Caiacopi	9462237317	$ 206.300	Porvenir	9462237317	$ 264.000	$ 66.000	$ -	$ -	
20	CARLOS PRETELT	1.065.006.168	OPERADOR	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 174.000	V	Salud Total	9462237317	$ 312.500	Porvenir	9462237317	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
21	GUSTAVO REYES	1.071.354.099	CADENERO	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Nueva Eps	9462237317	$ 145.000	Porvenir	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	Ret
22	JAIRO POMARES	73.159.265	PLOMERO	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Mutual Ser	9462237317	$ 145.000	Colfondos	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
23	JANCARLOS ALCALA	1.068.821.040	OFICIOS VARIOS	$ 1.121.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		29	$ 78.100	V	Nueva Eps	9462237317	$ 140.200	Colfondos	9462237317	$ 179.500	$ 44.900	$ -	$ -	Ret
24	ALEXANDER GONZALEZ	78.034.248	OFICIOS VARIOS	$ 1.121.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		29	$ 78.100	V	Salud Total	9462237317	$ 140.200	Porvenir	9462237317	$ 179.500	$ 44.900	$ -	$ -	Ing-Ret
25	JAIME PETRO	1.064.982.064	OFICIOS VARIOS	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 139.200	V	Mutual Ser	9462237317	$ 145.000	Colfondos	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
26	MAYKOL SANDON	1.065.000.276	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 80.800	V	Caiacopi	9462237317	$ 145.000	Colpensiones	9462237317	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
27	ANDRES RODRIGUEZ	1.005.489.007	OPERADOR	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 87.000	V	Salud Total	790389858	$ 50.000	Porvenir	790389858	$ 200.000	$ 50.000	$ -	$ -	
28	MANUEL MONTERROZA	1.100.338.551	OPERADOR	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 87.000	V	Salud Total	790389858	$ 50.000	Porvenir	790389858	$ 200.000	$ 50.000	$ -	$ -	
29	MARIO CAUSIL.	1.068.661.925	OPERADOR	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 87.000	V	Coosalus ESS	790389858	$ 50.000	Colfondos	790389858	$ 200.000	$ 50.000	$ -	$ -	
30	JAVIER ORTEGA	1.064.997.508	OPERADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 139.200	V	Salud Total	790389858	$ 80.000	Protección	790389858	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/02/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CESAR HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	434075094	9462237317	E	2024/01/05	2024/02/05	BANCOLOMBIA	31	$20,810,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1068821040	ALCALA JANCARLOS		X																231001	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$140,200	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$1,121,334	$56,200	No	$498,900
2	CC	1069493792	ALEAN JOVER																		230301	30	$3,350,000	$536,000	EPS005	30	$3,350,000	$418,800	CCF16	30	$3,350,000	$134,000	14-11	30	$3,350,000	$233,200	30	$3,350,000	$167,500	No	$1,489,500
3	CC	1064981032	ALMANZA JOSE		X																230301	29	$2,416,667	$386,700	EPS037	29	$2,416,667	$302,100	CCF16	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	$168,300	29	$2,416,667	$121,000	No	$1,074,800
4	CC	78027851	CABALLERO JUAN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
5	CC	1064988482	CORONADO DAIRO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
6	CC	92527941	DIAZ KEVIN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
7	CC	1067939423	DURANGO JUAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
8	CC	78029892	ESPINOSA LUIS		X																231001	29	$1,121,334	$179,500	ESSC07	29	$1,121,334	$140,200	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$1,121,334	$56,200	No	$498,900
9	CC	7385982	ESPITIA HUGO		X																230201	29	$3,238,334	$518,200	EPS002	29	$3,238,334	$404,800	CCF16	29	$3,238,334	$129,600	14-11	29	$3,238,334	$225,400	29	$3,238,334	$162,000	No	$1,440,000
10	CC	1067840601	FLOREZ JORGE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
11	CC	1032371247	GHISAYS DARIO																		231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
12	CC	78034248	GONZALEZ ALEXANDER	X	X																230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$140,200	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$1,121,334	$56,200	No	$498,900
13	CC	15370151	HERNANDEZ CESAR																		230201	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$306,300	CCF16	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$170,600	30	$2,450,000	$122,500	No	$1,089,400
14	CC	1067836256	IZQUIERDO LUIS																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
15	CC	1003188639	JIMENEZ LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
16	CC	7919051	JIMENEZ OSWALDO		X																230301	29	$1,933,334	$309,400	EPS002	29	$1,933,334	$241,700	CCF16	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	$134,600	29	$1,933,334	$96,800	No	$859,900
17	CC	34998916	MAUSSA JAIDYS																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
18	CC	1003193364	MEDELLIN GABRIEL																		230301	30	$1,650,000	$264,000	CCFC55	30	$1,650,000	$206,300	CCF16	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$114,900	30	$1,650,000	$82,500	No	$733,700
19	CC	1104422240	MONTERROZA DANIELA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
20	CC	1064981749	MUÑOZ ADRIANA																		230201	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$250,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
21	CC	1064982064	PETRO JAIME																		231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$250,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
22	CC	73159265	POMARES JAIRO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
23	CC	1065006168	PRETELT CARLOS																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
24	CC	1071354099	REYES GUSTAVO		X																230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$140,200	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$1,121,334	$56,200	No	$498,900
25	CC	1003457633	SALABARRIA JOSE		X																230201	29	$1,121,334	$179,500	ESSC07	29	$1,121,334	$140,200	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$1,121,334	$56,200	No	$498,900
26	CC	1065000276	SANDON MAYKOL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
Total	**Afiliados(26)**																						$45,525,005	$7,284,600			$45,525,005	$5,691,000			$45,525,005	$1,821,400			$45,525,005	$3,169,700		$45,525,005	$2,277,300		$20,244,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	434075094	9462237317	E	2024/01/05	2024/02/05	BANCOLOMBIA	31	$20,810,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$7,284,600	$203,700	$0	$7,488,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,738,200	$48,600	$0	$1,786,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$15,600	$0	$572,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,394,300	$94,900	$0	$3,489,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,595,300	$44,600	$0	$1,639,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,169,700	$88,600	$0	$3,258,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$3,169,700	$88,600	$0	$3,258,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,821,400	$50,900	$0	$1,872,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	$1,821,400	$50,900	$0	$1,872,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$5,691,000	$159,300	$0	$5,850,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$496,300	$13,900	$0	$510,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$4,100	$0	$149,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$1,070,400	$29,900	$0	$1,100,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$587,300	$16,500	$0	$603,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$285,200	$8,000	$0	$293,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$2,255,500	$63,100	$0	$2,318,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$851,300	$23,800	$0	$875,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,366,300	$38,200	$0	$1,404,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	$1,366,300	$38,200	$0	$1,404,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$911,000	$25,500	$0	$936,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	26	$911,000	$25,500	$0	$936,500
TOTAL				**26**	**$20,244,000**	**$566,200**	**$0**	**$20,810,200**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	457	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	207	Otras transferencias de capital - convenio Invias 924	104 de 2022	$ 16.321.717.210	$ 4.819.355.140
2023	789	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	207	Otras transferencias de capital - convenio Invias 924	104 de 2022	$ 403.558.223	$ 403.558.223
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 16.725.275.433,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ANTICIPO OTORGADO $ 1.445.806.542,08

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	ene-23	$ 3.966.460.659,98	$ -	$ 3.966.460.659,98	$ 1.189.938.197,99	$ 2.776.522.462	$ 3.706.576.965,01	457 - 2022	$ 8.648.679.585	$ 8.648.679.585				
2	Parcial	may-23	$ 1.960.457.514,28	$ -	$ 5.926.918.174	$ 588.137.254,28	$ 1.372.320.260	$ 3.118.439.710,72	457 - 2022	$ 7.276.359.325	$ 7.276.359.325				
3	Parcial	jul-23	$ 936.668.732	$ -	$ 6.863.586.906	$ 281.000.619,64	$ 655.668.113	$ 2.837.439.091,08	457 - 2022	$ 6.620.691.213	$ 6.620.691.213				
4	Parcial	sep-23	$ 1.070.633.986	$ -	$ 7.934.220.892,53	$ 321.190.195,84	$ 749.443.790,29	$ 2.516.248.895	457 - 2022	$ 5.871.247.422	$ 5.871.247.422				
5	Parcial	oct-23	$ 513.314.472	$ -	$ 8.447.535.364,77	$ 153.994.341,67	$ 359.320.130,57	$ 2.362.254.554	457 - 2022	$ 5.511.927.292	$ 5.511.927.292				
6	Parcial	nov-23	$ 601.283.276	$ -	$ 9.048.818.641,25	$ 180.384.982,94	$ 420.898.293,54	$ 2.181.869.571	457 - 2022	$ 5.091.028.998	$ 5.091.028.998				
7	Parcial	dic-23	$ 388.105.511	$ -	$ 9.436.924.152,47	$ 116.431.653	$ 271.673.858	$ 2.065.437.917	457 - 2022	$ 4.819.355.140	$ 4.819.355.140				
TOTALES			**$ 9.436.924.152**			**$ 2.831.077.245,7**	**$ 6.605.846.907**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.629.514.105	$ -	**$ 16.629.514.105**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.856.800	$ 6.052.792	**$ 37.909.592**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 57.851.736	$ -	**$ 57.851.736**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	$ -	**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 16.719.222.641	$ 6.052.792	**$ 16.725.275.433**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: Luis Jerónimo Izquierdo Angel
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-175762 COR

Firma

Nombre: Nohemi Sofia Padron Torres
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-328519COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
7794	19/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	35.7 KG/CM2	SI	Tramo T8. RESISTENCIA OBTENIDA 3,5 MPA Y/O 35.7 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 97% A LOS 7 DIAS
7794	19/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	38,4 KG/CM2	SI	Tramo T8. RESISTENCIA OBTENIDA 3,8MPA Y/O 38,4 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 97% A LOS 7 DIAS
7470	9/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	29,9 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 2,9 MPA Y/O 29,9 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 78% A LOS 7 DIAS
7470	9/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	30,7 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 3 MPA Y/O 30,7 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 81% A LOS 7 DIAS
7538	11/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	40,7 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 4 MPA Y/O 40,7 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 107% A LOS 7 DIAS
7538	11/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	37,9 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 3,7MPA Y/O 37,9 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 100% A LOS 7 DIAS
7646	16/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	36,9 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 3,6MPA Y/O 36,9 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 97% A LOS 7 DIAS
7646	16/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	38,1 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 3,8MPA Y/O 38,1 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 100% A LOS 7 DIAS
7437	6/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM1	INV E-410-14	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM3	35,3KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 3,5MPA Y/O 35,3 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 93% A LOS 7 DIAS
7437	6/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-15	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM4	36,7 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 3,6MPA Y/O 36,7 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 97% A LOS 7 DIAS
7572	12/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM3	INV E-410-16	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM5	35,6 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 3,5 MPA Y/O 35,6 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 94% A LOS 7 DIAS
7572	12/012024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM4	INV E-410-17	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM6	36,1 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 3,5MPA Y/O 36,1 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 95% A LOS 7 DIAS
7742	16/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM5	INV E-410-18	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM7	32,7 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 3,2MPA Y/O 32,7 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 86% A LOS 7 DIAS
7742	16/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM6	INV E-410-19	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM8	36,7 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 3,6MPA Y/O 36,7 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DEL 97% A LOS 7 DIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ED-RF-RM-M-048-1	12/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM5	INV E-410-18	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM7	39,4 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 4 MPA Y/O 40,9 KG/CM2 A LOS 7 DIAS DEL PR 0+050 AL PR 0+090
ED-RF-RM-M-048-2	12/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM6	INV E-410-19	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM8	40,9 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 4 MPA Y/O 40,9 KG/CM2 A LOS 14 DIAS DEL PR 0+050 AL PR 0+090
ED-RF-RM-M-049-1	16/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM7	INV E-410-20	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM9	40,9 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 4 MPA Y/O 40,9KG/CM2 A LOS 7 DIAS DEL PR 0+050 AL PR 0+000
ED-RF-RM-M-049-2	16/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM8	INV E-410-21	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM10	44,9 KG/CM2	SI	Tramo T15. RESISTENCIA OBTENIDA 4,4 MPA Y/O 44,9 KG/CM2 A LOS 14 DIAS DEL PR 0+050 AL PR 0+000
ED-RF-RM-M-050-1	19/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM9	INV E-410-22	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM11	35,5 KG/CM2	SI	Tramo T8. RESISTENCIA OBTENIDA 3,5 MPA Y/O 35,5 KG/CM2 A LOS 7 DIAS DEL PR 0+050 AL PR 0+000
ED-RF-RM-M-051-1	22/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM10	INV E-410-23	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM12	38,1 KG/CM2	SI	Tramo T12. RESISTENCIA OBTENIDA 3,8 MPA Y/O 38,1 KG/CM2 A LOS 7 DIAS DEL PR 0+110 AL PR 0+060
ED-RF-RM-M-046-1	4/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM11	INV E-410-24	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM13	46,2 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 4,6 MPA Y/O 46,2 KG/CM2 A LOS 7 DIAS DEL PR 0+105 AL PR 0+160
ED-RF-RM-M-046-2	4/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM12	INV E-410-25	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM14	47,7 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 4,7 MPA Y/O 47,7 KG/CM2 A LOS 14 DIAS DEL PR 0+105 AL PR 0+160
ED-RF-RM-M-047-1	9/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM13	INV E-410-26	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM15	39,4 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 3,9 MPA Y/O 39,4 KG/CM2 A LOS 7 DIAS DEL PR 0+200 AL PR 0+150
ED-RF-RM-M-047-2	9/01/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM14	INV E-410-27	LOSA PAVIMENTO	1	>=38KG/CM16	43,8 KG/CM2	SI	Tramo T13. RESISTENCIA OBTENIDA 4,3 MPA Y/O 43,8 KG/CM2 A LOS 14 DIAS DEL PR 0+200 AL PR 0+150

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CESAR HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VIASCON	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO** **NTC-2871** **VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS** **NIT: 901.384.338-1** **Dirección Planta** **Kilometro 2 via cerete-san carlos**	**CODIGO:**	**LBC-002**
		VERSION:	**1**
		FECHA:	**20/02/2022**
		PAGINA	**1 DE 1**

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022

NIT: 9015989166

OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

FRENTE: TRAMO 8

TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO

ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"

CONTÁCTO:

FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	6247	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	14/10/2023	1/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**29,50**	38,6	3,8	101	105	TERCIO MEDIO
2	6247	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	14/10/2023	11/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**31,40**	41,0	4,0	108		TERCIO MEDIO
3	6247	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	14/10/2023	11/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,80**	40,3	3,9	106	105	TERCIO MEDIO
4	6247	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	14/10/2023	11/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,00**	39,2	3,8	103		TERCIO MEDIO
1	7794	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	20/01/2024	27/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,30**	35,7	3,5	94	97	TERCIO MEDIO
2	7794	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	20/01/2024	27/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**29,36**	38,4	3,8	101		TERCIO MEDIO

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871** **VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS** **NIT: 901.384.338-1** **Dirección Planta** **Kilometro 2 via cerete-san carlos**	**CODIGO:**	**LBC-002**
		VERSION:	**1**
		FECHA:	**20/02/2022**
		PAGINA	**1 DE 1**

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022
NIT: 9015989166
OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.
FRENTE: TRAMO 13
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTÁCTO:
FECHA DE INFORME: 1/02/2024

Nº MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)							
1	6264	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/10/2023	24/10/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,80**	35,0	3,4	92	94	TERCIO MEDIO	
2	6264	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/10/2023	24/10/2023	7	15,10	15,10	45,00	**27,98**	36,6	3,6	96		TERCIO MEDIO	
3	6264	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/10/2023	14/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,00**	39,2	3,8	103	**105**	TERCIO MEDIO	
4	6264	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/10/2023	14/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**31,20**	40,8	4,0	107		TERCIO MEDIO	
1	6757	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	23/11/2023	30/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,68**	34,9	3,4	92	97	TERCIO MEDIO	
2	6757	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	23/11/2023	30/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**29,82**	39,0	3,8	103		TERCIO MEDIO	
3	6757	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	23/11/2023	21/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,72**	40,2	3,9	106	**107**	TERCIO MEDIO	
4	6757	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	23/11/2023	21/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**31,50**	41,2	4,0	108		TERCIO MEDIO	
1	6894	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	30/11/2023	7/12/2023	7	15,10	15,10	45,00	**28,88**	37,7	3,7	99	96	TERCIO MEDIO	
2	6894	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	30/11/2023	7/12/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,80**	35,0	3,4	92		TERCIO MEDIO	
3	6894	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	30/11/2023	28/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**33,20**	43,4	4,3	114	**109**	TERCIO MEDIO	
4	6894	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	30/11/2023	28/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,20**	39,5	3,9	104		TERCIO MEDIO	
1	7470	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	9/01/2024	16/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**22,78**	29,8	2,9	78	80	TERCIO MEDIO	
2	7470	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	9/01/2024	16/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**23,48**	30,7	3,0	81		TERCIO MEDIO	
1	7538	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	11/01/2024	18/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**31,12**	40,7	4,0	107	103	TERCIO MEDIO	
2	7538	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	11/01/2024	18/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**29,00**	37,9	3,7	100		TERCIO MEDIO	
1	7646	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	16/01/2024	23/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,24**	36,9	3,6	97	99	TERCIO MEDIO	
2	7646	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	16/01/2024	23/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**29,12**	38,1	3,7	100		TERCIO MEDIO	
1	7712	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/01/2024	24/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,11**	36,7	3,6	97	96	TERCIO MEDIO	
2	7712	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/01/2024	24/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,61**	36,1	3,5	95		TERCIO MEDIO	
1	7823	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	22/01/2024	29/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**26,99**	35,3	3,5	93	93	TERCIO MEDIO	
2	7823	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	22/01/2024	29/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,19**	35,5	3,5	94		TERCIO MEDIO	
1	7887	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	24/01/2024	31/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**26,89**	35,1	3,4	92	94	TERCIO MEDIO	
2	7887	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	24/01/2024	31/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,99**	36,6	3,6	96		TERCIO MEDIO	
1	7923	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	25/01/2024	1/02/2024	7	15,10	15,10	45,00	**25,99**	34,0	3,3	89	91	TERCIO MEDIO	
2	7923	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	25/01/2024	1/02/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,11**	35,4	3,5	93		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZALEZ
ELABORO
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISO
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBO
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO** **NTC-2871** **VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS** **NIT: 901.384.338-1** **Dirección Planta** **Kilometro 2 via cerete-san carlos**	**CODIGO:**	**LBC-002**
		VERSION:	**1**
		FECHA:	**20/02/2022**
		PAGINA	**1 DE 1**

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022

NIT: 9015989166

OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

FRENTE: TRAMO 7

TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO

ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"

CONTÁCTO:

FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)							
1	7437	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	6/01/2024	13/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,00**	35,3	3,5	93	95	TERCIO MEDIO	
2	7437	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	6/01/2024	13/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,10**	36,7	3,6	97		TERCIO MEDIO	
1	7572	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	12/01/2024	19/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,22**	35,6	3,5	94	94	TERCIO MEDIO	
2	7572	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	12/01/2024	19/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,64**	36,1	3,5	95		TERCIO MEDIO	
1	7747	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	18/01/2024	25/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**25,00**	32,7	3,2	86	91	TERCIO MEDIO	
2	7747	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	18/01/2024	25/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,10**	36,7	3,6	97		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²)		
									Edad (Dias)		
									7	14	
ED-RF-RM-M-046-1	Km 0+105 - Km 0+160 Tramo 13	04/01/2024	11/01/2024	7	15,0	45,0	15,0	34,0	46,2		
ED-RF-RM-M-046-2		04/01/2024	18/01/2024	14	15,0	45,0	15,0	35,1		47,7	
								RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	46,2	47,7	-
								RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)	38		
								PORCENTAJE DE RESISTENCIA	121,6	125,6	-

OBSERVACIONES :

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²) Edad (Dias) 7	14	
ED-RF-RM-M-047-1	Km 0+150 - Km 0+200 Tramo 13	09/01/2024	16/01/2024	7	15,0	45,0	15,0	29,0	39,4		
ED-RF-RM-M-047-2		09/01/2024	23/01/2024	14	15,0	45,0	15,0	32,2		43,8	
								RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	39,4	43,8	-
								RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)	38		
								PORCENTAJE DE RESISTENCIA	103,8	115,2	-

OBSERVACIONES :

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²) Edad (Dias) 7	14	
ED-RF-RM-M-048-1	Km 0+050 - Km 0+090 Tramo 15	12/01/2024	19/01/2024	7	15,0	45,0	15,0	29,0	39,4		
ED-RF-RM-M-048-2		12/01/2024	26/01/2024	14	15,0	45,0	15,0	30,1		40,9	
								RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	39,4	40,9	-
								RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)	38		
								PORCENTAJE DE RESISTENCIA	103,8	107,7	-

OBSERVACIONES :

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²) Edad (Dias) 7	14	
ED-RF-RM-M-049-1	Km 0+050 - Km 0+000 Tramo 15	17/01/2024	24/01/2024	7	15,0	45,0	15,0	30,1	40,9		
ED-RF-RM-M-049-2		17/01/2024	31/01/2024	14	15,0	45,0	15,0	33,0		44,9	
								RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	40,9	44,9	-
								RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)	38		
								PORCENTAJE DE RESISTENCIA	107,7	118,1	-

OBSERVACIONES :



Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²) Edad (Dias) 7		
ED-RF-RM-M-050-1	Km 0+050 - Km 0+000 Tramo 8	20/01/2024	27/01/2024	7	15,0	45,0	15,0	26,1	35,5		
ED-RF-RM-M-050-2										-	
RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)									**35,5**	**-**	**-**
RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)									**38**		
PORCENTAJE DE RESISTENCIA									**93,4**	**-**	**-**

OBSERVACIONES :

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²) Edad (Dias) 7		
ED-RF-RM-M-051-1	Km 0+110 - Km 0+060 Tramo 12	22/01/2024	29/01/2024	7	15,0	45,0	15,0	28,0	38,1		
ED-RF-RM-M-051-2										-	
RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)									**38,1**	**-**	**-**
RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)									**38**		
PORCENTAJE DE RESISTENCIA									**100,2**	**-**	**-**

OBSERVACIONES :

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.909.592,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.909.592,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	31/5/2022	31/5/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	31/5/2022	31/1/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	31/5/2022	31/7/2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	31/5/2022	31/5/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta recibo satisfacción	5 años a partir de acta recibo satisfacción

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	31/5/2022	31/7/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25 7 2022	27 3 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 7 2022	27 3 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25 7 2022	24 9 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25 7 2022	24 9 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25 7 2022	27 3 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 7 2022	27 3 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25 7 2022	24 9 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25 7 2022	25 7 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	24	9	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	30	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	30	6	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25 / 7 / 2022	30 / 9 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 / 7 / 2022	30 / 9 / 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.345.055.086,60	25 / 7 / 2022	31 / 12 / 2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25 / 7 / 2022	25 / 7 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.017.582.629,90	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 6 y 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 836.263.771,65	25 / 7 / 2022	31 / 3 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6 y 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADOS.A.**

POLIZA No. 96-44-101172752 **FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/01/2024**

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [X]

CONTRATISTA: **CONSORCIO CORDOBA 2022**

CÉDULA/NIT: **901598916-6**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.321.717.210,00).

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($403.558.223,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.725.275.433,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Por el término del contrato y 6 meses más	$1.672.527.543.30	25/07/2022	30/09/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	$4.896.515.163.00	25/07/2022	30/09/2024

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Plazo del contrato y 3 años mas	$3.345.055.086.60	25/07/2022	31/12/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Por el término de 5 años	$5.017.582.629,90		
CALIDAD DE REVISIÓN AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Por el termino de 5 años	$9.557.040.00	25/07/2022	25/07/2027

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de seguro de Cumplimiento No. 96-44-101172752, se aprueba la garantía, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra Pública No. 104 de fecha 31 de Mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de Enero de 2024.

ANGÉLICA MARÍA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Angélica Eusse Jefe Oficina Jurídica

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADOS.A.**
POLIZA No. 96-40-101061054	**FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/01/2024**
INICIAL: [ ]	**MODIFICACION:** [X]
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CORDOBA 2022**
CÉDULA/NIT:	**901598916-6**
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.321.717.210,00).
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($403.558.223,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.725.275.433,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$334.505.508.66	25/07/2022	31/03/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
GASTOS MEDICOS	$334.505.508.66	25/07/2022	31/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024

Revisada los amparos y hecha la verificación y analisis correspondientes de la póliza de seguro de Cumplimiento No. 96-40-101061054, se aprueba la garantía, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra Pública No. 104 de fecha 31 de mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de enero de 2024.

ANGÉLICA MARIA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Angélica Eusse Jefe Oficina Jurídica

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101172752**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**24**	**09**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/07/2022**	**30/06/2024**	**$1,672,527,543.30**	**$1,632,171,721.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**25/07/2022**	**30/06/2024**	**$4,896,515,163.00**	**$4,896,515,163.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/07/2022**	**31/12/2026**	**$3,345,055,086.60**	**$3,264,343,442.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$5,017,582,629.90**	**$4,896,515,163.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/07/2022**	**25/07/2027**	**$9,557,040.00**	**$9,557,040.00**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,217,032.00	$ **********0.00	$ *****231,236.00	$ *********1,448,268.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101172752**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**24**	**09**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,217,032.00	$ **********0.00	$ *****231,236.00	$ *********1,448,268.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735834(3900)000001448268(96)20241228

REFERENCIA PAGO:

1101411173583-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	24	09	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		**NIT: 901.598.916-6**
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		**NIT: 800.096.744-5**
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-40-101061054**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**31**	**03**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$334,505,508.66**	**$326,434,344.20**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,001,032.00	$ *******3,000.00	$ *****190,766.00	$ *********1,194,798.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA



96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CORDOBA 2022 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 — **CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER — **TELÉFONO:** 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN: CLL 12 12-37 — **CIUDAD:** CERETE, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
GASTOS MEDICOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$334,505,508.66**	**$326,434,344.20**
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-40-101061054**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**31**	**03**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,001,032.00	$ *******3,000.00	$ *****190,766.00	$ *********1,194,798.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735866(3900)000001194798(96)20230725

REFERENCIA PAGO:

1101411173586-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		**NIT: 901.598.916-6**
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		**NIT: 800.096.744-5**
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101172752**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**30**	**09**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/07/2022**	**30/09/2024**	**$1,672,527,543.30**	**$1,672,527,543.30**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**25/07/2022**	**30/09/2024**	**$4,896,515,163.00**	**$4,896,515,163.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/07/2022**	**31/12/2026**	**$3,345,055,086.60**	**$3,345,055,086.60**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$5,017,582,629.90**	**$5,017,582,629.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/07/2022**	**25/07/2027**	**$9,557,040.00**	**$9,557,040.00**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,814,780.00	$ *******8,000.00	$ *****536,328.00	$ *********3,359,109.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101172752**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**30**	**09**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,814,780.00	$ *******8,000.00	$ *****536,328.00	$ *********3,359,109.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735841(3900)000003359109(96)20230725

REFERENCIA PAGO:

1101411173584-1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	30	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		**NIT: 901.598.916-6**
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		**NIT: 800.096.744-5**
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

República de Colombia

MUNICIPIO DE CERETE
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 800096744

VERSIÓN	1			
PÁGINA	1	DE	1	
FECHA	22	9	2022	

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE CERETE

DATOS GENERALES

CONTRATO 104 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B
SUPERVISOR DE CONTRATO:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	POR DEFINIR
PRESUPUESTO:	$16.321.717.210,00
ANTICIPO 30%	$4.896.515.163,00

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe invertir en forma directa y de manera de inequívoca en el objeto contractual con sujeción a este plan de manejo e inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR TOTAL	%
1	Movimiento de tierra y suministro de agregados	$ 500.000.000,00	$ 200.000.000,00					$ 700.000.000,00	14,3%
2	Compra de Materiales	$ 1.000.000.000,00	$ 550.000.000,00					$ 1.550.000.000,00	31,7%
3	Obras en concreto Hidraulico para estructuras y suministro e instalacion de pavimento	$ 1.550.000.000,00	$ 1.096.515.163,00					$ 2.646.515.163,00	54,05%
	TOTAL	**$ 3.050.000.000,00**	**$ 1.846.515.163,00**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.896.515.163,00**	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

b) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

(Firma)
Contratista: ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO
CONSORCIO CORDOBA 2022
Contratista

(Firma)
Interventoria: JHULIANA SARMIENTO GARCIA
CONSORCIO ACI-3B
R/L interventoria

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** 19/12/2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 388.105.511,22

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 104-2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16.321.717.210,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16.321.717.210,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 SEPTIEMBRE DE 2023	2 OCTUBRE DE 2023	3 NOVIEMBRE DE 2023	4 DICIEMBRE DE 2023	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	%
1. EXPLANACIONES	$632.336	3,90%	41,93%	% P	0,21%	0,85%	1,01%								100,0%
	$534.266	3,29%	$224.036	$ P	$ 33.478,24	$ 138.699,27	$ 163.180,65								
				$ E	1,30%	0,11%	0,02%	0,11%							
				% E	$ 210.504,63	$ 18.373,67	$ 3.524,23	$ 17.544,93							
2. SUBBASES	$4.183.064	25,78%	67,00%	% P	0,52%	2,92%	5,35%								87,5%
	$3.601.641	22,20%	$2.413.030	$ P	$ 83.843,39	$ 473.408,47	$ 868.874,66								
				$ E	3,98%	0,89%	0,65%	0,65%							
				% E	$ 645.964,39	$ 145.205,78	$ 107.830,80	$ 104.782,92							
3. PAVIMENTOS DE CONCRETO	$8.931.471	55,04%	61,59%	% P	1,08%	3,67%	10,33%	7,26%							75,0%
	$8.412.395	51,85%	$5.181.168	$ P	$ 175.765,05	$ 595.902,61	$ 1.676.756,81	$ 1.177.432,79							
				$ E	11,93%	1,28%	0,25%	1,41%							
				% E	$ 1.936.172,30	$ 206.944,51	$ 41.071,51	$ 229.551,16							
4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE	$1.016.323	6,26%	4,52%	% P	1,43%	3,58%	2,86%	1,43%							62,5%
	$1.580.358	9,74%	$71.438	$ P	$ 232.141.433,63	$ 580.353.584,07	$ 464.282.867,26	$ 232.141.433,63							
				$ E											
				% E											
5. TRANSPORTE	$1.265.519	7,80%	52,77%	% P	0,23%	1,07%	1,40%								50,0%
	$825.871	5,09%	$435.808	$ P	$ 37.409.861,85	$ 173.972.628,67	$ 227.283.792,19								
				$ E	0,70%	0,13%	0,05%	0,21%							
				% E	$ 114.044,20	$ 21.891,77	$ 7.434,27	$ 34.071,58							
6. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$191.866	1,18%	0,00%	% P			0,30%	0,71%							37,5%
	$164.750	1,02%		$ P			$ 49.066.928,20	$ 115.682.731,40							
				$ E											
				% E											
7. CARACTERIZACION VIAL	$5.376	0,03%	0,00%					0,03%							25,0%
	$5.376	0,03%						$ 5.376.000,00							
8. ITEMS NO PREVISTOS			29,17%	% P	0,55%	1,18%	2,18%	1,17%							12,5%
	$1.101.299	6,79%	$321.274	$ P	$ 89.852.625,84	$ 191.360.156,48	$ 352.926.361,19	$ 190.562.632,74							
				$ E	1,22%	0,13%	0,01%	0,01%							
				% E	$ 198.193,76	$ 20.863,56	$ 1.886,54	$ 2.154,92							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 16.225.955,88	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 16.225.955,88**	100%													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**4,02%**	**13,27%**	**23,43%**	**10,61%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$652.490.595**	**$2.153.596.712**	**$3.802.372.066**	**$1.721.185.402**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**52,69%**	**65,96%**	**89,39%**	**100,00%**	0,0%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$8.548.801.895**	**$10.702.398.607**	**$14.504.770.674**	**$16.225.955.882**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**2,14%**	**3,35%**	**2,63%**	**2,64%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$347.243**	**$543.513**	**$426.595**	**$429.042**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**49,94%**	**53,29%**	**55,92%**	**58,56%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$8.103.241**	**$8.646.754**	**$9.073.350**	**$9.502.391**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se presentó en septiembre la nueva programación de acuerdo al plan de contingencia presentado.

Aprueba Firma
Nombre: César Hernández López
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Aprueba Firma:
Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Inicio de actividades de limpieza de canales sector 20 de julio	viernes, 29 de diciembre de 2023	NO CUMPLIÓ
Inicio de construcción de obras hidráulicas en Media Tapa	Seguimiento próximo comité	NO CUMPLIÓ
Inicio sello de juntas T13, T15, T1, A2, A3 y A4	Seguimiento próximo comité	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Tramitar resolución de permisos ante la ANI	Seguimiento próximo comité	EN SEGUIMIENTO
Seguimiento a invasión de espacio público sector T13	Seguimiento próximo comité	CUMPLIÓ
Reparación de losas en mal estado en el tramo T5, T18 y P14	viernes, 22 de diciembre de 2023	NO CUMPLIÓ
Seguimiento a invasión de espacio público sector T8	Seguimiento próximo comité	EN SEGUIMIENTO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones del área SST, ambiental y social.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría inicia revisando los compromisos pactados en el Comité de Obra anterior.

Se tienen los siguientes porcentajes de avance de obra de acuerdo al informe semanal con corte al día jueves 4 de enero de 2024: Programado del 59,03 %, ejecutado 57,68% y atraso del 1,35%.

Teniendo en cuenta el cambio de administración no se ha podido cumplir con el compromiso del inicio de actividades del canal en el sector 20 de julio, por ende la nueva administración entrará a revisar el compromiso vencido para entregar una nueva fecha para la ejecución de esta actividad.

El contratista manifiesta que se abriran tres frentes de trabajo para las obras hidráulicas de todo el proyecto las cuales iniciaran el dia lunes 15 de enero de 2024, de igual manera confirma que tiene acero figurado aproximadamente para 1 km.

Dentro del compromiso del sello de juntas se cumplió en los frentes T15, T1, A2.

Teniendo en cuenta el cambio de administración no se ha podido revisar el tema de los permisos de la ANI, la nueva administración estará revisando este tema esta semana.

El municipio realizó la demolición del paramento de la vivienda entre el K0+015 y el K0+040 que estaba afectando el trazado de la vía a construir en el sector T13.

Teniendo en cuenta que debido a las fiestas de fin de año se generaron algunos inconvenientes en la reparación de las losas por lo cual se pactará una nueva fecha para este compromiso.

El contratista reitera la necesidad de un acuerdo entre la administración y el dueño del predio en el sector T15 en el K0+335, razón por la cual el contratista remitirá oficio al municipio para revisión y acompañamiento de los linderos de dicho predio los cuales se encuentran dentro del trazado del proyecto.

La interventoría solicita al contratista el cumplimiento de los siguientes compromisos: Entrega de informe de imprevistos pagados hasta el acta No. 7, entrega de flujo de inversiones de la reprogramación, sello de juntas de pavimento pendientes en tramos A3, A4 y T13, instalación de bordillos in situ en T1 y entrega de pólizas actualizadas.

En el sector de T12, el contratista se compromete con el suministro e instalación de 30 metros lineales y/o hasta el final del pavimento con tubería de presión de 3 pulgadas con el fin de dejar el punto de acometida de agua potable, de igual manera dicho compromiso quedará mediante acta que será firmada por el propietario del predio una vez se cumpla lo pactado en este comité.

Se le solicita al contratista tener los equipos necesarios para las liberaciones de subbase, tales como carrotanque y motoniveladora.

Se le solicita al contratista entrega de programación semanal de las actividades a realizar por tramos.

Se le solicita al municipio que se le remita a la interventoría la trazabilidad de oficios respecto a la demolición del lindero del tramo T13 en el K0+015

2/3

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de fecha de inicio de actividades de limpieza de canales sector 20 de julio	Seguimiento próximo comité	Alcaldía Municipal
Inicio de construcción de obras hidráulicas en Media Tapa con tres frentes de trabajo	lunes, 15 de enero de 2024	Contratista
Inicio sello de juntas T13, A3 y A4	Seguimiento próximo comité	Contratista
Tramitar resolución de permisos ante la ANI	Seguimiento próximo comité	Alcaldía Municipal
Entrega de informe de imprevistos	miércoles, 24 de enero de 2024	Contratista
Reparación de losas en mal estado en el tramo T5, T18 y P14	Cumplimiento próximo comité	Contratista
Oficio de solicitud de seguimiento a invasión de espacio público sector T15 al municipio	miércoles, 10 de enero de 2024	Contratista
Entrega de programación semanal por tramos	miércoles, 10 de enero de 2024	Contratista
Entrega de flujo de inversión de la reprogramación	viernes, 12 de enero de 2024	Contratista
Entrega de pólizas actualizadas	viernes, 12 de enero de 2024	Contratista y Alcaldía
Instalación de tubería hasta el final del pavimento en T12	jueves, 18 de enero de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO TORO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
NOHEMÍ PADRÓN	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CESAR HERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO CÓRDOBA 2022	
PILAR PUCHE	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	
GREGORIO CARO ENIZ	PROPIETARIO FINCA FINAL T12		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3/3

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 24/01/2024 (Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de fecha de inicio de actividades de limpieza de canales sector 20 de julio	Seguimiento próximo comité	CUMPLIÓ
Inicio de construcción de obras hidráulicas en Media Tapa con tres frentes de trabajo	lunes, 15 de enero de 2024	CUMPLIÓ FUERA DE TIEMPO
Inicio sello de juntas T13, A3 y A4	Seguimiento próximo comité	NO CUMPLIÓ
Tramitar resolución de permisos ante la ANI	Seguimiento próximo comité	CUMPLIÓ
Entrega de informe de imprevistos	miércoles, 24 de enero de 2024	A TIEMPO
Reparación de losas en mal estado en el tramo T5, T18 y P14	Cumplimiento próximo comité	NO CUMPLIÓ
Oficio de solicitud de seguimiento a invasión de espacio público sector T15 al municipio	miércoles, 10 de enero de 2024	CUMPLIÓ
Entrega de programación semanal por tramos	miércoles, 10 de enero de 2024	CUMPLIÓ
Entrega de flujo de inversión de la reprogramación	viernes, 12 de enero de 2024	CUMPLIÓ
Entrega de pólizas actualizadas	viernes, 12 de enero de 2024	CUMPLIÓ
Instalación de tubería hasta el final del pavimento en T12	jueves, 18 de enero de 2024	CUMPLIÓ PARCIALMENTE

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones del área SST, ambiental y social.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría inicia revisando los compromisos pactados en el Comité de Obra anterior.

Se tienen los siguientes porcentajes de avance de obra de acuerdo al informe semanal con corte al día jueves 18 de enero de 2024: Programado del 63,05%, ejecutado 60,54% y atraso del -2,51%.

Se cumplió con el inicio de la construcción de obras hidráulicas en el tramo T1 media tapa el día Lunes 22 de enero de 2024. Del compromiso del sello de juntas el contratista cumplió parcialmente instalando el tramo A3 y el tramo T13 que cumple con el tiempo establecido para iniciar sello, queda pendiente sello de juntas del tramo A4.

El contratista radicó oficio ante el municipio para acompañamiento de la vivienda del tramo T15 que se encuentra dentro del trazado de la vía.

El contratista entregó las pólizas actualizadas. La interventoría solicita al municipio se haga entrega de la aprobación de las mismas.

Se realizó instalación de un tramo de la tubería del tramo T12, de tal forma que quedara por fuera del pavimento, queda pendiente el tramo de tubería hasta el fin del pavimento. Una vez se realice, se levantará acta de entrega por parte del contratista, alcaldía e interventoría; y de recibo por parte del propietario del predio, donde se descargarán las aguas lluvias del tramo T13 y T12.

La interventoría solicita al municipio que se haga concientización ambiental para los tramos T13 y T12 para explicarles que no se deben enviar las aguas negras al pavimento, debido que cada casa debe tener su pozo séptico para manejo de aguas residuales.

El contratista manifiesta que en 15 días entregará la reparación de losas pendientes.

La interventoría solicita al contratista que se haga cumplimiento del Plan de manejo de transito - PMT entregado y con los EPP (elementos de protección personal) de todos sus trabajadores en campo.

La interventoría solicita al municipio se haga copia de los oficios del proceso de corrección de linderos del tramo T13.

2/3

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio de limpieza de canales de 20 de julio	miércoles, 6 de marzo de 2024	Alcaldía municipal
Inicio sello de juntas A4.	sábado, 27 de enero de 2024	Contratista
Reparación de losas en mal estado en el tramo T18 , A1 y P14	jueves, 8 de febrero de 2024	Contratista
Oficio aprobación de pólizas actualizadas	jueves, 25 de enero de 2024	Alcaldía municipal
Seguimiento aprobación carril de aceleración y desaceleración ante la ANI	Seguimiento próximo comité	Alcaldía municipal
Entrega de informe de imprevistos	jueves, 25 de enero de 2024	Contratista
Corrección de empozamientos T5 y P14	miércoles, 31 de enero de 2024	Contratista
Respuesta linderos tramo T15	Seguimiento próximo comité	Alcaldía municipal
Terminar instalación tubería de agua potable del tramo T12	sábado, 27 de enero de 2024	Contratista
Jornada de concientización	seguimiento próximo comité	Alcaldía municipal
Cumplimiento de PMT y EPP del personal	miércoles, 24 de enero de 2024	Contratista
Entrega oficios linderos T13	viernes, 26 de enero de 2024	Alcaldía municipal

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO TORO NIÑO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B	
CESAR HERNANDEZ LOPEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO ACI-3B	
JORGE ASSIS	SECRETARIO DE PLANEACION	ALCALDIA MUNICIPAL	
SOFIA PADRON TORRES	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3/3

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022, CONVENIO 924-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación compromisos reunión anterior.

Gestión social y ambiental (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Avance de obra

Temas varios

1/3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presente comité de seguimiento inicia con la lectura y verificación de los compromisos pactados en la anterior reunión y en el comité de obra No. 20 con fecha 24 de enero de 2024.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Inicio de actividades de limpieza de canales sector 20 de julio	viernes, 24 de noviembre de 2023	NO CUMPLIÓ
Inicio de construcción de obras hidráulicas en Media Tapa	viernes, 1 de diciembre de 2023	CUMPLIÓ FUERA DE TIEMPO
Inicio sello de juntas en Chuchurubi (del K0+115 al K0+370),T4, T5, T1, T2, T7.	Seguimiento próximo comité	CUMPLIÓ
Entrega de balance No 3	martes, 21 de noviembre de 2023	CUMPLIÓ
Seguimiento a invasión de espacio público sector T13	Seguimiento próximo comité	CUMPLIÓ
Reinicio de actividad de instalación de bordillos	viernes, 1 de diciembre de 2023	CUMPLIÓ
Respuesta a derecho de petición tramo T18	martes, 21 de noviembre de 2023	CUMPLIÓ
Inicio de limpieza de canales de 20 de julio	miércoles, 6 de marzo de 2024	A TIEMPO
Inicio sello de juntas A4.	sábado, 27 de enero de 2024	NO CUMPLIÓ
Reparación de losas en mal estado en el tramo T18 , A1 y P14	jueves, 8 de febrero de 2024	A TIEMPO
Oficio aprobación de pólizas actualizadas	jueves, 25 de enero de 2024	CUMPLIÓ FUERA DE TIEMPO
Seguimiento aprobación carril de aceleración y desaceleración ante la ANI	Seguimiento próximo comité	EN SEGUIMIENTO
Entrega de informe de imprevistos	jueves, 25 de enero de 2024	NO CUMPLIÓ
Corrección de empozamientos T5 y P14	miércoles, 31 de enero de 2024	A TIEMPO
Respuesta linderos tramo T15	Seguimiento próximo comité	EN SEGUIMIENTO
Terminar instalación tubería de agua potable del tramo T12	sábado, 27 de enero de 2024	CUMPLIÓ
Jornada de concientización	seguimiento próximo comité	EN SEGUIMIENTO
Cumplimiento de PMT y EPP del personal	miércoles, 24 de enero de 2024	EN SEGUIMIENTO
Entrega oficios linderos T13	viernes, 26 de enero de 2024	NO CUMPLIÓ

AVANCE DE OBRA

El proyecto presenta los siguientes porcentajes de obra a corte del día jueves 25 de enero de 2024 programado del 65.14%, porcentaje de obra ejecutado de 62% y atraso 3.14%.

El secretario de planeación municipal indica que se abrió un proceso de licitación para realizar las obras de limpieza de canales en el sector de 20 de julio. La supervisión de Invias solicita al municipio que informe de manera formal mediante un comunicado sobre la apertura del proceso de licitación donde se incluya el anexo técnico.

La interventoría le solicita al contratista abrir un tercer frente de obra para agilizar la ejecución de las obras sobre todo en el tema de los canales.

En cuanto al atraso presentado por el contratista se le da un plazo de 15 días para subsanarlo, se revisaran los compromisos de la apertura de los nuevos frentes de obras hidráulicas y de un nuevo frente en obras de pavimento hidraulico, teniendo en cuenta dicho cumplimiento se revisará el alcance del proyecto para definir la prioridad de las obras a culminar.

2/3

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio de limpieza de canales de 20 de julio	miércoles, 6 de marzo de 2024	Alcaldía
Reparación de losas en mal estado en el tramo T18 , A1 y P14	jueves, 8 de febrero de 2024	Contratista
Seguimiento aprobación carril de aceleración y desaceleración ante la ANI	Seguimiento próximo comité	Alcaldía
Corrección de empozamientos T5 y P14	miércoles, 31 de enero de 2024	Contratista
Respuesta linderos tramo T15	Seguimiento próximo comité	Alcaldía
Jornada de concientización	Seguimiento próximo comité	Alcaldía
Cumplimiento de PMT y EPP del personal	Seguimiento próximo comité	Contratista
Apertura de nuevos frentes de obras hidráulicas	lunes, 5 de febrero de 2024	Contratista
Entrega de informe de imprevistos	martes, 6 de febrero de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Leonardo Toro	Director de Interventoría	Consorcio ACI - 3B	
Cesar Hernandez	Representante Legal	Consorcio Córdoba 2022	
Jorge Assis	Secretario Planeación Municipal	Alcaldía Municipal de Cereté	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3/3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA JNU512, MARCA TOYOTA-HILUX - MODELO 2020	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA	QWP-11G	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA	WZK74E	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Enero 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI - 3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-feb-24 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2021 Y 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 6.500.000,00	$ 452.400	V	SANITAS	9462569992	$ 260.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - Cotorra	$ 1.840.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				40%		$ 1.840.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9462569992	$ 73.600,00	PORVENIR	9462569992	$ 294.400	$ 73.600			
5	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría-Martinez 104	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9462569992	$ 184.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 736.000	$ 184.000			
6	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9462569992	$ 128.000,00	PROTECCION	9462569992	$ 512.000	$ 128.000			
7	Lina Maria Ramos Benavides	1.071.355.692	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	MUTUAL SER	9462569992	$ 128.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 512.000	$ 235.800			
8	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 1.750.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%		$ 1.750.000,00	$ 121.800	V	NUEVA EPS	9462569992	$ 70.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 280.000	$ 70.000			
9	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	Profesional Ambiental	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%		$ 2.000.000,00	$ 278.400	V	SANITAS	9462569992	$ 160.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 640.000	$ 160.000			
15	María José Teherán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 2.100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.100.000,00	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9462569992	$ 84.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 336.000	$ 84.000			
16	Ivanna Rocio Charraquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 1.015.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.015.000,00	$ 6.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9462569992	$ 52.000,00	PORVENIR	9462569992	$ 208.000	$ 52.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 27.780.000,00																																		$ 26.992.500,00	$ 3.673.210,00				$ 3.534.600,00			$ 7.744.000,00	$ 3.642.400,00			

El Interventor adjunta la certificación de fecha feb-24 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2202259765 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-I
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Enero 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021
MES INFORME MENSUAL: ene-24
INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No: 104 de 2021 y 001 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 242.430.000,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 1.588.100.773,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Principal	$ 100.000.000,00
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	Nación	Adicional No. 1	$ 730.945.286,00
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 109.747.200,00
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 124.572.800,00
2023	193523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 2	$ 230.000.000,00
2023	193523	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 2	$ 20.000.000,00
TOTAL						**3.145.796.059,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.145.796.059,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 242.430.000,00**			
1	**ene-22**	$ 456.300,00	$ 86.697,00	$ 542.997,00	$ 542.997,00	$ 542.997,00	1084921 - 30/12/2021	$ 241.887.003,00	$ 3.145.253.062,00		
2	**feb-22**	$ 39.956.820,00	$ 7.591.796,00	$ 47.548.616,00	$ 47.548.616,00	$ 47.548.616,00	1084921 - 30/12/2021	$ 194.338.387,00	$ 3.097.704.446,00		
3	**mar-22**	$ 61.066.163,00	$ 11.602.571,00	$ 72.668.734,00	$ 72.668.734,00	$ 72.668.734,00	1084921 - 30/12/2021	$ 121.669.653,00	$ 3.025.035.712,00		
4	**abr-22**	$ 88.928.160,00	$ 16.896.350,00	$ 105.824.510,00	$ 105.824.510,00	$ 105.824.510,00	1084921 - 30/12/2021	$ 15.845.143,00	$ 2.919.211.202,00		
5	**may-22**	$ 13.315.246,00	$ 2.529.897,00	$ 15.845.143,00	$ 15.845.143,00	$ 15.845.143,00	1084921 - 30/12/2021	$ -	$ 2.903.366.059,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 100.000.000,00**			
5	**may-22**	$ 78.131.354,00	$ 14.844.957,00	$ 92.976.311,00	$ 92.976.311,00	$ 92.976.311,00	280222 - 23/02/2022	$ 7.023.689,00	$ 2.810.389.748,00		
6	**jun-22**	$ 5.902.260,00	$ 1.121.429,00	$ 7.023.689,00	$ 7.023.689,00	$ 7.023.689,00	280222 - 23/02/2022	$ -	$ 2.803.366.059,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 1.588.100.773,00**			
6	**jun-22**	$ 94.536.797,00	$ 17.961.992,00	$ 112.498.789,00	$ 112.498.789,00	$ 112.498.789,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.475.601.984,00	$ 2.690.867.270,00		
7	**jul-22**	$ 101.134.200,00	$ 19.215.498,00	$ 120.349.698,00	$ 120.349.698,00	$ 120.349.698,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.355.252.286,00	$ 2.570.517.572,00		
8	**ago-22**	$ 113.107.700,00	$ 21.490.463,00	$ 134.598.163,00	$ 134.598.163,00	$ 134.598.163,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.220.654.123,00	$ 2.435.919.409,00		
9	**sep-22**	$ 105.579.070,00	$ 20.060.023,30	$ 125.639.093,00	$ 125.639.093,00	$ 125.639.093,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.095.015.030,00	$ 2.310.280.316,00		
10	**oct-22**	$ 121.465.020,00	$ 23.078.354,00	$ 144.543.374,00	$ 144.543.374,00	$ 144.543.374,00	280222 - 23/02/2022	$ 950.471.656,00	$ 2.165.736.942,00		
11	**nov-22**	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	280222 - 23/02/2022	$ 801.197.223,00	$ 2.016.462.509,00		
12	**dic-22**	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	280222 - 23/02/2022	$ 651.922.790,00	$ 1.867.188.076,00		
13	**ene-23**	$ 125.412.700,00	$ 23.828.413,00	$ 149.241.113,00	$ 149.241.113,00	$ 149.241.113,00	280222 - 23/02/2022	$ 502.681.677,00	$ 1.717.946.963,00		
14	**feb-23**	$ 126.773.730,00	$ 24.087.009,00	$ 150.860.739,00	$ 150.860.739,00	$ 150.860.739,00	280222 - 23/02/2022	$ 351.820.938,00	$ 1.567.086.224,00		
15	**mar-23**	$ 127.781.080,00	$ 24.278.405,20	$ 152.059.485,00	$ 152.059.485,00	$ 152.059.485,00	280222 - 23/02/2022	$ 199.761.453,00	$ 1.415.026.739,00		
16	**abr-23**	$ 126.132.000,00	$ 23.965.080,00	$ 150.097.080,00	$ 150.097.080,00	$ 150.097.080,00	280222 - 23/02/2022	$ 49.664.373,00	$ 1.264.929.659,00		
17	**may-23**	$ 41.734.765,55	$ 7.929.605,46	$ 49.664.371,00	$ 49.664.371,00	$ 49.664.371,00	280222 - 23/02/2022	$ 2,00	$ 1.215.265.288,00		
18	**jun-23**	$ 1,65	$ 0,32	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,00	280222 - 23/02/2022	$ -	$ 1.215.265.286,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 109.747.200,00**			
17	**may-23**	$ 75.832.284,45	$ 14.408.134,05	$ 90.240.419,00	$ 90.240.419,00	$ 90.240.419,00	1197722 - 16/11/2022	$ 19.506.781,00	$ 1.125.024.869,00		
18	**jun-23**	$ 16.392.252,62	$ 3.114.528,00	$ 19.506.781,00	$ 19.506.781,00	$ 19.506.781,00	1197722 - 16/11/2022	$ -	$ 1.105.518.088,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 124.572.800,00**			
18	**jun-23**	$ 98.480.245,73	$ 18.711.246,69	$ 117.191.492,00	$ 117.191.492,00	$ 117.191.492,00	1197722 - 16/11/2022	$ 7.381.308,00	$ 988.326.596,00		
19	**jul-23**	$ 6.202.779,83	$ 1.178.528,17	$ 7.381.308,00	$ 7.381.308,00	$ 7.381.308,00	1197722 - 16/11/2022	$ -	$ 980.945.288,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 730.945.286,00**			
19	**jul-23**	$ 97.360.220,17	$ 18.498.441,84	$ 115.858.662,00	$ 115.858.662,00	$ 115.858.662,00	1197722 - 16/11/2022	$ 615.086.624,00	$ 865.086.624,00		
20	**ago-23**	$ 110.892.900,00	$ 21.069.651,00	$ 131.962.551,00	$ 131.962.551,00	$ 131.962.551,00	1197722 - 16/11/2022	$ 483.124.073,00	$ 733.124.073,00		
21	**sep-23**	$ 103.549.900,00	$ 19.674.481,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	1197722 - 16/11/2022	$ 359.899.692,00	$ 609.899.692,00		
22	**oct-23**	$ 103.549.900,00	$ 19.674.481,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	1197722 - 16/11/2022	$ 236.675.311,00	$ 486.675.311,00		
23	**nov-23**	$ 89.508.160,00	$ 17.006.550,40	$ 106.514.710,00	$ 106.514.710,00	$ 106.514.710,00	1197722 - 16/11/2022	$ 130.160.601,00	$ 380.160.601,00		
24	**dic-23**	$ 109.343.060,00	$ 20.775.181,40	$ 130.118.241,00	$ 130.118.241,00	$ 130.118.241,00	1197722 - 16/11/2022	$ 42.360,00	$ 250.042.360,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 230.000.000,00**			
25	**ene-24**	$ 76.810.900,00	$ 14.594.071,00	$ 91.404.971,00	$ 91.404.971,00	$ 91.404.971,00	193523 - 27/10/2023	$ 138.595.029,00	$ 158.637.389,00		
TOTALES		**$ 2.510.217.370,00**	**$ 476.941.301,00**	**$ 2.987.158.670,00**	**$ 2.987.158.670,00**	**$ 91.404.971,00**		**$ 138.595.029,00**	**$ 158.637.389,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 2.128.605.570	$ 404.435.058	$ 2.533.040.628
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 381.611.800	$ 72.506.242	$ 454.118.042
*			
VALOR TOTAL	$ 2.510.217.370	$ 476.941.300	$ 2.987.158.670

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matricula No. : 54202-145218 NTS

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 1-feb-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE MARZO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.895.796.059,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Calidad del servicio	30%	$ 579.159.232,00	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027
Cumplimiento de Servicio	10%	$ 193.053.077,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.106.155,00	27	ENE	2022	29	AGOS	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551–6
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/10/2022

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 289.579.212,00	27	1	2022	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 579.159.212,00	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 868.738.818,00	1	7	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	1	2022	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	1	7	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

	FECHA	1-feb-24
		(Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta			
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	1	2022	1/10/2024			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/10/2024			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	1	2022	31	3	2027	
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	31	3	2024	31	3	2029	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 3 de enero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, debido a la suscripción de la prórroga 4 y adición 1 fechada 29/12/2023, esta interventoría solicita al Consorcio Córdoba 2022 se haga entrega de los siguientes documentos contractuales requeridos por la modificación al contrato mencionada:

1. Reprogramación de obra
2. Reprogramación de inversiones
3. Actualización de pólizas.

Así mismo, se requiere la entrega urgente de:

4. Laboratorios de densidades en campo y viguetas de concreto del mes de diciembre de 2023.
5. Informe de imprevistos del valor cobrado hasta acta N° 7.

Por favor atender los cinco (05) puntos solicitados anteriormente en un plazo máximo de 3 días.

Por otro lado, se requiere que se reinicien al 100% las actividades de obra y aumentar los rendimientos para subsanar los atrasos presentados en las semanas anteriores, toda vez, que el día de hoy solo se retomó con un frente de instalación de bordillos en el tramo T18.

Se le recuerda al contratista que se debe cumplir con los equipos mínimos requeridos en obra, ya que; la semana pasada para los 3 frentes en los que se estaba trabajando excavaciones e instalación de afirmado, solo se contaba con 2 retrocargadores y 1 minicargador, había ausencia de vibrocompactador, motoniveladora y carro tanque.

CONSORCIO ACI-3B

Por favor atender el reinicio de las actividades en un plazo máximo de un (01) día.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
3/01/2024 4:41:35 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - LUIS ANTONIO RHENALS OTERO - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Montería, 05 de enero de 2024

OFIC-CC2022-121

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de reprogramación

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de la reprogramación ajustada a la prorroga número 4 del contrato de la referencia.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

Montería, 10 de enero de 2023

OFIC-CC2022-123

SEÑORES
ING. JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Inconveniente social Tramo T15 – (CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4) Corregimiento de Martínez.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de informar que la reja de la casa que se encuentra en la esquina de la intersección de los tramos T8 y T15 del proyecto de la referencia, está fuera de sus linderos (Ver imagen siguiente).



Con la línea roja mostramos aproximadamente borde de vía.


Esto evidencia que dicha reja imposibilita la construcción de la vía.

Por lo anterior comedidamente solicitamos su acompañamiento para que se resuelva el inconveniente informado y así poder proceder con la construcción del tramo en asunto.

Informamos que este tramo no se ejecutará hasta que la situación con la comunidad no sea resuelta, y enviado el soporte por escrito de la resolución del mismo, esto con el fin de evitar inconvenientes posteriores con el o los propietarios.

Se Anexa:

1. Ubicación en Satelital del tramo

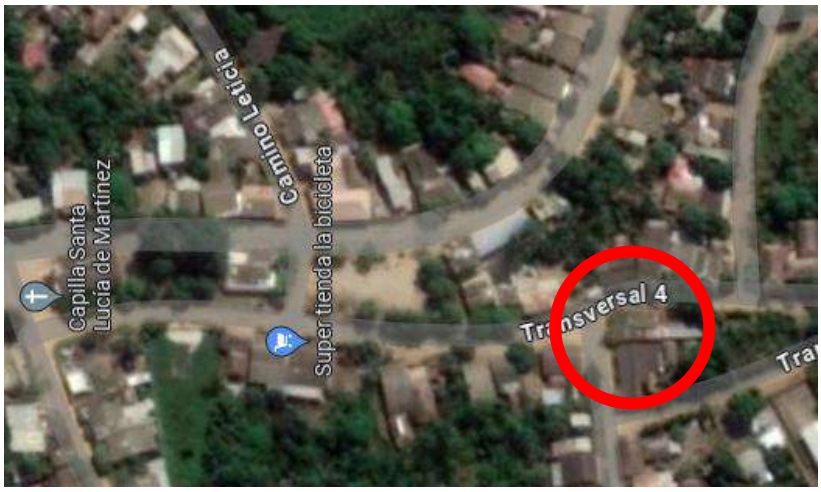

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

Montería, 10 de enero de 2024

OFIC-CC2022-122

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de reprogramación firmada

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de la reprogramación firmada ajustada a la prorroga número 4 del contrato de la referencia.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

Alcaldía de Cereté	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REPROGRAMACIÓN DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	05/01/2024

UNIDAD EJECUTORA: CERETÉ - CÓRDOBA

CONTRATO No :	104 - 2022	**PLAZO INICIAL:**	1 MES
OBJETO: '	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:**	25 DE JULIO DE 2022
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022	**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):**	$ 16.321.717.210,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2276-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):**	$ 16.725.275.433,00

					CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 03 Y ADICIÓN 1**		**PORCENTAJE DE AVANCE HASTA 31/12/2023**			**PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN**		
											57,50%			**42,50%**		
Nº	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**ACUMULADO**			**REPROGRAMACION**		
		GENERAL	**PARTICULAR**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		**CANTIDAD**	**VALOR**	
				SECCIÓN 1. MARTINEZ												
1.00 EXPLANACIONES																
1,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	343,20	$ 46.419,00	$ 15.931.001,00	1.271,21	$ 59.008.120,60		$ -		1.271,21	$ 59.008.120,60	
1,02	210.2.2	210,00		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	36.093,00	$ 12.130,00	$ 437.808.090,00	30.304,88	$ 367.598.194,40	17.446,23	$ 211.622.769,90		12.858,65	$ 155.975.424,50	
1,03	220,10	220,00		TERRAPLENES	M3	3.356,00	$ 32.116,00	$ 107.781.296,00	2.051,74	$ 65.893.713,96		$ -		2.051,74	$ 65.893.713,96	
							Subtotal	**$ 561.520.387,00**		**$ 492.500.028,96**		**$ 211.622.769,90**			**$ 280.877.259,06**	
2.00 SUBBASES TRAMO 1																
2,01	320,30	320,00		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	2.025,00	$ 237.760,00	$ 481.464.000,00	1.797,90	$ 427.468.704,00	610,66	$ 145.190.521,60		1.187,24	$ 282.278.182,40	
2,02	311,10	311,00		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	3.374,00	$ 143.812,00	$ 485.221.688,00	2.996,50	$ 430.932.478,24	1.364,73	$ 196.264.550,76		1.631,77	$ 234.667.927,48	
2,03	231,10	231,00		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	14.570,00	$ 6.275,00	$ 91.426.750,00	-	$ -		$ -		-	$ -	
							Subtotal	**$ 1.058.112.438,00**		**$ 858.401.182,24**		**$ 341.455.072,36**			**$ 516.946.109,88**	
3.00 PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO 1																
3,01	500,10	500,00		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	2.464,00	$ 800.073,00	$ 1.971.379.872,00	2.397,20	$ 1.917.934.195,53	845,08	$ 676.125.690,84		1.552,12	$ 1.241.808.504,69	
3,02	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	43.475,00	$ 8.664,00	$ 376.667.400,00	27.383,21	$ 237.248.144,26	10.741,41	$ 93.063.618,17		16.641,80	$ 144.184.526,09	
3,03	672,40	672,00		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3.673,00	$ 77.878,00	$ 286.045.894,00	2.836,26	$ 220.882.256,28	308,00	$ 23.986.424,00		2.528,26	$ 196.895.832,28	
							Subtotal	**$ 2.634.093.166,00**		**$ 2.376.064.596,07**		**$ 793.175.733,01**			**$ 1.582.888.863,06**	
4.00 SUBBASES TRAMO 2																
4,01	320,30	320,00		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3.519,00	$ 237.760,00	$ 836.677.440,00	3.339,91	$ 794.097.001,60	2.571,79	$ 611.468.790,40		768,12	$ 182.628.211,20	
4,02	311,10	311,00		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	10.556,00	$ 143.812,00	$ 1.518.079.472,00	10.019,72	$ 1.440.955.972,64	7.827,68	$ 1.125.714.316,16		2.192,04	$ 315.241.656,48	
4,03	231,10	231,00		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	24.081,00	$ 6.275,00	$ 151.108.275,00	-	$ -		$ -		-	$ -	
							Subtotal	**$ 2.505.865.187,00**		**$ 2.235.052.974,24**		**$ 1.737.183.106,56**			**$ 497.869.867,68**	
5.00 PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO 2																
5,01	500,10	500,00		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	4.303,00	$ 800.073,00	$ 3.442.714.119,00	4.463,13	$ 3.570.829.808,49	3.422,40	$ 2.738.169.835,20		1.040,73	$ 832.659.973,29	
5,02	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	71.854,00	$ 8.664,00	$ 622.543.056,00	48.691,76	$ 421.865.408,64	35.198,47	$ 304.959.544,08		13.493,29	$ 116.905.864,56	
5,03	672,40	672,00		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	7.768,00	$ 77.878,00	$ 604.956.304,00	6.242,71	$ 486.169.769,38	5.741,33	$ 447.123.297,74		501,38	$ 39.046.471,64	
							Subtotal	**$ 4.670.213.479,00**		**$ 4.478.864.986,51**		**$ 3.490.252.677,02**			**$ 988.612.309,49**	
6.00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT																
6,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO.	M3	168,00	$ 46.419,00	$ 7.798.392,00	106,40	$ 4.938.981,60	36,00	$ 1.671.084,00		70,40	$ 3.267.897,60	
6,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	49,00	$ 199.064,00	$ 9.754.136,00	32,00	$ 6.370.048,00	-	$ -		32,00	$ 6.370.048,00	
6,03	630,60	630,00		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	7,00	$ 578.848,00	$ 4.051.936,00	4,13	$ 2.390.642,24	2,8845	$ 1.669.687,06		1,25	$ 720.955,18	
6,04	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	90,00	$ 685.840,00	$ 61.725.600,00	42,40	$ 29.079.616,00	40,40	$ 27.707.936,00		2,00	$ 1.371.680,00	
6,05	630,70	630,00		CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO).	M3	95,00	$ 380.000,00	$ 36.100.000,00	50,4	$ 19.152.000,00	5,658	$ 2.150.040,00		44,74	$ 17.001.960,00	
6,06	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	5.977,00	$ 8.664,00	$ 51.784.728,00	4.332,14	$ 37.533.660,96	4.332,14	$ 37.533.660,96		-	$ -	
6,07	610,20	610,00		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63,00	$ 84.048,00	$ 5.295.024,00	20,56	$ 1.728.026,88	8,40	$ 706.003,20		12,16	$ 1.022.023,68	
							Subtotal	**$ 176.509.816,00**		**$ 101.192.975,68**		**$ 71.438.411,22**			**$ 29.754.564,46**	
7.00 CANALES Y CUNETAS EN CONCRETO PARA DRENAJE DE AGUAS SEGÚN DISEÑO																
7,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO.	M3	1.754,00	$ 46.419,00	$ 81.418.926,00	3.299,62	$ 153.165.015,29		$ -		3.299,62	$ 153.165.015,29	
7,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	78,00	$ 199.064,00	$ 15.526.992,00	14,00	$ 2.786.896,00		$ -		14,00	$ 2.786.896,00	
7,03	630,60	630,00		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	25,00	$ 578.848,00	$ 14.471.200,00	131,12	$ 75.900.569,94		$ -		131,12	$ 75.900.569,94	
7,04	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	410,00	$ 685.840,00	$ 281.194.400,00	1401,48	$ 961.193.838,00		$ -		1.401,48	$ 961.193.838,00	
7,05	630,70	630,00		CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO).	M3	538,00	$ 380.000,00	$ 204.440.000,00	7,00	$ 2.660.000,00		$ -		7,00	$ 2.660.000,00	
7,06	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	24.381,00	$ 8.664,00	$ 211.236.984,00	38.511,46	$ 333.663.301,50		$ -		38.511,46	$ 333.663.301,50	
7,07	610,20	610,00		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	370,00	$ 85.203,00	$ 31.525.110,00	692,53	$ 59.005.633,59		$ -		692,53	$ 59.005.633,59	
							Subtotal	**$ 839.813.612,00**		**$ 1.588.375.254,32**		**$ -**			**$ 1.588.375.254,32**	
8.00 TRANSPORTE																
8,01	900,20	900,00		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	M3/KM	619.590,00	$ 1.812,00	$ 1.122.697.080,00	439.306,92	$ 796.024.139,04	229.342,27	$ 415.568.187,80		209.964,65	$ 380.455.951,24	
							Subtotal	**$ 1.122.697.080,00**		**$ 796.024.139,04**		**$ 415.568.187,80**			**$ 380.455.951,24**	
9.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 03 Y ADICIÓN 1		57,50%		42,50%	
											ACUMULADO		REPROGRAMACION	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9,01	710,10	710,00		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	U	192,00	$ 563.245,00	$ 108.143.040,00	192,00	$ 108.143.040,00		$ -	192,00	$ 108.143.040,00
9,02	700,10	700,00		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	18.702,00	$ 2.092,00	$ 39.124.584,00	18.670,05	$ 39.057.744,60		$ -	18.670,05	$ 39.057.744,60
9,03	700,30	700,00		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M2	608,00	$ 44.490,00	$ 27.049.920,00				$ -	-	$ -
							Subtotal	$ 174.317.544,00		$ 147.200.784,60		$ -		$ 147.200.784,60
10.00 CARACTERIZACIÓN VIAL														
10,01				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	KM	6,23	$ 700.000,00	$ 4.361.000,00	6,23	$ 4.361.000,00		$ -	6,23	$ 4.361.000,00
							Subtotal	$ 4.361.000,00		$ 4.361.000,00		$ -		$ 4.361.000,00
11.00 ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1				CONFORMACION DE ESPALDAR DE BORDILLO	M3	-	$ 153.898,00	$ -	2.950,47	$ 454.071.201,21		$ -	2.950,47	$ 454.071.201,21
NP-2				REJILLA METALICA Y/O TAPA METALICA (SUMIDERO, CANAL DE PASO)	ML	-	$ 392.315,00	$ -	98,30	$ 38.564.564,50		$ -	98,30	$ 38.564.564,50
NP-3	230.1P	230		MEJORAMIENTO DE LA SUBBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (PIEDRA RAJÓN)	M3	-	$ 195.902,00	$ -	2.433,20	$ 476.669.202,48	355,68	$ 69.678.423,36	2.077,52	$ 406.990.779,12
NP-4	230.1P	230		RESALTO PLASTICO	UND.	-	$ 1.257.439,00	$ -	23,00	$ 28.921.097,00		$ -	23,00	$ 28.921.097,00
NP-5				PIEDRA PEGADA	M2	-	$ 134.757,00	$ -	155,69	$ 20.980.317,33		$ -	155,69	$ 20.980.317,33
NP-6				TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DIAMETRO 0.90 M	M	-	$ 871.490,00	$ -	14,00	$ 12.200.860,00		$ -	14,00	$ 12.200.860,00
NP-7				TUBERIA DE DESAGUE 6"	M	-	$ 61.870,00	$ -	114,00	$ 7.053.180,00		$ -	114,00	$ 7.053.180,00
NP-8				BORDILLO FUNDIDO IN SITU DE 0.2MX0.5M	M	-	$ 150.531,00	$ -	192,00	$ 28.901.952,00		$ -	192,00	$ 28.901.952,00
							Subtotal	$ -		$ 1.067.362.374,52		$ 69.678.423,36		$ 997.683.951,16
							SUBTOTAL TRAMOS MARTÍNEZ	$ 13.747.503.709,00		$ 14.145.400.296,18		$ 7.130.374.381,23		$ 7.015.025.914,95
II	**BARRIO CHUCHURIBÍ**													
1.00 EXPLANACIONES														
1,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	87,00	$ 46.419,00	$ 4.038.453,00	408,051	$ 18.941.319,37		$ -	408,05	$ 18.941.319,37
1,02	210.2.2	210,00		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.785,00	$ 12.130,00	$ 58.042.050,00	4.186,90	$ 50.787.097,00	4.186,90	$ 50.787.097,00	-	$ -
1,03	220,10	220,00		TERRAPLENES	M3	272,00	$ 32.116,00	$ 8.735.552,00	0	$ -		$ -	-	$ -
							Subtotal	$ 70.816.055,00		$ 69.728.416,37		$ 50.787.097,00		$ 18.941.319,37
2.00 SUBBASES														
2,01	320,30	320,00		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.204,00	$ 233.955,00	$ 281.681.820,00	1.087,50	$ 254.426.062,50	1.087,50	$ 254.426.062,50	-	$ -
2,02	311,10	311,00		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	2.007,00	$ 140.006,00	$ 280.992.042,00	1.812,50	$ 253.760.875,00	1.812,50	$ 253.760.875,00	-	$ -
2,03	231,10	231,00		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	8.990,00	$ 6.275,00	$ 56.412.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
							Subtotal	$ 619.086.112,00		$ 508.186.937,50		$ 508.186.937,50		$ -
3.00 PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO														
3,01	500,10	500,00		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	1.461,00	$ 800.073,00	$ 1.168.906.653,00	1.450,00	$ 1.160.105.850,00	1.450,00	$ 1.160.105.850,00	-	$ -
3,02	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	26.825,00	$ 8.664,00	$ 232.411.800,00	17.356,72	$ 150.378.622,08	17.356,72	$ 150.378.622,08	-	$ -
3,03	672,40	672,00		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.900,00	$ 77.878,00	$ 225.846.200,00	2914,65	$ 226.987.112,70	2855	$ 222.341.690,00	59,65	$ 4.645.422,70
							Subtotal	$ 1.627.164.653,00		$ 1.537.471.584,78		$ 1.532.826.162,08		$ 4.645.422,70
4.00 TRANSPORTE														
4,01	900,20	900,00		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	M3/KM	78.819,80	$ 1.812,00	$ 142.821.478,00	48.103,25	$ 87.163.089,00	48.103,25	$ 87.163.089,00	-	$ -
							Subtotal	$ 142.821.478,00		$ 87.163.089,00		$ 87.163.089,00		$ -
5.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
5,01	710,10	710,00		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	U	15,00	$ 563.245,00	$ 8.448.675,00	15,00	$ 8.448.675,00		$ -	15,00	$ 8.448.675,00
5,02	700,10	700,00		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	4.350,00	$ 2.092,00	$ 9.100.200,00	4.350,00	$ 9.100.200,00		$ -	4.350,00	$ 9.100.200,00
							Subtotal	$ 17.548.875,00		$ 17.548.875,00		$ -		$ 17.548.875,00
6.00 CARACTERIZACIÓN VIAL														
6,01				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	KM	1,45	$ 700.000	$ 1.015.000,00	1,45	$ 1.015.000,00		$ -	1,45	$ 1.015.000,00
							Subtotal	$ 1.015.000,00		$ 1.015.000,00		$ -		$ 1.015.000,00
7.00 ANDENES														
7,01	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3		$ 685.840	$ -	3,86	$ 2.646.176,47		$ -	3,86	$ 2.646.176,47
7,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3		$ 199.064,00	$ -	0,20	$ 40.449,80		$ -	0,20	$ 40.449,80
							Subtotal	$ -		$ 2.686.626,27		$ -		$ 2.686.626,27
8.00 ITEMS NO PREVISTOS														
NP-5	230.1P	230		MEJORAMIENTO DE LA SUBBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (PIEDRA RAJÓN)	M3		$ 195.902,00		486,65	$ 95.335.708,30	486,65	$ 95.335.708,30	-	$ -
NP-6				CONFORMACION DE ESPALDAR DE BORDILLO	M3	-	$ 153.898,00	$ -	1.019,80	$ 156.945.180,40	1019,80	$ 156.945.180,40	-	$ -
NP-7				PIEDRA PEGADA	M2	-	$ 134.757,00	$ -	31,60	$ 4.258.321,20		$ -	31,60	$ 4.258.321,20
NP-8				TUBERIA DE DESAGUE 6"	M	-	$ 61.870,00	$ -	61,00	$ 3.774.070,00		$ -	61,00	$ 3.774.070,00
							Subtotal	$ -		$ 260.313.279,90		$ 252.280.888,70		$ 8.032.391,20
							SUBTOTAL TRAMOS CHUCHURUBÍ	$ 2.478.452.173,00		$ 2.484.113.808,82		$ 2.431.244.174,28		$ 52.869.634,54
AJUSTE AL PESO								$ -						
							SUBTOTAL OBRAS	$ 16.225.955.882,00		$ 16.629.514.105,00		$ 9.561.618.555,51		$ 7.067.895.549,49
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 57.851.736,00		$ 57.851.736,00				$ 57.851.736,00
				REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 31.856.800,00		$ 31.856.800,00		$ 31.856.800,00		$ -
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 6.052.792,00		$ 6.052.792,00		$ 6.052.792,00		$ -
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 16.321.717.210,00		$ 16.725.275.433,00		$ 9.599.528.147,51		$ 7.125.747.285,49

VALOR TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

					CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 03 Y ADICIÓN 1		57,50%		42,50%	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			ACUMULADO		REPROGRAMACION	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE						
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACIÓN		A=	20,0%						
					IMPREVISTO		I=	5,0%						
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					UTILIDAD		U=	5,0%						
NOTA 4: El presupuesto original fue realizado y aprobado por INVIAS en un formato diferente al que se establece en el portal de Colombia Compra Eficiente, por lo cual el municipio lo ajustó a lo exigido.					TOTAL A.I.U		A.I.U.=	30,0%						

ING. CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R.L CONSORCIO CORDOBA 2022
CONTRATISTA DE OBRA

LEONARDO TORO NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ACI-3B

Montería, 10 de enero de 2023

OFIC-CC2022-123

SEÑORES
ING. JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Inconveniente social Tramo T15 – (CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4) Corregimiento de Martínez.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de informar que la reja de la casa que se encuentra en la esquina de la intersección de los tramos T8 y T15 del proyecto de la referencia, está fuera de sus linderos (Ver imagen siguiente).



Con la línea roja mostramos aproximadamente borde de vía.


Esto evidencia que dicha reja imposibilita la construcción de la vía.

Por lo anterior comedidamente solicitamos su acompañamiento para que se resuelva el inconveniente informado y así poder proceder con la construcción del tramo en asunto.

Informamos que este tramo no se ejecutará hasta que la situación con la comunidad no sea resuelta, y enviado el soporte por escrito de la resolución del mismo, esto con el fin de evitar inconvenientes posteriores con el o los propietarios.

Se Anexa:

1. Ubicación en Satelital del tramo

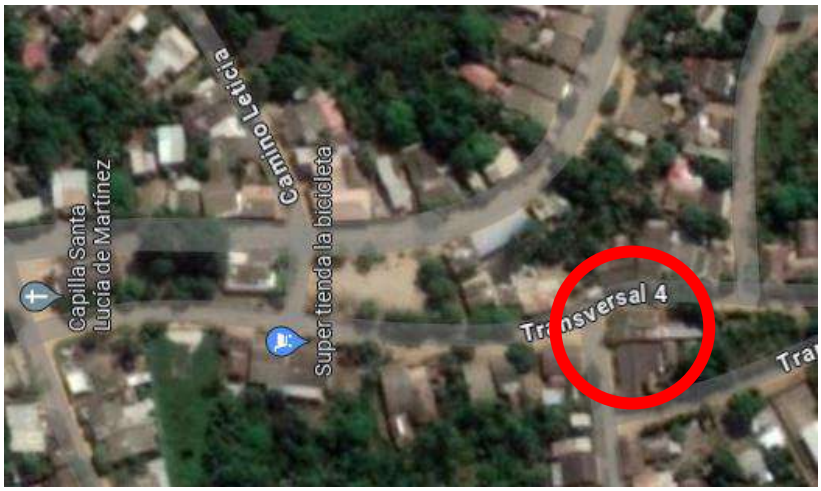

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-24-000333

Cerete, 10 de enero de 2024

Señor(a)
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com

Asunto: Aprobación de reprogramación al 31 de Marzo de 2024-Prórroga No 04.

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Respetado Ingeniero,

Teniendo en cuenta nuestros compromisos de seguimiento y supervisión del contrato de la referencia y una vez revisada la documentación referente a la reprogramaciòn de la prorroga No 04 y adición No 01 del contrato de obra No 104 de 2022; SE APRUEBA por parte de la interventoria dicha reprogramaciòn y se realizara el seguimiento con base en este documento. Se remite el archivo con la firma respectiva por favor devolver firmado con copia al Municipio.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Folios: 1
Anexo: 1
Nombre anexos: REPROGRAMACION DE OBRA A 31 DE MARZO DE 2024 - PRORROGA N° 04.pdf

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
10/01/2024 10:59:57 a. m.

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - SAID BITAR CASTILLA - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REPROGRAMACIÓN DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
Alcaldía de Cereté		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

		FECHA	05/01/2024

UNIDAD EJECUTORA: CERETÉ - CÓRDOBA

CONTRATO No :	104 - 2022	**PLAZO INICIAL:**	1 MES
OBJETO: '	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:**	25 DE JULIO DE 2022
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022	**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):**	$ 16.321.717.210,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2276-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):**	$ 16.725.275.433,00

					CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 03 Y ADICIÓN 1		PORCENTAJE DE AVANCE HASTA 31/12/2023				PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN		
											57,50%				42,50%		
		ESPECIFICACIONES									ACUMULADO				REPROGRAMACION		
Nº	ITEM DE PAGO	GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR	
				SECCIÓN 1. MARTINEZ													
1.00 EXPLANACIONES																	
1,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	343,20	$ 46.419,00	$ 15.931.001,00	1.271,21	$ 59.008.120,60		$ -			1.271,21	$ 59.008.120,60	
1,02	210.2.2	210,00		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	36.093,00	$ 12.130,00	$ 437.808.090,00	30.304,88	$ 367.598.194,40	17.446,23	$ 211.622.769,90			12.858,65	$ 155.975.424,50	
1,03	220,10	220,00		TERRAPLENES	M3	3.356,00	$ 32.116,00	$ 107.781.296,00	2.051,74	$ 65.893.713,96		$ -			2.051,74	$ 65.893.713,96	
							Subtotal	$ 561.520.387,00		$ 492.500.028,96		$ 211.622.769,90				$ 280.877.259,06	
2.00 SUBBASES TRAMO 1																	
2,01	320,30	320,00		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	2.025,00	$ 237.760,00	$ 481.464.000,00	1.797,90	$ 427.468.704,00	610,66	$ 145.190.521,60			1.187,24	$ 282.278.182,40	
2,02	311,10	311,00		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	3.374,00	$ 143.812,00	$ 485.221.688,00	2.996,50	$ 430.932.478,24	1.364,73	$ 196.264.550,76			1.631,77	$ 234.667.927,48	
2,03	231,10	231,00		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	14.570,00	$ 6.275,00	$ 91.426.750,00	-	$ -		$ -			-	$ -	
							Subtotal	$ 1.058.112.438,00		$ 858.401.182,24		$ 341.455.072,36				$ 516.946.109,88	
3.00 PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO 1																	
3,01	500,10	500,00		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	2.464,00	$ 800.073,00	$ 1.971.379.872,00	2.397,20	$ 1.917.934.195,53	845,08	$ 676.125.690,84			1.552,12	$ 1.241.808.504,69	
3,02	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	43.475,00	$ 8.664,00	$ 376.667.400,00	27.383,21	$ 237.248.144,26	10.741,41	$ 93.063.618,17			16.641,80	$ 144.184.526,09	
3,03	672,40	672,00		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3.673,00	$ 77.878,00	$ 286.045.894,00	2.836,26	$ 220.882.256,28	308,00	$ 23.986.424,00			2.528,26	$ 196.895.832,28	
							Subtotal	$ 2.634.093.166,00		$ 2.376.064.596,07		$ 793.175.733,01				$ 1.582.888.863,06	
4.00 SUBBASES TRAMO 2																	
4,01	320,30	320,00		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3.519,00	$ 237.760,00	$ 836.677.440,00	3.339,91	$ 794.097.001,60	2.571,79	$ 611.468.790,40			768,12	$ 182.628.211,20	
4,02	311,10	311,00		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	10.556,00	$ 143.812,00	$ 1.518.079.472,00	10.019,72	$ 1.440.955.972,64	7.827,68	$ 1.125.714.316,16			2.192,04	$ 315.241.656,48	
4,03	231,10	231,00		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	24.081,00	$ 6.275,00	$ 151.108.275,00	-	$ -		$ -			-	$ -	
							Subtotal	$ 2.505.865.187,00		$ 2.235.052.974,24		$ 1.737.183.106,56				$ 497.869.867,68	
5.00 PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO 2																	
5,01	500,10	500,00		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	4.303,00	$ 800.073,00	$ 3.442.714.119,00	4.463,13	$ 3.570.829.808,49	3.422,40	$ 2.738.169.835,20			1.040,73	$ 832.659.973,29	
5,02	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	71.854,00	$ 8.664,00	$ 622.543.056,00	48.691,76	$ 421.865.408,64	35.198,47	$ 304.959.544,08			13.493,29	$ 116.905.864,56	
5,03	672,40	672,00		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	7.768,00	$ 77.878,00	$ 604.956.304,00	6.242,71	$ 486.169.769,38	5.741,33	$ 447.123.297,74			501,38	$ 39.046.471,64	
							Subtotal	$ 4.670.213.479,00		$ 4.478.864.986,51		$ 3.490.252.677,02				$ 988.612.309,49	
6.00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT																	
6,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO.	M3	168,00	$ 46.419,00	$ 7.798.392,00	106,40	$ 4.938.981,60	36,00	$ 1.671.084,00			70,40	$ 3.267.897,60	
6,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	49,00	$ 199.064,00	$ 9.754.136,00	32,00	$ 6.370.048,00	-	$ -			32,00	$ 6.370.048,00	
6,03	630,60	630,00		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	7,00	$ 578.848,00	$ 4.051.936,00	4,13	$ 2.390.642,24	2,8845	$ 1.669.687,06			1,25	$ 720.955,18	
6,04	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	90,00	$ 685.840,00	$ 61.725.600,00	42,40	$ 29.079.616,00	40,40	$ 27.707.936,00			2,00	$ 1.371.680,00	
6,05	630,70	630,00		CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO).	M3	95,00	$ 380.000,00	$ 36.100.000,00	50,4	$ 19.152.000,00	5,658	$ 2.150.040,00			44,74	$ 17.001.960,00	
6,06	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	5.977,00	$ 8.664,00	$ 51.784.728,00	4.332,14	$ 37.533.660,96	4.332,14	$ 37.533.660,96			-	$ -	
6,07	610,20	610,00		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63,00	$ 84.048,00	$ 5.295.024,00	20,56	$ 1.728.026,88	8,40	$ 706.003,20			12,16	$ 1.022.023,68	
							Subtotal	$ 176.509.816,00		$ 101.192.975,68		$ 71.438.411,22				$ 29.754.564,46	
7.00 CANALES Y CUNETAS EN CONCRETO PARA DRENAJE DE AGUAS SEGÚN DISEÑO																	
7,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO.	M3	1.754,00	$ 46.419,00	$ 81.418.926,00	3.299,62	$ 153.165.015,29		$ -			3.299,62	$ 153.165.015,29	
7,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	78,00	$ 199.064,00	$ 15.526.992,00	14,00	$ 2.786.896,00		$ -			14,00	$ 2.786.896,00	
7,03	630,60	630,00		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	25,00	$ 578.848,00	$ 14.471.200,00	131,12	$ 75.900.569,94		$ -			131,12	$ 75.900.569,94	
7,04	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	410,00	$ 685.840,00	$ 281.194.400,00	1401,48	$ 961.193.838,00		$ -			1.401,48	$ 961.193.838,00	
7,05	630,70	630,00		CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO).	M3	538,00	$ 380.000,00	$ 204.440.000,00	7,00	$ 2.660.000,00		$ -			7,00	$ 2.660.000,00	
7,06	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	24.381,00	$ 8.664,00	$ 211.236.984,00	38.511,46	$ 333.663.301,50		$ -			38.511,46	$ 333.663.301,50	
7,07	610,20	610,00		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	370,00	$ 85.203,00	$ 31.525.110,00	692,53	$ 59.005.633,59		$ -			692,53	$ 59.005.633,59	
							Subtotal	$ 839.813.612,00		$ 1.588.375.254,32		$ -				$ 1.588.375.254,32	
8.00 TRANSPORTE																	
8,01	900,20	900,00		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	M3/KM	619.590,00	$ 1.812,00	$ 1.122.697.080,00	439.306,92	$ 796.024.139,04	229.342,27	$ 415.568.187,80			209.964,65	$ 380.455.951,24	
							Subtotal	$ 1.122.697.080,00		$ 796.024.139,04		$ 415.568.187,80				$ 380.455.951,24	
9.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																	

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 03 Y ADICIÓN 1		57,50%		42,50%	
											ACUMULADO		REPROGRAMACION	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9,01	710,10	710,00		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	U	192,00	$ 563.245,00	$ 108.143.040,00	192,00	$ 108.143.040,00		$ -	192,00	$ 108.143.040,00
9,02	700,10	700,00		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	18.702,00	$ 2.092,00	$ 39.124.584,00	18.670,05	$ 39.057.744,60		$ -	18.670,05	$ 39.057.744,60
9,03	700,30	700,00		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M2	608,00	$ 44.490,00	$ 27.049.920,00				$ -	-	$ -
							Subtotal	**$ 174.317.544,00**		**$ 147.200.784,60**		**$ -**		**$ 147.200.784,60**
10.00 CARACTERIZACIÓN VIAL														
10,01				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	KM	6,23	$ 700.000,00	$ 4.361.000,00	6,23	$ 4.361.000,00		$ -	6,23	$ 4.361.000,00
							Subtotal	**$ 4.361.000,00**		**$ 4.361.000,00**		**$ -**		**$ 4.361.000,00**
11.00 ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1				CONFORMACION DE ESPALDAR DE BORDILLO	M3	-	$ 153.898,00	$ -	2.950,47	$ 454.071.201,21		$ -	2.950,47	$ 454.071.201,21
NP-2				REJILLA METALICA Y/O TAPA METALICA (SUMIDERO, CANAL DE PASO)	ML	-	$ 392.315,00	$ -	98,30	$ 38.564.564,50		$ -	98,30	$ 38.564.564,50
NP-3	230.1P	230		MEJORAMIENTO DE LA SUBBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (PIEDRA RAJÓN)	M3	-	$ 195.902,00	$ -	2.433,20	$ 476.669.202,48	355,68	$ 69.678.423,36	2.077,52	$ 406.990.779,12
NP-4	230.1P	230		RESALTO PLASTICO	UND.	-	$ 1.257.439,00	$ -	23,00	$ 28.921.097,00		$ -	23,00	$ 28.921.097,00
NP-5				PIEDRA PEGADA	M2	-	$ 134.757,00	$ -	155,69	$ 20.980.317,33		$ -	155,69	$ 20.980.317,33
NP-6				TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DIAMETRO 0.90 M	M	-	$ 871.490,00	$ -	14,00	$ 12.200.860,00		$ -	14,00	$ 12.200.860,00
NP-7				TUBERIA DE DESAGUE 6"	M	-	$ 61.870,00	$ -	114,00	$ 7.053.180,00		$ -	114,00	$ 7.053.180,00
NP-8				BORDILLO FUNDIDO IN SITU DE 0.2MX0.5M	M	-	$ 150.531,00	$ -	192,00	$ 28.901.952,00		$ -	192,00	$ 28.901.952,00
							Subtotal	**$ -**		**$ 1.067.362.374,52**		**$ 69.678.423,36**		**$ 997.683.951,16**
							SUBTOTAL TRAMOS MARTÍNEZ	**$ 13.747.503.709,00**		**$ 14.145.400.296,18**		**$ 7.130.374.381,23**		**$ 7.015.025.914,95**
II				**BARRIO CHUCHURIBÍ**										
1.00 EXPLANACIONES														
1,01	600.2.3	600,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	87,00	$ 46.419,00	$ 4.038.453,00	408,051	$ 18.941.319,37		$ -	408,05	$ 18.941.319,37
1,02	210.2.2	210,00		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.785,00	$ 12.130,00	$ 58.042.050,00	4.186,90	$ 50.787.097,00	4.186,90	$ 50.787.097,00	-	-
1,03	220,10	220,00		TERRAPLENES	M3	272,00	$ 32.116,00	$ 8.735.552,00	0	$ -		$ -	-	-
							Subtotal	**$ 70.816.055,00**		**$ 69.728.416,37**		**$ 50.787.097,00**		**$ 18.941.319,37**
2.00 SUBBASES														
2,01	320,30	320,00		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.204,00	$ 233.955,00	$ 281.681.820,00	1.087,50	$ 254.426.062,50	1.087,50	$ 254.426.062,50	-	-
2,02	311,10	311,00		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	2.007,00	$ 140.006,00	$ 280.992.042,00	1.812,50	$ 253.760.875,00	1.812,50	$ 253.760.875,00	-	-
2,03	231,10	231,00		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	8.990,00	$ 6.275,00	$ 56.412.250,00	-	$ -		$ -	-	-
							Subtotal	**$ 619.086.112,00**		**$ 508.186.937,50**		**$ 508.186.937,50**		**$ -**
3.00 PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO														
3,01	500,10	500,00		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	1.461,00	$ 800.073,00	$ 1.168.906.653,00	1.450,00	$ 1.160.105.850,00	1.450,00	$ 1.160.105.850,00	-	-
3,02	640,10	640,00		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	26.825,00	$ 8.664,00	$ 232.411.800,00	17.356,72	$ 150.378.622,08	17.356,72	$ 150.378.622,08	-	-
3,03	672,40	672,00		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.900,00	$ 77.878,00	$ 225.846.200,00	2914,65	$ 226.987.112,70	2855	$ 222.341.690,00	59,65	$ 4.645.422,70
							Subtotal	**$ 1.627.164.653,00**		**$ 1.537.471.584,78**		**$ 1.532.826.162,08**		**$ 4.645.422,70**
4.00 TRANSPORTE														
4,01	900,20	900,00		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	M3/KM	78.819,80	$ 1.812,00	$ 142.821.478,00	48.103,25	$ 87.163.089,00	48.103,25	$ 87.163.089,00	-	$ -
							Subtotal	**$ 142.821.478,00**		**$ 87.163.089,00**		**$ 87.163.089,00**		**$ -**
5.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
5,01	710,10	710,00		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	U	15,00	$ 563.245,00	$ 8.448.675,00	15,00	$ 8.448.675,00		$ -	15,00	$ 8.448.675,00
5,02	700,10	700,00		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	4.350,00	$ 2.092,00	$ 9.100.200,00	4.350,00	$ 9.100.200,00		$ -	4.350,00	$ 9.100.200,00
							Subtotal	**$ 17.548.875,00**		**$ 17.548.875,00**		**$ -**		**$ 17.548.875,00**
6.00 CARACTERIZACIÓN VIAL														
6,01				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	KM	1,45	$ 700.000	$ 1.015.000,00	1,45	$ 1.015.000,00		$ -	1,45	$ 1.015.000,00
							Subtotal	**$ 1.015.000,00**		**$ 1.015.000,00**		**$ -**		**$ 1.015.000,00**
7.00 ANDENES														
7,01	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3		$ 685.840	$ -	3,86	$ 2.646.176,47		$ -	3,86	$ 2.646.176,47
7,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3		$ 199.064,00	$ -	0,20	$ 40.449,80		$ -	0,20	$ 40.449,80
							Subtotal	**$ -**		**$ 2.686.626,27**		**$ -**		**$ 2.686.626,27**
8.00 ITEMS NO PREVISTOS														
NP-5	230.1P	230		MEJORAMIENTO DE LA SUBBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (PIEDRA RAJÓN)	M3		$ 195.902,00		486,65	$ 95.335.708,30	486,65	$ 95.335.708,30	-	$ -
NP-6				CONFORMACION DE ESPALDAR DE BORDILLO	M3	-	$ 153.898,00	$ -	1.019,80	$ 156.945.180,40	1019,80	$ 156.945.180,40	-	$ -
NP-7				PIEDRA PEGADA	M2	-	$ 134.757,00	$ -	31,60	$ 4.258.321,20		$ -	31,60	$ 4.258.321,20
NP-8				TUBERIA DE DESAGUE 6"	M	-	$ 61.870,00	$ -	61,00	$ 3.774.070,00		$ -	61,00	$ 3.774.070,00
							Subtotal	**$ -**		**$ 260.313.279,90**		**$ 252.280.888,70**		**$ 8.032.391,20**
							SUBTOTAL TRAMOS CHUCHURUBÍ	**$ 2.478.452.173,00**		**$ 2.484.113.808,82**		**$ 2.431.244.174,28**		**$ 52.869.634,54**
AJUSTE AL PESO								$ -						
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 16.225.955.882,00**		**$ 16.629.514.105,00**		**$ 9.561.618.555,51**		**$ 7.067.895.549,49**
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				**$ 57.851.736,00**		**$ 57.851.736,00**				**$ 57.851.736,00**
				REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				**$ 31.856.800,00**		**$ 31.856.800,00**		**$ 31.856.800,00**		**$ -**
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 6.052.792,00**		**$ 6.052.792,00**		**$ 6.052.792,00**		**$ -**
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 16.321.717.210,00**		**$ 16.725.275.433,00**		**$ 9.599.528.147,51**		**$ 7.125.747.285,49**

VALOR TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 03 Y ADICIÓN 1		57,50%		42,50%	
											ACUMULADO		REPROGRAMACION	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE						
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACIÓN		A=	20,0%						
					IMPREVISTO		I=	5,0%						
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					UTILIDAD		U=	5,0%						
NOTA 4: El presupuesto original fue realizado y aprobado por INVIAS en un formato diferente al que se establece en el portal de Colombia Compra Eficiente, por lo cual el municipio lo ajustó a lo exigido.					TOTAL A.I.U		A.I.U.=	30,0%						

ING. CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R.L CONSORCIO CORDOBA 2022
CONTRATISTA DE OBRA

LEONARDO TORO NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ACI-3B

Montería, 11 de enero de 2024

OFIC-CC2022-124

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de flujo de inversiones

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega del flujo de inversiones del contrato de la referencia.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-24-000485

Cerete, 11 de enero de 2024

Señor(a)
Dionicio Daniel Ricardo Doria
Secretario de Planeación e Infraestructura
ALCALDÍA DE CERETÉ
planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Asunto: RESPUESTA A OFICIO SPI-0752-2023-EXT DEL 20/12/2023 “REMISIÓN OFICIO DEFENSORÍA DEL PUEBLO”

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, de acuerdo a lo solicitado por ustedes y por la defensoría del pueblo en el radicado 20230060145801691: *“esta entidad tuvo conocimiento a través de petición escrita suscrita por el señor Donaldo Miguel Morales, identificado con la C.C. N.º 6880769, de la siguiente situación:"...me informe acerca de la pavimentación del callejón Mata Perro perteneciente al corregimiento de Martínez la cual, el día 8 de marzo 2022 en la socialización de la pavimentación de Martínez el señor Alcalde comunico que había 2 kilómetros para ese callejón. Últimamente por información de la presidente de la JAC me informa que solo son 300 metros…" Adjunto petición.”,* esta interventoría se permite responder lo siguiente a todas las preguntas:

1. El callejón “mata perro” dentro del contrato de la referencia está nombrado como “T14 - Carrera 5a Entre Calle 7a Sector Mataperro”, dentro de la información contractual cuenta con 200 metros lineales de pavimento de 20 cm de espesor.
2. *“¿Cuándo se va hacer la pavimentación de los 2 kilómetros o 300 m del callejón mata perro?”*. Dentro de la programación suministrada por el contratista este tramo está para la última semana de febrero.
3. *“¿Cuándo se va a hacer la adecuación o pavimentación de una parte del callejón la esmeralda, ya que parte del callejón iniciaron la pavimentación?:* Ya se retomaron las actividades de pavimentación de este tramo nombrado T15 - Calle 7a Entre Carrera 6 Y Transversal 4.

CONSORCIO ACI-3B

4. *"¿Estas pavimentaciones hechas en Martínez y las ceibitas no requieren prueba de resistencia en la mezcla o material a usar?":* Para los tramos de Martínez dentro del contrato de obra de la referencia N° 104 de 2022 se hicieron unos diseños iniciales, los cuales fueron revisados y aprobados por los especialistas de nuestra interventoría, así mismo, como control de calidad se realizan ensayos de densidad en campo para las capas de afirmado y subbase granular; y en los días de fundida se toman muestras de concreto para la elaboración de viguetas, las cuales se fallan en laboratorio para verificar que se cumpla con la resistencia de diseño del concreto hidráulico para pavimento.
5. "*¿En esta pavimentación no lleva la capa de impermeabilizar? Ya que por lo general son tierras bajas y en el pasado fueron humedales":* Como se mencionó en el punto anterior, los tramos de vía del proyecto del contrato 104 de 2022 cuentan con diseños iniciales hidráulicos, geotécnicos y estructurales, los cuales fueron revisados y aprobados por los especialistas de la interventoría. Para poder elaborarlos, previamente se tomaron muestras de suelo aleatorias como exploración geotécnica y poder realizar los ensayos de laboratorio; dicho diseño estableció el tipo de estructura que se requería. Adicionalmente, durante las excavaciones, en los puntos donde se evidencia nivel freático alto o se evidencian fallos en la subrasante, se realiza un mejoramiento de la subrasante con piedra rajón, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de la misma.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
11/01/2024 11:23:11 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-24-000486

Cerete, 13 de enero de 2024

Señor(a)
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com

Asunto: Aprobación y remisión de flujo de inversiones

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Respetado ingeniero,

Una vez revisado el flujo de inversiones presentado por el CONSORCIO CORDOBA 2022, este es acorde a la programación de obra aprobada; por lo tanto se emite la aprobación respectiva y se adjuntan firmados por la interventoria con copia al Municipio de Cereté para su conocimiento.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Folios: 1
Anexo: 2
Nombre anexos: REPROGRAMACION FIRMADA PRORROGA 04.pdf
FLUJO INVERSIONES HASTA MARZO DE 2024.pdf

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
13/01/2024 7:50:45 a. m.

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - SAID BITAR CASTILLA - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 15 de enero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: ATRASO EN OBRA Y SEGUIMIENTO COMITÉ 19

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría solicita al Consorcio Córdoba 2022 se cumpla con los compromisos pactados para el día de hoy 15/01/24 en el comité de obra N° 19 realizado el día 10/01/24 en nuestras oficinas:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	10/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de fecha de inicio de actividades de limpieza de canales sector 20 de julio	Seguimiento próximo comité	Alcaldía Municipal
Inicio de construcción de obras hidráulicas en Media Tapa con tres frentes de trabajo	lunes, 15 de enero de 2024	Contratista
Inicio sello de juntas T13, A3 y A4	Seguimiento próximo comité	Contratista
Tramitar resolución de permisos ante la ANI	Seguimiento próximo comité	Alcaldía Municipal
Entrega de informe de imprevistos	miércoles, 24 de enero de 2024	Contratista
Reparación de losas en mal estado en el tramo T5, T18 y P14	Cumplimiento próximo comité	Contratista
Oficio de solicitud de seguimiento a invasión de espacio público sector T15 al municipio	miércoles, 10 de enero de 2024	Contratista
Entrega de programación semanal por tramos	miércoles, 10 de enero de 2024	Contratista
Entrega de flujo de inversión de la reprogramación	viernes, 12 de enero de 2024	Contratista
Entrega de pólizas actualizadas	viernes, 12 de enero de 2024	Contratista y Alcaldía
Instalación de tubería hasta el final del pavimento en T12	jueves, 18 de enero de 2024	Contratista

CONSORCIO ACI-3B

1. Inicio de construcción de obras hidráulicas en media tapa el día 15/01/2024: **estas obras representan el 9,5% del valor del contrato, razón por lo cual es indispensable cumplir con el compromiso pactado para ayudar a subsanar el atraso actual del proyecto el cual es del -3,36%;** el cual se considera muy alto, teniendo en cuenta que solo han transcurrido dos semanas desde la prórroga concedida y reprogramación de obra entregada.
2. Entrega de programación por tramos: Se requiere dicha programación para poder atender a las preguntas que a diario realiza la comunidad y para programación interna de nuestro personal, toda vez, que la programación entregada y aprobada está por ítems y/o GPP tal como está en el presupuesto inicial, el cual, no especifica tramos.

Por favor atender en un plazo máximo de un (01) día.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/01/2024 11:47:14 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - SAID BITAR CASTILLA - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Montería, 15 de enero de 2024

OFIC-CC2022-125

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de pólizas

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de las pólizas correspondientes a la prorroga N° 4 y adicional N° 1 del contrato de la referencia.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-40-101061054**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**31**	**03**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$334,505,508.66**	**$326,434,344.20**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,001,032.00	$ *******3,000.00	$ *****190,766.00	$ *********1,194,798.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA



96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CORDOBA 2022 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 — **CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER — **TELÉFONO:** 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN: CLL 12 12-37 — **CIUDAD:** CERETE, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
GASTOS MEDICOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$334,505,508.66**	**$326,434,344.20**
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/07/2022**	**31/03/2024**	**$836,263,771.65**	**$816,085,860.50**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-40-101061054**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**31**	**03**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,001,032.00	$ *******3,000.00	$ *****190,766.00	$ *********1,194,798.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735866(3900)000001194798(96)20230725

REFERENCIA PAGO:

1101411173586-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		**NIT: 901.598.916-6**
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		**NIT: 800.096.744-5**
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101172752**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**24**	**09**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/07/2022**	**30/06/2024**	**$1,672,527,543.30**	**$1,632,171,721.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**25/07/2022**	**30/06/2024**	**$4,896,515,163.00**	**$4,896,515,163.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/07/2022**	**31/12/2026**	**$3,345,055,086.60**	**$3,264,343,442.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$5,017,582,629.90**	**$4,896,515,163.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**25/07/2022**	**25/07/2027**	**$9,557,040.00**	**$9,557,040.00**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,217,032.00	$ **********0.00	$ *****231,236.00	$ *********1,448,268.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101172752**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**01**	**2024**	**25**	**07**	**2022**	**00:00**	**24**	**09**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	**NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	**NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROCOP

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,217,032.00	$ **********0.00	$ *****231,236.00	$ *********1,448,268.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735834(3900)000001448268(96)20241228

REFERENCIA PAGO:

1101411173583-4

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	24	09	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		**NIT: 901.598.916-6**
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		**NIT: 800.096.744-5**
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 15 de enero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: ATRASO EN OBRA Y SEGUIMIENTO COMITÉ 19

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría solicita al Consorcio Córdoba 2022 se cumpla con los compromisos pactados para el día de hoy 15/01/24 en el comité de obra N° 19 realizado el día 10/01/24 en nuestras oficinas:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	10/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de fecha de inicio de actividades de limpieza de canales sector 20 de julio	Seguimiento próximo comité	Alcaldía Municipal
Inicio de construcción de obras hidráulicas en Media Tapa con tres frentes de trabajo	lunes, 15 de enero de 2024	Contratista
Inicio sello de juntas T13, A3 y A4	Seguimiento próximo comité	Contratista
Tramitar resolución de permisos ante la ANI	Seguimiento próximo comité	Alcaldía Municipal
Entrega de informe de imprevistos	miércoles, 24 de enero de 2024	Contratista
Reparación de losas en mal estado en el tramo T5, T18 y P14	Cumplimiento próximo comité	Contratista
Oficio de solicitud de seguimiento a invasión de espacio público sector T15 al municipio	miércoles, 10 de enero de 2024	Contratista
Entrega de programación semanal por tramos	miércoles, 10 de enero de 2024	Contratista
Entrega de flujo de inversión de la reprogramación	viernes, 12 de enero de 2024	Contratista
Entrega de pólizas actualizadas	viernes, 12 de enero de 2024	Contratista y Alcaldía
Instalación de tubería hasta el final del pavimento en T12	jueves, 18 de enero de 2024	Contratista

CONSORCIO ACI-3B

1. Inicio de construcción de obras hidráulicas en media tapa el día 15/01/2024: **estas obras representan el 9,5% del valor del contrato, razón por lo cual es indispensable cumplir con el compromiso pactado para ayudar a subsanar el atraso actual del proyecto el cual es del -3,36%;** el cual se considera muy alto, teniendo en cuenta que solo han transcurrido dos semanas desde la prórroga concedida y reprogramación de obra entregada.
2. Entrega de programación por tramos: Se requiere dicha programación para poder atender a las preguntas que a diario realiza la comunidad y para programación interna de nuestro personal, toda vez, que la programación entregada y aprobada está por ítems y/o GPP tal como está en el presupuesto inicial, el cual, no especifica tramos.

Por favor atender en un plazo máximo de un (01) día.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/01/2024 11:47:14 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - SAID BITAR CASTILLA - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Montería, 15 de enero de 2024

OFIC-CC2022-125

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de pólizas

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de las pólizas correspondientes a la prorroga N° 4 y adicional N° 1 del contrato de la referencia.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

Montería, 16 de enero de 2024

OFIC-CC2022-127

Señores
Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P.
Carrera 14 Nº 48C-55
Montería - Córdoba
surtigas@surtigas.com.co


Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Redes sin cumplimiento de norma.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, actualmente nos encontramos en la ejecución del proyecto de la referencia en el corregimiento de Martínez.

Con preocupación hemos evidenciado que las profundidades de instalación de las redes de gas son menores a 0.50m, y no cuentan con cinta de señalización y/o capa de arena que indique de la existencia de dichas redes, las cuales ustedes administran (ver imagen)

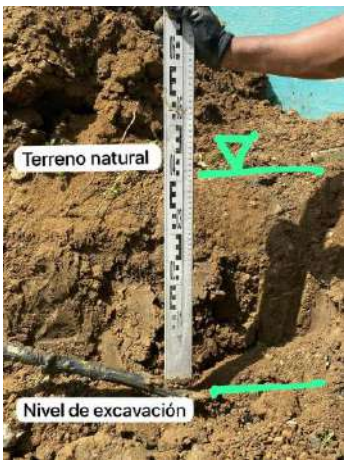

Por lo anterior, el Consorcio Córdoba 2022 NO se hará responsable de los daños ocasionados y no aceptará que se hagan cobros a propietarios de las viviendas en daños tuberías que no cumplan con las profundidades y/o señalización según la normativa colombiana.

Se Anexa: Listado de tramos del proyecto.

BARRIOS	Nomenclatura Catastral
ALBERTO SAIBIS	CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE
	CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE
20 DE JULIO	CARRERA 7AC ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2
	DIAGONAL 3 ENTRE CARRERA 7AC Y CARRERA 7a
	CALLE 2aE ENTRE CARRERA 7aC Y CARRERA 7aA
LA LUCHA	CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10
	VARIANTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aA
MARTINEZ	CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y FIN DE TRAMO
	CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CALLE 10
MARTINEZ	CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA
	CARRERA 3 VIA LA CEIBITA HASTA LA Y
	VARIANTE ENTRE CALLE 8 Y LA CARRERA 3
	CARRERA 6 ENTRE CALLE 10 ENTRE TRANSVERSAL 5
	CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y CALLE 10
	CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6
	CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3
	TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL 4A
	TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLE 7A Y CARRERA 4
	CALLE 7 ENTRE TRANVERSAL 4 Y CARRERA 4
	CARRERA 5A ENTRE CALLE 7A SECTOR MATAPERRO
	CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4
	TRANSVERSAL 4 ENTRE CARRERA 5C Y CALLE 7A
	CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5

De antemano agradecemos la atención prestada.

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

Montería, 16 de enero de 2024

OFIC-CC2022-127

Señores
Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P.
Carrera 14 Nº 48C-55
Montería - Córdoba
surtigas@surtigas.com.co


Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Redes sin cumplimiento de norma.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, actualmente nos encontramos en la ejecución del proyecto de la referencia en el corregimiento de Martínez.

Con preocupación hemos evidenciado que las profundidades de instalación de las redes de gas son menores a 0.50m, y no cuentan con cinta de señalización y/o capa de arena que indique de la existencia de dichas redes, las cuales ustedes administran (ver imagen)

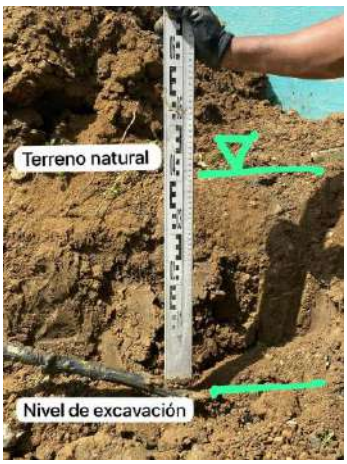

Por lo anterior, el Consorcio Córdoba 2022 NO se hará responsable de los daños ocasionados y no aceptará que se hagan cobros a propietarios de las viviendas en daños tuberías que no cumplan con las profundidades y/o señalización según la normativa colombiana.

Se Anexa: Listado de tramos del proyecto.

BARRIOS	Nomenclatura Catastral
ALBERTO SAIBIS	CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE
	CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE
20 DE JULIO	CARRERA 7AC ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2
	DIAGONAL 3 ENTRE CARRERA 7AC Y CARRERA 7a
	CALLE 2aE ENTRE CARRERA 7aC Y CARRERA 7aA
LA LUCHA	CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10
	VARIANTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aA
MARTINEZ	CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y FIN DE TRAMO
	CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CALLE 10
MARTINEZ	CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA
	CARRERA 3 VIA LA CEIBITA HASTA LA Y
	VARIANTE ENTRE CALLE 8 Y LA CARRERA 3
	CARRERA 6 ENTRE CALLE 10 ENTRE TRANSVERSAL 5
	CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y CALLE 10
	CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6
	CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3
	TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL 4A
	TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLE 7A Y CARRERA 4
	CALLE 7 ENTRE TRANVERSAL 4 Y CARRERA 4
	CARRERA 5A ENTRE CALLE 7A SECTOR MATAPERRO
	CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4
	TRANSVERSAL 4 ENTRE CARRERA 5C Y CALLE 7A
	CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5

De antemano agradecemos la atención prestada.

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 17 de enero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com


Asunto: SOLICITUD CORRECCIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO PAVIMENTO HIDRÁULICO

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría solicita al Consorcio Córdoba 2022 se cumpla con el artículo 500 de las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 del INVIAS, y con lo establecido en el APU del ítem 500.1 Pavimento De Concreto Hidráulico (38 Kg/Cm2), razón por la cual se requiere atender lo siguiente:

1. Se debe realizar el correcto curado del concreto una vez se termine el acabado final con antisol, y con agua por un período no inferior a los siete (07) días.

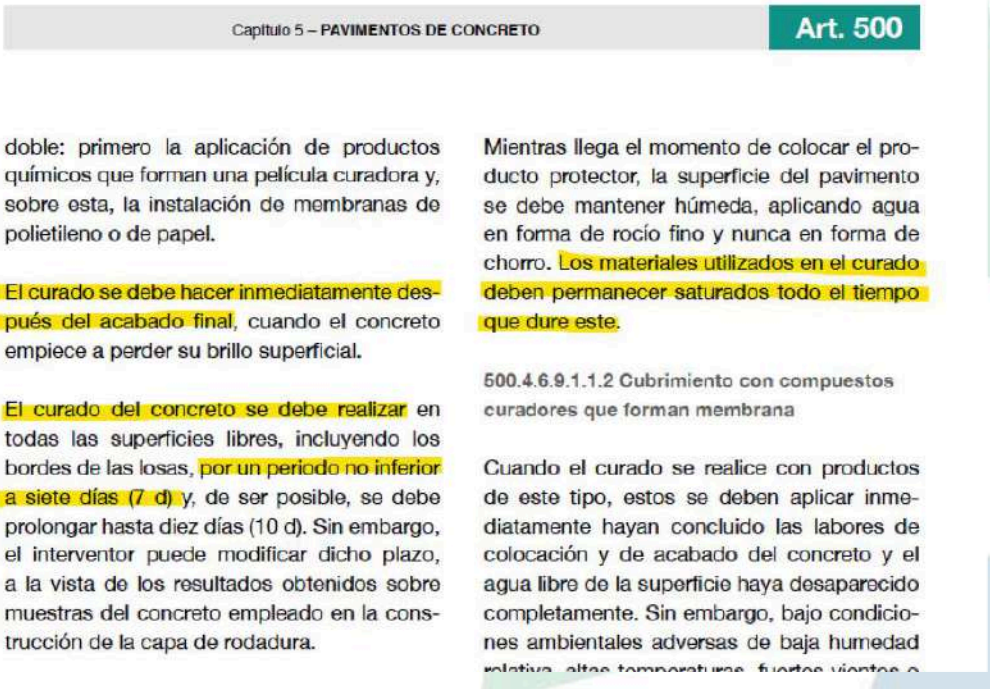

Capítulo 5 – **PAVIMENTOS DE CONCRETO** **Art. 500**

doble: primero la aplicación de productos químicos que forman una película curadora y, sobre esta, la instalación de membranas de polietileno o de papel.

El curado se debe hacer inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial.

El curado del concreto se debe realizar en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las losas, por un periodo no inferior a siete días (7 d) y, de ser posible, se debe prolongar hasta diez días (10 d). Sin embargo, el interventor puede modificar dicho plazo, a la vista de los resultados obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción de la capa de rodadura.

Mientras llega el momento de colocar el producto protector, la superficie del pavimento se debe mantener húmeda, aplicando agua en forma de rocío fino y nunca en forma de chorro. Los materiales utilizados en el curado deben permanecer saturados todo el tiempo que dure este.

500.4.6.9.1.1.2 Cubrimiento con compuestos curadores que forman membrana

Cuando el curado se realice con productos de este tipo, estos se deben aplicar inmediatamente hayan concluido las labores de colocación y de acabado del concreto y el agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o

CONSORCIO ACI-3B

2. Se debe optimizar el vibrado del concreto, de tal forma, que no se quede porcentaje de aire dentro del mismo y evitar hormigueo, el cual, afecta directamente la resistencia del concreto:



(Tramo T15)



(Tramo T15)

3. Mejorar el flotado superficial, de tal manera que no queden marcas del mismo:

CONSORCIO ACI-3B



(Tramo T15)

4. Requerir al proveedor del concreto corregir los sobre tamaños del agregado grueso que está presentando la mezcla:



CONSORCIO ACI-3B



(Tramo T13)

Por favor atender de manera inmediata, toda vez, que en el inciso “505.5.2.4 Control de la densidad del concreto” del manual de INVIAS se especifica que “En cualquier caso, la presencia de hormigueros hace obligatoria la demolición de las losas afectadas y su reconstrucción con otras que cumplan todos los requisitos de esta especificación.”

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
17/01/2024 7:43:03 p. m.

Folios: 4
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - SAID BITAR CASTILLA - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 19 de enero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de implementación de medidas de seguridad en todos los frentes de obra de este proyecto.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y control que realiza esta Interventoría a su contrato de obra No 104 de 2022, nos permitimos realizar la siguiente solicitud:

Señor contratista Consorcio Córdoba 2022, mediante la presente esta interventoría en el ejercicio de seguimiento y control del contrato en mención solicita implementar las siguientes medidas en cada uno de los frentes de trabajo de este proyecto.

1. Llevar a cabo la señalización y delimitación de los puntos que se requieren señalizar, con el fin que se prevenga a los peatones y conductores de los trabajos realizados y los diferentes tipos de riesgos que se encuentran presente en este proyecto, estas señales deben ubicarse con anterioridad al inicio y permanecer hasta que se de por culminado las actividades en el frente de trabajo por lo tanto se le solicita al contratista llevar acabo la implementación necesaria y adecuada de acuerdo al PMT de este proyecto, con señalizador tabular, cinta de peligro, señales informativas y preventivas al inicio de los tramos intervenidos, así mismo se delimite el área y se ubiquen bandereros en los tramos donde se realice trabajo nocturno (Instalación de concreto).
2. Se requiere que los trabajadores de la cuadrilla de bordillos y concreto estén dotados con sus respectivos elementos de protección personal ya que se ha evidenciado gran deficiencia del uso de estos elementos el cual minimiza la ocurrencia de un accidente laboral.
3. Contar con iluminarias para realizar el trabajo nocturno con el fin mejor la seguridad y calidad del trabajo realizado, ya que se han evidenciado que se ha visto afectada la calidad de los acabados del pavimento por falta de iluminación.

Se adjunta evidencia fotográfica






Sandra Nieto
Algarin







CONSORCIO ACI-3B





Por lo tanto esta interventoría solicita la implementación de estas medidas de seguridad en un plazo no mayor a tres días, de lo contrario estas actividades serán suspendidas hasta la implementación de estas.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
19/01/2024 9:46:58 a. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DE CORAZÓN con la gente

Nit. 800.096.744-5

Cereté, 20 de Diciembre de 2023

SPI-0752-2023-EXT

20 DIC 2023

ALCALDÍA DE CERETÉ
ARCHIVO MUNICIPAL
RECIBIDO RADICADO
00003163
HORA 03:11
PASA EXT RECIBIDO Vicky
DE CORAZÓN CON LA GENTE

Sres.
CONSORCIO ACI-3B
Carrera 7 # 156-10 piso 31
PBX. (601) 7460460
info@aciproyectos.com
Cereté- Córdoba

Referencia: Contrato No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL"

Asunto: Remisión Oficio Defensoría del Pueblo

Cordial Saludo:

Nos permitimos compartir con ustedes el oficio No. 20230060145801691 enviado a la Alcaldía Municipal de Cereté por parte de la Defensoría del pueblo, donde exponen las quejas presentadas por habitantes del sector Martínez, quienes solicitan información sobre la pavimentación del callejón conocido como Mata Perro y afirman que esperan sean pavimentados 3 kilómetros de dicho sector.

MUNICIPIO DE CERETÉ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
DESPACHO

DIONICIO DANIEL RICARDO DORIA
Secretario de planeación e Infraestructura

Adjuntar Oficio Radicado No. 2023006145772111
C.C CONSORCIO CORDOBA 2022
Elaboró: ING. ESTEFANIA ISABEL GUERRA LÓPEZ
Revisó: ING. PILAR PAOLA PUCHE PETRO
Aprobó: ARQ. DIONICIO DANIEL RICARDO DORIA

Montería;

Doctora:
SEGHEIDY MONTIEL PATIÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Calle 14 N° 12 - 41 Calle del Comercio
Cereté - Montería

Referencia: Remisión y seguimiento de Petición
Al contestar por favor cite este número SIVWATQ 2023119131/ GBGD -remitir respuesta a los correos: cordoba@defensoria.gov.co y ggamarra@defensoria.gov.co

Respetada doctora Segheidy:

La Defensoría del Pueblo como parte del ministerio público, dentro de la labor de vigilancia al poder público, está constituida, especialmente para la protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos, las garantías y libertades de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior, frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.

Es por ello, que, en virtud de lo anterior, esta entidad tuvo conocimiento a través de petición escrita suscrita por el señor Donaldo Miguel Morales, identificado con la C.C. N.º 6880769, de la siguiente situación:"...*me informe acerca de la pavimentación del callejón Mata Perro perteneciente al corregimiento de Martínez la cual, el día 8 de marzo 2022 en la socialización de la pavimentación de Martínez el señor Alcalde comunico que había 2 kilómetros para ese callejón. Últimamente por información de la presidente de la JAC me informa que solo son 300 metros*…" Adjunto petición.

En este orden de ideas, de acuerdo a las facultades que Constitucional y legalmente le corresponden a esta entidad, en especial las establecidas en el artículo 18 del Decreto ley 025 del 2014, solicitamos respetuosamente: se sirva adelantar los trámites administrativos pertinentes y que sean procedentes tendientes a dar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada por el señor Donaldo Miguel. Lo anterior con el fin de salvaguardar su derecho fundamental de petición, que pueden estar siendo flagrantemente vulnerado.

Finalmente, agradezco enviar respuesta de la presente comunicación, dentro del término de cinco (5) días establecido en el artículo 15 de la Ley 24 de 1992.

Cordialmente,

RICARDO NICOLAS MADERA SIMANCA
DEFENSOR REGIONAL CORDOBA

Copia: N/A
Anexo: 1 PDF

Tramitado y proyectado por: GLADYS BEATRIZ GAMARRA DE LA OSSA – Fecha 07/12/2023
Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Fecha : Diciembre 11 2023, a las 9:04:04 am
Codigo de Seguridad : 4f62abd320088e3a753136c687fb4acc
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.

Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra "Encuesta de Satisfacción al Usuario" escaneando el siguiente código QR.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 23 de enero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Señalización de bordillos y acopio o retiro del material sobrante.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y control que realiza esta Interventoría a su contrato de obra No 104 de 2022, nos permitimos realizar la siguiente solicitud:

Señor contratista Consorcio Córdoba 2022, mediante la presente esta interventoría en el ejercicio de seguimiento y control del contrato en mención solicita que se realice la debida señalización de los bordillos sobre la vía en el tramo T15 y el acopio o retiro del material sobrante el cual está siendo dejado sobre el pavimento con el fin de evitar que se presente un accidente.





CONSORCIO ACI-3B

Por lo anterior esta interventoria solicita tomar las medidas respectivas en un plazo no mayor a un (01) día de recibido dicho comunicado.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
23/01/2024 2:07:10 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 30 de enero de 2024

Ingeniero
JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE
alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Asunto: RESPUESTA A RADICADO 0000041 DEL 09-ENE-2024 ASUNTO: Derecho De Petición Consagrado En El Art 23 De La C.N Parágrafo 3 Y Demás Normas Siguientes, Solicitud De Información Sobre El Desagüe De Aguas Lluvias Y Residuales En La Calle San Roque Del Corregimiento De Martínez Cerete"

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, de acuerdo a lo solicitado por ustedes y por la señora MARIANELLA ESPINOSA CHAVES por medio del radicado 0000041 donde solicita información, nos permitimos responder lo siguiente:

1. **PREGUNTA:** "*Detalles de las obras civiles para el desagüe de aguas lluvias y residuales en la mencionada área residencial proyectada por su entidad establecidas en el contrato de pavimentación de la calle san roque del corregimiento de Martínez y que carece de sistemas de alcantarillado público"*

   RESPUESTA: El proyecto en ejecución, dentro del contrato 104 de 2022 del programa COLOMBIA RURAL del Instituto Nacional de Vías, no contempla instalación de redes de alcantarillado, toda vez, que el proyecto, el programa en mención y el corregimiento de Martínez son área rural del municipio. El manejo de las aguas lluvias para los tramos nombrados T12 y T13 del sector San roque, se dará por medio de escorrentía superficial y evacuará al predio del señor GREGORIO CARO ENIZ, propietario de la finca al final del tramo T12, donde se encuentra un canal natural de aguas lluvias. Referente al manejo de las aguas residuales, se le recuerda, que estas no deben ser vertidas a la vía o al suelo de manera directa, toda vez, que todas las viviendas del área rural del municipio están obligadas a contar con un sistema de manejo de aguas residuales como pozo séptico y/o campo de infiltración.

CONSORCIO ACI-3B

2. **PREGUNTA:** *"Nombre de la empresa o consorcio contratista encargado de la obra, su dirección registrada y el nombre de su representante legal"*

   RESPUESTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022 identificado con NIT 901598916-6, dirección Carrera 6#65-24 OFIC 317 Montería y representante legal CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ CC 15.370.151.

3. **PREGUNTA:** *"Nombre y apellidos de la trabajadora social designada por la empresa para manejar las relaciones entre la comunidad y la empresa constructoa según lo estipulados en las normas de contratación pública"*

   RESPUESTA: Trabajadora Social contratista: Adriana Muñoz Martínez Tel: 3233205516. Trabajadora social Interventoría: Katherine Lopesierra Tel:3167818545.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
30/01/2024 2:30:18 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

enero de 2024

DO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Remisión de derecho de petición

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 104 - 2022, remite derecho de petición interpuesto por la Sra. Marianella Espinosa, identificada con CC N° 35.114.270, residente en la carrera 2 calle 1A 13 de San Roque, corregimiento de Martínez.

La señora solicita información relacionada con el desagüe de aguas lluvias y residuales de las residencias ubicadas en la calle San Roque, teniendo en cuenta la peticionaria se encuentran represadas en los andenes. Asimismo requiere información referente al contratista y sus trabajadores, por lo tanto se adjunta el documento para su conocimiento y respuesta.

Se solicita amablemente al contratista dar respuesta a lo requerido en un plazo no superior a 5 días contados a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
30/01/2024 2:44:53 p. m.

Folios: 1
Anexo: 1
Nombre anexos: Peticion Marianella Espinosa.pdf

CONSORCIO ACI-3B

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

ALCALDÍA DE CERETÉ
ARCHIVO MUNICIPAL
RECIBIDO - RADICADO
RADICA 0000041 HORA 10:42
PASA A SPI RECIBIDO

RECIBIDO 09 ENE 2024

Cereté, diciembre 4 de 2023

Señores
Secretaria de Infraestructura Municipio de Cereté
Atención: secretario de Infraestructura Municipal
Ciudad

Asunto: Derecho de petición consagrado en el art. 23 de la C.N. parágrafo 3 y demás normas siguientes, solicitud de información sobre el desagüe de aguas lluvias y residuales en la calle San Roque del Corregimiento de Martínez Cereté

Estimados señores,

Por medio de la presente, yo, MARIANELLA ESPINOSA CHAVES, identificada con la cedula número 35.114.270 de Cereté, residente en la carrera 2 calle 1A 13 de Martínez, Cereté, me dirijo a ustedes para solicitar información relacionada con el desagüe de aguas lluvias y residuales de las residencias ubicadas en la calle San Roque, donde se está llevando a cabo el pavimento por parte de esa Alcaldía y que en la actualidad se encuentran represadas en los andenes de las residencias.

Mi solicitud de información específica incluye:

Detalles las obras civiles para el desagüe de aguas lluvias y residuales en la mencionada área residencial proyectadas por su entidad establecidas en el contrato de pavimentación de la Calle San Roque del Corregimiento de Martínez y que carece de sistemas de alcantarillado público.
Nombre de la empresa o consorcio contratista encargado de la obra, su dirección registrada y el nombre de su representante legal.
Nombres y apellidos de la trabajadora social designada por la empresa para manejar las relaciones entre la comunidad y la empresa constructora según lo estipulados en las normas de contratación pública.
El motivo de esta solicitud radica en los problemas entre vecinos ocasionados por la inadecuada gestión del desagüe de aguas lluvias y residuales, afectando la salud pública y causando daños en los bienes inmuebles y muebles de los residentes.

Agradezco su pronta respuesta a esta solicitud, la cual espero sea remitida a la dirección mencionada arriba o al correo electrónico marianellahespinosa09@gmail.com y al número de teléfono celular. 3103525530.

Quedo a la espera de una pronta y satisfactoria respuesta.

Cordialmente,

MARIANELLAH ESPINOSA CHAVES
CC. 35.114.270 expedida en Cereté

Montería, 31 de enero de 2024

OFIC-CC2022-129

Señores
Ing. Jorge Abraham Assis Burgos
Secretario de planeación e infraestructura
Alcaldía Municipal de Cerete

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Inconveniente social Tramo T15 – (INTERCEPCION TRAMO 15 Y CALLE EL BATALLON – ESQUINA TIENDA RUBI) Corregimiento de Martínez.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de informar que en días pasados la comunidad del tramo T15 intercepción calle el batallón tumbaron los bordillos que se habían instalado, la comunidad se encuentra inconforme con el tamaño del giro en esta intercepción (Ver imagen siguiente).




La comunidad pide realizar el giro mucho mas amplio de lo planteado, el consorcio CORDOBA 2022 en reunión con la comunidad y dándole respuesta se les informa que el giro se realizará de acuerdo con lo que está estipulado en los diseños aprobados.

Por lo anterior comedidamente solicitamos su acompañamiento para que se resuelva el inconveniente informado y así poder proceder con la construcción del giro en asunto.

Informamos que este tramo no se ejecutará hasta que la situación con la comunidad no sea resuelta, y enviado el soporte por escrito de la resolución del mismo, esto con el fin de evitar inconvenientes posteriores.

Se Anexa:

1. Ubicación de la intersección.

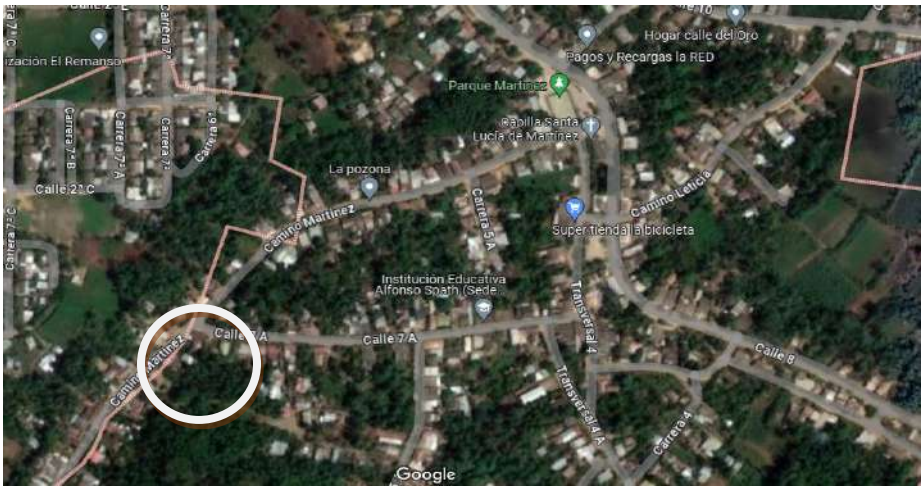

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022
Copia. Interventoría

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Foto 1. Continúa excavación para instalación de bordillos tramo T18.



Foto 2. céreo de Subbase granular del tramo T13 del Pr 105 al pr 160.



Foto 3. Instalación de afirmado del tramo t15 del pr 0+000 al pr 0+060.



Foto 4. Se extiende material de sub base desde la abs K0+140 hasta la K0+060 tramo T15 Martínez.



Foto 5. Se realiza instalación de rieles del PR 0+105 hasta el PR 0+160 tramo T13 la lucha.



Foto 6. Liberación rieles y sub base T13 Martínez del K0+105 al K0+160.



Foto 7. Fundida pavimento tramo T13 del PR 0+105 al PR 0+160.



Foto 8. Céreo de sub base tramo T15 del PR 0+140 al PR 0+090.



Foto 9. Corte de junta de pavimento tramo T13 del Pr 0+105 al PR 0+150.



Foto 10. Inicia excavación para instalación de bordillo tramo T13 la lucha.



Foto 11. Se compacta capa de sub base tramo T15 Martínez del PR 0+0140 al PR 0+090.



Foto 12. Se realiza enrielado del tramo T15 del pr 0+090 al pr 0+140.



Foto 13. Excavación mecánica tramo T8 desde el Pr 0+040 hacia menores.



Foto 14. Continúa instalación de bordillo tramo T13 la lucha.



Foto 15. Fundida pavimento T15 Martínez del PR 0+140 al PR 0+090.



Foto 16. el contratista realiza céreo de sub base del Pr 0+150 al PR 0+200 tramo T13.



Foto 17. Chequeo y liberación sub base y rieles T13 Martínez del K0+160 al K0+ 200.



Foto 18. Fundida tramo T13 del pr 0+150 al pr 0+200.



Foto 19. Céreo de sub base tramo T12 del Pr 0+151.39 al Pr 0+090.



Foto 20. Chequeo y liberación de excavación T8 Martínez del K0+040 al K0+020.



Foto 21. Corte de junta de pavimento del pr 0+150 al Pr 0+200 Tramo T13.



Foto 22. Céreo de sub base del Pr 0+200 al Pr 0+231.13 tramo T13.



Foto 23. Liberación y chequeo sub base y rieles del K0+200 al K0+231.13 T13 Martínez.



Foto 24. Liberación de afirmado T15 Martínez del K0+060 al K0+030.



Foto 25. Excavación mecánica del Pr 0+015 al Pr 0+000 tramo t13.



Foto 26. Sello de juntas tramo A3.



Foto 27. Liberación de excavación T13 Martínez del K0+015 al K0+000.



Foto 28. Instalación de rieles tramo t12 del Pr 0+151.39 al Pr 0+110.



Foto 29. Liberación de excavación T8 Martínez del K0+020 al K0+000.

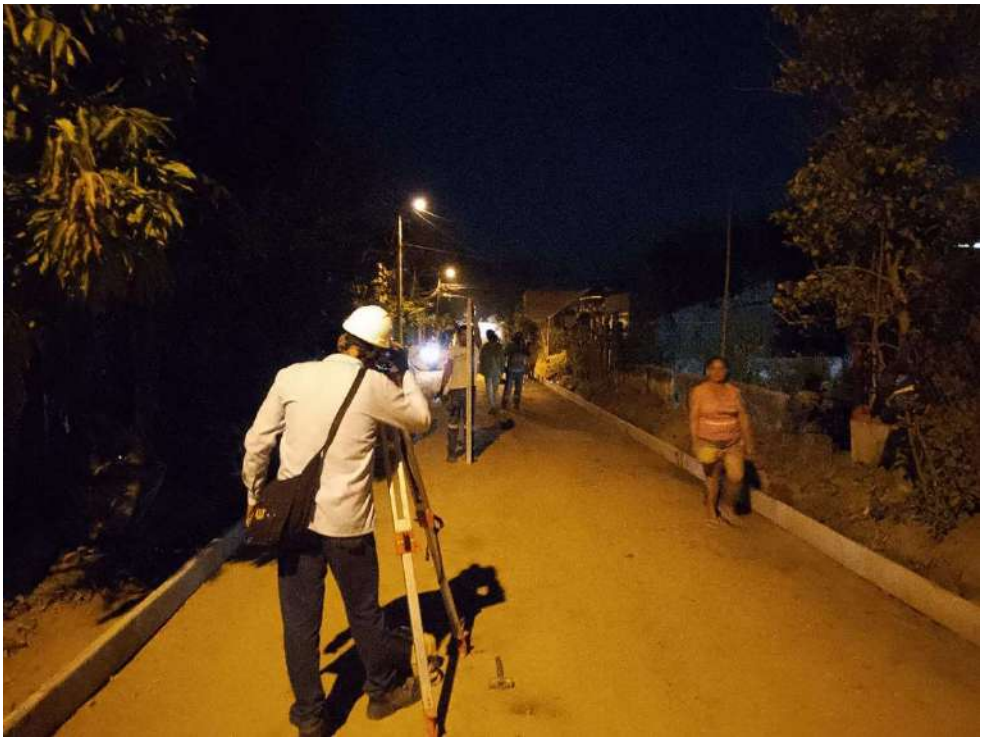


Foto 30. Liberación de rieles y sub base T12 Martínez del K0+151.39 al K0+110.



Foto 31. Fundida tramo t13 del pr 151.39 al pr 110.



Foto 31. Fundida tramo T12 del pr 151.39 al pr 110.



Foto 32. Se extiende material de sub base del Pr 0+060 al Pr 0+030 tramo t15.



Foto 33. Inicia excavación para instalación de bordillo tramo T15.



Foto 34. Inicia excavación mecánica tramo T16 Pr 0+000.



Foto 35. Se realiza céreo de sub base tramo T15 del Pr 0+090 al Pr 0+050.



Foto 36. Chequeo y liberación de sub base y rieles T15 Martínez del K0+090 al K0+050.



Foto 36. fundida pavimento T15 Martínez del Pr 0+090 al pr 0+050.



Foto 37. Chequeo y liberación de excavación T16 Martínez del K0+00 al K0+020.



Foto 38. Chequeo y liberación de excavación T12 Martínez del K0+090 al K0+060.



Foto 39. El contratista realiza céreo de afirmado del Pr 0+040 al Pr 0+000. Tramo t13 la lucha.



Foto 40. El contratista extiende material de afirmado del Pr 0+090 al Pr 0+060. Tramo t12.



Foto 41. Liberación de afirmado T13 Martínez del K0+040 al K0+000.



Foto 42. Excavación mecánica del tramo T16 del pr 0+020 al pr 0+040.



Foto 43. Instalación de bordillos tramo T15 ambos lados.



Foto 44. Chequeo y liberación afirmado T15 del K0+030 al K0+000.



Foto 45. Liberación de excavación T12 Martínez del K0+060 al K0+040.



Foto 46. Liberación de sub base y rieles T13 Martínez del K0+040 al K0+000.



Foto 47. Fundida pavimento t13 del Pr 0+040 al Pr 0+000.



Foto 48. Cereo de Subbase del pr 0+000 al pr 0+050 tramo T15.



Foto 49. Contratista realiza excavación mecánica tramo t12 del Pr 0+040 hacia menores.



Foto 50. Liberación y chequeo afirmado T8 Martínez del K0+00 al K0+095.



Foto 51. el contratista realiza instalación de rieles tramo T15 Martínez. Del Pr 0+050 al Pr 0+000.



Foto 52. extendido de afirmado hasta el Pr 0+030 del tramo T12.



Foto 53. Liberación sub base y rieles T 15 Martínez del K0+050 al K0+000.



Foto 54. Se realiza céreo de sub base tramo T8.



Foto 55. Se realiza excavación mecánica tramo T12. Pr 0+030.



Foto 56. Se tomaron densidades del tramo T15 del pr 0+050 al pr 0+000.



Foto 57. Liberación de excavación de la abscisa K0+030 al K0+000.



Foto 58. Inicia excavación mecánica tramo A7 sector 20 de Julio.



Fotos 59. Liberación de excavación T16 Martínez del K0+020 al K0+070.



60. Iniciando fundida tramo t15 del pr 0+050 al pr 0+000.



61. El contratista extiende material de afirmado tramo t16, Pr 0+020.



62. Corte de juntas de pavimento tramo T15 del pr 0+000 al PR 0+050.



63. Instalación de rieles del tramo T8 del PR 0+050 al PR 0+105,62.



64. Liberación sub base y rieles T8 Martínez del K0+050 al K0+100.



65. Se realiza densidades de sub base tramo T8 Martínez. Pr 0+055 LD.



66. Fundida pavimento tramo t8 Pr 0+105.62 al PR 0+050.



67. Céreo de Subbase hasta el Pr 0+000 tramo T8



68. Inicia excavación mecánica tramo t6 Martínez del Pr 0+000.



69. Bordillos fundidos in situ el día de ayer del ld pr 0+921 al 0+971.



70. Liberación de excavación T6 Martínez del K0+00 al K0+015.



71. Fundida de bordillos in situ tramo T1 del ld del pr 0+890 al 0+920.



72. Liberación de excavación A7 20 de julio del K0+060 al K0+080 Y K0+090 al K0+115.



73. Se realiza céreo de subbase en tramo T8 Martínez.



74. Liberación sub base y rieles T8 Martínez del K0+050 al K0+000.



75. Fundida pavimento T8 del PR 0+050 al Pr 0+000.



76. Liberación de afirmado T12 Martínez del K0+090 al K0+060.



77. contratista realiza céreo de sub base desde el Pr 0+110 hasta el Pr 0+060 tramo T12.



78. Chequeo cuneta media tapa Martínez.



79. Chequeo y liberación sub base y rieles T12 Martínez del K0+110 al K0+060.



80. Fundida pavimento tramo T12 del Pr 0+110 al Pr 0+060.



81. contratista realiza fundida losa de fondo de Cuneta tramo T1 media Tapa del Pr 0+090 al Pr 0+120.



82. Chequeo y liberación afirmado T12 del K0+060 al K0+000.



83. Liberación de afirmado T6 Martínez del K0+000 al K0+050.



84. Instalación de Subbase del tramo T12 hasta el PR0+000.



85. Liberación de sub base y rieles T12 Martínez del K0+065 al K0+000.



86. Liberación de excavación T6 Martínez del K0+065 al K0+080.



87. Inicia fundida del tramo T12 del pr0+060 al pr 0+000.



88. El contratista realiza céreo capa de sub base tramo T6 Martínez, del Pr 0+000 al Pr 0+050.



89. Liberación sub base y rieles T6 Martínez del K0+00 al K0+060.



90. Fundida pavimento T6 Martínez del Pr 0+000 al Pr 0+060.



91. Se fundió muros de andén cuneta del pr 0+090 a la 130.



92. Liberación de afirmado A6 - 20 de julio del del K0+000 al K0+115.



93. Contratista realiza céreo de capa de afirmado tramo T16 Martínez.



94. Liberación de afirmado T16 Martínez del K0+000 al K0+070.



95. Liberación de excavación T6 Martínez del K0 080 al K0+110.



96. Contratista realiza instalación de rieles tramo A7 del Pr 0+000 al Pr 0+060.



97. Liberación de sub base y rieles A7 20 de julio del K0+003 al K0+060.



98. fundida pavimento tramo A7 sector 20 de Julio del Pr 0+003 al Pr 0+060.



99. Liberación de sub base y rieles A7 20 de julio del K0+060 al K0+115.



100. Fundida del tramo A7 del pr 0+060 al pr 0+115.



101. Realizan fundida tapa anden cuneta tramo T1 media tapa del Pr 0+140 al Pr 0+170.



102. Liberación de sub base y rieles T16 del K0+00 al K0+070.



103. Fundida pavimento tramo T16 del Pr 0+004 al Pr 0+070.

Personal: -1 residente -1SST -4 ayudantes
Equipos: - Herr. menores
Actividades:
- continuó instalación de bordillos del lado derecho

TRAMO T13
clima: Soleado.
personal: -1 residente -1 SST -2 operadores -2 oficios varios -1 comisión topográfica
equipos: -1 nivel -Herr. menores -1 minicargadora -1 vibrocompactador
Actividades:
- Se realizó extendido de afirmado del PK0+013 al PK0+015.

* Sábado 30 de Diciembre de 2023,
* Domingo 31 de diciembre de 2023, Lunes 01 de enero de 2024. y Martes 02 de enero de 2024.
clima: Soleado
No se trabajó por fiestas de fin de año.

*Miércoles 03 de enero de 2024
Tramo T18.
clima Soleado
Personal: -1 residente -1SST -4 ayudantes
Equipos: -Herramientas menores
Actividades:
- continuan excavaciones del tramo T18. para bordills. del lado derecho

Powered by CamScanner

* Jueves 04 de enero de 2024

Tramo T13

Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1 SST -2 operadores -2 oficios varios -6 ayudantes -1 comisión topográfica

Equipos: -Herramientas menores -1 minicargadora -1 vibrocompactador -1 vibradora de agujas. -1 nivel.

Actividades:

-Se realiza cercado de Sobre ancho y se instalan rieles del PI otros al PI 01+160. y se libera por topografía de interferencias

-Se hace pavimento del PI otros al PI 01+160.

Tramo T18

Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1 SST - 4 ayudantes.

Equipos: -Herramientas menores.

Actividades:

- Se continúa instalación de bordillos del PI 01+000 al PI 01+400 del lado derecho.

Tramo T15.

Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1 SST - 1 minicargadora -1 vibrocompactador -2 oficios varios -2 operadores. -1 comisión topográfica

Equipos: -Herramientas menores -1 minicargador -1 vibrocompactador, -1 nivel

Actividades:

- Se realiza instalación de afirmado del PI 01+000 al PI 01+160.
- Se extiende Sobre ancho del PI otros al PI 01+160.

* Viernes 05 de enero de 2024

Tramo T15.

Powered by CamScanner

clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topográfica -2 operadores -2 oficios varios
Equipos: -herramientas menores -1 nivel -1 minicargador -1 vibrocompactador.
Actividades:
-Se realiza cerco de Subbase granular del tramo del PK 0+140 al PK 0+190.

TRAMO T13.
clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1 SST -2 oficios varios -4 ayudantes.
Equipos: -herramientas menores -1 volteadora -1 compresor
Actividades:
-Se realiza corte de juntas de pavimento del PK 0+105 al PK 0+150
-Se inicia excavación de bordillos del PK 0+040 al PK 0+010.

TRAMO T8.
clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST. -1 comisión topográfica -2 operadores
Equipos: -1 nivel -herramientas menores -1 minicargador -1 vibrocompactador.
Actividades:
-Se realiza excavación mecánico. del PK 0+040 al PK 0+020.

*Sábado 06 de enero de 2024.
TRAMO T15.
Clima: Soleado.

Powered by CamScanner

Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica
-2 operadores - 6 ayudantes
Equipos: -Herramientas menores -1 vibrador agusa
-1 nivel -1 minicargador -1 vibrocompactador
Actividades:
- Se realizo emplantado del PE otoño al PE otoño y se hizo por interventoría.
- Se hizo pavimento del PE otoño al PE otoño

Tramo T8.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -2 operadores
-2 ayudantes -1 comisión topográfica
Equipos: -Herramientas menores -1 nivel
-1 minicargador -1 pajarita.
Actividades:
- continúa excavación mecánica del PE otoño al PE otoño.
y retiro de material

Tramo T13.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -4 ayudantes
Equipos: -Herramientas menores
Actividades:
- continuan actividades de instalación de bordillos del lado derecho. e izquierdo del PE otoño al PE otoño.

* Domingo 07 de enero de 2024.
Clima: Soleado
No se trabajo por ser dominical.

* Lunes 08 de enero de 2024.

Powered by CamScanner

Clima: Soleado
No se trabajó por ser feriado.

Martes. 01 de enero de 2024.


TRAMO T13
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -SST -1 comisión topográfica -6 ayudantes -1 minicargador -1 vibrocompactada -1 vibrador agua
Equipos: -Herramientas menores. -1 vibrocompactador -1 vibrocon de agua. -1 minicargador.
Actividades:
-Se realiza instalación de rieles y Sobbase granular y se libera por inventario del PF 0+150 al PF 0+200.
-Se funde pavimento del PF 0+150 al PF 0+200

TRAMO T12
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -SST -1 comisión topográfica -1 oficios varios -2 operadores
Equipos: -1 nivel -Herramientas menores. -1 minicargador -1 vibrocompactador
Actividades.
-Se realiza extendido de Sobbase del PF 0+150 al PF 0+000


TRAMO T8
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -SST -1 comisión topográfica -2 operadores -2 ayudantes
Equipos: -Herramientas menores -1 nivel -1 minicargador -1 vibrocompactador.
Actividades:

Powered by CamScanner

-Se realiza chequeo y liberación de excavación mecánica del Pf 0+000 al Pf 0+020. por topografía de interventoría.
-continúan excavaciones mecánicas entre el Pf 0+020 y el Pf 0+000 y retiro de material de excavación.



* Miércoles 10 de enero de 2024
TRAMO T13.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente - 1 SST - 2 Operadores - 10 Ayudantes
1 comision topografica
Equipos: 1 minicargador - 1 vibrocompactador - Herr. menores
1 nivel
Actividades:
-Se continúa instalación de bordillos de ambos lados
-Se realiza corte de juntas de pavimento del Pf 0+150 al Pf 0+200
-Se realiza cereo de Subbase granular del Pf 0+200 al Pf 0+231,13 y se inicia instalación de rieles.



* Jueves 11 de enero de 2024
TRAMO T13
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision Topografica - 2 operador
6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 pajarita - 1 nivel - 1 vibrador de aguja
Actividades:
-Se realiza chequeo y liberación de Subbase y rieles del Pf 0+200 al Pf 0+231,13. por topografía de interventoría
-Se realizan excavaciones mecánicas del Pf 0+000 al Pf 0+015 y se libera por topografía de interventoría.
-Se funde pavimento del Pf 0+200 al Pf 0+231,13.

Powered by CamScanner

Tramo T12
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes - 1 comision topografica - 1 Operador
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 nivel - 1 vibrador de aguja
Actividades:
- Se termina extendido de Subbase granular y se instalan rieles del Pk 0+151,39 al Pk 0+110.
- Se observa Subbase y rieles por topografia de interventoria y se libera del Pk 0+151,39 al Pk 0+110
- Se funde pavimento del Pk 0+151,39 al Pk 0+110.

Tramo T8.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 oficios varios - 1 comision topografica - 1 Operador
Equipos: 1 pajarita - 1 nivel

Actividades:
- Se realizan excavaciones mecánicas y retiro de material del Pk 0+020 al Pk 0+000. y se libera por interventoria

Tramo T15.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica 2 operadores - 2 oficios varios
Equipos: 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 nivel

Actividades:

Powered by CamScanner

-Se realiza extendido de afinado y liberación por topografía de inventario del Pf otoño al Pf otoño

* Viernes 12 de enero de 2024

Tramo T15.

Clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 2 oficios varios - 6 Ayudantes 1 comisión topografica - 2 operadores

Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibro-compactador - 1 vibrador de aguja.

Actividades:

-Se extiende Sobbase granular del Pf otoño al Pf otoño

-Se realiza extendido y cereo de Sobbase del Pf otoño al Pf otoño. y se instalan rieles

-Se realiza cheqeo de Sobbase y rieles del Pf otoño al Pf otoño y se libera por interventoria.

-Se hace pavimento del Pf otoño al Pf otoño

Tramo T16.

Clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica 2 oficios varios - 1 cargador

Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pagarita

Actividades:

-Se inician actividades de excavación mecánica del Pf otoño al Pf otoño.

Tramo T12.

Clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica 2 oficios varios

Equipos: 1 pagarita - 1 nivel - 1 Herr. menores

Powered by CamScanner

Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del Pf 0+070 al Pf 0+060.

*Sábado 13 de enero de 2024
Turno T16.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comisión topográfica - 2 oficios varios
Equipos: 1 nivel - 1 pajarita - Herr. menores

Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del Pf 0+030 al Pf 0+020
-Se libera excavación mecánica del Pf 0+000 al Pf 0+020.
-Se retira material de excavación.

Turno T12
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comisión topográfica - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del Pf 0+090 al Pf 0+060.
-Se retira material de excavación
-Se libera excavación por topografía del Pf 0+090 al Pf 0+060.

*Domingo 14 de enero de 2024
Clima: Soleado

Se trabajó por ser dominical.

Powered by CamScanner

* LUNES 15 de enero de 2024

TRAMO T13

clima: Soleado.

Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica - 2 oficios varios - 2 operadores

Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 mini cargador - 1 vibrocompactador

Actividades:

- Se realizo cerco de afinado del PFOTO40 al PFOTO00, Se elevaron por fotografia de inteventoria y se libero. por
- Se extiende material de Subbase granular y se instalan rieles del PF OTO40 al PFOTO00.
- Se elevaron Subbase y rieles del PF OTO40 al PFOTO00 y se libero por topografia de interventoria.

TRAMO T12.

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica 2 oficios varios - 3 operadores

Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 mini cargador - 1 vibrocompactor - 1 pajarita

Actividades:

- Se realiza extendido de afinado del PF OTO40 al PF OTO60.
- Se realizo excavación mecánica del PF OTO60 al PFOTO40 y Se libero por fotografia de interventoria.

TRAMO T16.

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica 2 oficios varios - 1 operador

Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Powered by CamScanner

Actividades:
- Se realiza excavación mecánica del PK 0+020 al PK 0+040 y se retira material

TURNO TM5.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 3 Operador - 1 comision topogra..
Equipos: 1 vibro - 1 minicargador - 1 Pajarita - 1 nivel
Actividades:
- Inicia excavación e instalación de bordillos de ambos lados del PK 0+191 al PK 0+120
- Se extiende afirmado del PK 0+030 al PK 0+000 y se libera por topografía de interventoría.

* Viernes 16 de enero de 2024
TURNO TM3
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes - 2 oficios varios

Equipos: Herr. menores - 1 vibrador de aguja

Actividades:
- Se realiza fresada de pavimento del PK 0+040 al PK 0+000.
- Continua instalación de bordillos.

TURNO TM5.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 6 Ayudantes
2 oficios varios - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 vibrador de aguja.
Actividades:
- Se instaló tubos y Sobbase granular del PK 0+050 al

Powered by CamScanner

Proyecto y se liberó por topografía de inventario.
-Se fundió pavimento en losas de la rodete del Proyecto al Proyecto.
-Se tomaron densidades

Tramo T6
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 vibrocompactador - 1 pajarita
1 minicargador
Actividades:
-Se realizó extendido de afinado del Pf 0+030 al Pf 0+060.
-Se realizó excavación en la mañana del Pf 0+040 al Proyecto y se liberó por inventario

Tramo T6.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios
1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividades.
-Se realizó excavación mecánica del Pf 0+020 al Proyecto y se liberó por topografía de inventario.
-Se retiró material de excavación.

* Miércoles 17 de enero de 2024.
Tramo T16.
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios

Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
-1 nivel.

Powered by CamScanner

Actividades:
- Se extendió material de afirmado del PK 0+000 al PK 0+080.

Tramo: TA5
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 4 Ayudantes
Equipos: 1 cortadora - Herr. menores
Actividades:
- Se realizó corte de juntas de pavimento del PK 0+060 al PK 0+000.

Tramo TB.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 6 Ayudantes
2 oficios varios - 1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 vibrador de aguja
Actividades:
- Se realizó cargue de Subbase granular y tapa de desagües.
- Se instalaron rieles y se cargueó subbase y rieles.
del PK 0+060 al PK 0+000 por topografía de inventario.
- Se perdió pavimento en horas de la noche del PK 0+060 al PK 0+000.

Jueves 18 de Enero de 2024
Tramo A7.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comisión topográfica
2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Actividades:
- Se inician actividades de excavación mecánica del PK

Powered by CamScanner

Abscisa del Progresiva y del PK 0+115 al PK 0+090, se retira material de excavación y se libera por topografía de inventario.

TRAMO T6

Clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica
2 oficios varios - 1 operador

Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Actividades:

- Se realiza trazado de vía, se realiza excavación mecánica del PK 0+000 al PK 0+015 y se libera por topografía de inventario.

TRAMO T1

Clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades:

- Se realizó excavación, fundaleteo y fundida de bordillos in situ del ld del PK 0+091 al PK 0+089,7
- Se realizó excavación manual para bordillos del PK 1+096,6 al PK 1+100.

Viernes 19 de enero de 2024


Clima: Soleado TRAMO T1

Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes


Equipos: Herr. menores

Powered by CamScanner


Actividades:
-Se realizó pamaleteo y fundida de bordillos insitu del PK 1+416,6 al PK 1+510,9.



TURNO T8.
-Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica
2 Oficios varios - 2 operadores - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores, - 1 nivel - 1 minicargador -
1 vibro compactador - 1 vibrador de aguja
Actividades:
-Se realizó instalación de Subbase granular y ejes del PK otroso al PK otroco.
-Se liberó por parte de topografía de inventario y se fundió del PK otroso al PK otroco.



TURNO T12
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 Oficios varios - 2 operadores
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibro compactador
1 nivel
Actividades:
-Se realizó instalación y liberación por interventoría de obturado del PK otro90 al PK otro60.



Sábado. 20 de enero de 2024
Clima: Soleado TURNO T8.
Personal: 1 residente - 1 SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 contadora
Actividades:
-Se realizó corte de juntas de pavimento.

Powered by CamScanner

Tramo T6
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 1 comision topogra...
Equipos: 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - Herr. menor
Actividades:
- Se realizó Suministro de Material de afirmado y se inicio extendido.

* 21 de enero 2024 Domingo.
Clima: Soleado

No se trabajó por ser dominical.

* Lunes 22 de enero de 2024
Tramo T12.
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios - 6 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibrocompactador 1 vibrador de aguja
Actividades:
- Se realiza instalación de Sobbase granular y rieles del pk 0+110 al pk 0+060.
- Se chequea y se libera por parte de topografia de interventoria.
- Se funde Pavimento del pk 0+110 al pk 0+060. en la noche

Tramo T1
Clima:
Personal: 1 residentes - 1 SST - 6 Ayudantes - 1 operador - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 nivel

Powered by CamScanner

Actividades:
- Se realizó excavación manual del Pf 0+090 al Pf 0+126,6 para cuneta-canal y se liberó por topografía de interventoría.
- Se fundió acero de refuerzo del Pf 0+090 al Pf 0+126,6.

Tramo 16.
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comisión topográfica
2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividades:
- Se realizo excavación mecánica y retiro de material del PF0+015 al PF0+055.
- Se liberó por topografía de interventoría

Tramo A7.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios
1 comisión topográfica
Equipos:

Actividades:
- Se realizó excavación mecánica del Pf 0+060 al Pf 0+035 y se liberó por interventoría. y del Pf 0+060 al Pf 0+090.

Martes 23 de enero de 2024.
T1.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Powered by CamScanner

Equipos: Herr. menores

Actividades:
-Se realiza fundida de losa de fondo del Pt. 0+1296 al Pt 0+090 de cinden-coneta.

Tramo T12.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibrocompactador

Actividades:
-Se realiza instalación de atimado del Pt 0+060 al Pt 0+000 y se libera por topografía de interventoría

Tramo A7.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Actividades:
-Se realiza excavación mecánica y retiro de material del Pt 0+035 al Pt 0+015 y se libero por topografía de interventoría.

Tramo T6.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibrocompactador

Powered by CamScanner

Actividades:
- Se realiza instalación de alimado del Protodo del Protoso y se chequea y libera por interventoría.

* Miércoles 24 de enero de 2024
Clima: Soleado Frente T12.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 Oficios varios - 2 operadores 1 comisión topográfica - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador 1 nivel - 1 vibrador de aguja
Actividades:
- Se realizó cargue de Subbase granular del Protodo al Protodo y se instalaron picks.
- Se chequearon niveles por topografía de interventoría y se liberó.
- Se fundió pavimento del Protodo al Protodo.

Frente A7
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios 1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividades:
- Se realiza excavación mecánica del Protodo al Protodo, se libera por interventoría y se retira material.

T15
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Powered by CamScanner

Actividades:
-Continua instalación de bordillos de ambos lados

Tramo T6
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 Oficios varios - 1 operador - 1 comision topografica.
Equipos: Herr menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividades:
- Se realiza excavacion mecánica del Pf 0+060 al 0+080 y se libera por interventoria

* Jueves 25 de enero de 2024

Tramo A7
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividades:
- Se realiza excavacion mecánico del Pf 0+040 al Pf 0+060 y se libera por topografia de interventoria.

Tramo T6.
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 Oficios varios - 2 operadores - 1 comision topografica - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 nivel - 1 vibrador de aguja
Actividades:
- Se realizo instalación de Sobbase granular y nivel del Pf 0+000 al Pf 0+060 y se libero por

Powered by CamScanner

topografía de inventario.
- Se fundió pavimento en la noche del PK0+000 al PK 0+060.

* 26 de enero de 2024 viernes

TRAMO T1
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades:
- Se realizó excavación manual y fundida de losa de fondo de cuneta del PK 0+140 al PK 0+170.
- Se encofró y fundió muros de cunetas del PK 0+090 al PK 0+126,6.

TRAMO A7
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 oficios varios - 2 operadores - 1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador 1 nivel
Actividades:
- Se realizó instalación de afirmado del PK 0+000 al PK 0+115 y se libera por interventoría.

TRAMO T6
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 cortadora
Actividades:
- Se realiza corte de juntas de pavimento del PK0+060

Powered by CamScanner

al Pk 0+000

Tramo T13
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 4 Ayudantes

Equipos: Herr. menores - compresor y cortadora

Actividades:
- Se realiza Sello de juntas de pavimento del Pk 0+040 al Pk 0+000.

* Sábado 27 de enero de 2024.
Tramo T12 y T13
clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes
equipos: Herr. menores
Actividades:
- Se realizó excavación manual para bordillos.

Tramo T1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

equipos: Herr. menores.

Actividades:
- Se realiza encofrado para fundir tapas de anden cuneta del Pk 0+090 al Pk 0+126,6

* Domingo 28 de enero de 2024 clima: Soleado
No se trabajó por ser dominical

Powered by CamScanner

* Lunes 29 de enero de 2024
-Tramo T1
clima=Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

equipos: Herr. menores.

Actividades:
-continuo excavación manual y retiro de material de arden cuneta del PK0+170 en cadenas.
-Se fundio losa superior (tapas) de cunetas del PK0+070 al PK 0+260.


Tramo T1b
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1SST - 2operador - 2 oficios varios
1 comison topografica.
equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 nivel
Actividades.
-Se realiza instalacion de alimdado del PK0+00 al PK0+60.

* Martes 30 de enero de 2024
Tramo T6
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 1 operador - 2 oficios varios
- 1 comision topografica
equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel


Actividades.
-Se realiza excavación mecánica y liberación por interventoria del PK0+080 al PK 0+110

Powered by CamScanner


Tramo T16
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
- 1 nivel
Actividad:
- Se realiza liberacion de afirmado del Portico
al Portico por topografia de interventoria.



* miercoles 31 de enero de 2023
Clima: Soleado. Tramo A7.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica - 6 ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactor
- 1 nivel - 1 vibrador de aguja
Actividades:
- Se realiza instalacion de Subbase y neles del
Pt otoco al Portico y se libera por interventoria.
- Se hace pavimento del Pt otoco al Portico
- Se realiza cerco de Subbase granular del Portico
al Portal.



Tramo T16
clima Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica - 6 ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
- 1 nivel -
Actividades:
- Se realiza instalacion de Subbase y neles del
Pt otoco al Portico.



Powered by CamScanner

Tramo T1
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades:
- Se realiza encofrado y fundida de muros del PR0+140 al PR 0+170 de cuneta
- Se continua excavación manual del PR0+170 en adelante

* Jueves 01 de febrero de 2024
Tramo A7
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografia - 6 ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 Pajarita - 1 nivel - Vibrador de aguja
Actividades:
- Se realiza corte de juntas del PR0+000 al PR0+060.
- Se instalan rieles del PR0+060 al PR0+115. y Se libera por interventoria y se funde en horas de la noche.
- Se realizó excavación hasta el PR0+164 y se liberó por interventoria


Tramo A1 - A2
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades:
- Se funde losa al final del Separador entre el PR0+240


Powered by CamScanner

y Pk 0+238.



Tramo T16
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica - 6 Ayudantes - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 vibrador de aguja


Actividades:
- Se realiza liberacion de niveles por interventoria del Pk 0+041 al Pk 0+060 y se funde pavimento en horas de la mañana.



Tramo T13
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herramita menores.

Actividades:
- Se realiza terminacion de bordillos del Pk 0+040 al Pk 0+231,13 de ambos lados



Tramo T1
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herramientas menores

Actividades:
- Se realizó encofrado y fundido de losa superior de aletas

Powered by CamScanner

del Protoo al Protoo.

* Viernes 02 de febrero.
clima: Lluvias fuertes de 8:00pm - 11:00pm.

Tramo A7 y Tramo T16
Personal: 1 residente - 1SST - 3 Ayudantes

Equipos: Herr. menores - cortadora

Actividades:
- Se realizó corte de juntas de Pavimento fundido ayer.

Tramo T10
Personal: 1 residente - 1SST - 1operador - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1nivel

Actividades:
- Se realizó excavación mecánica del Protoo al Protoo.
y retiro de material.

Tramo T12
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudante

Equipos: Herramientas menores

Actividades.
- continua excavación e instalación de bordillos de ambos lados.

Powered by CamScanner
