INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM-26

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

CERETÉ, CÓRDOBA

AGOSTO DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 2276 de 2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM-26

PERIODO: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

CERETÉ, CÓRDOBA

AGOSTO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 104-2022 **Contratista:** CONSORCIO CORDOBA 2022

Contrato de Interventoría No. 2276-2021 **Interventoría:** CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

INFORME MENSUAL No. 26 **MES O PERIODO:** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		14
3.1	Información general del contrato		15
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	18
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	20
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	23
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		23
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	23
	• Seguimiento Programa de Obra		23
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	23
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	23
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	23
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		24
5.1	Información general del contrato		24
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		26
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		26
5.5	Informe matriz de riesgos.		26
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		26
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información		26
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		26
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	26
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	27
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	27
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	28
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		28
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	28
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	28
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	28
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	28
7	**Conclusiones y recomendaciones**		29
8	**Anexos**		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		30
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		30
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		30
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		30

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de febrero de 2022
Revisó Jesus D Salgado H

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 15-ago-24 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 104-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	22/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN 1:	22/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28/06/2024
FECHA DE REANUDACIÓN 2:	6/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/08/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 16.321.717.210,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 403.558.223,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 16.725.275.433,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 4.896.515.163,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 4.896.515.163,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	8114,75
	Mejoramiento	ML	8114,75
	Rehabilitación	ML	8114,75
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	199,8	8114,75
	Mejoramiento	ML	199,8	8114,75
	Rehabilitación	ML	199,8	8114,75
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	16.629.514.105,00		16.629.514.105,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	57.851.736,00		57.851.736,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16.719.222.641,00	6.052.792,00	16.725.275.433,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

11372877,6

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1.607.416.297,19		1.607.416.297,19	16.687.365.841,00
AJUSTES	0,00		0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00		0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00		0,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	1.607.416.297,19		1.607.416.297,19	16.725.275.433,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 16.725.275.433,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 16.725.275.433,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	12
	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	33

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Pavimento tramo A4 sector 20 de julio del k0+190 al 0+000



Foto 2. Tramo T5' pueblecito terminado incluido señalizacion horizontal y vertical y relleno de espaldares



Foto 3.Tramo A2 terminado con anden cuneta



Foto 4. Tramo A3 terminado con andenes y cunetas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El día 29 de julio de 2024 mediante Radicado No. SAL-24-010492 esta interventoría envió al municipio alcance 3 al informe de incumplimiento previamente radicado como solicitud de apertura de proceso sancionatorio. La interventoría ha enviado los alcances al informe de incumplimiento solicitados por el municipio como seguimiento a las audiencias y al proceso de imposición de multas

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa "Colombia Rural" por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El Instituto Nacional de vías INVIAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la Interventoría cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El presente documento contiene el informe Mensual de Interventoría No. 26, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la Interventoría, durante el período comprendido entre el 01 y el 15 de agosto de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Martínez (barrio Alberto Saibis, 20 de julio, la lucha) y Chuchurubí.

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR del departamento y se encuentra ubicada en la vía hacia Planeta Rica.

Es preciso aclarar que no será necesario montaje de plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Así mismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas

A continuación, se muestra una imagen general y especifica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Figura 1 Localización General del Proyecto.

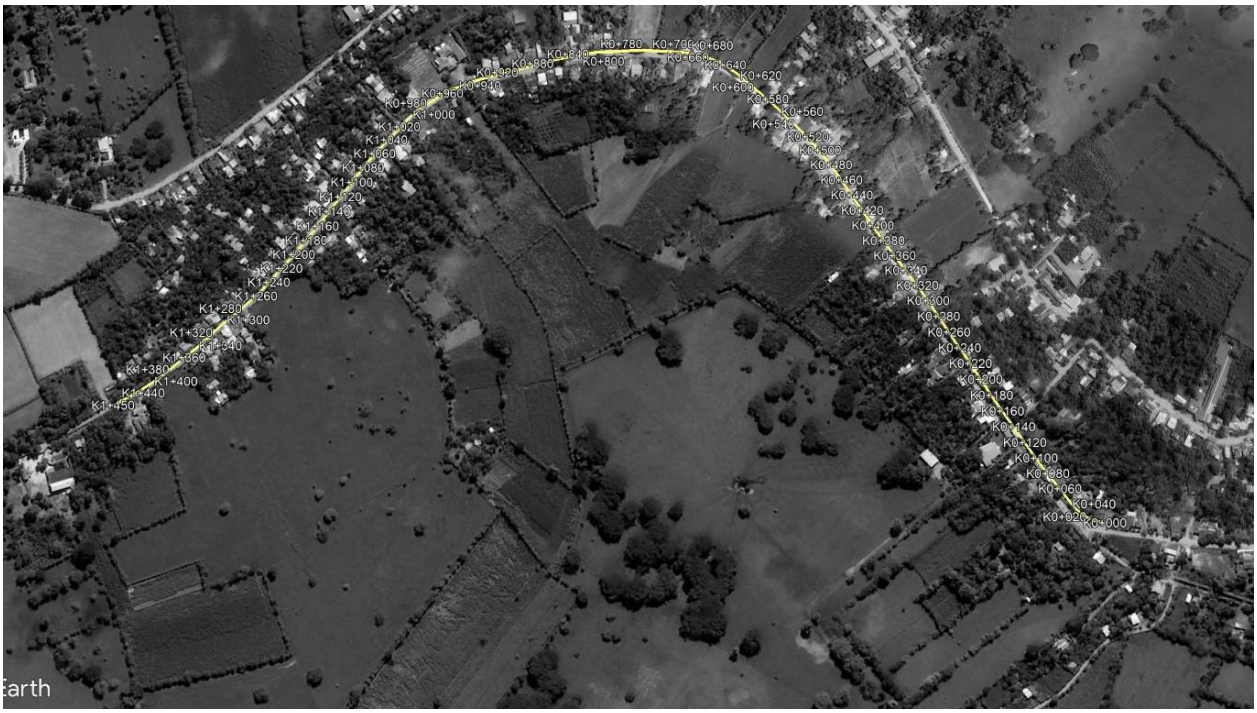


Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar sector Chuchurubí.



Figura 3 Localización específica de la vía a diseñar sector Martínez.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos, los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales.

De esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los PLAN D operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, perdida de grava, baches.

	
PR K0+700 al K0+800 Sector Chuchurubí	PR K0+600 Sector Martínez. Calle 8 vía media tapa.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste, según último balance en la construcción de 8114,75 metros lineales de pavimento de 20 cm de espesor y 38Mpa, la estructura con anchos de diseño de 5.50 m, 5.00 m, 4.50 m, y 4.00 m con bombeos normales del 2% y bombeos transicionales ajustados a las condiciones actuales de drenaje y empalmes viales, con bordillo prefabricados en ambos lados, una capa en afirmado con un espesor de 0.25 metros para el tramo 1 y 3 y 0.45 metros para el tramo 2; y subbase granular con un espesor de 0.15 metros para los 3 tramos.

Inicialmente eran 7673,35 metros lineales de pavimento, sin embargo, por adicional 1 al contrato de obra y balance de obra N° 6 y final, las cantidades aumentaron a 8114,75 y están distribuidos de la siguiente forma en los 3 sectores:

TRAMO	SECTOR	N°	Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Espesor afirmado (m)	Espesor subbase granular (m)	Espesor concreto (m)	Pavimento hidráulico (ml)
1	ALBERTO SAIBIS	1	A1- CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5,5	0,25	0,15	0,2	244,17
		2	A2 - CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5,5				242,73
	20 DE JULIO	3	A3 - CARRERA 7AC ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	5,5				452,37
		4	A4 - DIAGONAL 3 ENTRE CARRERA 7AC Y CARRERA 7a	5				410,5
		5	A7 - CALLE 2aE ENTRE CARRERA 7aC Y CARRERA 7aA	5,5				162,76
	LA LUCHA	6	T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10	5				418,98
		7	T19 - VARIANTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 23A	5				25,37
	MARTINEZ	8	T12 - CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y FIN DE TRAMO	4,5				151,38
		9	T13 - CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CALLE 10	4				231,13
2	MARTINEZ	10	T1 - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	6	0,45	0,15	0,2	1862,94
		11	T2 - CARRERA 3 VIA LA CEIBITA HASTA LA Y	6				240
		12	T2' - VARIANTE ENTRE CALLE 8 Y LA CARRERA 3	6				15,9
		14	T4 - CARRERA 6 ENTRE CALLE 10 ENTRE TRANSVERSAL 5	6				75,19
		15	T5 - CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y CALLE 10	6				261,1
		15A	T5' - CALLE 10-PUEBLECITO	5,5				452,2
		16	T6 - CARRERA 4 ENTRE CALLE B Y CALLE 6	4-5				163
		17	T7 - CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3	5				137,75
		18	T8 - TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL	4				100
		19	T9 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLE 7A Y CARRERA 4	5				177,12
		20	T10 - CALLE 7 ENTRE TRANVERSAL 4 Y CARRERA 4	5				101,37
		21	T14 - CARRERA 5A ENTRE CALLE 7A SECTOR MATAPERRO	4				200
		22	T15 - CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4	5				344,18
		23	T16 - TRANSVERSAL 4 ENTRE CARRERA 5C Y CALLE 7A	5				172,64
		24	T17 - CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	5				21,97
3	CHUCHURUBÍ	25	P14 - CARRERA 27 VIA PRINCIPAL	5	0,25	0,15	0,2	1450
					Cantidades totales ejecutadas			**8114,75**

Parámetros de Diseño

Longitud:	**K7+673,35**
Tipo de terreno:	**Plano**
Velocidad de diseño:	**30 Km/h**
Ancho de Calzada:	**4.00m - 4.50m - 5.00m - 5.50m - 6.0m**
Ancho de Carril:	**2.00m - 2.25m - 2.50m - 2.75m - 3.00m**
Bombeo Normal:	**2,00%**
Peralte Maximo	**-**

Adicionalmente se construirán 4 box culvert de sección transversal de 1mx1m ubicados así:

TRAMO	SECTOR	NOMENCLATURA	ABSCISA
A3	20 DE JULIO	CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	K0+310
T1	MEDIA TAPA	CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	K0+922
			K1+467
T18	LA LUCHA	CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10	K0+420

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

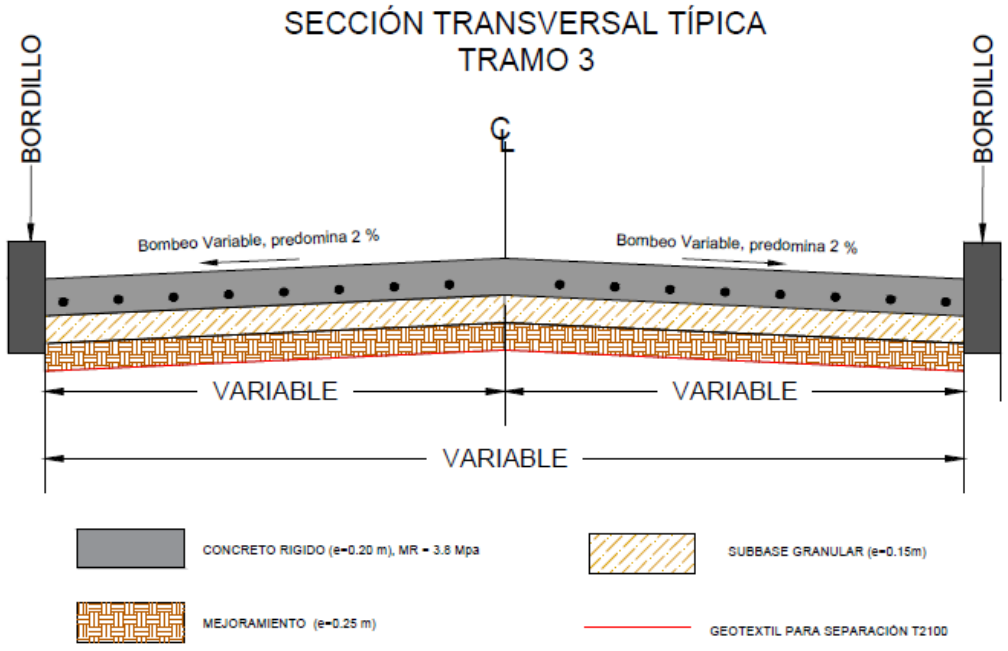


Figura 4. Tramo 1 y Tramo 3

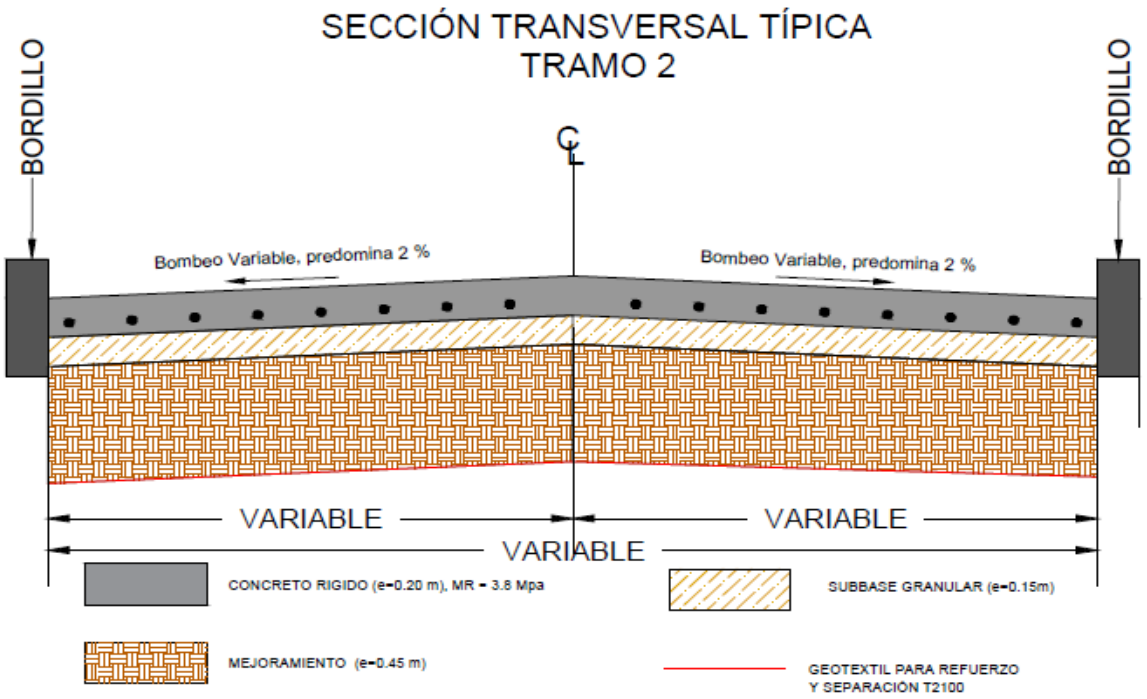


Figura 5. Tramo 2

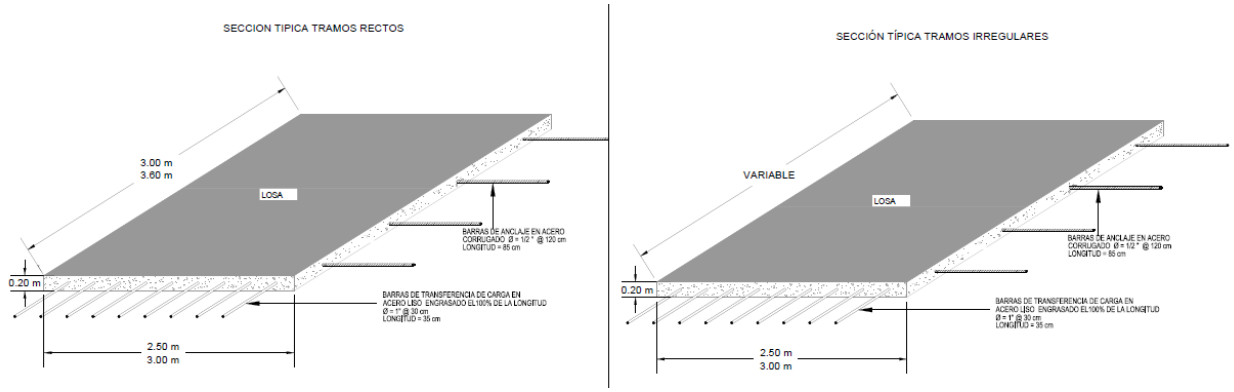


Figura 6. Sección típica

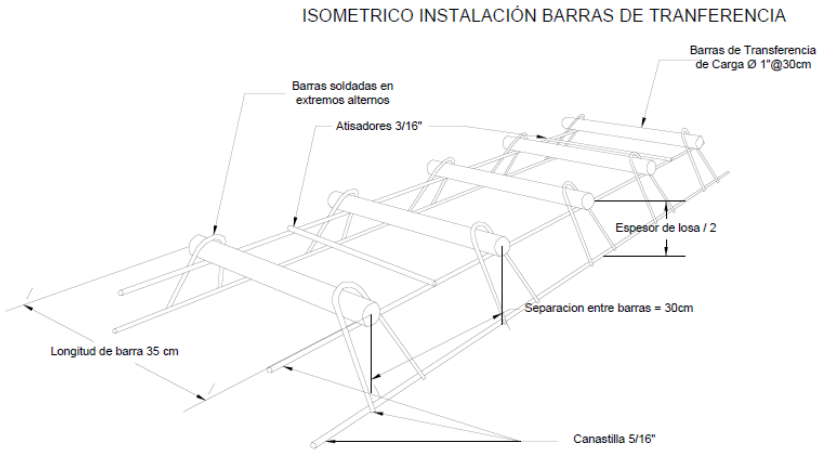


Figura 7. Canastillas de Instalación de barras de transferencia.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CERETE – CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL RURAL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE OBRA No	No. 104-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO CÓRDOBA 2022 INTEGRANTES: CONSTRULATINA S.A.S Nit No. 829002616-3 (95%) LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No. 6.640.311 (5%)
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ CC 15.370.151
NIT	901598916-6
DIRECCIÓN	Carrera 6#65-24 OFIC 317 Montería
TELÉFONO	3185162227
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 3	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 4	31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN SUSPENSIÓN N° 1 DEL 22/03/2024 AL 22/04/2024	01 DE MAYO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRÓRROGA 5	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN SUSPENSIÓN N° 2 DEL 28/06/2024 AL 06/07/2024	06 DE JULIO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRÓRROGA 6	15 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.321.717.210,00
VALOR ADICIÓN N° 1	$403.558.223,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.725.275.433,00

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

TRAMO A4: se fundió pavimento del PR 0+150 al PR 0+100 y radios de giro del PR 0+000. Se instaló el 100% de bordillos.
Se tiene previsto terminar losa superior e instalar las tapas removibles de todos los tramos de andén cuneta.
TRAMO A2: se fundió pavimento del PR 0+125 al PR 0+140
Se tiene previsto terminar de instalar señales verticales y señales horizontales.
TRAMO P14, T1 y T18: se instalaron señales verticales
TRAMO A3: se fundió muros y losa de fondo de andén cuneta del PR 0+140 al PR 0+310
TRAMO T15: se fundió muros faltantes y losa superior. Queda faltando las tapas removibles.
Se tiene previsto realizar caracterizacion vial
TRAMO T14: se fundió losa superior de anden cuneta de todo el tramo, faltando las tapas removibles
TRAMO P14, T1, T18 y T19: se instaló señalización horizontal
Se instalaron todas las señales verticales y demarcación vial en todos los tramos.
Se terminó fundida de anden cuneta tramo media tapa empalme con box T2'
Se terminó fundida de anden cuneta del tramo T2 hasta el box del tramo T2
Se terminó anden cuneta en A3, en A7.
Se fundieron los andenes todos en A3, T18.
Se terminó relleno de espaldares. de cunetas y bordillos.
Se fundieron todas las cajas de recolección de aguas lluvias de los tramos A3, A1 y T18.
Se fundieron radios de giro pendientes en T6 y A3 pr 0+000.
Se realizó limpieza y aseo general.

CANTIDAD MES DE AGOSTO 2024

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.607.416.297,2		$1.607.416.297,2	$ 16.687.365.841,0
AJUSTES	$ -		$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -	$ 37.909.592,0
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -		$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 1.607.416.297,2		$ 1.607.416.297,2	$16.725.275.433,0

3.3 ÍTEMS NO PREVISTOS

- En este período no se generaron nuevos ítems no previstos, por ende, no se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-10-FR-2.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

* Se realizan actas de reunión y actas de comités de obra para cierre de compromisos y veedurías.

* Se hizo estricto seguimiento a los compromisos y obligaciones del Contratista, tal como lo establece el contrato de obra y sus pliegos de condiciones hasta que cumpliera con el 100% de las obras contratadas.

*Se realizaron toma de muestras de concreto en campo para elaboración de viguetas y fallarlas en laboratorio como control de calidad.

* Se realizan levantamientos topográficos en conjunto con el contratista e interventoría en tramos antes de iniciar excavaciones para así llevar un mejor control de los volúmenes ejecutados.

* Se realiza chequeo de cada capa de material conforme a la estructura de diseño del pavimento antes de continuar con la siguiente. Se chequean cotas de excavación, afirmado, subbase granular y rieles para pavimento ya instalados.

* Se realiza acompañamiento en la parte social en el SAU del proyecto para cierre de actas de vecindad.

* Se realizan veedurías de cierre.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron dos (02) informes semanales correspondientes al periodo en mención, los cuales se encuentra relacionados en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. (Ver página 31-32)

INFORMES SEMANALES	FECHA
102	Del 02 al 08 de agosto de 2024
103	Del 09 al 15 de agosto de 2024

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionan la maquinaria y los equipos en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (ver página 33)

MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**
ESTACION TOTAL	GOWIN	Alcance 2000m	Martínez
Volqueta dobletroque	International	14 m3	Martínez
Vibrocompactador	Caterpillar	12 ton	Martínez
Motoniveladora	Caterpillar	12 Ton	Martínez
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Martínez

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el personal de este período. (ver página 34-36)

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	CORONADO DAIRO	1.064.988.482	OFICIOS VARIOS
2	ARGEL JUAN	15.005.196	OFICIOS VARIOS
3	ALEAN JOVER	1.069.493.792	INGENIERO R.

4	LYONS CASTILLA YACIRA CRISTINA	1.032.371.247	PROFESIONAL SST
5	JIMENEZ LUIS	1.003.188.639	OFICIOS VARIOS
6	MAUSSA JAIDYS	34.998.916	PROFESIONAL SOCIAL
7	MONTERROSA DANIELA	1.104.422.240	ADMON
8	MORALES BLADIMIR	1.003.193.113	AYUDANTE
9	MUÑOS MARTINEZ ADRIANA	1.064.981.749	SOCIAL
10	GONZALEZ ALEXANDER	78.034.248	OFICIOS VARIOS
11	HERNADEZ CESAR	153.700.151	DIRECTOR DE OBRA
12	IZQUIERDO LUIS	1.067.836.256	INGENIERO RESIDENTE
13	POMARES JAIRO	1.064.982.064	PLOMERO
14	PRETELT CARLOS	1.065.006.168	OPERADOR
15	RAMOS JHOAN	1.065.014.082	INGENIERO RESIDENTE
16	COGOLLO RODRIGUEZ FIDEL EDUARDO	1.133.824.054	OPERADOR
17	POLO VILLALOBO JOSE ARMANDO	1.003.060.368	OPERADOR
18	CAUSIL CAUSIL MARIO ALBERTO	1.068.661.925	OPERADOR

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra (ver página 37)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se relacionan el estado general del tiempo del presente mes. (Ver página 38)

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este período se relacionan laboratorios en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Ver página 39-41)

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimientos Garantías y Seguros Contrato de Obra se adjuntan en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Ver página 42-60).

Pólizas iniciales:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	31/05/2022	31/05/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	31/05/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	31/05/2022	31/07/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad de la revisión de estudios y diseños.	30%	$ 9.557.040,00	31/05/2022	31/05/2027
Predios, labores y operaciones		$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Contratistas y subcontratistas		$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Vehículos propios y no propios		$ 326.434.344,00	31/05/2022	31/07/2022

Pólizas actualizadas por prórroga 1:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	100%	$ 443.142.106,00	25/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.329.426.318,00	25/07/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 886.284.212,00	25/07/2022	31/12/2025

Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	$ 1.329.426.318,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	$ 4.778.556,00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prórroga 2:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	100%	$ 1.632.171.721,00	25/07/2022	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 3.264.343.442,00	25/07/2022	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prorroga 3:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25/07/2022	30/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25/07/2022	30/06/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	30%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prorroga 4 y adición 1:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25/07/2022	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.345.055.086,60	25/07/2022	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 5.017.582.629,9	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	30%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$836.263.771,65	25/07/2022	31/02/2024

Pólizas actualizadas por prorroga 5:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25/07/2022	01/11/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.345.055.086,60	25/07/2022	30/06/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 5.017.582.629,9	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	30%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$836.263.771,65	25/07/2022	30/06/2024

Pólizas actualizadas por prorroga 6:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25/07/2022	15/02/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	15/02/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.345.055.086,60	25/07/2022	15/08/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 5.017.582.629,9	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y	

			Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	30%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el Contratista hizo entrega del Plan de calidad correspondiente.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: a este contrato le desembolsado al Contratista el anticipo asignado según contrato del 30%. Adjunto se anexa (Ver Página 61).

Seguimiento Programa de Inversiones: se relaciona su seguimiento en el formato MEPI-MN-IN-6-FR-2. (Ver página 62)

Actas de Comité de Obra: en el presente mes no se realizaron Comités de Obra, por lo cual no se relacionan en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

Actas de Reunión: en el presente mes no se realizó acta de reunión por lo cual no se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2.

Acta de mayores y menores cantidades: no se realizó acta de mayores y menores en este período, por lo cual no se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1.

Acta parcial de obra: no se realizó acta parcial de obra para este período, por lo que no se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1. Queda pendiente el acta final con liquidación.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B INTEGRADO POR: ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%
NIT	901.551.292-6
TELÉFONO	601-74060460
DIRECCIÓN	Oficina. Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal – North Point
CONTRATO No	2276 DE 2021
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4"
LOCALIZACIÓN:	"CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (BARRIO ALBERTO SAIBIS, 20 DE JULIO, LA LUCHA Y CHUCHURUBÍ) CERETÉ CÓRDOBA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.930.530.773,00
VALOR ADICIÓN 1	$965.265.286,00
VALOR ADICIÓN 2	$250.000.000,00
VALOR ADICIÓN 3	$300.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.445.796.059,00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 3	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 4	31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN SUSPENSIÓN N° 1 DEL 22/03/2024 AL 22/04/2024	01 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 5	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN SUSPENSIÓN N° 2 DEL 28/06/2024 AL 06/07/2024	06 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN POR PRORROGA No 6	15 DE AGOSTO DE 2024

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación entregada por el Contratista.
- Seguimiento de las actividades de excavación, retiro y colocación de material de afirmado.
- Verificación de afiliaciones del personal.
- Realización de informes semanales y mensuales
- Requerimientos escritos al Contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En este mes no se relaciona informe de especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El Informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

El Informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

La Interventoría actualizó los documentos electrónicos en la plataforma CIFRA de acuerdo al Sistema de Gestión Documental implementado por INVIAS.

6. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se encuentran relacionados los equipos y vehículos para este período. (Ver página 63)

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Ver página 64)

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría
2	Nohemí Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría
3	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar
4	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social
5	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40,049,480	Profesional Ambiental
6	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST
7	Osvaldo Damian Mestra Ortiz	1.064.978.792	Inspector Técnico SST
8	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver página 65)

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver página 66-68)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo del Anticipo	27/02/2022	24/02/2025	$ 811.147.384
Calidad de Servicio	25/08/2024	25/08/2029	$ 1.033.738.817,70

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/02/2022	24/02/2025	$ 344.579.605,9
Salarios y prestaciones Sociales	27/02/2022	25/08/2027	$ 689.159.211,8

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, se encuentra en elaboración del Plan de Calidad. En el presente informe no se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: el Contrato de Interventoría no contempla anticipo.

Plan de cargas se encuentra relacionado en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 (Ver Página 69)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para agosto de 2024, se tenía previsto una Inversión Programada Acumulada de $16.725.275.433,00 la cual representa un porcentaje del 100% versus una Inversión Ejecutada Acumulada de $16.725.275.433,00 la cual representa un porcentaje del 100% para un atraso del 0,00%.
- Se hicieron ensayos de laboratorio a las viguetas tomadas en campo por parte de la interventoría para verificar resistencia del concreto instalado.
- Se terminó con el 100% de las actividades contractuales.
- Se hizo cierre de veedurías.
- Se recibió acta de recibo de la comunidad.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Se adjunta correspondencia recibida por parte del Contratista de obra y enviada por parte de Interventoría. (Ver página 70-100).

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas. (Ver página 101-128)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

No Se adjunta registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta la Bitácora de Obra, libro donde se registran todas las actividades que se realizaron durante el periodo. (Ver página 129-154).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	9/08/24 (Día/Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORIA VIAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 102 (Numeración consecutiva) del 02/08/2024 al 08/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL ALCANCE FISICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 8193,35 METROS LINEALES EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE 8193,35 METROS LINEALES EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MAS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022		
INTEGRANTES:	CONSTRUCTORA TRIADA INGENIERIA SAS NIT 900.901.119-8 35.000% PERSONA JURIDICA NIT 900.611.209-5		
CONTRATO No.	164 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO:	14/07/22	VALOR ADICIONES:	$ 403.940.258,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14/07/24	VALOR ACUMULADO:	$ 3.445.796.099,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/24		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI 38		
INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 38 PROYECTOS S.A.S CON 50%		
CONTRATO No.	2276 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/07/22	VALOR ADICIONES:	$ 1.515.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	VALOR ACUMULADO:	$ 3.445.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.725.275.433	$ 7.288.351.281
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 9.436.924.152	$ 5.571.314.145,93
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 7.288.351.280,53	$ 1.717.037.134,60
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 242.430.000	$ 1.930.530.773	$ 1.867.188.076	$ 550.042.360
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.279.607.983	$ 1.617.145.716	$ 403.940.258
	SALDO DE VIGENCIA	$ 242.430.000	$ 651.922.790	$ 250.042.360	$ 146.202.102

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.192.617.857,21	96,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.928.669.921,21	95,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -263.947.936,00	-1,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 0,00	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.196.929.940,73	96,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.928.669.921,21	95,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -268.010.019,52	-1,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 490.464.774,00	2,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 451.661.009,96	2,70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 14/06/2024 al 26/07/2024
VALOR FACTURAS: $ 1.225.994.606,29

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.414.013.364,00	99,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.413.491.907,00	99,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.345.582,00	0,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.345.582,00	0,91%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 76.900.168,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.896.515.163,00
Amortizado $	$ 4.896.515.163,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,07
Acumulado:	0,22

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96,79% — Avance o Atraso Físico %: -1,58%

Meta Física Ejecutada %: 93,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad tramo 1 y tramo 2	Cantidad tramo 3	TOTAL	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog.	1	1	1	1	100,0%
					Ejec.	1	1	1	1	100,0%
Explanaciones	M3	32.851,56	4.593,12	37.444,68	Prog.		32.095,97	4.487,48	36.583,46	97,7%
					Ejec.		30.857,49	4.185,90	35.044,35	93,6%
Subbases	M3	19.354,25	2.900,00	22.254,25	Prog.		19.354,25	2.900,00	22.254,25	100,0%
					Ejec.		18.811,30	2.900,00	21.711,30	97,6%
Pavimentos de concreto	M3	7.201,87	1.450,00	8.651,87	Prog.		7.201,87	1.450,00	8.651,87	100,0%
					Ejec.		6.912,50	1.450,00	8.362,50	96,7%
Estructuras de drenaje	M3	967,94		967,94	Prog.		780,16		780,16	80,6%
					Ejec.		285,26		285,26	29,5%
Transporte	M3/KM	427.070,31	48.103,25	475.173,56	Prog.		424.080,82	47.766,53	471.847,35	99,3%
					Ejec.		407.470,54	48.103,25	455.573,79	95,9%
Señalización y seguridad	M	20.272,05	4.374,00	24.646,05	Prog.		10.136,03	2.187,00	12.323,03	50,0%
					Ejec.		-	-	-	
Caracterizacion vial	KM	6,68	1,45	8,13	Prog.		-	-	-	
					Ejec.		-	-	-	
Items no previstos	M3	5197,89	1538,05	6.735,94	Prog.		4.501,37	1.331,95	5.833,32	86,6%
					Ejec.		722,19	1.506,45	2.228,64	33,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T5', T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP,	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora pajarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	JOMEVE		DISPONIBLE		
		PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el dia 05/09/2022 en martinez y el dia 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO A4: se fundió pavimento del PR 0+150 al PR 0+100 y radios de giro del PR 0+000. Se instaló el 100% de bordillos.
TRAMO A2: se fundió pavimento del PR 0+125 al PR 0+140
TRAMO T15: se fundió muros faltantes y losa superior. Queda faltando las tapas removibles.
TRAMO A3: se fundió muros y losa de fondo de andén cuneta del PR 0+140 al PR 0+310
TRAMO T14: se fundió losa superior de anden cuneta de todo el tramo, faltando las tapas removibles
TRAMO P14, T1, T18 y T19: se instaló señalización horizontal
TRAMO P14, T1 y T18: se instalaron señales verticales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene previsto terminar losa superior e instalar las tapas removibles de todos los tramos de andén cuneta.
Se tiene previsto realizar caracterizacion vial
Se tiene previsto terminar de instalar señales verticales y señales horizontales.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalación de señalización



Foto 2. Se fundió pavimento del tramo A4 hasta el PR 0+000 y se instaló bordillos



Foto 3. Fundida de muros de cunetas tramo A7

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El atraso del proyecto disminuyó del -3,24% al -31,4% , sin embargo continúa el atraso del proyecto. I. Se continúa haciendo seguimiento de los atrasos por medio de oficios y comités de obra. Se dio alcance al informe de incumplimiento anterior mediante radicado al municipio N° SAL-24-010492. Se procederá con nuevo informe de incumplimiento

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/08/24 (Día/Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORIA VIAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 103 (Numeración consecutiva) del 09/08/2024 al 15/08/2024 — Último Informe Semanal SI [x]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL ALCANCE FISICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 8193,35 METROS LINEALES EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE 8193,35 METROS LINEALES EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MAS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022		
INTEGRANTES:	CONSTRUCTORA TRIADA INGENIERIA SAS CON 50% - LUIS ESTUPIÑAN PERDOMO CON 50%		
CONTRATO No.	109 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO:	30/11/22	VALOR ADICIONES:	$ 401.792.923,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15/08/24	VALOR ACUMULADO:	$ 16.723.510.133,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/24		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%		
CONTRATO No.	229 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	29/07/22	VALOR ADICIONES:	$ 1.515.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	VALOR ACUMULADO:	$ 3.445.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.725.275.433	$ 7.288.351.281
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$	$ 9.436.924.152	$ 5.571.314.145,93
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 7.288.351.280,53	$ 1.717.037.134,60
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 242.430.000	$ 1.930.530.773	$ 1.867.188.076	$ 550.042.360
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.278.607.983	$ 1.617.145.716	$ 548.405.727
	SALDO DE VIGENCIA	$ 242.430.000	$ 651.922.790	$ 250.042.360	$ 1.636.633

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.725.275.433,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.725.275.433,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.436.924.152,00	56,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -7.288.351.281,00	-43,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.725.275.433,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.725.275.433,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 498.644.200,27	2,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.099.677.900,84	6,57%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 14/06/2024 al 26/07/2024
VALOR FACTURAS: $ 1.225.994.606,29

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.445.796.059,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.444.159.426,00	99,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.945.982,00	0,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.945.982,00	0,91%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 82.402.903,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.896.515.163,00
Amortizado $	$ 4.896.515.163,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,03
Acumulado:	0,21

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Cantidad tramo 1 y tramo 2	Cantidad tramo 3	TOTAL	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	1	1	Prog.	1	1	1	1	100,0%
					Ejec.	1	1	1	1	100,0%
Explanaciones	M3	32.013,62	4.593,12	36.606,74	Prog.		32.013,62	4.593,12	36.606,74	100,0%
					Ejec.		32.013,62	4.593,12	36.606,74	100,0%
Subbases	M3	19.234,40	2.900,00	22.134,40	Prog.		19.234,40	2.900,00	22.134,40	100,0%
					Ejec.		19.234,40	2.900,00	22.134,40	100,0%
Pavimentos de concreto	M3	7.383,22	1.450,00	8.833,22	Prog.		7.383,22	1.450,00	8.833,22	100,0%
					Ejec.		7.383,22	1.450,00	8.833,22	100,0%
Estructuras de drenaje	M3	946,54		946,54	Prog.		946,54		946,54	100,0%
					Ejec.		946,54		946,54	100,0%
Transporte	M3/KM	413.659,14	53.384,16	467.043,30	Prog.		413.659,14	53.384,16	467.043,30	100,0%
					Ejec.		413.659,14	53.384,16	467.043,30	100,0%
Señalización y seguridad	M	20.225,30	4.366,00	24.591,30	Prog.		20.225,30	4.366,00	24.591,30	100,0%
					Ejec.		20.225,30	4.366,00	24.591,30	100,0%
Caracterizacion vial	KM	6,69	1,45	8,14	Prog.		6,69	1,45	8,14	100,0%
					Ejec.		6,69	1,45	8,14	100,0%
Items no previstos	M3	6108,47	1600,65	7.709,12	Prog.		6.108,47	1.600,65	7.709,12	100,0%
					Ejec.		6.108,47	1.600,65	7.709,12	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Alberto saibis (A1 , A2), 20 de julio (A3, A4, A7), la lucha (T18, T19), Martínez (T12, T13)
TRAMO Y/O SECTOR 2: Martínez (T1, T2, T2', T4, T5, T5', T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16, T17)
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	2	2
Compresor 120 HP	1	1
Cortadora de pavimento,	1	1
Motoniveladora 215 HP,	1	1
Vibrocompactador, 153 HP	1	1
Aspersor manual	1	2
Vibrador de Concreto	1	2
Excavadora pajarita		2
Minicargador		2
Volqueta 14m3		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: JOMEVE — DISPONIBLE — PERMISO MINERO: SI [x] NO [ ] — LICENCIA AMBIENTAL: SI [x] NO [ ]
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ] — LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron los cierres de veeduría y actas de vecindad pertinentes.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se instalaron todas las señales verticales y demarcación vial en todos los tramos.
Se terminó fundida de anden cuneta tramo media tapa empalme con box T2'
Se terminó fundida de anden cuneta del tramo T2 hasta el box del tramo T2
Se terminó anden cuneta en A3, en A7.
Se fundieron los andenes todos en A3, T18.
Se terminó relleno de espaldares de cunetas y bordillos.
Se fundieron todas las cajas de recolección de aguas lluvias de los tramos A3, A1 y T18.
Se realizó limpieza y aseo general.
Se fundieron radios de giro pendientes en T6 y A3 pr 0+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Tramos A1 y A2 al 100%



Foto 2. Tramo T18 al 100%



Foto 3. Tramo T5 al 100%

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se terminó el 100% de las actividades de obra contractuales. Se está a la espera de documentacion para recibo y proceder a liquidación.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO
Matricula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO No. 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																					
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**																									
ESTACION TOTAL	GOWIN	Alcance 2000m	Martínez	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																									
Volqueta dobletroque	International	14 m3	Martínez	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																									
Vibrocompactador	Caterpillar	12 ton	Martínez	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																									
Motoniveladora	Caterpillar	12 Ton	Martínez	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																									
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Martínez	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																									
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																							
			TOTAL ACTIVO	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5																									
			TOTAL EN REPARACIÓN																																							
			TOTAL INACTIVO				5							5																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	65	86,67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	10	13,33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los días inactivos corresponden a los días que no se realizaron trabajos en obra por ser dominical y/o feriado.Del 01 al 05 de Julio se encontraron inactivos los equipos porque el contrato estuvo con segunda suspension ese período de tiempo. El día 19,23,27 inactivos por lluvias.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Luis Jerónimo Izquierdo Argel
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-175762 COR

Firma
Nombre: Nohemí Sofia Padron Torres
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-328519COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DARIO CORONADO	1.064.988.482	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CORDOBA 2022	30	$ 90.500	V	Mutual Ser	9472959493	$ 162.500	Colfondos	9472959493	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	LUIS JIMENEZ	1.003.188.639	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 90.500	V	Cajacopi	9472959493	$ 162.500	Porvenir	9472959493	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	DANIELA MONTERROZA	1.104.422.240	TRABAJADORA SOCIAL	$ 2.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 160.100	V	Sanitas	9472959493	$ 287.500	Porvenir	9472959493	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	
4	JAIDYS MAUSSA	34.998.916	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 174.000	V	Sanitas	9472959493	$ 312.500	Colfondos	9472959493	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
5	ADRIANA MUÑOS	1.064.981.749	AUXILIAR SOCIAL	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 146.200	V	Nueva Eps	9472959493	$ 262.500	Protección	9472959493	$ 336.000	$ 84.000	$ -	$ -	
6	CESAR HERNADEZ	153.700.151	DIRECTOR DE OBRA	$ 5.775.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 402.000	V	Salud Total	9472959493	$ 721.900	Protección	9472959493	$ 981.800	$ 231.000	$ -	$ -	
7	LUIS IZQUIERDO	1.067.836.256	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 174.000	V	Salud Total	9472959493	$ 312.500	Protección	9472959493	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
8	CARLOS PRETELT	1.065.006.168	OPERADOR	$ 2.625.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 182.700	V	Salud Total	9472959493	$ 328.200	Porvenir	9472959493	$ 420.000	$ 105.000	$ -	$ -	
9	JAIRO POMARES	73.159.265	PLOMERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 90.500	V	Mutual Ser	9472959493	$ 162.500	Colfondos	9472959493	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
10	ALEXANDER GONZALEZ	78.034.248	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 90.500	V	Salud Total	9472959493	$ 162.500	Porvenir	9472959493	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
11	JUAN ARGEL	15.005.196	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X n X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 90.500	V	Salud Total	9472959493	$ 162.500	Porvenir	9472959493	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
12	YACIRA LYONS	1.003.397.656	PROFESIONAL SST	$ 2.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 160.100	V	Mutual Ser	9472959493	$ 287.500	Colfondos	9472959493	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	
13	BLADIMIR MORALES	1.003.193.113	AYUDANTE	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 104.400	V	Nueva Eps	9472959493	$ 187.500	Colfondos	9472959493	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
14	JHOAN RAMOS	1.065.014.082	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 208.800	V	Mutual Ser	9472959493	$ 375.000	Porvenir	9472959493	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	
15	DIDIER RIVERO	1.003.193.013	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		30	$ 90.500	V	Nueva Eps	9472959493	$ 162.500	Protección	9472959493	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 12/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	9472959493	9472959493	E	2024/09/05	2024/09/12	BANCO DE BOGOTA	7	$14,538,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	15005196	ARGEL JUAN																		231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
2	CC	1064988482	CORONADO DAIRO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
3	CC	78034248	GONZALEZ ALEXANDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
4	CC	15370151	HERNANDEZ CESAR																		230201	30	$5,775,000	$981,800	EPS002	30	$5,775,000	$721,900	CCF16	30	$5,775,000	$231,000	14-11	30	$5,775,000	$402,000	30	$5,775,000	$288,800	No	$2,625,500
5	CC	1067836256	IZQUIERDO LUIS																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
6	CC	1003188639	JIMENEZ LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
7	CC	1003397656	LYONS YACIRA																		231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
8	CC	34998916	MAUSSA JAIDYS																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
9	CC	1104422240	MONTERROZA DANIELA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
10	CC	1003193113	MORALES BLADIMIR																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$1,500,000	$75,000	No	$666,900
11	CC	1064981749	MUÑOZ ADRIANA																		230201	30	$2,100,000	$336,000	ESSC07	30	$2,100,000	$262,500	CCF16	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$2,100,000	$105,000	No	$933,700
12	CC	73159265	POMARES JAIRO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
13	CC	1065006168	PRETELT CARLOS																		230301	30	$2,625,000	$420,000	EPS002	30	$2,625,000	$328,200	CCF16	30	$2,625,000	$105,000	14-11	30	$2,625,000	$182,700	30	$2,625,000	$131,300	No	$1,167,200
14	CC	1065014082	RAMOS JHOAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS048	30	$3,000,000	$375,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
15	CC	1003193013	RIVERO DIDIER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total	**Afiliados(15)**																						$32,400,000	$5,241,800			$32,400,000	$4,050,100			$32,400,000	$1,296,000			$32,400,000	$2,255,300		$32,400,000	$1,620,100		$14,463,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	9472959493	9472959493	E	2024/09/05	2024/09/12	BANCO DE BOGOTA	7	$14,538,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$5,241,800	$27,200	$0	$5,269,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,632,000	$8,400	$0	$1,640,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,084,000	$10,800	$0	$2,094,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,525,800	$8,000	$0	$1,533,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,255,300	$11,600	$0	$2,266,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$2,255,300	$11,600	$0	$2,266,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,296,000	$6,700	$0	$1,302,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	$1,296,000	$6,700	$0	$1,302,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	$4,050,100	$21,200	$0	$4,071,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$900	$0	$163,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$375,000	$2,000	$0	$377,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$587,500	$3,100	$0	$590,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$900	$0	$163,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$350,000	$1,800	$0	$351,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$2,125,100	$11,000	$0	$2,136,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$287,500	$1,500	$0	$289,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$972,100	$5,000	$0	$977,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$972,100	$5,000	$0	$977,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$648,000	$3,400	$0	$651,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$648,000	$3,400	$0	$651,400
TOTAL				15	$14,463,300	$75,100	$0	$14,538,400

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	457	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	207	Otras transferencias de capital - convenio Invias 924	104 de 2022	$ 16.321.717.210	$ 1.313.478.912
2023	789	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	207	Otras transferencias de capital - convenio Invias 924	104 de 2022	$ 403.558.223	$ 403.558.223
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 16.725.275.433,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ANTICIPO OTORGADO **$ 4.896.515.163,00**

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	ene-23	$ 3.966.460.659,98	$ -	$ 3.966.460.659,98	$ 1.189.938.197,99	$ 2.776.522.462	$ 3.706.576.965,01	457 - 2022	$ 8.648.679.585	$ 8.648.679.585				
2	Parcial	may-23	$ 1.960.457.514,28	$ -	$ 5.926.918.174	$ 588.137.254,28	$ 1.372.320.260	$ 3.118.439.710,72	457 - 2022	$ 7.276.359.325	$ 7.276.359.325				
3	Parcial	jul-23	$ 936.668.732	$ -	$ 6.863.586.906	$ 281.000.619,64	$ 655.668.113	$ 2.837.439.091,08	457 - 2022	$ 6.620.691.213	$ 6.620.691.213				
4	Parcial	sep-23	$ 1.070.633.986	$ -	$ 7.934.220.892,53	$ 321.190.195,84	$ 749.443.790,29	$ 2.516.248.895	457 - 2022	$ 5.871.247.422	$ 5.871.247.422				
5	Parcial	oct-23	$ 513.314.472	$ -	$ 8.447.535.364,77	$ 153.994.341,67	$ 359.320.130,57	$ 2.362.254.554	457 - 2022	$ 5.511.927.292	$ 5.511.927.292				
6	Parcial	nov-23	$ 601.283.276	$ -	$ 9.048.818.641,25	$ 180.384.982,94	$ 420.898.293,54	$ 2.181.869.571	457 - 2022	$ 5.091.028.998	$ 5.091.028.998				
7	Parcial	dic-23	$ 388.105.511	$ -	$ 9.436.924.152,47	$ 116.431.653	$ 271.673.858	$ 2.065.437.917	457 - 2022	$ 4.819.355.140	$ 4.819.355.140				
8	Parcial	feb-24	$ 1.289.781.748	$ -	$ 10.726.705.900,30	$ 515.912.699	$ 773.869.049	$ 1.549.525.218	457 - 2022	$ 4.045.486.092	$ 4.045.486.092				
9	Parcial	abr-24	$ 1.498.730.232	$ -	$ 12.225.436.132,01	$ 599.492.093	$ 899.238.139	$ 950.033.125	457 - 2022	$ 3.146.247.953	$ 3.549.806.176				
1'	Parcial	may-24	$ 801.214.892	$ -	$ 13.026.651.024,15	$ 400.607.446	$ 400.607.446	$ 549.425.679	457 - 2022	$ 2.745.640.506	$ 3.149.198.729				
11	Parcial	jun-24	$ 755.592.667,96	$ -	$ 13.782.243.692,11	$ 549.425.679	$ 206.166.989	$ -	457 - 2022	$ 2.539.473.518	$ 2.539.473.518				
12	Parcial	jul-24	$ 1.225.994.606,29	$ -	$ 15.008.238.298,40	$ -	$ 1.225.994.606	$ -	457 - 2022	$ 1.313.478.912	$ 1.717.037.135				
TOTALES			**$ 15.008.238.298**			**$ 4.896.515.163,0**	**$ 10.111.723.135**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.629.514.105	$ -	**$ 16.629.514.105**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.856.800	$ 6.052.792	**$ 37.909.592**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 57.851.736	$ -	**$ 57.851.736**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	$ -	**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 16.719.222.641	$ 6.052.792	**$ 16.725.275.433**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																Total
Seco	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24																356
Lluvias moderadas																															0
Lluvias intensas							4																								4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																360

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Luis Jerónimo Izquierdo Argel
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-175762 COR

Firma
Nombre: Nohemi Sofía Padron Torres
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-328519COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1

FECHA: 15/082024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
218	30/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	41,8 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 41,8 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 110% A LOS 28 DIAS.
218	30/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	42,5 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 42,5 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 112% A LOS 28 DIAS.
219	31/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	43,4 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 43,4 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 114% A LOS 28 DIAS.
219	3/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	40,9 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 40,9 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 108% A LOS 28 DIAS.
220	4/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	42,2 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 42,2 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 111% A LOS 28 DIAS.
220	4/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	43,5 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 43,5 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 115% A LOS 28 DIAS.
221	6/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	44,8 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 44,8 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 118% A LOS 28 DIAS.
221	6/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	46,1 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 46,1 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 121% A LOS 28 DIAS.
222	7/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	47,4 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 47,4 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 125% A LOS 28 DIAS.
222	7/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV-E-410-13	LOSA DE PAVIMENTO	1	>=38KG/CM2	48,8 KG/CM2	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 48,8 KG/CM2 CON UNA EVOLUCION DE 128% A LOS 28 DIAS.
8783	29/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3210 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3210 PSI CON UNA EVOLUCION DE 107% A LOS 28 DIAS.
8783	29/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3299 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3299 PSI CON UNA EVOLUCION DE 110% A LOS 28 DIAS.
8783	30/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3458 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3458 PSI CON UNA EVOLUCION DE 115% A LOS 28 DIAS.
8783	30/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3547 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3547 PSI CON UNA EVOLUCION DE 118% A LOS 28 DIAS.
8783	31/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3245 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3245 PSI CON UNA EVOLUCION DE 108% A LOS 28 DIAS.
8783	31/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3445 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3445 PSI CON UNA EVOLUCION DE 115% A LOS 28 DIAS.
8813	3/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3270 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3270 PSI CON UNA EVOLUCION DE 109% A LOS 28 DIAS.
8813	3/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3406 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3406 PSI CON UNA EVOLUCION DE 114% A LOS 28 DIAS.
8813	4/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3370 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3370 PSI CON UNA EVOLUCION DE 112% A LOS 28 DIAS.
8813	4/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3440 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3440 PSI CON UNA EVOLUCION DE 115% A LOS 28 DIAS.
8813	5/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3566 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3556 PSI CON UNA EVOLUCION DE 119% A LOS 28 DIAS.
8813	5/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3827 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3827 PSI CON UNA EVOLUCION DE 128% A LOS 28 DIAS.
8826	6/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3695 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3695 PSI CON UNA EVOLUCION DE 123% A LOS 28 DIAS.
8826	6/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3450 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3450 PSI CON UNA EVOLUCION DE 115% A LOS 28 DIAS.
8826	7/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3678 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3678 PSI CON UNA EVOLUCION DE 123% A LOS 28 DIAS.
8826	7/09/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3656 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3658 PSI CON UNA EVOLUCION DE 122% A LOS 28 DIAS.
8826	26/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3798 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3798 PSI CON UNA EVOLUCION DE 127% A LOS 28 DIAS.
8826	26/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3809 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3809 PSI CON UNA EVOLUCION DE 127% A LOS 28 DIAS.
9553	27/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3695 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3695 PSI CON UNA EVOLUCION DE 123% A LOS 28 DIAS.
9553	27/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3450 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3450 PSI CON UNA EVOLUCION DE 115% A LOS 28 DIAS.
9553	28/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3678 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3678 PSI CON UNA EVOLUCION DE 123% A LOS 28 DIAS.
9553	28/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3658 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3658 PSI CON UNA EVOLUCION DE 122% A LOS 28 DIAS.
9553	29/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3798 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3798 PSI CON UNA EVOLUCION DE 127% A LOS 28 DIAS.
9553	29/08/2024	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV-E-410-13	ANDENES Y CUNETAS	1	>=3000PSI	3809 PSI	SI	RESISTENCIA OBTENIDA 3809 PSI CON UNA EVOLUCION DE 127% A LOS 28 DIAS.

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: CESAR HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871	CODIGO:	LBC-002
	VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS	VERSION:	1
	NIT: 901.384.338-1	FECHA:	20/02/2022
	Kilometro 2 via cerete-san carlos	PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022
NIT:

OBRA: PAVIMENTO MARTINEZ

TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 6 +/-1"
CONTÁCTO:
FECHA DEL INFORME: 7/09/2024

N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
						DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)							
218	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	2/08/2024	30/08/2024	28	15,10	15,10	45,00	**32,00**	41,8	4,1	110	111	TERCIO MEDIO	
218	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	2/08/2024	30/08/2024	28	15,10	15,10	45,00	**32,50**	42,5	4,2	112		TERCIO MEDIO	
219	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	3/08/2024	31/08/2024	28	15,10	15,10	45,00	**33,20**	43,4	4,3	114	111	TERCIO MEDIO	
219	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	6/08/2024	3/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**31,30**	40,9	4,0	108		TERCIO MEDIO	
220	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	7/08/2024	4/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**32,30**	42,2	4,1	111	113	TERCIO MEDIO	
220	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	7/08/2024	4/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**33,30**	43,5	4,3	115		TERCIO MEDIO	
221	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	9/08/2024	6/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**34,30**	44,8	4,4	118	120	TERCIO MEDIO	
221	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	9/08/2024	6/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**35,30**	46,1	4,5	121		TERCIO MEDIO	
222	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	10/08/2024	7/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**36,30**	47,4	4,6	125	127	TERCIO MEDIO	
222	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	10/08/2024	7/09/2024	28	15,10	15,10	45,00	**37,30**	48,8	4,8	128		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZALEZ
ELABORO
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISO
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBO
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.384.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022
NIT:
OBRA: PAVIMENTO MARTINEZ
TIPO DE MEZCLA: 3000 PSI
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 6+/-1"
CONTÁCTO: CESAR HERNANDEZ
FECHA DE INFORME: 7/09/2024

N° MUESTRA	REMISION	CLIENTES	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	8783	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	1/08/2024	29/08/2024	28	10,1	80,1	180,00	224,7	22,0	3210	107	108	E	
2	8783	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	1/08/2024	29/08/2024	28	10,1	80,1	185,00	230,9	22,6	3299	110		E	
3	8783	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	2/08/2024	30/08/2024	28	10,0	78,5	190,00	241,9	23,7	3456	115	117	E	
4	8783	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	2/08/2024	30/08/2024	28	10,0	78,5	195,00	248,3	24,3	3547	118		E	
5	8783	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	3/08/2024	31/08/2024	28	10,1	80,1	182,00	227,2	22,3	3245	108	112	E	
6	8783	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	3/08/2024	31/08/2024	28	10,0	78,5	189,40	241,2	23,6	3445	115		E	
1	8813	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	6/08/2024	3/09/2024	28	10,1	80,1	183,40	228,9	22,4	3270	109	111	E	
2	8813	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	6/08/2024	3/09/2024	28	10,1	80,1	191,00	238,4	23,4	3406	114		E	
3	8813	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	7/08/2024	4/09/2024	28	10,0	78,5	185,30	235,9	23,1	3370	112	114	E	
4	8813	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	7/08/2024	4/09/2024	28	10,0	78,5	189,10	240,8	23,6	3440	115		E	
5	8813	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	8/08/2024	5/09/2024	28	10,1	80,1	200,00	249,6	24,5	3566	119	123	E	
6	8813	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	8/08/2024	5/09/2024	28	10,0	78,5	210,40	267,9	26,3	3827	128		E	
1	8826	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	9/08/2024	6/09/2024	28	10,1	80,1	207,20	258,6	25,3	3695	123	119	E	
2	8826	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	9/08/2024	6/09/2024	28	10,1	80,1	193,50	241,5	23,7	3450	115		E	
3	8826	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	10/08/2024	7/09/2024	28	10,0	78,5	202,20	257,4	25,2	3678	123	122	E	
4	8826	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	10/08/2024	7/09/2024	28	10,0	78,5	201,00	255,9	25,1	3656	122		E	
5	8826	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	12/08/2024	26/08/2024	14	10,1	80,1	213,00	265,9	26,1	3798	127	127	E	
6	8826	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	12/08/2024	26/08/2024	14	10,0	78,5	209,40	266,6	26,1	3809	127		E	
1	9553	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	13/08/2024	27/08/2024	14	10,1	80,1	207,20	258,6	25,3	3695	123	119	E	
2	9553	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	13/08/2024	27/08/2024	14	10,1	80,1	193,50	241,5	23,7	3450	115		E	
3	9553	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	14/08/2024	28/08/2024	14	10,0	78,5	202,20	257,4	25,2	3678	123	122	E	
4	9553	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	14/08/2024	28/08/2024	14	10,0	78,5	201,00	255,9	25,1	3656	122		E	
5	9553	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	15/08/2024	29/08/2024	14	10,1	80,1	213,00	265,9	26,1	3798	127	127	E	
6	9553	CONSORCIO CORDOBA 2022	3000	NORMAL	15/08/2024	29/08/2024	14	10,0	78,5	209,40	266,6	26,1	3809	127		E	

PEDRO GONZALEZ
ELABORO
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISO
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBO
INGENIERA DE CALIDAD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 15 DE AGOSTO DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.725.275.433,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.909.592,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.909.592,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	31/5/2022	31/5/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	31/5/2022	31/1/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	31/5/2022	31/7/2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	31/5/2022	31/5/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta recibo satisfacción	5 años a partir de acta recibo satisfacción

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	31/5/2022	31/7/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25 7 2022	27 3 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 7 2022	27 3 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25 7 2022	24 9 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25 7 2022	24 9 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25 7 2022	27 3 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 7 2022	27 3 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25 7 2022	24 9 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25 7 2022	25 7 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	24	9	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	30	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	30	6	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25/7/2022	30/9/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/7/2022	30/9/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.345.055.086,60	25/7/2022	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25/7/2022	25/7/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.017.582.629,90	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 6 y 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 836.263.771,65	25/7/2022	31/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 6 y 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25/7/2022	1/11/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	18/3/2024	1/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 3.345.055.086,60	25/7/2022	1/5/2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25/7/2022	25/7/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.017.582.629,90	5 años a partir de acta	5 años a partir de acta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 836.263.771,65	25/7/2022	1/5/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25	7	2022	1	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 3.345.055.086,60	25	7	2022	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.017.582.629,90	5 años a partir de acta			5 años a partir de acta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 836.263.771,65	25	7	2022	30	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.672.527.543,30	25	7	2022	15	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	15	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 3.345.055.086,60	25	7	2022	15	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.017.582.629,90	5 años a partir de acta			5 años a partir de acta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	15	8	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 836.263.771,65	25	7	2022	15	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

POLIZA No. 96-44-101172752 **FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/07/2024**

INICIAL: ☐ **MODIFICACION:** X
ANEXO No 11

CONTRATISTA: **CONSORCIO CÓRDOBA 2022**
CÉDULA/NIT: **901.598.916-6**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- COLOMBIA RURAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL TRECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.321.717.210,00).

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRI ENTE. ($403.558.223,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL SETENCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOS-CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA – Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($16.725.275.433,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato	$1,672,527,543.30	25/07/2022	15/02/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCIÓN DEL ANTICIPO	Hasta la liquidación del contrato.	$4,896,515,163.00	25/07/2022	15/02/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Plazo del contrato y 3 años mas	$3,345,055,086.60	25/07/2022	15/08/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Cinco años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de la obra	$5,017,582,629.90	24/09/2022	24/09/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de aprobación	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de seguro de Cumplimiento No. **96-44-101172752**, se aprueba la actualización de la garantía de acuerdo al acta de suspensión No. 2 de fecha 28 junio de 2024, acta de reinicio No.2 de fecha 06 julio, y contrato de prórroga No 6 de fecha de 8 de julio de 2024, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, en el contrato de obra pública No.104 de fecha 31 de mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de julio de 2024.

ANGELICA MARÍA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Juan Manuel Petro López- Judicante

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

POLIZA No. 96-40-101061054 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 15/07/2024

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [X]
ANEXO No 9

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
CÉDULA/NIT: 901.598.916-6

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- COLOMBIA RURAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL TRECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE. ($16.321.717.210,00).

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($403.558.223,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL SETENCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($16.725.275.433,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$334.505.508,66	25/07/2022	15/08/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
GASTOS MEDICOS	$334.505.508,66	25/07/2022	15/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. **96-40-101061054**, se aprueba la actualización de la garantía de acuerdo al acta de suspensión No. 2 de fecha 28 junio de 2024, acta de reinicio No.2 de fecha 06 julio, y contrato de prórroga No 6 de fecha de 8 de julio de 2024, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, en el contrato de obra pública No.104 de fecha 31 de mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de julio de 2024.

ANGÉLICA MARÍA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Juan Manuel Petro López- Judicante

Montería, 22 de julio de 2024

OFIC-CC2022-173

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETÉ
JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de pólizas

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de las pólizas correspondientes a la prorroga N° 6 del contrato de la referencia y solicitar la aprobación de las mismas.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6	CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5	CLL 14 NRO 12-41	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$334,505,508.66	$334,505,508.66

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024, ACTA DE REINICIO No. 2 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, Y CONTRATO DE PRORROGA No. 06 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****505,882.00	$ *******3,000.00	$ ******96,687.00	$ **********605,569.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 14 NRO 12-41	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$334,505,508.66	$334,505,508.66
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO	7746037

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · SUPERMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****505,882.00	$ *******3,000.00	$ ******96,687.00	$ **********605,569.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014112013181(3900)000000605569(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411201318-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORDOBA 2022			NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CERETE			NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO:	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2024	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 14 NRO 12-41	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2022	15/02/2025	$1,672,527,543.30	$1,672,527,543.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/07/2022	15/02/2025	$4,896,515,163.00	$4,896,515,163.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022	15/08/2027	$3,345,055,086.60	$3,345,055,086.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/09/2022	24/09/2027	$5,017,582,629.90	$5,017,582,629.90
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2022	25/07/2027	$9,557,040.00	$9,557,040.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024, ACTA DE REINICIO No. 2 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, Y CONTRATO DE PRORROGA No. 06 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,614,258.00	$ *******8,000.00	$ *****498,229.00	$ *********3,120,487.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2024	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO	7746037
ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER Bancolombia éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,614,258.00	$ *******8,000.00	$ *****498,229.00	$ *********3,120,487.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014112023500(3900)000003120487(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411202350-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2024	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 14 NRO 12-41	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056516 74

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056516741

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
22/07/2024 03:49p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO CORDOBA 2022 — NIT. 901.598.916

LA SUMA DE: Tres millones ciento veinte mil cuatrocientos ochenta y siete pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101172752

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-44-101172752-11-1	$2,622,258.00		$498,229.00	$3,120,487.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 3,120,487.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 3,120,487.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005651674

TOTAL: $3,120,487.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/22/2024 4:17:40PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056516 77

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056516773

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
22/07/2024 03:49p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO CORDOBA 2022 — NIT. 901.598.916

LA SUMA DE: Seiscientos cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101061054

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-40-101061054-9-1	$508,881.00		$96,688.00	$605,569.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 605,569.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 605,569.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005651677

TOTAL: $605,569.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/22/2024 4:17:28PM

172.16.10.23

ALCALDÍA DE CERETÉ

República de Colombia

MUNICIPIO DE CERETE
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 800096744

DE CORAZÓN con la gente

VERSIÓN	1			
PÁGINA	1	DE	1	
FECHA	22	9	2022	

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE CERETE

DATOS GENERALES

CONTRATO 104 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B
SUPERVISOR DE CONTRATO:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	POR DEFINIR
PRESUPUESTO:	$16.321.717.210,00
ANTICIPO 30%	$4.896.515.163,00

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe invertir en forma directa y de manera de inequívoca en el objeto contractual con sujeción a este plan de manejo e inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR TOTAL	%
1	Movimiento de tierra y suministro de agregados	$ 500.000.000,00	$ 200.000.000,00					$ 700.000.000,00	14,3%
2	Compra de Materiales	$ 1.000.000.000,00	$ 550.000.000,00					$ 1.550.000.000,00	31,7%
3	Obras en concreto Hidraulico para estructuras y suministro e instalacion de pavimento	$ 1.550.000.000,00	$ 1.096.515.163,00					$ 2.646.515.163,00	54,05%
	TOTAL	**$ 3.050.000.000,00**	**$ 1.846.515.163,00**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.896.515.163,00**	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

b) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

(Firma)
Contratista: ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO
CONSORCIO CORDOBA 2022
Contratista

(Firma)
Interventoria: JHULIANA SARMIENTO GARCIA
CONSORCIO ACI-3B
R/L interventoria

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	28/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** 26/07/2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.225.994.606,29

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 104-2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI 3B

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 22 DE MARZO DE 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28 DE JUNIO DE 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16.321.717.210,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16.725.275.433,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 15 DE AGOSTO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE AGOSTO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 1: 22 DE ABRIL DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 2: 06 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 403.558.223,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 JULIO DE 2024	2 AGOSTO DE 2024	3	4	5	6	7	8	9	10	%
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	
1. EXPLANACIONES	$632.336	3,90%	2,79%	% P	2,07%	0,83%									100,0%
	$82.118	0,51%	$453.405	$ P	$ 57.482,53	$ 24.835,32									
				$ E	1,51%										
				% E	$41907,81929										
2. SUBBASES	$4.183.064	25,78%	22,74%	% P	3,90%	0,00%									87,5%
	$108.301	0,67%	$3.689.879	$ P	$ 108.301,00	$ (0,00)									
				$ E	1,75%										
				% E	$48637,38005										
3. PAVIMENTOS DE CONCRETO	$8.931.471	55,04%	51,12%	% P	24,36%	0,00%									75,0%
	$676.484	4,17%	$8.293.900	$ P	$ 676.484,37	$ (0,00)									
				$ E	23,30%										
				% E	$647019,53092										
4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE	$1.016.323	6,26%	1,43%	% P	14,37%	14,39%									62,5%
	$798.806	4,92%	$232.553	$ P	$ 399.133,22	$ 399.673,22									
				$ E	3,19%										
				% E	$88643,76962										
5. TRANSPORTE	$1.265.519	7,80%	5,05%	% P	1,05%	0,45%									50,0%
	$41.820	0,26%	$819.194	$ P	$ 29.274,02	$ 12.546,01									
				$ E	0,94%										
				% E	$26934,31092										
6. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$191.866	1,18%	0,00%	% P		7,19%									37,5%
	$199.704	1,23%		$ P		$ 199.703,93									
				$ E											
				% E											
7. CARACTERIZACION VIAL	$5.376	0,03%	0,00%	% P		0,21%									25,0%
	$5.694	0,04%		$ P		$ 5.693,80									
8. ITEMS NO PREVISTOS			2,60%	% P	20,88%	10,14%									12,5%
	$861.603	5,31%	$421.217	$ P	$ 579.961,54	$ 281.641,03									
				$ E	13,53%										
				% E	$375678,74054										
9. ANDENES			0,00%	% P		0,10%									12,5%
	$2.687	0,02%		$ P		$ 2.686,63									
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 16.225.955,882	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA PROGRAMADO ACTUALIZADO (A')	**$ 2.777.216,651**	17%													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

11.559.148,66
5.128.217,18

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**66,64%**	**33,36%**									0,0%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.850.637**	**$926.580**									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**97,37%**	**602,23%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$15.798.695**	**$16.725.275**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**44,24%**	**22,90%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.228.642**	**$635.884**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**93,53%**	**83,17%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$15.176.700**	**$15.812.584**									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se presentó reprogramación de inversiones en mayo por prórroga 5

Aprueba Firma
Nombre: César Hernández López
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR

Aprueba Firma:
Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 15-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA JNU512, MARCA TOYOTA- HILUX - MODELO 2020	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
MOTOCICLETA	QWP-11G	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
MOTOCICLETA	WZK74E	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																			

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI - 3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: del 01 de Agosto al 15 de Agosto 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2021 Y 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría	$ 3.250.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 3.250.000,00	$ 226.200	V	SANITAS	9472742746	$ 130.000,00	PORVENIR	9472742746	$ 520.000	$ 130.000			
2	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría-Martinez 104	$ 2.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 2.300.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9472742746	$ 184.000,00	PORVENIR	9472742746	$ 368.000	$ 184.000			
3	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 1.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 1.600.000,00	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9472742746	$ 128.000,00	PROTECCION	9472742746	$ 256.000	$ 128.000			
4	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 1.750.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 1.750.000,00	$ 121.800	V	NUEVA EPS	9470107368	$ 162.500,00	PORVENIR	9470107368	$ 208.000	$ 162.500			
5	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40,049,480	Profesional Ambiental	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 2.000.000,00	$ 278.400	V	SANITAS	9472742746	$ 135.800,00	PORVENIR	9472742746	$ 543.000	$ 135.800			
6	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 1.050.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 1.050.000,00	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9472742746	$ 42.000,00	PORVENIR	9472742746	$ 168.000	$ 42.000			
7	Osvaldo Damian Mestra Ortiz	1.064.978.792	Inspector Tecnico	$ 1.050.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 1.050.000,00	$ 146.200	V	SALUD TOTAL	9472742746	$ 42.000,00	PORVENIR	9472742746	$ 33.600	$ 42.000			
8	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 507.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%		$ 507.500,00	$ 6.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9472742746	$ 52.000,00	PORVENIR	9472742746	$ 208.000	$ 52.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18.232.500,00																																$ 17.445.000,00	$ 3.433.110,00				$ 3.491.300,00			$ 5.858.200,00	$ 3.776.000,00			

El Interventor adjunta la certificación de fecha del 01 de Agosto al 15 de Agosto 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	IEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

MES INFORME MENSUAL: del 01 de Agosto al 15 de Agosto 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No: 104 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 242.430.000,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 1.588.100.773,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Principal	$ 100.000.000,00
2022	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	Nación	Adicional No. 1	$ 730.945.286,00
2022	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 109.747.200,00
2022	1197722	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 124.572.800,00
2023	1385323	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 2	$ 230.000.000,00
2023	1385323	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 2	$ 20.000.000,00
2024	437524	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 3	$ 270.000.000,00
2024	437524	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 3	$ 30.000.000,00
		TOTAL				**3.445.796.059,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.445.796.059,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 242.430.000,00**			
1	**ene-22**	$ 456.300,00	$ 86.697,00	$ 542.997,00	$ 542.997,00	$ 542.997,00	1084921 - 30/12/2021	$ 241.887.003,00	$ 3.445.253.062,00		
2	**feb-22**	$ 39.956.820,00	$ 7.591.796,00	$ 47.548.616,00	$ 47.548.616,00	$ 47.548.616,00	1084921 - 30/12/2021	$ 194.338.387,00	$ 3.397.704.446,00		
3	**mar-22**	$ 61.066.163,00	$ 11.602.571,00	$ 72.668.734,00	$ 72.668.734,00	$ 72.668.734,00	1084921 - 30/12/2021	$ 121.669.653,00	$ 3.325.035.712,00		
4	**abr-22**	$ 88.928.160,00	$ 16.896.350,00	$ 105.824.510,00	$ 105.824.510,00	$ 105.824.510,00	1084921 - 30/12/2021	$ 15.845.143,00	$ 3.219.211.202,00		
5	**may-22**	$ 13.315.246,00	$ 2.529.897,00	$ 15.845.143,00	$ 15.845.143,00	$ 15.845.143,00	1084921 - 30/12/2021	$ -	$ 3.203.366.059,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 100.000.000,00**			
5	**may-22**	$ 78.131.354,00	$ 14.844.957,00	$ 92.976.311,00	$ 92.976.311,00	$ 92.976.311,00	280222 - 23/02/2022	$ 7.023.689,00	$ 3.110.389.748,00		
6	**jun-22**	$ 5.902.260,00	$ 1.121.429,00	$ 7.023.689,00	$ 7.023.689,00	$ 7.023.689,00	280222 - 23/02/2022	$ -	$ 3.103.366.059,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 1.588.100.773,00**			
6	**jun-22**	$ 94.536.797,00	$ 17.961.992,00	$ 112.498.789,00	$ 112.498.789,00	$ 112.498.789,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.475.601.984,00	$ 2.990.867.270,00		
7	**jul-22**	$ 101.134.200,00	$ 19.215.498,00	$ 120.349.698,00	$ 120.349.698,00	$ 120.349.698,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.355.252.286,00	$ 2.870.517.572,00		
8	**ago-22**	$ 113.107.700,00	$ 21.490.463,00	$ 134.598.163,00	$ 134.598.163,00	$ 134.598.163,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.220.654.123,00	$ 2.735.919.409,00		
9	**sep-22**	$ 105.579.070,00	$ 20.060.023,30	$ 125.639.093,00	$ 125.639.093,00	$ 125.639.093,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.095.015.030,00	$ 2.610.280.316,00		
10	**oct-22**	$ 121.465.020,00	$ 23.078.354,00	$ 144.543.374,00	$ 144.543.374,00	$ 144.543.374,00	280222 - 23/02/2022	$ 950.471.656,00	$ 2.465.736.942,00		
11	**nov-22**	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	280222 - 23/02/2022	$ 801.197.223,00	$ 2.316.462.509,00		
12	**dic-22**	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	280222 - 23/02/2022	$ 651.922.790,00	$ 2.167.188.076,00		
13	**ene-23**	$ 125.412.700,00	$ 23.828.413,00	$ 149.241.113,00	$ 149.241.113,00	$ 149.241.113,00	280222 - 23/02/2022	$ 502.681.677,00	$ 2.017.946.963,00		
14	**feb-23**	$ 126.773.730,00	$ 24.087.009,00	$ 150.860.739,00	$ 150.860.739,00	$ 150.860.739,00	280222 - 23/02/2022	$ 351.820.938,00	$ 1.867.086.224,00		
15	**mar-23**	$ 127.781.080,00	$ 24.278.405,20	$ 152.059.485,00	$ 152.059.485,00	$ 152.059.485,00	280222 - 23/02/2022	$ 199.761.453,00	$ 1.715.026.739,00		
16	**abr-23**	$ 126.132.000,00	$ 23.965.080,00	$ 150.097.080,00	$ 150.097.080,00	$ 150.097.080,00	280222 - 23/02/2022	$ 49.664.373,00	$ 1.564.929.659,00		
17	**may-23**	$ 41.734.765,55	$ 7.929.605,46	$ 49.664.372,00	$ 49.664.372,00	$ 49.664.372,00	280222 - 23/02/2022	$ 1,00	$ 1.515.265.287,00		
18	**jun-23**	$ 1,65	$ 0,32	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,00	280222 - 23/02/2022	$ (1,00)	$ 1.515.265.285,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 109.747.200,00**			
17	**may-23**	$ 75.832.284,45	$ 14.408.134,05	$ 90.240.418,00	$ 90.240.418,00	$ 90.240.418,00	1197722 - 16/11/2022	$ 19.506.782,00	$ 1.425.024.869,00		
18	**jun-23**	$ 16.392.252,62	$ 3.114.528,00	$ 19.506.781,00	$ 19.506.781,00	$ 19.506.781,00	1197722 - 16/11/2022	$ 1,00	$ 1.405.518.088,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 124.572.800,00**			
18	**jun-23**	$ 98.480.245,73	$ 18.711.246,69	$ 117.191.493,00	$ 117.191.493,00	$ 117.191.493,00	1197722 - 16/11/2022	$ 7.381.307,00	$ 1.288.326.595,00		
19	**jul-23**	$ 6.202.779,83	$ 1.178.528,17	$ 7.381.308,00	$ 7.381.308,00	$ 7.381.308,00	1197722 - 16/11/2022	$ (1,00)	$ 1.280.945.287,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 730.945.286,00**			
19	**jul-23**	$ 97.360.220,17	$ 18.498.441,84	$ 115.858.662,00	$ 115.858.662,00	$ 115.858.662,00	1197722 - 16/11/2022	$ 615.086.624,00	$ 1.165.086.623,00		
20	**ago-23**	$ 110.892.900,00	$ 21.069.651,00	$ 131.962.551,00	$ 131.962.551,00	$ 131.962.551,00	1197722 - 16/11/2022	$ 483.124.073,00	$ 1.033.124.072,00		
21	**sep-23**	$ 103.549.900,00	$ 19.674.481,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	1197722 - 16/11/2022	$ 359.899.692,00	$ 909.899.691,00		
22	**oct-23**	$ 103.549.900,00	$ 19.674.481,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	1197722 - 16/11/2022	$ 236.675.311,00	$ 786.675.310,00		
23	**nov-23**	$ 89.508.160,00	$ 17.006.550,40	$ 106.514.710,00	$ 106.514.710,00	$ 106.514.710,00	1197722 - 16/11/2022	$ 130.160.601,00	$ 680.160.600,00		
24	**dic-23**	$ 109.343.060,00	$ 20.775.181,40	$ 130.118.241,00	$ 130.118.241,00	$ 130.118.241,00	1197722 - 16/11/2022	$ 42.360,00	$ 550.042.359,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 230.000.000,00**			
25	**ene-24**	$ 66.127.740,00	$ 12.564.270,60	$ 78.692.011,00	$ 78.692.011,00	$ 78.692.011,00	1385323 - 27/10/2023	$ 151.307.989,00	$ 471.350.348,00		
26	**feb-24**	$ 65.487.750,00	$ 12.442.672,50	$ 77.930.423,00	$ 77.930.423,00	$ 77.930.423,00	1385323 - 27/10/2023	$ 73.377.566,00	$ 393.419.925,00		
27	**mar-24**	$ 53.750.903,00	$ 10.212.671,57	$ 63.963.575,00	$ 63.963.575,00	$ 63.963.575,00	1385323 - 27/10/2023	$ 9.413.991,00	$ 329.456.350,00		
28	**abr-24**	$ 7.910.917,00	$ 1.503.074,23	$ 9.413.991,00	$ 9.413.991,00	$ 9.413.991,00	1385323 - 27/10/2023	$ -	$ 320.042.359,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 20.000.000,00**			
28	**abr-24**	$ 15.382.160,00	$ 2.922.610,40	$ 18.304.771,00	$ 18.304.771,00	$ 18.304.771,00	1385323 - 27/10/2023	$ 1.695.229,00	$ 301.737.588,00		
29	**may-24**	$ 1.424.562,18	$ 270.666,82	$ 1.695.229,00	$ 1.695.229,00	$ 1.695.229,00	437524 - 20/05/2024	$ -	$ 300.042.359,00		
				C-2402-0600-12-51102A-2402041-02				**$ 270.000.000,00**			
29	**may-24**	$ 64.655.537,80	$ 12.284.552,19	$ 76.940.090,00	$ 76.940.090,00	$ 76.940.090,00	437524 - 20/05/2024	$ 193.059.910,00	$ 223.102.269,00		
30	**jun-24**	$ 64.621.990,00	$ 12.278.178,00	$ 76.900.168,00	$ 76.900.168,00	$ 76.900.168,00	437524 - 20/05/2024	$ 116.159.742,00	$ 146.202.101,00		
31	**jul-24**	$ 69.246.137,00	$ 13.156.766,00	$ 82.402.903,00	$ 82.402.903,00	$ 82.402.903,00	437524 - 20/05/2024	$ 33.756.839,00	$ 63.799.198,00		
32	**ago-24**	$ 28.367.091,60	$ 5.389.747,00	$ 33.756.839,00	$ 33.756.839,00	$ 33.756.839,00	437524 - 20/05/2024	$ -	$ 30.042.359,00		
				C-2402-0600-12-51102A-2402112-02				**$ 30.000.000,00**			
32	**ago-24**	$ 23.870.358,40	$ 4.535.368,00	$ 28.405.726,00	$ 28.405.726,00	$ 28.405.726,00	437524 - 20/05/2024	$ 1.594.274,00	$ 1.636.633,00		
	TOTALES	**$ 2.894.251.617,00**	**$ 549.907.807,00**	**$ 3.444.159.426,00**	**$ 3.444.159.426,00**	**$ 28.405.726,00**		**$ 1.636.633,00**	**$ 1.636.633,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 2.420.796.807	$ 459.951.394	$ 2.880.748.201
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 473.454.810	$ 89.956.414	$ 563.411.226
*			
VALOR TOTAL	$ 2.894.251.617	$ 549.907.810	$ 3.444.159.427

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matricula No. : 54202-145218 NTS

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No. 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 15-ago-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 2.480.530.773,00
VALOR ACUMULADO: $ 3.445.796.059,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	29	12	2021	31	1	2023
Calidad del servicio	30%	$ 579.159.232,00	31	7	2022	31	7	2027
Cumplimiento de Servicio	10%	$ 193.053.077,00	20	12	2021	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.106.155,00	29	12	2021	31	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551–6
Certificado de modificación o anexo No.: 14009077
(ción o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/01/2022

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 289.579.212,00	27	1	2022	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 579.159.212,00	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 868.738.818,00	1	7	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6
Certificado de modificación o anexo No.: 14401977
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/10/2022

OBSERVACIONES: Modificación por prórroga 1

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 289.579.606,00	27	1	2022	30	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	30	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 579.159.212,00	27	1	2022	30	6	2026
Calidad del servicio	30%	$ 868.738.818,00	31	12	2022	30	6	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6
Certificado de modificación o anexo No.: 14737002
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/06/2023

OBSERVACIONES: Modificación por prórroga 2 y adición 1

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 289.579.606,00	27	1	2022	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 579.159.212,00	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 868.738.818,00	1	7	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.: 15150057
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/07/2023

OBSERVACIONES:
Modificación por prórroga 3

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	1	2022	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.: 15446868
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/12/2023

OBSERVACIONES:
Modificación por adición 2

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	1	2022	1	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	1	2022	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.: 15490854
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/01/2024

OBSERVACIONES:
Modificación por prórroga 4

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	2	2022	1	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	2	2022	1	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	2	2022	1	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	1	5	2024	1	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.: 15639494
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/05/2024

OBSERVACIONES:
Modificación por supensión 1, adición 3 y prórroga 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 15-ago-24
(Día / Mes / Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 344.579.605,90	27	2	2022	24	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	2	2022	24	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 689.159.211,80	27	2	2022	25	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 1.033.738.817,70	25	8	2024	25	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.: 15816187
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañia Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Modificación por suspensión 2 y prórroga 6

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA:

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 1
La modificación vía cobro Sobre de Tarifa corresponde conforme a Otros Ítems
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

GRUPO 6 (FLOTILLA): [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible]
OBJETO: [illegible]
INTERVENTOR: [illegible]
SUPERVISIÓN DE CONTRATO INTERVENTORÍA: [illegible]
TARIFA VIGENTE No.: [illegible]

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [illegible]
FECHA DE SUSPENSIÓN: [illegible]
FECHA DE REANUDACIÓN: [illegible]
VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): [illegible]
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($): [illegible]

PLAZO INICIAL: [illegible]
PLAZO ACUMULADO: [illegible]
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: [illegible]
FECHA DE TERMINACIÓN: [illegible]
VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($): [illegible]

FECHA DE ACTA DE EJECUTORIA: 20/1/22 (ESAL); 1/04/22 (CONCESIONES)
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL CONCESIONES RUTEADAS CONTRATO 2021 CONSORCIO CONCESIONES

No. de Ítem	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y GASTOS			CONDICIONES ACTA INTERVENTORÍA, Fecha Corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		AÑO 2022																								AÑO 2023												TOTAL
			Dotación de Personal	Horas Mensuales	Total Dedicación Mensual Horas (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Periodo	Costos de Personal	Horas Mensuales	Participación (H-M)	Valor Total ($)	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		
												H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	H-M	Valor($)	
		PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO																																																		
		Director					Local																																															
1	1	Director de Interventoría	$ 8.000.000,00		0,00	$ 384.000.000,00	2022	$ 8.000.000,00		48,00	$ 192.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 5 de agosto de 2024

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: EMPOZAMIENTO TRAMO T16 Y SOCAVACIÓN TRAMO A7

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Respetado Ingeniero,

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría requiere al Consorcio Córdoba 2022 hacer entrega de las propuestas de solución técnica a los siguientes dos puntos:

1. **TRAMO T16:** se presentan empozamientos en los PR 0+110 y el PR 0+140. (Ver imagen 1 y 2)



Ilustración 1- PR 0+140

CONSORCIO ACI-3B



2. **TRAMO A7:** Debido que se realizó y se dejó abierta mucho tiempo la excavación para andén cuneta en el tramo en mención, a pesar que la interventoría fue muy insistente en darle celeridad a dicha actividad, se presentó socavación en la subbase y afirmado de la estructura de pavimento en un ancho aproximado de 25 cm desde el borde (ver imagen 3):



Ilustración 3

CONSORCIO ACI-3B

Se requiere que se dé respuesta a este comunicado a más tardar el día martes 06 de agosto, teniendo en cuenta que a la fecha de este documento estamos a 10 días de la fecha de finalización del contrato.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
5/08/2024 7:53:28 a. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 5 de agosto de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: ALERTA POR INCREMENTO EN ATRASO E INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Respetado Ingeniero,

En nuestro seguimiento y control del contrato de la referencia, esta interventoría se permite notificar al CONSORCIO CORDOBA 2022 el incremento del atraso de la última reprogramación y el incumplimiento de los compromisos pactados en el acta de comité de obra del 31 de julio de 2024, los cuales se resumen a continuación:

1. I**nicio de Señalización horizontal y vertical de fecha 05 de agosto de 2024,** dicho compromiso al estar por finalizar la jornada y luego de verificar en todos los tramos del contrato, se pudo apreciar que no existen cuadrillas de limpieza ni de instalación de señales verticales; motivo por el cual vemos con preocupación que esta actividad no se dé por iniciada a tan solo 10 días de finalizar el contrato y con una longitud de aprox. 8 km que se deben intervenir.

2. **Entrega del plan de contingencia de fecha 02 de agosto de 2024**, teniendo en cuenta el atraso que presenta el proyecto el cual al último corte de fecha 01 de agosto de 2024 es del **3,24%** es de vital importancia que se presente dicho documento en máximo un dia (1) con el fin de subsanar las demoras en algunas actividades y de incrementar el rendimiento de los frentes de trabajo.

En este momento la ruta crítica del proyecto siguen siendo las estructuras de cuneta anden, las cuales en análisis financiero realizado por esta interventoria arrojo los siguientes datos:
Ejecutado acumulado: $ 309.547.331,83 y valor del capítulo de Anden cuneta: $ 946.082.168,96 lo que nos muestra un % ejecutado de 32,72% y un faltante de 67,28%, los cuales con un rendimiento optimo puede ser ejecutado en el plazo restante.

En cuanto al total programado tenemos un 93,86% equivalente a $15.698.055.866,72 y un ejecutado del 90,62% equivalente a $ 15.155.785.727,81 para un atraso del 3,24% equivalente a $ 542.287.138,91.

CONSORCIO ACI-3B

Por tal motivo solicitamos de manera muy atenta se aumenten los rendimientos en obra, se dupliquen las horas laborales y se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento al cronograma de obra en el plazo señalado.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
5/08/2024 6:10:39 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - GESTOR TECNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co
SEGUROS DEL ESTADO - AREA JURIDICA - juridico@segurosdelestado.com

Copia interna:
Sandra Janneth Hernandez Martinez - Gerente Técnico de Infraestructura
Israel Anderson Rojas Mosquera - Gestor Jurídico De Proyectos
Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia - Director Jurídico
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Montería, 8 de agosto de 2024

OFIC-CC2022-176

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETÉ
JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato de la referencia.

Cordial saludo,

De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de reiterar las dificultades que se han venido presentando en la ejecución de la construcción del sistema hidráulico (cuneta anden) el cual garantizará el drenaje de las aguas lluvias en el sector 20 de julio y Alberto saibis.

Como es de su conocimiento nuestra firma contratista actualmente tiene 7 frentes de trabajo en la construcción de la cuneta anden, pero el estancamiento de las aguas por el lento drenaje durante y después de las lluvias ha impactado significativamente el rendimiento de dichas cuadrillas, esto se debe que la alcaldía municipal no ha podido terminar la limpieza de los canales de evacuación del sistema hidráulico en construcción, generando un represamiento aguas arriba donde se adelantan dichos trabajos.

Este retraso de las actividades de la alcaldía se deriva de la negativa de uno de los propietarios en permitir la limpieza del canal en su predio, es de aclarar que dicho propietario ya había manifestado que permitiría dicha limpieza.

Por lo expresado anteriormente y dadas las dificultades manifiestas, las cuales son verificables en obra y no son imputables a nuestra firma contratista, de manera comedida solicitamos suspensión del contrato de la referencia desde el día lunes 12 de agosto y por un término de 15 días o hasta que se subsanen por parte del municipio la terminación de las actividades de limpieza de los canales de drenaje y así poder garantizar la culminación de las actividades de obra.

Nota: Se anexa registro fotográfico.

Agradezco su atención

Cordialmente;



CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022





CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba



CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 15 de agosto de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Entrega de documentación para cierre social.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 104 - 2022, solicita que se realice la entrega de los siguientes documentos correspondientes al cierre social.

- Consolidado de actas de vecindad de inicio y cierre
- Certificación de la personería de no pasivos sociales
- Formatos correspondientes al informe mensual (INVIAS)
- Acta de recibo de la comunidad

Lo anterior teniendo en cuenta que contractualmente hoy, 15 de agosto, finalizan las actividades de obra, por lo tanto se solicita organizar y remitir la documentación requerida en un plazo no superior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/08/2024 2:46:33 p. m.

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 15 de agosto de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud informe gestión ambiental agosto de 2024 (1 al 15) y balance ambiental a la terminación del contrato de obra.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente, el consorcio ACI-3B en cumplimiento a las labores de seguimiento y control ejercidas al contrato de obra N° 104-2022 y teniendo en cuenta la finalización del plazo contractual del mismo; se permite solicitar de manera formal el informe de gestión ambiental del periodo comprendido entre el primero (1) y quince (15) de agosto de la presente anualidad, y el balance ambiental a la terminación del contrato de obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-1), con sus respectivos anexos.

Cabe aclarar que el balance ambiental a la terminación del contrato de obra, hace parte de los documentos que conforman el expediente para la liquidación del contrato; por tanto, es preciso que se allegue todo lo requerido a fin de poder emitir por parte de esta interventoría el certificado de NO PASIVOS AMBIENTALES y proceder a remitir el respectivo cierre ambiental a la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS.

Por lo anterior, se solicita al contratista CONSORCIO CORDOBA 2022 realizar el envío de lo requerido en un plazo no mayor a (5) días hábiles contados a partir del recibido de la presente comunicación.

Agradecemos su gestión y pronta respuesta.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/08/2024 4:52:28 p. m.

Folios: 2

CONSORCIO ACI-3B

Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 17 de agosto de 2024

Señora
YEIMI ALEXANDRA MELO MERCHAN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Yeimi.Melo@segurosdelestado.com

Asunto: ENTREGA DE POLIZAS CONTRATO 104-22 CONSORCIO CORDOBA 2022.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada vía correo electrónico de fecha viernes 16 de agosto de 2024, se adjunta a este oficio la ultima póliza expedida por Seguros del Estado S.A con su respectiva aprobación por parte del ente contratante.

Quedamos prestos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Folios: 1
Anexo: 1
Nombre anexos: Aprobacion polizas reinicio 2 y prorroga 6.pdf

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
17/08/2024 9:22:09 a. m.

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co

Copia interna:
Gustavo Andres Calderon Perdomo - Coordinador de Proyecto
Sandra Janneth Hernandez Martinez - Gerente Técnico de Infraestructura
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

POLIZA No. 96-44-101172752 **FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/07/2024**

INICIAL: ☐ **MODIFICACION:** X
ANEXO No 11

CONTRATISTA: **CONSORCIO CÓRDOBA 2022**
CÉDULA/NIT: **901.598.916-6**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- COLOMBIA RURAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL TRECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.321.717.210,00).

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRI ENTE. ($403.558.223,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL SETENCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOS-CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA – Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($16.725.275.433,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato	$1,672,527,543.30	25/07/2022	15/02/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERCIÓN DEL ANTICIPO	Hasta la liquidación del contrato.	$4,896,515,163.00	25/07/2022	15/02/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Plazo del contrato y 3 años mas	$3,345,055,086.60	25/07/2022	15/08/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Cinco años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de la obra	$5,017,582,629.90	24/09/2022	24/09/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de aprobación	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de seguro de Cumplimiento No. **96-44-101172752**, se aprueba la actualización de la garantía de acuerdo al acta de suspensión No. 2 de fecha 28 junio de 2024, acta de reinicio No.2 de fecha 06 julio, y contrato de prórroga No 6 de fecha de 8 de julio de 2024, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, en el contrato de obra pública No.104 de fecha 31 de mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de julio de 2024.

ANGELICA MARÍA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Juan Manuel Petro López- Judicante

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

POLIZA No. 96-40-101061054 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 15/07/2024

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [X]
ANEXO No 9

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
CÉDULA/NIT: 901.598.916-6

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- COLOMBIA RURAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL TRECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE. ($16.321.717.210,00).

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($403.558.223,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISEIS MIL SETENCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($16.725.275.433,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$334.505.508,66	25/07/2022	15/08/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024
GASTOS MEDICOS	$334.505.508,66	25/07/2022	15/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$836.263.771,65	25/07/2022	15/08/2024

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. **96-40-101061054**, se aprueba la actualización de la garantía de acuerdo al acta de suspensión No. 2 de fecha 28 junio de 2024, acta de reinicio No.2 de fecha 06 julio, y contrato de prórroga No 6 de fecha de 8 de julio de 2024, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, en el contrato de obra pública No.104 de fecha 31 de mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de julio de 2024.

ANGÉLICA MARÍA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Juan Manuel Petro López- Judicante

Montería, 22 de julio de 2024

OFIC-CC2022-173

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETÉ
JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Entrega de pólizas

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de manera atenta, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de las pólizas correspondientes a la prorroga N° 6 del contrato de la referencia y solicitar la aprobación de las mismas.

Cordialmente;

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6	3185162227

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 | CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5	7746037

DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41 | CIUDAD: CERETE, CORDOBA

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$334,505,508.66	$334,505,508.66

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024, ACTA DE REINICIO No. 2 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, Y CONTRATO DE PRORROGA No. 06 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****505,882.00	$ *******3,000.00	$ ******96,687.00	$ **********605,569.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCION: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELEFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$334,505,508.66	$334,505,508.66
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	15/08/2024	$836,263,771.65	$836,263,771.65

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO	7746037

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · SUPERMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****505,882.00	$ *******3,000.00	$ ******96,687.00	$ **********605,569.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014112013181(3900)000000605569(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411201318-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2024	25	07	2022	00:00	15	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORDOBA 2022			NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CERETE			NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO:	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2024	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 14 NRO 12-41	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2022	15/02/2025	$1,672,527,543.30	$1,672,527,543.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/07/2022	15/02/2025	$4,896,515,163.00	$4,896,515,163.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022	15/08/2027	$3,345,055,086.60	$3,345,055,086.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/09/2022	24/09/2027	$5,017,582,629.90	$5,017,582,629.90
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2022	25/07/2027	$9,557,040.00	$9,557,040.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024, ACTA DE REINICIO No. 2 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2024, Y CONTRATO DE PRORROGA No. 06 DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,614,258.00	$ *******8,000.00	$ *****498,229.00	$ *********3,120,487.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2024	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 14 NRO 12-41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO	7746037
ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER SUPERMAX Movii Red

Bancolombia

éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,614,258.00	$ *******8,000.00	$ *****498,229.00	$ *********3,120,487.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014112023500(3900)000003120487(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411202350-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2024	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 14 NRO 12-41	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056516 74

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056516741

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
22/07/2024 03:49p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO CORDOBA 2022 — NIT. 901.598.916

LA SUMA DE: Tres millones ciento veinte mil cuatrocientos ochenta y siete pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101172752

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-44-101172752-11-1	$2,622,258.00		$498,229.00	$3,120,487.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 3,120,487.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 3,120,487.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005651674

TOTAL: $3,120,487.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/22/2024 4:17:40PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056516 77

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056516773

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
22/07/2024 03:49p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO CORDOBA 2022 — NIT. 901.598.916

LA SUMA DE: Seiscientos cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101061054

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-40-101061054-9-1	$508,881.00		$96,688.00	$605,569.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 605,569.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 605,569.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005651677

TOTAL: $605,569.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/22/2024 4:17:28PM

172.16.10.23

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 29 de agosto de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento de entrega de documentos del área de Seguridad requeridos para la liquidación del contrato 104.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro Seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 104 de 2022, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento:

El día 31 de julio de 2024, Se solicitó al contratista **Consorcio Córdoba 2022**, por medio de oficio con radicado **N° SAL-23-010639, "**teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 15 de agosto del presente año por Prórroga No. 06, se le solicita al señor contratista Consorcio Córdoba 2022 la entrega de la documentación requerida en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo para la liquidación de este contrato de obra No. 104.

A continuación se mencionan los documentos.

1. Listado personal relacionado al Consorcio Córdoba. (Nombre completo, cedula, cargo, sueldo, fecha de ingreso y fecha de salida y teléfono).
2. Fotocopia de cedula de cada trabajador.
3. Contratos o subcontratos (Soluciones de ingenierías nómadas S.A.S, Constructora Terluz S.A.S, Constructora Carranza S.A.S, JML Constructor S.A.S Vanegas Payares Daniel Andrés y demás subcontratistas).
4. Certificado de Paz y Salvo de todos los subcontratistas.
5. Certificado de Paz y Salvo de alquiler de Maquinaria y Equipos.
6. Planillas de Seguridad Social de Consorcio Córdoba 2022 y todos los subcontratistas.
7. Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social
8. Informe final de PMT"

Por lo tanto esta interventoría reitera la solicitud de entrega de los documentos para la liquidación de este proyecto.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
29/08/2024 4:45:08 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 30 de agosto de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento N°1 a entrega de documentación para cierre social.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 104 - 2022, requiere la entrega de los siguientes documentos correspondientes al cierre social.

- Consolidado de actas de vecindad de inicio y cierre
- Certificación de la personería de no pasivos sociales
- Formatos correspondientes al informe mensual (INVIAS)
- Acta de recibo de la comunidad

Lo anterior teniendo en cuenta que contractualmente finalizaron las actividades de obra el pasado 15 de agosto de 2024 y a la fecha no se ha recibido ninguno de los documentos anteriormente descritos, por lo tanto se solicita adjuntar la información requerida en un plazo no superior a 3 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
30/08/2024 1:34:06 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Foto 1. El contratista realizo fundida de losa superior de AC del tramo T2' empalme con tramo T2.



Foto 2. El contratista realiza fundida de pavimento del Pr 0+070 al Pr 0+100 tramo A4 sector 20 de Julio.



Foto 3. El contratista realiza Corte de junta de pavimento empalme A1 con A2 Pr 0+130.



Foto 4. El contratista realiza fundida de pavimento del Pr 0+070 al Pr 0+000 tramo A4 sector 20 de Julio.



Foto 5. Acero empalme entre A1 y A2 Pr 0+130.



Foto 6. Fundida de empalme entre A1 y A2 Pr 0+130.



Foto 7. El contratista realiza instalación de tapas removibles de cunetas y rejillas de canal de paso tramo A7 sector 20 de Julio.



Foto 8. Se realiza excavación y formaleteo canal de paso 1 del tramo T5' pueblecito.



Foto 9. Fundida de muros de canal de paso de T6 y losa superior de cunetas de T6



Foto 10. Fundida de losa superior de anden cuneta e instalación de rejilla del canal de paso del tramo T6.



Foto 11. El contratista realiza instalación de tapas removibles de cunetas tramo T14.



Foto 12. El contratista terminó fundida de losa superior fija de andén cuneta y realiza instalación de tapas removibles de cunetas tramo T2.



Foto 13. El contratista realiza fundida de losa superior de anden cuneta del tramo A3 sector 20 de Julio.



Foto 14. El contratista realizó fundida de muros de cajas de registros del tramo A1 y A3.



Foto 15. El contratista realiza fundida de andenes del colegio del tramo P14 chuchurubi



Fotos 16. Instalación de señales verticales tramo T18



Foto 17. El contratista realiza formaleteo de losa superior de anden cuneta tramo A3.



Foto 18. El contratista realiza fundida de muros de anden cuneta tramo A3.



Foto 19. El contratista realiza fundida de muros de anden cuneta tramo T14.



Foto 20. El contratista realiza fundida de losa superior de anden cuneta tramo T14.



Foto 21. Formaleteo para losa superior de cuneta andén tramo T14.



Foto 22. El contratista realiza demarcación horizontal tramo T1 media tapa.



Foto 23. El contratista realiza demarcación horizontal tramo T1 media tapa.



Foto 24. El contratista realiza demarcación horizontal tramo T18.



Foto 25. El contratista realiza demarcación horizontal tramo P14



Foto 26. El contratista realiza instalación de bordillos tramo A4.



Foto 27. El contratista realiza encofrado de tapa de andén cuenta tramo T2.



Foto 28. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T5.



Foto 29. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T9.



Foto 30. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T17.



Foto 31. El contratista fundió empedrado de protección de taludes tramo T2'.



Foto 32. El contratista fundió empedrado de protección de taludes tramo T2'.



Foto 33. El contratista fundió empedrado de protección de taludes, terminó cunetas e instaló señalización en tramo T2'.



Foto 34. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T6.



Foto 35. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T2.



Foto 36. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T2'.



Foto 37. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T1.



Foto 38. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A2 y A1.



Foto 39. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T1.



Foto 40. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A3.



Foto 41. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A1.



Foto 42. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A3.



Foto 43. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A3.



Foto 44. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A7.



Foto 45. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A7.



Foto 46. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A7.



Foto 47. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A7.



Foto 48. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A4.



Foto 49. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A4.



Foto 50. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A4.



Foto 51. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A4.



Foto 52. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A4.



Foto 53. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo T19.



Foto 54. El contratista realizó instalación de señales verticales y demarcación vial en tramo A1-A2.



Foto 50. El contratista realizó instalación de empedado de protección de taludes en tramo P14 chuchurubí.

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 3 operadores - 2 opiaos varios
1 comision topograpica - 1SST
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 pajarita - 1 nivel
Actividades
El contratista realiza retiro de material saturado del
Protoso al Protooo

Jueves 01 de agosto de 2024
Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 3 operadores - 2 opiaos varios
1 comision topograpica - 1SST
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 motoniveladora
1 vibrocompactador - 1 nivel
Actividades
Realizan instalaaon de material de subbase, proceden
a cereo de subbase e instalaaon de redes del Protoso
al Protooo en horas de la mañana, inician fundida en
horas de la noche del Protooo al Protoso el cual fue
liberado por interventoria.

Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan encopiado de andenes y fundida del
Protoss al Prot25

Scanned with CamScanner

Tramo A2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudante
Equipos: Herr. menores
Actividades
• Realizan fundida de andenes del Pr 0+025 al Pro+000 LI
• Fundida de radio de giro entre A1 y A2 Pr 0+000.

Tramo T15
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
El contratista realiza encopriado de losa superior del Pr 0+155 al Pr 0+167.8
Realizan fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+155 al Pr 0+167.8

Tramo T14
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
El contratista realiza fundida de losa inferior del Pr 0+150 al Pr 0+200 LD

Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
El contratista realiza encopriado de muros de anden cuneta ambos lados
Realizan fundida de muros del Pro+092 al Pr 0+120 LI

Scanned with CamScanner

Viernes 02 de agosto de 2024

Tramo A7

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes

Equipos

Actividades

* El contratista realiza excavacion manual de onden cuneta del Pr 0+107 al Pr 0+130
* Encofrado de muros del Pr 0+000 al Pr 0+035 en horas de la mañana y fundida de muros en horas de la tarde.
* Fundida de fondo de onden cuneta del Pr 0+080 al Pr 0+100

Tramo T1S

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

* Realizan encofrado de losa superior del Pr 0+168 al Pr 0+191 en horas de la mañana
* fundida de losa superior de cuneta onden del Pr 0+168 al pr 0+191. Finalizando con fundida de onden cunetas.

Tramo T14

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1 residente - 10 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

* fundida de losa inferior de onden cuneta del Pr 0+000 al pr 0+050 LD
* Encofrado de muro del pr 0+150 al Pr 0+200 en horas de la mañana y fundida en horas de la tarde LD
* Realizan encofrado de losa superior y fundida

Scanned with CamScanner

del Pr 0+098 al Pr 0+140.

Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr menores. - 1 nivel.
Actividades
El contratista realiza Encofrado de muros y fundida de anden cuneta del Pr 0+030 al Pr 0+040.
Excavacion manual de anden cuneta del Pr 0+171 al Pr 0+200.

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel
Actividades
Excavacion manual de anden cuneta del Pr 0+150 al Pr 0+200
Realizan instalacion de bordillos y fundida de anden L1 del Pr 0+040 al Pr 0+100.

Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel
Actividades
Realizan fundida de losa de fondo de anden cuneta en el Pr 0+000.

Scanned with CamScanner

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 vibrador de aguja.
Actividades
Realizan instalacion y cereo de subbase del Pr 0+050 al Pr 0+100, se libera por interventoria. en horas de la tarde y realizan fundida en horas de la noche.

Sabado 03 de agosto de 2024
Tramo A7
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel
Actividades
- Realizan excavacion manual de anden cuneta del Pr 0+137 al Pr 0+160
- Realizan fundida de losa de fondo de anden cuneta del Pr 0+107 al Pr 0+130.
- Realizan encofrado de muros de anden cuneta y fundida del Pr 0+080 al Pr 0+100.

Tramo T14
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 10 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel
Actividades
Realizan fundida de losa de fondo de anden cuneta LD del Pr 0+050 al Pr 0+100.
Realizan encofrado de muros y fundida del Pr 0+000 al Pr 0+050 LD.

Scanned with CamScanner

Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel.
Actividades
* Realizan excavacion manual de anden cuneta del Pr 0+200 al Pr 0+240.
* Fundida de losa de fondo de anden cuneta del Pr 0+171 al Pr 0+200.

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 12 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel
Actividades
* Realizan fundida de losa de fondo del Pr 0+150 al Pr 0+200.
* Realizan excavacion manual del anden cuneta del Pr 0+200 al Pr 0+240.
* Realizan instalacion de bordillo y fundida de andenes LI del Pr 0+100 al Pr 0+120.

Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan encoprado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+000.

Scanned with CamScanner

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Equipos: Herr. menores - 1 cortadora de concreto.

Actividades
Realizan cortes de junta de pavimento del Pr 0+050 al Pr 0+100.
comizan instalacion de bordillo de Pr 0+406 al Pr 0+250 L.I.

Tramo A2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 Operadores - 2 Oficios varios 1 comision topografica - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador 1 nivel - 1 vibrador de aguja.
Actividades
El contratista realiza realiza cereo de subase del Pr 0+125 al Pr 0+140 e instalacion de rieles, se libera por Interventoria, Realizan fundida en horas de la tarde.

Domingo 04 de agosto de 2024
clima: Soleado
No se trabaja por ser dia dominical

Lunes 05 de agosto de 2024
Tramo A7
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 10 Ayudantes - 1 comision topografica

Equipo: Herr. menores - 1 nivel.

Scanned with CamScanner

Actividad

- El contratista realiza fundida de losa de fondo de anden coneta del Pr 0+137 al Pr 0+160.
- Realizan encoprado de muros en horas de la mañana del Pr 0+107 al Pr 0+130
- Realizan fundida de muros en horas de la tarde del Pr 0+107 al Pr 0+130.

Tramo T14

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

- Realizan encofrado de muros y fundida del Pr 0+050 al Pr 0+100. LD
- Encoprado de losa superior y fundida del Pr 0+140 al Pr 0+200 LI

Tramo T2

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes - 1 comision topografica

Equipos: Herr. menores - 1 nivel.

Actividades

Realizan fundida de losa de fondo de anden coneta del Pr 0+200 al Pr 0+240.

Realizan encoprado de muros y fundida del Pr 0+120 al Pr 0+130.

Tramo A3

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 12 Ayudantes - 1 comision topografica

Equipos: Herr. menores

Scanned with CamScanner

Actividades
- Realizan excavacion manual de anden cuneta del Pr 0+247 al Pr 0+270
- Realizan fundida de losa de fondo de anden cuneta del Pr 0+200 al Pr 0+240.

Continuan con instalacion de bordillo y fundida de andenes LI del Pr 0+120 al Pr 0+140.

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades
Realizan instalacion de bordillos del Pr 0+250 al Pr 0+100. LI

Tramo A2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes - 2 opicios varios
1 comision topografica - 2 operadores
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 vibrador de aguja.
Actividades
- Realizan corte de junta de pavimento del Pr 0+125 al Pr 0+140
- Realizan fundida de empal entre A1 y A2 Pr 0+130.

Martes 06 de agosto de 2024
Tramo A7
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST + 8 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Equipos: Herr. menores.
Actividades
Realizan encopiado de muros y fundida del Pr0+137 al Pr 0+160. (Anden cuneta)

Tramo T14
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes
Equipos: Herr. menores.
Actividades
Realizan encoprado losa superior en horas de la mañana y fundida en horas de tarde del Pr0+000 al Pr 0+050 L D.

Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes
Equipos: Herr menores.
Actividades
- El contratista realiza encoprado de muros del Pr0+130 a Pr0+180 en horas de la mañana.
- Realizan fundida en horas de la tarde de muros del Pr 0+130 al Pr0+180 (Anden cuneta)

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 12 Ayudantes - 1 comison topografica.
Equipos: Herr. menores - 1nivel.
Actividades
- Realizan excevacion manual de anden cuneta del Pr 0+270 al Pr0+310.
- Realizan fundida de losa de fondo de anden cuneta del Pr0+247 al Pr 0+270.

Scanned with CamScanner

• El contratista inicia encofrado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+150 al Pr 0+200.
• continuan instalacion de bordillo y fundida de andenes LD del Pr 0+040 al Pr 0+100.

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
continuan instalacion de bordillo del Pr 0+100 al pr 0+000 LI y del Pr 0+406 al pr 0+350 LD.

Tramo T15
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 1 operador - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador.
Actividades
• Realizan fundida de andenes en el colegio.
• Realizan instalacion de espaldar de cuneta.

Tramo A2
clima: Soleado
Personal: 1 residen - 1SST - 4 Ayudantes

Equipos: Herr. menores - 1 cortadora de concreto.

Actividades
El contratista realiza corte de juntas de pavimento en el empalme.

Miercoles 07 de agosto de 2024

Tramo T14

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

Realizan encofrado y fundida de losa superior LD del Protoso al Pr 0+170. (Anden cuneta)

Tramo T2

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

El contratista realiza encofrado de muros de anden cuneta en horas de la mañana y fundida en horas de la tarde del Pr 0+180 al Pr 0+210.

Tramo A3

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 12 Ayudantes - 1 comision topografica

Equipos: Herr. menores - 1 nivel

Actividades

- Realizan fundida de losa fondo de anden cuneta del Pr 0+210 al Pr 0+310.
- Realizan encofrado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+200 al Pr 0+240.
- Realizan encofrado y fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+150 al Pr 0+200.

Tramo A4

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes.

Scanned with CamScanner

Equipos: Herr. menores.
Actividades
continua instalacion de bordillo LD del Pr 0+160 al Pr 0+350.

Tramo P14 Chuchurubi
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes - 2 Oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- En horas de la mañana el contratista Realiza demarcación de señalizacion horizontal y instalacion de señalizacion vertical.
- En horas de la tarde Realizan fundida de andenes frente al colegio

Tramo T19
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- En horas de la tarde el contratista realiza demarcación de señalizacion horizontal y instalacion de señalizacion vertical

Tramo T18
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan en horas de la tarde demarcacion de señalizacion horizontal y instalacion de señalizacion vertical

Scanned with CamScanner

Jueves 08 de agosto de 2024

Tramo T14

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Equipos: Herr. menores.

Actividades

Realizan encofrado y fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+170 al Pr 0+200 LD. Finalizando fundidas de anden cuneta. con relleno de espaldar.

Tramo T2

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Equipos: Herr. menores.

Actividades

El contratista realiza encofrado de muros y fundida de anden cuneta del Pr 0+210 al Pr 0+240.

Tramo A3

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 12 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

- El contratista realiza encofrado y fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+200 al Pr 0+240.
- Realizan instalacion de bordillo y fundida de anden del Pr 0+100 al Pr 0+210 LD.

Tramo A4

clima: Soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades

El contratista continua instalacion de bordillo del

Scanned with CamScanner

Pr 0+160 al Pr 0+000. LD.

Tramo T1 media tapa
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 oficios varios - 3 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- El contratista finaliza fundidan de anden cuneta
- Realizan demarcación de señalizacion horizontal y instalacion de señalizacion vertical
- Relleno de espaldar de cuneta

Tramo T13
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan demarcacion vial

Tramo T12
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Viernes 09 de agosto de 2024
Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudante - 1 comision topografica

Equipos: Herr. menores

Scanned with CamScanner

Actividades
- Realizan encofrado y fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+065 al Pr 0+110.
- Realizan excavacion manual de anden cuneta del Pr 0+040 al Pr 0+065

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 12 Ayudantes - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan instalacion de bordillo y fundida de andenes del Pr 0+210 al Pr 0+240
- Realizan encofrado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+247 al Pr 0+280.
- Realizan excavacion de cajas de registro

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 oficios varios - 1 operador
Equipos: Herr. menores - 1 mini cargador
Actividades
- Realizan instalacion, nivelacion y compatacion de espaldar de bordillo. Realizan fundida de losa de fondo de cuneta de paso

Tramo A7
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel.
Actividades
- Realizan fundidas de los de fondo de anden cuneta del Pr 0+165 hasta empalmar con A4.
- Realizan encofrado y fundida de losa superior

Scanned with CamScanner

de anden cuneta del Pr 0+000 al Pr 0+050.

Tramo T2'
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan excavacion de anden cuneta para empalme con T2 y T1.

Tramo T6
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Inician excavacion de anden cuneta para empalme con T1 y fundida de losa de fondo.

Tramo T5
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Se Realiza demarcacion vial

Tramo T4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Se realiza demarcacion vial.

Scanned with CamScanner

Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan excavacion manual de cajas de registro.
- Finalizan fundidas de anden cuneta

Sabado 10 de agosto de 2024
Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 10Ayudantes - 1comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel
Actividades
- Realizan encofrado y fundida de losa superior del Pr 0+110 al Pr 0+160.
- Realizan fundida de losa inferior de anden cuneta del Pr 0+040 al Pr 0+068

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 14 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Se realiza instalacion de bordillo y fundida de andenes hasta el box.
- Se realiza encofrado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+280 al box.
- continuan con excavacion manual de cajas de registro.

Tramo A7
clima: Soleado
Persona: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan encofrado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+160 hasta empalme con A4.
- Realizan encofrado y fundida de losa superior del Pr 0+050 al Pr 0+080.

Tramo T6
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan encofrado y fundida de muros de anden cuneta hasta empalme con T1.

Tramo A2
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 1 operador - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador
Actividades
- Se Realizaron empalme de anden cuneta, finalizando fundida de anden cuneta, igualmete bordillos y espaldar de bordillos, mas relleno de espaldar de cuneta.

Domingo 11 de agosto de 2024
clima: Soleado
No se trabaja por ser dia dominical.

Lunes 12 de agosto de 2024
Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+160 al Pr 0+210.
- Realizan encofrado y fundida de muros de anden cuneta del Pr 0+040 al Pr 0+065.

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 12 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan encofrado y fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+247 al Pr 0+280.
- Realizan fundidas de losa de las cajas de registro.

Tramo A7
clima: Soleado
Personal: Residente - 1SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan encofrado y fundida de losa superio de anden cuneta del Pr 0+100 al Pr 0+080 y del Pr 0+107 al Pr 0+130.
- Realizan fundida de canales de paso

Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1residente - 1SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan fundida de losa de fondo de caja de Registro

Scanned with CamScanner

Tramo T18
clima: Soleado
Personal: Residente - 1SST - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
• Inician fundida de andenes

Tramo T9
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
• Realizan demarcacion vial

Tramo T8
clima: Soleado
Personal: Residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Tramo T15
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial.

Martes 13 de agosto de 2024
Tramo T2
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 10 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+210 al Pr 0+240.
- Realizan encofrado y fundida de losa superior de anden cuneta del Pr 0+040 al Pr 0+65.
- Realizan trabajos de anden cuneta para empalme con box de T2'.

Tramo A3
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 12 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Se termina fundida de anden cuneta y relleno de espaldar.
- Realizan encofrado y fundida de muros de las cajas de registro.
- finalizan detalles de andenes.

Tramo T18
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- continuan fundida de andenes
- Realizan trabajos caja de registro (fundida).

Tramo T 6
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 8 Ayudantes - 1 operador
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador
Actividades
- Realizan encofrado y fundida de anden cuneta losa superio hasta empalme con T1

Scanned with CamScanner

- Fundieron tacos de giros pendientes Protocolo.
- Relleno de espaldar de bordillo y cunetas

Tramo A7
Clima: Soleado
Personal: 1residente-1SST- 8 Ayudantes-1 operador
Equipos: Herr. menores-1 minicargador
Actividades
- Finalizan fundidas de anden cuneta y relleno de espaldar de bordillo y cunetas.

Miercoles 14 de agosto de 2024
Clima: Soleado Tramo T2
Personal: 1residente- 1SST- 10 Ayudantes- 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Finalizan fundida de anden cuneta y relleno de espaldar de bordillo y cunetas.
- Realizan demarcacion vial.

Tramo T18
Clima: Soleado
Personal: 1residente- 1SST- 8 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Finalizan fundida de andenes.
- Finalizan trabajos de caja de registro.

Tramo A3
Clima: Soleado
Personal: 1residente-1SST- 3 Ayudantes- 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades

Scanned with CamScanner

- Finalizan trabajos de cajas de registros
- Realizan demarcaaon vial

Tramo A4
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial.

Tramo A7
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Tramo A1
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos
Actividades
Realizan demarcacion vial.

Tramo A2
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Scanned with CamScanner

Tramo pueblecito
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Tramo T16
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Tramo T14
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial

Tramo T7
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
Realizan demarcacion vial.

Tramo T10
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores

Scanned with CamScanner

Actividades
Realizan demarcacion vial

Tramo T 6
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 1 minicargador - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador
Actividades
- Realizan Rellono de espaldar de bordillo finalizando dicha actividad
- Realizan demarcacion vial.

Tramo T17
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 1 minicargador - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores -
Actividades
- Realizan Relleno de espaldar de bordillo finalizando dicha actividad.
- Realizan demarcacion vial.

Tramo T2'
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes
Equipos: Herr. menores
Actividades
- Realizan demarcacion vial

Jueves 15 de agosto de 2024
Clima: Soleado.
Se realizo limpieza y aseo general en todos los tramos.

Scanned with CamScanner
