ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	**02**	**FECHA DE ELABORACION**		Diciembre 26 de 2024
SUPERVISOR	ANGIE LORENA GASCA OME	**CARGO**		GERENTE
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.-	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1.0700.15003			
ACTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024			
ACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS			
CEDULA	12.169.279 de Isnos Huila			
NUMERO DE CONTRATO:	122 de 2024			
FECHA DE CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA.**			
FECHA DE INICIACIÓN	18 DE MARZO DE 2024			
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	18 DE MAYO DE 2024			
VALOR	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 679.505.761,00)			
PRORROGA N° 1	UN (01) MES			
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES			
FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1	18 DE JUNIO DE 2024			
SUSPENSION N°1 DEL CONTRATO	14 DE JUNIO DE 2024			
SUSPENSIÓN N° 1	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES			
PRORROGA DE SUSPENSIÓN N° 1	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES			

REINICIO	29 DE JULIO DE 2024
PRORROGA N° 2	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR	YUDI TATIANA HERNANDEZ SAMBONI
FORMA DE PAGO	Se establece como forma de pago para el proponente al cual se le adjudique el contrato: un 50% como anticipo, pagadero una vez se expida la resolución de aprobación de pólizas y firma del acta de inicio, un 30% de manera posterior al avance del 80% de la obra, previa entrega de informe de avance y verificación del interventor y expedición del acta correspondiente, el excedente restante correspondiente al 20%, se cancelara como pago final, al cumplimiento total del objeto contratado y verificación previa de la supervisión y expedición del acta final.
CUMPLIMIENTO Y ALCANCE DEL CONTRATO	El contratista en cumplimiento del objeto contractual, ha realizado actividades correspondientes a la remodelación, adecuación, arreglo y mejoramiento de ornato de la infraestructura física interna y externa de los centros de salud ubicados en las veredas Alto Quinchana, Obando, El Rosario, Villa Fátima y Sevilla del Municipio de San Agustín Huila. El contratista ha ejecutado las cantidades de obra que se relacionan en cada uno de los centros de Salud.

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA			
		UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	$ 3.850,00	85,41	328.829
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	$ 35.500,00	70,00	2.485.000
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	$ 18.600,00	72,33	1.345.312
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	$ 55.000,00	1,00	55.000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA (luminarias)	m2	$ 8.000,00	66,00	528.000
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	$ 8.500,00	62,20	528.700
2	**OBRAS DE URBANISMO**				
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	$ 79.800,00	41,51	3.312.498

3	**OBRAS EN CUBIERTA**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	$ 97.500,00	89,46	8.722.389
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	$ 1.800,00	89,46	161.029
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	$ 92.800,00	7,55	700.640
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	$ 60.000,00	102,70	6.162.000
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	$ 39.500,00	-	-
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	$ 39.500,00	38,39	1.516.484
4,3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	$ 9.500,00	15,00	142.500
4,4	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	$ 33.200,00	107,85	3.580.533
4,5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	$ 37.000,00	95,12	3.519.540
4,6	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	$ 37.000,00	35,99	1.331.541
5	**PISOS Y CIELO RASO**				
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	$ 52.300,00	59,71	3.122.979
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	$ 173.000,00	45,04	7.791.920
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	$ 85.000,00	78,01	6.630.850

	5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	$ 83.000,00	66,09	5.485.429
	6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**				
	6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	$ 84.900,00	13,88	1.178.667
	6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	$ 84.900,00	2,42	205.034
	6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	$ 345.000,00	1,00	345.000
	6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 450.000,00	1,00	450.000
	6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 280.000,00	1,00	280.000
	6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	1,00	35.000
	6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	1,00	35.000
	6,8	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 250.000,00	1,00	250.000
	7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				

	7,1	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO	M2	$ 345.000,00	0,75	260.130
	7,2	ESPEJO 4 MM	m2	$ 85.000,00	0,50	42.500
	7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	$ 62.000,00	5,20	322.617
	7,4	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	$ 345.000,00	1,00	345.000
	8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	$ 450.000,00	1,00	450.000
	8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	$ 55.000,00	1,00	55.000
	8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	$ 145.000,00	12,00	1.740.000
	8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	$ 105.000,00	10,00	1.050.000
	8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	$ 105.000,00	12,00	1.260.000
	9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				
	9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	$ 92.500,00	16,00	1.480.000
	9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	$ 8.500,00	42,30	359.550
	9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 1.250,00	18,00	22.500

9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	$ 52.600,00	1,00	52.600
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	$ 52.600,00	1,00	52.600
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	$ 52.600,00	1,00	52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	$ 62.400,00	1,00	62.400
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	$ 56.200,00	1,00	56.200
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	$ 62.400,00	1,00	62.400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	$ 19.000,00	5,00	95.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	$ 15.000,00	19,00	285.000
9,12	TUBERÍA 4" SANITARIA	ml	$ 24.000,00	11,20	268.800
9,13	TUBERÍA 3" SANITARIA	ml	$ 17.000,00	28,10	477.700
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	$ 180.000,00	2,00	360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 45.600,00	2,00	91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 1.700.000,00	1,00	1.700.000
10	**ASEO GENERAL**				
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	$ 4.500,00	215,26	968.663
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02					**72.202.333**

	ADMINISTRACION				**13.718.443**
	IMPREVISTOS				**722.023**
	UTILIDADES				**3.610.117**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**90.252.916**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**90.252.916**
VALOR PAGADO EN EL ACTA PARCIAL No 01	**39.962.219**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**45.126.458**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**5.164.239**
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	**5.164.239**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	**90.252.916**

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA OBANDO			
		UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	$ 3.850	96,77	$ 372.565
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	$ 35.500	40,50	$ 1.437.750
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	$ 24.500	106,96	$ 2.620.520
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	$ 55.000	1,00	$ 55.000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	$ 8.000	96,77	$ 774.160
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	$ 8.500	153,35	$ 1.303.475
2,00	**OBRAS DE URBANISMO**			0,00	$ 0
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	$ 95.500	19,40	$ 1.852.700
3,00	**OBRAS EN CUBIERTA**			0,00	$ 0
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	$ 115.200	164,08	$ 18.902.016
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	$ 1.800	164,08	$ 295.344
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	$ 92.800	11,20	$ 1.039.360
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	$ 60.000	205,10	$ 12.306.000
4,00	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			0,00	$ 0
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	$ 42.600	91,79	$ 3.910.254
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	$ 48.900	0,00	$ 0

4,3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	$ 9.500	34,59	$ 328.605
4,4	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	$ 36.900	202,24	$ 7.462.781
4,5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	$ 37.000	111,21	$ 4.114.840
4,6	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	$ 42.500	21,32	$ 905.930
4,7	REPOSICION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBIRADA SENCILLA INC. CHAPA	UND	$ 465.300	8,00	$ 3.722.400
5,00	**PISOS Y CIELO RASO**			0,00	$ 0
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	$ 52.300	123,37	$ 6.452.251
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	$ 187.900	108,03	$ 20.298.837
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	$ 85.000	102,26	$ 8.692.100
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	$ 83.000	91,07	$ 7.558.810
6,00	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**			0,00	$ 0
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	$ 84.900	11,83	$ 1.004.146
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	$ 84.900	2,73	$ 231.607
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	$ 395.000	1,00	$ 395.000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 450.000	1,00	$ 450.000

	6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 280.000	1,00	$ 280.000
	6,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000	1,00	$ 35.000
	6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000	1,00	$ 35.000
	7,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			0,00	$ 0
	7,1	ESPEJO 4 MM	m2	$ 85.000	0,50	$ 42.500
	7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	$ 62.000	8,11	$ 502.752
	7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	$ 345.000	1,00	$ 345.000
	8,00	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			0,00	$ 0
	8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	$ 55.000	1,00	$ 55.000
	8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	$ 145.000	17,00	$ 2.465.000
	8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	$ 105.000	17,00	$ 1.785.000
	8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	$ 105.000	17,00	$ 1.785.000

9,00	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			0,00	$ 0
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	$ 92.500	22,40	$ 2.072.000
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	$ 8.500	19,88	$ 168.987
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 1.250	17,00	$ 21.250
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	$ 52.600	1,00	$ 52.600
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	$ 52.600	1,00	$ 52.600
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	$ 52.600	1,00	$ 52.600
9,7	*PUNTO SANITARIO INODORO* TANQUE	und	$ 62.400	1,00	$ 62.400
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	$ 56.200	1,00	$ 56.200
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	$ 62.400	1,00	$ 62.400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	$ 19.000	8,00	$ 152.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	$ 15.000	10,00	$ 150.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	$ 24.000	11,65	$ 279.600
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	$ 17.000	18,00	$ 306.000
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	$ 180.000	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 45.600	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000
10,00	**ASEO GENERAL**			0,00	
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	$ 4.500	161,84	$ 728.280
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02					**$ 120.184.820**

	ADMINISTRACION				**22.835.116**
	IMPREVISTOS				**1.201.848**
	UTILIDADES				**6.009.241**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**150.231.025**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	150.231.025
VALOR PAGADO EN EL ACTA PARCIAL No 01	10.992.148
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	75.115.513
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	64.123.364
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	64.123.364

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	150.231.025

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO			
		UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	$ 3.850,00	112,00	$ 431.200
1,2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	$ 18.600,00	118,82	$ 2.210.052
1,3	DESMONTE DE SANITARIO	und	$ 55.000,00	2,00	$ 110.000
1,4	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	$ 8.000,00	112,00	$ 896.000
1,5	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	$ 8.500,00	143,00	$ 1.215.500
2	**OBRAS DE URBANISMO**			-	$ 0
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	$ 79.800,00	37,22	$ 2.970.156
3	**OBRAS EN CUBIERTA**			-	$ 0
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	$ 97.500,00	135,62	$ 13.222.463
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	$ 1.800,00	135,62	$ 244.107
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	$ 92.800,00	14,50	$ 1.345.600

	3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	$ 60.000,00	133,20	$ 7.992.000
	4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			-	$ 0
	4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	$ 39.500,00	84,35	$ 3.331.916
	4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	$ 9.500,00	8,21	$ 77.995
	4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	$ 33.200,00	202,84	$ 6.734.198
	4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	$ 37.000,00	113,96	$ 4.216.624
	4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	$ 37.000,00	56,04	$ 2.073.561
	5	**PISOS Y CIELO RASO**			-	$ 0
	5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	$ 52.300,00	96,50	$ 5.046.950
	5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	$ 173.000,00	90,63	$ 15.678.990
	5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	$ 85.000,00	100,79	$ 8.567.150
	5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	$ 83.000,00	103,59	$ 8.597.970
	6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**			-	$ 0
	6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	$ 80.500,00	23,54	$ 1.895.292
	6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	$ 80.500,00	4,82	$ 388.026

	6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	$ 345.000,00	1,00	$ 345.000
	6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 450.000,00	2,00	$ 900.000
	6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 280.000,00	2,00	$ 560.000
	6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	2,00	$ 70.000
	6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	2,00	$ 70.000
	7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				
	7,1	ESPEJO 4 MM	m2	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000
	7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	$ 62.000,00	5,58	$ 346.109
	7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	$ 345.000,00	2,00	$ 690.000
	8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	$ 0
	8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	$ 450.000,00	-	$ 0
	8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	$ 55.000,00	-	$ 0

8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	$ 145.000,00	14,00	$ 2.030.000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	$ 105.000,00	15,00	$ 1.575.000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	$ 105.000,00	14,00	$ 1.470.000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			-	$ 0
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	$ 92.500,00	29,00	$ 2.682.500
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	$ 8.500,00	35,40	$ 300.900
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 1.250,00	15,00	$ 18.750
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	$ 52.600,00	2,00	$ 105.200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	$ 52.600,00	2,00	$ 105.200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	$ 52.600,00	1,00	$ 52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	$ 62.400,00	2,00	$ 124.800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	$ 56.200,00	2,00	$ 112.400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	$ 77.364,50	1,00	$ 77.365
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	$ 19.000,00	7,00	$ 133.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	$ 15.000,00	8,00	$ 120.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	$ 24.000,00	30,80	$ 739.200

9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	$ 17.000,00	6,00	$ 102.000
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	$ 180.000,00	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 45.600,00	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**			-	$ 0
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	$ 4.500,00	155,71	$ 700.717
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02					**$ 102.912.690**

	ADMINISTRACION				**$ 19.553.411**
	IMPREVISTOS				**$ 1.029.127**
	UTILIDADES				**$ 5.145.634**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 128.640.862**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	128.640.862
VALOR PAGADO EN EL ACTA PARCIAL No 01	55.630.027
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	64.320.431
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	8.690.404
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	8.690.404

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	128.640.862

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA			
		UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	$ 3.850,00	195,55	$ 752.868
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	$ 35.500,00	44,61	$ 1.583.788

	1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	$ 24.500,00	148,19	$ 3.630.655
	1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	$ 55.000,00	2,00	$ 110.000
	1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	$ 8.000,00	155,00	$ 1.240.000
	1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	$ 8.500,00	357,60	$ 3.039.600
	2	**OBRAS DE URBANISMO**			0,00	$ 0
	2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	$ 95.500,00	3,10	$ 296.050
	3	**OBRAS EN CUBIERTA**			0,00	$ 0
	3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	$ 115.200,00	192,00	$ 22.118.400
	3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	$ 1.800,00	192,00	$ 345.600
	3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	$ 105.300,00	13,00	$ 1.368.900
	3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	$ 60.000,00	341,92	$ 20.515.200
	4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			0,00	$ 0
	4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	$ 42.600,00	226,41	$ 9.645.236
	4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	$ 9.500,00	45,00	$ 427.500
	4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	$ 36.900,00	252,06	$ 9.300.852
	4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	$ 37.000,00	83,22	$ 3.079.214
	4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	$ 42.500,00	37,25	$ 1.583.168
	5	**PISOS Y CIELO RASO**			0,00	$ 0
	5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	$ 52.300,00	170,87	$ 8.936.501

	5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	$ 187.900,00	164,48	$ 30.905.792
	5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	$ 89.300,00	142,35	$ 12.711.855
	5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	$ 88.000,00	146,79	$ 12.917.520
	6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**			0,00	$ 0
	6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	$ 88.800,00	24,46	$ 2.172.119
	6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	$ 88.800,00	4,92	$ 436.754
	6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	$ 345.000,00	1,00	$ 345.000
	6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 450.000,00	2,00	$ 900.000
	6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 280.000,00	2,00	$ 560.000
	6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	2,00	$ 70.000
	6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	2,00	$ 70.000

	7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			0,00	$ 0
	7,1	ESPEJO 4 MM	m2	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000
	7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	$ 62.000,00	10,56	$ 654.615
	7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	$ 345.000,00	2,00	$ 690.000
	8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			0,00	$ 0
	8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	Und	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000
	8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	$ 55.000,00	1,00	$ 55.000
	8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	$ 145.000,00	22,00	$ 3.190.000
	8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	$ 105.000,00	29,00	$ 3.045.000
	8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	$ 105.000,00	22,00	$ 2.310.000
	9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			0,00	$ 0
	9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	$ 92.500,00	26,00	$ 2.405.000
	9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	$ 8.500,00	37,35	$ 317.475
	9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 1.250,00	5,00	$ 6.250

9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	$ 52.600,00	2,00	$ 105.200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	$ 52.600,00	2,00	$ 105.200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	$ 52.600,0	1,00	$ 52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	$ 62.400,00	2,00	$ 124.800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	$ 56.200,00	2,00	$ 112.400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	$ 62.400,00	1,00	$ 62.400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	$ 19.000,00	8,00	$ 152.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	$ 15.000,00	11,00	$ 165.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	$ 24.000,00	19,16	$ 459.743
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	$ 17.000,00	27,50	$ 467.500
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	$ 180.000,00	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 45.600,00	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**			0,00	$ 0
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	$ 4.500,00	440,00	$ 1.980.013
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02					**$ 168.208.966**

	ADMINISTRACION				**$ 31.959.703**
	IMPREVISTOS				**$ 1.682.090**
	UTILIDADES				**$ 8.410.448**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 210.261.207**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**210.261.207**
VALOR PAGADO EN EL ACTA PARCIAL No 01	**58.874.940**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**105.130.604**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**46.254.663**
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	**46.254.663**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	**210.260.207**

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SEVILLA			
		UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	$ 3.850,00	86,26	$ 332.101
1,2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	$ 18.600,00	76,44	$ 1.421.784
1,3	DESMONTE DE SANITARIO	und	$ 55.000,00	4,00	$ 220.000
1,4	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	$ 8.000,00	73,44	$ 587.520
1,5	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	$ 8.500,00	75,00	$ 637.500
2	**OBRAS DE URBANISMO**			-	$ 0
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	$ 79.800,00	21,73	$ 1.734.054
3	**OBRAS EN CUBIERTA**			-	$ 0
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	$ 97.500,00	97,31	$ 9.487.725
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	$ 1.800,00	97,31	$ 175.158
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	$ 92.800,00	13,15	$ 1.220.320
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	$ 60.000,00	102,80	$ 6.168.000

	4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			-	$ 0
	4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	$ 39.500,00	13,02	$ 514.258
	4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	$ 9.500,00	0,50	$ 4.750
	4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	$ 33.200,00	128,23	$ 4.257.319
	4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	$ 37.000,00	110,13	$ 4.074.732
	4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	$ 37.000,00	34,75	$ 1.285.661
	5	**PISOS Y CIELO RASO**			-	$ 0
	5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	$ 52.300,00	83,95	$ 4.390.585
	5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	$ 173.500,00	67,39	$ 11.692.165
	5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	$ 77.500,00	76,50	$ 5.928.750
	5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	$ 83.000,00	66,09	$ 5.485.470
	6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**				
	6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	$ 83.500,00	33,81	$ 2.822.910
	6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	$ 83.500,00	6,00	$ 500.649

6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	$ 345.000,00	1,00	$ 345.000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 450.000,00	3,00	$ 1.350.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 280.000,00	2,00	$ 560.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	3,00	$ 105.000
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 35.000,00	2,00	$ 70.000
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			-	$ 0
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	$ 62.000,00	3,02	$ 187.153
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	$ 345.000,00	4,00	$ 1.380.000
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	$ 0

	8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	$ 450.000,00	-	$ 0
	8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	$ 55.000,00	-	$ 0
	8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	$ 145.000,00	13,00	$ 1.885.000
	8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	$ 105.000,00	11,00	$ 1.155.000
	8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	$ 105.000,00	13,00	$ 1.365.000
	9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			-	$ 0
	9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	$ 92.500,00	26,30	$ 2.432.750
	9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	$ 8.500,00	34,70	$ 294.950
	9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 1.250,00	12,00	$ 15.000
	9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	$ 52.600,00	4,00	$ 210.400
	9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	$ 52.600,00	3,00	$ 157.800
	9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	$ 52.600,00	1,00	$ 52.600
	9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	$ 62.400,00	4,00	$ 249.600

9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	$ 56.200,00	3,00	$ 168.600
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	$ 62.400,00	1,00	$ 62.400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	$ 19.000,00	14,00	$ 266.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	$ 15.000,00	10,00	$ 150.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	$ 24.000,00	42,80	$ 1.027.136
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	$ 17.000,00	13,90	$ 236.300
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	$ 180.000,00	3,00	$ 540.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	$ 45.600,00	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**				
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	$ 4.500,00	225,00	$ 1.012.500
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02					**$ 80.095.801**

	ADMINISTRACION				$ 15.218.202
	IMPREVISTOS				$ 800.958
	UTILIDADES				$ 4.004.790
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 100.119.751**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**100.119.751**
VALOR PAGADO EN EL ACTA PARCIAL No 01	**38.392.394**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**50.059.876**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**11.667.481**
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	**11.667.481**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	**100.119.751**

Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $679.505.761 discriminado así:

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 122 DE 2024							
No	PUESTO DE SALUD	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	PAGO REALIZADO ACTA PARCIAL No 1 (30%)	VALOR ACUMULADO PARA PAGO ACTA FINAL	TOTAL EJECUTADO
1	ALTO QUINCHANA	$ 90.252.916	$ 90.252.916	$ 45.126.458	$ 39.962.219	$ 5.164.239	$ 90.252.916
2	OBANDO	$ 150.231.025	$ 150.231.025	$ 75.115.513	$ 10.992.148	$ 64.123.364	$ 150.231.025
3	EL ROSARIO	$ 128.640.862	$ 128.640.862	$ 64.320.431	$ 55.630.027	$ 8.690.404	$ 128.640.862
4	SEVILLA	$ 100.119.751	$ 100.119.751	$ 50.059.876	$ 38.392.394	$ 11.667.481	$ 100.119.751
5	VILLA FATIMA	$ 210.261.207	$ 210.261.207	$ 105.130.604	$ 58.874.940	$ 46.255.663	$ 210.261.207
TOTAL		**$ 679.505.761**	**$ 679.505.761**	**$ 339.752.882**	**$ 203.851.728**	**$ 135.901.151**	**$ 679.505.761**

El valor ejecutado de $135.901.152 representa el 20% de ejecución respecto al valor del contrato, cumpliendo de esta manera con el porcentaje requerido para tramite del pago final según la forma de pago del contrato.

Ala fecha se presenta un avance en la ejecución del contrato del 100% tomado como valor promedio de los porcentajes ejecutados en cada uno de los centros de salud tal como se presenta en la siguiente tabla:

CENTRO DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION (%)
QUINCHANA	100
OBANDO	100
ROSARIO	100
VILLA FATIMA	100
SEVILLA	100
% PROMEDIO	100

Para el contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora, un avance en porcentaje ejecutado del cien por ciento (100 %) de las actividades contratadas .

Total porcentaje del contrato: 100%
Total ejecutado hasta septiembre de 2024: 100%
Saldo por ejecutar: 0 %

|DOCUMENTOS ENTREGADOS	• 5 cuentas de cobro correspondientes al acta final del contrato en referencia. Una cuenta de cobro por cada puesto de salud.

POR EL CONTRATISTA	• Informe de avance No. 02 por parte de la firma Interventora representada por la ing. Yudy Tatiana Hernández con los soportes correspondientes. • 5 paquetes que contiene cada uno el Acta Final y las respectivas memorias de cantidades de obra ejecutadas en cada uno de los puestos de Salud. • Planillas de seguridad social del contratista y del personal empleado por el contratista para la ejecución de las actividades en los 5 centros de Salud. • Pólizas del contrato de obra 122 de 2024.
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las necesidades requeridas por la E.S.E, en relación al objeto contractual. A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades ejecutadas por el contratista en los 5 puestos de salud que se encuentran dentro del objeto contractual. **1. CENTRO DE SALUD ALTO QUINCHANA** 














2. CENTRO DE SALUD ROSARIO






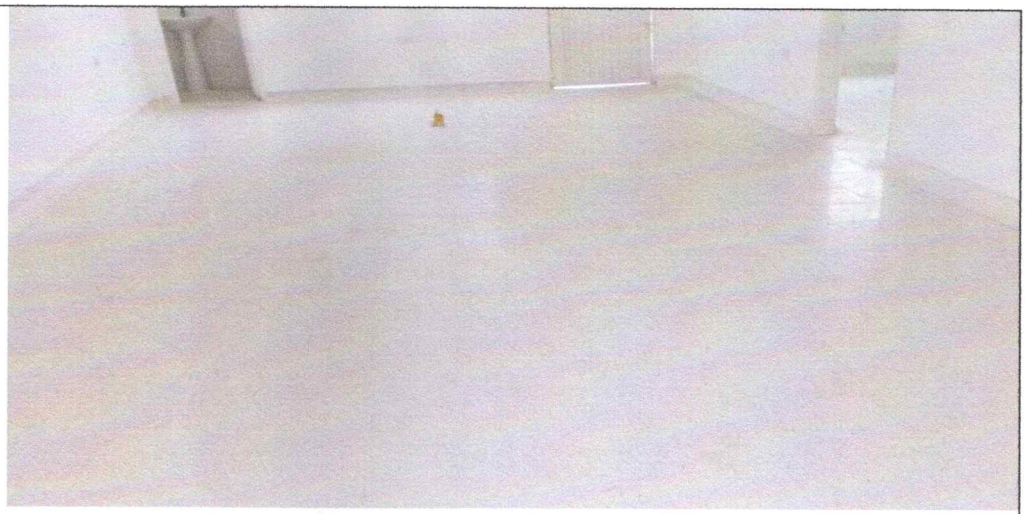





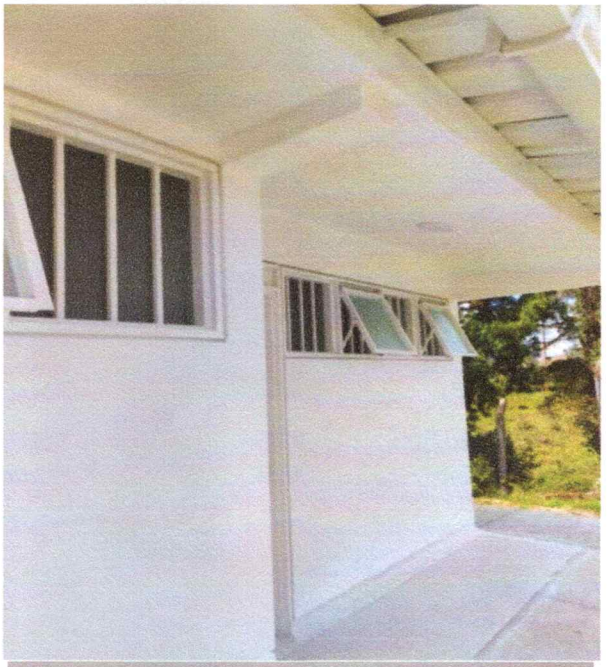



3. CENTRO DE SALUD VILLA FÁTIMA











4. CENTRO DE SALUD SEVILLA















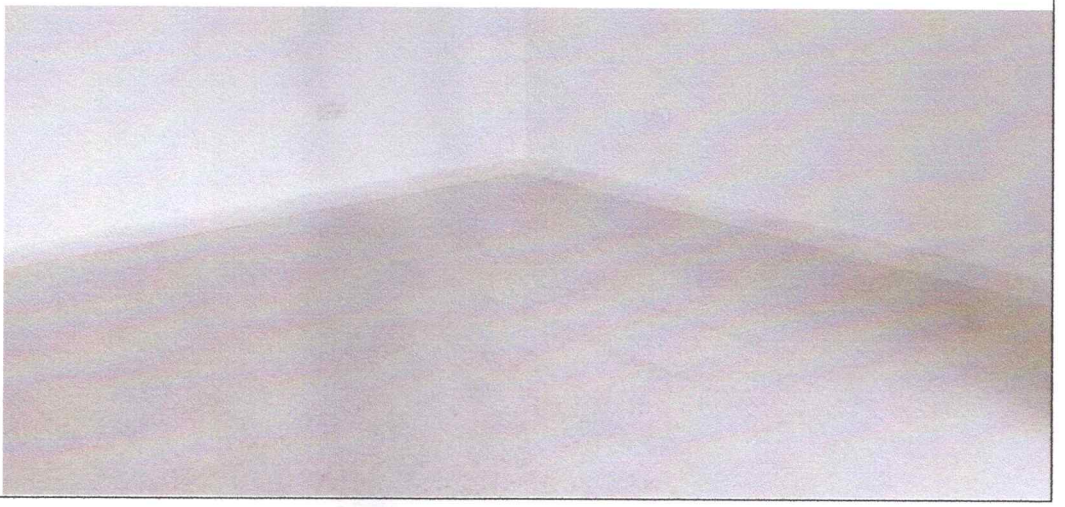





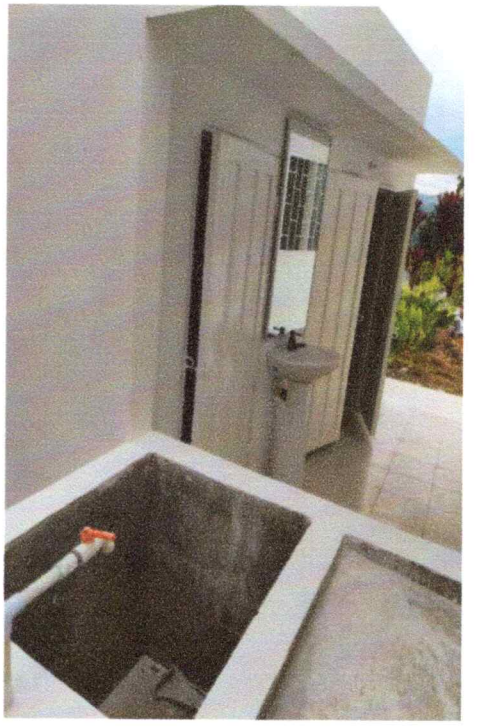

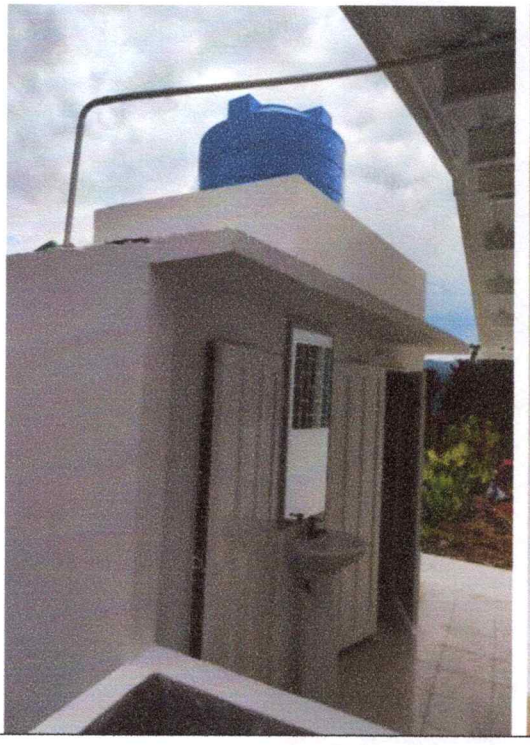

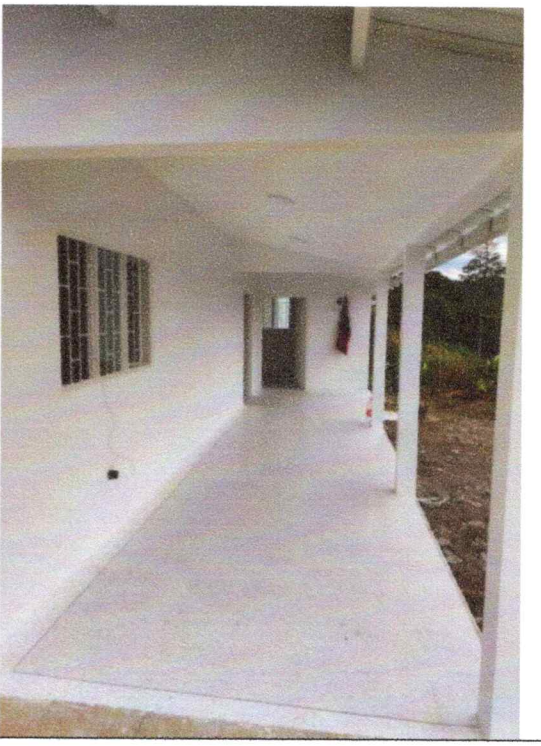

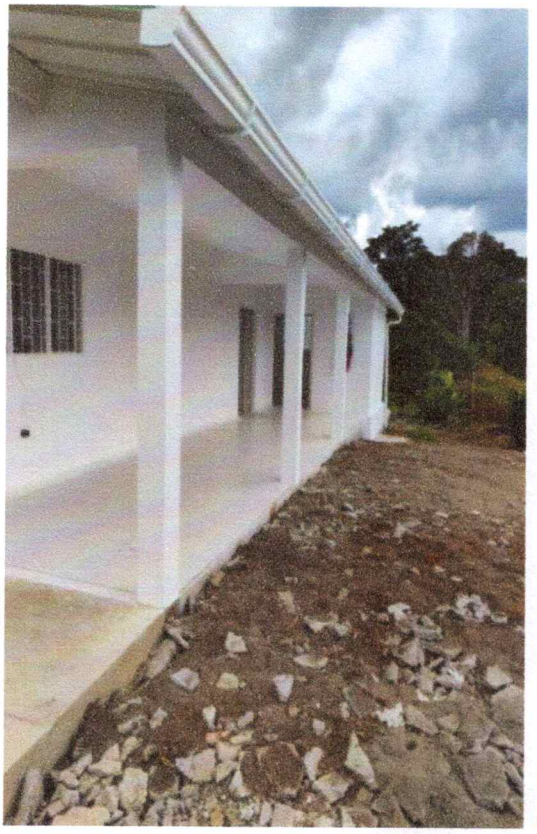

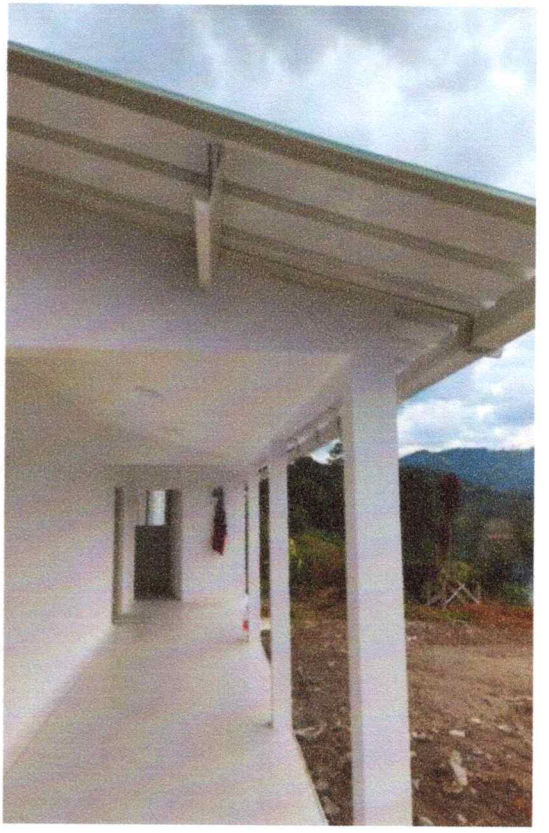

5. CENTRO DE SALUD OBANDO












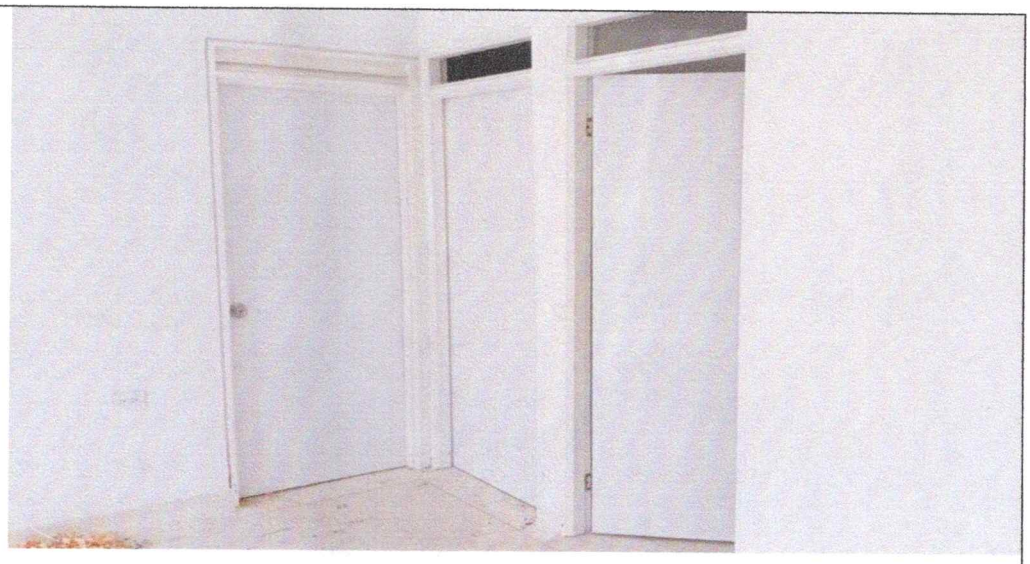

EJECUCION FINANCIERA

EL contrato presenta una ejecución del cien (100%) por ciento, equivalente a SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($679.505.761,00) IVA INCLUIDO.

Se realiza amortización del 100% del anticipo por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($339.752.882)

El valor total a pagar en el ACTA FINAL correspondiente al 20% según forma de pago es de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESO ($135.901.151).

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 122 DE 2024						
No	PUESTO DE SALUD	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	PAGO REALIZADO ACTA PARCIAL No 1 (30%)	VALOR ACUMULADO PARA PAGO ACTA FINAL
1	ALTO QUINCHANA	$ 90.252.916	$ 90.252.916	$ 45.126.458	$ 39.962.219	$ 5.164.239
2	OBANDO	$ 150.231.025	$ 150.231.025	$ 75.115.513	$ 10.992.148	$ 64.123.364
3	EL ROSARIO	$ 128.640.862	$ 128.640.862	$ 64.320.431	$ 55.630.027	$ 8.690.404
4	SEVILLA	$ 100.119.751	$ 100.119.751	$ 50.059.876	$ 38.392.394	$ 11.667.481
5	VILLA FATIMA	$ 210.261.207	$ 210.261.207	$ 105.130.604	$ 58.874.940	$ 46.255.663
TOTAL		$ 679.505.761	$ 679.505.761	$ 339.752.882	$ 203.851.728	$ 135.901.151

OBSERVACIONES

A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato, presentando la documentación requerida y los soportes para la firma del acta final.

	Por parte de la supervisión se ha realizado revisión de los documentos que hacen parte del Acta Final, tales como informe de interventoría, memorias de cantidades de obra, planillas de seguridad social, pólizas actualizas, entre otros. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato de obra 122 DE 2024, razón por la cual, se autoriza cancelar el valor correspondiente al ACTA FINAL según los valores discriminados en cada uno de los centros de salud.

Atentamente,

ANGIE LORENA GASCA OME
Supervisora contrato de Obra 122 de 2024

Proyectó:

ING. ROBERTO ÑAÑEZ MUÑOZ
Apoyo a la Supervisión

Con copia: Tesorería
