CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024

Yopal, 27 de febrero de 2025

OFICIO OP-003

Ingeniero
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

Yopal, 2025/02/27 10:57:35
RAD: 20250102012
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Asunto: Entrega de informes semanales 1, 2 y 3.

Ref.: Contrato de consultoría 382 de 2024 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

N° INFORME SEMANAL	PERIODO	FOLIOS
1	Del 03/02/2025 al 09/02/2025	4
2	Del 10/02/2025 al 16/02/2025	4
3	Del 17/02/2025 al 23/02/2025	4

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

CONSORCIO INTER - OROPAZ 2024
R/L DIANA PAOLA RAMIREZ MONTAÑEZ
Contrato de consultoría No 382 de 2024

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

Semana Número:	1	Del:	3/02/2025	Al:	9/02/2025	No:	1

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 7 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GAS CAPIBARA

Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

Nombre Apoyo a la Supervisión: CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE, PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	005 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAS CAPIBARA				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	6925	No R.P.	6925
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.224.801.805,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.889.920.722	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 2.889.920.722	40%

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,96%	0,96%	OBRA EJECUTADA (%)	0,68%	0,68%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 69.272.145,60	$ 69.272.145,60	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 49.248.000,00	$ 49.248.000,00

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	382 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	4125	No R.P.	4125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 762.327.150,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

FECHA DE INCIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la socializacion del proyecto con la comunidad el dia 03 de febrero de 2025.
Se da inicio a la actividad de REPLANTEO y LOCALIZACION de TUBERIAS de GAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Socializacion del proyecto



Descripción: Localización y replanteo

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850126

INTERVENTORIA X **APOYO SUPERVISION**

Se proyecta dar inicio a las actividades: excavación manual en material común, relleno de excavaciones y conexiones domiciliarias e instalación de tuberías de 4" y relleno de material seleccionado.
Además, continuar con la localización y replanteo.

OBSERVACIONES



En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024
R/L Diana Paola Ramirez Montañez
INTERVENTOR

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Recibió

CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN

VoBo:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	382 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

Semana Número:	2	Del:	10/02/2025	Al:	16/02/2025	No:	2

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 14 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GAS CAPIBARA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE, PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	005 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAS CAPIBARA				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	6925	No R.P.	6925
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.224.801.805,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.889.920.722	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 2.889.920.722	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,96%	1,92%	OBRA EJECUTADA (%)	10,59%	11,27%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 69.272.145,60	$ 138.544.291,20	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 765.120.276,00	$ 814.368.276,00

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	382 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	4125	No R.P.	4125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 762.327.150,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

FECHA DE INCIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A


RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la actividad de REPLANTEO y LOCALIZACION de TUBERIAS de GAS
Se da inicio a la actividad de excavación manual en material común
Se da inicio a la actividad de instalación de tubería 4"
Se inicia el relleno de excavaciones, con la debida instalación de cinta de seguridad.
Se inicia con la actividad de excavacion mecanica en zanja (0 - 15m).

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Excavación mecánica y relleno de excavaciones.

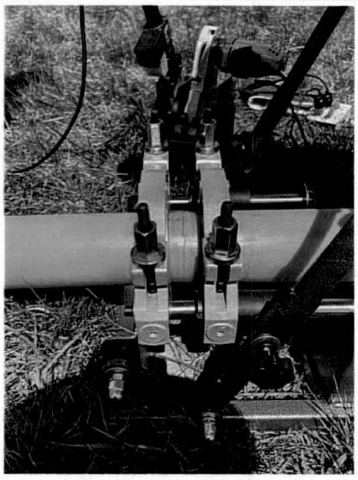

Descripción: Intalación de tubería de 4".

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850126

INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

Continuar con la actividad de REPLANTEO y LOCALIZACION de TUBERIAS de GAS
Continuar con la actividad de excavación manual en material común
Continuar con la actividad de instalación de tubería 4"
Continuar con el relleno de excavaciones, con la debida instalación de cinta de seguridad.
Continuar con la actividad de excavacion mecanica en zanja (0 - 15m).

OBSERVACIONES



En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER - OROPAZ 2024
R/L Diana Paola Ramirez Montañez
INTERVENTOR

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Recibió

CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN

VoBo:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

Semana Número:	3	Del:	17/02/2025	Al:	23/02/2025	No.	3

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 21 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GAS CAPIBARA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE, PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.							
CONTRATO No	005 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAS CAPIBARA					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	6925	No R.P.	6925	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.224.801.805,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A					
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.889.920.722	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 2.889.920.722	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,96%	2,88%	OBRA EJECUTADA (%)	10,51%	21,79%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 69.272.145,60	$ 207.816.436,80	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 759.621.740,00	$ 1.573.990.016,00

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**						
CONTRATO No	382 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	4125	No R.P.	4125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 762.327.150,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

FECHA DE INCIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la actividad de excavación manual en material común
Se continúa con la actividad de instalación de tubería 4"
Se continúa con el relleno de excavaciones, con la debida instalación de cinta de seguridad.
Se continúa con la actividad de excavacion mecanica en zanja (0 - 15m).
Se inicia la actividad de instalación de tubería 1/2"

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Excavación mecánica y relleno de excavaciones.



Descripción: Excavación manual en material común.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATO No.:	382 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	27	2	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850126

INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

Continuar con la actividad de REPLANTEO y LOCALIZACION de TUBERIAS de GAS
Continuar con la actividad de excavación manual en material común
Continuar con la actividad de instalación de tubería 4"
Continuar con el relleno de excavaciones, con la debida instalación de cinta de seguridad.
Continuar con la actividad de excavacion mecanica en zanja (0 - 15m).

OBSERVACIONES



En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024
R/L Diana Paola Ramirez Montañez
INTERVENTOR

Recibió

CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

VoBo:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
