CONTRATO No.:	382 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		25	3	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA: X — APOYO SUPERVISION:

Semana Número:	7	Del:	17/03/2025	Al:	23/03/2025	No:	7

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 1 Meses y 20 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GAS CAPIBARA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE, PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	005 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GAS CAPIBARA				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	6925	No R.P.	6925
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.224.801.805,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.889.920.722	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 2.889.920.722	40%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	5,88%	15,18%	OBRA EJECUTADA (%)	8,67%	50,96%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 424.673.771,93	$ 1.096.793.909,95	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 626.607.073,00	$ 3.681.537.000,84

CONTRATO No.:	382 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		25	3	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	382 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER – OROPAZ 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0126	No. C.D.P.	4125	No R.P.	4125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 762.327.150,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de octubre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

			DD	MM	AA
CONTRATO No.:	382 DE 2024	**FECHA**	25	3	2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850126

INTERVENTORIA X **APOYO SUPERVISION**

FECHA DE INCIO	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	**N/A**

PRORROGAS			**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**		
CONTRATO ADICIONAL No	**TIEMPO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	**ACTA No**	**TIEMPO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	**VALOR**	**NUEVO VALOR DEL CONTRATO**
N/A	**N/A**	**N/A**

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la localización y replanteo en las veredas Akimindia, La Potosi, La Aguada y El Jordan del municipio de Paz de Ariporo.
Se continúa con la actividad de excavación manual en material común en El Duya, la esmeralda y san Juanito del municipio de Orocué. Asi mismo, se realiza el posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con la actividad de instalación de tubería 4" en el R.I El Duya del municipio de Orocué.
Se continúa con la actividad de instalación de tubería 1/2" en el R.I El Duya y en san Juanito del municipio de Orocué.
Se continúa con la actividad de excavacion mecanica en zanja (0 - 15m) en el RI El Duya y el posterior relleno de las excavaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Excavación manual



Descripción: Instalación de tubería

CONTRATO No.:	382 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		25	3	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850126


INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la localización y replanteo en Paz de Ariporo.
Continuar con la actividad de excavación manual en material común, con la instalación de tubería 4", con el relleno de excavaciones y con la actividad de excavacion mecanica en zanja (0 - 15m) en los resguardos indigenas El Duya, San Juanito, la esmeralda y el casco urbano del municipio de Orocué.

OBSERVACIONES

Para el corte de la presente semana se tiene un adelanto del 35,78%.

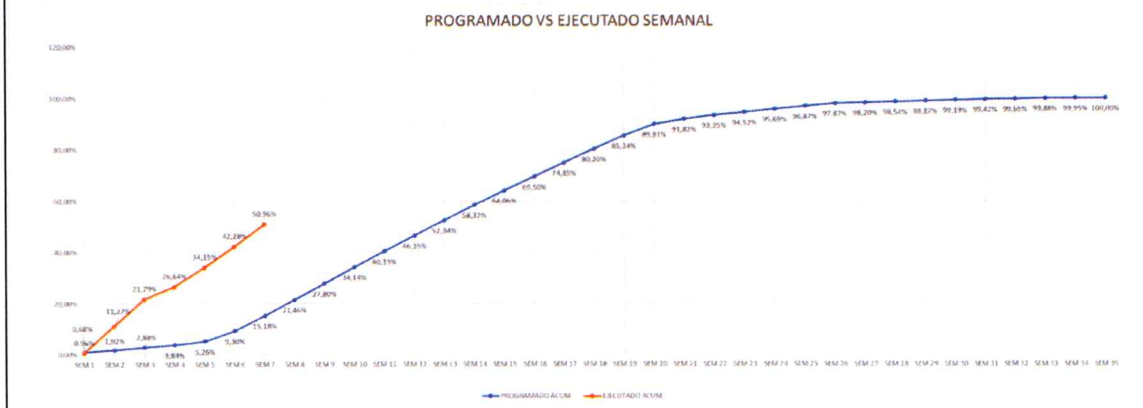

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER- OROPAZ 2024
R/L Diana Paola Ramirez Montañez
INTERVENTOR

Recibió

CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

VoBo:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
