DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO

NIT 80099370 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085178296 del 11/12/2024 al 11/06/2025
Habilita numeración de:
FE-19 al FE-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 11 A No 11 - 46

Facatativá,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE29
Fecha de emisión: 02/04/2025 08:52:52 AM
Fecha de validación DIAN: 02/04/2025 08:54:17 AM
Fecha de vencimiento: 17/04/2025
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT 900594382 - 6
Dirección: CL 26 51 53 TO BENEFICENCIA P 5
Codigo Cliente 4
Teléfono: 3135653846
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. UAEPC – 215- 2024	CUARTO PAGO - CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/02/2025 Y EL 12/03/2025 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	1,00	unidad	COP 12,428,924.37	COP 0.00	IVA(19%)		COP 12,428,924.37

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO IDENTIFICADO CON CC No 80.099.370

Subtotal:	COP 12,428,924.37
IVA(19%)	COP 2,361,495.63

Impuestos:	COP 2,361,495.63
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 14,790,420.00
Neto a pagar	COP 14,790,420.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE e507a845b9d5ad3ce306560c969cf65f93cc58ca327f21dfb6f0eb16587a113dbb87dd9212a1f2745f2b121a6a3d2443

INFORME CUARTO PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEPC – 215- 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".



MARZO DE 2025

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Como objeto primordial, del presente proceso constructivo, es mejorar y/o adecuar las instalaciones físicas y de tránsito, en la casa RANCHO ACUARIES, ubicada en Municipio de Tocaima (Cundinamarca), y perteneciente a la UAEPC.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, mediante CONTRATO DE OBRA No. UAEPC – 214- 2024, cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",** por un valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($999.975.663),** y una adición de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 499.924.293,00); para un valor final de: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHCOIENTOS NOVENTA Y NUEVEL MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.499.899.956).**

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA mediante el proceso de selección por contratación de menor cuantía, suscribe el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEPC – 215- 2024**, con **DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO** cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".** por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE $29.580.840, INCLUIDO IVA**

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA:

- **CONTRATISTA DE OBRA**

CONTRATO N°	UAEPC – 214- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OCRRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($999.975.663)
ADICIÓN NO. 1	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($999.975.663)
VALOR ADICIÓN:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 499.924.293,00)
VALOR FINAL:	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHCOIENTOS NOVENTA Y NUEVEL MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.499.899.956).
CONTRATISTA	ROMING S.A.S NIT. 9008105438 R/L DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS C.C.: 1.010.184.700 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA DIRECTOR GENERAL UAEPC
FECHA DE INICIO	13 de noviembre de 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DOS (2) MESES
PRORROGA No 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No 2	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMIACIÓN FINAL	6 de abril de 2025

- **INTERVENTORÍA**

CONTRATO N°	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. UAEPC-215-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE $29.580.840
ADICIÓN NO. 1	VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($22.185.630,00)
ADICIÓN NO. 2	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.580.840)
VALOR TOTAL CONTRATADO	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($81.347.310)
CONTRATISTA	DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO
SUPERVISOR	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MEDINA DIRECTOR GENERAL UAEPC
FECHA DE INICIO	11 de marzo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 de julio de 2024
PRORROGA No 1	31 de diciembre de 2024
PRORROGA No 2	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27 de abril de 2025

INFORMACIÓN JURÍDICA:

CONTRATO DE OBRA

Anexo 2 a la Póliza No. 14-40-101068454

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
Predios labores y operaciones	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Contratistas y subcontratistas	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Vehículos propios y no propios	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Responsabilidad civil patronal	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	13/11/2024	13/02/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

Anexo 3 a la Póliza No. 14-44-101222694

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	13/06/2025	$99,997,566.30	$99,997,566.30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/11/2024	13/02/2026	$149,996,349.45	$149,996,349.45

Pago de Salarios , Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	13/02/2028	$49,998,783.15	$49,998,783.15
Estabilidad y calidad de la Obra	28/12/2024	28/12/2029	$499,987,831.50	

INTERVENTORÍA:

Anexo 6: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	27/08/2025	$16,269,462.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/04/2028	$4,067,365.50

Anexo 5: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	27/06/2025	$16,269,462.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/02/2028	$4,067,365.50

Anexo 4: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	27/06/2025	$ 10,353,294.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	27/02/2028	$2,588,323.50

Anexo 3: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024	13/03/2025	$ 10,353,294.00
Calidad del Servicio	13/01/2025	13/01/2030	$5,916,168.00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/11/2024	13/01/2028	$2,588,323.50

Anexo 2: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	11/03/2024	11/11/2024	$ 4.123.523,20
Calidad del Servicio	11/07/2024	11/07/2027	$ 4.123.523,20
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	11/03/2024	11/07/2027	$ 1.030.880,80

Anexo 1: Póliza No. 21-44-101455166

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ANTERIOR	SUMA ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	13/11/2024			
Calidad del Servicio	11/07/2024	11/07/2027	$ 4.123.523,20	
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	11/03/2024	11/07/2027	$ 1.030.880,80	$ 1.030.880,80

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

- FINCA CASA ACUARIES - TOCAIMA, CUNDINAMARCA

Casa finca vereda la Tete – Coordenadas: 4.467001082098247, -74.68603246013294



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ÍTEMS

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

INFORME FINANCIERO

1. Avance Financiero del contrato de obra No UAEPC – 214- 2024

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$999.975.663,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.499.898.730,00
FECHA ACTA PARCIAL NO. 1	23/12/2024
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1	$ 302.326.738,00
FECHA ACTA PARCIAL NO. 2	07/03/2025
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL NO. 2	$659.980.808,00
SALDO POR COBRAR	$537.591.184,00
PORCENTAJE DE AVANCE	64,16%
PORCENTAJE POR COBRAR	35,84%

2. Avance financiero del contrato de interventoría No UAEPC – 214- 2024

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$29.580.840,00
VALOR ADICIÓN No 1	$22.185.630,00
VALOR ADICIÓN No 2	$29.580.840,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$81.347.310,00
VALOR COBRADO	$44.371.260,00
PORCENTAJE COBRADO	60%
SALDO POR COBRAR	$ 36.976.050,00
PORCENTAJE POR COBRAR	40%

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

Cordialmente,



ING. DIDER IVAN GONZALEZ FORERO
Interventor

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

ACTA DE PAGO APROBADA EN ESTE PERIODO

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com



ROMING. SAS
NIT 900.810.543-8
Cra 19 # 8A-15
Tel: 3118212284
Fusagasugá - Colombia
romingsas@gmail.com
www.romingsas.com

Factura electrónica de venta
No. FEL 137

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
NIT	900.594.384-6	**Teléfono**	(601) 7491642 - Ext. 000
Dirección	CALLE 26 #51-53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2025, 11:04
Expedición	07/03/2025, 11:04
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.00	496,226,171.00	496,226,171.00	0 %	0.00	496,226,171.00
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	124,056,543.00	124,056,543.00	0 %	0.00	124,056,543.00
3	IMPREVISTOS	1.00	24,811,309.00	24,811,309.00	0 %	0.00	24,811,309.00
4	UTILIDAD	1.00	14,886,785.00	14,886,785.00	0 %	0.00	14,886,785.00

Total items: 4

Total Bruto	659,980,808.00
Total a Pagar	659,980,808.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y nueve millones novecientos ochenta mil ochocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-06 por $ 659,980,808.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082621769 aprobado en 20241031 prefijo FEL desde el número 125 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 5
CUFE: 46f1a6d642bab8c5cb2127c096fe22aa9bf69830d8a1562995ff9cfcea512c8fca214c0e064db71c26e04f57d6b519c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE OBRA – CORTE # 2

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTIA: N.º UAEPC-214-2024.

CONTRATISTA: ROMING S.A.S

MES: FEBRERO

AÑO: 2025

TOCAIMA

CUNDIANAMARCA.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1. DESCRIPCION GENERAL 4
1.2. LOCALIZACION..... 4
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6
2.1. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS..... 6
2.2 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: 181
3. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS..... 181
..... 182
3.1. ESTADO FINANCIERO..... 182
4. HERRAMIENTA UTILIZADA..... 183
5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 184
ANEXOS..... 185



1. INTRODUCCIÓN

En lo siguiente se muestra un planteamiento del proyecto dirigido a una población del municipio de Tocaima, Cundinamarca **N.º UAEPC-214-2024** de contrato y su objetivo es la **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**. Este proyecto se efectúa con el fin de dar una mejor calidad de infraestructura para la fauna y flora de las especies que habitan en la zona y generaciones nuevas que se encaminan hacia el futuro, se determina una construcción mejorada con los estándares de calidad y la normatividad vigente para este tipo de proyectos.

1.1. DESCRIPCION GENERAL

Realizar la construcción de estructuras de viviendas, y demás áreas que proporcionen una sana convivencia y una mejor calidad de vida a las personas beneficiadas por este proyecto ACUARIES, también realizar un empalme a favor de la fauna y flora del área a intervenir,

1.2. LOCALIZACION

FINCA CASA ACUARIES - TOCAIMA, CUNDINAMARCA



Imagen 1: Casa finca vereda la Tete – Coordenadas: 4.467001082098247, -74.68603246013294 – FUENTE: Google Maps.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	UAEPC-214-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA.
SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA
CEDULA DE CIUDADANÍA:	80.798.446 DE BOGOTA D.C
CARGO:	DIRECTOR GENERAL
CONTRATISTA:	ROMING SAS
NIT:	900.810.543-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.010.184.700 DE BOGOTA D.C
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20 DE JUNIO DE 2023
INTERVENTOR:	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO
CEDULA DE CIUDADANÍA:	80.099.370 DE BOGOTA D.C
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2:	6 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	HASTA EL 06 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 999.975.663,00
FECHA DE ADICIÓN No. 1:	6 DE FEBRERO DE 2025
ADICIÓN No. 1	$ 499.924.293,00
VALOR FINAL DEL CONTRATADO	$ 1.499.898.730,00
VALOR EJECUTADO CORTE 1:	$ 302.326.738,00
VALOR EJECUTADO CORTE 2:	$ 302.326.738,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 697.648.925,00

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- EL CONTRATO N° UAEPC-214-2024.
- CONTRATISTA: ROMING S.A.S
- OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
- ESTADO DEL CONTRATO: **EN EJECUCION**.

2.1. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Se Realiza Verificación de Obra ROMING S.A.S de las memorias de cálculo de cantidades ejecutadas del contrato de obra **N.º UAEPC-214-2024**, Tocaima, Cundinamarca – Objeto: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 1.3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ANADAMIOS CERTIFICADOS, EN CASA DEL ADMINISTRADOR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ANDAMIOS SECCIONES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SECCION DE ANDAMIOS CON RODACHINES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SECCION DE ANDAMIOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)

ITEM 1.4

ASEO GENERAL PERMANENTE EN OBRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: Aseo en la area de ejecucion del Proyecto. FUENTE: `PROPIA.



Fotografía Nº 2 Recoleccion de Residuos para Botadero. FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : Aseo reallizado en sitio predestinado, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4 Limpieza de Area FUENTE: PROPIA.

NOTA: ACTIVIDAD REALIZADA CONSTANTEMENTE PARA MANTENER UN AREA DE TRABAJO OPTIMA.

UBICACIÓN	PARQUEADERO	ITEM 2.3	UNIDAD DE MEDIDA	ML

DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO, FUENTE: `PROPIA.



Fotografía Nº 2 DEMOLICION DE CONCRETO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : LIMPIEZA DE AREA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4 INICIO DE RAMPA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO.

ITEM 3.2 - PARQUEADERO

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: Compactacion de Area a construir, FUENTE: `PROPIA.



Fotografía Nº 2: Compactacion Mecanica, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : Recebo B200 FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: Compactacion de Recebo Fino, FUENTE: PROPIA.

NOTA: MATERIAL PARA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL.

UBICACIÓN	PARQUEADERO	ITEM 4.1	UNIDAD DE MEDIDA	KG

ACERO FIGURADO DE 60000 PSI.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: AMARRADO DE CANASTAS, FUENTE: `PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE VIGAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ENCOFRADO DE VIGAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: REFUERZO DE VIGAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE ACERO FIGURADO DE 60000 PSI.

ITEM 4.2

CONCRETO CLASE C =4000PSI (PLACAS)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: Vaciado de Concreto de 4000 PSI, para placa peatonal, FUENTE: `PROPIA.



Fotografía Nº 2: Tallado y Acabado de Concretos, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : Construccion de Bordillos Fundidos en Sitio, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: Tallado y Acabado de Concretos, FUENTE: PROPIA.

NOTA: RAMPA DISEÑADA CON EL FIN DEL INGRESO A CUARTOS DE COMPOSTAJE.

ITEM 5.1

CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M - CUARTO DE COMPOSTAJE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: Instalacion de Tela Verde FUENTE: `PROPIA.



Fotografía Nº 2: Instalacion de Postes de Templete para Tela Verde H: 2.10 M, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : Instalacion Tela Verde Con Templetes, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: Instalacion de Cerca en Tela Verde, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CERRAMIENTO DE AREA A TRABAJAR EN TELA VERDE.

ITEM 5.2

HIDROLAVADO DE MUROS, FACHADAS Y TECHOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: Hidrolavado, de Tejado FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: Hidrolavado de Muros, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : Lavado de Muros Internos FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: Limpieza de Paredes Externas, FUENTE: PROPIA.

NOTA: LIMPIEZA DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, CUBIERTA DE CUARTOS DE COMPOSTAJE.

ITEM 6.1

DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: Demolicion de Muros, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: Demolicion de Muros E= 0.15 m FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : Demolicion en Puertas, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: Limpieza, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZA DEMOLICION DE MAMPOSTERIA PARA DIVIDIR EL CUARTO DE COMPOSTAJE EN 2 AREAS.

ITEM 6.2

MURO EN BLOQUE N.º 5 E=0.12 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: MAMPOSTERIA EN BLOQUE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TRAZADO DE MAMPOSTERIA FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MAMPOSTERIA EN BLOQUE Nº 5. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: BLOQUE Nº 5 E= 0.15 CM, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZA MURO EN MAMPOSTERIA, CERRAR ENTRADA DE COMUNICACIÓN A LAS 2 AREAS.

ITEM 6.3

MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: MURO EN BLOQUE Nº 5 E= 0.12 CM
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TRAZADO DE MAMPOSTERIA
FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MAMPOSTERIA EN BLOQUE Nº 5. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: BLOQUE Nº 5 E= 0.12 CM, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZA MAMPOSTERIA EN AREA FRONTAL DE COMPOSTAJE, PARA INSTALACION DE PUERTA.

ITEM 6.4

PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: AFINADO DE PAÑETE EN MUROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PAÑETE LISO EN REGATAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PAÑETE LISO EN MAMPOSTERIA, E= 1.5 CM, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO EN PAÑETE LISO, MUROS EXTERIORES, FUENTE: PROPIA.

NOTA: PAÑETE EN MAMPOSTEIA REALIZADA EN CUARTO DE COMPOSTAJE.

ITEM 6.5

PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PAÑETE LISO, E= 2 CM, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PAÑETE LISO EN PLACAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : AREA DE VENTANAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ESPESOR DE PAÑETE LISO, AREA VENTANAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: PAÑETE LINEAL DE AREAS DE PUERTAS Y VENTANAS.

ITEM 7.1

INSTALACION DE ESTUCO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS EXTERNOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS INTERNOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ESTUCO AREAS EXTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ESTUCO AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE ESTUCAN TODOS LOS MUROS EXTERNOS E INTERNOS DE CUARTO COMPOSTAJE.

ITEM 7.2

ESTUCO LINEAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS EXTERNOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS EXTERNOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ESTUCO AREAS EXTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ESTUCO AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZA ESTUCO EN LINEALES DE PUERTS Y VENTANAS CUARTO DE COMPOSTAJE.

ITEM 7.3

FILOS O DILATACIONES S/MUROV

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FILOS EN AREAS DE VENTANAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FILOS EN PUERTAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FILOS EN AREAS DE VENTANAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DILATACIONES, FUENTE: PROPIA.

NOTA: FILOS EN MORTERO PARA ACABADOS DE VENTANAS Y PUERTAS DE AREA COMPOSTAJE.

ITEM 7.5

PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACION DE PINTURA EN AREAS INTERNAS FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PINTURAEN AREAS EXTERNAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE PELICULA DE PINTURA, FACHADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: APLICACIÓN DE PELICULA DE PINTURA EN AREAS EXTERNAS. FUENTE: PROPIA.

NOTA: BASE DE PINTURA VINILO, PARA FONDO DE COLOR FINAL DE COMPOSTAJE.

ITEM 7.6

PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PELICULA DE PINTURA, PRIMERA MANO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RETOQUES EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE PINTURA A MESONES Y ARMARIOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN RECORTES DE PUERTAS Y VENTANAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: DETALLES PARA FILOS EN PINTURA VINILO PARA BASE DE COLOR FINAL.

ITEM 8.1


DESMONTE MARCOS Y PUERTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INICIO DE DESMONTE DE PUERTAS, FUENTE: PROPIA.

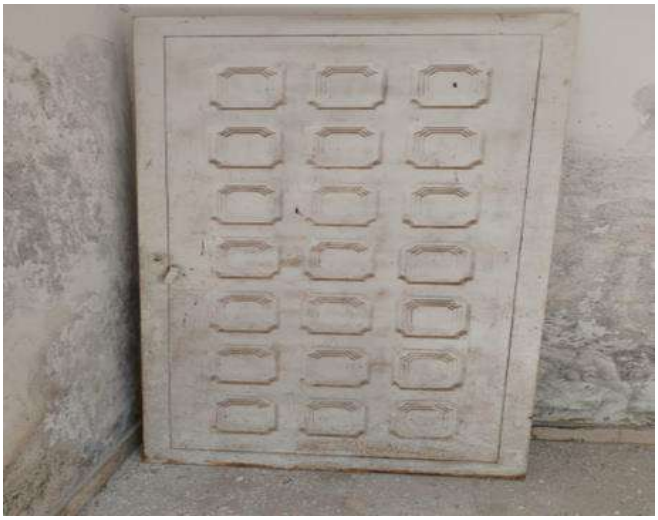

Fotografía Nº 2: PUERTA DESMONTADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ESPACIO PARA MEJORAMIENTO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DESMONTE PUERTA INTERNA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: DESMONTE DE PUERTA EN CUARTO COMPOSTAJE, SE REALIZA PARA DIVIDIR ESTE CUARTO EN 2 AREAS.

ITEM 8.2

DESMONTE DE VENTANAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: VENTANAS A DESMONTAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INICIO DE DESMONTE DE VENTANAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : DESMONTE DE VENTANAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: MEJORAMIENTO EN FILOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: DESMONTE DE VENTANA EN CUARTO COMPOSTAJE PARA SU ARREGLO Y CORRECION DE INSTALACION.

ITEM 8.3

PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO (1,8*2,1) INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGA, PINTURA ELECTROSTATICA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PUERTA CALIBRE 18 A INSTALAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE PUERTA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PUERTA INSTALADA Y ASEGURADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FACHADA FUENTE: PROPIA.

NOTA: PUERTA ACCESO A CUARTO COMPOSTAJE ZONA HERRAMIENTAS.

ITEM 8.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED CAL18, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: SITIO PARA INSTALACION DE VENTANA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: VENTANA CORREDIZA A INSTALAR, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE VENTANA CALIBRE 18, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: VENTANA CORREDIZA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: VENTANA CORREDIZA, EN CUARTO COMPOSTAJE AREA DE HERRAMIENTAS.

ITEM 8.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO ROMBO CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROTATICA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CONSTRUCCION DE VENTANA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: DISEÑO Y SOLDADURA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE VENTANA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PINTURA EN VENTANA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: REJA PARA SEGURIDAD DEL CUARTO HERRAMIENTAS.

ITEM 8.7

MESONES EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) DOBLE MESON CON ACABADO EN GRANITO ANCHO PLACA SUPERIOR 0.26 Y PLACA INFERIOR 0.55M (INCLUYE MEDIA CAÑA Y FALDON O NARIZ, ENTREPAÑO EN CONCRETO, E: 5 CMS, ACABADO EN GRANITO PULIDO) MUROS LATERALES (O.55 X 0.78 X O.10) Y MURO FRONTAL (0.98M X 1.00M X 0.10M) REPELLADOS, ESTUCADOS Y PINTADOS POR TODAS LAS CARAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CONSTRUCCION DE MESON, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ACABADOS DE MESON, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACABADOS DE COMPARTIMINETOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: MESONES CON DISTRIBUCION Y ACABADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE SABANAS Y HERRAMIENTAS.

ITEM 9.1

APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: REGATA PARA TUBERIA ELECTRICA Y PUNTOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: REGATA PARA CIRCUITO ELECTRICO CERRADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : RESTABLECIMIENTO DE MURO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4 MORTERO PARA CUBRIR REGATA ELECTRICA FUENTE: PROPIA.

NOTA: APERTURA DE REGATAS PARA LA INSTALACUON DE TUBERIA CONDRUIT, EN CUARTOS DE COMPOSTAJE

ITEM 9.2

SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE EMT, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE SOPORTE DE LAMPARA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE SOPORTES LATERALES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE TUBERIA EMT, FUENTE: PROPIA.

NOTA: DISTRIBUCION DE PUNTOS ELECTRICOS, PARA ILUMINARIAS.

ITEM 9.3

LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: UBICACIÓN DE LAMPARAS LED, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE LAMPARA LED, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ACABADOS EN PVC FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSPECCION DE LAMPARAS LED DE 18W / 6500 K FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE ILUMINARIAS LED, PARA AREA DE CUARTOS DE COMPOSTAJE.

ITEM 9.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CABLE ENCAUCHETADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE SENSORES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CABLE ENCAUCHETADO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 9.7	UNIDAD DE MEDIDA	ML

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




Fotografía Nº 1: INSTALACION DE CABLE 3X12 AWG 7 HILOS, FUENTE: PROPIA.




Fotografía Nº 2: TUBERIA DE CONDUCCION, FUENTE: PROPIA.

DESPUES

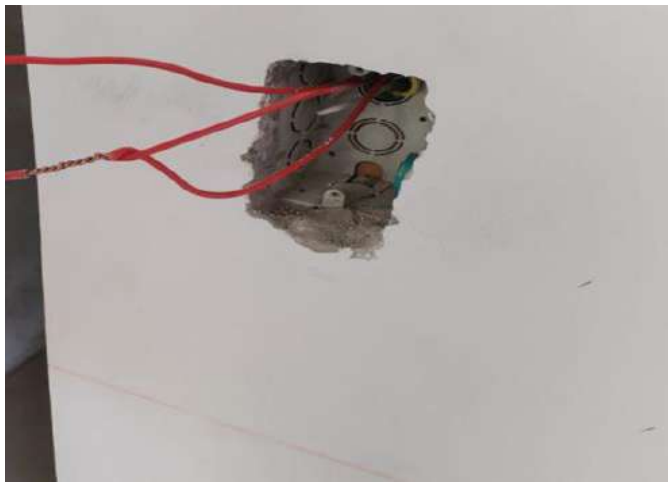

Fotografía Nº3 : FUENTE: PROPIA.

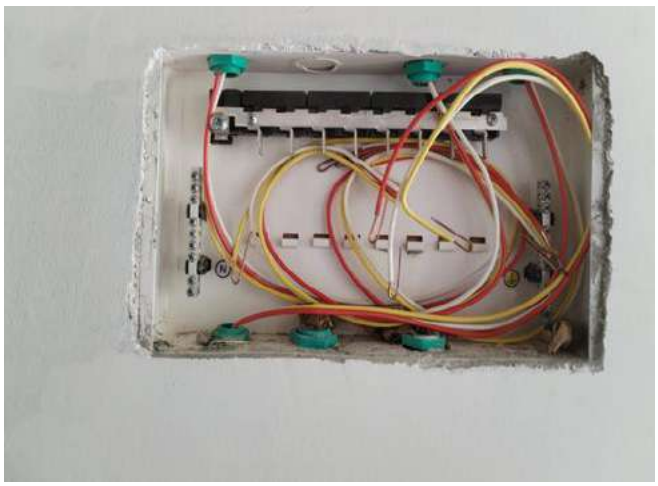

Fotografía Nº 4: FUENTE: PROPIA.

NOTA: RED SUMINISTRO PRINCIPAL ELECTRICO.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE RECORRIDO DE CUBIERTA AJUSTE, LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y SUMINISTRO DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PAÑETE ENTRE ESPACIOS DE CUBIERTA Y VIGA CINTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PERFIL PARA CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MEJORAMIENTO DE CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: AJUSTE DE CUBIERTA, TEJAS FUENTE: PROPIA.

NOTA: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CUARTO COMPOSTAJE, GOTERAS Y EMPALMES DE TEJAS.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.2	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA COLONIAL ROJO 1.97 X 0.72 X 2.3MM, INCLUYE GANCHOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE TEJAS DE FIBROCEMENTO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CAMBIO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION COMPLETA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CAMBIO DE TEJAS EN MAS ESTADO DE AREA CUARTO DE COMPOSTAJE.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.3	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: TUBO ESTRUCTURAL DE 15 MM, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TERMINACION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PELICULA EN ESMALTE BLANCO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: ESTRUCTURA EN PERFILERIA, PARA TEJA DE FIBROCEMENTO. CUARTO COMPOSTAJE.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.4	UNIDAD DE MEDIDA	ML

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PINTURA ANTICORROSIVA EN PERFILES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE CAPA DE PINTURA AL RESPALDO DE LA CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: PINTURA ANTICORROSIVA PARA FONDE DE PINTURA FINAL.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.5	UNIDAD DE MEDIDA	ML

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PINTURA ESMALTE EN PERFILES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE CAPA DE PINTURA AL RESPALDO DE LA CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: ESMALTE COLOR NEGRO, ACABADO FINAL PARA ESTRUCTURA METALICA.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.6	UNIDAD DE MEDIDA	M2

TEJA ESPAÑOLA ETERNIT

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ESTRUCTURA PARA CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE TEJA ESPAÑOLA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE TEJA ESPAÑOLA ETERNIT, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: APLICACIÓN DE PINTURA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: TEJA ESPAÑOLA EN AREA AMPLIACION COMPOSTAJE.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.7	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CONSTRUCCION DE ANCLAJES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE RINCONERAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC, PARA CUARTOS DE COMSPOSTAJE.

UBICACIÓN	CUARTO DE COMPOSTAJE	ITEM 10.8	UNIDAD DE MEDIDA	UNID

ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ANADAMIOS CERTIFICADOS, EN CASA DEL ADMINISTRADOR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ANDAMIOS SECCIONES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SECCION DE ANDAMIOS CON RODACHINES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SECCION DE ANDAMIOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 14.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EXCAVACION MANUAL, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ESPESOR DE EXCAVACION DE 0.20 M, FUENTE: PROPIA.

NOTA: EXCAVACION MANUAL EN ROCA, VARIAS

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 14.7	UNIDAD DE MEDIDA	M3

CONCRETO DE 3000 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE REFUERZOS DE HIERRO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ALINIAMIENTO Y EJES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI EN PLACA DE PISO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI EN ANDEN PEATONAL, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONCRETOS DE PASILLOS Y CORREDORES

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 14.9	UNIDAD DE MEDIDA	M2

MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CONSTRUCCION DE MURO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: MURO PARA MESON, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MORTERO PARA RECUBRIMIENTO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PAÑETE LISO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: MESON EN AREA DE COCINA CASA ADMINISTRADORES.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 14.10	UNIDAD DE MEDIDA	M3

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ESTENDIDO DE RECEBO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APISONADOR, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APISONADOR RANA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SITIO PARA FUNDICION DE CONCRETO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: BASE DE NIVELACION CON RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 14.12	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FUNDIDA DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ANDEN LATERAL FUNDIDO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : DELIMITACION DE ANDEN, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: MUROS A INTERVENIR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PAÑETE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : RECORTE DE ESPESOR DE PAÑETE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PAÑETE LISO E= 1.5 CM, FUENTE: PROPIA.

NOTA: PAÑETE LISO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.2	UNIDAD DE MEDIDA	ML

PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PAÑETE LISO EN AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PAÑETE LISO LINEAL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PAÑETE LISO EN FACHADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PAÑETE LISO EN VENTANAS Y PUERTAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: PAÑETE LISO EN PUERTAS, VENTANAS Y COLUMNETAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.3	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PAÑETE EN EXTERIORES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : AFINADO DE PAÑETE EN AREAS INTERIORES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PAÑETE EN AREAS DE VENTANAS Y PUERTAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE APLICO PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE Y EXTERIORES.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.4	UNIDAD DE MEDIDA	ML

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PAÑETE EN MUROS INTERIORES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE PAÑETE EN DINTELES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : AFINADO DE PAÑETE EN FACHADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PAÑETE EN AREAS DE VENTANAS Y PUERTAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE APLICO PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE Y EXTERIORES.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 7.3	UNIDAD DE MEDIDA	ML

FILOS O DILATACIONES S/MUROV

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FILOS EN VENTANAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FILOS EN AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FILOS EN COLUMNAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: FILOS Y DILATACIONES EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.6	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ESTUCO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS INTERNOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS INTERNOS Y RECORTES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS EXTERNOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO EN ESTUCO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACIÓN DE ESTUCO AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CASA DEL ADMINISTRADOR..

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.7	UNIDAD DE MEDIDA	ML

ESTUCO (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ESTUCO EN VENTANAS Y PUERTAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ESTUCO EN VENTANALES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS EXTERNOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO EN ESTUCO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACIÓN DE ESTUCO AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CASA DEL ADMINISTRADOR..

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.8	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RECORTES EN BORDES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PINTURA EN VINILO BLANCO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: EN AREAS SUPERIORES, FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACIÓN DE PELICULA EN PINTURA VINILO DE 1 A 3 MANOS EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.9	UNIDAD DE MEDIDA	ML

PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RECORTES EN BORDES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PINTURA EN VINILO BLANCO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: EN PUERTAS Y VENTANAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACIÓN DE PELICULA EN PINTURA VINILO DE 1 A 3 MANOS EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.12	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ALISTADO EN AREAS INTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ALISTADO EN AREAS INTERNAS E=0.04 CM FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ALISTADO EN AREAS DE PUERTAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ALISTADO EN CORREDORES Y ZONAS PEATONALES, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZA EL ALISTADO ENDURECIDO CON MATERIALES DE CALIDAD Y NORMAYIVIDAD VIGENTE.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 15.13	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ALISTADO IMPERMEABILIZADO EN AREAS EXTERNAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RECORTE DEL ALISTADO IMPERMEABILIZADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FRAGUADO DE LA MEZCLA IMPERMEABILIZANTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SECADO DEL ALISTADO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZA PARA EVITAR LA HUMEDAD, SEGÚN EL SUELO FREATICO QUE SE PRESENTA E INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EXCAVACION DE ZANJA PERIMETRAL, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CAJA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS SANITARIAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: ESTAS EXCAVACIONES SE REALIZARON PARA UBICACIÓN DE TUBERIAS Y CAJAS DE INSPECCION.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.2	UNIDAD DE MEDIDA	ML

RED SUMINISTRO PVC 1"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE SUMINISTRO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE TUBERIA DE 1 PULGADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : RED DE TUBERIA DE SUMINISTRO,, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACCESORIOS PARA DIRECCIONAMIENTO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA EN PVC DE 1 PULGADA.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.3	UNIDAD DE MEDIDA	ML

RED SANITARIA PVC-S 4"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE TUBERIA DE 4 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUES, PULGADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : RED DE TUBERIA DE DESAGUE PARA BAÑOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TUBERIA HACIA CAJAS DE INSPECCION, FUENTE: PROPIA.

NOTA: RED SANITARIA DE 4 PULGADAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.4	UNIDAD DE MEDIDA	UNID

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: SALIDA SANITARIA ACCESORIOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: EXCAVACION PARA SALIDAS SANITARIAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SALIDAS SANITARIAS DE 4 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CON RELLENO EN RECEBO FINO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SALIDAS SANITARIAS PARA DESAGUES.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.6	UNIDAD DE MEDIDA	UNID

PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PUNTP HIDRAULICO PARA DUCHA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PUNTO HIDRAULICO EN COCINA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DEMARCAMIENTO PARA PUNTOS HIDRAULICOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: PUNTOS HIDRAULICOS EN BAÑO Y COCINA.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

REGISTRO DE 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: RED DE SUMINISTRO DE 1/2 PULGADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: REGISTRO DE 1/2, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ENCOFRADO PARA REGISTRO DE 1/2 FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACCESORIOS PARA RED DE SUMINISTRO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: REGISTRO DE MEDIA 1/2 PARA CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CASA DEL ADMINISTRADOR.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.12	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE RED PARA DUCHA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ACABADOS EN EL BAÑO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ACCESORIOS DE DUCHA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DUCHA SENCILLA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA EN EL BAÑO.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.15	UNIDAD DE MEDIDA	ML

REMATES BOCEL ALUMINO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CONSTRUCCION DE POCETA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE BOCEL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE BALDOSA ANTIDESLISANTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: LIMPIEZA DE AREA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: REMATES DE BOCEL EN ALUMINO EN LA DUCHA.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.16	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 2" Y 3"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE BALDOSA ANTIDESLISANTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE REJILLA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TERMINADO Y ENBOQUILLADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CAJA DEL PRODUCTO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: REJILLA PARA SIFON EN ACERO INOXIDABLE.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.17	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE CANAL LAVAMANOS 2"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE REJILLA EN LAVAMANOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: REJILLA PARA SIFON LAVAMANOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ACCESORIOS REJILLA Y SIFON, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION REALIZADA, FUENTE: PROPIA.


NOTA: SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE CANAL LAVAMANOS 2"

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 16.18	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CONCRETO DIVISORIO PARA DUCHA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

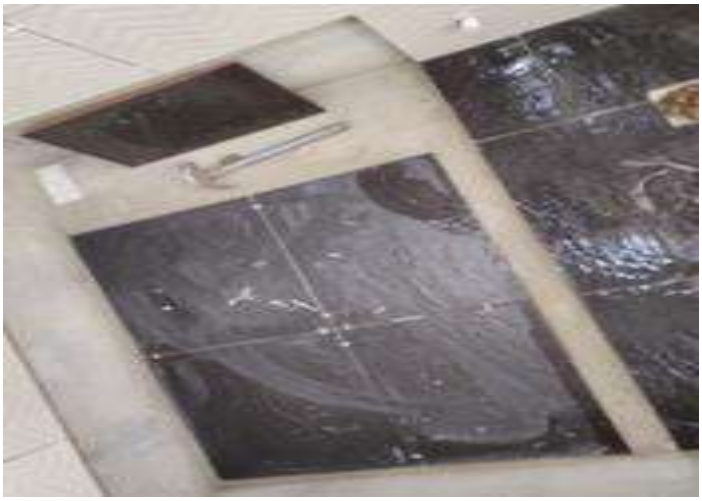

Fotografía Nº 1: CONCRETO DIVISORIO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: DEMARCACION PARA CONCRETO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CONSTRUCCION DE POCETA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONCRETO DIVISORIO PARA DUCHA, CONSTRUCCION DE POCETA.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 17.2	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE PUNTOS PARA SALIDA DE LAMPARA, FUENTE: PROPIA.




Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE LAMPARA CONMUTABLE EMT, FUENTE: PROPIA.

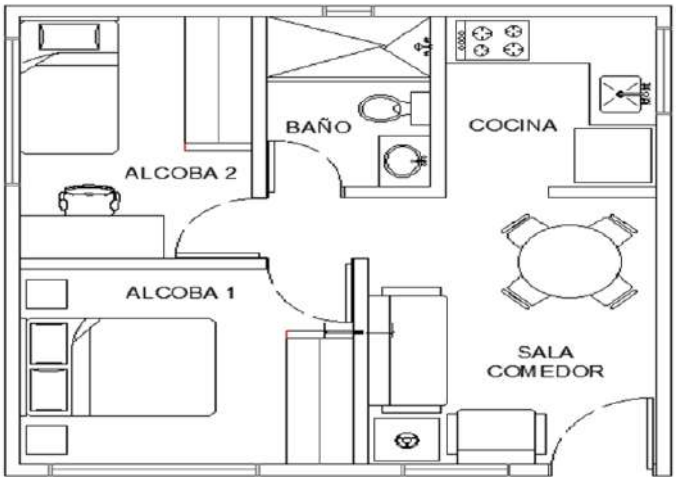

Fotografía Nº 4: UBICACIÓN DE LAS LAMPARAS SEGÚN PLANIMETRIA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE LAMPARAS CONMUTABLES EMT, EN AREAS INTERNAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 17.3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE PANEL LED DE INSCRUSTRAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PANEL LED INSTALADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : AREAS INTERNAS CON INSTALACION DE PANELES LED, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PANEL LED DE 18W / 6500 K FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE PANELES LED DE INCRUSTRAR EN AREAS INTERNAS DE LA CASA DEL ADMINISTRADOR.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 17.4	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




Fotografía Nº 1: PROLONGACION DE CABLEADO PARA TACOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CIRCUITO LISTO PARA INSTALAR CAJA DE 12 CIRCUITOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES

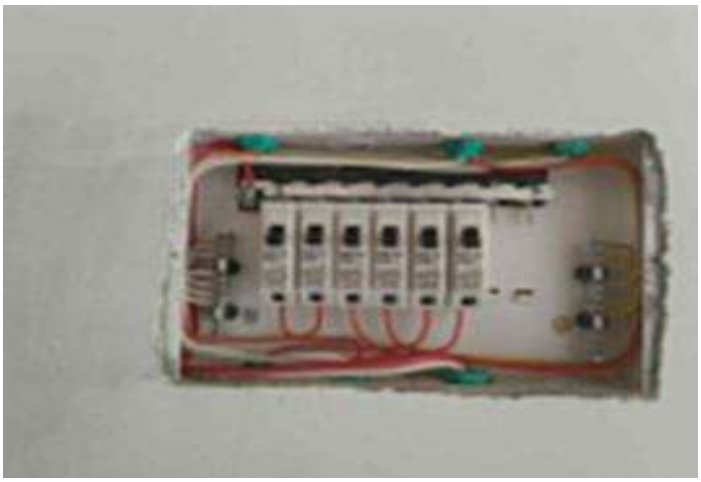

Fotografía Nº3 : INSTALACION DE TACOS DE 30 AMPERIOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS ELECTRICOS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 17.5	UNIDAD DE MEDIDA	ML

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MEDICION DE CABLE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO DE 2X14. FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 17.7	UNIDAD DE MEDIDA	ML

APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APERTURA DE REGATA PARA TUBERIA ELECTRICA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE TUBERIA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : RESANE DE REGATAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO Y AFINADO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: APERTURA DE REGARAS, PARA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA EMT.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 17.8	UNIDAD DE MEDIDA	ML

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




Fotografía Nº 1: INSTALACION DE CABLE TRENZADO, FUENTE: PROPIA.




Fotografía Nº 2: PROLONGACION DE CABLEADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES

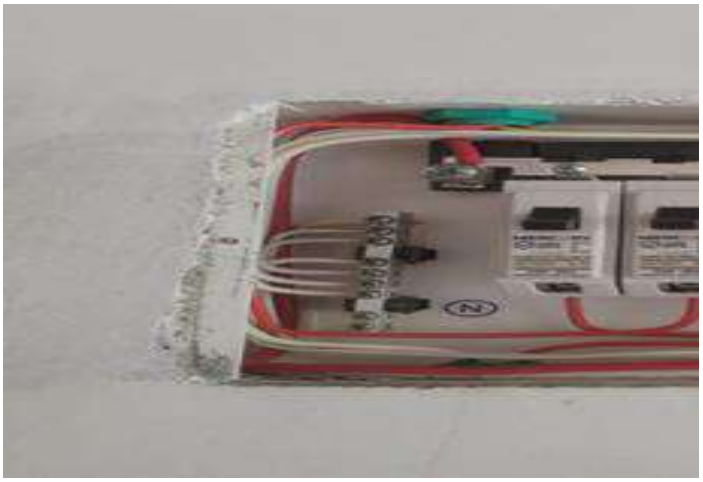

Fotografía Nº3 : INSTALACION DE CONECTORES Y TACOS, FUENTE: PROPIA.

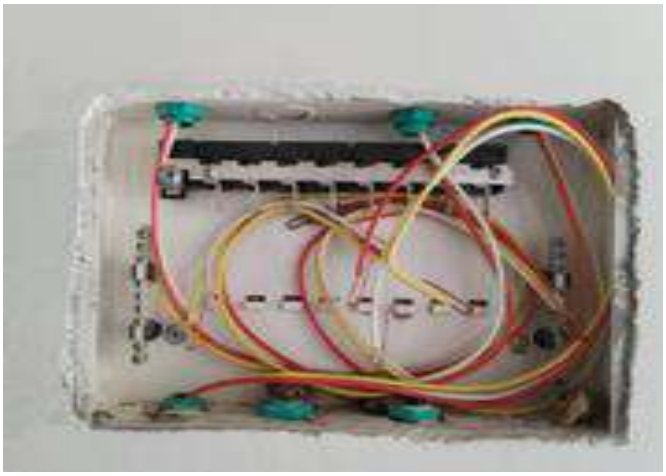

Fotografía Nº 4: CABLEADO INSTALADO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS, PARA CIRCUITO ELECTRICO.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ESTRUCTURA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PERFILERIA METALICA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SOLDADA EN PUNTOS DE ESTRUCTURA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CASA DEL ADMINISTRADOR.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.2	UNIDAD DE MEDIDA	M2

TEJA ESPAÑOLA ETERNIT

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE TEJA ETERNIT, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TEJA ETERNIT ESPAÑOLA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ALINIAMIENTO DE TEJADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CUBIERTA INSTALADA EN TEJA ETERNIT ESPAÑOLA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ESPAÑOLA ETERNIT.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.3	UNIDAD DE MEDIDA	ML

CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INICIO DE ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CABALLETE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CABALLETE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE CABALLETE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ENTREGA DE ACTIVIDAD, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE CABALLETE FIJO EN FIBROCEMENTO EN ROJO COLONIAL.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.4	UNIDAD DE MEDIDA	ML

CANAL PVC AMAZONAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE SOPORTES PARA CANAL PVC TIPO AMAZONAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTAÑLACION DE CANAL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ASEGURAMIENTO DE CANAL AL SOPORTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ENTREGA DE ACTIVIDAD, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.5	UNIDAD DE MEDIDA	ML

BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CUADRANTE PARA ANCLAJE DE BAJANTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ACCESORIOS PARA DIRECCIONAMIENTO DE LA BAJANTE EN PVC, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE TUBERIA PARA BAJANTE EN PVC AMAZONAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO DE ACTIVIDAD, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE BAJANTE TIPO AMAZONAS RAINGO, PARA DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.6	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE SOPORTE PARA CIELO RAZO EN PVC, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : RINCONERAS EN PVC, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ENTREGA DE LA ACTIVIDAD, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18..6	UNIDAD DE MEDIDA	ML

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINACION DE ACTIVIDAD, FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.7	UNIDAD DE MEDIDA	ML

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: APLICACIÓN DE ESMALETE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ESMALTE SOBRE LAMINA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ESMALTE SOBRE LAMINA EN PERFIL, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 18.8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ANADAMIOS CERTIFICADOS, EN CASA DEL ADMINISTRADOR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ANDAMIOS SECCIONES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SECCION DE ANDAMIOS CON RODACHINES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SECCION DE ANDAMIOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 19.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

CLOSET EN ESTRUCTURA DE LAMINA ETERBOARD 8MM ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN RH PARA MUROS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ESTRUCTURA PARA CLOSET, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ETERBOARD, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE PUERTAS RH PARA MUROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE CLOSET EN ESTRUCTURA DE LAMINA ETERBOARD 8MM ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN RH

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 19.2	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

MARCO PUERTA EN RH X O.15

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE MARCO PUERTA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE PUERTA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE MARCO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: MARCO A ISNTALAR, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO INSTALACION DE MARCO PUERTA EN RH X O.15.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 19.3	UNIDAD DE MEDIDA	M2

HOJA PUERTA EN RH INCLUYE BISAGRA NEGRA Y TAPALUCES EN RH

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: HOJA DE PUERTA A INSTALAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: HOJA DE PUERTA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : AREA INTERVENIDAD, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CON LACA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO INSTALACION DE HOJA PUERTA EN RH INCLUYE BISAGRA NEGRA Y TAPALUCES EN RH

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 19.4	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CHAPA ALUMINIO NEGRO PARA PUERTA DE MADERA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CHAPA EN ALUMINIO DE COLOR NEGRO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CHAPA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE CHAPA 2 FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE CHAPA 3, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO INSTALACION DE CHAPA ALUMINIO NEGRO PARA PUERTA DE MADERA.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 19.6	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

ESPEJO BISELADO INCOLORO DE 4MM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ESPEJO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ESPEJO BISELADO INCOLORO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ESPEJO BISELADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ESPEJO EN EL AREA DEL BAÑO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO LA INSTALACION DE ESPEJO BISELADO INCOLORO DE 4MM.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 24.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON RTK, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE TRIPODE Y PUNTOS FIJOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MEDICION DE AREAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ESTACAS DE DEMARCACION, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 24.2	UNIDAD DE MEDIDA	M2

CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION CERCA EN TELA VERDE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE POSTES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CERCA INSTALADA A 2.10 M DE ALTURA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 24.3	UNIDAD DE MEDIDA	M2

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: LIMPIEZA DE AREA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: DESCAPOTE MANUAL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : LIMPIEZA DE AREA A INTERVENIR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 24.4	UNIDAD DE MEDIDA	M3

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EXCAVACIONES PARA TUBERIA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : EXCAVACIONES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: EXCAVACIONES REALIZADAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA.

UBICACIÓN	CASA DEL ADMINISTRADOR	ITEM 24.5	UNIDAD DE MEDIDA	M3

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOR A 1 0 KM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CARGUE Y RETIRO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : LIMPIEZA DE AREA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CARGUE Y RETIRO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOR A 1 0 KM

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 25.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3

PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E: 10 CMS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO 3000 PSI.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 25.2	UNIDAD DE MEDIDA	KG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: SUMINISTRO DE ACERO DE 60000 PSI, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ACERO PARA COLUMNAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SUMINISTRO DE ACERO PARA VIGAS DE AMARRE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FUNDIDA DE COLUMNAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SUMINISTRO DE ACERO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 25.3	UNIDAD DE MEDIDA	M3

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: SUMINISTRO DE ACERO DE 60000 PSI, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ACERO PARA VIGA DE AMARRE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : VIGAS DE AMARRE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FUNDIDA DE VIGA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 26.1	UNIDAD DE MEDIDA	ML

RED SUMINISTRO PVC 1"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: RED DE SUMINISTRO PARA AGUA POTABLE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RED DE 1 PULGADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE RED DE 1 PULGADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO DE 1 PULGADA.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 26.2	UNIDAD DE MEDIDA	ML

RED SANITARIA PVC-S 4"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE RED SANITARIA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RED SANITARIA DE 4 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ACCESORIOS DE 4 PULGADAS FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CONECTORES DE 4 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE RED SANITARIA DE 4 PULGADAS.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 26.3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ACCESORIOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ACCESORIOS DE 4 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TUBERIA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SALIDA SANITARIA DE 4 PULGADAS. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 4 PULGADAS.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 26.4	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ACCESORIOS PARA TUBERIA DE 3 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE CODO DE 3 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SALIDA SANITARIA DE 3 PULGADAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACCESORIOS INSTALADOS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 3 PULGADAS.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 27.1	UNIDAD DE MEDIDA	ML

APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: DEMOLICION PARA REGATA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: DEMOLICION DE REGADA DE 5 CM DE ANCHO X 5 CM DE PROFUNDO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : REAGATA REALIZADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE TUBERIA EN REGATA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE REGATA EN PISO DE 5 CM DE ANCHO X 5 CM DE PROFUNDO.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 29.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIERO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM) POZO SEPTICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EXCAVACIONES VARIAS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: EXCAVACION PARA POZO SEPTICO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : EXCAVACIONES VARIAS Y PERFILAMIENTO DE TERRENO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: EXCAVACION DE POZO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: EXCAVACION PARA POZO SEPTICO.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 29.3	UNIDAD DE MEDIDA	KG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,
FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.
FUENTE: PROPIA.

NOTA: ARMADO DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑOS ESTRUCTURALES.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 29.4	UNIDAD DE MEDIDA	M3

CONCRETO 4000 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FUNDICION DE CONCRETO DE 4000 PSI. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FUNDICION DE CONCRETO DE 4000 PSI, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUNDICION DE CONCRETO DE 4000 PSI, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FUNDICION DE CONCRETO DE 4000 PSI. FUENTE: PROPIA.

NOTA: FUNDICION DE VIGAS Y TAPAS DE POZOS SEPTICOS EN CONCRETO DE 4000 PSI.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 29.5	UNIDAD DE MEDIDA	M2

MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE LADRILLO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE LADRILLO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE LADRILLO FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE LADRILLO. FUENTE: PROPIA.

NOTA: LEVANTAMIENTO DE MUROS EN LADRILLO.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 29.6	UNIDAD DE MEDIDA	ML

RED SANITARIA PVC-S 4"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE RED DE TUBERIA.
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE RED DE TUBERIA,
FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE RED DE TUBERIA
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE RED DE TUBERIA.
FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE RED DE TUBERIA SANITARIA.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 29.7	UNIDAD DE MEDIDA	M3

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 30.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL. FUENTE: PROPIA.

NOTA: EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE INSPECCION.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 30.3	UNIDAD DE MEDIDA	M3

CONCRETO 4000 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FUNDICION EN CONCRETO DE 4000 PSI. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FUNDICION EN CONCRETO DE 4000 PSI, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUNDICION EN CONCRETO DE 4000 PSI. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FUNDICION EN CONCRETO DE 4000 PSI. FUENTE: PROPIA.

NOTA:FUNDICION DE TAPAS Y BASES EN CONCRETO DE 4000 PSI.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 30.4	UNIDAD DE MEDIDA	M2

MURO EN LADRILLO PRENZADO MACIZO E= 0.12 M

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PERFILAMIENTO PARA INSTALACION DE LADRILLO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE LADRILLO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE LADRILLO FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE LADRILLO. FUENTE: PROPIA.

NOTA : LEVANTAMIENTO DE MURO DE EN LADRILLO PRENSADO MACIZO.

UBICACIÓN	PORTERIA	ITEM 30.5	UNIDAD DE MEDIDA	M3

MORTERO IMPERMEABILIZADO DE 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: MORTERO IMPERMEABILIZADO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: MORTERO IMPERMEABILIZADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : MORTERO IMPERMEABILIZADO FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: MORTERO IMPERMEABILIZADO. FUENTE: PROPIA.

NOTA:MORTERO IMPERMEABILIZADO EN CAJAS DE INSPECCION .

UBICACIÓN	CASA PRINCIPAL	ITEM 42.1	UNIDAD DE MEDIDA	UND

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 3 HP

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: MORTERO IMPERMEABILIZADO. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE BOMBA DE 3HP .

UBICACIÓN	CASA PRINCIPAL	ITEM 43.4	UNIDAD DE MEDIDA	ML

DESMONTE Y CAMBIO TUBERIAS DE PRESION 1 1/2"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: DESMONTE DE TUBERIA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: DESMONTE DE TUBERIA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CAMBIO DE TUBERIA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CAMBIO DE TUBERIA. FUENTE: PROPIA.

NOTA:DESMONTE Y CAMBIO DE TUBERIA.

UBICACIÓN	CASA PRINCIPAL	ITEM 44.2	UNIDAD DE MEDIDA	UND

SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BALONCESTO EN ACRILICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ADECUACION DE AREA PARA TABLERO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TABLERO ACRILICO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE TABLERO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE TABLERO. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE TABLERO ACRILICO.

UBICACIÓN	CASA ACUARIES	ITEM 46.1	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CONTROL DE PLAGAS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES POR EL METODO DE ASPERSION DIRIGIDA EN TODAS LAS AREAS DE CASA ACUARIES CON PRODUCTOS APROBADOS POR LA SALUD PUBLICA Y TOTALMENTE ORGANICOS (SAFER SL, ACEITE DE NEEM, CREOLINA GOLD, BOLAS DE NEFTALINA, EXTRACTO DE AJO, ACPM, SAL INCLUYE MANO DE OBRA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: MEZCLA PARA FUMIGAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: AREA A FUMIGAR, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUMIGACION CON EL METODO DE ASPERSION DIRIGIDA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: AREA DESINFECTADA Y FUMIGADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONTROL DE PLAGAS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES POR EL METODO DE ASPERSION DIRIGIDA EN TODAS LAS AREAS DE CASA ACUARIES.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 47.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3

CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ENCOFRADO PARA CICLOPEOS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: VACIADO DE CONCRETO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : VACIADO DE CONCRETO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CONSTRUCCION DE CICLOPEO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONCRETO PARA CILOPEO DE 2000 PSI.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 47.2	UNIDAD DE MEDIDA	KG

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ESPACIADORES PARA MALLA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUNDIDA DE MALLA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE PIEDRA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 47.5	UNIDAD DE MEDIDA	M3

BASE GRANULAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ENCOFRADO PARA BASE GRANULAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: BASE GRANULAR, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE BASE GRANULAR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ENTREGA DE RELLENO EN BASE GRANULAR, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE BASE GRANULAR.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 47.7	UNIDAD DE MEDIDA	ML

FILOS O DILATACIONES B/PLACA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: AFINADO DE PLACA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FILOS Y DILATACIONES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : DILATACIONES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DILATACIONES Y ESCOBIADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION FILOS O DILATACIONES B/PLACA.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 47.8	UNIDAD DE MEDIDA	ML

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ENCOFRADO DE BORDILLO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ENCOFRADO Y SOPORTE LATERAL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CONSTRUCCION DE BORDILLO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FILOS Y DILATACIONES, FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 47..8	UNIDAD DE MEDIDA	M3

DADOS EN CONCRETO 3500PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: FUENTE: PROPIA.

NOTA: CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO DE 3500 PSI.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO DE COMPOSTAJE.	ITEM 48.1	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: VARILLA COOPER WELL, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CAJA PARA LINEA A TIERRA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CIRCUITO BAJO TIERRA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: VARILLA COOPER WELL INSTALADA, FUENTE: PROPIA.


NOTA: INSTALACION DE LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO DE COMPOSTAJE.	ITEM 48.2	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

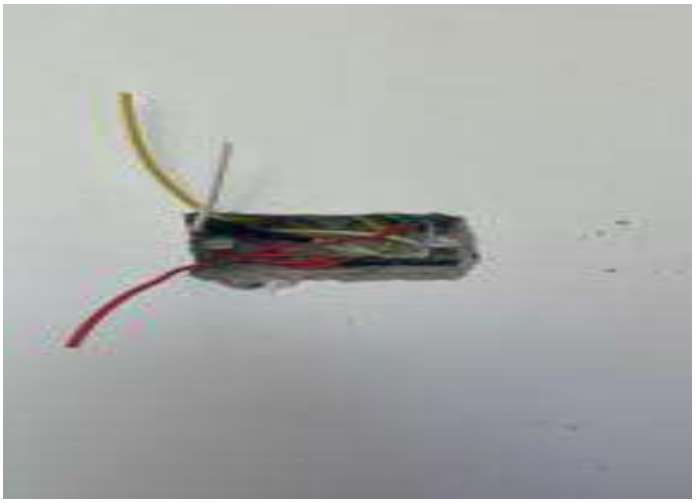

Fotografía Nº 1: AREA A INTERVENIR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE TOMA DOBLE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TOMA DOBLE INSTALADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TOMAS DOBLES INSTALADAS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO DE COMPOSTAJE.	ITEM 48.3	UNIDAD DE MEDIDA	ML

TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: REGATAS PARA INSTALACION, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RESANE DE REGATAS Y TUBERIA INSTALADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TUBERIA INSTALADA CON SOPORTE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2".

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO DE COMPOSTAJE.	ITEM 48.4	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PLACA DE SOPORTE PARA TANQUE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TANQUE DE ALMACENAMIENTO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TANQUE DE ALMACENAMIENTO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TANQUE DE CAPACIDAD DE 1000 LT. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA DEL ADMINISTRADOR.	ITEM 49.1	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PROLONGACION DE CABLEADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: REGATA PARA TOMA DOBLE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TOMA DOBLE INSTALADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TOMA DOBLE PVC COMPLETA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA DEL ADMINISTRADOR.	ITEM 49.10	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

TUBO CUADRADO 100*100 * 2MM * 6MT

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADADA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: ALINIAMIENTO DE TUBERIA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : NIVELACION DE TUBERIA, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE TUBO CUADRADO 100*100 * 2MM * 6MT

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA DEL ADMINISTRADOR.	ITEM 49.21	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

Lavaplatos en Acero Inoxidable 1.0 X 0.50 cm , incluye gridería y sifon.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE LAVAPLATOS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: Instalacion de Lavaplatos en Acero Inoxidable 1.0 X 0.50 cm , incluye gridería y sifon.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA DEL ADMINISTRADOR.	ITEM 49.23	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

Grifería cuello sisne acero inoxidable agua fria

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE LAVAPLATOS Y GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE GRIFERIA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: Instalacion de Grifería cuello sisne acero inoxidable agua fria

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 49.24	UNIDAD DE MEDIDA	M2

MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO Y ENTREPAÑO EN CONCRETO, E= 5 CMS)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: FUNDICION DE CONCRETO REFORZADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : FUNDICION DE CONCRETO REFORZADO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINACION DE MESON. FUENTE: PROPIA.

NOTA:CONSTRUCCION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 49.26	UNIDAD DE MEDIDA	ML

WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: TOMA DE MEDIDAS. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TOMA DE MEDIDAS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ELEMENTO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ELEMENTO. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE WIN MEDIA CAÑA

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 49.27	UNIDAD DE MEDIDA	ML

TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: REGATAS EN MUROS. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: REGATAS EN MUROS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE RED TUBERIA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE RED TUBERIA. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE TUNERIA CONDUIT PVC 1/2"

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 50.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PAÑETE IMPERMEABILIZADO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PAÑETE IMPERMEABILIZADO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PAÑETE IMPERMEABILIZADO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PAÑETE IMPERMEABILIZADO. FUENTE: PROPIA.

NOTA: PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 52.2	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PUERTA CORREDIZA CON RIEL DE 1.20X2.45 INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROST

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: ANCLAJE DE SOPORTE DE PUERTA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE PUERTA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE PUERTA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE PUERTA. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA SEGÚN CONDICIONES TECNICAS.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO	ITEM 52.3	UNIDAD DE MEDIDA	KG

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: DESPIECE DE MALLA ELECTROSOLDADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: DESPIECE DE MALLA ELECTROSOLDADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : DESPIECE DE MALLA ELECTROSOLDADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DESPIECE DE MALLA ELECTROSOLDADA. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA .

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE	ITEM 52.4	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PINTURA EN ACEITE ESMALTADA A 2 MANOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




Fotografía Nº 1: PINTURA EN ACEITE ESMALTADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PINTURA EN ACEITE ESMALTADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES

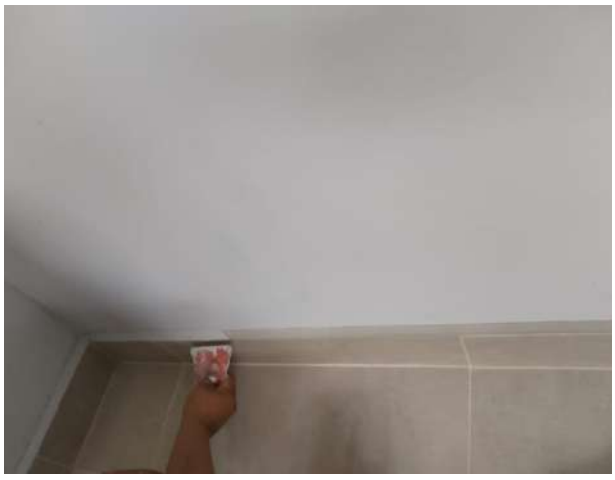

Fotografía Nº3 : PINTURA EN ACEITE ESMALTADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PINTURA EN ACEITE ESMALTADA. FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACION DE PINTURA EN ACEITE ESMALTADA .

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE	ITEM 52.5	UNIDAD DE MEDIDA	ML

PINTURA EN ACEITE ESMALTADA A 2 MANOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PINTURA EN ACEITE ESMALTADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PINTURA EN ACEITE ESMALTADA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PINTURA EN ACEITE ESMALTADA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PINTURA EN ACEITE ESMALTADA. FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACION DE PINTURA EN ACEITE ESMALTADA EN MESONES.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE	ITEM 52.6	UNIDAD DE MEDIDA	M2

PINTURA PARA CUBIERTA EN ETERNIT ROJA A 3 MANOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: PINTURA PARA CUBIERTA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: PINTURA PARA CUBIERTA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : PINTURA PARA CUBIERTA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: PINTURA PARA CUBIERTA. FUENTE: PROPIA.

NOTA: APLICACION DE PINTURA PARA CUBIERTA.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES	ITEM 53.1	UNIDAD DE MEDIDA	UNID

Profundización pozo #2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EXCAVACION PARA POZO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: RECUBRIMIENTO EN CONCRETO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TUBERIA DE CONCRETO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: SISTEMA DE BOMBEO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: Construccion y Profundización pozo #2

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES	ITEM 53.2	UNIDAD DE MEDIDA	UNID

SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: MOTOBOMBA, FUENTE: PROPIA.




Fotografía Nº 2: SISTEMA DE BOMBEO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : SISTEMA DE FILTRO, FUENTE: PROPIA.

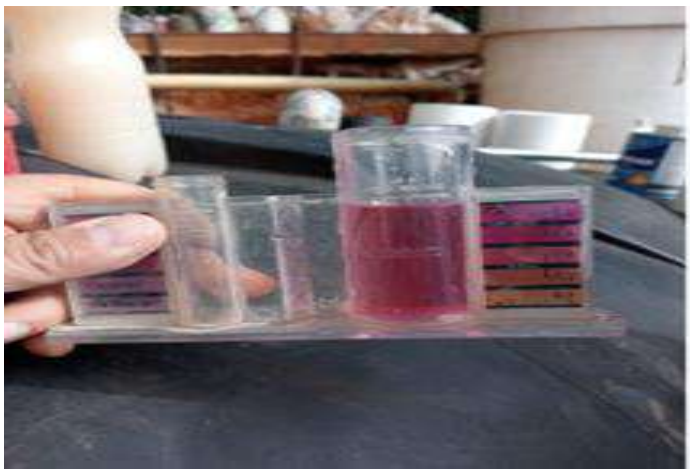

Fotografía Nº 4: PRUEBA DE CALIDAD DEL AGUA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES	ITEM 53.4	UNIDAD DE MEDIDA	UNID

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO EN CONCRETO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 4 X 4 X 2,33 ALTO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: AREA A INTERVENIR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: LIMPIEZA DE TANQUE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3: LIMPIEZA DE MUROS PERIMETRALES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: DESINFECCION DE TANQUE INTERNAMENTE, FUENTE: PROPIA.

NOTA: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.1	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ENCHAPE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.2	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ENCHAPE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.3	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ENCHAPE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.4	UNIDAD DE MEDIDA	ML

GUARDA ESCOBA CERAMICA de 8 x 55 CMS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE GUARDA ESCOBA.
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE GUARDA ESCOBA,
FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE GUARDA ESCOBA.
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE GUARDA ESCOBA.
FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE GUARDA ESCOBA.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.5	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS PIZARRA, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ENCHAPE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.6	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PARED EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO (baño)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ENCHAPE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ENCHAPE. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACIÓN DE ACABADO DE PARED EN ENCHAPE CERÁMICO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.7	UNIDAD DE MEDIDA	M2

SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO 20X20 PARA PISO CON DISEÑO EXCLUSIVO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




Fotografía Nº 1: INSTALACION DE PORCELANATO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE PORCELANATO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES

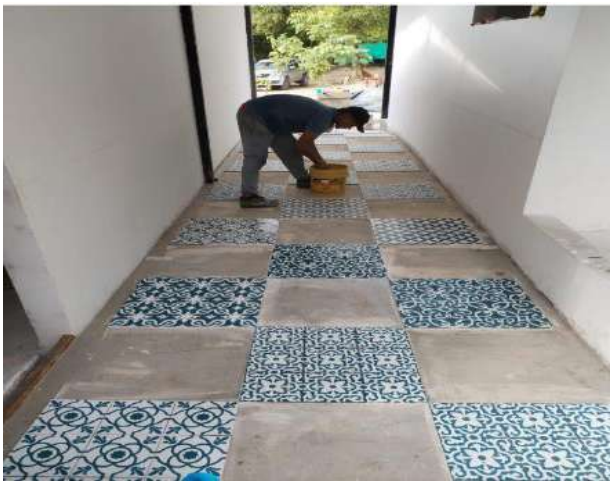

Fotografía Nº3 : INSTALACION DE PORCELANATO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE PORCELANATO. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN PORCELANATO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.8	UNIDAD DE MEDIDA	M2

ACABADO EN GRAVILLA LAVADA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA.
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA,
FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA.
FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA.
FUENTE: PROPIA.

NOTA:TERMINADO EN GRAVILLA LAVADA.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.9	UNIDAD DE MEDIDA	ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MADERA PARA BAÑOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE MESONES. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE MESONES, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE MESONES. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE MESONES. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE MESONES EN MADERA PARA BAÑOS.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.10	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS VESSEL SEGNO BLACK (600*350*160 (mm))

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE LAVAMANOS. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE BASE, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : REFUERZO PARA LAVAMANOS. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA,. FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS VESSEL SEGNO BLACK (600*350*160 (mm)).

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.11	UNIDAD DE MEDIDA	UN

MONOCONTROL PARA LAVAMANOS COLOR NEGRO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE MONOCONTROL. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE MONOCONTROL, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE MONOCONTROL. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE MONOCONTROL. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE MONOCONTROL PARA LAVAMANOS COLOR NEGRO

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.12	UNIDAD DE MEDIDA	UN

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER VULCANO NEGRO MATE (680X380X780 (mm)). DOBLE PULSADOR DE DESCARGA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE SANITARIO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE SANITARIO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE SANITARIO. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE SANITARIO. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION SANITARIO POWER VULCANO NEGRO MATE (680X380X780 (mm))

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.13	UNIDAD DE MEDIDA	UN

KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO SET 5 PIEZAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO SET 5 PIEZAS.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.14	UNIDAD DE MEDIDA	UN

EXTRACTOR DE OLORES HELICOIDAL 6" EXTRAPL DECOR200 127V PARA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: EXTRACTOR DE OLORES, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: AREA A INSTALAR, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE EXTRACTOR, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: ACTIVIDAD REALIZADA, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES HELICOIDAL 6" EXTRAPL DECOR200 127V PARA BAÑO.

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.16	UNIDAD DE MEDIDA	UN

ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIBLE DE 58.5 CMS GAS NATURAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE ESTUFA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE ESTUFA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE ESTUFA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE ESTUFA. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE ESTUFA

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.17	UNIDAD DE MEDIDA	M2

VENTANA EN ALUMINIO 744 TIPO NEGRA INCLUYE VIDRIO 4MM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: INSTALACION DE VENTANA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: INSTALACION DE VENTANA, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : INSTALACION DE VENTANA. FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: INSTALACION DE VENTANA. FUENTE: PROPIA.

NOTA:INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.18	UNIDAD DE MEDIDA	M2

DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO Ttemplado H= 1.8 M, E=8MM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: DEMARCACION PARA SUBDIVISION, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: AREA A INTERVENIR, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : VIDRIO INSTALADO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO, FUENTE: PROPIA.

NOTA: INSTALACION DE DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=8MM

UBICACIÓN	ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR	ITEM 56.19	UNIDAD DE MEDIDA	M3

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Fotografía Nº 1: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.

DESPUES



Fotografía Nº3 : CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, FUENTE: PROPIA.

NOTA: SE REALIZO RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA N°	UAEPC-214-2024	**FECHA CONTRATO**	5	11	2024	**FECHA CORTE 2**			2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BIEN INMUEBLE CASA ACUARIES PROPIEDAD DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE										
NATURALEZA	OBRA PUBLICA										
FECHA DE INICIO	13	11	2024								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20	12	2024								
ADICION EN TIEMPO	59	DÍAS									
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	6	4	2025								
VLR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 999.975.663**	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS									
VLR MODIFICACION 1 DEL CONTRATO	**$ 1.499.898.730,00**	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS									
VLR ADICIONES DEL CONTRATO	**$ 499.924.293,00**	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS									
VLR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.499.898.730,00**	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS									
VLR DEL ANTICIPO	**N/A**	NO APLICA									
VALOR CORTE 1	**$ 302.326.738,00**	TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE									
VALOR DEL PRESENTE CORTE	**$ 659.980.808,00**	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE									
VLR EJECUTADO	**$ 962.307.546,00**	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS M/CTE									
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO										
CONTRATISTA	ROMING SAS										
SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA										

0	CONDICIONES INICIALES								BALANCE CORTE 1		BALANCE CORTE 2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
1	**ITEM ICCU**	**GENERAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		PRELIMINARES				**$ 16.929.395,00**				**$ 11.794.625,00**		**$ 5.134.770,00**		**$ 16.929.395,00**		**$ -**
1.1	ICCU 1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	$ 2.745.101,00	$ 2.745.101,00	0,00		1,00	$ 2.745.101,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.745.101,00	0,00	$ -
1.2	ICCU 1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	126,00	$ 62.774,00	$ 7.909.524,00	0,00		126,00	$ 7.909.524,00	0,00	$ -	126,00	$ 7.909.524,00	0,00	$ -
1.3	APU1	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	60,00	$ 38.000,00	$ 2.280.000,00		0,00	30,00	$ 1.140.000,00	30,00	$ 1.140.000,00	60,00	$ 2.280.000,00	0,00	$ -
1.4	APU2	ASEO GENERAL PERMANENTE EN OBRAS	M2	512,15	$ 7.800,00	$ 3.994.770,00		0,00	0,00	$ -	512,15	$ 3.994.770,00	512,15	$ 3.994.770,00	0,00	$ -
		INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIOS				**$ 3.612.821,00**				**$ 3.612.821,00**		**$ -**		**$ 3.612.821,00**		**$ -**
1.5	ICCU 1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UND	1,00	$ 3.612.821,00	$ 3.612.821,00	0,00		1,00	$ 3.612.821,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.612.821,00	0,00	$ -
					SUB TOTAL	**$ 20.542.216,00**			**SUB TOTAL**	**$ 15.407.446,00**	**SUB TOTAL**	**$ 5.134.770,00**	**SUB TOTAL**	**$ 20.542.216,00**	**SUB TOTAL**	**$ -**

2	ITEM ICCU	PARQUEADERO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1		**PRELIMINARES**				**$ 8.396.146,07**				**$ 8.396.146,07**		**$ 300.576,58**		**$ 8.696.722,65**		**$ 300.576,58**
2.2	ICCU1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	94,50	$ 29.436,00	$ 2.781.702,00		0,00	94,50	$ 2.781.702,00	0,00	$ -	94,50	$ 2.781.702,00	0,00	$ -
2.3		DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	21,00	$ 100.192,19	$ 2.104.036,07		0,00	21,00	$ 2.104.036,07	3,00	$ 300.576,58	24,00	$ 2.404.612,65	3,00	$ 300.576,58
2.4	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	264,00	$ 13.297,00	$ 3.510.408,00		0,00	264,00	$ 3.510.408,00	0,00	$ -	264,00	$ 3.510.408,00	0,00	$ -
3	3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 26.814.305,47**				**$ 26.814.305,47**		**$ 800.138,52**		**$ 27.614.443,99**		**$ 800.138,52**
3.1	ICCU 16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,20 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	163,01	$ 68.434,00	$ 11.155.289,47		0,00	163,01	$ 11.155.289,47	0,00	$ -	163,01	$ 11.155.289,47	0,00	$ -
3.2	ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	72,00	$ 143.394,00	$ 10.324.368,00	0,00		72,00	$ 10.324.368,00	5,58	$ 800.138,52	77,58	$ 11.124.506,52	5,58	$ 800.138,52
3.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA 3 A 5"	M3	0,00	$ 81.118,58	$ -	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 10 KM	M3	66,00	$ 80.828,00	$ 5.334.648,00		0,00	66,00	$ 5.334.648,00	0,00	$ -	66,00	$ 5.334.648,00	0,00	$ -
4	4	**ESTRUCTURA**				**$ 71.015.968,16**				**$ 71.015.968,16**		**$ 11.543.179,70**		**$ 82.559.147,86**		**$ 11.543.179,70**
4.1	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	790,79	$ 7.746,00	$ 6.125.485,16		0,00	790,79	$ 6.125.485,16	790,79	$ 6.125.485,16	1581,59	$ 12.250.970,32	790,79	$ 6.125.485,16
4.2	ICCU 4.2	CONCRETO CLASE C =4000PSI (PLACAS)	M3	66,00	$ 970.913,00	$ 64.080.258,00	0,00		66,00	$ 64.080.258,00	5,58	$ 5.417.694,54	71,58	$ 69.497.952,54	5,58	$ 5.417.694,54
4.3	ICCU 11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	25,00	$ 32.409,00	$ 810.225,00	0,00		25,00	$ 810.225,00	0,00	$ -	25,00	$ 810.225,00	0,00	$ -
					SUB TOTAL	**$ 106.226.419,70**			**SUB TOTAL**	**$ 106.226.419,70**	**SUB TOTAL**	**$ 12.643.894,80**	**SUB TOTAL**	**$ 118.870.314,50**	**SUB TOTAL**	**$ 12.643.894,80**

	ITEM ICCU	CUARTO COMPOSTAJE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5		**PRELIMINARES**				**$ 3.607.465,17**				**$ -**		**$ 3.943.948,88**		**$ 3.943.948,88**		**$ 336.483,71**
5.1	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	73,00	$ 29.436,00	$ 2.148.828,00		-73,00	0,00	$ -	73,00	$ 2.148.828,00	73,00	$ 2.148.828,00	0,00	$ -
5.2		HODROLAVADO DE MUROS, FACHADAS Y TECHOS	M2	128,31	$ 11.368,00	$ 1.458.637,17		-128,31	0,00	$ -	157,91	$ 1.795.120,88	157,91	$ 1.795.120,88	29,60	$ 336.483,71
6		**MAMPOSTERA**				**$ 772.668,18**				**$ -**		**$ 2.421.648,33**		**$ 2.421.648,33**		**$ 1.648.980,15**
6.1	ICCU 1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	3,75	$ 21.070,00	$ 79.012,50		-3,75	0,00	$ -	3,75	$ 79.012,50	3,75	$ 79.012,50	0,00	$ -
6.2	ICCU 5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	4,94	$ 57.544,00	$ 284.267,36		-4,94	0,00	$ -	4,94	$ 284.267,36	4,94	$ 284.267,36	0,00	$ -
6.3	ICCU 5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	2,15	$ 35.950,00	$ 77.292,50		-2,15	0,00	$ -	2,15	$ 77.292,50	2,15	$ 77.292,50	0,00	$ -
6.4	ICCU 6,21	PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS	M2	4,94	$ 32.049,00	$ 158.322,06		-4,94	0,00	$ -	9,89	$ 316.964,61	9,89	$ 316.964,61	4,95	$ 158.642,55
6.5	ICCU 6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	8,78	$ 19.792,00	$ 173.773,76		-8,78	0,00	$ -	84,08	$ 1.664.111,36	84,08	$ 1.664.111,36	75,30	$ 1.490.337,60
7	7	**PINTURA**				**$ 5.669.495,57**				**$ -**		**$ 8.219.875,19**		**$ 8.219.875,19**		**$ 2.550.379,62**
7.1	ICCU 18,14	ESTUCO	M2	128,03	$ 11.124,00	$ 1.424.167,90		-128,03	0,00	$ -	157,91	$ 1.756.590,84	157,91	$ 1.756.590,84	29,88	$ 332.422,94
7.2	ICCU 18,15	ESTUCO LINEAL	ML	25,56	$ 7.051,00	$ 180.223,56		-25,56	0,00	$ -	26,39	$ 186.075,89	26,39	$ 186.075,89	0,83	$ 5.852,33
7.3	ICCU 6,3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	56,16	$ 10.597,00	$ 595.127,52		-56,16	0,00	$ -	63,18	$ 669.518,46	63,18	$ 669.518,46	7,02	$ 74.390,94
7.5		PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	56,64	$ 18.700,00	$ 1.059.175,48		-56,64	0,00	$ -	235,85	$ 4.410.395,00	235,85	$ 4.410.395,00	179,21	$ 3.351.219,52
7.6		PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	0,00	$ 12.100,00	$ -		0,00	0,00	$ -	98,95	$ 1.197.295,00	98,95	$ 1.197.295,00	98,95	$ 1.197.295,00
7.7		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES	M2	63,98	$ 30.010,00	$ 1.919.895,75		-63,98	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-63,98	-$ 1.919.895,75
7.8		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES LINEAL	ML	25,56	$ 19.206,00	$ 490.905,36		-25,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-25,56	-$ 490.905,36
8		**CARPINTERÍA METALICA**				**$ 26.026.560,46**				**$ -**		**$ 25.085.619,07**		**$ 25.085.619,07**		**-$ 940.941,39**
8.1	ICCU 1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	1,00	$ 20.121,00	$ 20.121,00		-1,00	0,00	$ -	2,00	$ 40.242,00	2,00	$ 40.242,00	1,00	$ 20.121,00
8.2	ICCU 1,39	DESMONTE DE VENTANAS	M2	3,00	$ 17.545,00	$ 52.635,00		-3,00	0,00	$ -	3,74	$ 65.618,30	3,74	$ 65.618,30	0,74	$ 12.983,30

8.3		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO (1,8*2,1)INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	2,47	$ 578.000,00	$ 1.429.105,00		-2,47	0,00	$ -	2,47	$ 1.427.660,00	2,47	$ 1.427.660,00	0,00	-$ 1.445,00
8.4		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO (1,5*2,1)INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	2,94	$ 578.000,00	$ 1.699.320,00		-2,94	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,94	-$ 1.699.320,00
8.5		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED CAL18 , INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA	M2	2,85	$ 345.000,00	$ 983.250,00		-2,85	0,00	$ -	2,85	$ 983.250,00	2,85	$ 983.250,00	0,00	$ -
8.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO ROMBO CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROTATICA	M2	2,85	$ 327.830,09	$ 934.315,77		-2,85	0,00	$ -	2,85	$ 934.315,77	2,85	$ 934.315,77	0,00	$ -
8.7		MESONES EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) DOBLE MESON CON ACABADO EN GRANITO ANCHO PLACA SUPERIOR 0.26 Y PLACA INFERIOR 0.55M (INCLUYE MEDIA CAÑA Y FALDON O NARIZ, ENTREPAÑO EN CONCRETO, E: 5 CMS, ACABADO EN GRANITO PULIDO) MUROS LATERALES (O.55 X 0.78 X O.10) Y MURO FRONTAL (0.98M X 1.00M X 0.10M) REPELLADOS , ESTUCADOS Y PINTADOS POR TODAS LAS CARAS	M2	15,39	$ 1.358.100,00	$ 20.907.813,69		-15,39	0,00	$ -	15,93	$ 21.634.533,00	15,93	$ 21.634.533,00	0,54	$ 726.719,31
9		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 5.862.399,70**				**$ -**		**$ 8.463.319,70**		**$ 8.463.319,70**		**$ 2.600.920,00**
9.1		APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	30,00	$ 30.642,14	$ 919.264,20		-30,00	0,00	$ -	30,00	$ 919.264,20	30,00	$ 919.264,20	0,00	$ -
9.2	ICCU 12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	9,00	$ 121.785,00	$ 1.096.065,00		-9,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.096.065,00	9,00	$ 1.096.065,00	0,00	$ -
9.3		LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	8,00	$ 60.875,00	$ 487.000,00		-8,00	0,00	$ -	8,00	$ 487.000,00	8,00	$ 487.000,00	0,00	$ -
9.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	13,50	$ 9.503,00	$ 128.290,50		-13,50	0,00	$ -	13,50	$ 128.290,50	13,50	$ 128.290,50	0,00	$ -
9.5	ICCU 12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	0,00	$ 133.559,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.6	ICCU 21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	60,00	$ 29.043,00	$ 1.742.580,00		-60,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-60,00	-$ 1.742.580,00
9.7	9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	60,00	$ 24.820,00	$ 1.489.200,00		-60,00	0,00	$ -	235,00	$ 5.832.700,00	235,00	$ 5.832.700,00	175,00	$ 4.343.500,00
10		**CUBIERTA**				**$ 15.343.775,51**				**$ -**		**$ 15.742.225,13**		**$ 15.742.225,13**		**$ 398.449,62**
10.1		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE RECORRIDO DE CUBIERTA AJUSTE , LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y SUMINISTRO DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	M2	43,52	$ 83.400,00	$ 3.629.276,10		-43,52	0,00	$ -	46,68	$ 3.893.112,00	46,68	$ 3.893.112,00	3,16	$ 263.835,90
10.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA COLONIAL ROJO 1.97 X 0.72 X 2.3MM, INCLUYE GANCHOS	UND	4,00	$ 108.000,00	$ 432.000,00		-4,00	0,00	$ -	4,00	$ 432.000,00	4,00	$ 432.000,00	0,00	$ -
10.3	ICCU 7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM	M2	20,68	$ 82.382,00	$ 1.703.659,76		-20,68	0,00	$ -	29,11	$ 2.398.140,02	29,11	$ 2.398.140,02	8,43	$ 694.480,26
10.4	ICCU 18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	257,43	$ 4.556,00	$ 1.172.828,30		-257,43	0,00	$ -	236,82	$ 1.078.951,92	236,82	$ 1.078.951,92	-20,61	-$ 93.876,38
10.5	ICCU 18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	257,43	$ 4.142,00	$ 1.066.254,35		-257,43	0,00	$ -	236,82	$ 980.908,44	236,82	$ 980.908,44	-20,61	-$ 85.345,91
10.6	ICCU 7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	20,68	$ 110.975,00	$ 2.294.963,00		-20,68	0,00	$ -	17,25	$ 1.914.318,75	17,25	$ 1.914.318,75	-3,43	-$ 380.644,25
10.7		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	38,97	$ 100.200,00	$ 3.904.794,00		-38,97	0,00	$ -	38,97	$ 3.904.794,00	38,97	$ 3.904.794,00	0,00	$ -
10.8		ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	30,00	$ 38.000,00	$ 1.140.000,00		-30,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.140.000,00	30,00	$ 1.140.000,00	0,00	$ -
11		**CANALES**				**$ 1.879.852,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 1.879.852,00**

11.1	11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22. DE ACUERDO A SECCIÓN DESARROLLADA EXISTENTE , INCLUYE INSTALACIÓN DE GANCHOS PARA EVITAR REBOSES. INCLUYE PINTURA	ML	11,86	$ 123.400,00	$ 1.463.524,00		-11,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-11,86	-$ 1.463.524,00
11.2	11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN. INCLUYE PINTURA	ML	8,36	$ 49.800,00	$ 416.328,00		-8,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-8,36	-$ 416.328,00
12		**RED HIDROSANITARIA**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12.1	ICCU 16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	0,00	$ 43.107,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.2	ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0,00	$ 12.477,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.3	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,00	$ 96.707,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
					SUB TOTAL	**$ 59.162.216,59**			**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**$ 63.876.636,30**	**SUB TOTAL**	**$ 63.876.636,30**	**SUB TOTAL**	**$ 4.714.419,71**

	ITEM ICCU	CASA ADMINISTRADOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13		**PRELIMINARES**				**$ 3.498.171,00**				**$ 3.498.171,00**		**$ -**		**$ 3.498.171,00**		**$ -**
13.1	ICCU 1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	40,00	$ 29.436,00	$ 1.177.440,00	0,00		40,00	$ 1.177.440,00	0,00	$ -	40,00	$ 1.177.440,00	0,00	$ -
13.2	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	90,00	$ 13.297,00	$ 1.196.730,00	0,00		90,00	$ 1.196.730,00	0,00	$ -	90,00	$ 1.196.730,00	0,00	$ -
13.3	ICCU 1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	90,00	$ 9.368,00	$ 843.120,00	0,00		90,00	$ 843.120,00	0,00	$ -	90,00	$ 843.120,00	0,00	$ -
13.4		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	13,50	$ 20.806,00	$ 280.881,00		-60,00	13,50	$ 280.881,00	0,00	$ -	13,50	$ 280.881,00	0,00	$ -
14		**ESTRUCTURA**				**$ 41.675.360,83**				**$ 36.063.942,47**		**$ 4.484.697,17**		**$ 40.548.639,64**		**-$ 1.126.721,19**
14.1	ICCU 16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	7,54	$ 135.660,00	$ 1.023.220,98	-3,40		4,14	$ 561.632,40	5,91	$ 801.750,60	10,05	$ 1.363.383,00	2,51	$ 340.162,02
14.2	ICCU 630,6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M2	0,00	$ 434.634,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.3	ICCU 4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1303	$ 7.746,00	$ 10.092.224,15		0,00	1302,89	$ 10.092.224,15	0,00	$ -	1302,89	$ 10.092.224,15	0,00	$ -
14.4	ICCU 2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	4,61	$ 755.786,00	$ 3.482.661,89	0,00		4,61	$ 3.482.661,89	0,00	$ -	4,61	$ 3.482.661,89	0,00	$ -
14.5	ICCU 2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	2,59	$ 732.242,00	$ 1.897.971,26	0,00		2,59	$ 1.897.971,26	0,00	$ -	2,59	$ 1.897.971,26	0,00	$ -
14.6	ICCU 2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	3,04	$ 807.388,00	$ 2.451.229,97	0,00		3,04	$ 2.451.229,97	0,00	$ -	3,04	$ 2.451.229,97	0,00	$ -
14.7	ICCU 8,7	CONCRETO 3000 PSI	M3	5,97	$ 432.515,00	$ 2.580.860,26	-5,10		0,87	$ 376.028,54	4,59	$ 1.985.243,85	5,46	$ 2.361.272,39	-0,51	-$ 219.587,87
14.8	ICCU 4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,16	$ 1.132.981,00	$ 1.316.070,73	0,00		1,16	$ 1.316.070,73	0,00	$ -	1,16	$ 1.316.070,73	0,00	$ -
14.9	ICCU 5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	115,16	$ 53.337,00	$ 6.142.288,92		-1,86	113,30	$ 6.043.082,10	1,86	$ 99.206,82	115,16	$ 6.142.288,92	0,00	$ -
14.10	ICCU 16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	16,78	$ 143.394,00	$ 2.406.687,61	-3,28		13,50	$ 1.935.819,00	3,29	$ 471.766,26	16,79	$ 2.407.585,26	0,01	$ 897,65
14.11		PLACA CONTRAPISO 3000 PSI E: 10CMS	M2	46,77	$ 153.974,92	$ 7.201.407,08	-4,52		42,25	$ 6.505.440,43	0,00	$ -	42,25	$ 6.505.440,43	-4,52	-$ 695.966,65
14.12	ICCU 5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	40,66	$ 75.772,00	$ 3.080.737,98		-22,16	18,50	$ 1.401.782,00	14,87	$ 1.126.729,64	33,37	$ 2.528.511,64	-7,29	-$ 552.226,34
14.13	ICCU 5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	0,00	$ 27.514,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15		**PAÑETES Y ACABADOS**				**$ 32.634.204,60**				**$ -**		**$ 26.729.487,84**		**$ 26.729.487,84**		**-$ 5.904.716,76**

15.1	ICCU 6,17	PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS	M2	123,28	$	25.898,00	$	3.192.664,00		-123,28	0,00	$	-	128,39	$	3.325.044,22	128,39	$	3.325.044,22	5,11	$	132.380,22
15.2	ICCU 6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	26,45	$	16.270,00	$	430.341,50		-26,45	0,00	$	-	30,95	$	503.556,50	30,95	$	503.556,50	4,50	$	73.215,00
15.3	ICCU 6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	79,32	$	31.137,00	$	2.469.656,06		-79,32	0,00	$	-	85,05	$	2.648.201,85	85,05	$	2.648.201,85	5,73	$	178.545,79
15.4	ICCU 6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	36,56	$	31.137,00	$	1.138.368,72		-36,56	0,00	$	-	36,56	$	1.138.368,72	36,56	$	1.138.368,72	0,00	$	-
7,3	ICCU 6,3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	179,18	$	10.597,00	$	1.898.770,46		-179,18	0,00	$	-	130,96	$	1.387.783,12	130,96	$	1.387.783,12	-48,22	-$	510.987,34
15.6	ICCU 18,14	ESTUCO	M2	194,49	$	11.124,00	$	2.163.549,03		-194,49	0,00	$	-	207,33	$	2.306.338,92	207,33	$	2.306.338,92	12,84	$	142.789,89
15.7	ICCU 18,16	ESTUCO (LINEAL)	ML	55,49	$	7.051,00	$	391.259,99		-55,49	0,00	$	-	54,41	$	383.644,91	54,41	$	383.644,91	-1,08	-$	7.615,08
15.8		PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	116,26	$	18.700,00	$	2.174.032,08		-116,26	0,00	$	-	385,17	$	7.202.679,00	385,17	$	7.202.679,00	268,91	$	5.028.646,92
15.9		PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	26,45	$	12.100,00	$	320.045,00		-26,45	0,00	$	-	27,37	$	331.177,00	27,37	$	331.177,00	0,92	$	11.132,00
15.10		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES	M2	122,63	$	30.010,00	$	3.680.123,30		-122,63	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-122,63	-$	3.680.123,30
15.11		PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES LINEAL	ML	32,14	$	19.206,00	$	617.280,84		-32,14	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-32,14	-$	617.280,84
15.12	ICCU 13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	42,97	$	54.503,00	$	2.341.874,00		-42,97	0,00	$	-	42,97	$	2.341.874,00	42,97	$	2.341.874,00	0,00	$	-
15.13	ICCU 13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	47,60	$	51.972,00	$	2.473.950,36		-47,60	0,00	$	-	99,30	$	5.160.819,60	99,30	$	5.160.819,60	51,70	$	2.686.869,24
15.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO CERÁMICO MADERA ZEBRANO OSCURO 25X75	M2	37,92	$	110.731,05	$	4.199.331,26		-37,92	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-37,92	-$	4.199.331,26
15.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED CERÁMICA AGATA GRIS CARAS DIFERENCIADAS 25X35	M2	32,24	$	95.000,00	$	3.062.762,00		-32,24	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-32,24	-$	3.062.762,00
15.16		GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA MADERA ZEBRANO OSCURO DE 25 X 75	ML	38,38	$	54.200,00	$	2.080.196,00		-38,38	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-38,38	-$	2.080.196,00
16		**RED HIDROSANITARIA**					**$**	**5.663.800,51**				**$**	**-**		**$**	**6.932.683,64**		**$**	**6.932.683,64**		**$**	**1.268.883,13**
16.1	ICCU 16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M	M3	19,50	$	43.107,00	$	840.586,50		-19,50	0,00	$	-	3,90	$	168.117,30	3,90	$	168.117,30	-15,60	-$	672.469,20
16.2	ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	0,00	$	20.471,00	$	-		0,00	0,00	$	-	149,00	$	3.050.179,00	149,00	$	3.050.179,00	149,00	$	3.050.179,00
16.3	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	30,70	$	67.435,00	$	2.070.254,50		-30,70	0,00	$	-	30,70	$	2.070.254,50	30,70	$	2.070.254,50	0,00	$	-
16.4	ICCU 11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	4,00	$	136.114,00	$	544.456,00		-4,00	0,00	$	-	4,00	$	544.456,00	4,00	$	544.456,00	0,00	$	-
16.5	ICCU 11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,00	$	123.929,00	$	-		0,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16.6	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	5,00	$	96.707,00	$	483.535,00		-5,00	0,00	$	-	5,00	$	483.535,00	5,00	$	483.535,00	0,00	$	-
16.7	ICCU 11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	6,92	$	17.969,00	$	124.345,48		-6,92	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-6,92	-$	124.345,48
16.8	ICCU 11,36	REGISTRO 1/2	UND	1,00	$	83.340,00	$	83.340,00		-1,00	0,00	$	-	1,00	$	83.340,00	1,00	$	83.340,00	0,00	$	-
16.9	ICCU 11,37	REGISTRO DE 3/4	UND	0,00	$	104.714,00	$	-		0,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16.10	ICCU 14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$	170.308,00	$	170.308,00		-1,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-1,00	-$	170.308,00
16.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALUVIA REDONDO BLANCO O SIMILAR, INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$	513.965,19	$	513.965,19		-1,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-1,00	-$	513.965,19
16.12	ICCU 17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$	123.668,00	$	123.668,00		-1,00	0,00	$	-	1,00	$	123.668,00	1,00	$	123.668,00	0,00	$	-
16.13	ICCU 14,37	TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UND	1,00	$	27.579,00	$	27.579,00		-1,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-1,00	-$	27.579,00
16.14	ICCU 14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	0,00	$	20.998,00	$	-		0,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16.15	ICCU 14,35	REMATES BOCEL ALUMINO	ML	2,58	$	13.698,00	$	35.340,84		-2,58	0,00	$	-	2,58	$	35.340,84	2,58	$	35.340,84	0,00	$	-
16.16		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 2" Y 3"	UND	1,00	$	44.450,00	$	44.450,00		-1,00	0,00	$	-	1,00	$	44.450,00	1,00	$	44.450,00	0,00	$	-
16.17		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE CANAL LAVAMANOS 2"	UND	1,00	$	24.000,00	$	24.000,00		-1,00	0,00	$	-	1,00	$	24.000,00	1,00	$	24.000,00	0,00	$	-
16.18		CONCRETO DIVISORIO PARA DUCHA	ML	1,29	$	236.700,00	$	305.343,00		-1,29	0,00	$	-	1,29	$	305.343,00	1,29	$	305.343,00	0,00	$	-
16.19	ICCU 17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1,00	$	272.629,00	$	272.629,00		-1,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	-1,00	-$	272.629,00
17		**RED ELECTRICA**					**$**	**10.536.923,00**				**$**	**-**		**$**	**13.294.606,89**		**$**	**13.294.606,89**		**$**	**2.757.683,89**

17.2	ICCU 12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	8,00	$	121.785,00	$	974.280,00		-8,00	0,00	$	-	8,00	$	974.280,00	8,00	$	974.280,00	0,00	$	-
17.3		LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	8,00	$	60.875,00	$	487.000,00		-8,00	0,00	$	-	6,00	$	365.250,00	6,00	$	365.250,00	-2,00	-$	121.750,00
17.4	ICCU 12,13	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$	572.447,00	$	572.447,00		-1,00	0,00	$	-	1,00	$	572.447,00	1,00	$	572.447,00	0,00	$	-
17.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	12,00	$	9.503,00	$	114.036,00		-12,00	0,00	$	-	12,00	$	114.036,00	12,00	$	114.036,00	0,00	$	-
17.6	ICCU 21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	0,00	$	29.043,00	$	-		0,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
17.7		APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	0,00	$	30.642,14	$	-		0,00	0,00	$	-	45,37	$	1.390.233,89	45,37	$	1.390.233,89	45,37	$	1.390.233,89
17.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	338,00	$	24.820,00	$	8.389.160,00		-338,00	0,00	$	-	398,00	$	9.878.360,00	398,00	$	9.878.360,00	60,00	$	1.489.200,00
18		**CUBIERTA**					**$**	**26.288.778,71**				**$**	**-**		**$**	**30.612.759,19**		**$**	**30.612.759,19**		**$**	**4.323.980,49**
18.1	ICCU 7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	88,78	$	82.382,00	$	7.313.775,10		-88,78	0,00	$	-	88,78	$	7.313.873,96	88,78	$	7.313.873,96	0,00	$	98,86
18.2	ICCU 7,32	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	92,72	$	110.975,00	$	10.289.979,32		-92,72	0,00	$	-	92,72	$	10.289.602,00	92,72	$	10.289.602,00	0,00	-$	377,31
18.3	ICCU 7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	1,86	$	86.836,00	$	161.254,45		-1,86	0,00	$	-	9,77	$	848.387,72	9,77	$	848.387,72	7,91	$	687.133,27
18.4	ICCU 7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	18,97	$	115.149,00	$	2.184.376,53		-18,97	0,00	$	-	30,80	$	3.546.589,20	30,80	$	3.546.589,20	11,83	$	1.362.212,67
18.5	ICCU 7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	14,50	$	75.957,00	$	1.101.376,50		-14,50	0,00	$	-	11,95	$	907.686,15	11,95	$	907.686,15	-2,55	-$	193.690,35
18.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	37,32	$	100.200,00	$	3.739.934,94		-37,32	0,00	$	-	37,33	$	3.740.466,00	37,33	$	3.740.466,00	0,01	$	531,06
18,6	ICCU 18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	41,17	$	4.556,00	$	187.562,77		-41,17	0,00	$	-	324,92	$	1.480.335,52	324,92	$	1.480.335,52	283,75	$	1.292.772,75
18.7	ICCU 18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	41,17	$	4.142,00	$	170.519,10		-41,17	0,00	$	-	324,92	$	1.345.818,64	324,92	$	1.345.818,64	283,75	$	1.175.299,54
18.8		ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	30,00	$	38.000,00	$	1.140.000,00		-30,00	0,00	$	-	30,00	$	1.140.000,00	30,00	$	1.140.000,00	0,00	$	-
19		**CARPINTERÍA**					**$**	**22.214.876,00**				**$**	**-**		**$**	**14.052.679,76**		**$**	**14.052.679,76**		**-$**	**8.162.196,24**
19.1	19,1	CLOSET EN ESTRUCTURA DE LAMINA ETERBOARD 8MM ENTREPAÑOS Y PUERTA	M2	9,45	$	1.078.000,00	$	10.187.100,00		-9,45	0,00	$	-	7,59	$	8.182.020,00	7,59	$	8.182.020,00	-1,86	-$	2.005.080,00
19.2	19,2	MARCO PUERTA EN RH X 0.15	UN	3,00	$	511.500,00	$	1.534.500,00		-3,00	0,00	$	-	3,00	$	1.534.500,00	3,00	$	1.534.500,00	0,00	$	-
19.3	19,3	HOJA PUERTA EN RH INCLUYE BISAGRA NEGRA Y TAPALUCES EN RH	M2	6,85	$	638.000,00	$	4.370.300,00		-6,85	0,00	$	-	5,83	$	3.719.540,00	5,83	$	3.719.540,00	-1,02	-$	650.760,00
19.4	19,4	CHAPA ALUMINIO NEGRO PARA PUERTA DE MADERA	UND	3,00	$	187.000,00	$	561.000,00		-3,00	0,00	$	-	3,00	$	561.000,00	3,00	$	561.000,00	0,00	$	-
19.5	19,5	VENTANA EN ALUMINIO TIPO MADERA INCLUYE VIDRIO	M2	0,00	$	896.000,00	$	-		0,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
19.6	ICCU 9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO DE 4MM	M2	56,00	$	99.321,00	$	5.561.976,00		-56,00	0,00	$	-	0,56	$	55.619,76	0,56	$	55.619,76	-55,44	-$	5.506.356,24
19.7	ICCU 10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	0,00	$	717.035,00	$	-		0,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
20		**POZO SEPTICO DE 2*2*2**					**$**	**6.568.607,89**				**$**	**6.568.607,89**		**$**	**-**		**$**	**6.568.607,89**		**$**	**-**
20.1	ICCU 16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,69	$	20.806,00	$	409.711,75	0,00		19,69	$	409.711,75	0,00	$	-	19,69	$	409.711,75	0,00	$	-
20.2		BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO	M3	0,00	$	125.922,00	$	-	0,00		0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
20.3	ICCU 4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	19,69	$	7.746,00	$	152.534,23		0,00	19,69	$	152.534,23	0,00	$	-	19,69	$	152.534,23	0,00	$	-
20.4	ICCU 8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	1,25	$	490.404,00	$	614.721,41	0,00		1,25	$	614.721,41	0,00	$	-	1,25	$	614.721,41	0,00	$	-
20.5	ICCU 5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	19,92	$	123.056,00	$	2.451.275,52	0,00		19,92	$	2.451.275,52	0,00	$	-	19,92	$	2.451.275,52	0,00	$	-
20.6	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	20,00	$	67.435,00	$	1.348.700,00	0,00		20,00	$	1.348.700,00	0,00	$	-	20,00	$	1.348.700,00	0,00	$	-
20.7		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	19,69	$	80.828,00	$	1.591.664,98	0,00		19,69	$	1.591.664,98	0,00	$	-	19,69	$	1.591.664,98	0,00	$	-
21	**21**	**CAJA DE INSPECCION**					**$**	**477.047,40**				**$**	**477.047,40**		**$**	**-**		**$**	**477.047,40**		**$**	**-**

21.1	ICCU 16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIEERA H=1,0 M	M3	0,45	$ 43.107,00	$ 19.311,94	0,00		0,45	$ 19.311,94	0,00	$ -	0,45	$ 19.311,94	0,00	$ -
21.2		BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO	M3	0,13	$ 125.922,00	$ 16.118,02	0,00		0,13	$ 16.118,02	0,00	$ -	0,13	$ 16.118,02	0,00	$ -
21.3	ICCU 8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	0,15	$ 490.404,00	$ 71.108,58	0,00		0,15	$ 71.108,58	0,00	$ -	0,15	$ 71.108,58	0,00	$ -
21.4	ICCU 5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	2,56	$ 123.056,00	$ 315.023,36	0,00		2,56	$ 315.023,36	0,00	$ -	2,56	$ 315.023,36	0,00	$ -
21.5	ICCU 8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,06	$ 866.961,00	$ 55.485,50	0,00		0,06	$ 55.485,50	0,00	$ -	0,06	$ 55.485,50	0,00	$ -
					SUB TOTAL	$ 149.557.769,94			SUB TOTAL	$ 46.607.768,76	SUB TOTAL	$ 96.106.914,49	SUB TOTAL	$ 142.714.683,25	SUB TOTAL	-$ 6.843.086,68

	ITEM ICCU	ACCESO ENTRADA PRICIPAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
22		**PRELIMINARES**				**$ 9.497.312,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 9.497.312,00**
22.1	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	40,00	$ 29.436,00	$ 1.177.440,00		-40,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-40,00	-$ 1.177.440,00
22.2		DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN SUPERBOARD	M2	110,00	$ 58.000,00	$ 6.380.000,00		-110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-110,00	-$ 6.380.000,00
22.3		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 10 KM	M3	24,00	$ 80.828,00	$ 1.939.872,00		-24,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-24,00	-$ 1.939.872,00
23		**ESTRUCTURA Y ACABADOS**				**$ 53.640.226,00**				**$ -**		**$ -**		**$ 36.803.490,00**		**-$ 16.836.736,00**
23.1	ICCU 5,15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	170,00	$ 164.739,00	$ 28.005.630,00		-170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	170,00	$ 28.005.630,00	0,00	$ -
23.2	ICCU 5,16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	90,00	$ 97.754,00	$ 8.797.860,00		-90,00	0,00	$ -	0,00	$ -	90,00	$ 8.797.860,00	0,00	$ -
23.3	23,3	PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES	M2	300,00	$ 30.010,00	$ 9.003.000,00		-300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-300,00	-$ 9.003.000,00
23.4	23,4	PINTURA TIPO KORAZA EXTERIORES LINEAL	ML	76,00	$ 19.206,00	$ 1.459.656,00		-76,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-76,00	-$ 1.459.656,00
23.5	23,5	GOTERO EN LAMINA ETERBOARD 0.06 M PARA MUROS	ML	29,60	$ 99.800,00	$ 2.954.080,00		-29,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-29,60	-$ 2.954.080,00
23.6	23,6	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	90	$ 38.000,00	$ 3.420.000,00		-90,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	-90,00	-$ 3.420.000,00
					SUB TOTAL	$ 63.137.538,00			SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ 36.803.490,00	SUB TOTAL	-$ 26.334.048,00

	ITEM ICCU	PORTERÍA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
24		**PRELIMINARES**				**$ 11.380.543,04**				**$ -**		**$ 5.783.032,22**		**$ 5.783.032,22**		**-$ 5.597.510,82**
24.1	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	121,10	$ 13.297,00	$ 1.610.266,70		-121,10	0,00	$ -	121,10	$ 1.610.266,70	121,10	$ 1.610.266,70	0,00	$ -
24.2	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	48,60	$ 29.436,00	$ 1.430.589,60		-48,60	0,00	$ -	48,60	$ 1.430.589,60	48,60	$ 1.430.589,60	0,00	$ -
24.3	ICCU 1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	79,00	$ 9.368,00	$ 740.072,00		-79,00	0,00	$ -	95,00	$ 889.960,00	95,00	$ 889.960,00	16,00	$ 149.888,00
24.4	ICCU 16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,42	$ 20.806,00	$ 29.636,07		-1,42	0,00	$ -	1,42	$ 29.544,52	1,42	$ 29.544,52	0,00	-$ 91,55
24.5		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	93,66	$ 80.828,00	$ 7.569.978,67		-93,66	0,00	$ -	22,55	$ 1.822.671,40	22,55	$ 1.822.671,40	-71,11	-$ 5.747.307,27
25		**ESTRUCTURA**				**$ 5.428.440,70**				**$ -**		**$ 6.808.141,71**		**$ 6.808.141,71**		**$ 1.379.701,00**

25.1		PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E: 10 CMS.	M2	20,77	$ 153.974,92	$ 3.197.289,24		-20,77	0,00	$ -	25,77	$ 3.967.933,73	25,77	$ 3.967.933,73	5,01	$ 770.644,48
25.2	ICCU 4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	139,82	$ 7.746,00	$ 1.083.045,72		-139,82	0,00	$ -	215,53	$ 1.669.495,38	215,53	$ 1.669.495,38	75,71	$ 586.449,66
25.3	ICCU 2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,42	$ 807.388,00	$ 1.148.105,74		-1,42	0,00	$ -	1,45	$ 1.170.712,60	1,45	$ 1.170.712,60	0,03	$ 22.606,86
26		**RED HIDROSANITARIA**				**$ 2.994.244,78**				**$ -**		**$ 1.605.433,90**		**$ 1.605.433,90**		**-$ 1.388.810,88**
26.1	ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	14,60	$ 20.471,00	$ 298.876,60		-14,60	0,00	$ -	31,20	$ 638.695,20	31,20	$ 638.695,20	16,60	$ 339.818,60
26.2	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10,82	$ 67.435,00	$ 729.646,70		-10,82	0,00	$ -	10,82	$ 729.646,70	10,82	$ 729.646,70	0,00	$ -
26.3	ICCU 11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	1,00	$ 131.646,00	$ 131.646,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 131.646,00	1,00	$ 131.646,00	0,00	$ -
26.4	ICCU 11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	1,00	$ 105.446,00	$ 105.446,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 105.446,00	1,00	$ 105.446,00	0,00	$ -
26.5	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	2,00	$ 96.707,00	$ 193.414,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 193.414,00
26.6	ICCU 11,25	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	UND	40,00	$ 17.969,00	$ 718.760,00		-40,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-40,00	-$ 718.760,00
26.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALUVIA REDONDO BLANCO O SIMILAR, INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 513.965,19	$ 513.965,19		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 513.965,19
26.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AVANTI PEDESTAL BLANCO. INCLUYE GRIFERÍA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 302.490,29	$ 302.490,29		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 302.490,29
27		**RED ELECTRICA**				**$ 4.152.099,59**				**$ -**		**$ 318.678,26**		**$ 318.678,26**		**-$ 3.833.421,34**
27.1	27,1	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	17,10	$ 30.642,14	$ 523.980,59		-17,10	0,00	$ -	10,40	$ 318.678,26	10,40	$ 318.678,26	-6,70	-$ 205.302,34
27.2	ICCU 12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	3,00	$ 121.785,00	$ 365.355,00		-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,00	-$ 365.355,00
27.3		LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	3,00	$ 60.875,00	$ 182.625,00		-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,00	-$ 182.625,00
27.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	40,00	$ 9.503,00	$ 380.120,00		-40,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-40,00	-$ 380.120,00
27.5	ICCU 12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 133.559,00	$ 133.559,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 133.559,00
27.6	ICCU 21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	20,00	$ 29.043,00	$ 580.860,00		-20,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-20,00	-$ 580.860,00
27.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	80,00	$ 24.820,00	$ 1.985.600,00		-80,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-80,00	-$ 1.985.600,00
28		**MUROS Y ACABADOS**				**$ 62.734.823,07**				**$ -**		**$ 57.800.000,00**		**$ 57.800.000,00**		**-$ 4.934.823,07**
28.1	28,1	CASETA DE VENTAS EN PLASTICO RECICLADO TIPO TAQUILLA FABRICADA 90% CON PLATICO RECUPERADO CON UNA DURABILIDAD DE MAS DE 20 AÑOS	M2	20,00	$ 2.890.000,00	$ 57.800.000,00		-20,00	0,00	$ -	20,00	$ 57.800.000,00	20,00	$ 57.800.000,00	0,00	$ -
28.2	ICCU 7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	8,00	$ 115.149,00	$ 921.192,00		-8,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-8,00	-$ 921.192,00
28.3	ICCU 7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	10,00	$ 75.957,00	$ 759.570,00		-10,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-10,00	-$ 759.570,00
28.4	ICCU 13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	20,00	$ 51.972,00	$ 1.039.440,00		-20,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-20,00	-$ 1.039.440,00
28.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO CERÁMICO MADERA ZEBRANO OSCURO 25X75	M2	20,00	$ 110.731,05	$ 2.214.621,07		-20,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-20,00	-$ 2.214.621,07
29		**POZO SEPTICO DE 2*2*2**				**$ 6.564.588,80**				**$ -**		**$ 5.246.160,96**		**$ 5.246.160,96**		**-$ 1.318.427,84**

29.1	ICCU 16,2	EXCCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIERO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM) POZO SEPTICO	M3	13,23	$ 20.806,00	$ 275.284,19		-13,23	0,00	$ -	13,23	$ 275.263,38	13,23	$ 275.263,38	0,00	-$ 20,81
29.2		BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO	M3	0,23	$ 125.922,00	$ 28.332,45		-0,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-0,23	-$ 28.332,45
29.3	ICCU 4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	77,29	$ 7.746,00	$ 598.688,34		-77,29	0,00	$ -	80,56	$ 624.017,76	80,56	$ 624.017,76	3,27	$ 25.329,42
29.4	ICCU 8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	1,72	$ 490.404,00	$ 843.494,88		-1,72	0,00	$ -	1,72	$ 843.494,88	1,72	$ 843.494,88	0,00	$ -
29.5	ICCU 5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	15,20	$ 123.056,00	$ 1.870.451,20		-15,20	0,00	$ -	13,68	$ 1.683.406,08	13,68	$ 1.683.406,08	-1,52	-$ 187.045,12
29.6	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	13,78	$ 67.435,00	$ 929.254,30		-13,78	0,00	$ -	13,78	$ 929.254,30	13,78	$ 929.254,30	0,00	$ -
29.7		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	24,98	$ 80.828,00	$ 2.019.083,44		-24,98	0,00	$ -	11,02	$ 890.724,56	11,02	$ 890.724,56	-13,96	-$ 1.128.358,88
30	**30**	**CAJA DE INSPECCION**				**$ 524.001,01**				**$ -**		**$ 459.299,90**		**$ 459.299,90**		**-$ 64.701,11**
30.1	ICCU 16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M	M3	0,32	$ 43.107,00	$ 13.794,24		-0,32	0,00	$ -	0,32	$ 13.794,24	0,32	$ 13.794,24	0,00	$ -
30.2		BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO	M3	0,00	$ 125.922,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30.3	ICCU 8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	0,15	$ 490.404,00	$ 75.326,05		-0,15	0,00	$ -	0,16	$ 78.464,64	0,16	$ 78.464,64	0,01	$ 3.138,59
30.4	ICCU 5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	2,56	$ 123.056,00	$ 315.023,36		-2,56	0,00	$ -	2,56	$ 315.023,36	2,56	$ 315.023,36	0,00	$ -
30.5	ICCU 8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,14	$ 866.961,00	$ 119.857,36		-0,14	0,00	$ -	0,06	$ 52.017,66	0,06	$ 52.017,66	-0,08	-$ 67.839,70
					SUB TOTAL	**$ 93.778.740,99**			**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**$ 78.020.746,95**	**SUB TOTAL**	**$ 78.020.746,95**	**SUB TOTAL**	**-$ 15.757.994,06**

	ITEM ICCU	ZONA BBQ	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
31		**PRELIMINARES**				**$ 863.076,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 863.076,00**
31.1	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	26,00	$ 29.436,00	$ 765.336,00		-26,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-26,00	-$ 765.336,00
31.2	ICCU 1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	2,00	$ 21.070,00	$ 42.140,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 42.140,00
31.3		RESANE Y REPARACIÓN DE MURO	ML	2,00	$ 27.800,00	$ 55.600,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 55.600,00
32		**ESTRUCTURA**				**$ 26.116.208,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 26.116.208,00**
32.1		ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE 10 x 10	KG	1100,00	$ 18.000,00	$ 19.800.000,00		-1100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1100,00	-$ 19.800.000,00
32.2	ICCU 18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	120,00	$ 4.556,00	$ 546.720,00		-120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-120,00	-$ 546.720,00
32.3	ICCU 18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	120,00	$ 4.142,00	$ 497.040,00		-120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-120,00	-$ 497.040,00
32.4	ICCU 7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	64,00	$ 82.382,00	$ 5.272.448,00		-64,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-64,00	-$ 5.272.448,00
33		**CUBIERTA**				**$ 11.609.469,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 11.609.469,00**

33.1	ICCU 7,32	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	64,00	$ 110.975,00	$ 7.102.400,00		-64,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-64,00	-$	7.102.400,00
33.2	ICCU 7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	8,00	$ 86.836,00	$ 694.688,00		-8,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-8,00	-$	694.688,00
33.3	ICCU 7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	11,00	$ 115.149,00	$ 1.266.639,00		-11,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-11,00	-$	1.266.639,00
33.4	ICCU 7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	6,00	$ 75.957,00	$ 455.742,00		-6,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-6,00	-$	455.742,00
33.5		ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	55,00	$ 38.000,00	$ 2.090.000,00		-55,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-55,00	-$	2.090.000,00
34		**RED ELECTRICA**				**$ 3.359.517,12**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$**	**3.359.517,12**
34.1	34,1	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	8,00	$ 30.642,14	$ 245.137,12		-8,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-8,00	-$	245.137,12
34.2	ICCU 12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	12,00	$ 121.785,00	$ 1.461.420,00		-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-12,00	-$	1.461.420,00
34.3		LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	12,00	$ 60.875,00	$ 730.500,00		-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-12,00	-$	730.500,00
34.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	15,00	$ 9.503,00	$ 142.545,00		-15,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-15,00	-$	142.545,00
34.5	ICCU 12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 133.559,00	$ 133.559,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$	133.559,00
34.6	ICCU 21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	12,00	$ 29.043,00	$ 348.516,00		-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-12,00	-$	348.516,00
34.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	12,00	$ 24.820,00	$ 297.840,00		-12,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-12,00	-$	297.840,00
35		**RED HIDROSANITARIA**				**$ 1.157.505,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$**	**1.157.505,00**
35.1	ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	20,00	$ 20.471,00	$ 409.420,00		-20,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-20,00	-$	409.420,00
35.2	ICCU 11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	1,00	$ 105.446,00	$ 105.446,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$	105.446,00
35.3	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	2,00	$ 96.707,00	$ 193.414,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$	193.414,00
35.4	ICCU 11,25	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	UND	25,00	$ 17.969,00	$ 449.225,00		-25,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-25,00	-$	449.225,00
36		**MOBILIARIO**				**$ 19.091.975,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$**	**19.091.975,00**
36.1		MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO Y ENTREPAÑO EN CONCRETO, E= 5 CMS)	M2	7,00	$ 985.300,00	$ 6.897.100,00		-7,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-7,00	-$	6.897.100,00
36.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1.20 X 0.50 CM DOBLE POCETA , INCLUYE GRIDERÍA Y SIFON.	UND	1,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$	980.000,00
36.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA USO MIXTO ACERO INOXIDABLE AGUA FRIA	UND	1,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$	340.000,00
36.4		ESTRUCTURA EN LADRILLO TOLETE PARA INSTALACIÓN DE HORNO	GLB	1,00	$ 852.000,00	$ 852.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$	852.000,00
36.5	ICCU 5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	20,00	$ 75.772,00	$ 1.515.440,00		-20,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-20,00	-$	1.515.440,00
36.6	ICCU 4.13	CONTRUCCION DE ESCALERA EN CONCRETO	M3	5,00	$ 1.359.487,00	$ 6.797.435,00		-5,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-5,00	-$	6.797.435,00
36.7		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERAMICO 25X 35, INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, CON 5% DE DESPERDICIO.	M2	18,00	$ 95.000,00	$ 1.710.000,00		-18,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-18,00	-$	1.710.000,00
					SUB TOTAL	**$ 62.197.750,12**			**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**-$**	**62.197.750,12**

	ITEM ICCU	CASA PRINCIPAL - KIOSCO - CANCHA - EQUIPOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
37		**PRELIMINARES**				**$ 3.586.080,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 3.586.080,00**
31.1	ICCU 1.9	DEMOLICION DE ESCALERA EN CONCRETO	M2	6,00	$ 130.571,00	$ 783.426,00		-6,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-6,00	-$ 783.426,00
47.2		DESMONTE DE BARANDA METALICA EXISTENTE	ML	14,69	$ 18.000,00	$ 264.420,00		-14,69	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-14,69	-$ 264.420,00
37.3	ICCU 4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	2,00	$ 1.269.117,00	$ 2.538.234,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 2.538.234,00
38		**ACABADOS**				**$ 19.890.055,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 19.890.055,00**
38.1		PICADO SOBRE MAMPOSTERIA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE ENCHAPE	M2	70,00	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00		-70,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-70,00	-$ 1.120.000,00
38.2		PICADO DE MESONES PARA LA INSTACION DE PORCELANATOS INCLUYE ALISTA	M2	25,00	$ 103.710,00	$ 2.592.750,00		-25,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-25,00	-$ 2.592.750,00
38.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERAMICO 25X 35, INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR.	M2	50,00	$ 95.000,00	$ 4.750.000,00		-50,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-50,00	-$ 4.750.000,00
38.4		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERAMICO 30 X 60, INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR	M2	78,00	$ 113.000,00	$ 8.814.000,00		-78,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-78,00	-$ 8.814.000,00
38.5		WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO VIGAS Y FILOS	ML	49,00	$ 18.900,00	$ 926.100,00		-49,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-49,00	-$ 926.100,00
38.6		WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS	ML	39,00	$ 25.600,00	$ 998.400,00		-39,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-39,00	-$ 998.400,00
38.7	ICCU 6,3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	65,00	$ 10.597,00	$ 688.805,00		-65,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-65,00	-$ 688.805,00
39		**BARANDA**				**$ 28.035.234,80**						**$ -**		**$ -**		**-$ 28.035.234,80**
39.1		DESMONTE DE BARANDA METALICA EXISTENTE	ML	31,00	$ 18.000,00	$ 558.000,00		-31,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-31,00	-$ 558.000,00
39.2		REGATA PARA ANCLAGE DE BARANDA MANGLE	M2	4,00	$ 34.600,00	$ 138.400,00		-4,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-4,00	-$ 138.400,00
39.3		PLATINA HR CL 1/4´ 20 X 20	UND	19,00	$ 52.500,00	$ 997.500,00		-19,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-19,00	-$ 997.500,00
39.4		TORNILLO 1" X 1/4" DOBLE ARANDELA	KG	76,00	$ 5.800,00	$ 440.800,00		-76,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-76,00	-$ 440.800,00
39.5		TUBO CUADRADO 100 *100 2MM * 6 MT	ML	2,85	$ 442.900,00	$ 1.262.265,00		-2,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,85	-$ 1.262.265,00
39.6	ICCU 8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,50	$ 866.961,00	$ 433.480,50		-0,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-0,50	-$ 433.480,50
39.7	ICCU 18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	2,85	$ 4.556,00	$ 12.984,60		-2,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,85	-$ 12.984,60
39.8	ICCU 18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	2,85	$ 4.142,00	$ 11.804,70		-2,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,85	-$ 11.804,70
39.9		BARANDA MADERA RUSTICA, AMARRE EN LAZO TORNILLERIA Y QUIMICOS PARA SU CORRECTA CONSERVACION	ML	31,00	$ 780.000,00	$ 24.180.000,00		-31,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-31,00	-$ 24.180.000,00
40		**DEPOSITO CAR**				**$ 418.579,72**				**$ 418.579,72**		**$ -**		**$ 418.579,72**		**$ -**
40.1	ICCU 1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	4,20	$ 9.368,00	$ 39.345,60		0,00	4,20	$ 39.345,60	0,00	$ -	4,20	$ 39.345,60	0,00	$ -
40.2	ICCU 16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,20 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,45	$ 68.434,00	$ 30.795,30		0,00	0,45	$ 30.795,30	0,00	$ -	0,45	$ 30.795,30	0,00	$ -
40.3		BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL AFIRMADO)	M3	0,23	$ 118.580,00	$ 26.680,50		0,00	0,23	$ 26.680,50	0,00	$ -	0,23	$ 26.680,50	0,00	$ -
40.4	ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	4,66	$ 12.635,00	$ 58.847,51		0,00	4,66	$ 58.847,51	0,00	$ -	4,66	$ 58.847,51	0,00	$ -
40.5	ICCU 8,7	CONCRETO 3000 PSI	M3	0,34	$ 432.515,00	$ 145.973,81		0,00	0,34	$ 145.973,81	0,00	$ -	0,34	$ 145.973,81	0,00	$ -
40.6	ICCU 13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	2,25	$ 51.972,00	$ 116.937,00		0,00	2,25	$ 116.937,00	0,00	$ -	2,25	$ 116.937,00	0,00	$ -
40.7	ICCU 18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	0,00	$ 4.556,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
41		**SPA**				**$ 12.401.922,00**				**$ 12.401.922,00**		**$ -**		**$ 12.401.922,00**		**$ -**

41.1	ICCU 7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM	M2	68,00	$ 82.382,00	$ 5.601.976,00	0,00		68,00	$ 5.601.976,00	0,00	$ -	68,00	$ 5.601.976,00	0,00	$ -
41.2	ICCU 18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	77,00	$ 4.556,00	$ 350.812,00	0,00		77,00	$ 350.812,00	0,00	$ -	77,00	$ 350.812,00	0,00	$ -
41.3	ICCU 18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	77,00	$ 4.142,00	$ 318.934,00	0,00		77,00	$ 318.934,00	0,00	$ -	77,00	$ 318.934,00	0,00	$ -
41.4		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	31,00	$ 100.200,00	$ 3.106.200,00	0,00		31,00	$ 3.106.200,00	0,00	$ -	31,00	$ 3.106.200,00	0,00	$ -
41.5		ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	35,00	$ 38.000,00	$ 1.330.000,00	0,00		35,00	$ 1.330.000,00	0,00	$ -	35,00	$ 1.330.000,00	0,00	$ -
41.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO ANGEO.	M2	77,00	$ 22.000,00	$ 1.694.000,00	0,00		77,00	$ 1.694.000,00	0,00	$ -	77,00	$ 1.694.000,00	0,00	$ -
42		**EQUIPOS**				**$ -**				**$ -**		**$ 5.800.000,00**		**$ 5.800.000,00**		**$ 5.800.000,00**
42.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 3 HP	UND	0,00	$ 5.800.000,00	$ -		0,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00
43		**PISCINA**				**$ 12.538.000,00**				**$ -**		**$ 864.000,00**		**$ 864.000,00**		**-$ 11.674.000,00**
43.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 10MM, INCLUYE PERFORACIONES Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (1,10 X 1,20 M)	UND	1,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 1.100.000,00
43.2		SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PARAL EN ALUMINIO PARA VIDRIO TEMPLADO	UND	1,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 185.000,00
43.3		MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ARENA DE FILTRADO (12 SACOS DE ARENA CILICE 20-40 TIPO INDUSTRIAL) LIMPIEZA DE FLAUTAS , MANTENIMIENTO DIFUSORES Y FLAUTAS PARA REVISOON QUE NO ESTEN PERFORADAS , VERIFICACION DE VALVULA MULTIFORM , REVISION Y CAMBIO CANASTILLA TRAMPAS .	UND	2,00	$ 900.000,00	$ 1.800.000,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 1.800.000,00
43.4		DESMONTE Y CAMBIO TUBERIAS DE PRESION 1 1/2"	ML	6,00	$ 108.000,00	$ 648.000,00		-6,00	0,00	$ -	8,00	$ 864.000,00	8,00	$ 864.000,00	2,00	$ 216.000,00
43.5		DESMONTE DE REGISTROS BIRADIAL	UND	2,00	$ 45.000,00	$ 90.000,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 90.000,00
43.6		MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESION PISCINA 220 VOLTIOS Y JAKUZZY INCLUYE DESMONTE Y CAMBIO SELLOS MECANICOS , LIMPIEZA DE ROTADORES , CAMBIO RODAMIENTOS , LIMPIAR SULFATOS, ENGRASE DE LAS PARTES DE FRICCION .	UND	3,00	$ 435.000,00	$ 1.305.000,00		-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,00	-$ 1.305.000,00
43.7		PINTURA CON ANTICORROSIVO (EVITAR CORROSION) EN CARCASAS , ROTADORES, TORNILLOS , BOMBA) VERIFICACION Y CALIBRACION DE EJE IMPULSOR BOMBA	Glb	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 350.000,00
43.8		DESMONTE Y CAMBIO DE REGISTROS B1 - RADIALES DE 1 1/2" CON DOCLE UNIVERSAL SIN ROSCA DE PAGA	UND	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 240.000,00
43.9		ELECTRICA COFRE ELECTRICO EN LAMINA PLATICA CON LLAVE TRIANGULADA CONFORMADO CON: DE TRES (3) CONTACTORES DE 12 A 18 AMPERIOS , TERMICOS RELED DE 220 VOLTIOS , BOBINAS DE 220 VOLTIOS A 15 AMP Y DEMAS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL TABLERO	UND	1,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 4.500.000,00
43.10		INSTALACION FILTRO CARTUCHO PARA SAUNA , CAMBIO DE BOMBA DE PASO DE LA CALDERA , ACCESORIOS COMO REDUCTORES DE CALIBRE CON BUJES DE 1 1/2" A 1/2" TODO DE LATA PRESION , SOLDADURAS PARA PVC,CPVC,TEFLON NIPLES TUBERIA DE 1/2" Y NIPLES DE TUBERIA DE 1 1/2" X 50CMS	UND	1,00	$ 2.320.000,00	$ 2.320.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 2.320.000,00
44		**CANCHA**				**$ 1.669.800,00**				**$ 430.000,00**		**$ 2.479.600,00**		**$ 2.909.600,00**		**$ 1.239.800,00**

44.1		SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN NYLON PARA CANCHA MULTIPLE TIPO CABAÑA.	UND	2,00	$ 215.000,00	$ 430.000,00	0,00		2,00	$ 430.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 430.000,00	0,00	$ -
44.2		SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BALONCESTO EN ACRILICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UND	1,00	$ 1.239.800,00	$ 1.239.800,00		-1,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.479.600,00	2,00	$ 2.479.600,00	1,00	$ 1.239.800,00
					SUB TOTAL	$ 78.539.671,52			SUB TOTAL	$ 13.250.501,72	SUB TOTAL	$ 9.143.600,00	SUB TOTAL	$ 22.394.101,72	SUB TOTAL	-$ 56.145.569,80
	ITEM ICCU	SISTEMA DE SEGURIDAD	UNIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
45		**SISTEMA DE SEGURIDAD**				$ 77.920.300,00				$ -		$ -		$ -		-$ 77.920.300,00
45.1		SUMINISTRO E INSTALACION NVR 64 CH H.265 (DAHUA NVR 64 CH H2.65 DECODIFICACION 4CH 4 K O16 CH 2MP AB ENTRADA 320MBPS 4 SATA 2 HDMI)	UND	1,00	$ 3.545.000,00	$ 3.545.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 3.545.000,00
45.2		SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA TIPO BALA (CAMARA IP TIPO BALA 2MP 30FPS LENTE 2,8MM FOV 100 WIFI IP67 H.265 IR 30M CON MICROFONO)	UND	7,00	$ 369.900,00	$ 2.589.300,00		-7,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-7,00	-$ 2.589.300,00
45.3		SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA TIPO BALA IP (4MP 30FPS LENTE 2.8MM IP67 WDR 120DB H 2.65 + 4G PANEL SOLAR)	UND	24,00	$ 2.030.000,00	$ 48.720.000,00		-24,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-24,00	-$ 48.720.000,00
45.4		SUMINISTRO E ISNTALACION DISCO DURO (4 TERAS)	UND	2,00	$ 768.500,00	$ 1.537.000,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 1.537.000,00
45.5		SUMINISTRO E INSTALACION ANTENA (CPE para exteriores de 5 GHZ, 867 mbps y 23 dbi emisor y receptor)	UND	20,00	$ 669.900,00	$ 13.398.000,00		-20,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-20,00	-$ 13.398.000,00
45.6		SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE INSTALACION CAMARA (CAMARA , VIDEO BALUN, RJ45)	UND	33,00	$ 45.000,00	$ 1.485.000,00		-33,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-33,00	-$ 1.485.000,00
45.7		SUMINISTRO E ISNTALACION SWICHE DE 24 PUERTOS (TPLINK O LINKSYS)	UND	1,00	$ 943.000,00	$ 943.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 943.000,00
45.8		SUMINISTRO E INSTALACION ACCES POINT (EAP225 Outdoor omada punto de acceso inalambrico, MU-MIMO AC 1200 para exterior e interior)	UND	4,00	$ 754.000,00	$ 3.016.000,00		-4,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-4,00	-$ 3.016.000,00
45.9		SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA TIPO BALA (CAMARA IP PT 4MP FULL COLOR DISUASION ACTIVA LENTE FIJO 4 G IR 30M SMART H.265 MICROSD IP 66 WIFI)	UND	1,00	$ 2.030.000,00	$ 2.030.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 2.030.000,00
45.10		SUMINISTRO E ISNTALACION MATERIALES VARIOS (TENSORES AMARRA , ELEMENTOS DE CONEXIÓN)	UND	1,00	$ 657.000,00	$ 657.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 657.000,00
46		**FUMIGACION CONTRA RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES**				$ 29.600.000,00				$ -		$ 29.600.000,00		$ 29.600.000,00		$ -
46.1		CONTROL DE PLAGAS RASTREROS , VOLADORES Y ROEDORES POR EL METODO DE ASPERSION DIRIGIDA EN TODAS LAS AREAS DE CASA ACUARIES CON PRODUCTOS APROBADOS POR LA SALUD PUBLICA Y TOTALMENTE ORGANICOS (SAFER SL, ACEITE DE NEEM, CREOLINA GOLD, BOLAS DE NEFTALINA , EXTRACTO DE AJO, ACPM,SAL INCLUYE MANO DE OBRA	UND	2,00	$ 14.800.000,00	$ 29.600.000,00		-2,00	0,00	$ -	2,00	$ 29.600.000,00	2,00	$ 29.600.000,00	0,00	$ -
					SUB TOTAL	$ 107.520.300,00			SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ 29.600.000,00	SUB TOTAL	$ 29.600.000,00	SUB TOTAL	-$ 77.920.300,00

	ITEM ICCU	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
47		**PARQUEADERO**										**$ 8.521.169,13**				
47.1	ICCU 4,25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	9,48	$ 486.437,00	$ 4.611.422,76	0,00		9,48	$ 4.611.422,76	2,63	$ 1.279.329,31	12,11	$ 5.890.752,07	2,63	$ 1.279.329,31
47.2		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	546,48	$ 12.635,00	$ 6.904.774,80		0,00	546,48	$ 6.904.774,80	115,96	$ 1.465.154,60	662,44	$ 8.369.929,40	115,96	$ 1.465.154,60
47.3		VIGA CINTA 3500 PSI	M3	10,775	$ 1.099.406,00	$ 11.846.099,65	0,00		10,78	$ 11.846.099,65	0,00	$ -	10,78	$ 11.846.099,65	0,00	$ -
47.4	ICCU 320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	52,80	$ 145.523,00	$ 7.683.614,40	0,00		52,80	$ 7.683.614,40	0,00	$ -	52,80	$ 7.683.614,40	0,00	$ -
47.5	ICCU 330.1	BASE GRANULAR	M3	39,60	$ 157.249,00	$ 6.227.060,40	0,00		39,60	$ 6.227.060,40	27,88	$ 4.384.102,12	67,48	$ 10.611.162,52	27,88	$ 4.384.102,12
47.6		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	0,00	$ 49.632,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47.7		FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	298,00	$ 8.624,00	$ 2.569.952,00	0,00		298,00	$ 2.569.952,00	109,20	$ 941.740,80	407,20	$ 3.511.692,80	109,20	$ 941.740,80
47.8	ICCU 2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	4,61	$ 732.242,00	$ 3.374.171,14	0,00		4,61	$ 3.374.171,14	0,15	$ 111.176,30	4,76	$ 3.485.347,44	0,15	$ 111.176,30
47,8	ICCU 2,17	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	46,00	$ 56.611,00	$ 2.604.106,00	0,00		46,00	$ 2.604.106,00	6,00	$ 339.666,00	52,00	$ 2.943.772,00	6,00	$ 339.666,00
					SUB TOTAL	**$ 45.821.201,15**			**SUB TOTAL**	**$ 45.821.201,15**	**SUB TOTAL**	**$ 8.521.169,13**	**SUB TOTAL**	**$ 54.342.370,28**	**SUB TOTAL**	**$ 8.521.169,13**
48		**CUARTO COMPOSTAJE**										**$ 3.161.939,00**				
48,1		LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 375.331,00	$ 375.331,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 375.331,00	1,00	$ 375.331,00	0,00	$ -
48,2		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	12,00	$ 76.686,00	$ 920.232,00		-12,00	0,00	$ -	12,00	$ 920.232,00	12,00	$ 920.232,00	0,00	$ -
48,3		TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	30,00	$ 4.932,00	$ 147.960,00		-30,00	0,00	$ -	30,00	$ 147.960,00	30,00	$ 147.960,00	0,00	$ -
48,4		TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 859.208,00	$ 859.208,00		-1,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.718.416,00	2,00	$ 1.718.416,00	1,00	$ 859.208,00
					SUB TOTAL	**$ 2.302.731,00**			**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	**$ 3.161.939,00**	**SUB TOTAL**	**$ 3.161.939,00**	**SUB TOTAL**	**$ 859.208,00**

49		**CASA ADMINISTRADOR**										**$ 10.245.345,00**				
49.1		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	14,00	$ 76.686,00	$ 1.073.604,00		-14,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.073.604,00	14,00	$ 1.073.604,00	0,00	$ -
49.2		SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UND	0,00	$ 105.527,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49.3		LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 375.331,00	$ 375.331,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 375.331,00	1,00	$ 375.331,00	0,00	$ -
49,1		TUBO CUADRADO 100*100 * 2MM * 6MT	UND	3,00	$ 442.900,00	$ 1.328.700,00		-3,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.328.700,00	3,00	$ 1.328.700,00	0,00	$ -
49,2		PISOS EN ENCHAPE CERAMICO CON FOMRATO 55cmx55cm	M2	0,00	$ 95.000,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49,21		Lavaplatos en Acero Inoxidable 1.0 X 0.50 cm , incluye gridería y sifon.	UND	1,00	$ 325.000,00	$ 325.000,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 325.000,00	1,00	$ 325.000,00	0,00	$ -
49,22		MUROS EN ENCHAPE CERAMICO CON FOMRATO 55cmx55cm	M2	0,00	$ 116.000,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49,23		GRIFERÍA CUELLO SISNE ACERO INOXIDABLE AGUA FRIA	UND	0,00	$ 340.000,00	$ -		0,00	0,00	$ -	1,00	$ 340.000,00	1,00	$ 340.000,00	1,00	$ 340.000,00
49,24		MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO Y ENTREPAÑO EN CONCRETO, E= 5 CMS)	M2	2,11	$ 985.300,00	$ 2.081.446,25		-2,11	0,00	$ -	6,36	$ 6.266.508,00	6,36	$ 6.266.508,00	4,25	$ 4.185.061,75

49,25		WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO VIGAS Y FILOS	ML	0,00	$ 18.900,00	$ -		0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49,26		WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS	ML	5,20	$ 25.600,00	$ 133.120,00		-5,20	0,00	$ -	15,84	$ 405.504,00	15,84	$ 405.504,00	10,64	$ 272.384,00
49,27		TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	0,00	$ 4.932,00	$ -		0,00	0,00	$ -	26,50	$ 130.698,00	26,50	$ 130.698,00	26,50	$ 130.698,00
					SUB TOTAL	$ 5.317.201,25			SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ 10.245.345,00	SUB TOTAL	$ 10.245.345,00	SUB TOTAL	$ 4.928.143,75
	ITEM ICCU	ITEMS NO PREVISTOS 2	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
50		PARQUEADERO										$ 888.027,24				
50,1	ICCU 6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	19,84	$ 31.137,00	$ 617.758,08	-19,84		0,00	$ -	28,52	$ 888.027,24	28,52	$ 888.027,24	8,68	$ 270.269,16
					SUB TOTAL	$ 617.758,08			SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ 888.027,24	SUB TOTAL	$ 888.027,24	SUB TOTAL	$ 270.269,16
51		ZONA BBQ										$ -				
51,1	3.1 ICCU 16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,20 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	4,60	$ 68.434,00	$ 314.796,40		-4,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-4,60	-$ 314.796,40
51,2	3.2 ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	3,60	$ 143.394,00	$ 516.218,40		-3,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,60	-$ 516.218,40
51,3	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	105,00	$ 8.062,00	$ 846.510,00		-105,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-105,00	-$ 846.510,00
51,4	ICCU 5,17	MURO EN BLOQUE No.5 E=0,12m	M2	16,00	$ 61.034,00	$ 976.544,00		-16,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-16,00	-$ 976.544,00
51,5	ICCU 6,21	PAÑETE LISO EN MURO 1.4 E=1,5CMS	M2	32,00	$ 34.611,00	$ 1.107.552,00		-32,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-32,00	-$ 1.107.552,00
51,6	ICCCU 6,22	PAÑETE LISO EN PLACA 1.4 E=2 CMS (LINEAL)	ML	32,00	$ 21.431,00	$ 685.792,00		-32,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-32,00	-$ 685.792,00
51,7	ICCU 2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500PSI	M3	1,62	$ 856.224,00	$ 1.387.082,88		-1,62	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,62	-$ 1.387.082,88
51,8		PLACA CONTRA PISO 3000PSI E=10CMS	M2	18,00	$ 153.974,00	$ 2.771.532,00		-18,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-18,00	-$ 2.771.532,00
51,9		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	28,26	$ 12.635,00	$ 357.065,10		-28,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-28,26	-$ 357.065,10
51,10		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCIA MENOS A 10KM	M3	8,00	$ 80.828,00	$ 646.624,00		-8,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-8,00	-$ 646.624,00
51,11		CUBIERTA MADERA 8 X 1,4CM LISTON , MEDIDA DE LARGO 100 CMS X 2,95 MADERA SECA EN PINO MACHIMBREADA	M2	52	$ 395.000	$ 20.540.000		-52,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-52,00	-$ 20.540.000,00
51,12		SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO 20X20 PARA PISO CON DISEÑO EXCLUSIVO	M2	30,00	$ 427.700,00	$ 12.831.000,00		-30,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-30,00	-$ 12.831.000,00
51,13		Bbq de carbon mixto (gas) asador que funciona con carbon y encendido rapido a gas , tiene mecanismo que regula la altura con el fin de evitar exceso de calor sobre los alimentos. Ceunta con un desnivel para depositar la grasa y los jugos de las comidas , la base tiene un deposito para rl carbon , una baneja auxiliar lateral que se puede deslizar . medida de alto 1,28 . Material fabricado en hierro con un recubrimiento de pintura electrostatica	UND	1,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 4.800.000,00
					SUB TOTAL	$ 47.780.716,78			SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL	-$ 47.780.716,78

52		**CUARTO COMPOSTAJE**											**$ 12.706.718,54**				
52,1	ICCU 6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	27,00	$ 16.270,00	$ 439.290,00		-27,00	0,00	$ -	22,09	$ 359.404,30	22,09	$ 359.404,30	-4,91	-$ 79.885,70
52,2		PUERTA CORREDIZA CON RIEL DE 1.20X2.45 INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	2,94	$ 689.000,00	$ 2.025.660,00		-2,94	0,00	$ -	2,94	$ 2.025.660,00	2,94	$ 2.025.660,00	0,00	$ -
52,3	ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	30,00	$ 10.618,00	$ 318.540,00		-30,00	0,00	$ -	258,68	$ 2.746.664,24	258,68	$ 2.746.664,24	228,68	$ 2.428.124,24
52,4		PINTURA EN ACEITE ESMALTADA A 2 MANOS	M2	120,00	$ 23.500,00	$ 2.820.000,00		-120,00	0,00	$ -	322,34	$ 7.574.990,00	322,34	$ 7.574.990,00	202,34	$ 4.754.990,00
52,5		PINTURA EN ACEITE ESMALTADA A 2 MANOS	ML	98,00	$ 11.600,00	$ 1.136.800,00		-98,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-98,00	-$ 1.136.800,00
52,6		PINTURA PARA CUBIERTA EN ETERNIT ROJA A 3 MANOS	M2	21	$ 15.000	$ 310.200,00		-20,68	0,00	$ -	63,93	$ 958.881,00	63,93	$ 958.881,00	43,25	$ 648.681,00
					SUB TOTAL	$ 7.050.490,00			**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	**$ 13.665.599,54**	**SUB TOTAL**	**$ 13.665.599,54**	**SUB TOTAL**	**$ 6.615.109,54**
53		**SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**										**$ 127.248.000,00**					
53,1		Profundizacion pozo #2	UND	1	$ 30.450.000	$ 30.450.000,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 30.450.000,00	1,00	$ 30.450.000,00	0,00	$ -
53,2		Sistema de potabilizacion agua y sistema de Bombeo	UND	1	$ 95.000.000	$ 95.000.000,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 95.000.000,00	1,00	$ 95.000.000,00	0,00	$ -
53,3		Alquiler de Vactor para Bombeo y limpieza de pozo aguas negras	UND	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 3.200.000,00
53,4		Limpieza y desinfeccion de tanque de agua potable subterraneo en concreto con las siguientes medidas de 4 x 4 x 2,33 alto	UND	2	$ 899.000	$ 1.798.000,00		-2,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.798.000,00	2,00	$ 1.798.000,00	0,00	$ -
53,5		Suministro y Terminado texturizado en emulsion acuosa de un copolimero acrilico se debe incluir arrego de fisuras y grietas con mortero de poliuretano o cubrielastik	M2	168,62	$ 86.400	$ 14.568.768,00		-168,62	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-168,62	-$ 14.568.768,00
					SUB TOTAL	$ 145.016.768,00			**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	**$ 127.248.000,00**	**SUB TOTAL**	**$ 127.248.000,00**	**SUB TOTAL**	**-$ 17.768.768,00**
54		**MANTENIMIENTO PARQUE DE NIÑOS**										**$ -**					
54,1		HIDRO LAVADO DE MUROS , FACHADAS Y TECHOS	M2	200	$ 11.368	$ 2.273.600,00		-200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-200,00	-$ 2.273.600,00
54,2		MANTENIMIENTO DE CESPED GRAMA ARTIFICIAL	M2	118	$ 28.000	$ 3.304.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	-118,00	-$ 3.304.000,00
54,3		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	203	$ 4.848	$ 984.144,00					0,00	$ -	0,00	$ -	-203,00	-$ 984.144,00
54,4		ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	203	$ 4.420	$ 897.260,00		-203,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-203,00	-$ 897.260,00
54,5		CAMBIO DE BUJES Y ENGRACE DE JUEGOS	UND	6	$ 85.000	$ 510.000,00		-6,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-6,00	-$ 510.000,00
54,6		CAMBIO DE GRAVILLA 3/4-1"	M3	2	$ 198.000	$ 396.000,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 396.000,00
54,7		RESTAURACION PIEZAS DE PASTA (COLOR Y MANTENIMIENTO)	GLB	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000,00		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 2.800.000,00
54,8		VINILO A TRES MANOS (LINEAL)	ML	96	$ 16.227	$ 1.557.792,00		-96,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-96,00	-$ 1.557.792,00
					SUB TOTAL	$ 12.722.796,00			**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**$ -**	**SUB TOTAL**	**-$ 12.722.796,00**

55		**SENDEROS ENTRADAS PRINCIPALES**											$ -				
55,1		DEMOLICION Y EXCAVACION CAMINO EN PIEDRA PEGADA	M3	10,5	$ 1.203.400	$ 12.635.700		-10,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-10,50	-$ 12.635.700,00
55,2		EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0 M	M3	3,5	$ 47.202	$ 165.207		-3,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,50	-$ 165.207,00
55,3		CONCRETO 3000 PSI	M3	12,74	$ 451.192	$ 5.748.186		-12,74	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-12,74	-$ 5.748.186,08
55,4		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	201	$ 11.223	$ 2.255.823		-201,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-201,00	-$ 2.255.823,00
55,5		PISO EN PIEDRA PEGADA	M2	39	$ 433.000	$ 16.887.000		-39,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-39,00	-$ 16.887.000,00
55,6		FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	304,1	$ 9.975	$ 3.033.398		-304,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-304,10	-$ 3.033.397,50
55,7		TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1"	ML	320	$ 18.787	$ 6.011.840		-320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-320,00	-$ 6.011.840,00
55,8		TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 3" ESP 2,0MM	ML	86	$ 50.050	$ 4.304.300		-86,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-86,00	-$ 4.304.300,00
55,9		PLATINA HR CL 1/4´ 20 X 20	UND	84	$ 37.440	$ 3.144.960		-84,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-84,00	-$ 3.144.960,00
55,10		TORNILLO 1" X 1/4" DOBLE ARANDELA	UND	348	$ 5.200	$ 1.809.600		-348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-348,00	-$ 1.809.600,00
55,11		MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	3,15	$ 603.709	$ 1.901.683		-3,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,15	-$ 1.901.683,35
55,12		PINTURA ANTICORROSIVA GRIS TUBERIA METALICA	ML	406	$ 35.350	$ 14.352.100		-406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-406,00	-$ 14.352.100,00
55,13		REFLECTOR 250WCON CAMPANA EN ALUMINIO	UND	4	$ 1.609.818	$ 6.439.272		-4,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-4,00	-$ 6.439.272,00
55,14		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	14	$ 80.828	$ 1.131.592		-14,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-14,00	-$ 1.131.592,00
					SUB TOTAL	$ 79.820.660,93			**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	**-$ 79.820.660,93**
56		**CASA ADMINISTRADOR**										$ 37.969.528,74				
56,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	45	$ 118.000	$ 5.310.000		-45,00	0,00	$ -	33,63	$ 3.968.340,00	33,63	$ 3.968.340,00	-11,37	-$ 1.341.660,00
56,2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO ACANALADO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	6	$ 122.000	$ 732.000		-6,00	0,00	$ -	6,46	$ 787.510,00	6,46	$ 787.510,00	0,45	$ 55.510,00
56,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	18	$ 112.000	$ 2.016.000		-18,00	0,00	$ -	11,53	$ 1.291.360,00	11,53	$ 1.291.360,00	-6,47	-$ 724.640,00
56,4		GUARDA ESCOBA CERAMICA de 8 x 55 CMS	ML	37,5	$ 38.600	$ 1.447.500		-37,50	0,00	$ -	44,00	$ 1.698.400,00	44,00	$ 1.698.400,00	6,50	$ 250.900,00
56,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS PIZARRA , T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	4,8	$ 118.000	$ 566.400		-4,80	0,00	$ -	3,28	$ 387.040,00	3,28	$ 387.040,00	-1,52	-$ 179.360,00

56,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PARED EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO (baño)	M2	20	$ 128.500	$ 2.570.000		-20,00	0,00	$ -	18,05	$ 2.319.296,50	18,05	$ 2.319.296,50	-1,95	-$ 250.703,50
56,7		SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO 20X20 PARA PISO CON DISEÑO EXCLUSIVO	M2	20,2	$ 427.700	$ 8.639.540		-20,20	0,00	$ -	23,41	$ 10.010.746,20	23,41	$ 10.010.746,20	3,21	$ 1.371.206,20
56,8		ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	24	$ 105.800	$ 2.539.200		-24,00	0,00	$ -	18,70	$ 1.978.460,00	18,70	$ 1.978.460,00	-5,30	-$ 560.740,00
56,9		SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MADERA PARA BAÑOS	ML	2,4	$ 630.000	$ 1.512.000		-2,40	0,00	$ -	1,50	$ 945.000,00	1,50	$ 945.000,00	-0,90	-$ 567.000,00
56,10		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS VESSEL SEGNO BLACK (600*350*160 (mm))	UND	1	$ 2.735.300	$ 2.735.300		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.735.300,00	1,00	$ 2.735.300,00	0,00	$ -
56,11		MONOCONTROL PARA LAVAMANOS COLOR NEGRO	UND	1	$ 333.200	$ 333.200		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 333.200,00	1,00	$ 333.200,00	0,00	$ -
56,12		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER VULCANO NEGRO MATE (680X380X780 (mm)). DOBLE PULSADOR DE DESCARGA	UND	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ -
56,13		KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO SET 5 PIEZAS	UND	1	$ 580.000	$ 580.000		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 580.000,00	1,00	$ 580.000,00	0,00	$ -
56,14		EXTRACTOR DE OLORES HELICOIDAL 6" EXTRAPL DECOR200 127V PARA BAÑO	UND	1	$ 390.000	$ 390.000		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 390.000,00	1,00	$ 390.000,00	0,00	$ -
56,15		LAVAPLATOS 100 CMS X 50CMS DE SOBREPONER IZQUIERDO	UND	1	$ 370.000	$ 370.000		-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,00	-$ 370.000,00
56,16		ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIBLE DE 58.5 CMS GAS NATURAL	UND	1	$ 590.900	$ 590.900		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 590.900,00	1,00	$ 590.900,00	0,00	$ -
56,17		VENTANA EN ALUMINIO 744 TIPO NEGRA INCLUYE VIDRIO 4MM	M2	8,4	$ 485.000	$ 4.074.000		-8,40	0,00	$ -	8,40	$ 4.074.000,00	8,40	$ 4.074.000,00	0,00	$ -
56,18		DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=8MM	M2	2,8	$ 790.000	$ 2.212.000		-2,80	0,00	$ -	2,32	$ 1.832.800,00	2,32	$ 1.832.800,00	-0,48	-$ 379.200,00
56,19		RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	15,00	$ 80.828,00	$ 1.212.420,00		-15,00	0,00	$ -	15,43	$ 1.247.176,04	15,43	$ 1.247.176,04	0,43	$ 34.756,04
					SUB TOTAL	$ 40.630.460,00			**SUB TOTAL**	$ -	**SUB TOTAL**	**$ 37.969.528,74**	**SUB TOTAL**	**$ 37.969.528,74**	**SUB TOTAL**	**-$ 2.660.931,26**

CONTRACTUAL			
COSTOS DIRECTOS		$	**1.127.743.406,00**
ADMINISTRACIÓN	25%	$	281.935.852,00
IMPREVISTOS	5%	$	56.387.170,00
UTILIDAD	3%	$	33.832.302,00
TOTAL		$	**1.499.898.730,00**

CORTE 1		CORTE 2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
	$ 227.313.337,00		$ 496.226.171,00		$ 760.342.999,00		-$ 367.400.408,00
25%	$ 56.828.334,00	25%	$ 124.056.543,00	25%	$ 190.085.750,00	25%	-$ 91.850.102,00
5%	$ 11.365.667,00	5%	$ 24.811.309,00	5%	$ 38.017.150,00	5%	-$ 18.370.020,00
3%	$ 6.819.400,00	3%	$ 14.886.785,00	3%	$ 22.810.290,00	3%	-$ 11.022.012,00
TOTAL	**$ 302.326.738,00**	**TOTAL**	**$ 659.980.808,00**	**TOTAL**	**$ 1.011.256.189,00**	**TOTAL**	**-$ 488.642.542,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA
CC 80.099.370	ROMING SAS	DIRECTOR GENERAL
INTERVENTOR	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO

2.2 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:

UBICACIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR CORTE 1	VALOR CORTE 2
TOCAIMA	$ 1.499.898.730	$ 302.326.738,00	$ 659.980.808,00
PORCENTAJE EJECUTADO (%)	100%	20%	44%
TOTAL EJECUTADO (%)	100%	64%	

NOTA: SE HA EJECUTADO EL 64% DE EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PREVISTAS POR EL DOCUMENTO CONTRACTUAL.

3. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS CONTRACTUAL

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
			DESDE	HASTA			
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101222694	CUMPLIMIENTODEL CONTRATO	13/11/2024	28/04/2025	$ 99,997,566.30	ANEXO 2	VIGENTE
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/11/2024	28/12/2025	$149,996,349.45	ANEXO 2	VIGENTE
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	13/11/2024	28/12/2027	$49,998,783.15	ANEXO 2	VIGENTE
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/12/2024	2812/2029	$499,987,831.50	ANEXO 2	VIGENTE
SEGUROS DEL ESTADO	14-40-101068454	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/11/2024	28/12/2025	$ 260.000.000,00	ANEXO 0	VIGENTE

MODIFICATORIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
			DESDE	HASTA			
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101222694	CUMPLIMIENTODEL CONTRATO	13/11/2024	28/04/2025	$ 99,997,566.30	ANEXO 2	VIGENTE
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/11/2024	28/12/2025	$149,996,349.45	ANEXO 2	VIGENTE
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	13/11/2024	28/12/2027	$49,998,783.15	ANEXO 2	VIGENTE
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/12/2024	2812/2029	$499,987,831.50	ANEXO 2	VIGENTE
SEGUROS DEL ESTADO	14-40-101068454	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/11/2024	28/12/2025	$ 260.000.000,00	ANEXO 0	VIGENTE

3.1. ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.499.898.730
ADICION	N/A
VALOR ACTA 1	$ 302.326.738,00
VALOR ACTA 2	$ 659.980.808,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.011.256.189,00
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 488.642.542,00

4. HERRAMIENTA UTILIZADA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía Nº 1: HERRAMIENTA DE MANO Y EPP, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 2: HERRAMIENTA DE MANO Y UN BOGUE, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº3 : VALDES DE PLASTICO, FUENTE: PROPIA.



Fotografía Nº 4: CARRETILLAS Y BOGUES, FUENTE: PROPIA.

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La obra se encuentra en estado de avance del 30%, en lo referente al alcance de este contrato.

El plazo de ejecución del contrato se encuentra en avance

El contrato se ha ejecutado a CORTE 1 de manera eficiente por parte del contratista, cumpliendo con las especificaciones técnicas, siguiendo las indicaciones del supervisor, realizando actividades como:

- Mantenimiento correctivo, corrección de anomalías y atención de averías.

- Mantenimiento al sistema eléctrico, que incluye iluminación, salidas eléctricas, tablero de protección y distribución y redes eléctricas internas.

- Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias que comprenden redes de agua potable, redes sanitarias, sanitarios, lavamanos.

- Se han entregado en buen estado de aseo el área intervenida una vez se ha realizado el trabajo.

- En mantenimientos preventivos se han realizado las actividades que se realizan en el inmueble o equipos, que le permiten mantener su funcionalidad y garantizar las condiciones para las cuales fue construido; generando condiciones seguras.

- En mantenimientos correctivos se realizan actividades en los inmuebles

- La empresa ROMING SAS, cuenta con el personal necesario para garantizar la intervención de los bienes inmuebles del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca en horarios acordados con las administraciones cuando haya lugar, con la finalidad de no afectar el funcionamiento de espacios.

ANEXOS

- CORTE 1
- ACTA MAYORES Y MENORES CORTE 1
- MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1
- INFORME SST
- BITÁCORA
- FACTURA COBRO CORTE 1
- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
- RUT
- DOCUMENTOS REVISORA FISCA
- POLIZAS

Cordialmente;

DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS
CC 1.010.184.700 de Bogotá
Representante legal ROMING S.A.S


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
FECHA	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
1.3	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	**GENERAL**

PLANO

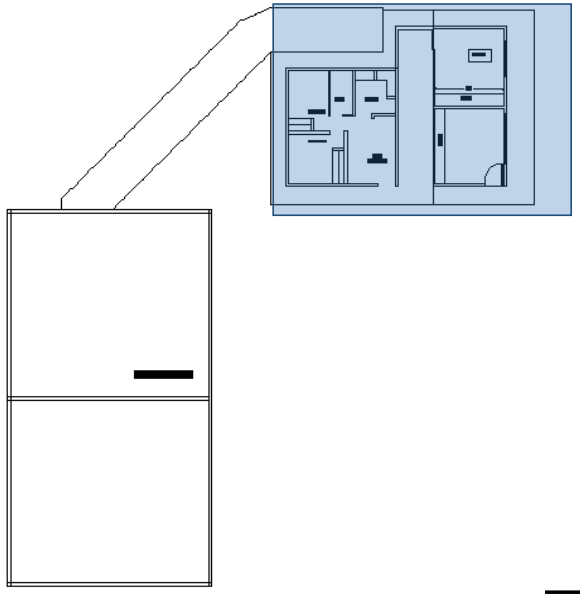

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Área perimetral del proyecto				30,00	30,00
Subtotal				**UND**	30,00
Vienen					
TOTAL					**30,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**									**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
1.3	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	**GENERAL**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
1.4	ASEO GENERAL PERMANENTE EN OBRAS	M2	**GENERAL**

PLANO

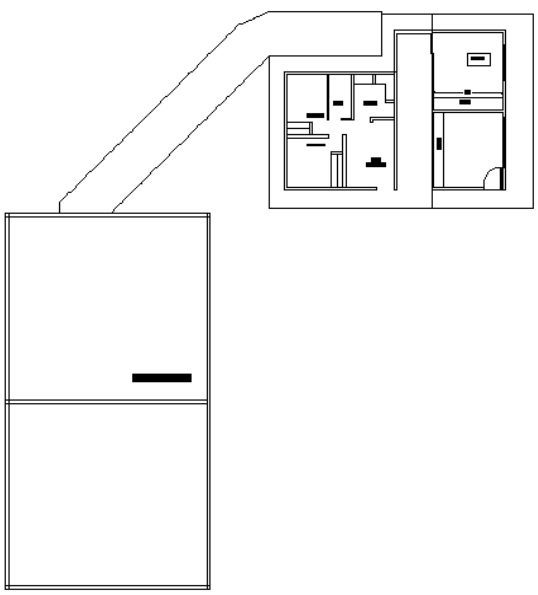

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
		22,00	**12**	1,00	264,00
CASETA		5,00	4,00	1,00	20,00
ADMINISTRADORES		6,00	9,90	1,00	59,40
COMPOSTAJE		9,50	8,50	1,00	80,75
BQQ		8,00	6,00	1,00	48,00
COCINA		5,00	8,00	1,00	40,00
			Subtotal	**M2**	512,15
			Vienen		
			TOTAL		**512,15**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
1.4	ASEO GENERAL PERMANENTE EN OBRAS	M2	**GENERAL**

Registro Fotografico












DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
2.3	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	**PARQUEADERO**

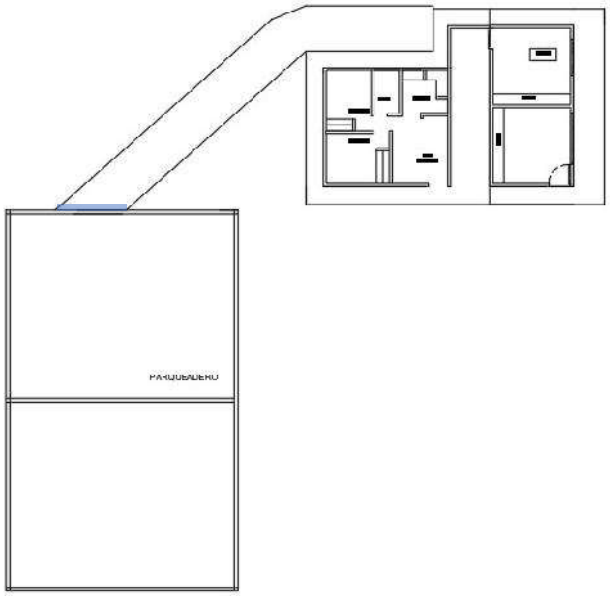PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Demolicion bordillo acceso rampa**			3,00		3,00
	Subtotal				**ML**	3,00
	Vienen					
	TOTAL					**3,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
2.3	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	**PARQUEADERO**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
3.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	**PARQUEADERO**

PLANO

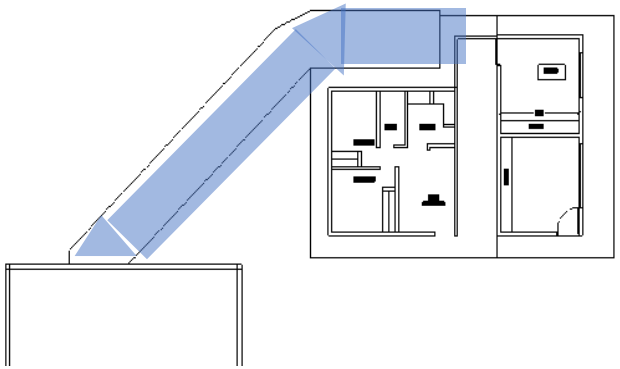

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Rampa acceso compostaje	0,10	2,50	22,30		5,58
Subtotal				**M3**	5,58
Vienen					
TOTAL					**5,58**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
3.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	**PARQUEADERO**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	**PARQUEADERO**

PLANO

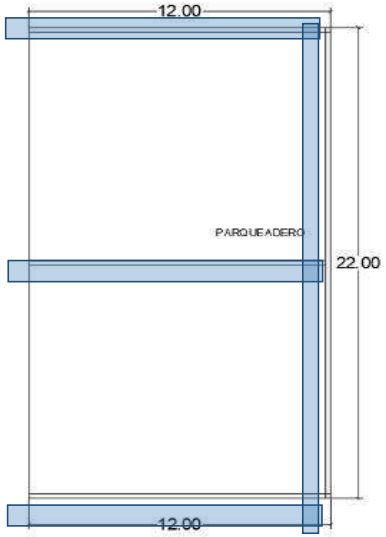

Localización	PESO	LARGO	N°VARILLAS	**No Elem.**	**Medida Total**
VIGA	**1**	**12**	**4**	3,00	144,00
VIGA	**1**	**22**	**4**	2,00	176,00
VIGAS	**0,56**	**1,1**	**1**	526,67	324,43
DADOS	1,00	0,85	10,00	9,00	76,50
DADOS	1,00	1,20	4,00	9,00	43,20
TRASLAPOS	1,00	0,50	8,00	3,00	12,00
TRASLAPOS	1,00	0,50	14,67	2,00	14,67
Subtotal				**KG**	790,79
Vienen					
TOTAL					**790,79**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	**PARQUEADERO**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
4.2	CONCRETO CLASE C =4000PSI (PLACAS)	M3	**PARQUEADERO**

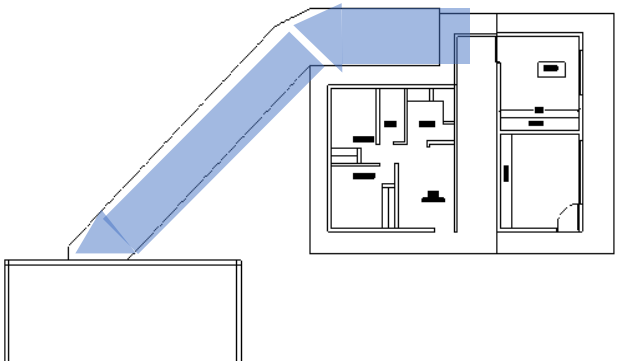PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Rampa acceso compostaje**	0,10	2,50	22,30		5,58
					Subtotal	**M3** 5,58
					Vienen	
					TOTAL	**5,58**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
4.2	CONCRETO CLASE C =4000PSI (PLACAS)	M3	**PARQUEADERO**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
5.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

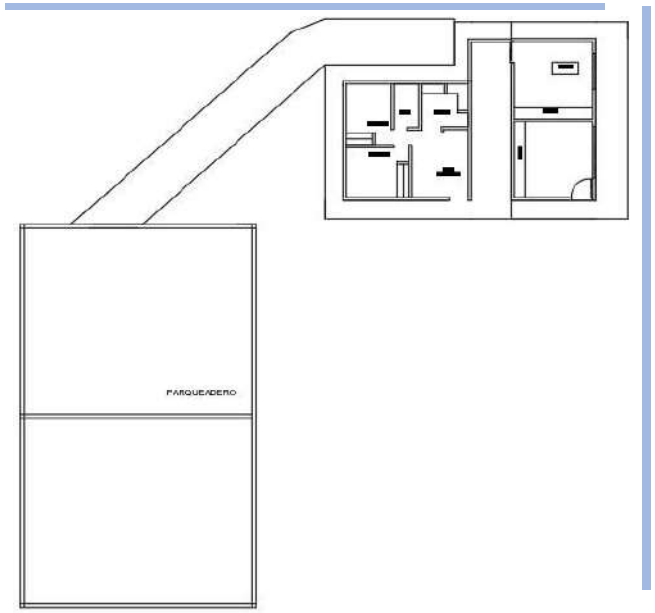

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cerca tela verde			73,00		73,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**									**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
5.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
5.2	HODROLAVADO DE MUROS, FACHADAS Y TECHOS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

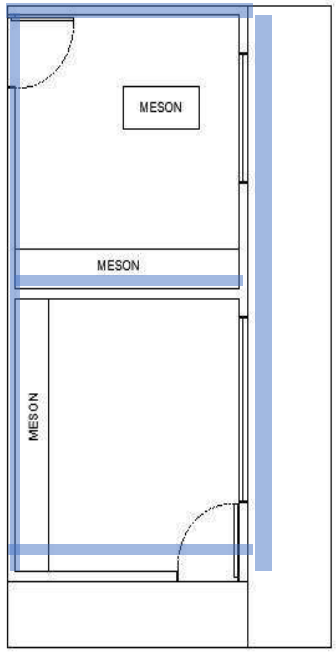

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Fachada lateral derecha		2,95	8,88		26,20
Fachada lateral derecha por dentro		2,95	8,73		25,75
Fachada lateral izquierda		2,95	8,88		26,20
Fachada lateral izquierda por dentro		2,95	8,73		25,75
Fachada trasera		2,95	4,33		12,77
Fachada trasera por dentro		2,95	4,03		11,89
Fachada Frontal		2,95	4,33		12,77
Fachada Frontal por dentro		2,95	4,03		11,89
Muro divisorio		3,30	4,03	2,00	26,60
Hueco ventana cuarto atrás	1,50	2,00		2,00	-6,00
Hueco ventana cuarto frente	1,00	2,82		2,00	-5,64
Hueco puerta abatible	2,07	1,06		2,00	-4,39
Hueco puerta corrediza	2,45	1,20		2,00	-5,88
Subtotal				**M2**	157,91
Vienen					
TOTAL					**157,91**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**									**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
5.2	HODROLAVADO DE MUROS, FACHADAS Y TECHOS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.1	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

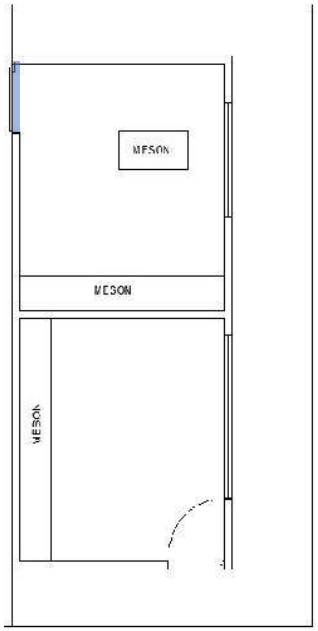PLANO	**Localización**				**No Elem.**	**Medida Total**
		ALTO	ANCHO			
	**Domolicion espacio puerta**	2,5	1,5			3,75
	Subtotal				**M2**	3,75
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**3,75**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	**1**	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.1	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.2	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

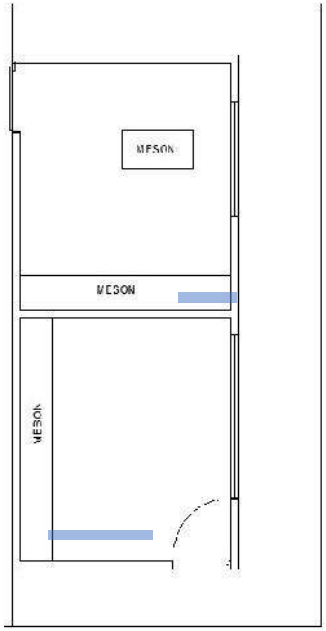

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana fachada	1,05	2,35			2,47
Puerta sellada	2,15	1,15			2,47
Subtotal				**M2**	4,94
Vienen					
TOTAL					**4,94**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.2	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.3	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

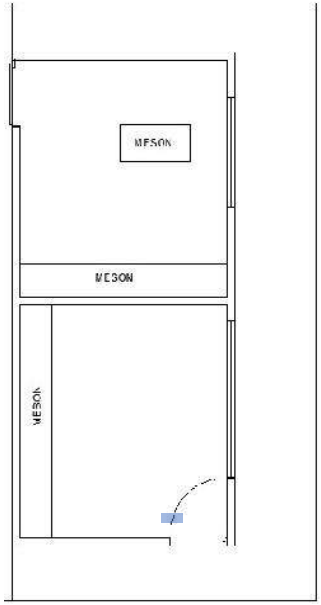

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta fachada			2,15		2,15

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.3	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.4	PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

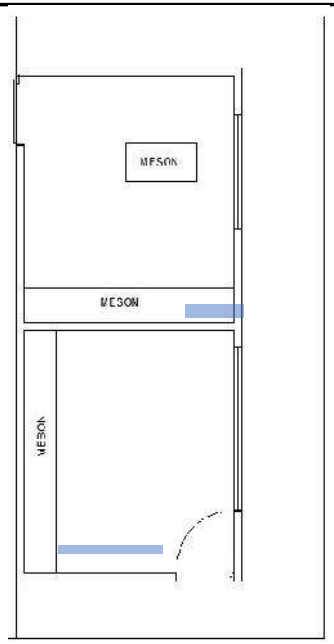

Localización	ALTO	ANCHO		**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana cubierta fachada principal	1,05	2,35		2,00	4,94
Puerta sellada	2,15	1,15		2,00	4,95
Subtotal				**M2**	9,89
Vienen					
TOTAL					**9,89**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.4	PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.5	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

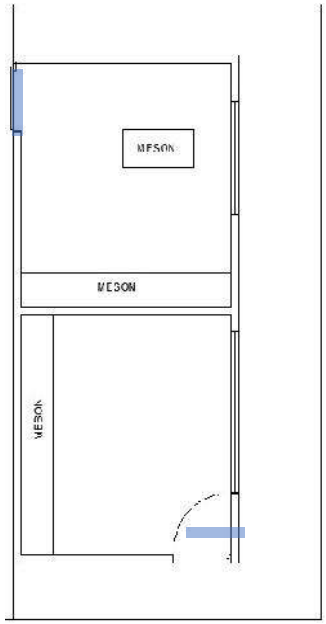

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta abatible	2,15			2,00	4,30
		1,12			1,12
Puerta corrediza	2,45			2,00	4,90
		1,20			1,20
meson cuarto herramientas	1,14			4,00	4,56
			4,16	4,00	16,64
meson cuarto sabanas	2,12			4,00	8,48
	0,47			4,00	1,88
			4,00	8,00	32,00
meson de planchado	0,90			8,00	7,20
			0,90	2,00	1,80
Subtotal				**ML**	84,08
Vienen					
TOTAL					**84,08**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
6.5	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.1	ESTUCO	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

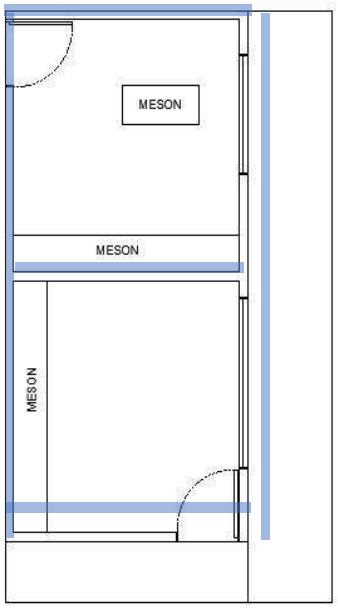

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Fachada lateral derecha		2,95	8,88		26,20
Fachada lateral derecha por dentro		2,95	8,73		25,75
Fachada lateral izquierda		2,95	8,88		26,20
Fachada lateral izquierda por dentro		2,95	8,73		25,75
Fachada trasera		2,95	4,33		12,77
Fachada trasera por dentro		2,95	4,03		11,89
Fachada Frontal		2,95	4,33		12,77
Fachada Frontal por dentro		2,95	4,03		11,89
Muro divisorio		3,30	4,03	2,00	26,60
Hueco ventana cuarto atrás	1,50	2,00		2,00	-6,00
Hueco ventana cuarto frente	1,00	2,82		2,00	-5,64
Hueco puerta abatible	2,07	1,06		2,00	-4,39
Hueco puerta corrediza	2,45	1,20		2,00	-5,88
Subtotal				**M2**	157,91
Vienen					
TOTAL					**157,91**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.1	ESTUCO	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.2	ESTUCO LINEAL	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

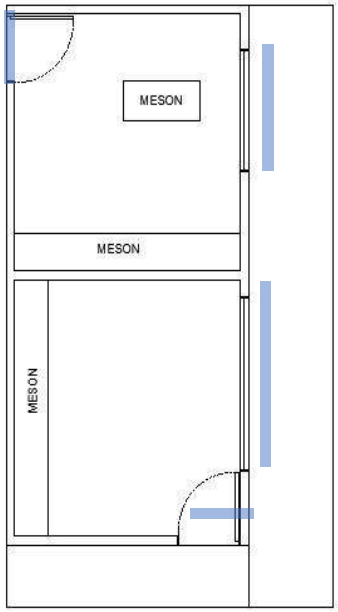

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana 1	2,82			2,00	5,64
		1,10		2,00	2,20
Ventana 2	2,00			2,00	4,00
		1,50		2,00	3,00
Puerta corrediza	2,45			2,00	4,90
		1,20			1,20
Puerta abatible	2,15			2,00	4,30
		1,15			1,15
				Subtotal	**ML** 26,39
				Vienen	
				TOTAL	**26,39**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.2	ESTUCO LINEAL	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

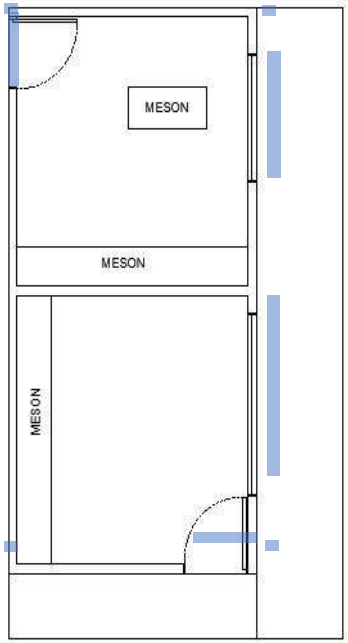

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana 1	2,82			4,00	11,28
		1,10		4,00	4,40
Ventana 2	2,00			4,00	8,00
		1,50		4,00	6,00
Puerta corrediza	2,45			4,00	9,80
		1,20		2,00	2,40
Puerta abatible	2,15			4,00	8,60
		1,15		2,00	2,30
Equinas fachadas	2,60			4,00	10,40
Subtotal				**ML**	63,18
Vienen					
TOTAL					**63,18**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**									**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.5	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

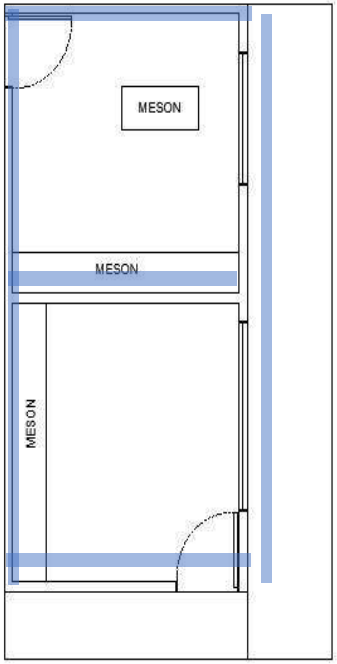

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Fachada lateral derecha		2,95	8,88	2,00	52,39
Fachada lateral derecha por dentro		2,95	8,73		25,75
Fachada lateral izquierda		2,95	8,88	2,00	52,39
Fachada lateral izquierda por dentro		2,95	8,73		25,75
Fachada trasera		2,95	4,33	2,00	25,55
Fachada trasera por dentro		2,95	4,03		11,89
Fachada Frontal		2,95	4,33	2,00	25,55
Fachada Frontal por dentro		2,95	4,03		11,89
Muro divisorio		3,30	4,03	2,00	26,60
Hueco ventana cuarto atrás	1,50	2,00		2,00	-6,00
Hueco ventana cuarto frente	1,00	2,82		2,00	-5,64
Hueco puerta abatible	2,07	1,06		2,00	-4,39
Hueco puerta corrediza	2,45	1,20		2,00	-5,88
Subtotal				**M2**	235,85
Vienen					
TOTAL					**235,85**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.5	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.6	PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

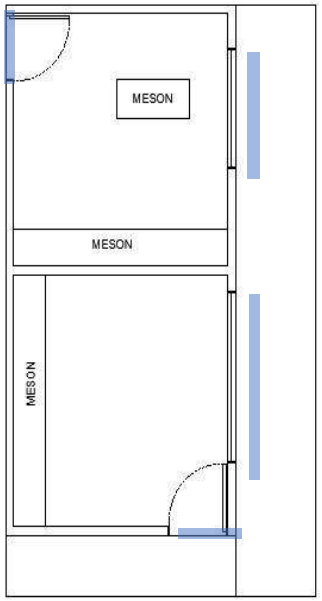

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana 1	2,82			2,00	5,64
		1,10		2,00	2,20
Ventana 2	2,00			2,00	4,00
		1,50		2,00	3,00
Puerta corrediza	2,45			2,00	4,90
		1,20			1,20
Puerta abatible	2,15			2,00	4,30
		1,15			1,15
meson cuarto herramientas	1,14			4,00	4,56
			4,16	4,00	16,64
meson cuarto sabanas	2,12			4,00	8,48
	0,47			4,00	1,88
			4,00	8,00	32,00
meson de planchado	0,90			8,00	7,20
			0,90	2,00	1,80
Subtotal				**ML**	98,95
Vienen					
TOTAL					**98,95**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7.6	PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

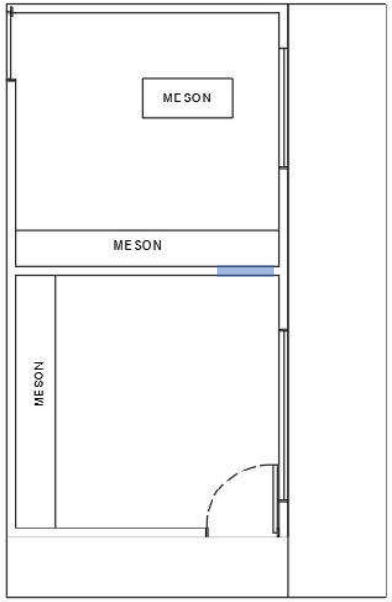

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta compostaje				2,00	2,00
Subtotal				**UND**	2,00
Vienen					
TOTAL					**2,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.2	DESMONTE DE VENTANAS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

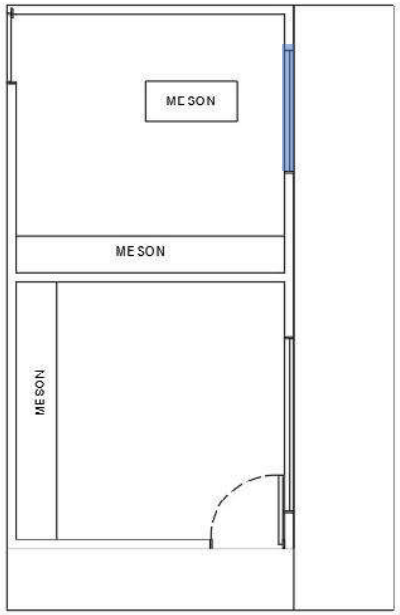

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana	1,7	2,2		1,00	3,74
Subtotal				**M2**	3,74
Vienen					
TOTAL					**3,74**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.2	DESMONTE DE VENTANAS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.3	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO (1,8*2,1)INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

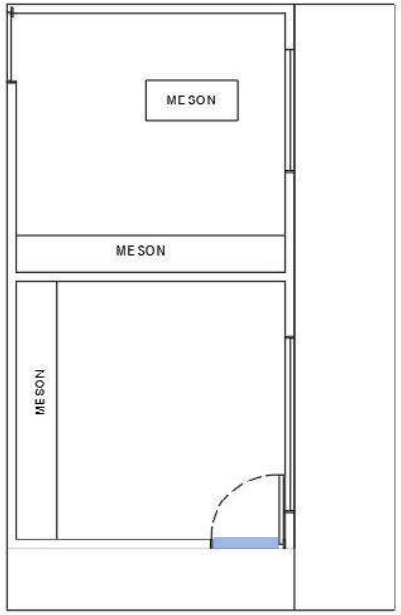

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta Fachada principal		1,15	2,15	1,00	2,47
Subtotal				**M2**	2,47
Vienen					
TOTAL					**2,47**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.3	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO (1,8*2,1)INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED CAL18 , INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

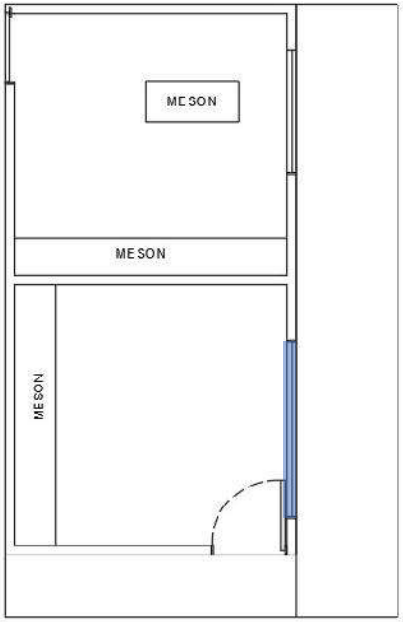

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana corrediza	1,00		2,85		2,85
Subtotal				**M2**	2,85
Vienen					
TOTAL					**2,85**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED CAL18 , INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico

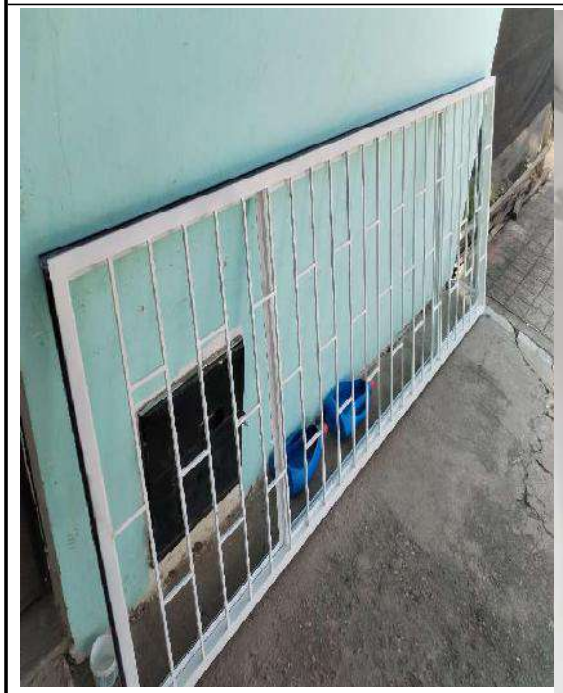





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO ROMBO CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROTATICA	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

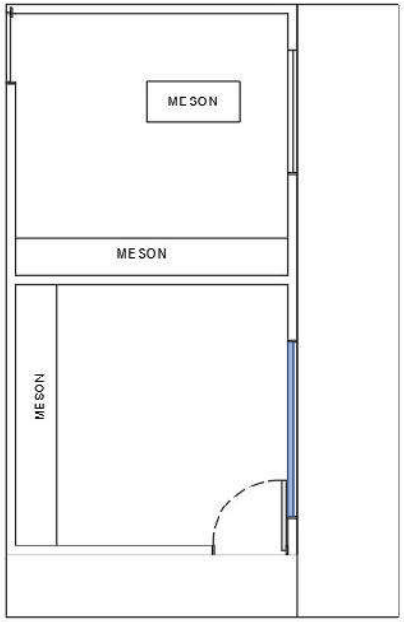

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana Compostaje	1,00		2,85		2,85
Subtotal				**M2**	2,85
Vienen					
TOTAL					**2,85**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO ROMBO CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROTATICA	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.7	MESONES EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) DOBLE MESON CON ACABADO EN GRANITO ANCHO PLACA SUPERIOR 0.26 Y PLACA INFERIOR 0.55M (INCLUYE MEDIA CAÑA Y FALDON O NARIZ, ENTREPAÑO EN CONCRETO, E: 5 CMS, ACABADO EN GRANITO PULIDO) MUROS LATERALES (O.55 X 0.78 X O.10) Y MURO FRONTAL (0.98M X 1.00M X 0.10M) REPELLADOS , ESTUCADOS Y PINTADOS POR TODAS LAS CARAS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

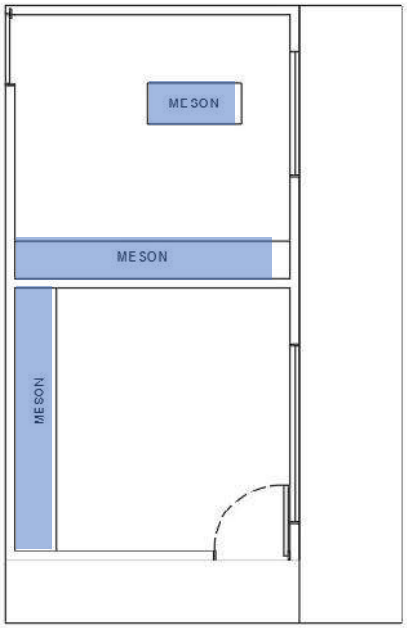

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Meson Cuarto 1	1,20	4,16			4,99
Meson cuarto 2	2,20	4,02			8,84
Meson tipo isla Cuarto 2	1,27	1,65			2,10
				Subtotal	**M2** 15,93
				Vienen	
				TOTAL	**15,93**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
8.7	MESONES EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) DOBLE MESON CON ACABADO EN GRANITO ANCHO PLACA SUPERIOR 0.26 Y PLACA INFERIOR 0.55M (INCLUYE MEDIA CAÑA Y FALDON O NARIZ, ENTREPAÑO EN CONCRETO, E: 5 CMS, ACABADO EN GRANITO PULIDO) MUROS LATERALES (O.55 X 0.78 X O.10) Y MURO FRONTAL (0.98M X 1.00M X 0.10M) REPELLADOS , ESTUCADOS Y PINTADOS POR TODAS LAS CARAS	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.1	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

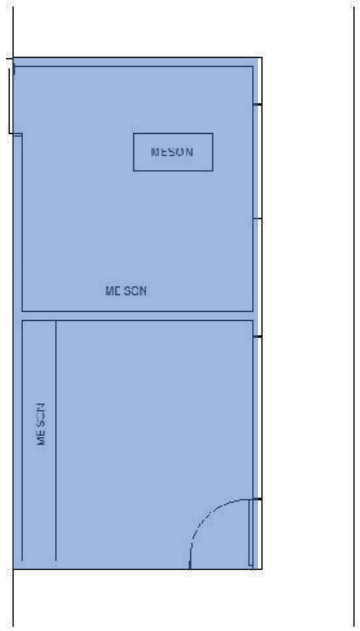

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Apertura regata			30,00		30,00
				Subtotal	**ML** 30,00
				Vienen	
				TOTAL	**30,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**									**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1							

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.1	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.2	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

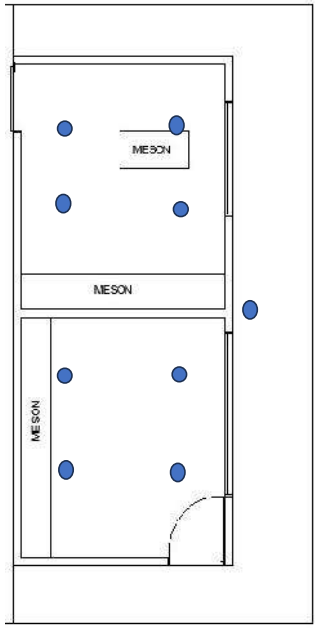

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Salidas lamparas				9,00	9,00
Subtotal				**UND**	9,00
Vienen					
TOTAL					**9,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.2	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.3	LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

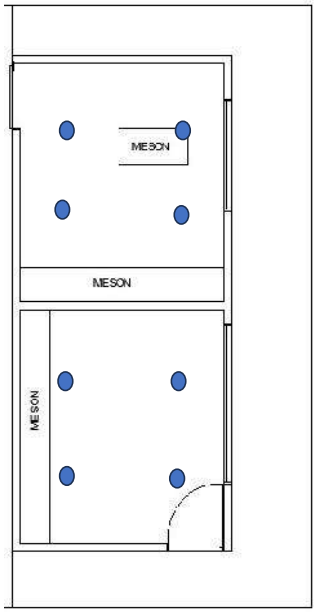

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Lampara led				8,00	8,00
Subtotal				**UND**	8,00
Vienen					
TOTAL					**8,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.3	LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico











DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

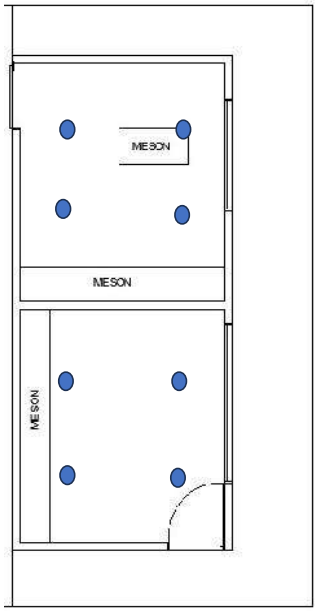

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
En cada punto de iluminacion			1,50	9,00	13,50
Subtotal				**ML**	13,50
Vienen					
TOTAL					**13,50**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA


F O R M A T O	FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024	H O J A	1	DE	2

F E C H A	D	23	M	12	A	20	24	CORTE Nº	2	ODT	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	Descrpcion	Unidad	Ubicación
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

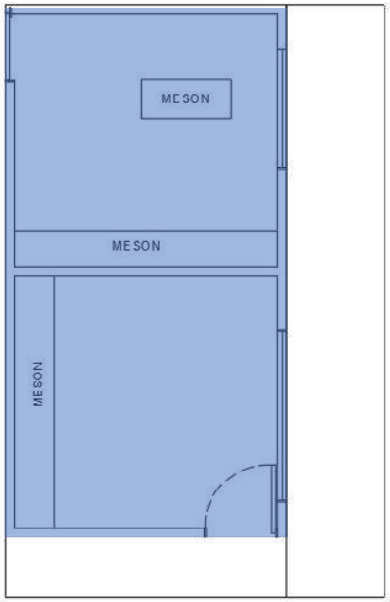

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	No Elem.	Medida Total
Cable trenzado			235,00		235,00
Subtotal				**ML**	235,00
Vienen					
TOTAL					**235,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico

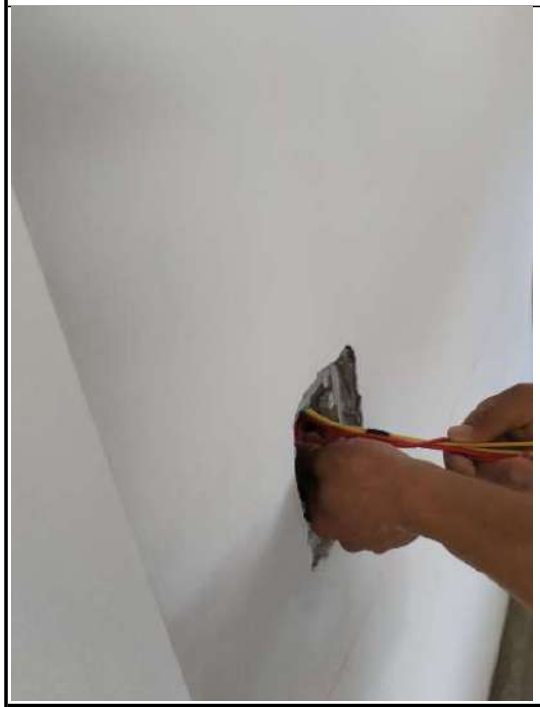



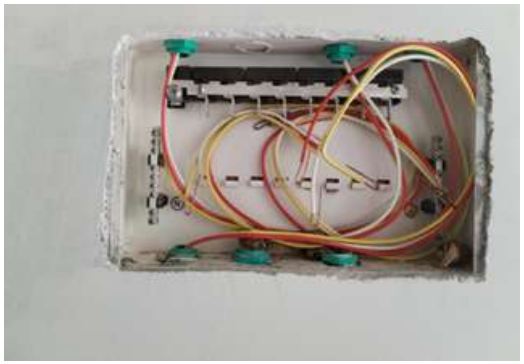



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE RECORRIDO DE CUBIERTA AJUSTE , LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y SUMINISTRO DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

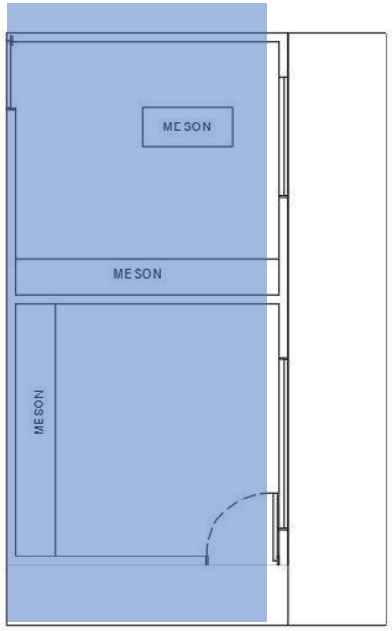

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cubierta compostaje sin ampliacion		4,33	10,78		46,68
Subtotal				**M2**	46,68
Vienen					
TOTAL					**46,68**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		


I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE RECORRIDO DE CUBIERTA AJUSTE , LIMPIEZA, SELLAMIENTO Y SUMINISTRO DE SECCIONES QUE FALTEN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







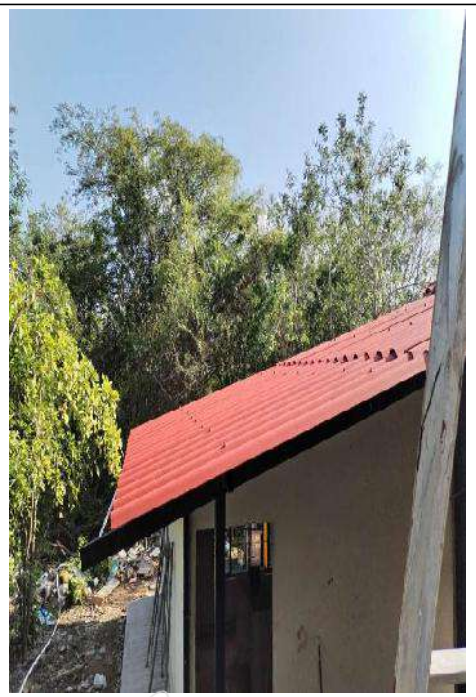

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA COLONIAL ROJO 1.97 X 0.72 X 2.3MM, INCLUYE GANCHOS	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

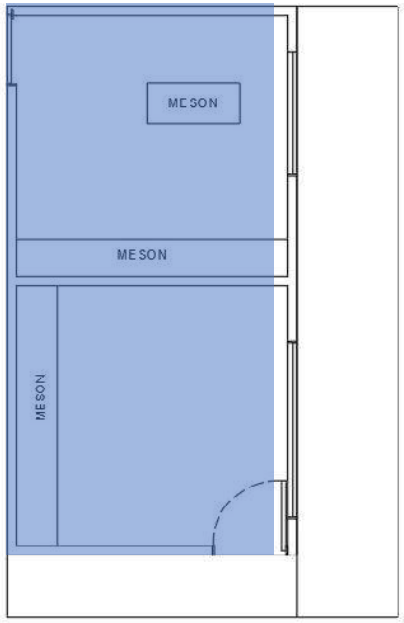

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Tejas que se cambiaron en estructura existente				4,00	4,00
Subtotal				**UND**	4,00
Vienen					
TOTAL					**4,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA COLONIAL ROJO 1.97 X 0.72 X 2.3MM, INCLUYE GANCHOS	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.3	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

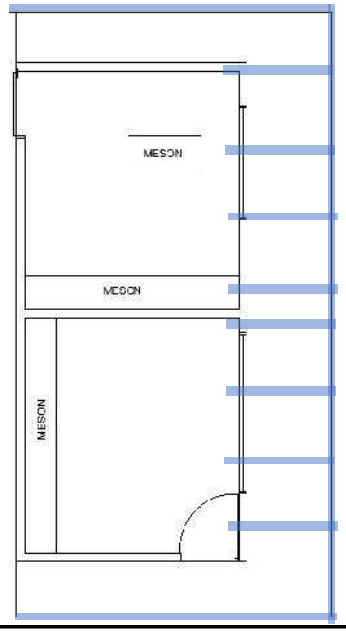

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Amaplicacion compostaje		1,60	10,78		17,25
Volado cubierta		1,00	5,93	2,00	11,86
				Subtotal	**M2** 29,11
				Vienen	
				TOTAL	**29,11**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.3	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.4	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

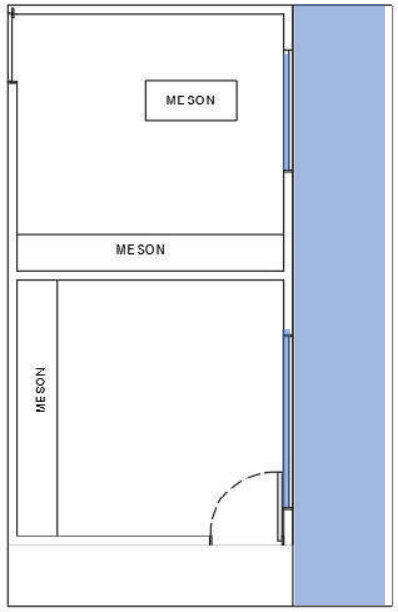

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Perfiles caida cubierta	3,1			8,00	24,80
Perfil punta cubierta	3,3			4,00	13,20
Perfiles 7.5 x4 transversales			1,8	32,00	57,60
Prefiles 7,5 x4 logitudinales			10,78	4,00	43,12
Marco ventana cuarto trasero	1,50			4,00	6,00
			2,00	3,00	6,00
Rejas cuarto trasero	1,50			18,00	27,00
			2,00	9,00	18,00
Marco ventana cuarto frente	1,00			4,00	4,00
			2,82	2,00	5,64
Rejas cuarto frente	1,00			23,00	23,00
			2,82	3,00	8,46
Subtotal				**ML**	236,82
Vienen					
TOTAL					**236,82**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.4	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

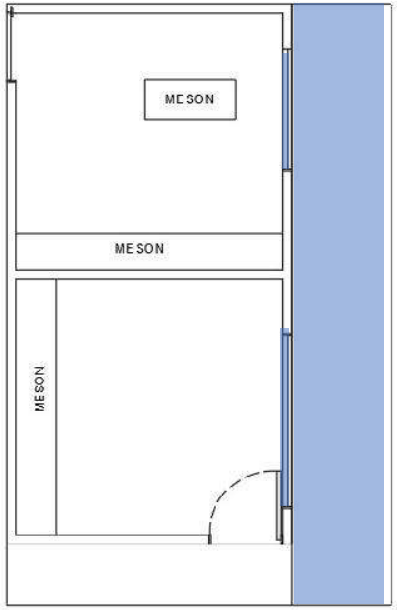

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Perfiles caida cubierta	3,1			8,00	24,80
Perfil punta cubierta	3,3			4,00	13,20
Perfiles 7.5 x4 transversales			1,8	32,00	57,60
Prefiles 7,5 x4 logitudinales			10,78	4,00	43,12
Marco ventana cuarto trasero	1,50			4,00	6,00
			2,00	3,00	6,00
Rejas cuarto trasero	1,50			18,00	27,00
			2,00	9,00	18,00
Marco ventana cuarto frente	1,00			4,00	4,00
			2,82	2,00	5,64
Rejas cuarto frente	1,00			23,00	23,00
			2,82	3,00	8,46
Subtotal				**ML**	236,82
Vienen					
TOTAL					**236,82**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.6	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

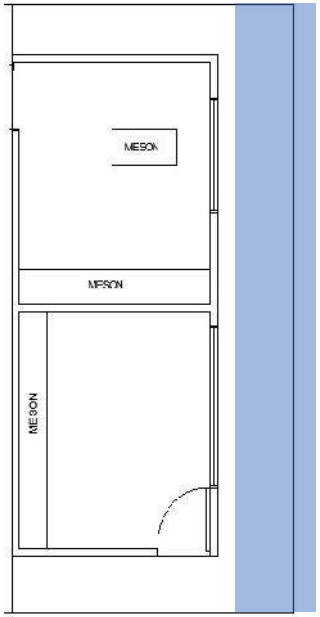

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Amaplicacion compostaje		1,6	10,78		17,25
Subtotal				**M2**	17,25
Vienen					
TOTAL					**17,25**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O						**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**						**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.6	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

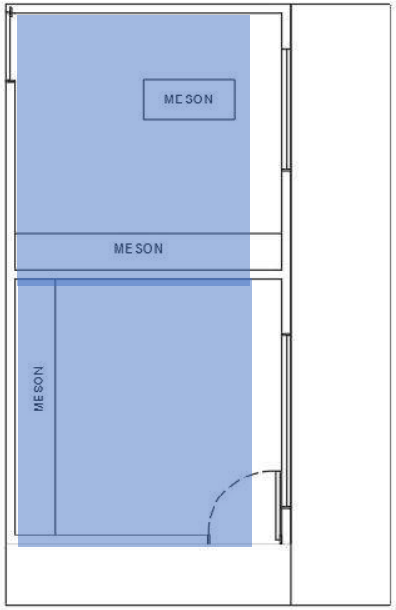

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cuarto atrás		4,33	4,50		19,49
Cuarto frente		4,33	4,50		19,49
				Subtotal	**M2** 38,97
				Vienen	
				TOTAL	**38,97**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





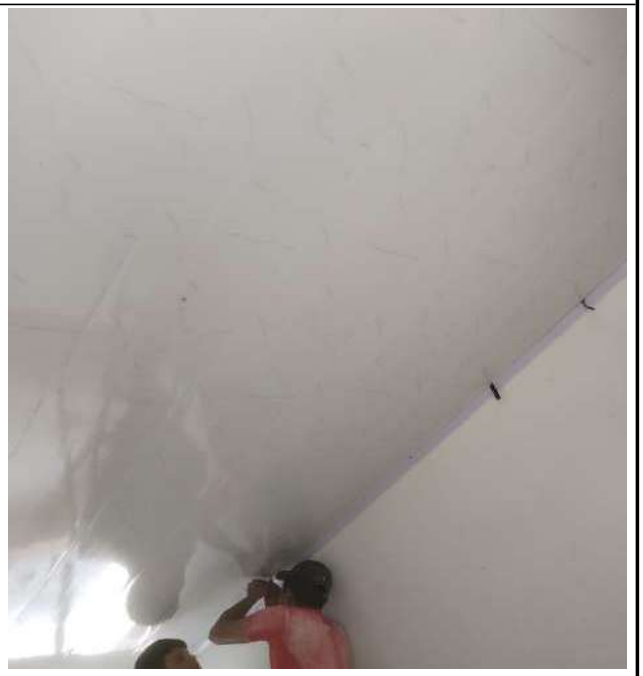

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.8	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

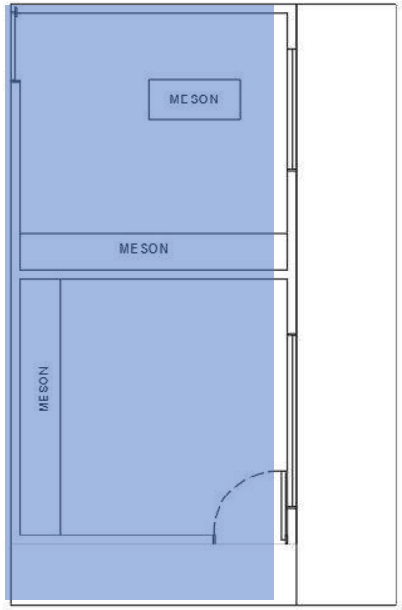

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**Dias**	**Medida Total**
Andamios				30,00	30,00
Subtotal				**UND**	30,00
Vienen					
TOTAL					**30,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
10.8	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	**CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

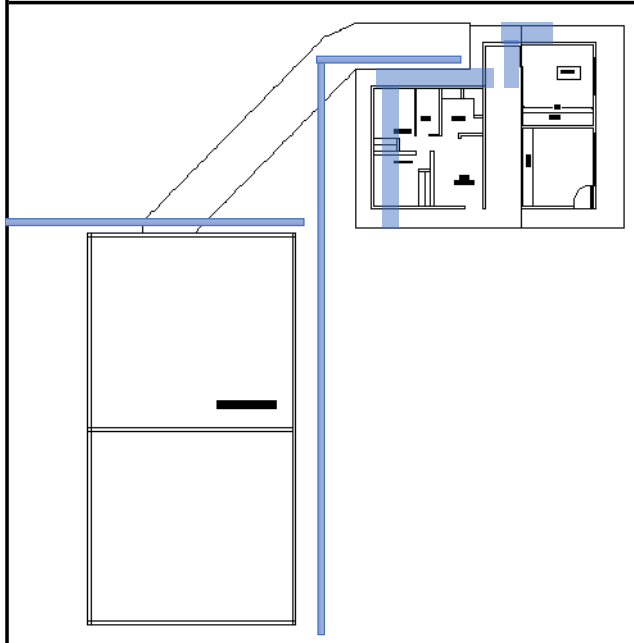

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Excavacion anden alcobas	0,15	0,90	8,34		1,13
Excavacion anden trasero	0,15	0,88	6,57		0,87
Excavacion anden esquina	0,15	2,90	3,24		1,41
Excavacion red de suministro de agua	0,20	0,20	51,78		2,07
Excavacion base tanques	1,20	1,20	0,15	2,00	0,43
Subtotal				**M3**	5,91
Vienen					
TOTAL					**5,91**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.7	CONCRETO 3000 PSI	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

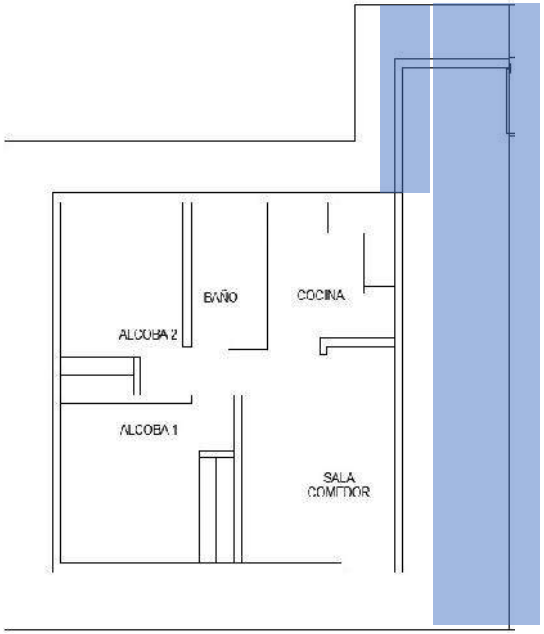

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Pasillo compostaje	0,15	2,00	10,78		3,23
Ramapa acceso cuarto puerta corrediza	0,15	0,54	1,12	0,50	0,05
Anden esquina	0,15	0,90	2,34		0,32
Recubrimiento perfiles 10x10	0,50	0,25	0,25	3,00	0,09
	0,50	0,10	0,10	-3,00	-0,02
Recubrimiento perfiles 7x7	0,30	0,22	0,22	2,00	0,03
	0,30	0,07	0,07	-2,00	0,00
Recubrimiento perfiles 5x5	0,30	0,22	0,22	2,00	0,03
	0,30	0,05	0,05	-2,00	0,00
Placa tanques de recoleccion	1,20	1,20	0,30	2,00	0,86
Subtotal				**M3**	4,59
Vienen					
TOTAL					**4,59**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.7	CONCRETO 3000 PSI	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico













DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.9	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

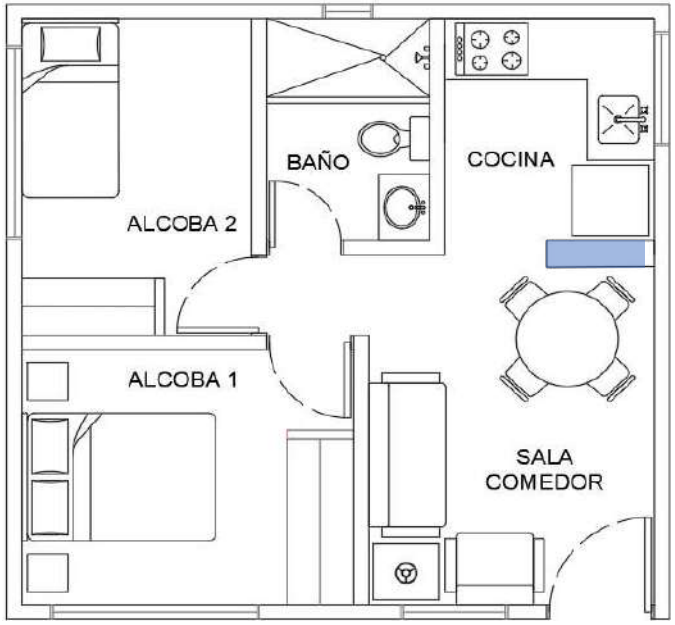

Localización	ALTO	ANCHO	HUECOS	**No Elem.**	**Medida Total**
Muro divicion cocina	1,20	1,55			1,86
Subtotal				**M2**	1,86
Vienen					
TOTAL					**1,86**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.9	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

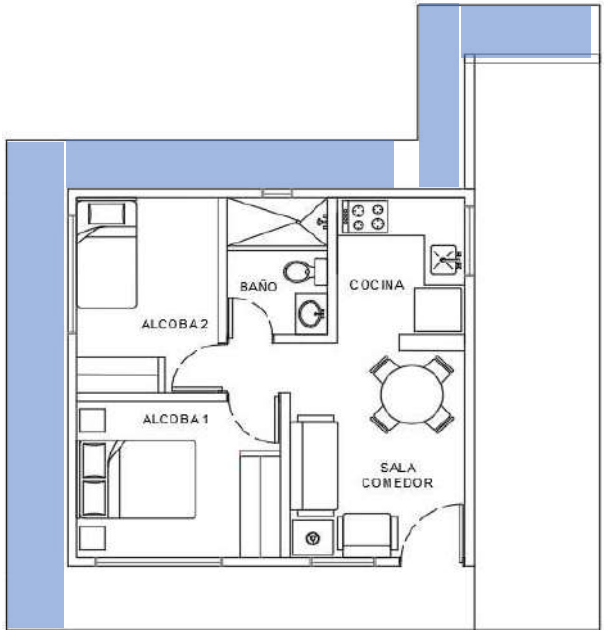

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Anden alcobas	0,15	0,90	8,34		1,13
Anden trasero	0,15	0,88	5,67		0,75
Anden esquina	0,15	2,90	3,24		1,41
Subtotal				**M3**	3,29
Vienen					
TOTAL					**3,29**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.12	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

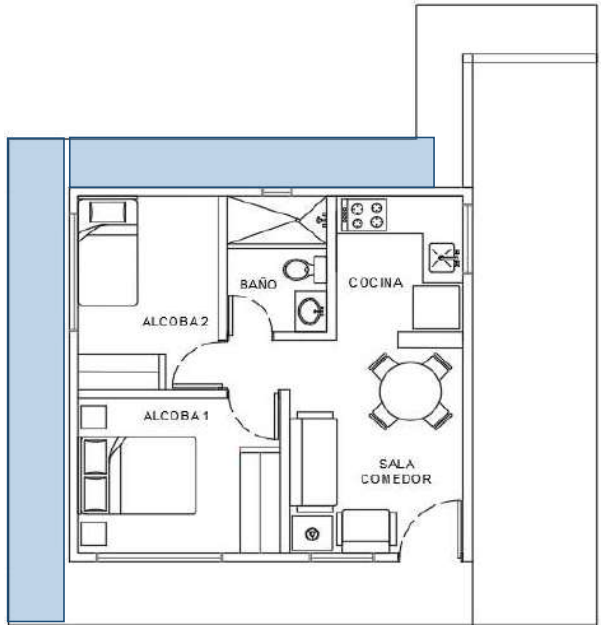

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Anden lateral		0,90	8,34		7,51
Anden trasero		0,80	6,57		5,26
Rampa anden pasillo		0,50	2,60		1,30
Rampa anden compostaje		0,50	1,60		0,80
Subtotal				**M2**	14,87
Vienen					
TOTAL					**14,87**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
14.12	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O						**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**						**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.1	PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

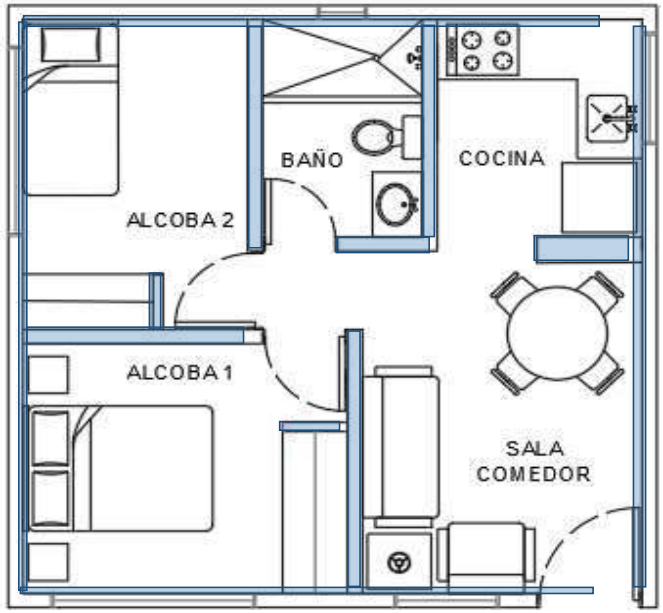

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Alcoba 1 Pared Ventana	2,70		3,25		8,78
Ventana alcoba 1	1,37		1,54	-1,00	-2,11
Alcoba 1 pared respado cama	2,70		2,74		7,40
Alcoba 1 pared al 2	2,70		3,25	2,00	17,55
Muro closet alcoba 1	2,20		0,50	2,00	2,20
Alcoba 1 pared sala	2,70		2,89	2,00	15,61
Alcoba 2 Pared Ventana	2,70		3,35		9,05
Ventana alcoba 2	1,40		2,04	-1,00	-2,86
Alcoba 2 pared respado cama	2,70		2,30		6,21
Muro closet alcoba 2	2,20		0,50	2,00	2,20
Alcoba 2 pared baño	2,70		2,55	2,00	13,77
Baño pared ventana	2,70		1,29		3,48
Baño pared pasillo	2,70		1,29	2,00	6,97
Puerta baño	2,20		0,70	-2,00	-3,08
Baño pared cocina	2,70		2,53	2,00	13,66
Cocina pared trasera	2,70		2,40		6,48
Cocina pared ventana	2,70		2,35		6,35
Ventana cocina	0,60		1,50	-1,00	-0,90
Muro divicion cocina	1,12		1,40	2,00	3,14
Sala comedor pared pasillo comp	2,70		3,89		10,50
Sala comedor pared ventana	2,70		1,87		5,05
Ventana sala comedor	1,36		0,78	-1,00	-1,06
Subtotal				**M2**	128,39
Vienen					
TOTAL					**128,39**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES GUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.1	PAÑETE LISO EN MUROS 1:4 E=1.5 CMS	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

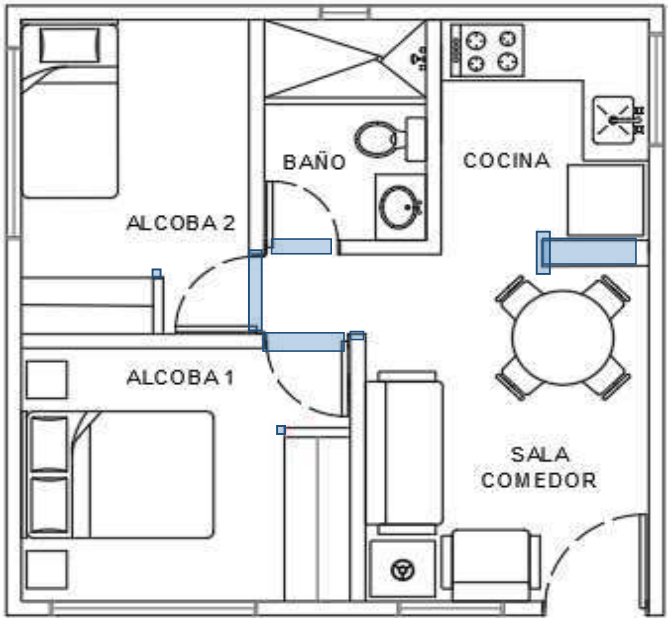

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta alcoba 1	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Puerta alcoba 2	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Puerta baño	2,20			2,00	4,40
			0,70		0,70
Muro division cocina	1,20				1,20
			1,55		1,55
Muro division alcoba sala	2,70				2,70
Closet Alcobas 1			2,20		2,20
Closet Alcobas 2			2,20		2,20
esquinero cuarto administradores	2,80			1,00	2,80
esquinero baño	2,80			1,00	2,80
Subtotal				**ML**	30,95
Vienen					
TOTAL					**30,95**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	**1**				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

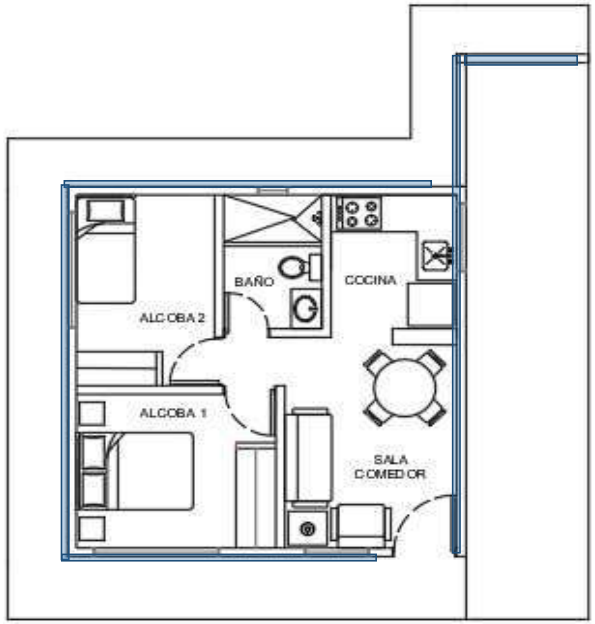

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Fachada frente	3,10		6,57		20,37
Ventana alcoba 1	1,37	1,54			-2,11
Ventana salacomedor	1,36	0,78			-1,06
Puerta principal	2,36	1,00			-2,36
Fachada trasera	3,10		6,57		20,37
Ventana baño	0,30	0,77			-0,23
Fachada pasillo compostaje	3,70		6,54		24,20
Ventana cocina	0,60	1,50			-0,90
Fachada parqueadero	3,70		6,54		24,20
Ventana alcoba 2	1,40	2,04			-2,86
Muros anden esquina casa admi	0,45		4,42		1,99
	0,20		4,42		0,88
Recubrimiento perfiles 10x10	0,50	0,25		12,00	1,50
Recubrimiento perfiles 7x7	0,30	0,22		8,00	0,53
Recubrimiento perfiles 5x5	0,30	0,22		8,00	0,53
Subtotal				**M2**	85,05
Vienen					
TOTAL					**85,05**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	**1**

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

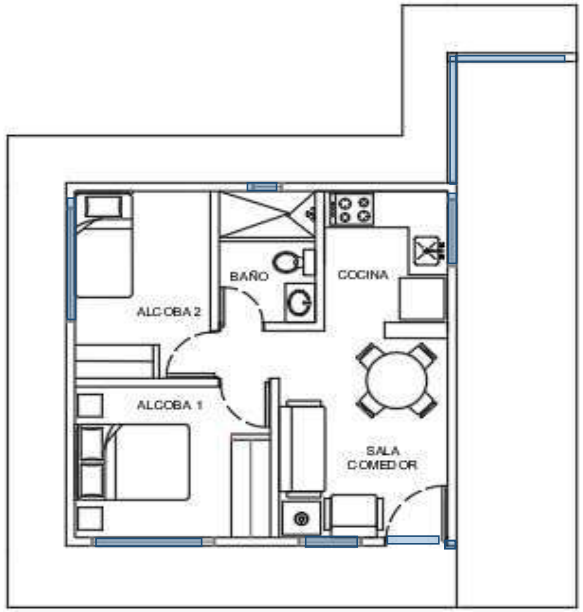

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana alcoba 1	1,37			2,00	2,74
			1,54	2,00	3,08
Ventana alcoba 2	1,40			2,00	2,80
			2,04	2,00	4,08
Ventana baño	0,30			2,00	0,60
			0,77	2,00	1,54
Ventana cocina	0,60			2,00	1,20
			1,50	2,00	3,00
Puerta entrada	2,36			2,00	4,72
			1,00	1,00	1,00
Venta entrada	1,36			2,00	2,72
			0,78	2,00	1,56
Muro puerta principal			3,10		3,10
Muros esquina casa admi			4,42		4,42
Subtotal				**ML**	36,56
Vienen					
TOTAL					**36,56**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico











DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7,3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

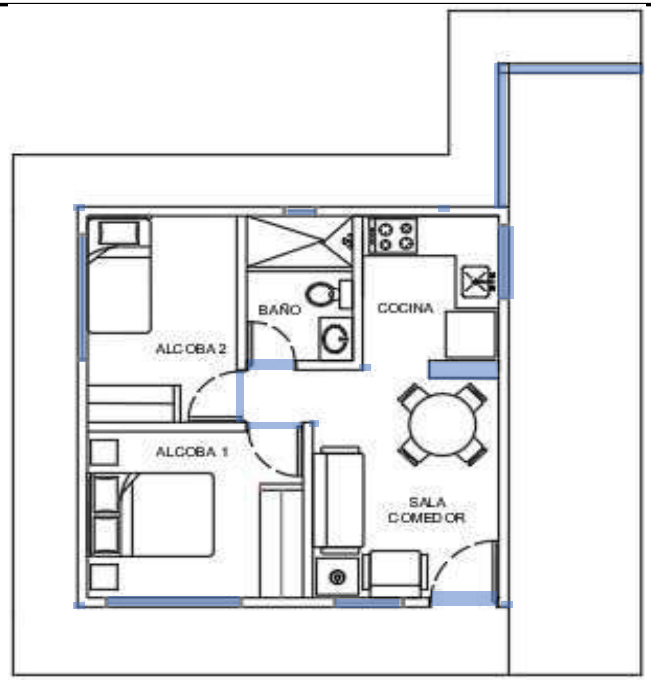

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Filo esquinas casa	3,10			4,00	12,40
Filo puerta principal	2,36			4,00	9,44
			1,00	2,00	2,00
Filo ventana sal comedor	1,36			4,00	5,44
			0,78	4,00	3,12
Filo ventana alcoba 1	1,37			4,00	5,48
			1,54	4,00	6,16
Filo de ventana alcoba 2	1,40			4,00	5,60
			2,04	4,00	8,16
Filo ventana baño	0,30			4,00	1,20
			0,77	4,00	3,08
Filo ventana cocina	0,60			4,00	2,40
			1,50	4,00	6,00
Filo puerta baño	2,20			4,00	8,80
			0,70	2,00	1,40
Filo puertas alcobas	2,20			8,00	17,60
			0,80	4,00	3,20
Filo pasillo	2,20			1,00	2,20
Filo cocina	2,20			1,00	2,20
Filo muro divicion cocina	1,12			2,00	2,24
			1,55	2,00	3,10
Filo muro pasilllo	2,15			2,00	4,30
			2,32	2,00	4,64
Filo closets alcobas	2,20			4,00	8,80
			0,50	4,00	2,00
Subtotal				**ML**	130,96
Vienen					
TOTAL					**130,96**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
7,3	FILOS O DILATACIONES S/MUROV	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
FECHA	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.6	ESTUCO	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

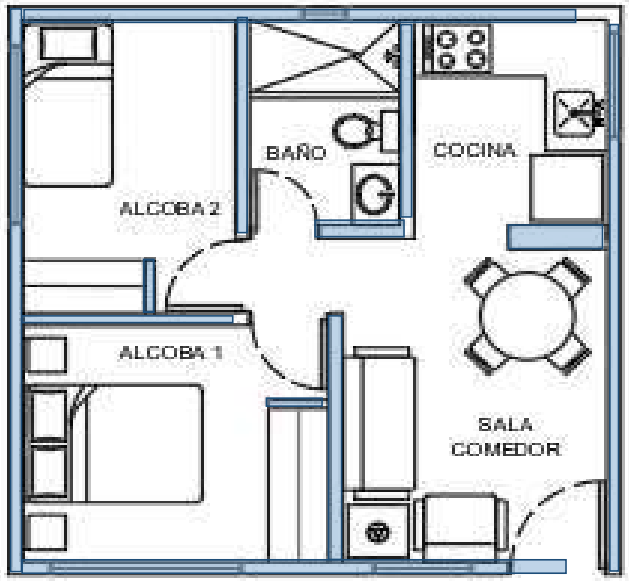

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Eleme.**	**Medida Total**
Fachada principal	3,10		6,57	2,00	40,73
Ventana sala comedor	1,36		0,78	-2,00	-2,12
Ventana alcoba 1	1,37		1,54	-2,00	-4,22
Puerta principal	2,36		1,00	-2,00	-4,72
Fachada trasera	3,10		6,57	2,00	40,73
Ventana baño	0,30		0,77	-2,00	-0,46
Fachada lateral pasillo compostaje	3,70		6,54	2,00	48,40
Ventana cocina	0,60		1,50	-2,00	-1,80
Fachada lateral parqueadero	3,70		6,54	2,00	48,40
Ventana alcoba 2	1,40		2,04	-2,00	-5,71
Pared alcoba 1 y 2	2,70		2,45	2,00	13,23
Pared acoba 2 Baño	2,70		2,50	2,00	13,50
Pared alcoba baño cocina	2,70		2,50	2,00	13,50
Muro antepecho	1,12		1,55	2,00	3,47
Closets alcobas 1 y 2	2,20		0,50	4,00	4,40
Subtotal				**M2**	207,33
Vienen					
TOTAL					**207,33**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.6	ESTUCO	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.7	ESTUCO (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

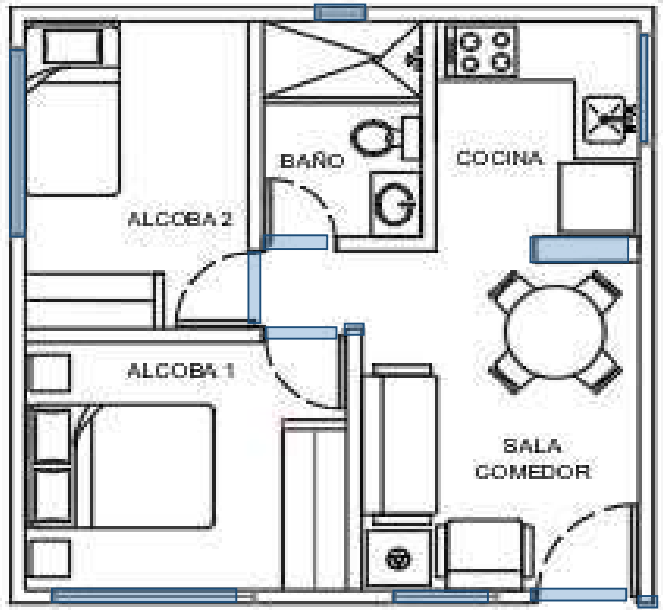

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana alcoba 1	1,37			2,00	2,74
			1,54	2,00	3,08
Puerta alcoba 1	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Ventana alcoba 2	1,40			2,00	2,80
			2,04	2,00	4,08
Puerta alcoba 2	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Ventana baño	0,30			2,00	0,60
			0,77	2,00	1,54
Puerta baño	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Ventana cocina	0,60			2,00	1,20
			1,50	2,00	3,00
Muro division cocina	1,12			1,00	1,12
			1,55	1,00	1,55
Puerta entrada	2,36			2,00	4,72
			1,00		1,00
Venta entrada	1,36			2,00	2,72
			0,78	2,00	1,56
Muro division alcoba sala	2,70			1,00	2,70
Closet Alcobas 1 y 2			2,20	2,00	4,40
			Subtotal	**ML**	54,41
			Vienen		
			TOTAL		**54,41**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.7	ESTUCO (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.8	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

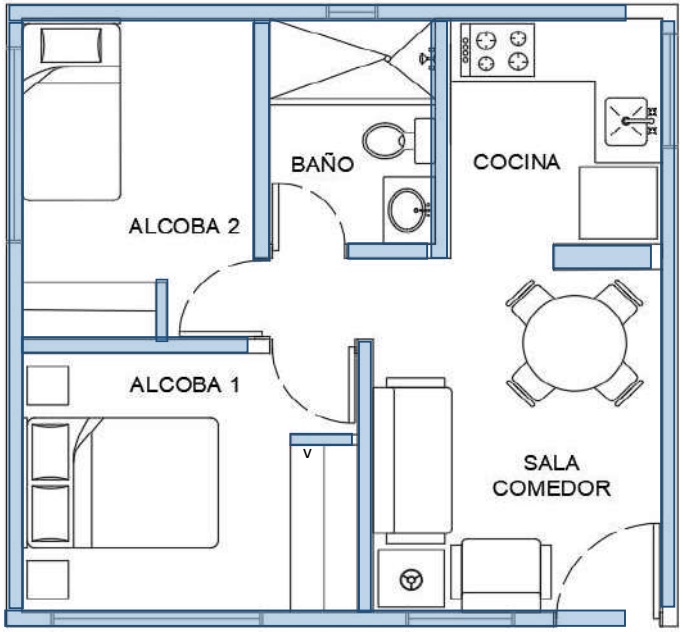

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**Huecos**	**Medida Total**
Alcoba 1 Pared Ventana	2,70		3,25		8,78
Ventana alcoba 1	1,37		1,54	-1,00	-2,11
Alcoba 1 pared respado cama	2,70		2,74		7,40
Alcoba 1 pared al 2	2,70		3,25	2,00	17,55
Muro closet alcoba 1	2,20		0,50	2,00	2,20
Alcoba 1 pared sala	2,70		2,89	2,00	15,61
Alcoba 2 Pared Ventana	2,70		3,35		9,05
Ventana alcoba 2	1,40		2,04	-1,00	-2,86
Alcoba 2 pared respado cama	2,70		2,30		6,21
Muro closet alcoba 1	2,20		0,50	2,00	2,20
Alcoba 2 pared baño	2,70		2,55	2,00	13,77
Baño pared ventana	2,70		1,29		3,48
Baño pared pasillo	2,70		1,29	2,00	6,97
Puerta baño	2,20		0,70	-2,00	-3,08
Baño pared cocina	2,70		2,53	2,00	13,66
Cocina pared trasera	2,70		2,40		6,48
Cocina pared ventana	2,70		2,35		6,35
Ventana cocina	0,60		1,50	-1,00	-0,90
Muro divicion cocina	1,12		1,40	2,00	3,14
Sala comedor pared pasillo comp	2,70		3,89		10,50
Sala comedor pared ventana	2,70		1,87		5,05
Ventana sala comedor	1,36		0,78	-1,00	-1,06
Subtotal				**M2**	385,17
Vienen					
TOTAL					**385,17**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES GUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**									**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.8	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.9	PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

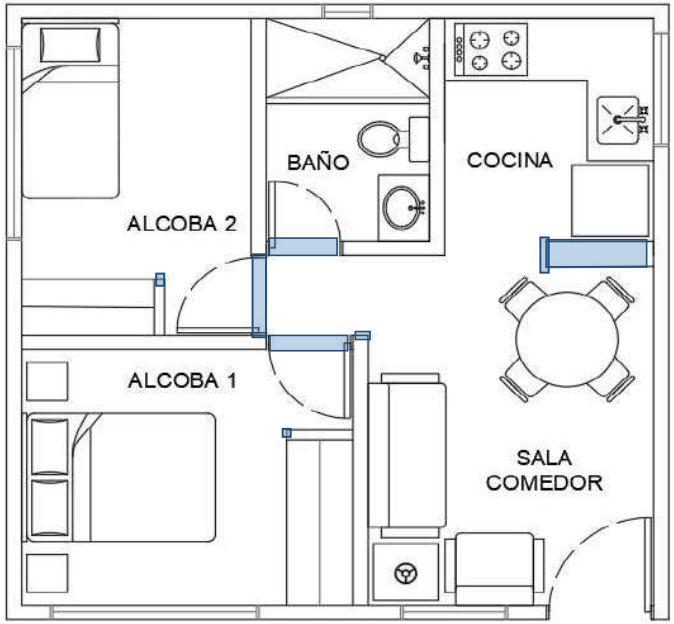

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta alcoba 1	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Puerta alcoba 2	2,20			2,00	6,40
			0,80		0,80
Puerta baño	2,20			2,00	4,40
			0,80		0,80
Muro division cocina	1,12				1,12
			1,55		1,55
Muro division alcoba sala	2,70				2,70
Closet Alcobas 1 y 2	2,20				4,40
Subtotal				**ML**	27,37
Vienen					
TOTAL					**27,37**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.9	PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.12	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

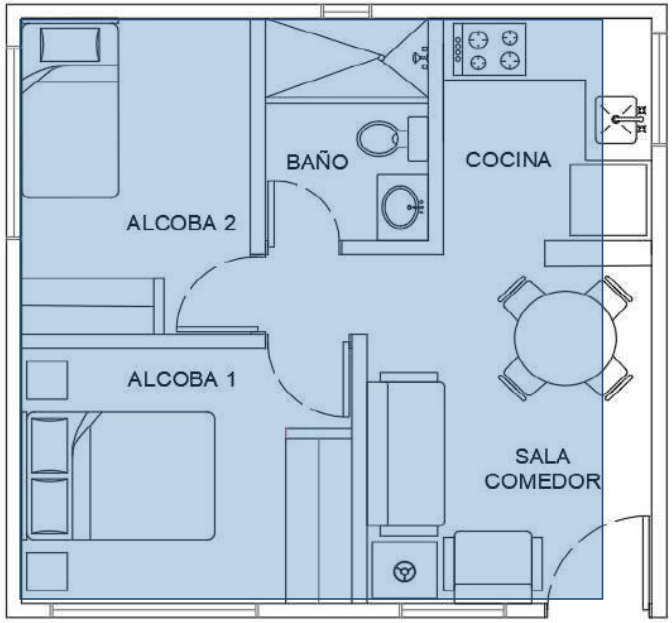

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Placa		6,54	6,57		42,97
Subtotal				**M2**	42,97
Vienen					
TOTAL					**42,97**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.12	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.13	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

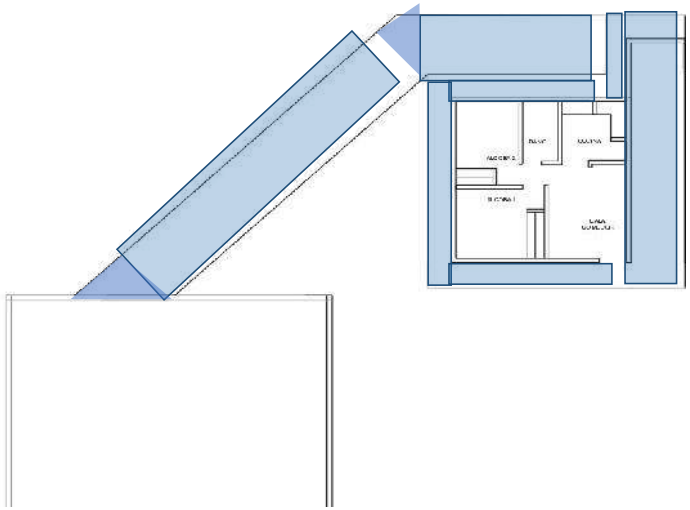

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Anden frontal		1,00	6,57		6,57
Anden Lateral alcobas		0,90	8,34		7,51
Anden trasero		0,88	5,67		4,99
Anden esquina		0,90	3,24		2,92
Anden pasillo		2,00	10,78		21,56
Paso parqueadero compostaje		2,50	22,30		55,75
Subtotal				**M2**	99,30
Vienen					
TOTAL					**99,30**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
15.13	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

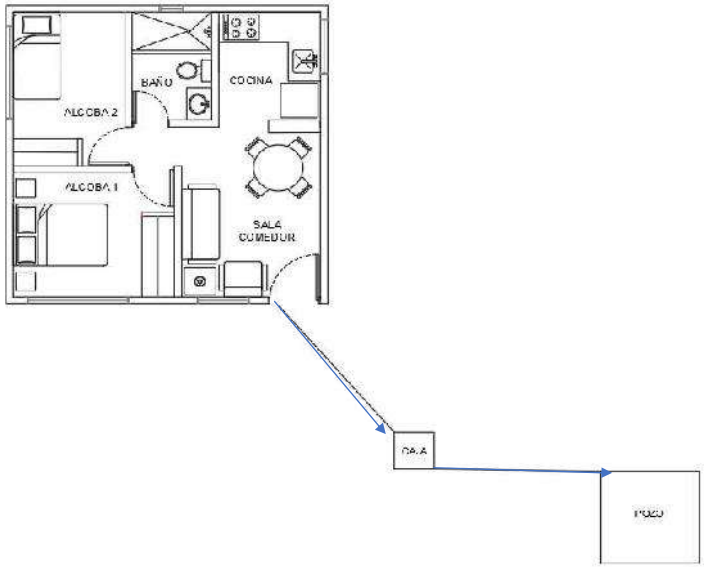

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Red pricipal - Caja inspeccion	0,50	0,40	3,10		0,62
Caja inspeccion - pozo septico	0,50	0,40	16,40		3,28
Subtotal				**M3**	3,90
Vienen					
TOTAL					**3,90**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M	M3	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.2	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

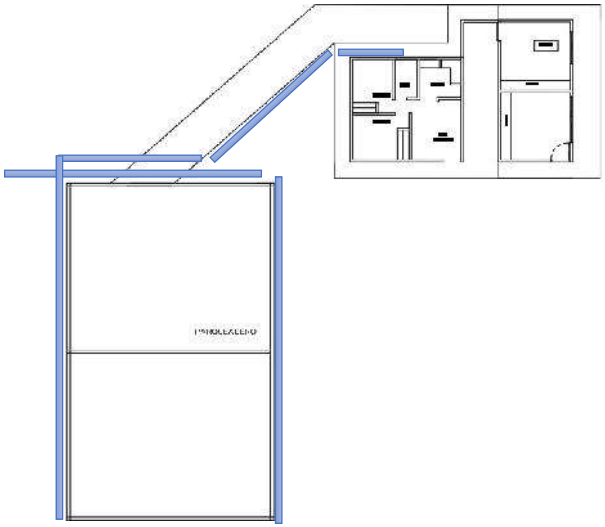

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Red de riego			34,00		34,00
Red de suministro			115,00		115,00
Subtotal				**ML**	149,00
Vienen					
TOTAL					**149,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.2	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

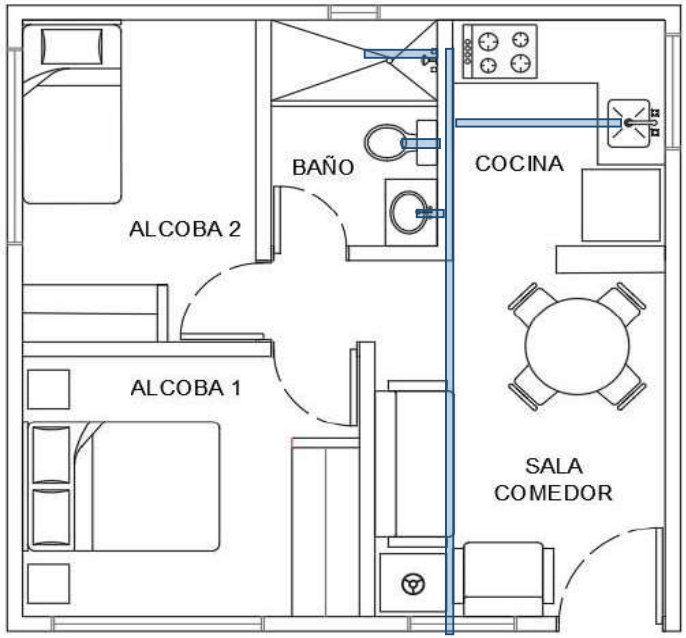

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Linea principal - caja inspeccion			9,20		9,20
Ducha - Linea principal			1,35		1,35
Lavaplatos - Linea principal			1,22		1,22
Lavamanos - Linea principal			1,18		1,18
Inodoro- linea principal			1,35		1,35
Caja inspeccion - pozo septico			16,40		16,40
		Subtotal		**ML**	30,70
		Vienen			
		TOTAL			**30,70**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

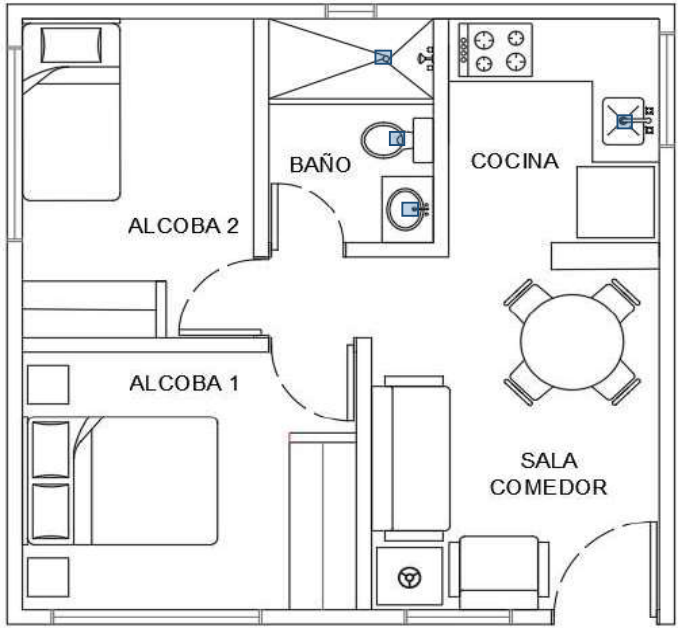

Localización				**No Elem.**	**Cantidad Total**
Punto ducha				1,00	1,00
Punto inodoro				1,00	1,00
Punto lavaplatos				1,00	1,00
Punto lavamanos				1,00	1,00
			Subtotal	**UND**	4,00
			Vienen		
			TOTAL		**4,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.6	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

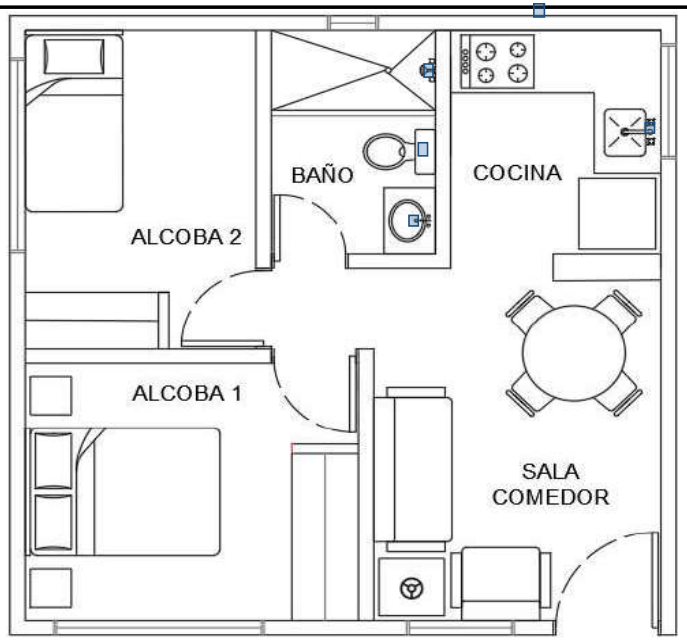

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Cantidad Total**
Lavaplatos				1,00	1,00
Lavamasno				1,00	1,00
Inodoro				1,00	1,00
Ducha				1,00	1,00
Llave de riego				1,00	1,00
				Subtotal	**UND** 5,00
				Vienen	
				TOTAL	**5,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.6	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	1 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.8	REGISTRO 1/2	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

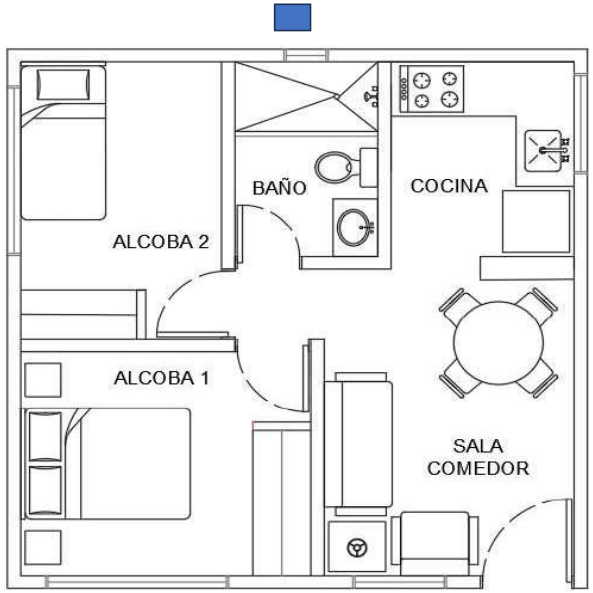

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Registro				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.8	REGISTRO 1/2	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

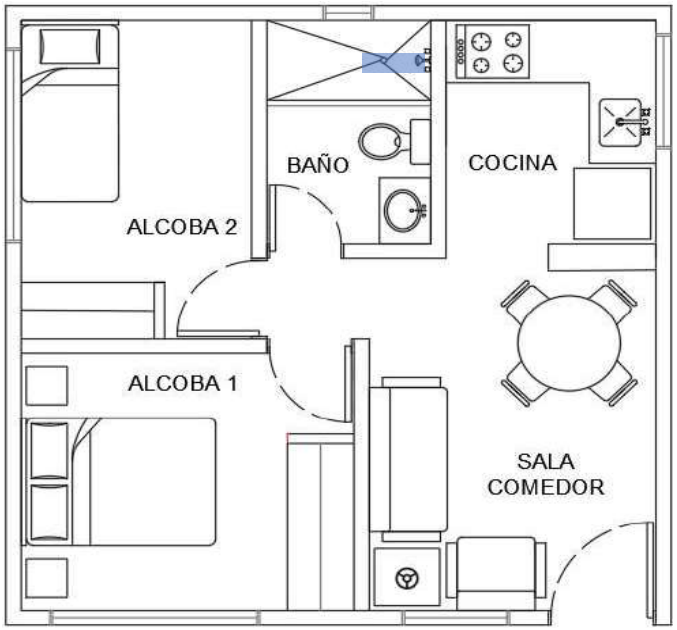

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Ducha				1,00	1,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**						**H O J A**	1	DE 2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1		

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.15	REMATES BOCEL ALUMINO	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

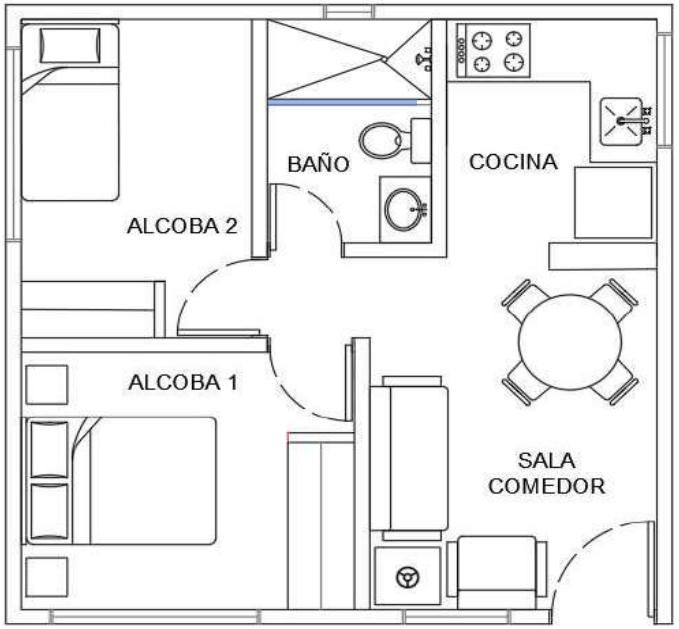

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Muro ducha			1,29	2,00	2,58
				Subtotal	**ML** 2,58
				Vienen	
				TOTAL	**2,58**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.15	REMATES BOCEL ALUMINO	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 2" Y 3"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

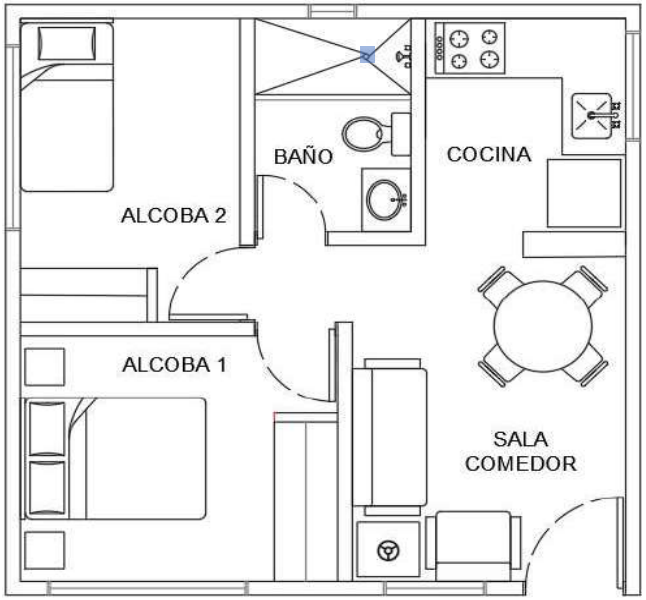

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Ducha				1,00	1,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 2" Y 3"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE CANAL LAVAMANOS 2"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

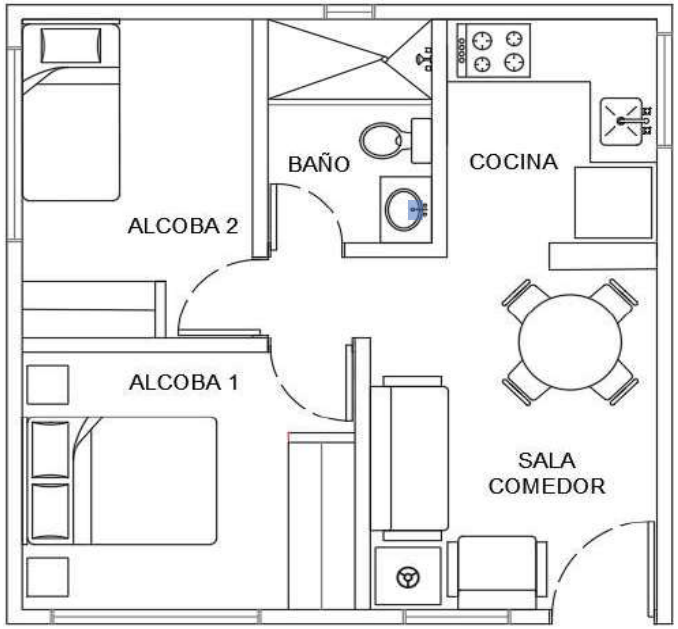

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Lavamanos				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SIFON DE CANAL LAVAMANOS 2"	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.18	CONCRETO DIVISORIO PARA DUCHA	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

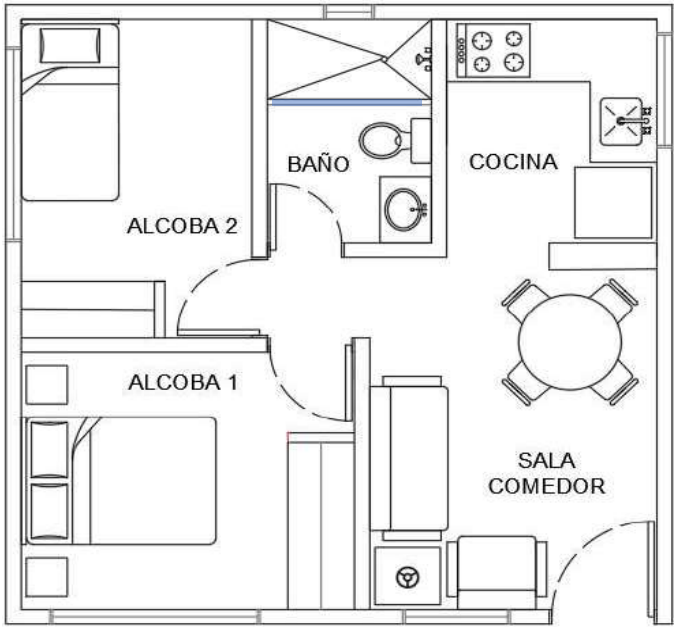

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Muro ducha			1,29		1,29
				Subtotal	**ML** 1,29
				Vienen	
				TOTAL	**1,29**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
16.18	CONCRETO DIVISORIO PARA DUCHA	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico

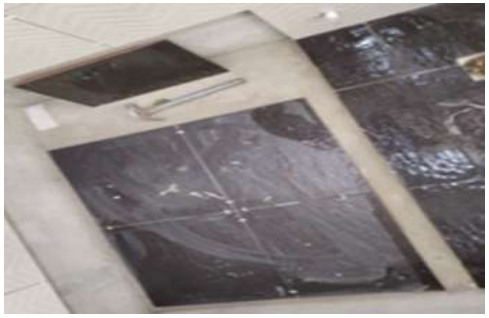







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O						**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.2	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

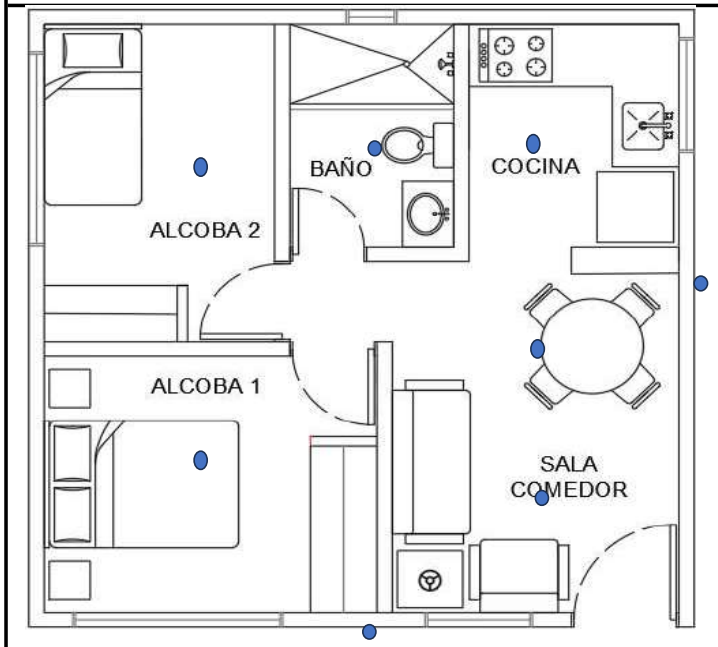

Localización				**No Elem.**	**Cantidad Total**
Salidas lamparas				8,00	8,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.2	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico

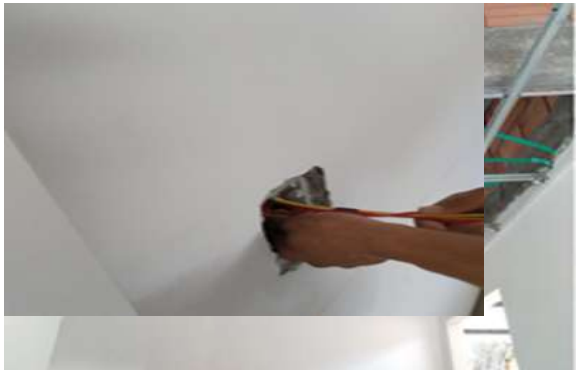



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.3	LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

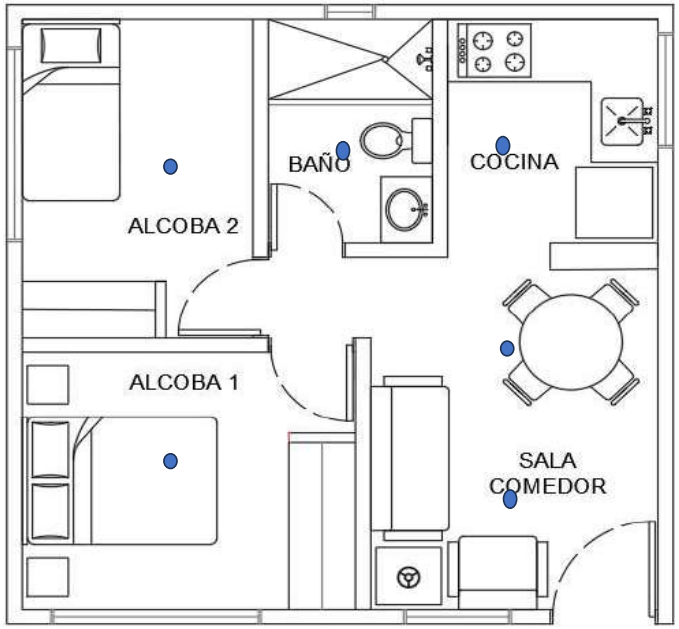

Localización				**No Elem.**	**Cantidad Total**
Lampara panel				6,00	6,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.3	LAMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR 18W 6500K	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	1 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.4	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

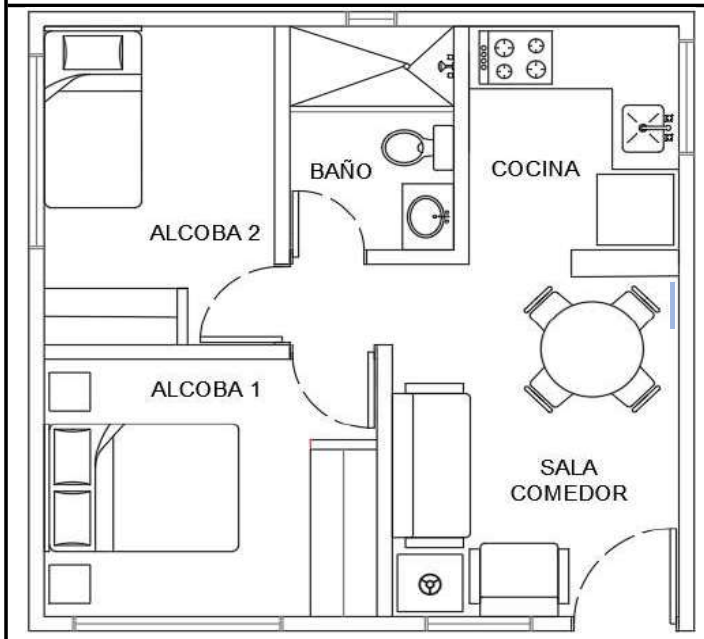

Localización				**No Elem.**	**Cantidad Total**
Tablero parciales				1,00	1,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.4	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

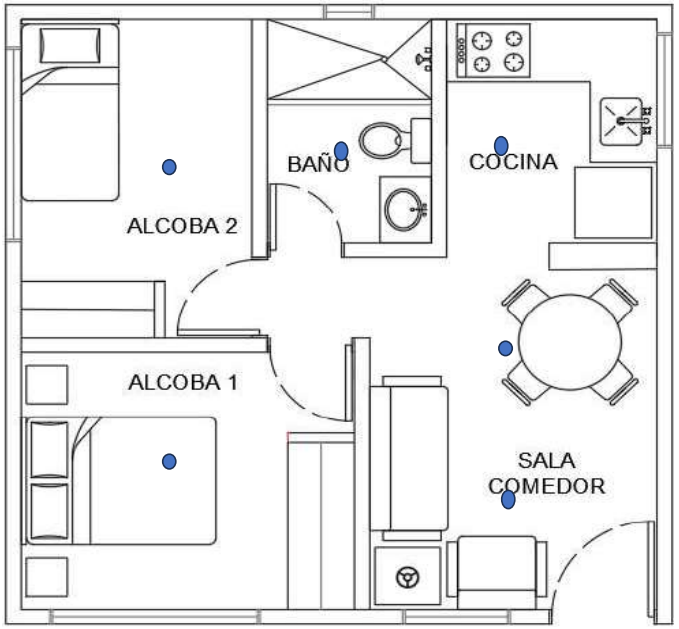

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cable encauchetado			1,50	8,00	12,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.7	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

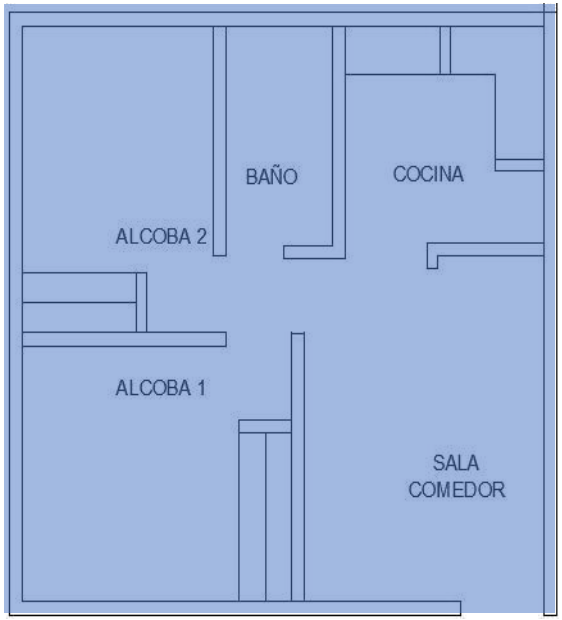

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Regata pared			45,37		45,37
Subtotal				**ML**	45,37
Vienen					
TOTAL					**45,37**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.7	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

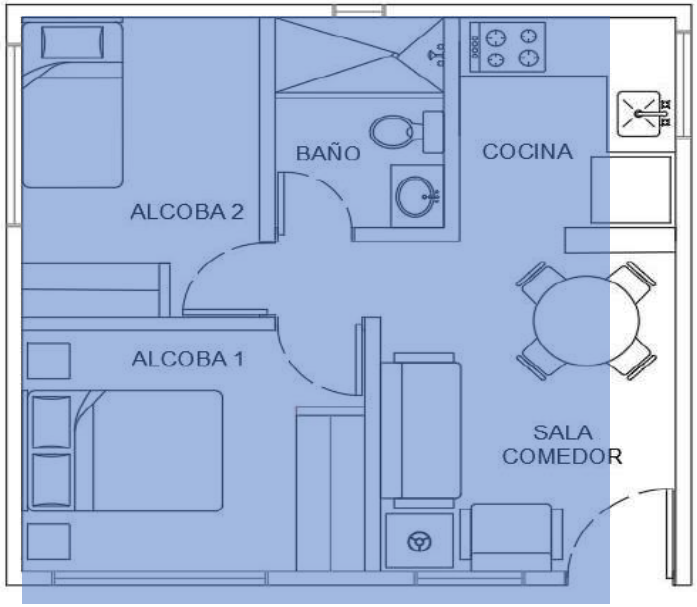

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cable trenzado			338,00		338,00
Cable trenzado acometida			60,00		60,00
				Subtotal	**ML** 398,00
				Vienen	
				TOTAL	**398,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 AWG 7 HILOS	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





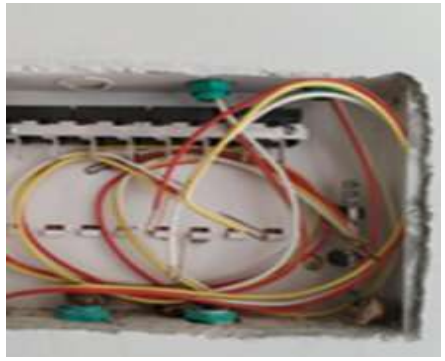

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.1	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

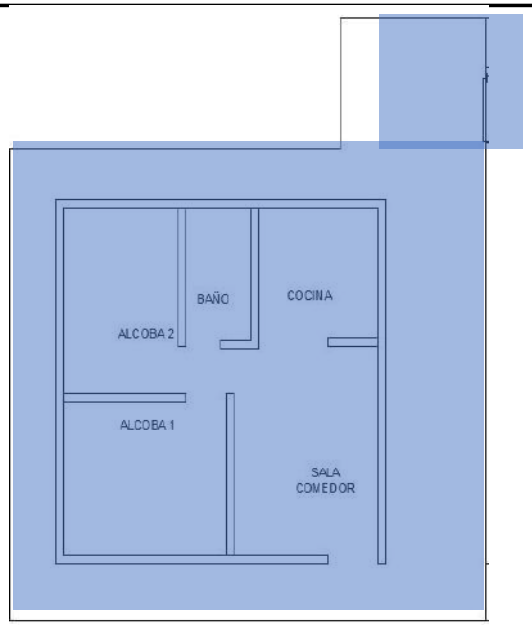

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cubierta casa		7,47	8,34		62,30
Cubierta pasillo		2,30	10,77		24,77
Cubierta anden		0,70	2,44		1,71
			Subtotal	**M2**	88,78
			Vienen		
			TOTAL		**88,78**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.1	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE 2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.2	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

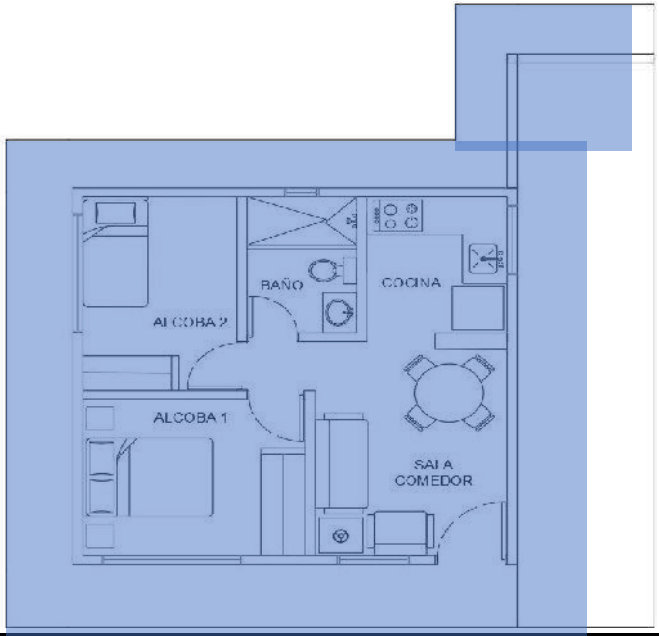

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cubierta casa		7,47	8,42		62,90
Cubierta pasillo		2,30	10,77		24,77
Cubierta anden		0,90	2,36		2,12
Traslapo cubierta		0,30	9,77		2,93
Subtotal				**M2**	92,72
Vienen					
TOTAL					**92,72**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES GUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.2	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.3	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

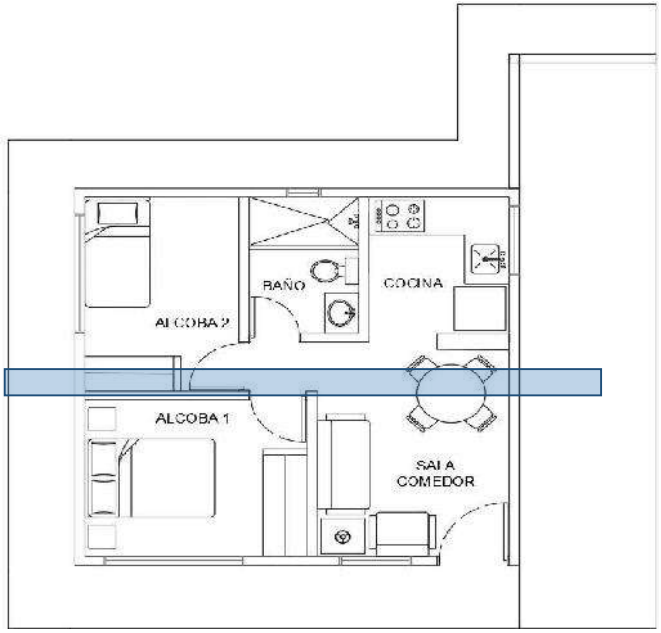

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cubierta			9,77		9,77
Subtotal				**ML**	9,77
Vienen					
TOTAL					**9,77**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES GUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.3	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.4	CANAL PVC AMAZONAS	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

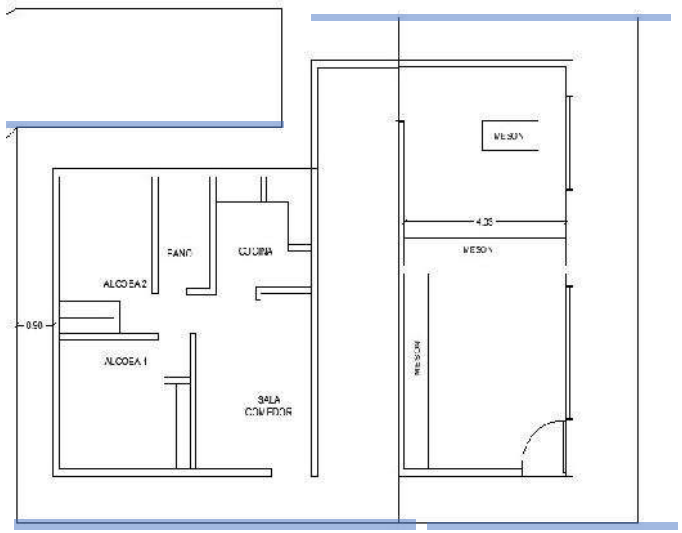

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Fachada frontal			15,40		15,40
Fachada trasera			6,57		6,57
Cubierta pasillo y compostaje			8,83		8,83
				Subtotal	**ML** 30,80
				Vienen	
				TOTAL	**30,80**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.4	CANAL PVC AMAZONAS	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.5	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

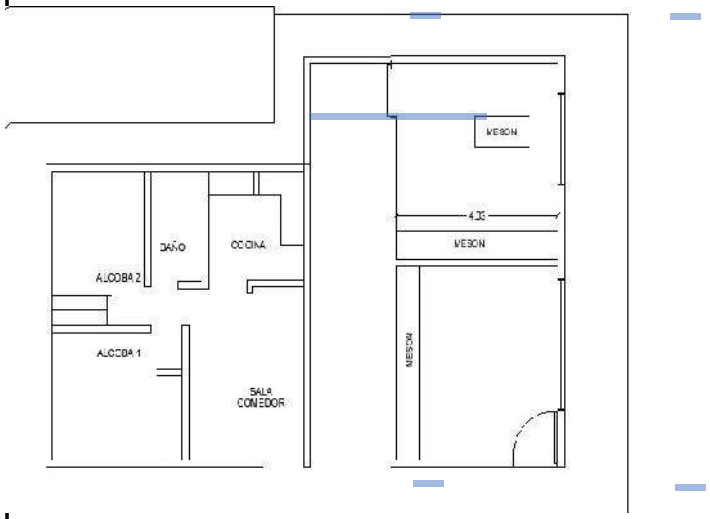

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Bajante compostaje delantero			5,10		5,10
Bajante compostaje trasero			0,35		0,35
Bajante trasero administradores			5,00		5,00
Bajante cubierta admi a compostaje			1,50		1,50
Subtotal				**ML**	11,95
Vienen					
TOTAL					**11,95**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.5	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

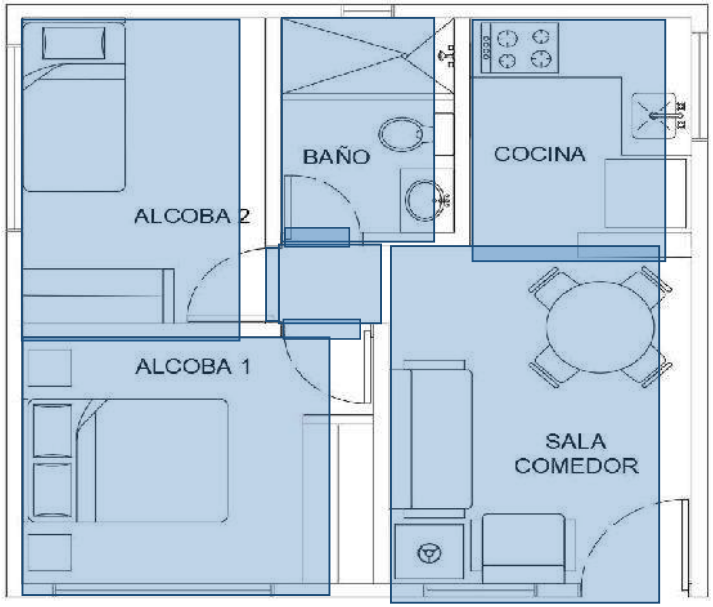

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO		**Medida Total**
Alcoba 1		2,74	3,25		8,91
Alcoba 2		2,30	3,35		7,71
Baño		1,29	2,53		3,26
sala comedor		2,87	3,70		10,62
Cocina		2,40	2,53		6,07
Pasillo		0,80	0,95		0,76
			Subtotal	**M2**	37,33
			Vienen		
			TOTAL		**37,33**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18,6	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

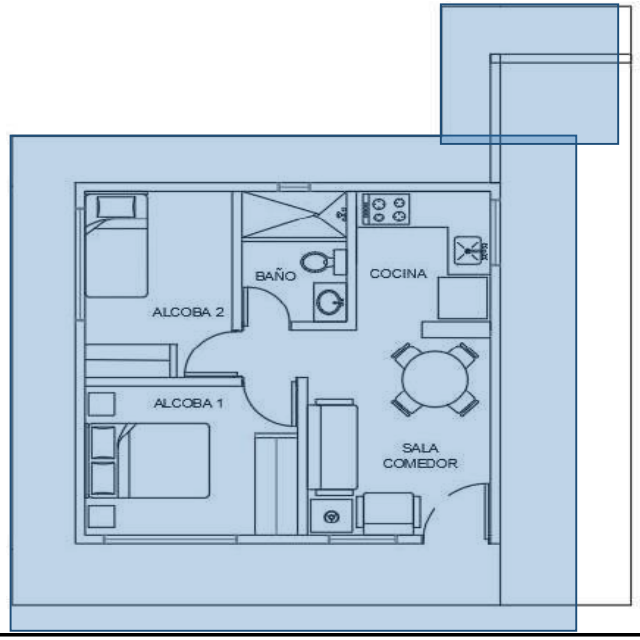

Localización		ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Perfil columna cubierta pasillo fachada 10x10		0,10	3,10	6,00	18,60
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 1 7x7		0,07	2,70	2,00	5,40
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 2 7x7		0,07	3,56	2,00	7,12
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 3 7x7		0,07	3,34	2,00	6,68
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 4 7x7		0,07	2,70	2,00	5,40
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 5x5		0,05	2,70	2,00	5,40
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 5x5		0,05	2,70	2,00	5,40
Perfiles vigas longitudinal		0,04	9,77	8,00	78,16
		0,08	9,77	8,00	78,16
Perfiles vigas Transversales		0,04	8,34	3,00	25,02
		0,08	8,34	3,00	25,02
Perfiles vigas Transversales pasillo		0,04	10,76	3,00	32,28
		0,08	10,76	3,00	32,28
	Subtotal			**ML**	324,92
	Vienen				
	TOTAL				**324,92**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18,6	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O						**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**						**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.7	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

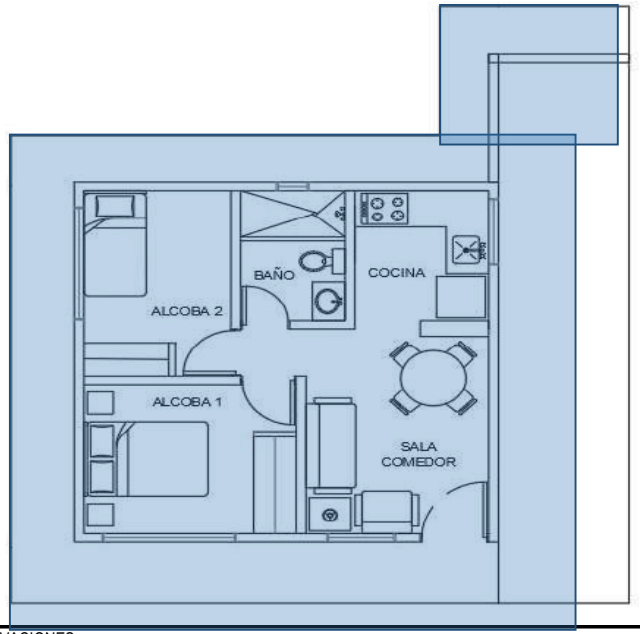

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Perfil columna cubierta pasillo fachada 10x10		0,10	3,10	6,00	18,60
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 1 7x7		0,07	2,70	2,00	5,40
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 2 7x7		0,07	3,56	2,00	7,12
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 3 7x7		0,07	3,34	2,00	6,68
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 4 7x7		0,07	2,70	2,00	5,40
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 5x5		0,07	2,70	2,00	5,40
Perfil columna cubierta pasillo compostaje 5x5		0,07	2,70	2,00	5,40
Perfiles vigas longitudinal		0,04	9,77	8,00	78,16
		0,08	9,77	8,00	78,16
Perfiles vigas Transversales		0,04	8,34	3,00	25,02
		0,08	8,34	3,00	25,02
Perfiles vigas Transversales pasillo		0,04	10,76	3,00	32,28
		0,08	10,76	3,00	32,28
Subtotal				**ML**	324,92
Vienen					
TOTAL					**324,92**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.7	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.8	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

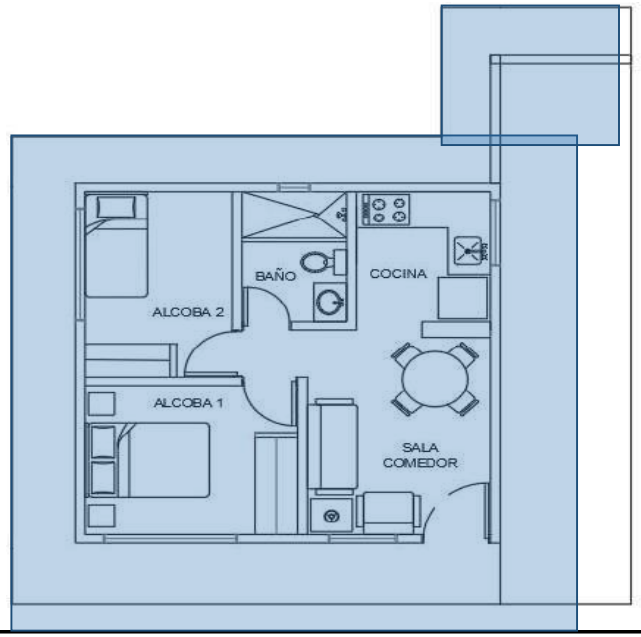

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Casa				30,00	30,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
18.8	ANDAMIOS CERTIFICADOS, INCLUYE TRANSPORTE (SECCION)	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE 2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.1	CLOSET EN ESTRUCTURA DE LAMINA ETERBOARD 8MM ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN RH PARA MUROS	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

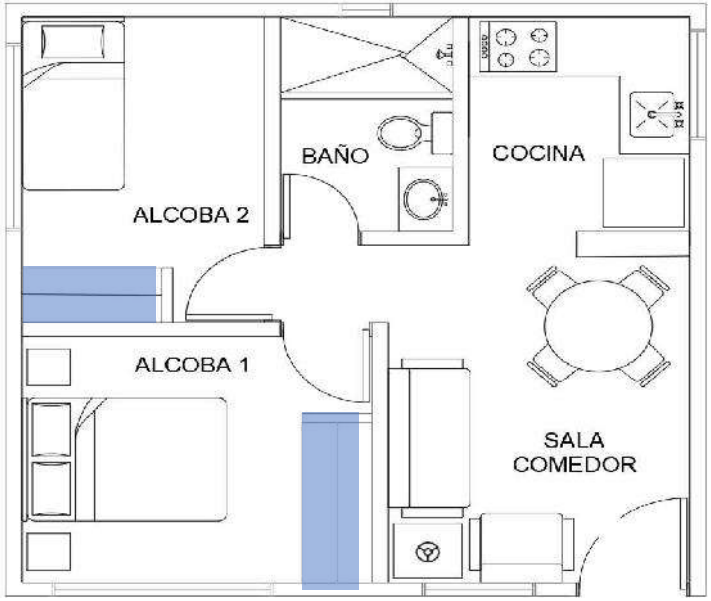

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Closet alcoba 1	2,20	1,95			4,29
Closet alcoba 2	2,20	1,50			3,30
Subtotal				**M2**	7,59
Vienen					
TOTAL					**7,59**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.1	CLOSET EN ESTRUCTURA DE LAMINA ETERBOARD 8MM ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN RH PARA MUROS	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.2	MARCO PUERTA EN RH X O.15	UN	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

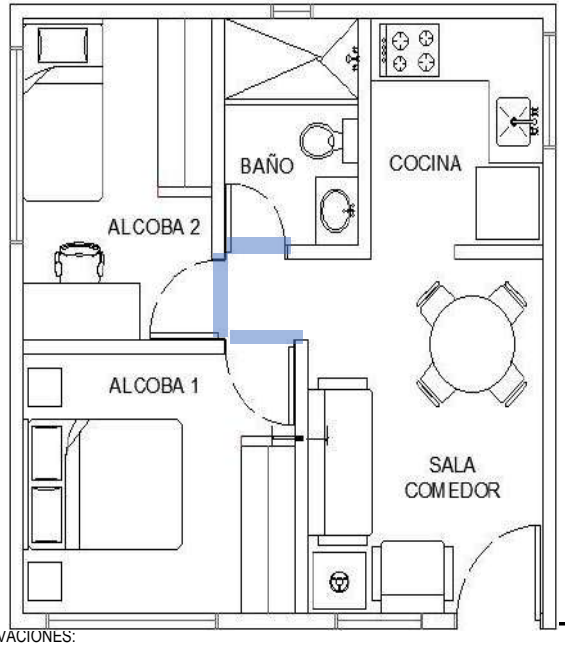

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Alcoba 1				1,00	1,00
Alcoba 2				1,00	1,00
Baño				1,00	1,00
			Subtotal	**UN**	3,00
			Vienen		
			TOTAL		**3,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES GUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.2	MARCO PUERTA EN RH X O.15	UN	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE 2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.3	HOJA PUERTA EN RH INCLUYE BISAGRA NEGRA Y TAPALUCES EN RH	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

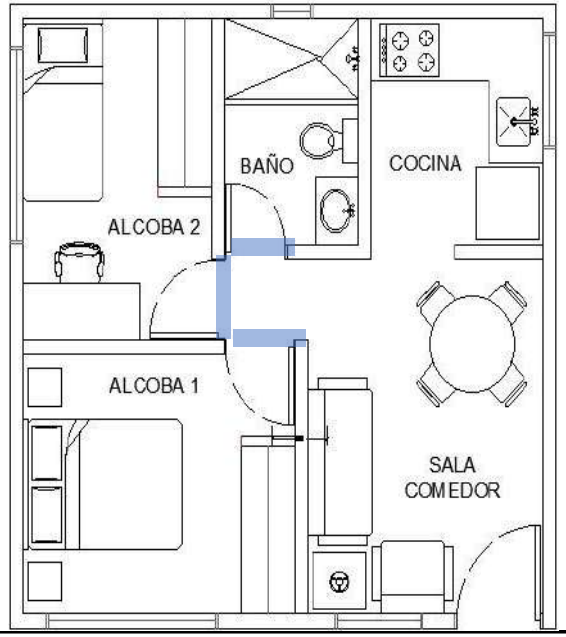

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Baño		0,85	2,20		1,87
Alcoba 1 y 2		0,90	2,20	2,00	3,96
Subtotal				**M2**	5,83
Vienen					
TOTAL					**5,83**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.3	HOJA PUERTA EN RH INCLUYE BISAGRA NEGRA Y TAPALUCES EN RH	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE 2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.4	CHAPA ALUMINIO NEGRO PARA PUERTA DE MADERA	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

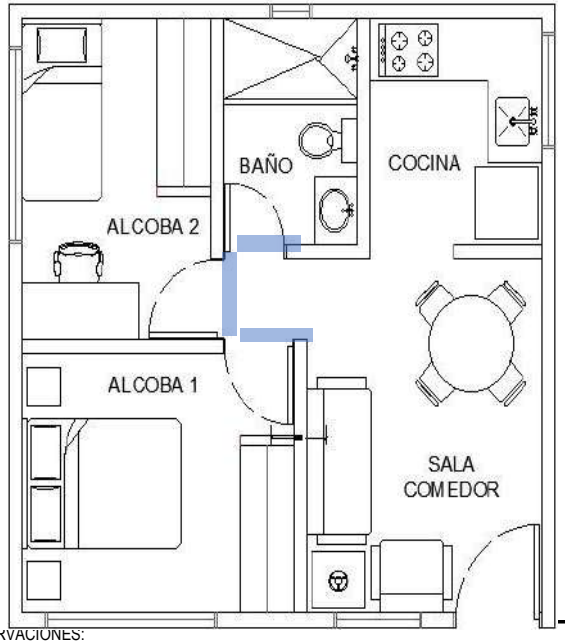

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Baño				1,00	1,00
Alcoba 1 y 2				2,00	2,00
Subtotal				**UND**	3,00
Vienen					
TOTAL					**3,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.4	CHAPA ALUMINIO NEGRO PARA PUERTA DE MADERA	UND	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.6	ESPEJO BISELADO INCOLORO DE 4MM	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

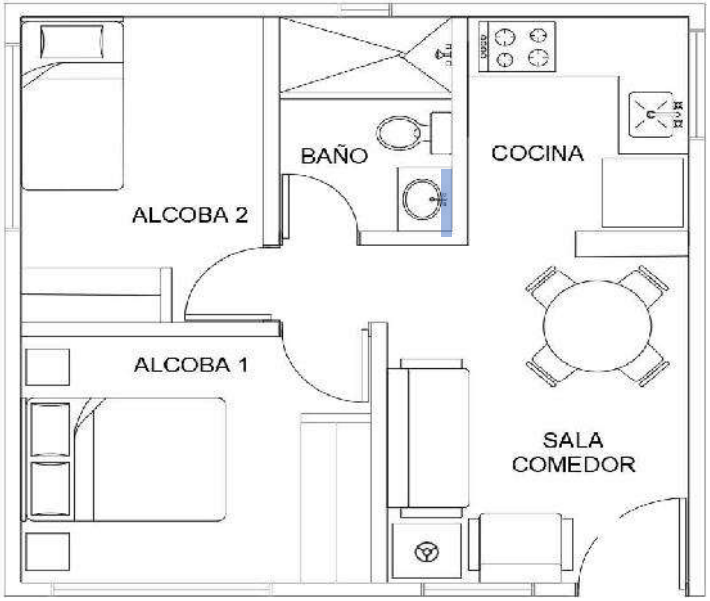

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Espejo baño		0,70	0,80	1,00	0,56
Subtotal				**M2**	0,56
Vienen					
TOTAL					**0,56**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES GUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
19.6	ESPEJO BISELADO INCOLORO DE 4MM	M2	**CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA

F O R M A T O	FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024	H O J A	1	DE	2

F E C H A	D	23	M	12	A	20	24	CORTE Nº	2	ODT	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	Descrpcion	Unidad	Ubicación
24.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	PORTERÍA

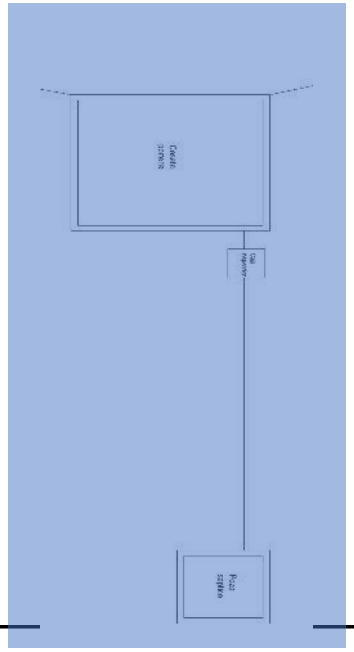PLANO	Localización		ANCHO	LARGO	No Elem.	Medida Total
	Caseta porteria		7,00	17,30		121,10

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	**PORTERÍA**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	**PORTERÍA**

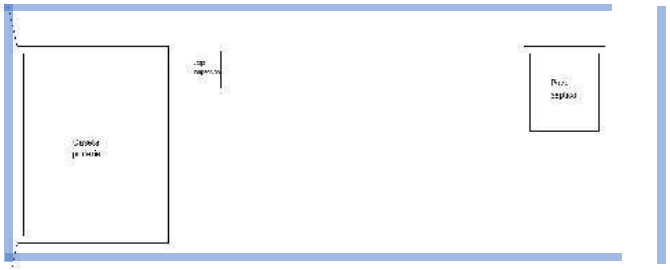PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
						
			7,00		2,00	14,00
				17,30	2,00	34,60
	Subtotal				**ML**	48,60
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**48,60**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	**PORTERÍA**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.3	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	**PORTERÍA**

PLANO

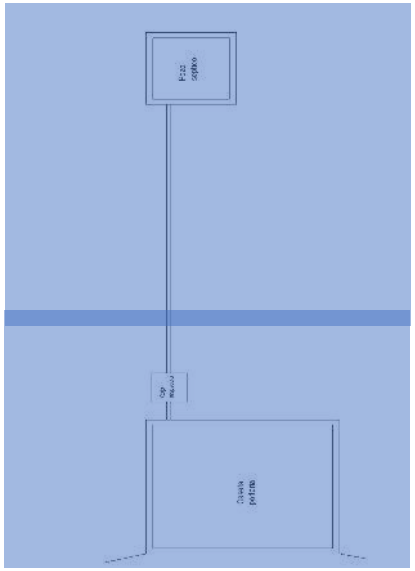

Localización		ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Descapote placa		7,00	7,00		49,00
Descapote pozo		3,00	10,00		30,00
Descapote tanque aereo		4,00	4,00		16,00
				Subtotal	**M2** 95,00
				Vienen	
				TOTAL	**95,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.3	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	**PORTERÍA**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	**PORTERÍA**

PLANO

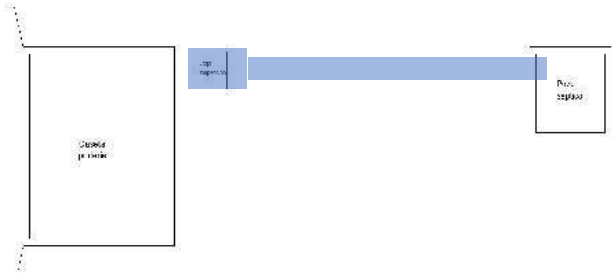

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Caja de inspeccion	0,36	0,80	1,30		0,37
Tuberia 4"	0,35	0,40	7,50		1,05
			Subtotal	**M3**	1,42
			Vienen		
			TOTAL		**1,42**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.5	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	**PORTERÍA**

PLANO

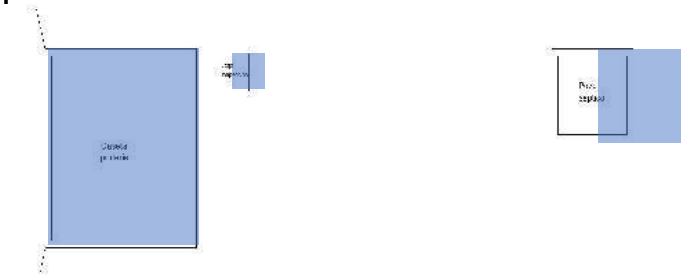

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Caja de inspeccion	0,36	0,80	1,30		0,37
Tuberia 4"	0,35	0,40	7,50		1,05
Pozo septico	2,10	2,10	2,20		9,70
red	0,70	0,40	10,00		2,80
caja de inspección	0,90	0,90	0,90		0,73
Descapote placa	0,10	7,00	7,00		4,90
Descapote pozo	0,10	3,00	10,00		3,00
			Subtotal	**M3**	22,55
			Vienen		
			TOTAL		**22,55**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
24.5	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
25.1	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E: 10 CMS.	M2	**PORTERÍA**

PLANO

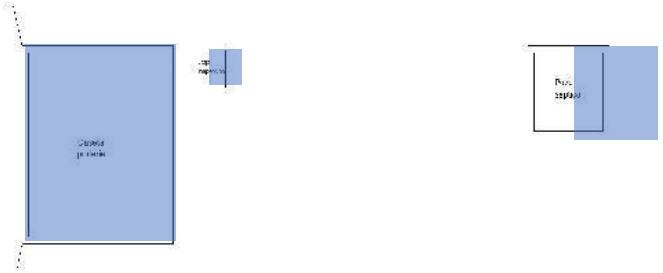

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Placa contrapiso		3,75	4,30		16,13
Tapa pozo septico		2,00	2,00		4,00
Tapa caja de inspeccion		0,80	0,80		0,64
Placa tanque de reserva		1,00	1,00		1,00
Zapata tanque de reserva		2,00	2,00		4,00
Subtotal				**M2**	25,77
Vienen					
TOTAL					**25,77**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
25.1	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E: 10 CMS.	M2	**PORTERÍA**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	1 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
25.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	**PORTERÍA**

PLANO

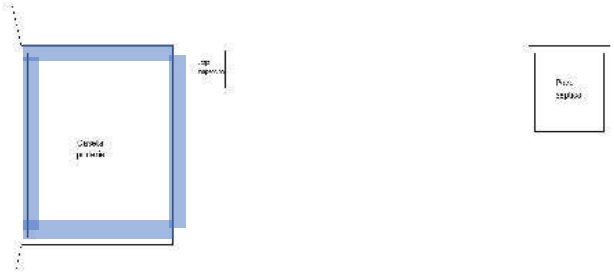

Localización		CANTIDAD	LARGO	**kg/m**	**Medida Total**
Varilla 1/2" viga caseta largo		8,00	4,30	0,99	34,19
Varilla 1/2" viga caseta ancho		8,00	3,75	0,99	29,82
flejes de 30x30 3/8"		107,00	1,30	0,57	79,29
Varilla 1/2" columna torre tanque		8,00	4,50	0,99	35,78
Varilla 1/2" placa tanque		12,00	0,80	0,99	9,54
Varilla 1/2" zapata tanque		10,00	0,60	0,99	5,96
Fejes de 0.25x0.25 de 3/8"		35,00	1,05	0,57	20,95
	Subtotal			**KG**	215,53
	Vienen				
	TOTAL				**215,53**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
25.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	**PORTERÍA**

Registro Fotografico






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
25.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	**PORTERÍA**

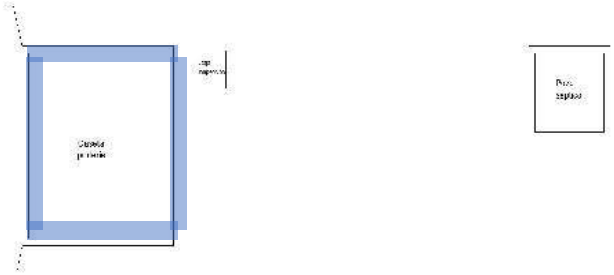PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Viga casa**	0,30	0,30	16,06		1,45
	Subtotal				**M3**	1,45
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**1,45**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
25.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.1	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	**PORTERÍA**

PLANO

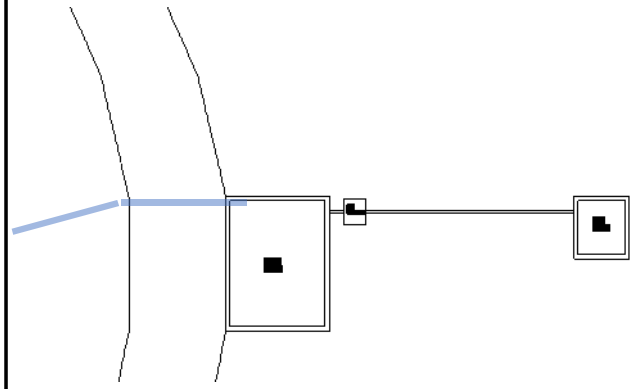

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Caseta porteria			31,20		31,20
Subtotal				**ML**	31,20
Vienen					
TOTAL					**31,20**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.1	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	**PORTERÍA**

Registro Fotografico






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.2	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**PORTERÍA**

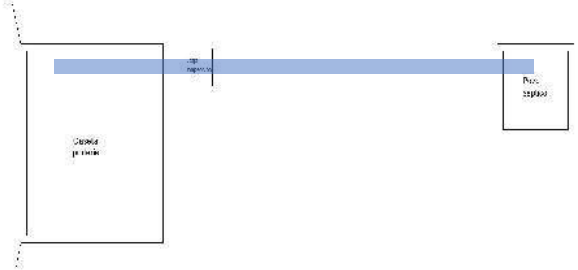PLANO	**Localización**				**No Elem.**	**Medida Total**
				LARGO		
	**Sanitario a caja**			3,32		3,32
	Caja a pozo			7,50		7,50
	Subtotal				**ML**	10,82
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**10,82**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.2	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**PORTERÍA**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	**PORTERÍA**

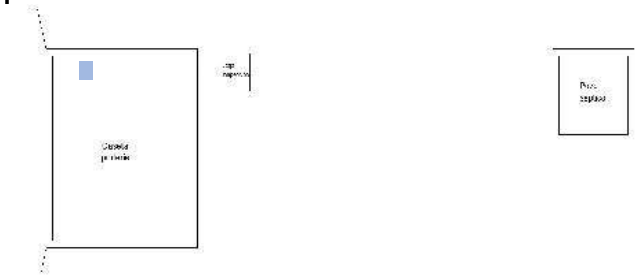PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Salida sanitaria**				1,00	1,00
	Subtotal				**UND**	1,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**1,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	**PORTERÍA**

Registro Fotografico






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	**PORTERÍA**

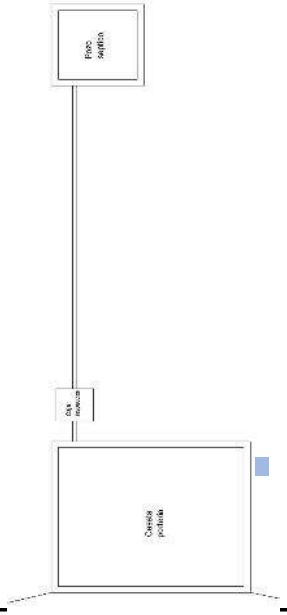PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Ducha**				1,00	1,00
	Subtotal				**UND**	1,00
	Vienen					
	TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
26.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	**PORTERÍA**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
27.1	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	**PORTERÍA**

PLANO

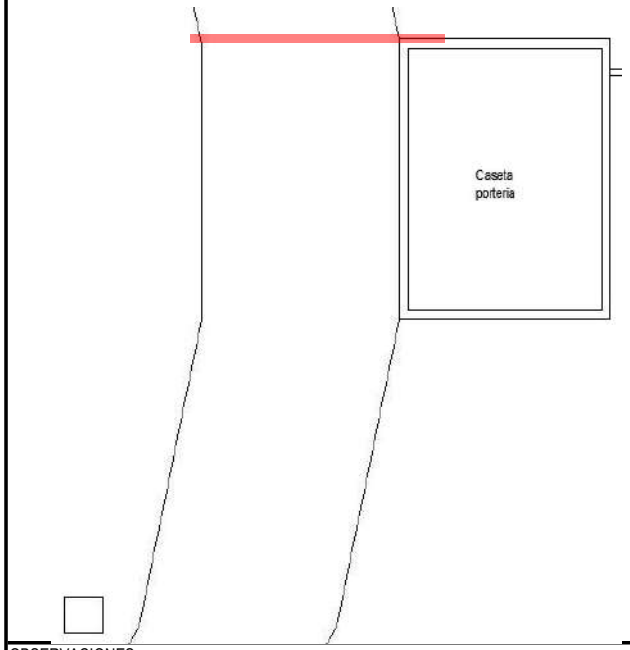

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Punto electrico			10,40		10,40
				Subtotal	**ML** 10,40
				Vienen	
				TOTAL	**10,40**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
27.1	APERTURA REGATA EN PISO PARED O TECHO 5CM ANCHO 5CM PROFUNDIDAD PARA TUBERIA INCLUYE RESANE Y ALISASO	ML	**PORTERÍA**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
28.1	CASETA DE VENTAS EN PLASTICO RECICLADO TIPO TAQUILLA FABRICADA 90 % CON PLATICO RECUPERADO CON UNA DURABILIDAD DE MAS DE 20 AÑOS	M2	**PORTERÍA**

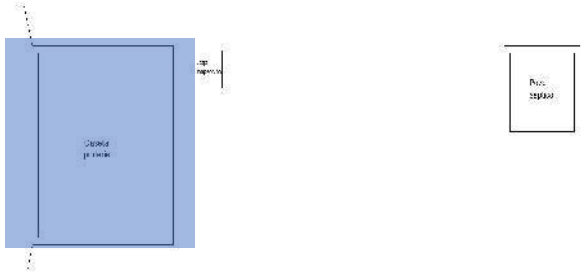PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Caseta**		4,00	5,00		20,00
					Subtotal	**M2** 20,00
OBSERVACIONES:					**Vienen**	
					TOTAL	**20,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
28.1	CASETA DE VENTAS EN PLASTICO RECICLADO TIPO TAQUILLA FABRICADA 90 % CON PLATICO RECUPERADO CON UNA DURABILIDAD DE MAS DE 20 AÑOS	M2	**PORTERÍA**

Registro Fotografico






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.1	EXCCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIERO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM) POZO SEPTICO	M3	**PORTERÍA**

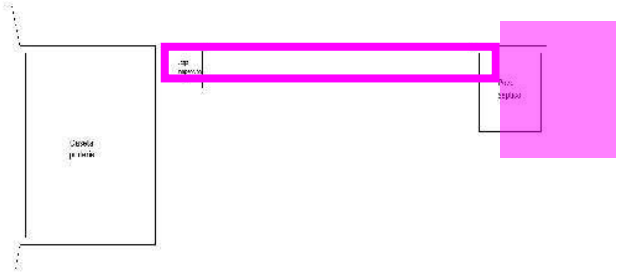PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Pozo septico**	2,10	2,10	2,20		9,70
	Red	0,70	0,40	10,00		2,80
	Caja de inspección	0,90	0,90	0,90		0,73
	Subtotal				**M3**	13,23
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**13,23**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.1	EXCCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIERO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM) POZO SEPTICO	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	**PORTERÍA**

PLANO



Localización		CANTIDAD	LARGO	**kg/m**	**Medida Total**
Pozo septico tapa varilla 1/2"		10,00	1,65	0,99	16,40
Pozo septico vigas varilla 1/2"		16,00	2,00	0,99	31,81
Pozo septico flejes Varilla 1/2"		31,00	1,05	0,99	32,35
	Subtotal			**KG**	80,56
	Vienen				
	TOTAL				**80,56**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	**PORTERÍA**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.4	CONCRETO 4000 PSI	M3	**PORTERÍA**

PLANO



Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Concreto vigas	0,40	0,40	2,00	4,00	1,28
Tapa pozo septico	0,11	2,00	2,00	1,00	0,44
				Subtotal	**M3** 1,72
				Vienen	
				TOTAL	**1,72**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.4	CONCRETO 4000 PSI	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.5	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	**PORTERÍA**

PLANO



Localización	ALTO	ANCHO		**No Elem.**	**Medida Total**
Pozo septico	1,90	1,80		4,00	13,68
Subtotal				**M2**	13,68
Vienen					
TOTAL					**13,68**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.5	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	**PORTERÍA**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.6	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**PORTERÍA**

PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Respirador**			3,00		3,00
	Caseta - pozo			10,78		10,78
	Subtotal				**ML**	13,78
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**13,78**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.6	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	**PORTERÍA**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.7	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	**PORTERÍA**

PLANO

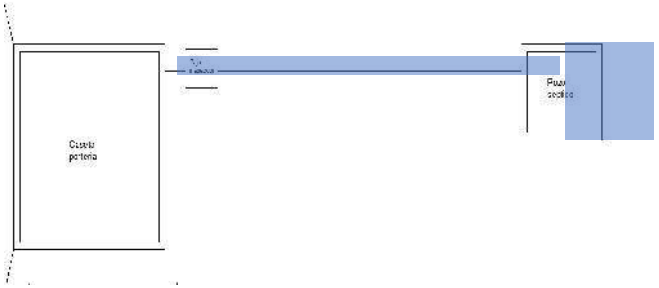

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Retiro excavaciones Pozo	2,00	2,00	2,00		8,00
Tuberia a pozo	0,70	0,40	10,78		3,02
Subtotal				**M3**	11,02
Vienen					
TOTAL					**11,02**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
29.7	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M	M3	**PORTERÍA**

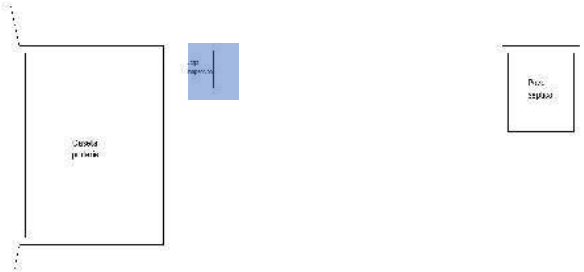PLANO	**Localización**				**No Elem.**	**Medida Total**
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**Caja de inspeccion**	0,50	0,80	0,80		0,32
	Subtotal				**M3**	0,32
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**0,32**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1,0M	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.3	CONCRETO 4000 PSI	M3	**PORTERÍA**

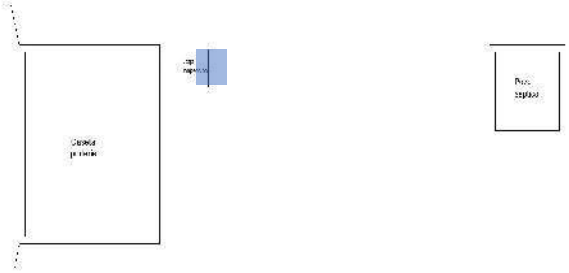PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Tapa caja**	0,12	0,80	0,80		0,08
	Base	0,12	0,80	0,80		0,08
	Subtotal				**M3**	0,16
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**0,16**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.3	CONCRETO 4000 PSI	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.4	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	**PORTERÍA**

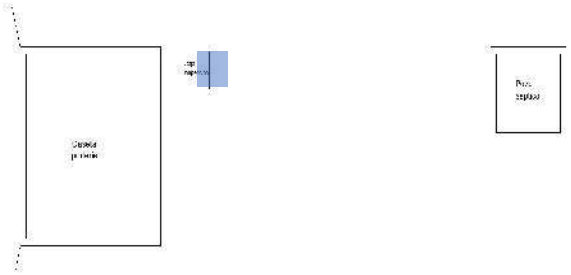PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Caja de inspeccion**	0,80	0,80		4,00	2,56
	Subtotal				**M2**	2,56
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**2,56**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.4	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	**PORTERÍA**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.5	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	**PORTERÍA**

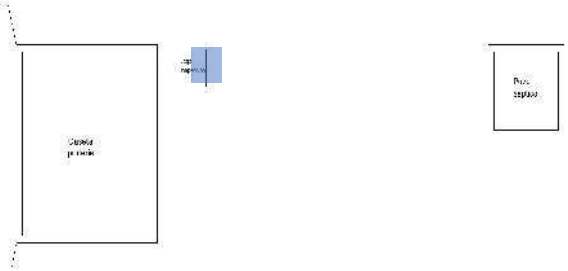PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Fondo caja de inspeccion**	0,10	0,65	0,65		0,04
	Tapa caja de inspeccion	0,03	0,80	0,80		0,02
	Subtotal				**M3**	0,06
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**0,06**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
30.5	MORTERO IMPERMEABILIZADO DE 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	**PORTERÍA**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
42.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 3 HP	UND	**EQUIPOS**

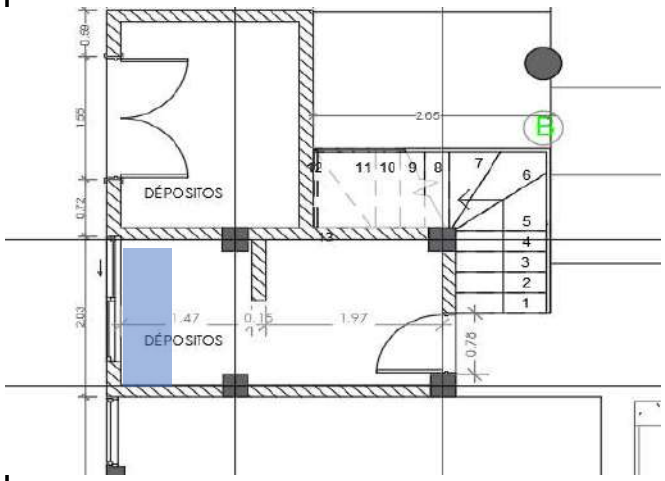PLANO	**Localización**				**No Elem.**	**Medida Total**
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**Cuarto Equipos**				1,00	1,00
	Subtotal				**UND**	1,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**1,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
42.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 3 HP	UND	**EQUIPOS**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O						**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
43.4	DESMONTE Y CAMBIO TUBERIAS DE PRESION 1 1/2"	ML	**PISCINA**

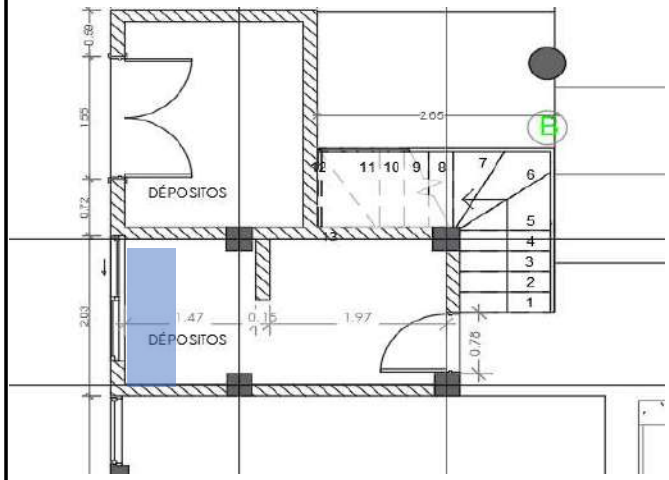PLANO	**Localización**				**No Elem.**	**Medida Total**
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**Cambio tuberia**			8,00	1,00	8,00
	Subtotal				**ML**	8,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**8,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
43.4	DESMONTE Y CAMBIO TUBERIAS DE PRESION 1 1/2"	ML	**PISCINA**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA

F O R M A T O	FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024	H O J A	1	DE	2

F E C H A	D	23	M	12	A	20	24	CORTE Nº	2	ODT	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
44.2	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BALONCESTO EN ACRILICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UND	**CANCHA**

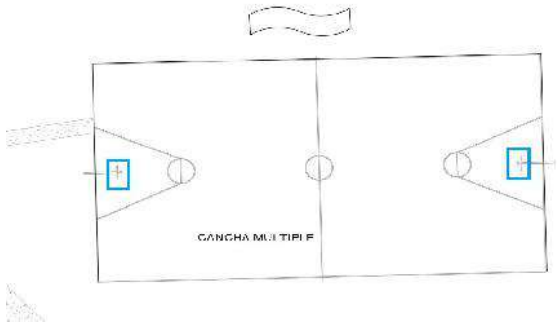PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Tablero baloncesto**				2,00	2,00
	Subtotal				**UND**	2,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**2,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
44.2	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BALONCESTO EN ACRILICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UND	**CANCHA**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
46.1	CONTROL DE PLAGAS RASTREROS , VOLADORES Y ROEDORES POR EL METODO DE ASPERSION DIRIGIDA EN TODAS LAS AREAS DE CASA ACUARIES CON PRODUCTOS APROBADOS POR LA SALUD PUBLICA Y TOTALMENTE ORGANICOS (SAFER SL, ACEITE DE NEEM, CREOLINA GOLD, BOLAS DE NEFTALINA , EXTRACTO DE AJO, ACPM,SAL INCLUYE MANO DE OBRA	UND	**CASA ACUARIES**

PLANO

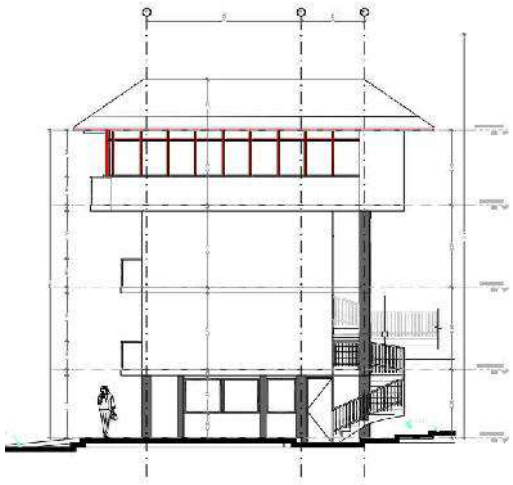

FACHADA ORIENTAL

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Control de plagas				2,00	2,00
Subtotal				**UND**	2,00
Vienen					
TOTAL					**2,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
46.1	CONTROL DE PLAGAS RASTREROS , VOLADORES Y ROEDORES POR EL METODO DE ASPERSION DIRIGIDA EN TODAS LAS AREAS DE CASA ACUARIES CON PRODUCTOS APROBADOS POR LA SALUD PUBLICA Y TOTALMENTE ORGANICOS (SAFER SL, ACEITE DE NEEM, CREOLINA GOLD, BOLAS DE NEFTALINA , EXTRACTO DE AJO, ACPM,SAL INCLUYE MANO DE OBRA	UND	**CASA ACUARIES**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.1	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

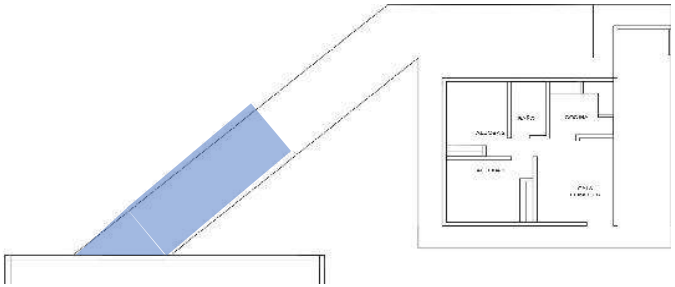PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Rampa compostaje**	0,15	2,50	7,00		2,63
	Subtotal				**M3**	2,63
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**2,63**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.1	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

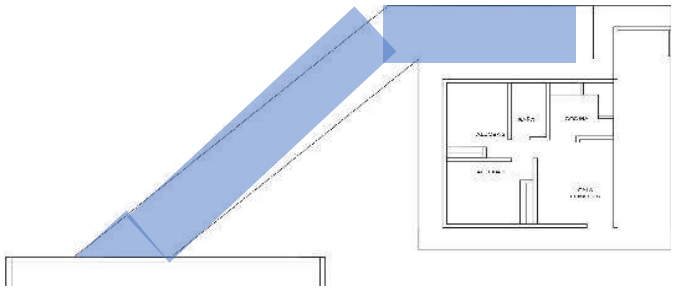PLANO	**Localización**	ANCHO	LARGO	PESO/m2	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Malla electrosoldada 5mm**	2,5	22,3	2,08		115,96
	Subtotal				**KG**	115,96
	Vienen					
	TOTAL					**115,96**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA


F O R M A T O	FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024	H O J A	1	DE	2

F E C H A	D	23	M	12	A	20	24	CORTE Nº	2	ODT	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	Descrpcion	Unidad	Ubicación
47.5	BASE GRANULAR	M3	ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO

PLANO

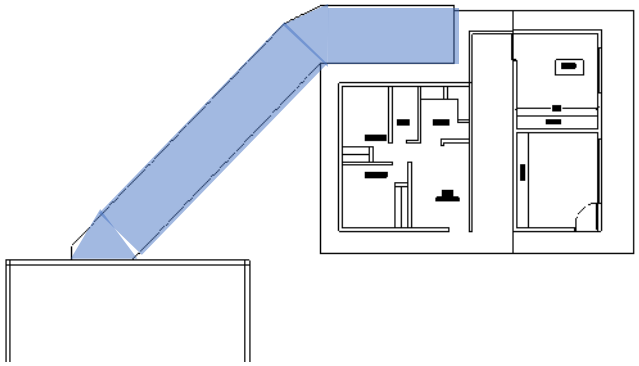

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	No Elem.	Medida Total
Base granular	0,50	2,50	22,30		27,88
Subtotal				**M3**	27,88
Vienen					
TOTAL					**27,88**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.5	BASE GRANULAR	M3	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.7	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

PLANO

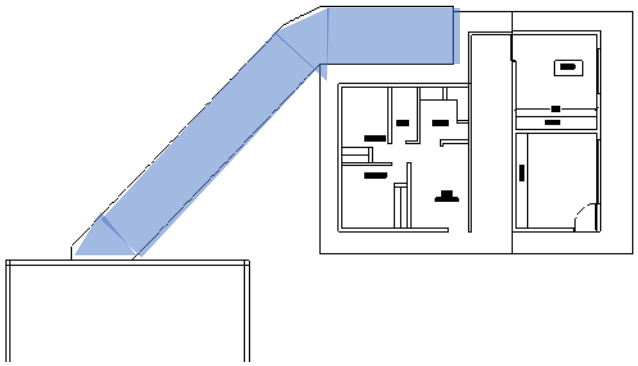

Localización			LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Bordillos			22,30	4,00	89,20
Dilataciones cada 3m			2,50	8,00	20,00
		Subtotal		**ML**	109,20
		Vienen			
		TOTAL			**109,20**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.7	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.8	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

PLANO

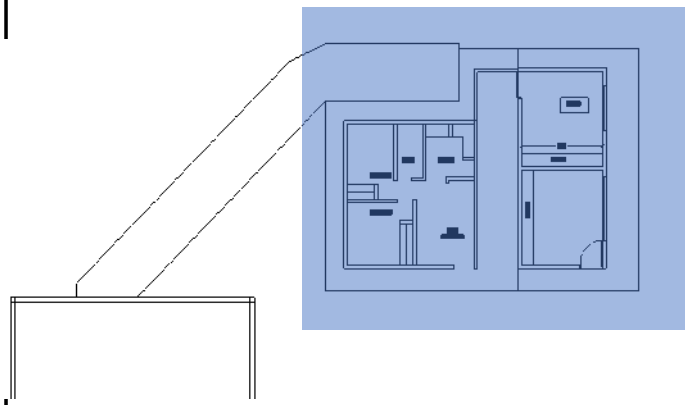

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Frente Casa Administradores	0,50	0,25	0,25	3,00	0,09
Ampliación Compostaje	0,30	0,22	0,22	2,00	0,03
Posterior Casa Administradores	0,30	0,22	0,22	2,00	0,03
Subtotal				**M3**	0,15
Vienen					
TOTAL					**0,15**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47.8	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47,8	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

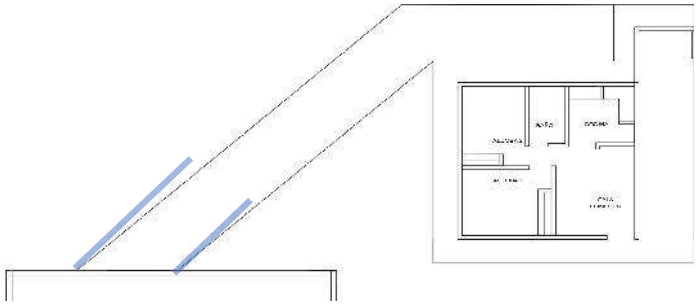PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
						
				3,00	2,00	6,00
	Subtotal				**ML**	6,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**6,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**										**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
47,8	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,1	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

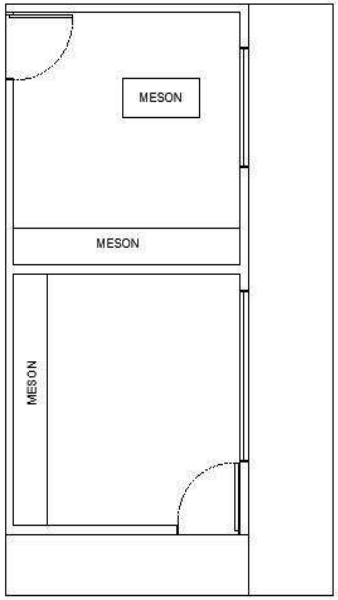PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
	**Circuito bajo tierra**				1,00	1,00
	Subtotal				**UND**	1,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**1,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,1	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

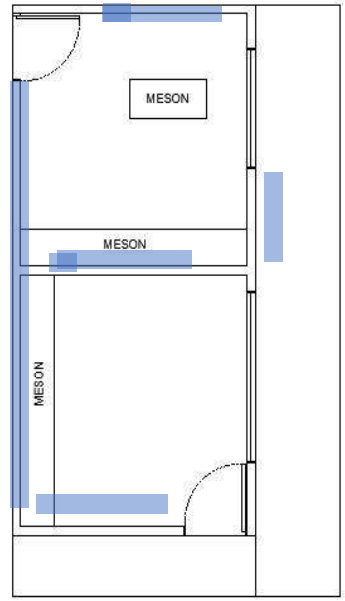

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cuarto compostaje				12,00	12,00

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		


I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







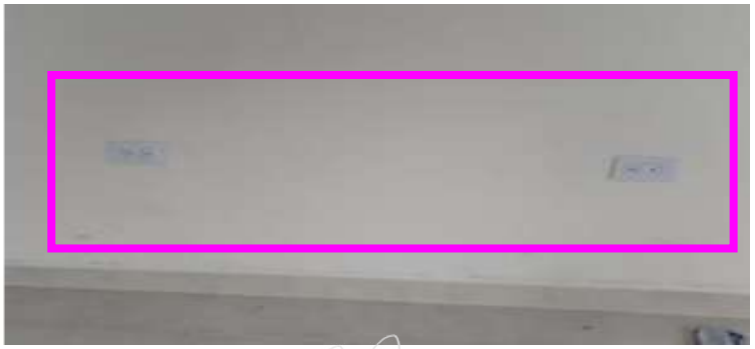

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,3	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

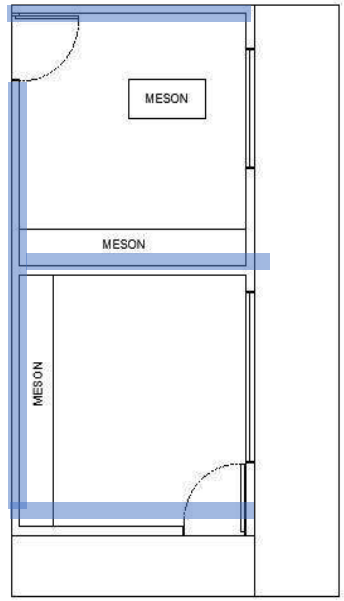

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cuarto compostaje (paredes y techos)			30,00		30,00
Subtotal				**ML**	30,00
Vienen					
TOTAL					**30,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,3	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico










DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,4	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

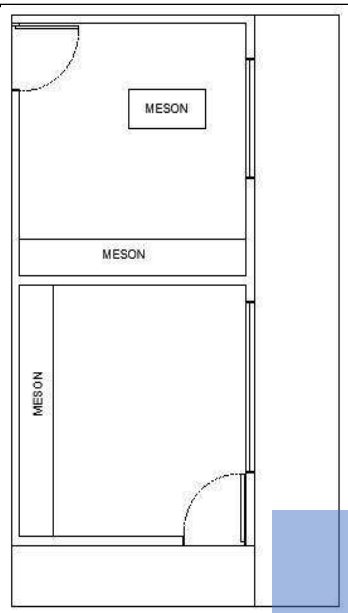PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Cantidad Total**
	**Tanques plasticos**				2,00	2,00
	Subtotal				**UND**	2,00
	Vienen					
	TOTAL					**2,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
48,4	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49.1	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

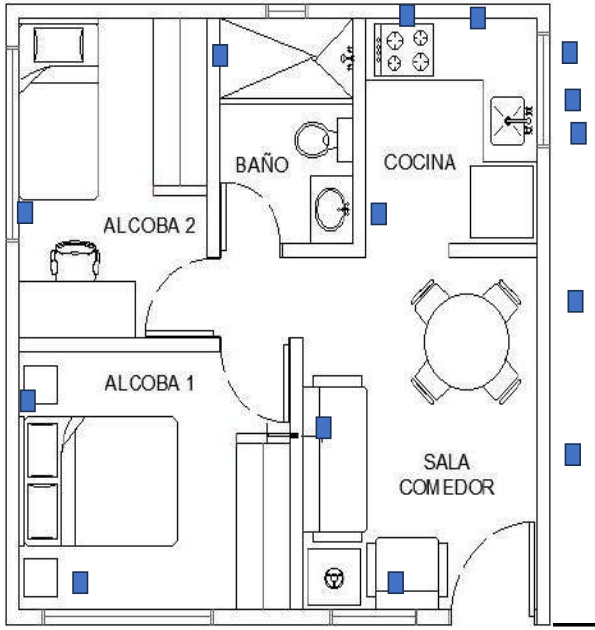

Localización				**No Elem.**	**Medida Total**
Toma doble				14,00	14,00
			Subtotal	**UND**	14,00
			Vienen		
			TOTAL		**14,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49.1	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico








DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49.3	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

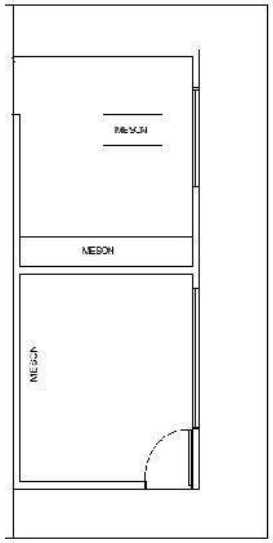PLANO	**Localización**	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
						
	Linea a tierra				1,00	1,00
	Subtotal				**UND**	1,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**1,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49.3	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,1	TUBO CUADRADO 100*100 * 2MM * 6MT	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

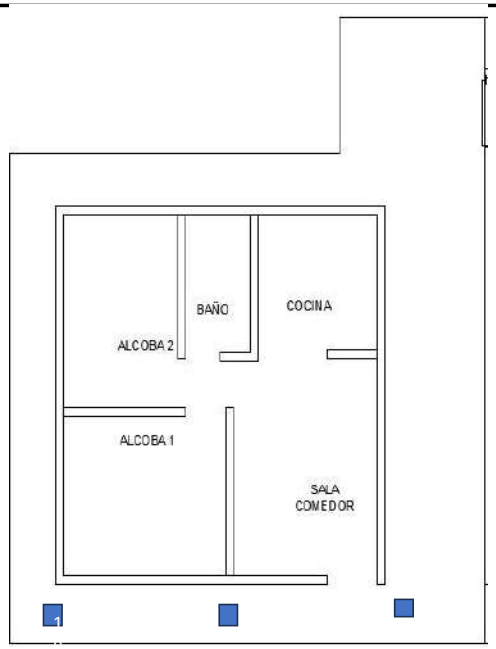

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Tubo cuadrado facada frontal				3,00	3,00
Subtotal				**UND**	3,00
Vienen					
TOTAL					**3,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,1	TUBO CUADRADO 100*100 * 2MM * 6MT	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,21	Lavaplatos en Acero Inoxidable 1.0 X 0.50 cm , incluye gridería y sifon.	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

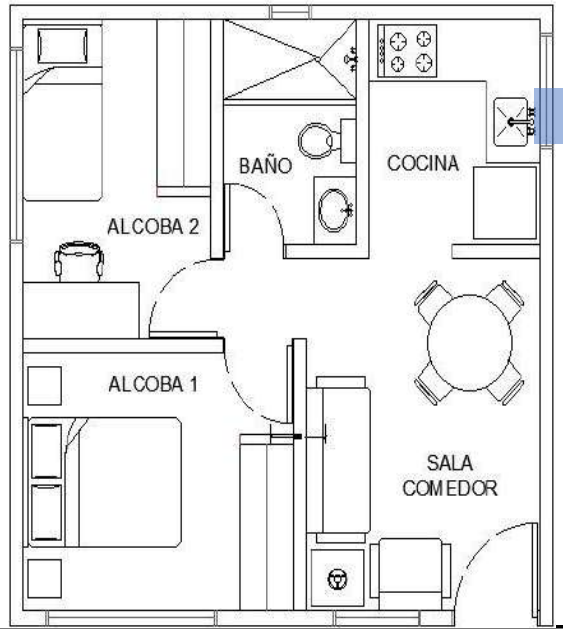

Localización				**No Elem.**	**Cantidad Total**
Lavaplatos				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,21	Lavaplatos en Acero Inoxidable 1.0 X 0.50 cm , incluye gridería y sifon.	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,23	GRIFERÍA CUELLO SISNE ACERO INOXIDABLE AGUA FRIA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

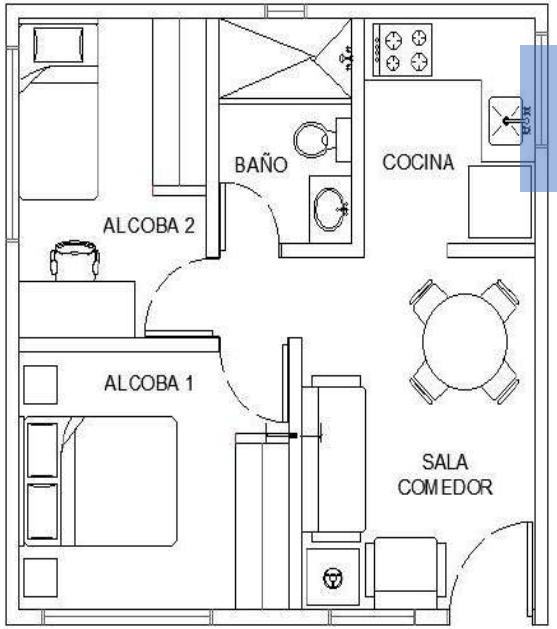

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Lavaplatos Casa administrador				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,23	GRIFERÍA CUELLO SISNE ACERO INOXIDABLE AGUA FRIA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,24	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO Y ENTREPAÑO EN CONCRETO, E= 5 CMS)	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

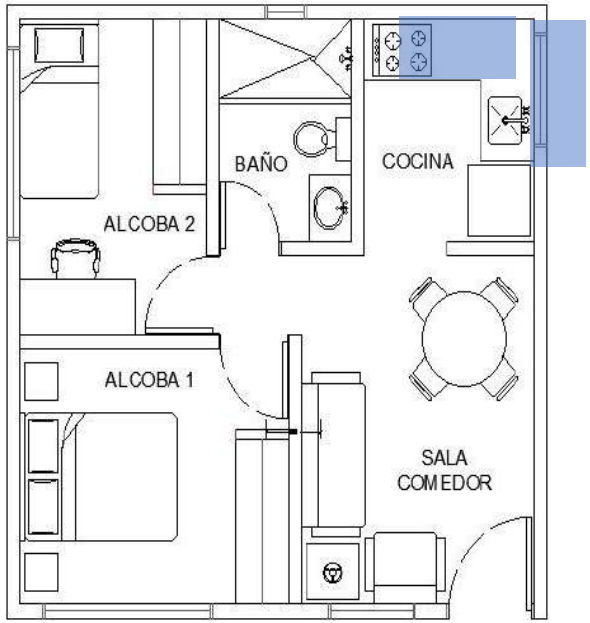

Localización	nero elemen	ANCHO	LARGO	**Huecos**	**Medida Total**
Meson estufa	**3**	0,65	1,75	-0,36	3,42
Meson lavaplatos	**3**	0,65	1,50	-0,16	2,94
			Subtotal	**M2**	6,36
			Vienen		
			TOTAL		**6,36**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,24	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO Y ENTREPAÑO EN CONCRETO, E= 5 CMS)	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,26	WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

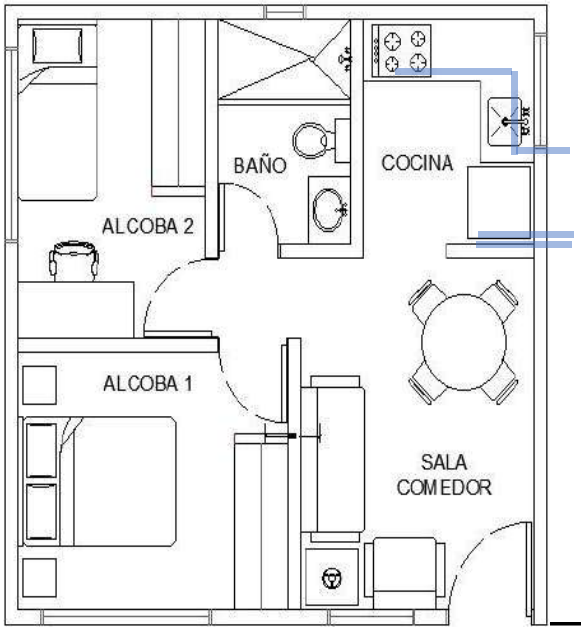

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Meson cocina			3,45		3,45
Entrepaño			2,63		2,63
Muro divisorio			6,16		6,16
Muro estufa			0,90	2,00	1,80
Muro lavaplatos			0,90	2,00	1,80
				Subtotal	**ML** 15,84
				Vienen	
				TOTAL	**15,84**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**										**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1								

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,26	WIN MEDIA CAÑA PARA PORCELANATO DE MESONES Y ENTREPAÑOS	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	1 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,27	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

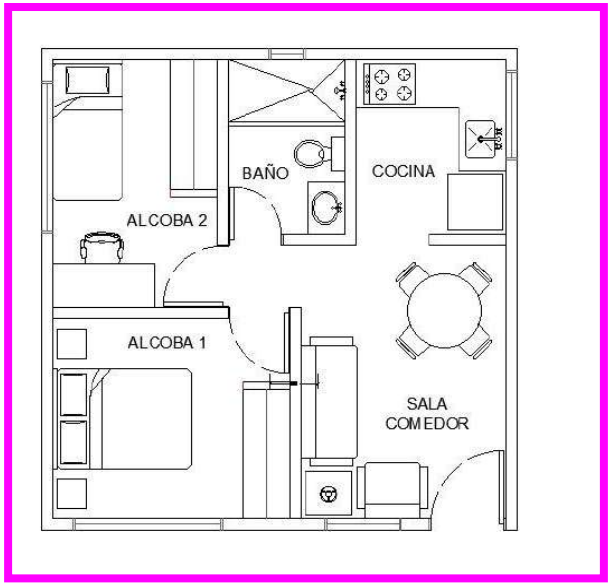

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Tuberia pvc conduit			26,50		26,50
Subtotal				**ML**	26,50
Vienen					
TOTAL					**26,50**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
49,27	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descripcion**	**Unidad**	**Ubicación**
50,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

PLANO

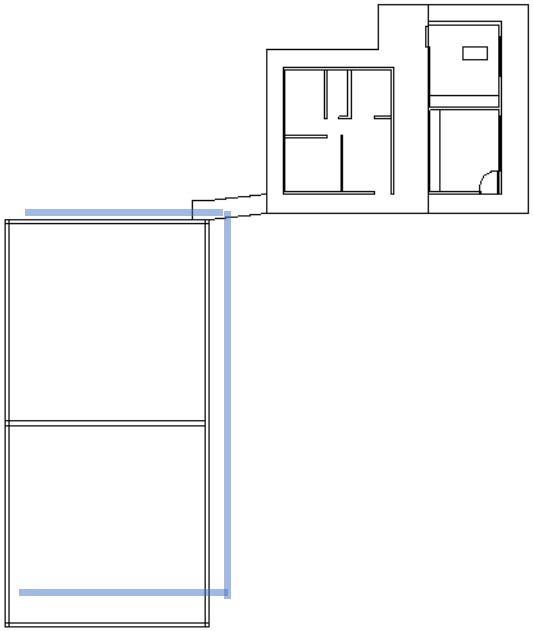

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Pañete parqueadero	0,62		22,00	1,00	13,64
	0,62		12,00	2,00	14,88
			Subtotal	**M2**	28,52
			Vienen		
			TOTAL		**28,52**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
50,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	**ITEMS NO PREVISTOS PARQUEADERO**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

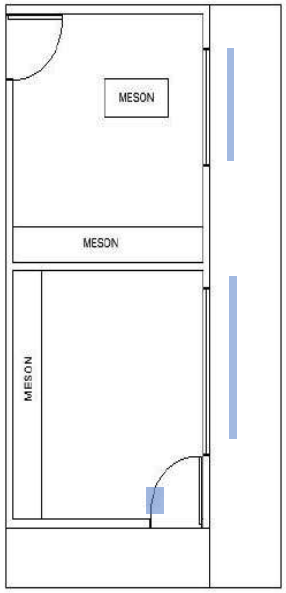

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta corrediza	2,45			2,00	4,90
		1,2			1,20
Puerta abatible	2,15				0,00
		1,15			1,15
Ventana 1	2,82			2,00	5,64
		1,1		2,00	2,20
Ventana 2	2,00			2,00	4,00
		1,5		2,00	3,00
				Subtotal	**ML** 22,09
				Vienen	
				TOTAL	**22,09**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,2	PUERTA CORREDIZA CON RIEL DE 1.20X2.45 INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

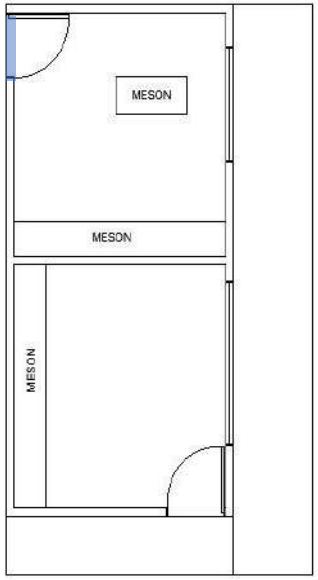

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Puerta corrediza	2,45	1,20			2,94
Subtotal				**M2**	2,94
Vienen					
TOTAL					**2,94**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,2	PUERTA CORREDIZA CON RIEL DE 1.20X2.45 INCLUYE MODULO ABATIBLE Y PUERTA CON MARCO Y CERRADURA DE INCRUSTAR, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE , BISAGRAS OMEGA , PINTURA ELECTROSTATICA	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

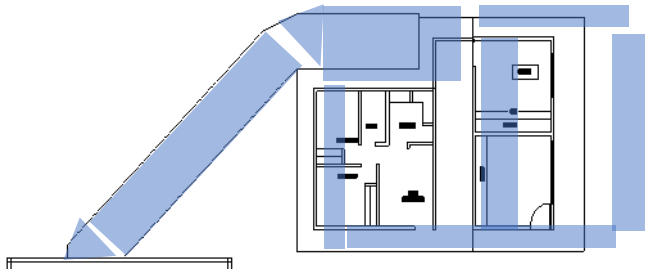

Localización	ALTO	ANCHO		**kg/m2**	**Medida Total**
Anden trasero admi	0,9	9,78		2,08	18,31
Anden trasero compostaje	0,9	7,23		2,08	13,53
Anden frontal	1,00	13,77		2,08	28,64
Anden lateral compostaje	1,60	8,88		2,08	29,55
Pasillo	2,00	9,71		2,08	40,39
Anden laterla admi	0,90	6,57		2,08	12,30
Ramapa parqueadero compostaje	2,50	22,30		2,08	115,96
			Subtotal	**KG**	258,68
			Vienen		
			TOTAL		**258,68**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,4	PINTURA EN ACEITE ESMALTADA A 2 MANOS	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

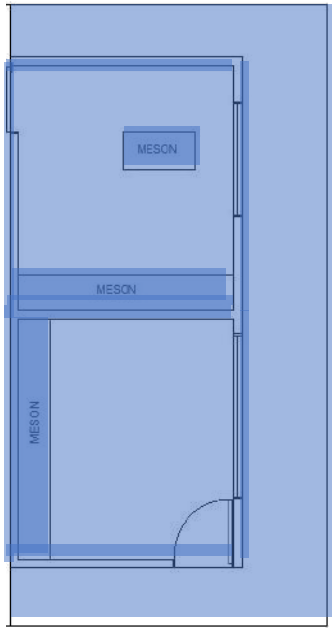

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**Huecos**	**Medida Total**
Pared trasera	2,3	4,33			9,96
Pared meson	2,9	4,33			12,56
Pared puerta corrediza	2,6	4,2			10,92
Puerta corrediza	2,45	1,2		-1	-2,94
Pared ventana	2,6	4,2			10,92
Ventana cuarto frente	1,99		1,5	-1	-2,99
Pared cuarto	2,9	4,33			12,56
Pared meson	2,6	4,16			10,82
Pared puerta	2,3	4,33			9,96
Puerta abatible	2,12	1,12		-1	-2,37
Pared ventana	2,6	4,16			10,82
Ventana cuarto trasero	0,99	2,82		-1	-2,79
Meson Cuarto 1	1,1	4,16			4,58
Meson cuarto 2	3	4,02			12,06
Meson tipo isla Cuarto 2	1,65	1,27			2,10
	1,65	0,65			1,07
Cubierta		5,93	10,78		63,93
Subtotal				**M2**	322,34
Vienen					
TOTAL					**322,34**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,4	PINTURA EN ACEITE ESMALTADA A 2 MANOS	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA


F O R M A T O	FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024	H O J A	1	DE	2

F E C H A	D	23	M	12	A	20	24	CORTE Nº	2	ODT	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,6	PINTURA PARA CUBIERTA EN ETERNIT ROJA A 3 MANOS	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

PLANO

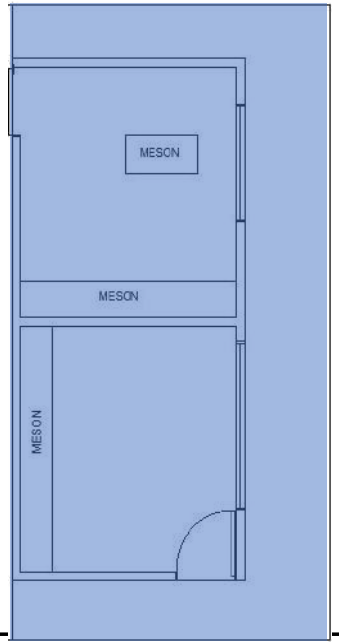

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Cubierta		5,93	10,78		63,93
Subtotal				**M2**	63,93
Vienen					
TOTAL					**63,93**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
52,6	PINTURA PARA CUBIERTA EN ETERNIT ROJA A 3 MANOS	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CUARTO COMPOSTAJE**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
53,1	Profundizacion pozo #2	UND	**ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**

PLANO

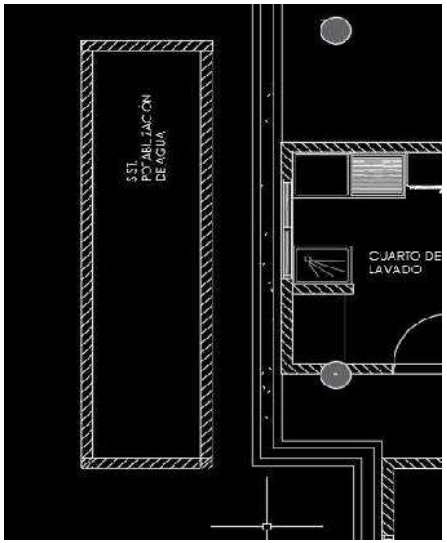

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Sistema de potabilización				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
53,1	Profundizacion pozo #2	UND	**ITEMS NO PREVISTOS** **SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**

Registro Fotografico

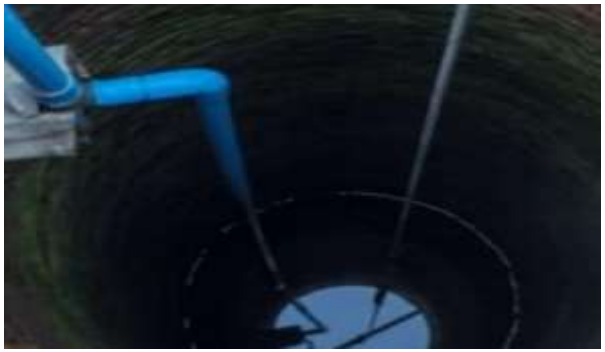






DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
53,2	Sistema de potabilizacion agua y sistema de Bombeo	UND	**ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**

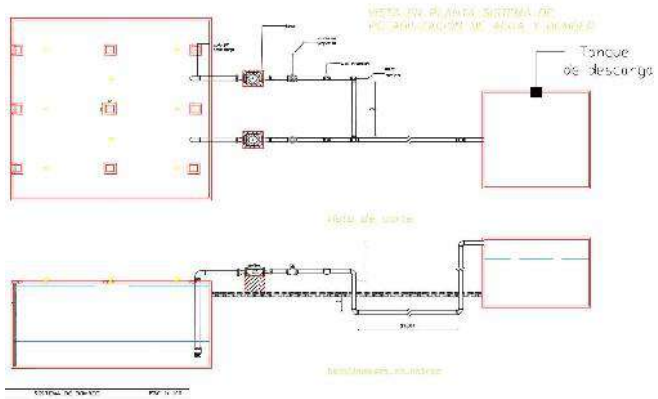PLANO	**Localización**				**No Elem.**	**Medida Total**
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**Posterior tanques bloque social**				1,00	1,00
	Subtotal				**UND**	1,00
OBSERVACIONES:	**Vienen**					
	TOTAL					**1,00**

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		


I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
53,2	Sistema de potabilizacion agua y sistema de Bombeo	UND	**ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**

Registro Fotografico







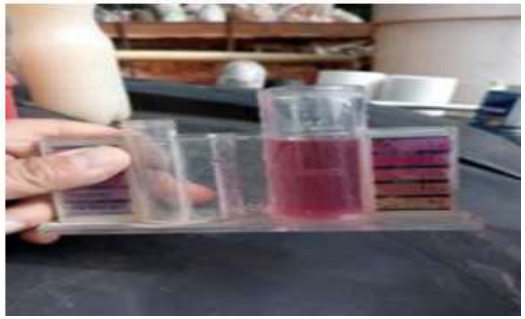

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA


F O R M A T O	FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024	H O J A	1	DE	2

F E C H A	D	23	M	12	A	20	24	CORTE Nº	2	ODT	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
53,4	Limpieza y desinfeccion de tanque de agua potable subterraneo en concreto con las siguientes medidas de 4 x 4 x 2,33 alto	UND	**ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**

PLANO

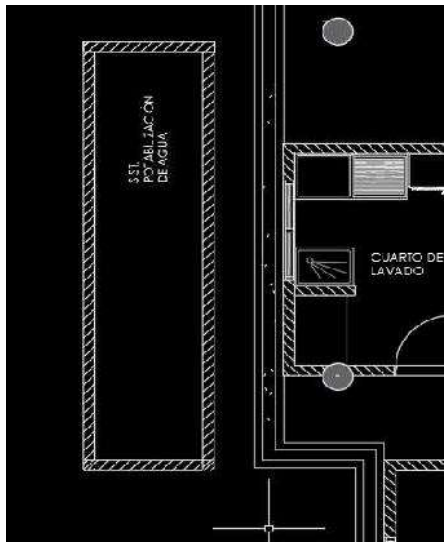

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Tanques subterraneos				2,00	2,00
				Subtotal	**UND** 2,00
				Vienen	
				TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
53,4	Limpieza y desinfeccion de tanque de agua potable subterraneo en concreto con las siguientes medidas de 4 x 4 x 2,33 alto	UND	**ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA DE POTABILIZACION AGUA Y TANQUES**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

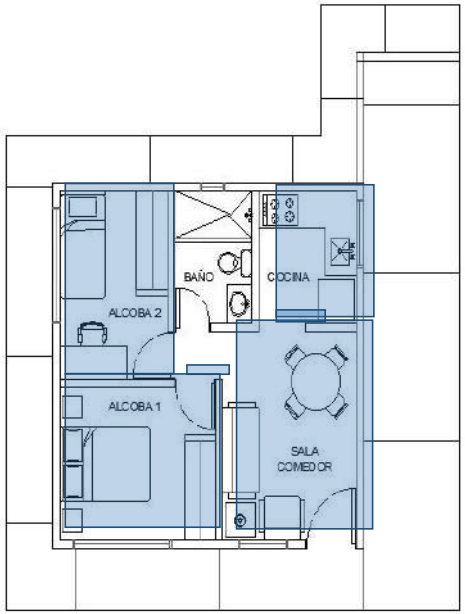

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Alcoba 2		2,86	2,45		7,01
Alcoba 1		2,89	3,25		9,39
Sala comedor		2,87	3,74		10,73
Cocina		2,40	2,40		5,76
Pasillo		0,80	0,93		0,74
				Subtotal	**M2** 33,63
				Vienen	
				TOTAL	**33,63**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**								**H O J A**	2	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO ACANALADO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

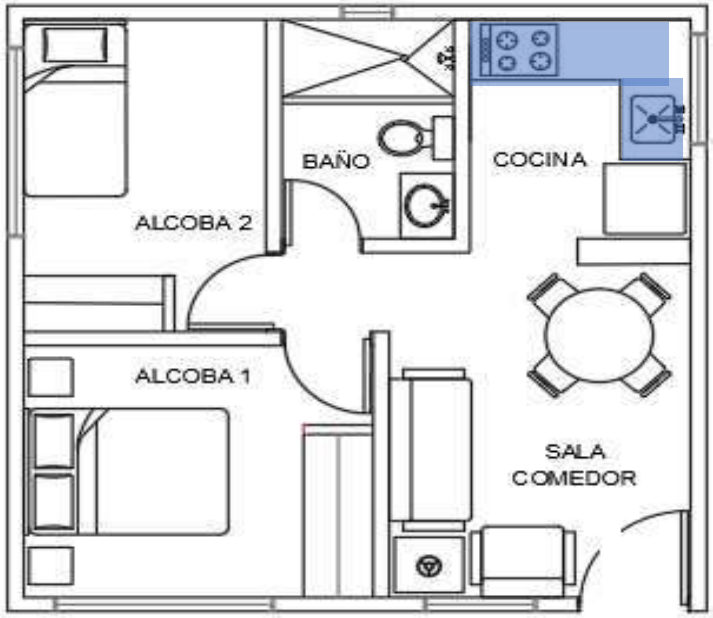

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Enchape meson estufa		0,58	2,40		1,39
Estufa		0,42	0,56	-1,00	-0,24
Enchape meson lavaplatos		0,58	1,05		0,61
Lavaplatos		0,50	1,00	-1,00	-0,50
Borde	0,04		2,87		0,23
Borde lavaplatos	0,90	0,58			0,52
Enchape entrepaño estufa		0,58	2,40		1,39
Muro estufa		0,13	1,16	-1,00	-0,15
Enchape entrepaño lavaplatos		0,58	0,87		0,50
Muro estufa meson	0,80	1,29			1,03
Muro estufa entrepaño	0,84	1,29			1,08
Muro lavaplatos meson	0,40	0,71			0,28
Muro lavaplatos entrepaño	0,42	0,71			0,30
salpicadero					
Subtotal				**M2**	6,46
Vienen					
TOTAL					**6,46**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO ACANALADO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

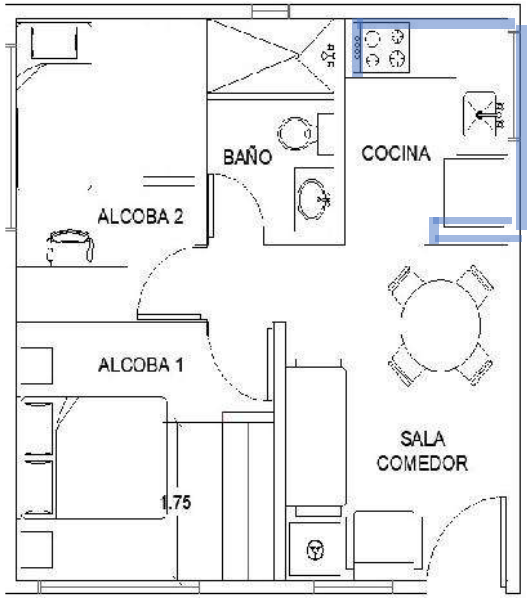

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Pared baño	1,72	0,58			1,00
Pared trasera	1,72	2,40			4,13
Pared ventana	1,72	2,40			4,13
Muro divisorio	1,12	1,40			1,57
Frente muro	1,12	0,28			0,31
Meson muro	1,40	0,28			0,39
				Subtotal	**M2** 11,53
				Vienen	
				TOTAL	**11,53**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,4	GUARDA ESCOBA CERAMICA de 8 x 55 CMS	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

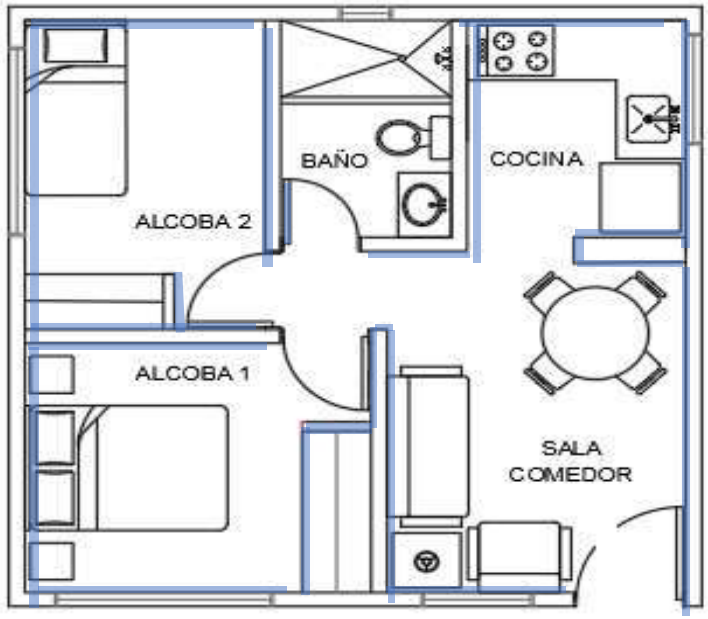

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Alcoba 1			11,30		11,30
Alcoba 2			10,65		10,65
Sala comedor			10,89		10,89
Cocina			11,16		11,16
Subtotal				**ML**	44,00
Vienen					
TOTAL					**44,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,4	GUARDA ESCOBA CERAMICA de 8 x 55 CMS	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS PIZARRA , T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

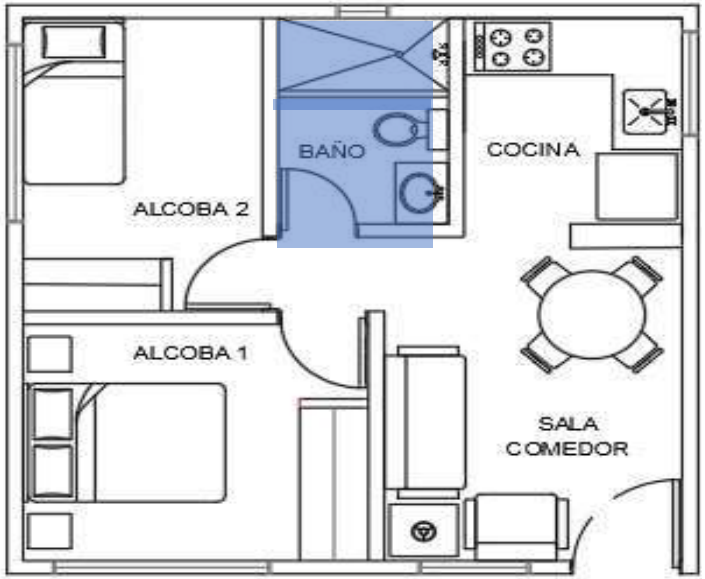

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Piso baño		1,29	2,38		3,07
Division ducha	0,08		1,29	2,00	0,21
Subtotal				**M2**	3,28
Vienen					
TOTAL					**3,28**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	


F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.55 X 0.55 METROS PIZARRA , T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



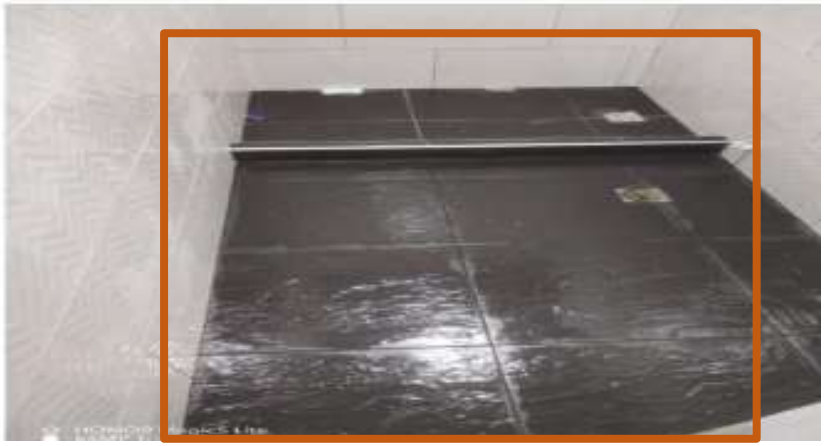

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PARED EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO (baño)	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

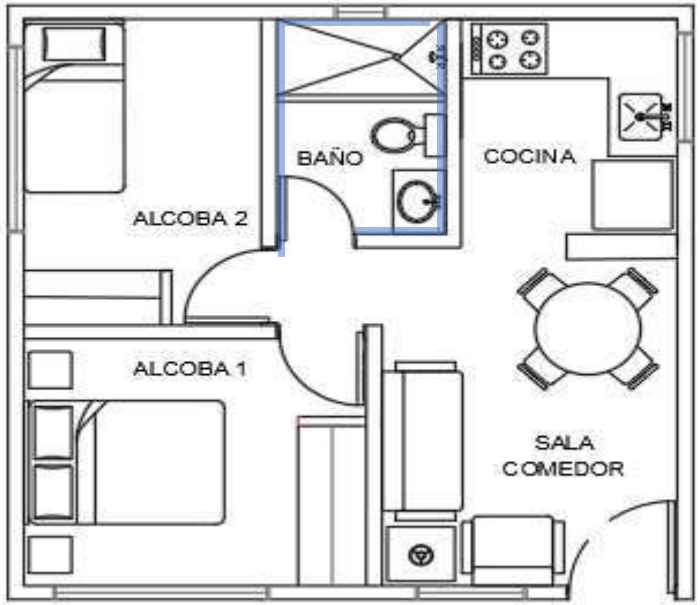

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**HUECOS**	**Medida Total**
Pared alcoba 1	2,70	2,38			6,43
Pared ventana	2,70	1,29			3,48
Ventana	0,30		0,77	-1,00	-0,23
Pared cocina	2,70	2,38			6,43
Pared pasillo	2,70	1,29			3,48
Puerta	2,20	0,70		-1,00	-1,54
			Subtotal	**M2**	18,05
			Vienen		
			TOTAL		**18,05**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	**23**	**M**	**12**	**A**	**20**	**24**	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PARED EN ENCHAPE CERÁMICO EN FORMATO DE 0.30 X 0.60 METROS, T INCLUYE ALFALISTO Y ALFACOLOR, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO (baño)	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,7	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO 20X20 PARA PISO CON DISEÑO EXCLUSIVO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

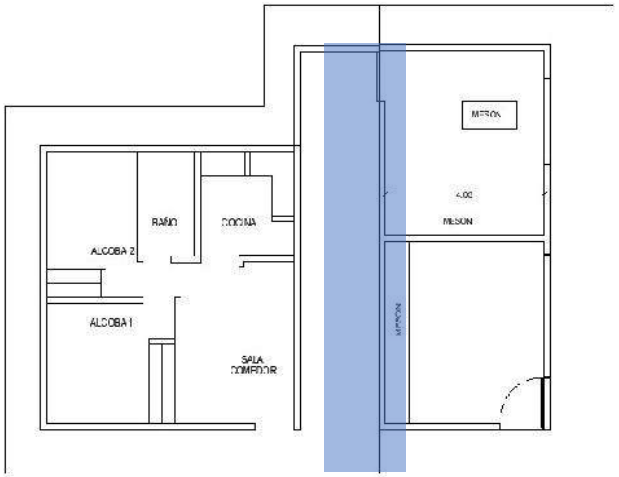

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Porcelanato		2,00	9,71	1,00	19,42
Guarda escobas	0,11		8,71	2,00	1,92
		0,60	0,60	-21,00	-7,56
corredor frente		0,90	12,60	1,00	11,34
guarda escoba	0,11		10,60	1,00	1,17
		0,60	0,60	-8,00	-2,88
				Subtotal	**M2** 23,41
				Vienen	
				TOTAL	**23,41**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S


F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,7	SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO 20X20 PARA PISO CON DISEÑO EXCLUSIVO	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico

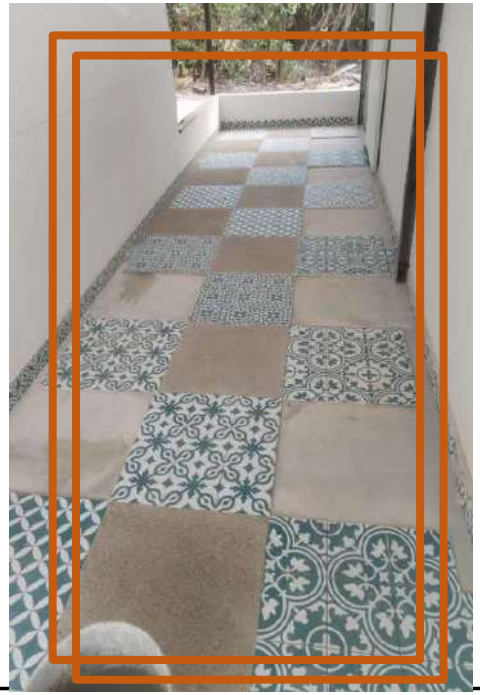



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,8	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

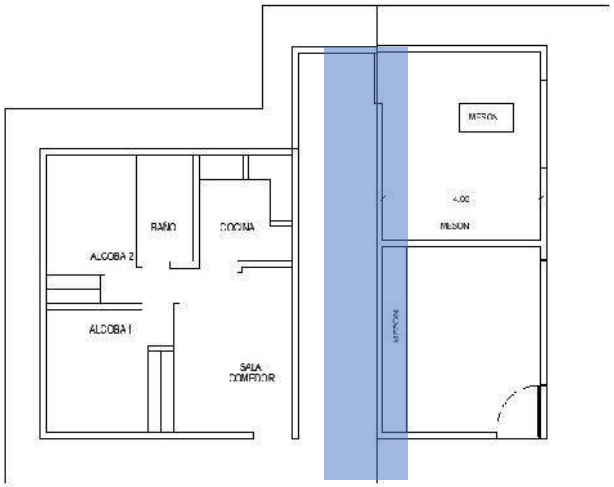

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Acabado gravilla		2,00	9,71	1,00	19,42
		0,60	0,60	-21,00	-7,56
		0,90	12,60		11,34
		0,60	0,60	-12,50	-4,50
Subtotal				**M2**	18,70
Vienen					
TOTAL					**18,70**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,8	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1					

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MADERA PARA BAÑOS	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

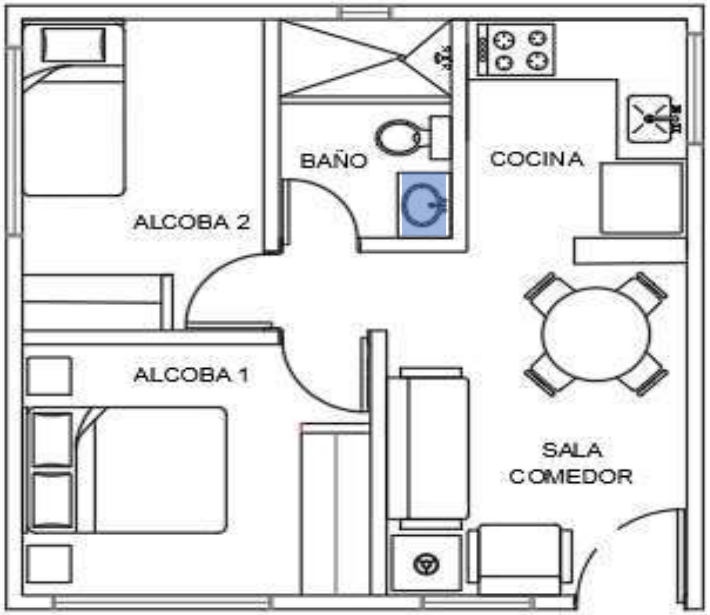

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Meson en madera			0,75	2,00	1,50
Subtotal				**ML**	1,50
Vienen					
TOTAL					**1,50**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	


F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MADERA PARA BAÑOS	ML	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico



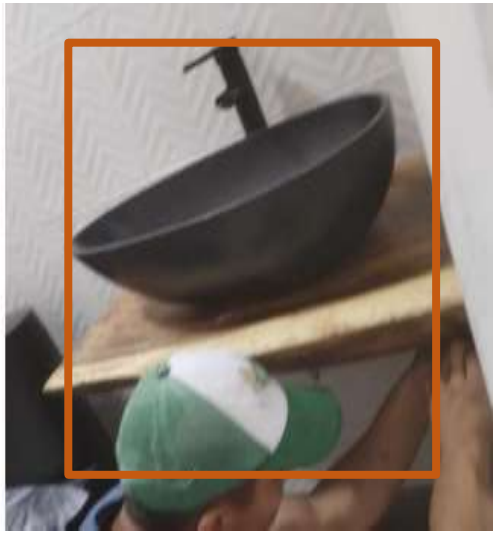



DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS VESSEL SEGNO BLACK (600*350*160 (mm))	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

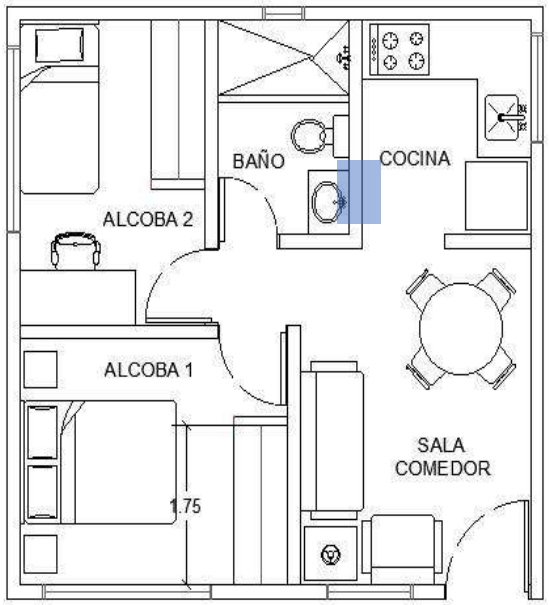

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Lavamanos				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS VESSEL SEGNO BLACK (600*350*160 (mm))	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,11	MONOCONTROL PARA LAVAMANOS COLOR NEGRO	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

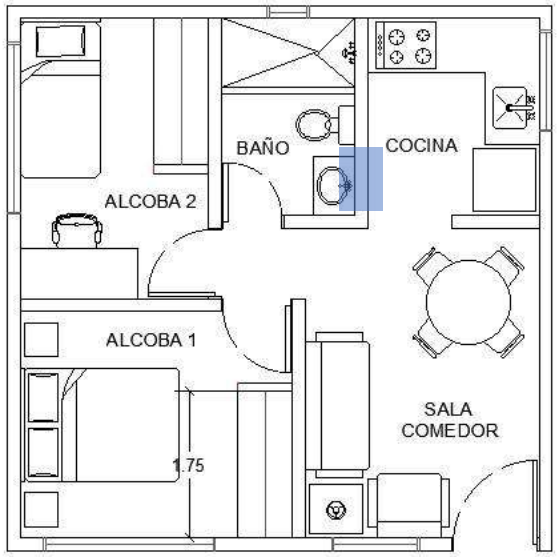

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Llave lavamanos				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,11	MONOCONTROL PARA LAVAMANOS COLOR NEGRO	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,12	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER VULCANO NEGRO MATE (680X380X780 (mm)). DOBLE PULSADOR DE DESCARGA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

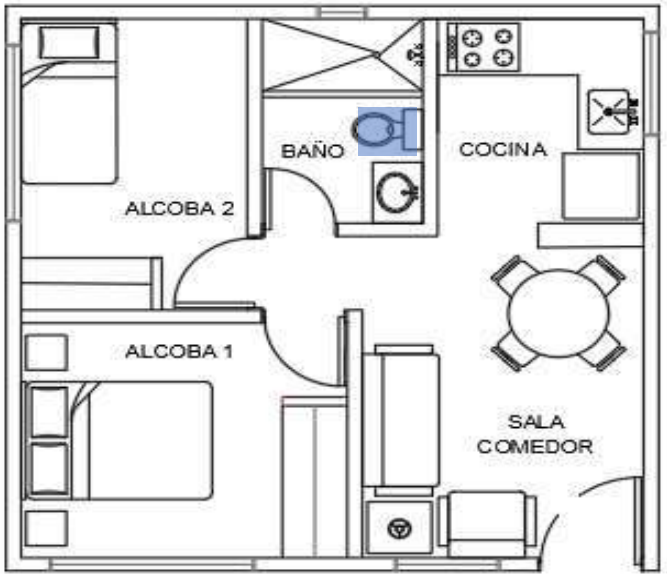

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Sanitario				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,12	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER VULCANO NEGRO MATE (680X380X780 (mm)). DOBLE PULSADOR DE DESCARGA	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,13	KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO SET 5 PIEZAS	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

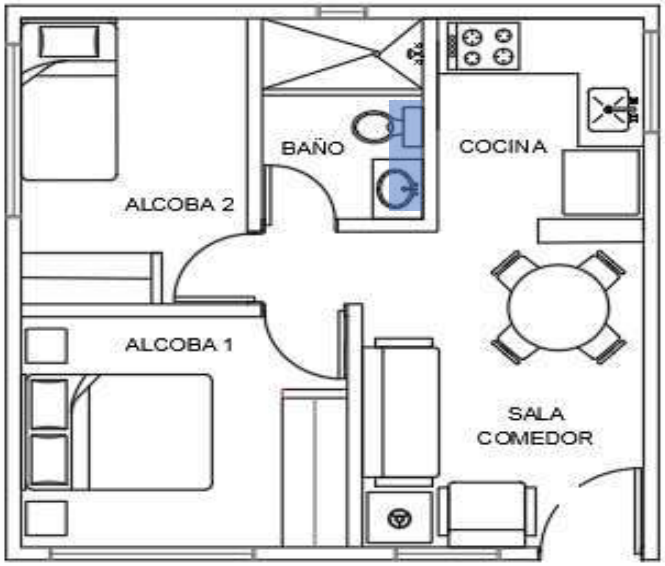

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Baño				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,13	KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR NEGRO SET 5 PIEZAS	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,14	EXTRACTOR DE OLORES HELICOIDAL 6" EXTRAPL DECOR200 127V PARA BAÑO	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

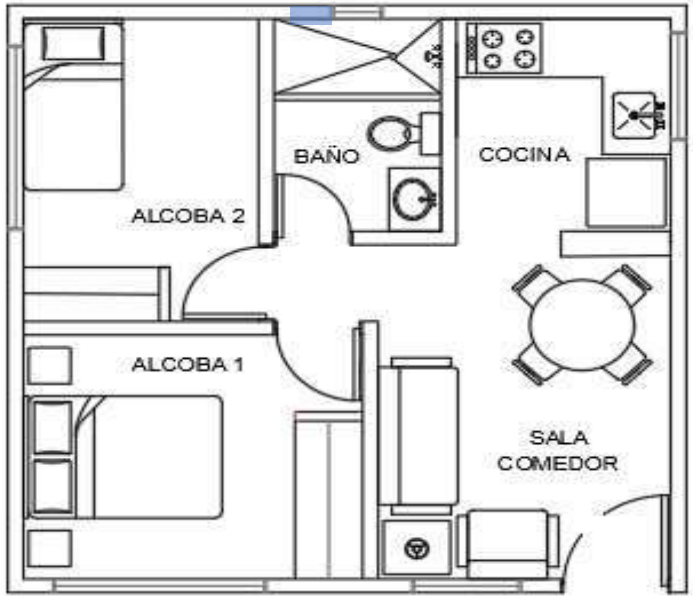

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Baño				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,14	EXTRACTOR DE OLORES HELICOIDAL 6" EXTRAPL DECOR200 127V PARA BAÑO	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico







DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,16	ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIBLE DE 58.5 CMS GAS NATURAL	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

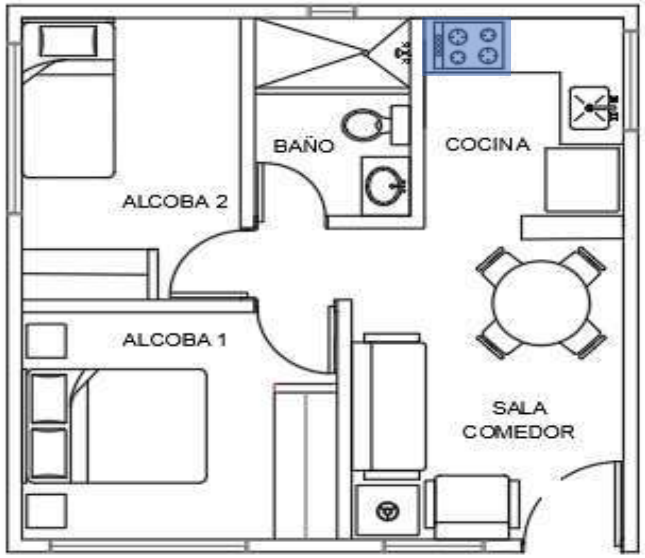

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Estufa de empotrar				1,00	1,00
Subtotal				**UND**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	2	DE	2		
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,16	ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIBLE DE 58.5 CMS GAS NATURAL	UND	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1 DE 2	
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,17	VENTANA EN ALUMINIO 744 TIPO NEGRA INCLUYE VIDRIO 4MM	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

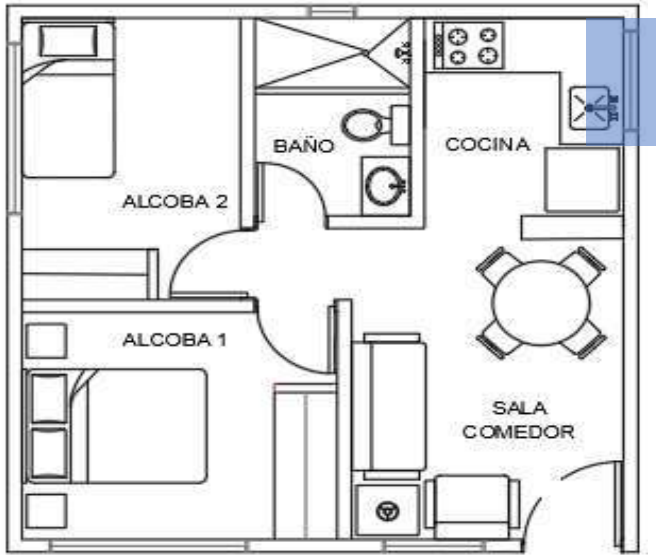

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Ventana				1,00	1,00
Subtotal				**M2**	1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,17	VENTANA EN ALUMINIO 744 TIPO NEGRA INCLUYE VIDRIO 4MM	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico





DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,18	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=8MM	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

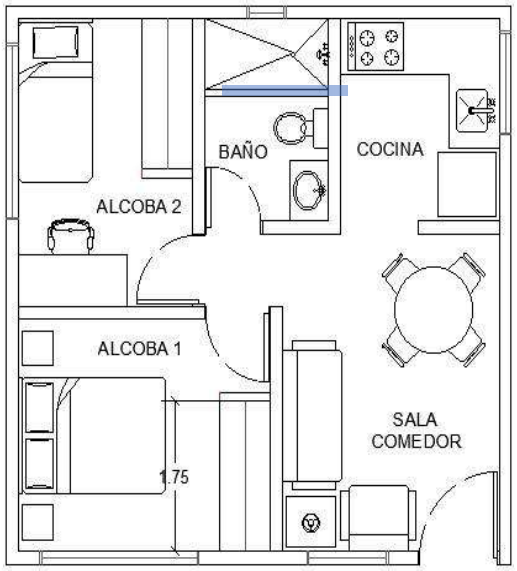

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Division de muro	1,80		1,29		2,32
Subtotal				**M2**	2,32
Vienen					
TOTAL					**2,32**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O	**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**	**H O J A**	2 DE 2	

F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,18	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=8MM	M2	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.


PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT: 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O					**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**							**H O J A**	1	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1				

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,19	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

PLANO

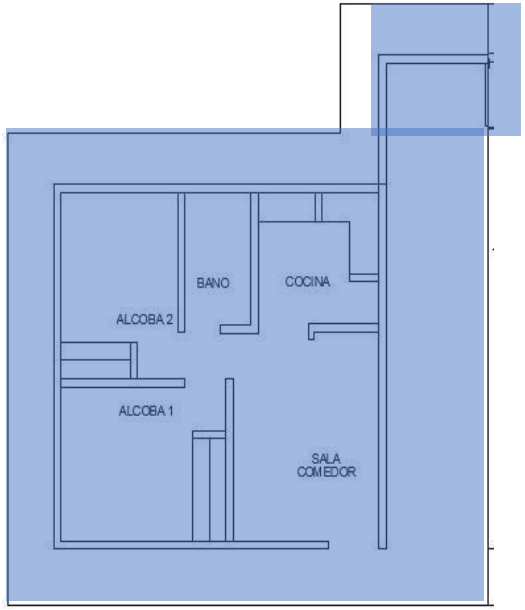

Localización	ALTO	ANCHO	LARGO	**No Elem.**	**Medida Total**
Sobrantes obra	0,50	5,54	5,57		15,43
Subtotal				**M3**	15,43
Vienen					
TOTAL					**15,43**

OBSERVACIONES:

DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

PENSIONES CUNDINAMARCA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA**	ROMING NIT 900.810.543-8 S.A.S

F O R M A T O								**FECHA CORTE No 23 DE DICIEMBRE 2024 - 28 DE FEBRERO 2024**					**H O J A**	2	DE	2
F E C H A	**D**	23	**M**	12	**A**	20	24	**CORTE Nº**	2	**ODT**	1						

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPLEJO ARQUITECTONICO SEDE ADMINISTRATIVA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATISTA	ROMING SAS	900.810.543-8	**CONTRATO Nº**	UAEPC-214-2024
INTERVENTOR	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	80.099.370		

I T E M	**Descrpcion**	**Unidad**	**Ubicación**
56,19	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA A UNA DISTANCA MENOS A 1 0 KM	M3	**ITEMS NO PREVISTOS CASA ADMINISTRADOR**

Registro Fotografico









DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	ROMING SAS	.
Vo.Bo. INTERVENTORIA	Vo.Bo. SUPERVISION UAEPC	CONTRATISTA	.

Bogotá D.C., abril 4 de 2025

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo, DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 80.099.370 de Bogotá, en mi calidad de Persona Natural, certifico que me encuentro al día con el pago de los aportes parafiscales, del personal empleado, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A continuación, relaciono el personal vinculado:

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANÍA
JUAN EFRAÍN CAMELO TRUJILLO	11.431.293
DIDIER IVÁN GONZALEZ FORERO	80.099.370
JERZY JOSÉ ACOSTA MORENO	86.059.453

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por mí, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el 2 de abril de 2025.

Cordialmente,

Firma: _____
R/L: **DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO**
C.C.: **80.099.370 de Bogotá D.C.**
Profesión: **INGENIERO CIVIL**

Oficina Principal: Calle11a No 11-46 Facatativá – Cundinamarca
Teléfono móvil: (+57 1) 3185714635
E-mail: ingivangonzalezf@gmail.com

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-20, 11:36:58 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1071326212

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-03-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO				
Documento	CC 11431293	**Dirección**	CR 1 SUR NO 3-81 int 2 barrio la paz		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8923248		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11431293		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					CAMELO TRUJILLO JUAN EFRAIN	25269000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	0	0			$ 2.800.000	25-14		16 %	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 798.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80099370	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO	CALLE 11A No. 11-46	8901255	ingivangonzalez@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	01/04/2025	84722768	$624.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	14	2.200	0	252.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	14	2.900	0	322.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	48.800				48.800	14	500	49.300			488	49.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	252.200
Pensión	1	320.000	322.900
Riesgos Laborales	1	48.800	49.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.800	624.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80099370	DIDIER IVAN GONZALEZ FORERO		CALLE 11A No. 11-46	8901255	ingivangonzalez@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	01/04/2025	84722768	$624.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80099370	GONZALEZ FORERO DIDIER IVAN	57	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	3	48.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86059453	JERZY JOSE ACOSTA MORENO	CL 86A 69T 81 AP 1302 TR 4 SOLARIUM DE [illegible]	9054859	jjacosta257@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	19/03/2025	85101691	$506.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	6	400	99.500			991	99.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	1	99.100	99.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	506.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86059453	JERZY JOSE ACOSTA MORENO	CL 86A 69T 81 AP 1302 TR 4 SOLARIUM DE [illegible]	9054859	jjacosta257@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	19/03/2025	85101691	$506.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86059453	ACOSTA MORENO JERZY JOSE	57	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
