PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
PROYECTO IMPUESTO AL CARBONO AISLAMIENTO

ACTA DE RECIBIDO No 001
Fecha: diciembre de 2023

Área Protegida	PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUIDEAS		
Nombre del Beneficiario	PNNO	Documento de Identidad	
Nombre del Acuerdo			
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	**URRAO**
Comunidad	PNNO	Coordenadas	
Convenio y/o contrato en que se enmarca la inversión	IMPUESTO AL CARBONO CONTRATO DE OBRA 003 DE 2023		

Con el proyecto de impuesto al carbono, inicia la ejecución del Contrato De Obra Pública Nación No. 003 de 2023 con la empresa **ASOCIACION FUENTES VERDES DE COLOMBIA** en el mes de diciembre con el objeto de *"Contratar la instalación de aislamientos que incluye suministro de materiales con el fin de garantizar acciones y actividades de Restauración Ecológica Participativa en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas",* por valor de **$ 59.221.374**. El aislamiento es de 3.000 metros lineales en la vereda calles por todo el borde del Rio Calles para evitar el ingreso de semovientes ya que al otro lado del rio, habitan campesinos que subsisten económicamente del ganado.

Por lo anterior fue necesario adquirir los siguientes insumos para realizar el asilamiento de 3 kilómetros lineales:

Bienes, equipos y maquinarias relacionadas:

ÏTEM	BIEN	DESCRIPCIÓN	Marca, Número de Motor, Número de Serie	CANT.
1	Alambre de púa	Calibre 14,5 x 500m		**20**

2	Poste de acero	Largo 1.82 m peso: 3.4kg		**1000**
3	Grapa	(Clip galvanizado para alambre de Púa)		**3900**
4	Puntilla de hierro con	cabeza de 5 pulgadas Cajas de gramos 1000.		**3**
5	Guantes	Guantes de carnaza		**3**
6	Martillo	Para poste de Acero Q235 con manijas (altura 60 cm, diámetro cilindro 8 cm)		**3**
7	Estacón	Estacón Inmunizado 2.20 mts X 9 cm cilindrado		**99**
8	Machete	Machete 3 rayas esmaltado 18 pulgadas con cubierta de cuero de 16 pulgadas		**3**

La empresa realizó la instalación del cercado en la vereda de calles desde el predio de la Cascajosa hasta el predio el Hospital cada 2,5 metros y cada 30 metros la instalacion de pie de amigo.

El hincado se realizó con los postes de pie de amigo de madera inmunizada rolliza a 50 cmt de profundidad y los postes de acero de 1.82 metros a 35 cm de profundidad hincados a presión con martillo de 7,5 kilogramos.

El personal del PNNO realizó seguimiento donde se verificó la instalacion de 3 hilos alambre de PUA calibre 14.5, la instalacion de postes de pie de amigo y la instalacion de los postes de acero.

El transporte mayor se realizó en camion hasta el corregimiento de la Encarnación y desde alli transporte menor con semovientes (mula) hasta el lugar de trabajo (Vereda Calles) PNNO.



















dic. 08,2023 02:58:19 p. m.

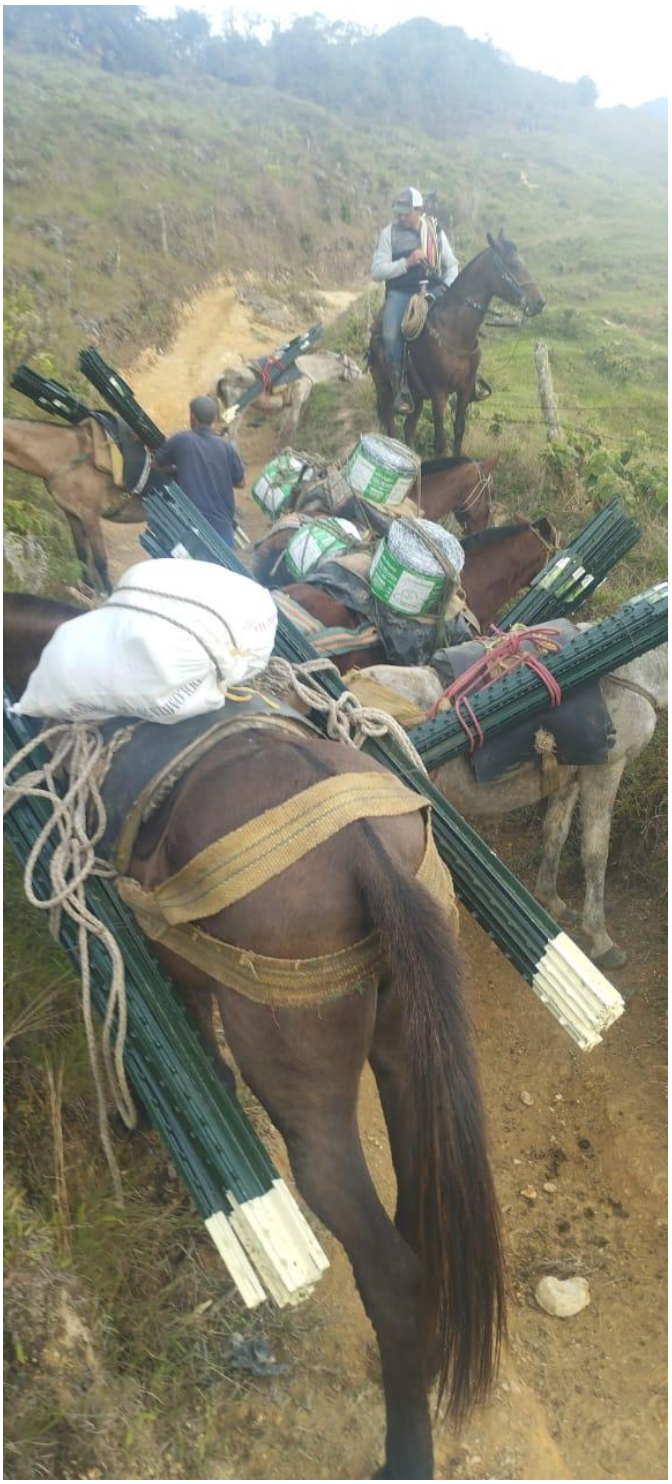


dic. 08,202





Por lo anterior se aprueba la entrega de insumos del contrato de obra 003 de aislamiento para el Parque Nacional Natural Las Orquídeas.

Para constancia se firma en Urrao a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.

Diana Nieves

FIRMA QUIEN RECIBE
DIANA CAROLINA NIEVES VARGAS
CONTRATISTA PARQUE LAS ORQUIDEAS
CC 1.015.410.513

FIRMA QUIEN ENTREGA
MAURO FAVIAN SALAZAR BUITRAGO
COORDINADOR TECNICO FUNVERCOL
CC 7.253.321

JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR
JEFE PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUIDEAS
