CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 6703345 DE 2024



"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT: 9.658.796-1

PERIODO DEL INFORME
01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Objeto de Interventoría:	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	
Título de Documento:	Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 5 (01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025).	
Documento No:	INFM-005	
APROBACIÓN		
	Nombre:	**ING. FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	31-01-2025
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA**
Vo Bo director de interventoría:	Firma:	
		31-01-2025

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 6
2.1 Generalidades del contrato 6
2.2 Localización del Proyecto y Descripción 7
2.3 Organigrama del contrato 8
2.4 Plazo de ejecución 8
2.5 Análisis de costos del contrato de interventoría para el contrato 9

3. ASPECTOS FINANCIEROS 11
3.1 Control Presupuestal 11
3.2 Avance Financiero 11

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS 12
4.1 Cronología contractual 12
4.2 Control de Pólizas 12
4.3 Actas generadas 14
4.4 Comités de Obra y Reuniones 14
4.5 Relación de personal y aportes Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales 14
4.6 Instalaciones administrativas 15
4.7 Transporte 16

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 16
5.1 Actividades Básicas 16
5.2 Funciones principales realizadas 17
5.3 Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación 18
5.4 Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social 18
5.5 Seguimiento y control del Plan de Gestión Social 19
5.6 Seguimiento y control al Estado del Tiempo 19
5.7 Seguimiento y control al plan de calidad 19
5.8 Seguimiento y control de Seguridad Industrial 19
5.9 Seguimiento y control Técnico de la Obra 19

6 SEGUIMIENTO A AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL.....20

7 ENSAYOS DE LABORATORIO.....21

8 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....21

9 CONCLUSIONES.....52

10 ANEXOS.....53

1 INTRODUCCIÓN

Mediante proceso contractual N0. CM001 DE 2024, suscribió el contrato de interventoría No. 6703345 DE 2024 cuyo objeto contractual es: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” con el Ingeniero JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con cedula de ciudadanía No 9.658.796 de Yopal, por un valor inicial de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($145.160.800,00) y un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses. El 19 de diciembre de 2024 se avala una adición de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOSIENTOS SEIS PESOS ($57.258.806,00) para un valor total de DOSCIENTOS DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($202.272.390,00) y una prórroga de ejecución de dos (2) meses.

El propósito del presente informe es proporcionar una guía metodológica general para el programa de interventoría, con el fin de establecer los procesos y procedimientos administrativos que están interrelacionados, de manera interdisciplinaria y en un orden coherente, que describe el desarrollo del contrato de interventoría para REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

En el presente informe se describen todas las actividades ejecutadas por el contratista de interventoría en el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

2.1 Generalidades del contrato

En el siguiente cuadro se muestran los aspectos más importantes del contrato de interventoría:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
PROCESO CONTRACTUAL:	LP003 DE 2024
CONTRATO DE:	OBRA
No. DEL CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6698166
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($145.160.800,00)
VALOR ADICIONAL 1:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($ 57.111.590,00)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 202.272.390,00)
NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE EJECUCION PRORROGA 1:	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA	28 DE FEBRERO DE 2025

2.2 Localización del Proyecto y Descripción

1. Palacio de justicia de granada (Meta)	2. Sede judicial el Yary, Villavicencio (Meta)	3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)
		
4. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	5. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	6.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),
		
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),		
		

Ilustración 1 Localización de las zonas.

2.3 Organigrama del contrato

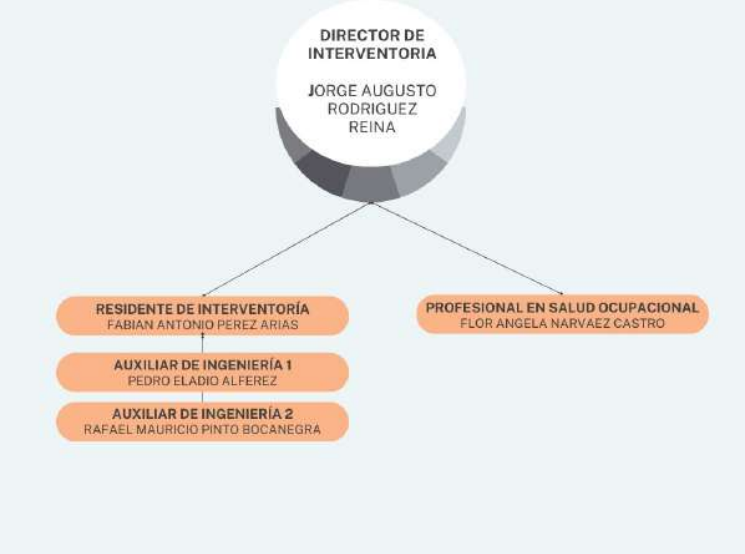


Ilustración 2 Organigrama del contrato de Interventoría a partir del 03 de enero de 2025.

2.4 Plazo de ejecución

El contrato estaba previsto para ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2024, a partir del acta de inicio. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2024, se realizó una adición de $57.111.590 y una prórroga de dos meses, quedando la fecha de finalización del contrato actualizada al 28 de febrero de 2025. En circunstancias excepcionales, como fuerza mayor o caso fortuito, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre y cuando la naturaleza de las obligaciones lo permita, no se infrinjan normas de orden público y se tomen medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

OBJETO	PLAZO ACTUAL	ACTA DE INICIO	PLAZO TRANSCURRIDO	% DE TIEMPO TRANSCURRIDO
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL	SEIS (6) MESES	04/09/2024	(150) días	84,75%

2.5 Análisis de costos del contrato de interventoría para el contrato

CONTRATO DE INTERVENTORIA 6703345 DE 2024 resultante del Proceso de Contratación CM001 DE 2024

Cantidad	Descripción	Dedicación	Salario Básico	Tiempo (Meses)	Total mensual
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	50%	**$4.900.000,00**	4,00	9.800.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	100%	**$4.250.000,00**	4,00	17.000.000,00
3	AUXILIAR DE INGENIERÍA (Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura)	100%	**$1.700.000,00**	4,00	20.400.000,00
1	Profesional en Salud Ocupacional	100%	**$2.100.000,00**	4,00	8.400.000,00
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	**$ 55.600.000,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,10**
				COSTOS PERSONAL	**$ 116.760.000,00**
				OTROS COSTOS DIRECTOS	**$5.223.865,55**
				COSTO BASICO	**$ 121.983.865,55**
				IVA (19%)	**$ 23.176.934,00**
				COSTO TOTAL	**$ 145.160.799,55**
				VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	**$ 145.160.800,00**

DESGLOSE DE OTROS COSTOS DIRECTOS PARA PERIODO DE OFERTA ECONÓMICA INICIAL (DEL 04/09/2024 AL 03/01/2025)

VALOR OTROS COSTOS DIRECTOS PERIODO INICIAL	CONCEPTO	# MESES	COSTO MENSUAL
$5.223.865,55	ALQUILER DE CAMIONETA	4	$1.305.966,39

2.6. Oferta económica actualizada según Modificatoria N°1 Adición N°1 y Prórroga N°1 suscrita el 19/12/2024

ITEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA INICIAL							CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION (HOMBRE-MES)	TIEMPO EN MESES	SALARIOS		VALOR/ TOTAL	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION (HOMBRE-MES)	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1	50,00%	4,00	$ 4.900.000,00		$ 9.800.000,00	1	50,00%	4,00	$ 9.800.000,00
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1	25,00%		$ 4.900.000,00		$ -	1	25,00%	2,00	$ 2.450.000,00
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1	100,00%	4,00	$ 4.250.000,00		$ 17.000.000,00	1	100,00%	6,00	$ 25.500.000,00
3	AUXILIAR DE INGENIERÍA (Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura)	3	100,00%	4,00	$ 1.700.000,00		$ 20.400.000,00	3	100,00%	4,00	$ 20.400.000,00
3.1	AUXILIAR DE INGENIERÍA (Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura)	2	95,00%		$ 1.700.000,00		$ -	2	95,00%	2,00	$ 6.460.000,00
4	Profesional en Salud Ocupacional	1	100,00%	4,00	$ 2.100.000,00		$ 8.400.000,00	1	100,00%	6,00	$ 12.600.000,00
A+B+C+D	SUBTOTAL PERSONAL						$ 55.600.000,00				$ 77.210.000,00
E	FACTOR MULTIPLICADOR						2,10				2,10
F	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B+C+D) * E						$ 116.760.000,00				$ 162.141.000,00
	COSTOS DIRECTOS										
ITEM	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR TOTAL
5	OTROS COSTOS DIRECTOS	GLOBAL	1,00	100%	4,00	$ 1.305.966,39	$ 5.223.865,55	1,00	100,00%	6,00	$ 7.835.798,33
G	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 5.223.865,55				$ 7.835.798,00
H	TOTAL COSTOS(F+G)						$ 121.983.865,55				$ 169.976.798,00
I	IVA SOBRE (H) (19) %						$ 23.176.934,00				$ 32.295.592,00
	VALOR TOTAL (H+I)						$ 145.160.800,00				**$ 202.272.390,00**

DESGLOSE DE OTROS COSTOS DIRECTOS PARA PERIODO DE OFERTA ECONÓMICA SEGÚN ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1 (DEL 04/01/2024 AL 28/02/2025)

VALOR OTROS COSTOS DIRECTOS PERIODO PRÓRROGA N°1	CONCEPTO	# MESES	COSTO MENSUAL
$2.611.932,78	ALQUILER DE CAMIONETA	2	$1.305.966,39

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Control Presupuestal

- **CDP Inicial:**

El valor del contrato se encuentra amparado de acuerdo con el certificado de disponibilidad No 7524 del 30 de abril de 2023

CERTIDICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
UNIDAD	**No.**	**FECHA DE EXPEDICION**	**RUBRO**	**RECURSO**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR A AFECTAR**
27-01-02-015	7524	2024-04-30	C-2701-080037-20111D2701019-02	16	$145.160.810	$145.160.810

- **CDP Adición N°1:**

El valor de la adición N°1 al contrato se encuentra amparado de acuerdo con el certificado de disponibilidad No 26524 del 12 de diciembre de 2024

CERTIDICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
UNIDAD	**No.**	**FECHA DE EXPEDICION**	**RUBRO**	**RECURSO**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR A AFECTAR**
27-01-02-015	26524	2024-12-12	A-02-02-02-005-004	10	$57.111.590	$57.111.590

3.2 Avance Financiero

A la fecha no se han adelantado el trámite para pago de actas de cobro parcial, es decir la entidad no ha desembolsado recursos financieros a la interventoría por lo que el análisis financiero del contrato corresponde al siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 0,00	N/A	N/A	0,00%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00	N/A	N/A	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 202.272.390,00	N/A	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	100%

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

4.1 Cronología contractual

Los documentos contractuales suscritos en el contrato son los siguientes:

ACTA	FECHA
ACTO DE AUTORIZACIÓN - Resolución No. CSJMER24-223	23 de julio de 2024
RESOLUCIÓN DAPERTURA - Resolución No. 2110	08 de agosto de 2024
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN - Resolución No. 2173	29 de agosto de 2024
ACTA DE INICIO	04 de septiembre de 2024
ACTA MODIFICATORIA N°1 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1	19 de diciembre de 2024

4.2 Control de Pólizas

A continuación, se relaciona la información de la póliza que ampara el Contrato según suscripción de este:

Póliza de Cumplimiento	620 47 994000053954 ANEXO 0	
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Fecha de expedición.	30 DE AGOSTO DE 2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	

	Fecha Inicial	Fecha Final	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	30/08/2024	01/07/2025	$29,032,160.00
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	30/08/2024	31/12/2027	$14,516,080.00
Calidad del servicio	31/12/2024	31/12/2029	$29,032,160.00

A continuación, se relaciona la información de la póliza que ampara el Contrato según acta de inicio:

Póliza de Cumplimiento	620 47 994000053954 ANEXO 1		
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de expedición.	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	04/09/2024	01/07/2025	$29,032,160.00
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	04/09/2024	31/12/2027	$14,516,080.00
Calidad del servicio	31/12/2024	31/12/2029	$29,032,160.00

- Pólizas según prórroga N°1 suscrita el 19/12/2024.

Póliza de Cumplimiento	620 47 994000053954 ANEXO 2		
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de expedición.	20 DE DICIEMBRE DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	04/09/2024	01/09/2025	$29,032,160.00
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	04/09/2024	01/03/2028	$14,516,080.00
Calidad del servicio	28/02/2025	28/02/2023	$29,032,160.00

- Pólizas según adición N°1 suscrita el 19/12/2024.

Póliza de Cumplimiento	620 47 994000053954 ANEXO 3
Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición.	20 DE DICIEMBRE DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	04/09/2024	01/09/2025	$40,454,478.00
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	04/09/2024	01/03/2028	$20,227,239.00
Calidad del servicio	28/02/2025	28/02/2023	$40,454,478.00

4.3 Actas generadas

Las actas generadas en el contrato son las siguientes:

ACTA	FECHA
Acta de inicio	04 de septiembre de 2024
Cambio personal No.1 interventoría	04 de septiembre de 2024
Cambio personal No.2 interventoría	10 de noviembre de 2024
Acta modificatoria N°1 adición N°1 y prórroga N°1	19 de diciembre de 2024

4.4 Comités de Obra y Reuniones

En el periodo comprendido del presente informe mensual se realizaron los siguientes comités de obra y reuniones:

TIPO ACTA	FECHA	INTERVINIENTES		
Acta de comité No 19	10-01-2025	Contratista	Interventoría	Supervisión
Acta de comité No 20	15-01-2025	Contratista	Interventoría	Supervisión
Acta de comité No 21	24-01-2025	Contratista	Interventoría	Supervisión
Acta de comité No 22	31-01-2025	Contratista	Interventoría	Supervisión

4.5 Relación de personal y aportes Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales

Se realiza la entrega de las planillas de los reportes de pagos de salud, ARL, Pensiones y demás parafiscales de los trabajadores en el periodo comprendido del presente informe mensual, tal como se evidencia a continuación:

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	AFILIACIÓN				Fecha de ingreso	Fecha de retiro	No. Planilla ENERO 2025
			EPS	Pensión	ARL	CCF			
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Director de interventoría	Independiente	EPS Sura	Colpensiones	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9481372656
Fabian Antonio Pérez Arias	Residente de interventoría	Dependiente	Sanitas	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9481725832
Pedro Eladio Alférez Rincón	Auxiliar de ingeniería No.1	Dependiente	Nueva EPS Movilidad	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9481725832
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra	Auxiliar de ingeniería No.2	Dependiente	Salud Total	Colpensiones	Sura	Cofrem	10/11/2024	N/A	9481725832
Eyleen Dayana Montilla Beltrán	Auxiliar de ingeniería No.3	Dependiente	Sanitas	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	03/01/2025	9481725832
Flor Angela Narváez Castro	Profesional en Salud Ocupacional	Dependiente	Fosyga régimen de excepción	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9481725832

Teniendo en cuenta la oferta económica para el periodo de prórroga N°1, comprendido del 04/01/2025 al 28/02/2025, se realiza el retiro del auxiliar de ingeniería N°3 el día 03/01/2025 ya que hasta esa fecha estuvo ofertado de acuerdo con las condiciones iniciales del contrato.

4.6 Instalaciones administrativas

La interventoría cuenta con instalaciones administrativas en la ciudad de Villavicencio ubicada en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 barrio caudal alto dedicada al contrato suscrito.



4.7 Transporte

La interventoría cuenta con la disponibilidad para el proyecto del vehículo camioneta doble cabina con las siguientes características

MARCA	NISSAN	**MODELO**	2014	**LINEA**	D22/NP300
PLACA	HBV493	**No POLIZA**	84930866-600004083		
CLASE	CAMIONETA	**SERVICIO**	PARTICULAR	**COLOR**	BLANCO



5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

5.1 Actividades Básicas

Las actividades generales de la interventoría es realizar el respectivo seguimiento, verificación y control de las actividades realizadas por el contratista de obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Lo que incluye asegurar que se cumplan los plazos, la calidad, cantidades y se realice la utilización correcta de los recursos asignados, de igual manera se encarga de mantener la comunicación efectiva entre las partes involucradas, organizando reuniones, mesas de trabajo, estableciendo comités y solicitando informes periódicos para asegurar que el avance se efectué de manera adecuada. En caso de surgir contratiempos, la interventoría está preparada para ofrecer soluciones rápidas, lo que contribuye a la gestión y control de los riesgos identificados. En resumen, su objetivo principal es supervisar de manera eficiente y constante todas las fases del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales estipuladas en el acuerdo.

5.2 Funciones principales realizadas

La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones, la Interventoría ha sido consecuente con sus objetivos principales los cuales ha aplicado así:

Supervisión del Proyecto: La interventoría supervisa todas las actividades del proyecto para garantizar que se lleven a cabo según lo planeado y que se cumplan los plazos establecidos.

Función de Controlar: Este objetivo es el más importante y se ha logrado por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, estableciendo de esta forma que la ejecución se ajusta a lo pactado. Especialmente en relación con:

- Las especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Actividades administrativas a cargo del contratista.
- Actividades legales.
- Actividades financieras y presupuestales.
- Toda estipulación contractual.
- Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.
- Vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.
- Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
- oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente.

Control de Calidad: Se encarga de verificar que los materiales utilizados y los procesos de construcción cumplan con los estándares de calidad especificados en los documentos del proyecto.

Control de Costos: Realiza un seguimiento detallado de los costos del proyecto para asegurarse de que se adhieran al presupuesto establecido.

Gestión de Cambios: Evalúa y gestiona cualquier cambio en el alcance, los requisitos o las condiciones del proyecto para minimizar los impactos negativos en el costo, el cronograma y la calidad.
Gestión de Riesgos: Identifica, evalúa y gestiona los riesgos asociados con el proyecto para minimizar su impacto en los objetivos del mismo.

Coordinación entre Partes: Actúa como intermediario entre el contratista, el cliente y otras partes interesadas para asegurar una comunicación fluida y resolver cualquier conflicto que pueda surgir durante la ejecución del proyecto.

Informe de Avance: Prepara informes periódicos sobre el avance del proyecto, destacando los logros, los problemas encontrados y las acciones tomadas para resolverlos.

Función de Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, esta interventoría ha sido la encargada de resolver las dudas que se han presentado en el desarrollo del contrato, garantizando la comunicación entre las partes.

Función de Colaborar: La Interventoría y el Contratista han conformado un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero, aclarando que ello signifique, renunciar al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista.

Función de Exigir: La interventoría cuando ha encontrado que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, ha exigido al Contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

Función de Solicitar: Esta interventoría ha pedido al Contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, las fallas que se han presentado en ejecución del contrato.

Función de Prevenir: Esta interventoría ha establecido que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

Función de Verificar: esta interventoría ha verificado el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del contratista en la ejecución del contrato, esta actividad se ha concretado mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

5.3 Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación

El concepto de evaluación de impacto urbano se refiere a un conjunto de estrategias diseñadas para minimizar el manejo de los asuntos humano que afectan el entorno, con el objetivo de lograr una convivencia armónica entre el desarrollo de proyectos y la sostenibilidad ambiental.

5.4 Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control a que el contratista cumpliera con proporcionar un entorno de trabajo seguro, ofreciera salarios pactados en su propuesta, así como las afiliaciones a seguridad social y cumplimiento de las leyes, reglamentos laborales establecidas en el Código del Trabajo y demás que contienen normas laborales.

5.5 Seguimiento y control del Plan de Gestión Social

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizó seguimiento y control a la implementación de estrategias diseñadas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos, al mismo tiempo que buscó realzar los efectos positivos resultantes de la realización de las obras, lo anterior como instrumento de planificación que busca garantizar la participación y el compromiso de la comunidad, para el empoderamiento de la infraestructura, así como su sostenibilidad en el marco social.

5.6 Seguimiento y control al Estado del Tiempo

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control riguroso al comportamiento de las condiciones climatológicas con el objetivo de evaluar la incidencia de estas en la ejecución del contrato.

5.7 Seguimiento y control al plan de calidad

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizó el seguimiento y control exhaustivo al alcance del plan de calidad, a la verificación de elementos de entrada, al cumplimiento de los objetivos, al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección, a la verificación del control de documentos, datos, registros y Gestión de los recursos.

5.8 Seguimiento y control de Seguridad Industrial

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control al contratista, en la afiliación del personal al sistema de seguridad social, de igual manera se hizo seguimiento al cumplimiento Decreto Único 1072 – Año 2015 el cual no modificó las normas, solo las unificó, haciendo que todas las empresas, sin importar su nivel de riesgo, implementaran el SG-SST de forma obligatoria.

5.9 Seguimiento y control Técnico de la Obra


Durante el presente periodo del informe mensual la interventoría realizó:

- Acompañamiento durante la ejecución de actividades en obra.
- Participación en comités semanales.
- Seguimiento y control al avance ejecutado versus programado.
- Elaboración de informes semanales.
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada actividad ejecutada.
- Verificación del cumplimiento del plan de calidad del contratista.

6 SEGUIMIENTO A AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL

A corte del presente informe, el contrato de obra presentaba el siguiente avance físico:

Avance programado acumulado ($)	Avance programado acumulado (%)	Avance ejecutado acumulado ($)	Avance ejecutado acumulado (%)	Avance ($)	Avance (%)
$ 1,504,814,614.24	76,17%	$ 1,576,654,585.0	79.81%	(+) $71,839,970.76	(+) 3,637%

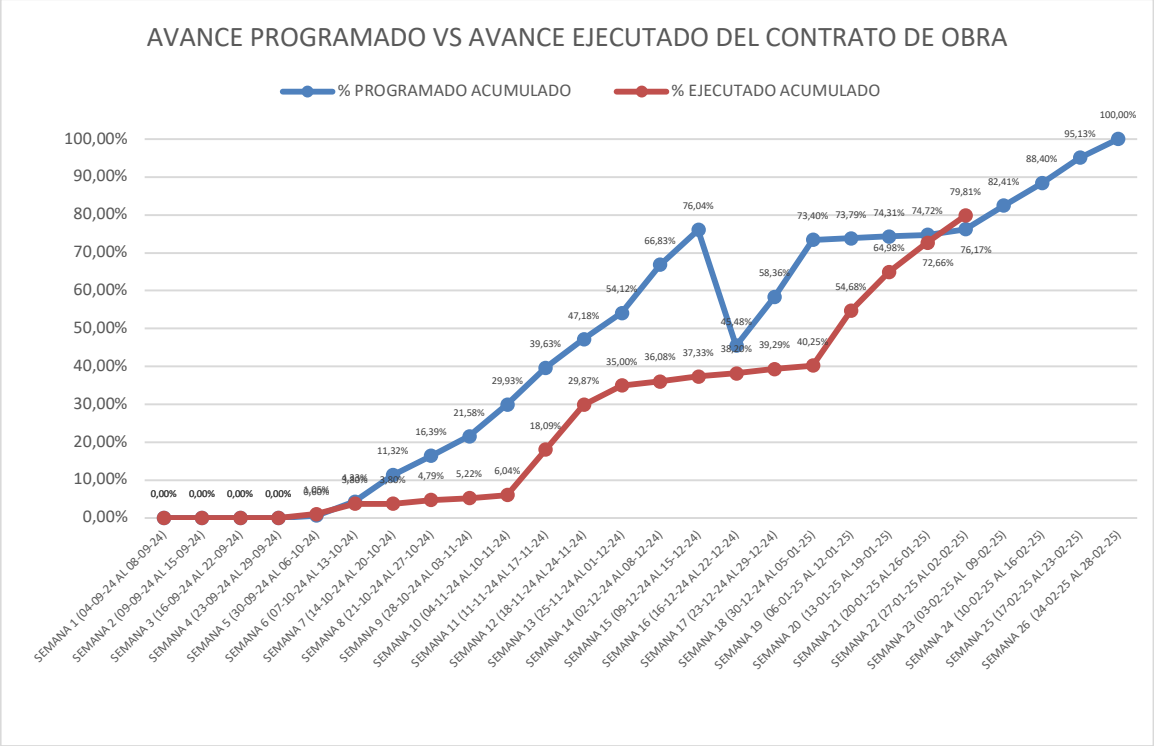

En la gráfica anterior, se muestra el adelanto que tiene la obra, el cual corresponde al 3,637%, este adelanto se debe principalmente que el contratista amplió sus cuadrillas de trabajo.

De acuerdo con el informe semanal N°22 con el cual cerró el periodo del presente informe, se evidencia las siguientes actividades ejecutadas en cada una de las sedes:

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA N°1	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEDE
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	71.10%	0.00%	-71.10%	Durante la presente semana N°22 se realizaron actividades de remates en el juzgado de familia y se realizó entrega el día viernes a la interventoría.
2. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	90.53%	92.50%	1.97%	Durante la presente semana N°22 se realizó instalación de fibra de vidrio a la parte superior de la cubierta rodando el poste. Continua la instalación de cielo raso y la instalación de cableado para las acometidas electricas con sus respectivos breakers. Se está realizando la apliacación de pintura tipo Koraza en el muro oriental.
3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)	100.00%	80.00%	-20.00%	Durante la presente semana N°22 continua la instalación de la fachada flotante.
4. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	100.00%	100.00%	0.00%	Durante la presente semana N°22 se instaló el mesón en el centro de servicios, el cual estaba pendiente de ajuste.
5.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),	50.84%	73.67%	22.84%	Durante la presente semana N°22 se realizó enchape de muros de los baños de los magistrados, se realizó instalación de tomacorrientes para las lámparas, se realizó instalación de canaleta metálica.
6. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta	30.33%	0.00%	-30.328%	A la fecha de la presente semana N°22 no se ha iniciado ejecución de actividades en esta sede. Durante la presente semana se realizó visita el viernes 31 de enero entre contratista, interventoría y la supervisión, para priorizar necesidades de la sede considerando el balance de cantidades que se está realiazando al contrato y poder establer el alcance de la intervención.
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),	27.07%	0.00%	-27.07%	Durante la presente semana N°22 el dia lunes 27 de enero se realizó visita a la sede con el fin de verificar el alcance de las actividades aprobadas en el presupuesto y priorizar nuevas necesidades. El contratista está realizando actividades logísticas de traslado de los funcionarios para liberar el área de trabajo y consecución y transporte de materiales e insumos al sitio de obra para iniciar ejecución con personal el día 10 de febrero de 2025.

7 ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo del presente informe la interventoría no realizó toma de muestras para ensayos de laboratorio debido a que las actividades ejecutadas no lo requirieron.

8 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- A continuación, se relaciona y soporta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula séptima del contrato de interventoría:

OBLIGACIONES GENERALES	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupción de este pliego de condiciones.	La interventoría certifica que se han implementado todas las acciones necesarias para apoyar la labor del Estado Colombiano en el fortalecimiento. En este contexto, se han asumido y cumplido de manera explícita los compromisos indicados en el numeral 1.2 "Compromiso Anticorrupción" del pliego de condiciones. Esto incluye la supervisión rigurosa de las actividades, el control permanente de los procesos y la adopción de medidas destinadas a prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo asociado a actos de corrupción en el desarrollo.
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre o la equidad natural.	La interventoría certifica que ha obrado con buena fe en todas las etapas contractuales, cumpliendo con las disposiciones expresamente pactadas en el contrato y atendiendo de manera diligente las obligaciones inherentes a la naturaleza de este. Se han adoptado todas las medidas necesarias para prevenir y superar cualquier dilatación o tropiezo que pudiera surgir durante la ejecución del proyecto. Además, las acciones realizadas se han fundamentado en los principios de la ley, la costumbre y la equidad natural, garantizando un desempeño ético, transparente y alineado con los compromisos asumidos contractualmente.
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.	La interventoría certifica que no ha accedido a peticiones ni a amenazas provenientes de personas o grupos que actúen al margen de la ley, y que puedan tener como finalidad obligar a realizar u omitir algún acto o hecho.
4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco	La interventoría certifica que se constituyeron todas las garantías requeridas por la Entidad, conforme a los términos establecidos en el Decreto No 1082 de 2015.

(5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.	
5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el garante en los términos establecidos por él.	A la fecha del presente informe no se ha modificado el estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades o tiempos, por lo cual, no ha sido necesario actualizar la garantía única de cumplimiento.
6. Permitir en cualquier momento a la Supervisión, entes de control y a los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato.	La interventoría certifica que, durante la ejecución del contrato, se permitió en todo momento a la Supervisión, a los entes de control y a los servidores o funcionarios autorizados la revisión de los trabajos realizados en el marco del objeto contractual. Esta disposición se cumplió sin restricciones, facilitando el acceso a la información, a las áreas de trabajo y a los documentos necesarios, garantizando así la transparencia y el adecuado seguimiento por parte de las instancias responsables.
7. Suministrar a la Entidad cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.	La interventoría certifica que ha suministrado a la Entidad, siempre que esta lo ha requerido, los informes correspondientes sobre cualquier aspecto relacionado con la obra objeto del contrato. Estos informes han sido elaborados con rigurosidad técnica y han incluido toda la información necesaria para garantizar la claridad y la transparencia en el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.
8. Presentar a la Entidad durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el ítem “FORMA DE PAGO”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación.	A la fecha del presente informe el contratista ha tramitado el cobro del acta parcial N°1.

9. Presentar al supervisor del contrato, previa revisión y aprobación del interventor, las solicitudes que realice el contratista de obra para suspensión o reinicio del contrato; y con al menos con un (1) mes de anterioridad las solicitudes de prórroga y/o adición, debidamente soportada y justificada por el contratista de obra.	A la fecha del presente informe no se ha requerido tramitar solicitudes de suspensión o reinicio al contrato de obra.
10. Presentar al supervisor del contrato para su revisión y aprobación, las solicitudes de prórroga y/o adición del contrato de interventoría, debidamente soportadas y justificadas, para lo cual deberá tener en cuenta los costos de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada por la interventoría, según se requieran en esa etapa del proyecto.	A la fecha del presente informe se solicitó a la supervisión y tramitó el acta modificatoria N°1 adición N°1 y prórroga N°1, la cual fue suscrita el 19 de diciembre de 2024.
11. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.	La interventoría certifica que el contratista, desde la suscripción del contrato, ha cumplido con la política integrada del SIGCMA, incluyendo los lineamientos establecidos en la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. Durante el desarrollo del contrato, se ha verificado de manera permanente que el contratista mantenga el cumplimiento de estas disposiciones, garantizando la integridad y la transparencia en todas las actividades ejecutadas. No se han identificado incumplimientos relacionados con estas políticas que hayan requerido la adopción de medidas correctivas por parte de la Entidad contratante.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**
1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra que tiene por objeto: “Reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes a cargo de la Seccional Villavicencio de la Rama Judicial”.	La interventoría certifica que ha ejercido el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra cuyo objeto es: “Reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes a cargo de la Seccional Villavicencio de la Rama Judicial”. Este control se ha llevado a cabo de manera sistemática y rigurosa, verificando el cumplimiento

	de los cronogramas, la calidad de los trabajos realizados, la correcta ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas y contractuales. De esta forma, se garantiza la adecuada ejecución del contrato conforme a los objetivos establecidos.
2. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista de obra el cumplimiento exacto de sus obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones técnicas descritas en el Proceso de Contratación, con la calidad pactada y costos asociados	La interventoría certifica que ha verificado, constatado, exigido y conminado al contratista de obra para garantizar el cumplimiento exacto de sus obligaciones conforme a los tiempos acordados, las especificaciones técnicas descritas en el Proceso de Contratación, la calidad pactada y los costos asociados.
3. Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para la oportuna ejecución de actividades dentro del cronograma pactado de Obra.	La interventoría certifica que ha llevado a cabo el control, la vigilancia y las gestiones necesarias para garantizar la oportuna ejecución de las actividades previstas en el cronograma pactado de obra. Estas acciones incluyeron el monitoreo constante del avance del proyecto, la identificación y resolución de posibles contingencias, y la coordinación efectiva con el contratista para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos, en estricto apego a las obligaciones contractuales y a los lineamientos técnicos correspondientes. Gracias a la gestión realizada por la interventoría se lograron aprobar los presupuestos iniciales para iniciar obra en las sedes Acacias, Granada, Puerto Rico, SJG Palacio y SJG Tribunales.
4. Suscribir junto con la supervisión, el Acta de inicio del contrato de interventoría, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías del contrato de interventoría por parte de la Entidad.	La interventoría ha cumplido con este ítem, ya que suscribió el Acta de Inicio del contrato de interventoría el día 04 de septiembre de 2024.
5. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega por parte del Contratista de obra de los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, los documentos relacionados a	El contratista ha cumplido con este ítem, ya que entregó en los tiempos establecidos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, la cual fue firmada el día 04 de septiembre de 2024.

continuación, los cuales deberán ser remitidos al supervisor y exigir su cumplimiento durante toda la ejecución del contrato e informar al supervisor de cualquier novedad: A. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA EN PROJECT O SOFTWARE DE PROPÓSITO SIMILAR: En medio magnético del programa y en PDF, dentro de la cual deberá especificar los tiempos a desarrollar la presente contratación, teniendo en cuenta el plazo de ejecución establecido por la entidad y deberá tener en cuenta el sitio en que se va a desarrollar la obra, naturales, geológicas, climáticas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra. Así mismo tendrá en cuenta consideraciones establecidas por la entidad. B. Los Análisis de Precios Unitarios (APUs) presentados por parte del Contratista de obra que soportan la propuesta económica presentada. Los APUs aprobados, junto con el certificado de aprobación, deben ser remitidos al supervisor del contrato, debidamente suscrito y en original. C. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de obra. D. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.	
6. Suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra. Parágrafo: La Interventoría deberá revisar, verificar y conminar al contratista para que	La interventoría confirma que el contratista ha dado cumplimiento a este ítem, ya que suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra el día 04 de septiembre de 2024.

el contratista de obra entregue en debida forma y cargue en el SECOP II las garantías requeridas en el contrato de obra, en los términos allí establecidos.	Asimismo, la interventoría realizó la respectiva revisión y verificación de las garantías requeridas en el contrato de obra, conminando al contratista para su correcta entrega y cargue en el SECOP II dentro de los plazos estipulados.
7. La interventoría deberá efectuar visita técnica en los diferentes inmuebles objeto de intervención, de manera conjunta con el contratista de obra y supervisor del contrato de interventoría; con el fin de evaluar y establecer el alcance, proyectar costos y tiempos de ejecución de las intervenciones requeridas según las necesidades definidas para cada uno de ellos y la propuesta presentada por el contratista. De estas visitas, el Contratista presentará a la Interventoría un informe técnico con registro fotográfico, discriminando las sedes, áreas, actividades, costos, duración de las intervenciones y trabajos a ejecutar, identificando ítems no previstos que sean requeridos y llevar el respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del mismo; para lo cual la interventoría deberá revisar y aprobar para su correspondiente ejecución.	La interventoría certifica que se realizaron las visitas técnicas en las diferentes sedes objeto de intervención, de manera conjunta con el contratista de obra y el supervisor, cumpliendo con el objetivo de evaluar y establecer el alcance, proyectar los costos y definir los tiempos de ejecución de las intervenciones requeridas, en concordancia con las necesidades identificadas y la propuesta presentada por el contratista. Como resultado de estas visitas, el contratista presentó a la interventoría el informe diagnóstico, el cual se anexó al informe mensual de obra N°1 y fue insumo fundamental para la elaboración de los presupuestos aprobados para las sedes.
8. Revisar y analizar conjuntamente con el contratista de obra, dentro de cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,	La interventoría informa que, en conjunto con el contratista, se dio cumplimiento a este ítem. Se realizó la revisión y análisis de la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos y demás información técnica suministrada por la Entidad. Se verificó que dicha documentación estuviera acorde con las normas, especificaciones, permisos y resoluciones aplicables, garantizando así el desarrollo normal del proyecto.

resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión y aceptación de la información entregada.	
9. Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental, sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o solicitudes de modificación, ajuste o complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes del proyecto antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberán ser emitidos por los profesionales idóneos con que la Interventoría debe contar para tal fin; dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo y dar traslado de la misma a la Entidad. Así mismo, apoyar a la Entidad en las respuestas a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.	La interventoría ha analizado y emitido los conceptos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, contables y ambientales requeridos sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o solicitudes presentadas por el constructor. Dichos conceptos han sido elaborados por los profesionales idóneos de la interventoría y emitidos dentro del plazo establecido. Tal como se puede evidenciar en la aprobación de los presupuestos iniciales de las sedes.
10. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir al contratista de obra la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, ambientales y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.	La interventoría certifica que ha ejercido un control integral sobre el proyecto, conforme a lo establecido en el contrato. Durante su desarrollo y ejecución, se exigió al contratista de obra la entrega de información necesaria para la adecuada supervisión del avance del proyecto. Asimismo, se solicitaron y verificaron las medidas adoptadas por el contratista para garantizar el mantenimiento de las condiciones técnicas, económicas, ambientales y financieras vigentes al momento de la celebración del contrato. Estas acciones han sido realizadas en cumplimiento de las disposiciones contractuales, garantizando la

	transparencia y la correcta ejecución del proyecto en todos sus aspectos.
11. Realizar seguimiento, valoración y conciliación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que se establecen en el Anexo 5 – Acuerdos de Niveles de Servicios Locativos del contrato de obra.	La interventoría certifica que se ha llevado a cabo el seguimiento, valoración y conciliación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) estas actividades incluyeron la revisión periódica de los indicadores de desempeño, el cumplimiento de los estándares pactados y la resolución de posibles diferencias, garantizando que los servicios locativos cumplieran con los niveles de calidad y eficiencia requeridos en el contrato. Todo ello se realizó conforme a las disposiciones contractuales y en coordinación con las partes involucradas.
12. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras, ambientales y administrativas del Contratista de obra. La certificación de cumplimiento que expide la Interventoría constituye la prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista de Obra.	La interventoría expidió certificaciones y dio aval y aprobación a la solicitud de pago parcial N°1 presentado por el contratista de obra.
13. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo, solo cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el acta y solo se facturarán los ítems sobre los que no haya controversia.	La interventoría dio trámite del acta parcial N°1 al contrato de obra, una vez aprobadas a satisfacción las actividades de obra ejecutadas.
14. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra del ordenamiento jurídico colombiano y en especial de las siguientes normas: I. Ley 1383 de 2010, por lo que debe verificar que el contratista de obra cumpla con los permisos requeridos para el transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de	La interventoría ha verificado el cumplimiento por parte del contratista de obra del ordenamiento jurídico colombiano y en especial de las siguiente normas así: - El contratista no ha requerido permisos para el transporte y movilización de cargas, toda vez que la compra de materiales se ha realizado con proveedores que los entregan en el sitio de obra.

los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación). II.Decreto Nacional No. 392 de 2018, por lo que debe vigilar, controlar y exigir al contratista de obra que durante la ejecución del contrato mantenga en su planta de personal el número de trabajadores en condición de discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor en el proceso exigiendo el certificado expedido por el Representante Legal del contratista de obra en el que establezca y demuestre que cumple con dicho requisito. III. Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra respecto de la normatividad en (i) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y (ii) el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice durante la ejecución del contrato de obra, conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 de la norma citada. IV. Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018, “Por la cual se crea e implementa el Registro único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se vinculen o contraten personas extranjeras.	- La interventoría verificó el certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad emitido por el ministerio del trabajo a nombre de INVERSIONES GYS SAS. - La interventoría ha verificado la implementación del SG-SST por parte del contratista de obra de acuerdo a la normatividad vigente. - Dentro del personal vinculado por el contratista de obra no hay personas de nacionalidad extranjera. - La interventoría ha verificado que el contratista cumple con la normatividad vigente para la disposición de RCD y mitigar la afectación ambiental durante la ejecución de la obra.

IV. Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, debe verificar y exigir que el Contratista de obra minimice el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por el Contratista de Obra en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables.	
15. Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios contractuales o de afectación de garantías, rendir los testimonios que sean decretados y presentar los informes técnicos que le sean requeridos.	A la fecha del presente informe no se ha requerido realizar procesos sancionatorios al contratista de obra. Sin embargo, en caso de ser necesario la interventoría realizará acompañamiento jurídico y técnico a la Entidad en los procesos sancionatorios contractuales o de afectación de garantías, conforme a lo establecido en el contrato.
16. Proyectar para la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio la respuesta jurídica, técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto desequilibrio económico o mayor permanencia de obra.	A la fecha del presente informe no se ha requerido proyectar respuestas jurídicas, técnicas, contables y financieras ante reclamaciones por presunto desequilibrio económico o mayor permanencia de obra.
17. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Obra, con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar las labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para aprovechamiento forestal, sustracción de reserva o levantamiento de veda, concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos, permiso para	A la fecha del presente informe no se ha requerido realizar trámites por parte del contratista de obra para la obtención de permisos y licencias.

trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Así como a los trámites realizados con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de realizar la conexión efectiva de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos estarán a cargo del Contratista de Obra.	
18. Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	Durante la ejecución del proyecto, se verificó que las actividades se desarrollaron dentro de los tiempos acordados, garantizando el adecuado desempeño de las labores asignadas.
19. Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto requerido para el cumplimiento de este contrato. Para ello, deberá documentar con las formalidades requeridas e informar si el contratista de obra se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría. En estos casos, la Interventoría notificará por escrito al contratista de obra sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no	La interventoría ha realizado los requerimientos por escrito al contratista de obra sobre los aspectos necesarios para el cumplimiento del contrato, documentando cada solicitud con las formalidades requeridas. En los casos en que se han emitido órdenes escritas, el contratista ha atendido dichas instrucciones dentro de los plazos establecidos, evitando así omisiones o infracciones. Hasta la fecha, no ha sido necesario notificar incumplimientos ni escalar la situación a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, ya que el contratista ha dado

surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, la Interventoría debe comunicar dicha situación a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio para que inicie el proceso de incumplimiento contractual.	respuesta y cumplimiento a las órdenes impartidas por la interventoría en los términos exigidos.
20. Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los ítems no previstos identificados y presentados por el Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de las mismas, para lo cual este deberá adjuntarle a la Interventoría: I. Justificación técnica y detallada de la necesidad. II. Análisis de Precios Unitarios (APU) soportados en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como “construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. II. Especificaciones técnicas de los ítems no previstos. IV. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores	La interventoría informa que, hasta la fecha, no ha sido necesario aplicar este ítem, ya que durante la planeación y ejecución de la obra no se han presentado ítems no previstos por parte del contratista. En consecuencia, no se ha requerido el estudio, evaluación o aprobación de actividades adicionales, ni la validación de precios o la suscripción de actas de fijación de precios. La interventoría continuará con el seguimiento y, en caso de presentarse ítems no previstos, procederá conforme a lo establecido en el contrato.

cantidades de obra e ítems no previstos. V. Programación de ejecución de obra actualizado según balance del contrato. VI. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente trámite ante la entidad. Parágrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez deberá revisar la información recibida y realizar la validación y comparación de los precios teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de los ítems no previstos que se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno. Parágrafo 2. En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la	

interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar las presentadas por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría. Parágrafo 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará mediante la suscripción entre interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU's aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados los ítems no previstos, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra.	
21. Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades sin que se cuenten con los recursos en el contrato	La interventoría ha realizado seguimiento y control permanente a las actividades ejecutadas en obra y ha impedido que se ejecuten mayores cantidades

para su pago y verificar que se dé aviso previo al garante.	de obra sin contar con los recursos en el contrato para el respectivo pago.
22. Revisar mensualmente la proyección de cantidades de obra del contrato e informar inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que impida completar la obra en los términos previstos.	La interventoría certifica que ha realizado mensualmente la revisión de la proyección de cantidades de obra del contrato, evaluando el avance en relación con los recursos financieros disponibles y el tiempo de vigencia del contrato.
23. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor. El Informe debe ser cargado en la plataforma informática que indique la Entidad.	La interventoría certifica que durante el periodo del presente informe se elaboraron los siguientes informes semanales: - Informe semanal N°18. - Informe semanal N°19. - Informe semanal N°20. - Informe semanal N°21. Dichos informes semanales se anexan al presente informe para el cargue a la plataforma SECOP II.
24. Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado y avance del contrato de obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, rendimientos financieros generados en la fiducia producto del anticipo entregado al Contratista de obra y certificar el cumplimiento de: el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y del documento Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). El Informe debe ser cargado en la plataforma informática que indique la Entidad.	La interventoría ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la entrega de los informes mensuales N°1, N°2, N°3, N°4 y el presente informe N°5, los cuales incluyen los porcentajes de avance, gráficos, fotografías que evidencian el progreso real de las actividades contratadas y el cumplimiento de los planes presentados por el contratista. Todos los informes mensuales de interventoría se han cargado en la plataforma SECOP II, de acuerdo a directrices de la entidad.
25. Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de Obra, confirmar que se cargue la información en la plataforma informática que indique	La interventoría certifica que se revisaron los informes presentados por el Contratista de Obra, los cuales fueron recibidos mediante correo

la Entidad y allegarlos en original al supervisor del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Contratista de Obra, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, jurídico, financiero y contable emitido por la Interventoría. Los informes suscritos y en original debe ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	electrónico en archivo PDF y se verificó que sean cargados a la plataforma SECOP II.
26. Evaluar el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar a través de comités de obra semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo a la programación de obra del contrato. De dichos comités deberá dejarse constancia en acta, documento que debe ser allegado a la Entidad a través del supervisor del contrato, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del Comité. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	La interventoría ha realizado comités de obra de seguimiento semanal con el contratista de obra y se han generado las respectivas actas de comité, las cuales se han entregado como anexo en los informes mensuales de interventoría.
27. Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del gasto en los que dé cuenta de las obligaciones incumplidas por el contratista de obra en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, las normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de los perjuicios en caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder. De igual manera se	La interventoría informa que, hasta la fecha, no ha sido necesario elaborar informes sobre incumplimientos del contratista, dado que no se han presentado situaciones que requieran su aplicación. No se ha identificado incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del contratista que amerite un análisis sobre posibles violaciones de cláusulas, tasación de perjuicios o generación de recomendaciones adicionales. No obstante, la interventoría continúa con el seguimiento estricto del contrato y, en caso de evidenciarse algún incumplimiento, procederá

deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	conforme a lo establecido en este ítem, elaborando y presentando los informes requeridos.
28. Publicar toda la información relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son: programación de obra, acta de inicio, pólizas, informes semanales, mensuales, actas de pago parciales y final, entre otros; en la Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.	La interventoría ha dado cumplimiento a este ítem, publicando en la Plataforma SECOP II y/o en el aplicativo dispuesto por la entidad toda la información relevante del contrato, previamente aprobada por el supervisor. Entre los documentos cargados se incluyen la programación de obra, el acta de inicio, las pólizas, los informes semanales y mensuales.
29. Solicitar al Contratista de Obra la ejecución de las pruebas de calidad del concreto de acuerdo con la normatividad vigente y el Plan de Calidad, cuyos resultados deben ser entregados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, previo análisis por parte de la Interventoría.	En el presente informe se adjuntan los resultados de los ensayos de laboratorio emitidos por el laboratorio.
30. Solicitar al Contratista de Obra, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. La Interventoría debe exigir el cumplimiento de esta obligación. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoría y remitido al Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	Hasta la fecha, el contratista ha cumplido con el cronograma establecido, por lo que no ha sido necesario solicitar un Plan de Contingencia. No obstante, la interventoría mantiene el seguimiento constante del avance del proyecto para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.
31. Evaluar, valorar y recomendar sobre la solicitud realizada por el contratista de obra con relación a las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos, basado en los soportes correspondientes del imprevisto generado y aprobar el pago	La interventoría no ha requerido la aplicación de este ítem hasta el momento, ya que no se han presentado solicitudes por parte del contratista INVERSIONES GYS S.A.S. relacionadas con circunstancias que afecten el rubro de imprevistos.

correspondiente conjuntamente con el supervisor del contrato de interventoría. En todo caso el valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta económica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluidos AIU.	
32. Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	La interventoría ha cumplido con este ítem, remitiendo al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demás escritos generados durante la ejecución del contrato y que han sido conservados en virtud de la interventoría. Dicha documentación ha sido enviada en los tiempos establecidos y conforme a las disposiciones contractuales, garantizando su adecuada custodia por parte del Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.
33. Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificación suscrita por el Director de la Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados en obra por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo contratado.	A la fecha del presente informe no se han suscrito actas de recibo de obra. Sin embargo, cuando el contratista finalice en su totalidad las actividades de obra en cada una de las sedes se suscribirá por la presente interventoría un acta de recibo parcial de obra y una vez finalizadas en su totalidad todas las sedes se procederá a suscribir el acta de recibo final.
34. Elaborar y presentar informe o concepto: técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y/o contable; de acuerdo a los requerimientos que le realice el supervisor del contrato. Los cuales deberán ser emitidos por el profesional	La Interventoría ha dado cumplimiento a este ítem, ya que ha elaborado y presentado en los tiempos estipulados los informes y conceptos requeridos por el supervisor del contrato en los ámbitos técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y/o contable.

idóneo con que la Interventoría debe contar para tal fin. Una vez hecha la solicitud, el interventor tendrá cinco (5) días hábiles para presentar el concepto por escrito y debidamente suscrito.	
35. Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, las peticiones que soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato de obra, como para el contrato de Interventoría. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Entidad. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	La interventoría no ha cumplido con este ítem, ya que hasta la fecha los Entes de Control no han realizado ninguna solicitud relacionada con el Contrato de Obra o el Contrato de Interventoría. No obstante, en caso de presentarse alguna petición, la interventoría procederá a responder de fondo dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y remitirá los documentos requeridos a la Entidad, para su custodia por parte del Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.
36. Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista de obra y allegarlos en original al supervisor del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Consultor, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y contable emitido por la Interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	A la fecha del presente informe la interventoría revisó y validó el informe para cobro de acta parcial N°1 presentado por el contratista INVERSIONES GYS SAS y fue remitido a la supervisión para el respectivo trámite de pago.
37. Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la Garantía Única de Cumplimiento, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de terminación del contrato y exigirlas al contratista de obra.	La Interventoría entregará en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la Garantía Única de Cumplimiento, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de terminación del contrato y serán exigidas al contratista de obra.
38. Realizar con posterioridad a la terminación del contrato de obra, el balance de actividades ejecutadas y el balance presupuestal que servirán	La Interventoría informa que este ítem aún no ha sido cumplido, dado que la terminación del contrato de obra no se ha realizado. Una vez finalizado el contrato, se procederá con la elaboración del balance de actividades ejecutadas y el balance

como insumo para la elaboración del acta de liquidación del contrato.	presupuestal, los cuales servirán como insumo para el acta de liquidación.
39. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final de Obra, el Contratista haga entrega en medio físico y magnético, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, el presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en formato pdf y Excel) Memorias de Cálculo consolidadas y firmadas (en formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord firmados, de las obras ejecutadas (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc., en formato pdf y Autocad) bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños realizados, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad u otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato. Además, la información debe ser cargada en la plataforma informática que indique la Entidad.	La Interventoría dará cumplimiento a este ítem una vez finalizado el contrato y al momento de la firma del Acta de Recibo Final de Obra. En esa instancia, se coordinará y verificará que el Contratista entregue a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio toda la documentación requerida en los formatos físicos y digitales estipulados. Asimismo, se garantizará que la información sea cargada en la plataforma informática que indique la Entidad, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en el contrato.
40. Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de entrega y recibo final y recibo a satisfacción de obra en el cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas.	La obra aún se encuentra en ejecución y tiene fecha de terminación para el 28 de febrero de 2025. Finalizada la ejecución de actividades en obra se realizará inspección en campo, se remitirán observaciones y una vez subsanadas por el contratista se suscribirá el acta de recibo final.
41. Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los contratos, crear los escenarios de reuniones y como resultado de ello, proyectar las actas de liquidación de los contratos de obra y de interventoría, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de	La interventoría recopilará la documentación de los dos contratos, obra e interventoría y proyectará las actas de liquidación de los contratos.

finalización o al recibo a satisfacción de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas de liquidación deben remitirse a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio - Consejo Superior de la Judicatura, una vez sean revisadas, aprobadas y suscritas por las partes. Parágrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista, la Interventoría, el Supervisor del contrato de Interventoría y el Director de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio responsable del contrato de obra de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. Parágrafo 2: La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio no reconoce costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidación del contrato.	
42. Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidación, la certificación de cumplimiento de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, así como los Paz y Salvos de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas con los cuales ejecute el contrato.	La interventoría entregará a la supervisión los certificados de paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales.
43. Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de las labores contratadas, el equipo de trabajo mínimo y solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos exigidos	La Interventoría ha dado cumplimiento a este ítem, verificando que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de los trabajos el equipo de trabajo mínimo requerido. Asimismo, se ha realizado el seguimiento continuo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad y al

por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.	desempeño del personal, sin que hasta la fecha haya sido necesaria la solicitud de sustitución de algún integrante del equipo de trabajo.
44. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, obtuvo un puntaje adicional o acreditó un factor de desempate, a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección, así como verificar y exigir al Contratista de Obra el cumplimiento de los ofrecimientos por este realizados por los que obtuvo puntaje o acreditó un factor de desempate.	La Interventoría ha cumplido con este ítem, exigiendo al Contratista el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección, por los cuales obtuvo puntaje adicional o acreditó un factor de desempate. Asimismo, ha verificado que dichos compromisos se mantengan durante toda la ejecución del contrato.
45. La Interventoría para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles descritos en el numeral 6.1.2.3 Experiencia Del Equipo De Trabajo. Esta obligación debe ser revisada por el supervisor del contrato, en cada una de las etapas contractuales. El anterior equipo mínimo debe cumplir con los siguientes requisitos: a. El personal relacionado anteriormente conforma el equipo mínimo de trabajo necesario para la ejecución del proyecto. Si la interventoría requiere vincular personal adicional para la correcta ejecución del contrato, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que la Interventoría utilice en la ejecución del Contrato, ya que la	La Interventoría ha cumplido con este ítem, garantizando que su equipo de trabajo cuenta con los profesionales y técnicos mínimos exigidos, conforme a los perfiles y requisitos establecidos en el contrato. Además, ha asegurado su disponibilidad y cumplimiento durante la ejecución del contrato. Las hojas de vida de los profesionales ofertados fueron remitidas a la supervisión para su revisión y aprobación.

Entidad en la etapa de planeación estableció el personal mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato. b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por entidades de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra o la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. En el evento de no disponerse de la certificación de experiencia, se deberá adjuntar copia del acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el documento que corresponda; donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o fecha de ejecución las actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el representante de la entidad contratante y el Contratista. c. No se aceptan certificaciones relacionadas con interventoría a obras civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vías y andenes, puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, canchas deportivas,	

parques o plazoletas. d. Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. e. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. f. Para el cálculo de los años de experiencia se tomarán en cuenta años laborales de 360 días, de acuerdo a lo consagrado en el derecho comercial, en concordancia con lo expuesto en el Concepto 104544 de abril 21 de 2008, emitido por el Ministerio de la Protección Social. g. Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos simultáneos, es decir, no será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante. h. No se aceptan auto certificaciones. i. Si la interventoría ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o más	

cargos, este deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno de los ellos, siempre y cuando no supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. j. Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito, puede encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o consultoría con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, que le impida desempeñar el cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello, para lo cual el personal deberá aportar Certificación que así lo afirme. k. La interventoría garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. l. La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24)	

meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma. Parágrafo: Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se computará a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de 1998. Lo anterior operará también para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matrícula profesional para el desempeño profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso contrario, se aplicará el artículo 229 del Decreto No. 019 de 2012. m. Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019.	

n. En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formación académica en el exterior con: 1. Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación La convalidación correspondiente. Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros civiles se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 2003. o. Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. p. Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del	

permiso o licencia provisional para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la entidad competente.	
46. Adicionalmente al personal mínimo requerido, la interventoría se obliga a contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto.	La Interventoría ha cumplido con este ítem, contando con el personal profesional adicional necesario para asesorar las diferentes etapas de ejecución del proyecto, garantizando el adecuado desarrollo del contrato.
47. Disponer y suministrar el personal que permitan adelantar los controles de las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, la interventoría deberá garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.	La interventoría dispone del personal suficiente para el adecuado seguimiento y control a la ejecución de actividades en obra en cada una de las sedes aprobadas para intervención dentro del alcance del contrato de obra objeto de vigilancia.
48. La Interventoría deberá garantizar que el equipo mínimo trabajo ofrecido y aprobado por la entidad, con la dedicación requerida y pactada, siendo estos quienes deben ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben ser sustentadas, la interventoría presentará la hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración del supervisor del contrato. En este caso, la persona que reemplazará al profesional del equipo mínimo de trabajo debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo correspondiente, si se trata de un profesional que hace parte del equipo de trabajo clave evaluable por el cual se	La Interventoría ha cumplido con este ítem, garantizando que el equipo mínimo de trabajo ofrecido y aprobado por la Entidad ha desempeñado sus funciones con la dedicación requerida y pactada. Hasta la fecha, no ha sido necesario realizar cambios en el personal; sin embargo, en caso de requerirse, se seguirá el procedimiento establecido en el contrato, presentando las hojas de vida y soportes correspondientes para evaluación del supervisor.

asignó puntaje, adicionalmente deberá acreditar como mínimo los años de experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional sobre los cuales le fue otorgado el puntaje al profesional presentado con la oferta. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas. Parágrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y sustitución de cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligación será revisada por el supervisor del contrato en cada una de las etapas contractuales a partir de la firma del Acta de Inicio.	
49. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva de la interventoría, por lo tanto, el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	La Interventoría ha cumplido con este ítem, garantizando la vinculación del personal bajo su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, todo el personal que ha participado en la ejecución del contrato no tiene ninguna relación laboral, civil ni comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.
50. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral	La Interventoría ha cumplido con este ítem, asegurando el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a su personal, así como el cumplimiento de todas las obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales,

de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente. Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato de prestación de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.	conforme a la normatividad vigente. Adicionalmente, en los casos aplicables, se ha allegado la certificación respectiva firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal. La Interventoría ha cumplido con este ítem, asegurando el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a su personal, así como el cumplimiento de todas las obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, conforme a la normatividad vigente. Adicionalmente, en los casos aplicables, se ha allegado la certificación respectiva firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal.
51. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.	La presente interventoría a nombre de JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA no fue acreedora de puntaje por factor de discapacidad según decreto 392 de 2018, por lo tanto, no presenta certificado de cumplimiento.
52. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma. Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor del contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra por parte de la entidad o los entes de control.	El Contratista ha cumplido con este ítem, asegurando el cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012, contando con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST, un Coordinador de trabajo en alturas y el equipo de protección requerido, disponible para inspecciones.
53. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad	La Interventoría y el Contratista han cumplido con este ítem, garantizando la seguridad industrial,

industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.	ocupacional y la salud en el trabajo del personal, cumpliendo con la normatividad vigente. Asimismo, el Contratista ha asumido los costos de señalización, vallas informativas, iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad requeridos.


9 CONCLUSIONES

La interventoría ha llevado a cabo el seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista, facilitando así la realización de todos los objetivos establecidos en el contrato. Ha ejercido una supervisión rigurosa para asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales, enfocándose en aspectos clave como los plazos, la calidad, las cantidades de obra y la eficiencia en el uso de los recursos. Además, ha mantenido una comunicación constante y efectiva entre todas las partes involucradas en el proyecto, lo que ha permitido la organización efectiva de reuniones, mesas técnicas, comités de obra y otros encuentros importantes. También ha solicitado informes de los procesos y ha verificado que se ejecuten adecuadamente, ofreciendo soluciones rápidas ante cualquier problema, lo que facilita la gestión y control de riesgos identificados. La interventoría ha supervisado de manera continua y eficiente todas las fases del

contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos y las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales definidas en el contrato. Esto se ha logrado con el apoyo del personal calificado ofrecido, acorde con las exigencias de dedicación y análisis de costos presentados en la propuesta.

Durante el mes de diciembre de 2024, la interventoría realizó una supervisión integral del contrato de obra CO1.PCCNTR.6698166 de 2024, registrando un avance físico acumulado del 76.17%, frente a un avance programado del 79.81% lo que refleja un avance del (+)3,637%.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los 31 días del mes de enero de 2025.



(JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA)
Representante Legal
(INTERVENTORIA)

10 ANEXOS

10.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO
10.2 COMITES DE OBRA
10.3 INFORMES SEMANALES
10.4 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
10.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA
10.6 CORRESPONDECIA RECIBIDA
10.7 BITACORA DE OBRA
10.8 CERTIFICACIONES VARIAS
10.9 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA
10.10 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
10.11 INFORME ESPECIALISTA SST

9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 31 M: 1 A: 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

INTERVENCIÓN SEDE EL ACACIAS - META

INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN DRYWALL



FOTOGRAFIA 1

INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA FLACHADA FLOTANTE



FOTOGRAFIA 2

INTERVENCIÓN SEDE EL ACACIAS - META

FINALIZACIÓN DE ENTRADA PARA ESCALERA PARA SUBIR A CUBIERTA



FOTOGRAFIA 3

INICIO DE INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 31 M: 1 A: 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

INTERVENCIÓN SEDE PUERTO RICO - META

ESTUCADO DE OFICINA ARCHIVO DOS FINALIZADO



FOTOGRAFIA 1

TAPAS EN SUPERBOARD PARA FACHADA



FOTOGRAFIA 2

INTERVENCIÓN SEDE PUERTO RICO - META

INSTALACIÓN DE DUCTERÍA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS



FOTOGRAFIA 3

INSTALACIÓN DE ESTRUCTRA PARA CIELO RASO EN PVC



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 31 M: 1 A: 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	SECRETARIA LIDER
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		SUPERVISOR
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

INTERVENCIÓN SEDE GRANADA - META

INSTALACION ELECTRICA



FOTOGRAFIA 1

INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC



FOTOGRAFIA 2

VISITA SEDE GRANADA - META

ENCHAPE DEL BAÑO DE JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA



FOTOGRAFIA 3

PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 31 M: 1 A: 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	SECRETARIA LIDER
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		SUPERVISOR
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

INTERVENCIÓN SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE SEDE ALTO TRIBUNAL

INSTALACION DE COFRE AE-319



FOTOGRAFIA 1

PAÑETE DE MURO



FOTOGRAFIA 2

INTERVENCIÓN SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE SEDE ALTO TRIBUNAL

RESANE Y PINTURA



FOTOGRAFIA 3

INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EMT



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME (D / M / A)
		31 / 1 / 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	SECRETARIA LIDER
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		SUPERVISOR
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

COMITES SEDE PUERTO RICO - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 1

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 2

COMITES SEDE PUERTO RICO - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 3

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL D: 31 M: 1 A: 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

COMITES SEDE EL CALVARIO - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 1

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 2

COMITES SEDE EL CALVARIO - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 3

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME (D / M / A)
		31 / 1 / 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	**SECRETARIA LIDER**
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		**SUPERVISOR**
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

COMITES SEDE EL YARI - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 1

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 2

COMITES SEDE EL YARI - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 3

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No. 6703345 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 31 M: 1 A: 2025
TIPO CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	SECRETARIA LIDER
INTERVENTORIA		RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA		SUPERVISOR
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS

COMITES SEDE GRANADA - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 1

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 2

COMITES SEDE GRANADA - META

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 3

COMITÉ PRESENCIAL



FOTOGRAFIA 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FABIAN ANTONIO PEREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

9.2 CÓMITES DE OBRA

	Consejo Superior de la Judicatura ***Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*** ***Unidad de Infraestructura Física***

CONTRATO No	CO1.PCCNTR.6698166	DE	2024	FECHA ACTA	DD	MM	AA	COMITE
					31	01	2025	

CONTRATISTA	INVERSIONES G Y S S.A.S NIT. 830.083.258-1 R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
OBJETO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	Sitio de obra - Sede El Yarí		
HORA DE INICIO:	7:30 AM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SUPERVISIÓN		
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION JUDICIAL		
VALOR INCIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS ($1.451.608.104,00) COP		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR ADICIÓN N°1:	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA UN PESOS M/CTE ($523.864.231)		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	DOS (02) MESES		
VALOR TOTAL:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.975.472.335,00)		
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATO INTER No	CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA:	28 DE FEBRERO DE 2025		
SUPERVISOR	MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Revisión a cumplimiento de compromisos anteriores.
2. Estado de ejecución del contrato.
3. Recuento de actividades ejecutadas en la semana.
4. Inconvenientes presentados en obra.
5. Balance de cantidades del contrato.
6. Inicio de actividades en Sedes El Yarí y El Calvario.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Instalación de mesón en Palacio SJG	Cumplió	
2	revisión y entrega de informe de obra #4 diciembre a la supervisión	No se cumplió	
3	Cronograma de trabajo de sedes el Calvario y la sede el Yari	No se cumplió	

Scanned with CamScanner

4	Informar visita técnica por parte de la Dirección para la conexión en la sede Acacías	Cumplió	
5	Viabilidad para los baños en el primer piso de la sede Granada	Cumplió	
6	Enviar informe sobre las manejadoras en la Sede Palacio de SJG	Cumplió	
7	Visita de obra a la sede Calvario	Cumplió	
8	Visita de obra a la sede Yarí	Cumplió	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	2. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta)	3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)
		
4. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	5. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	6.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),
		
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),		
		

Scanned with CamScanner

	Consejo Superior de la Judicatura **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física**

ANÁLISIS DE ESTADO DEL CONTRATO:

Fecha de inicio:	04 de septiembre de 2024	
Fecha de terminación:	28 de febrero de 2025	
Plazo:	5.93 meses	178 días
Días transcurridos:	178 días	
Días restantes:	29 días	
% tiempo transcurrido:	83,62%	
Avance programado $:	**$ 1.504.814.614,24**	
% avance programado	**76,17%**	
Avance ejecutado a corte del 31/01/2025 $:	$ 1.576.654.585,00	
% avance ejecutado	79,81%	
Atraso o adelanto	**(+) $71.839.971**	
% atraso o adelanto	**(+) 3,64%**	

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Se da inicio al comité con un recorrido por la sede el Yarr.

El contratista de obra expone el alcance de las intervenciones aprobadas inicialmente.

La interventoría informa que la sede tiene 2 problemas por la humedad, el primero es debido a que la cimentación no está aislada del terreno natural generando humedad en los muros del primer piso. El segundo problema es una humedad en el antepecho de la terraza que debido a juntas constructivas que no están selladas y fisuras que se evidencian, se genera filtración de agua al interior de la oficina en el segundo piso.

La entidad contratante solicita al contratista presentar un informe con la solución técnica para solucionar la problemática de la humedad por capilaridad en el primer piso, con su respectivo presupuesto, para evaluar incluirla dentro del alcance del contrato.

El contratista manifiesta que una alternativa es la construcción de un filtro francés perimetral con su descole.

Durante el recorrido se evidencia humedades en el cuarto donde se van a ubicar el rack y donde esta la puerta de seguridad para acceso al área de la Escalera, se inspecciona la placa de concreto de la terraza del primer nivel que está sobre esta área, se evidencia que el manto asfáltico de la terraza está en mal estado y el desagüe es insuficiente ya que solo tiene

Scanned with CamScanner

una bajante. Se propone volver a impermeabilizar y construir una gárgola - una bajante adosada con pendiente a 2 aguas.
Se realiza recorrido en el segundo piso y se confirma que las humedades son por la filtración de agua por los muros perimetrales, por lo cual, la entidad indica que se debe priorizar en el presupuesto las impermeabilizaciones externas antes de realizar resanes al interior de la edificación.
Se contempla 3 cambios de grifería de lavamanos, 1 cambio de grifería de push baño 2do piso, 1 registro de bola, en el baño 1er piso cambio llave push para los 2 orinales y 1 sanitario y cambio de grifería para lavamanos y el cambio del registro de bola. Se contempla demolición de enchape y se posteriores reposición para el cambio de llaves y registros.
Se plantea realizar la misma intervención en el baño de mujeres 1er piso, donde existe 2 sanitarios, 2 lavamanos y 1 registro bola.
En el baño de mujeres 2do piso se reemplazará 1 sanitario que esta despegado y genera humedad.
La entidad sobota contemplar la inclusión de la raya de seguridad y el cerramo en la zona de acceso a la fiscalía.

BAÑOS GRANADA
Se establece que para los baños 1er piso Granada se mantendrá la misma distribución de los espacios.
La supervisión indica que se debe instalar el sanitario Cadet Corona para los baños comunitarios 1er y 2do piso, se autoriza también instalarlos en los baños comunitarios de San José y el Calvario. Para los baños de los jueces se debe dibujar la referencia Monteverde.
El contratista deberá presentar referencias de lavamanos para el Calvario.
Para la sede Granada el contratista informa que en los juzgados del 2do piso, en los baños quedarán 2 espejos rectangulares y 1 espejo circular, debido a la limitación de los espacios.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

ACTA DE RECORRIDO

CONTINUACIÓN PÁGINA 4 ACTA DE COMITÉ 31 DE ENERO DE 2025.

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS

El contratista informa que espera entregar en su totalidad la sede Acacias el 10 de Febrero.

El juzgado de Fomba en Granada se trasladará el día de hoy y se ubicarán actividades en la sala de audiencia en el baño del 2do piso. La fecha entrega de esta sede es el 20 de febrero.

En la sede Pto Rico se estima una fecha entrega para el 12 de febrero para la entidad contratante.

En la sede SPC Tribunales se requiere definir la intervención para la bajante aguas lluvias del patio y la ubicación de las canaletas. La interventoría recomienda conectar la bajante a la caja del patio y construir un descanso para evitar la colmatación de la tubería. La supervisión indica que está en reunión con el ordenador del gasto.

En la sede el Calvario ya se realizó el traslado y se está pendiente del desmonte de los puntos de datos y voz parte de la entidad.

En la sede SPC Tribunales la supervisión informa que se va a radicar la solicitud ante EVERCUARIARE para el cambio de cerradura

El contratista manifiesta que requiere prontas definiciones de la ubicación de las canaletas en SPC Tribunales porque esta actividad impide realizar el pilo-caso y pintura. La supervisión informa que el lunes le remite respuesta. El contratista informa que el viernes pasado el fresno lunes queda listo. Para los baños de los magistrados en todas las sedes la supervisión solicita instalar gabinetes en vidrio ~~inoxidable~~ templado y para los baños comunitarios gabinetes push, y los orinales sean metálicos tipo push. El contratista informa que en SPC Tribunales necesita aún 28 luminarias, la supervisión indica que esta gestionando la entrega
El contratista informa que está realizando logística para llevar todos los materiales al Calvario, e iniciarán obra el 10 de febrero.

Scanned with CamScanner

	Consejo Superior de la Judicatura **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física**

Compromisos adquiridos:

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Oficio Para Solicitar Cambio de Contador.		Entidad.	03/02/2025.
2	Desague Cubierta.		Entidad.	03/02/2025.
3	Definición Condensadoras Sin Uso.		Entidad.	03/02/2025
4.	Presupuesto Para Yary		Inversiones G y S.	05/02/25.
5.	Nancy Gauet Rawos			

Próximo comité de obra:


Lista Asistencia:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
William E Bernal B.	Coordinador		
Angie Baena	Residente De Obra	Inversiones G y S.	
Nelson Gomez	Director De Obra.	Inversiones G y S.	
Rafael Pinto	Inspector de interventoría	Interventoría	
Nancy Gauet	Supervisora	Entidad	
Fabian Antonio Perez Arias	Residente de Interventoría	INTERVENTORIA	

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



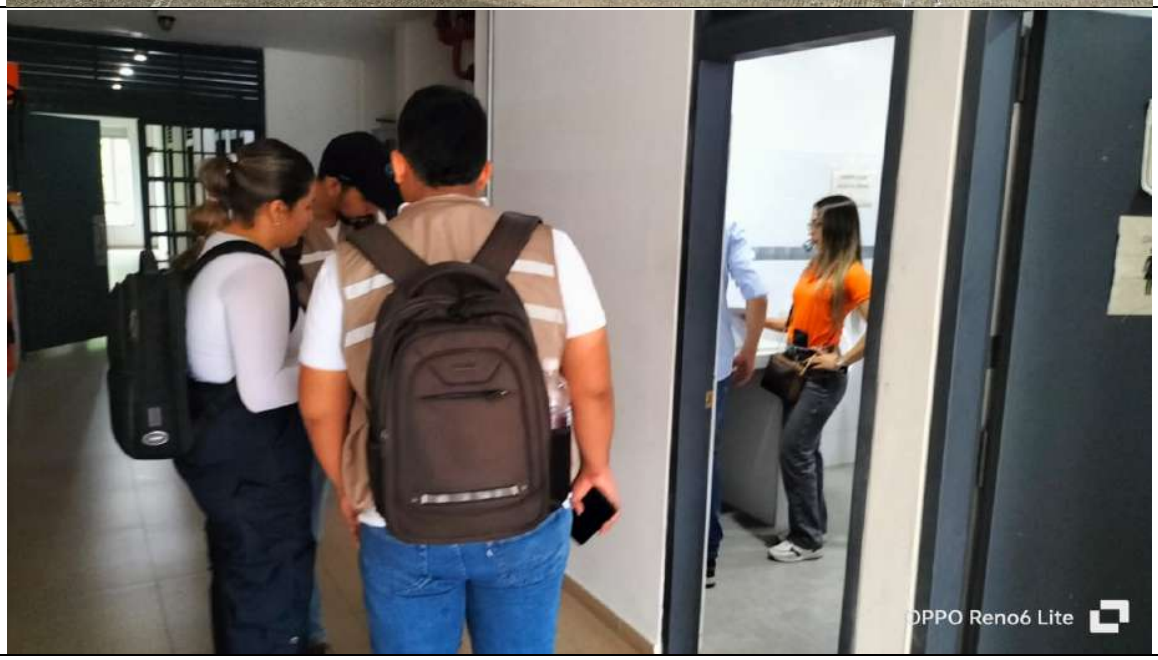


OPPO Reno6 Lite


OPPO Reno6 Lite

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*** ***Unidad de Infraestructura Física***

CONTRATO No	CO1.PCCNTR.6698166	**DE**	2024	**FECHA ACTA**	**DD**	**MM**	**AA**	**COMITE**
					10	01	2025	

CONTRATISTA	INVERSIONES G Y S S.A.S NIT. 830.083.258-1 R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
OBJETO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	Sitio de obra - Sede Judicial Granada - Meta		
HORA DE INICIO:	1:30 PM	**HORA FINAL:**	3:00 PM
CONVOCA:	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION JUDICIAL		
VALOR INCIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS ($1.451.608.104,00) COP		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR ADICIÓN N°1:	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA UN PESOS M/CTE ($523.864.231)		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	DOS (02) MESES		
VALOR TOTAL:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.975.472.335,00)		
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATO INTER No	CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA:	28 DE FEBRERO DE 2025		
SUPERVISOR	MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Revisión a cumplimiento de compromisos anteriores.
2. Estado de ejecución del contrato.
3. Recorrido en obra sede Granada.
4. Inconvenientes presentados en obra.
5. Necesidades adicionales en la sede Granada

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

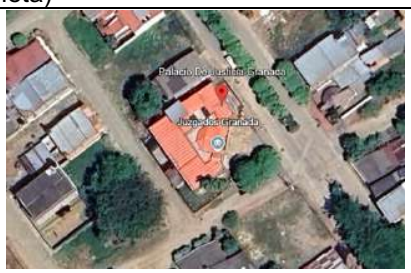LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	2. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta)	3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)
		
7. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	8. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	9.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),
		
10. Sede Judicial Del Calvario (Meta),		
		

ANÁLISIS DE ESTADO DEL CONTRATO:		
Fecha de inicio:	04 de septiembre de 2024	
Fecha de terminación:	28 de febrero de 2025	
Plazo:	5.93 meses	178 días
Días transcurridos:	129 días	
Días restantes:	49 días	
% tiempo transcurrido:	72,47%	
Avance programado $:	$ 1.449.996.230,18	
% avance programado	73,40%	
Avance ejecutado a corte del 05/01/2025 $:	$ 795.127.615,00	
% avance ejecutado	40,25%	
Atraso o adelanto	**(-) $ 654.868.615,18**	
% atraso o adelanto	**(-) 33,15%**	

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Se da inicio al comité de obra en la sede judicial de Granada, el objetivo de realizar el comité en esta sede es para evidenciar el avance en la ejecución de actividades en las oficinas del juzgado primero y segundo promiscuo en el segundo piso, las cuales se deben entregar el próximo lunes 13 de enero de 2025.

Recorrido en obra:
Se realiza recorrido por la sede judicial Granada para evidenciar el avance en las diferentes áreas:



Fotografía 1. Inicio de recorrido en obra

Se evidencia el avance de obra en los juzgados primero y segundo promiscuo, se tiene el cielo raso instalado en un 90%, el muro divisorio de las dos oficinas está terminado, se está realizando el enchape de los baños de los jueces, entre las actividades que se encuentran pendientes por ejecutar está la pintura de muros, la terminación de enchapes de baño e instalación de lavamanos con su mueble y espejo y las incrustaciones de los baños, el cielo raso pvc de los baños también está pendiente por instalar y el aseo y limpieza general de las oficinas.



Fotografía 2. Juzgados promiscuos piso 2.

También se evidencia que falta instalar las luminarias y los aíres acondicionados al interior de los dos juzgados. El día de hoy la supervisión trajo las luminarias que se requieren instalar en la sede, por lo cual la entidad contratante realiza el suministro y el contratista ejecuta la instalación. De acuerdo a lo evidenciado, el contratista manifiesta que podrá entregar las oficinas el día lunes 13 de enero, pero que quedarán actividades

de remates y acabados pendientes por ejecutar, principalmente en los baños de los jueces. La supervisión lo considera viable y sugiere terminar las actividades pendientes en horario nocturno y/o los fines de semana.



Fotografía 3. Juzgados promiscuos piso 2.

Se realiza recorrido por las oficinas del juzgado de familia, se evidencia que está área tiene un avance menor ya que se priorizó la entrega de los juzgados promiscuos del piso 2. El contratista manifiesta que la próximo semana continuará con el personal ejecutando actividades en estás oficinas.



Fotografía 4. Juzgado de familia piso 2.

La interventoría informa que previo el incio del comité se realizó recorrido con el contratista por el área de la cubierta donde se evidencia la culminación de actividades en esta zona, únicamente está pendiente instalar una cubierta en la zona donde ingresa la acometida de la red de datos a la sede judicial, el traslado de la red de datos deberá ser ejecutado por el proveedor del servicio contratado por la entidad.



Fotografía 5. Zona de cubierta, cambio de teja y reubicación de A/C.

Por último, el contratista manifiesta que se encuentra en proceso de elaboración del balance de cantidades de todas las sedes y que en la sede de Granada se presentan las siguientes necesidades las cuales no están dentro del alcance del contrato, pero se recomiendan realizar para un adecuado funcionamiento de la edificación:

- En el tanque elevado de almacenamiento de agua potable se genera rebose cuando se está realizando el llenado con la electrobomba, lo cual puede generar a futuro posible humedades por exceso de agua filtrando sobre la cubierta, para lo cual el contratista recomienda instalar un sistema automatizado para que la electrobomba se apague cuando el tanque esté lleno y no se sigan presentando los reboses.
- En el cuarto del Rack se evidencia un desorden excesivo de cableado, donde los cables nos están organizados ni marquillados, lo cual dificulta operar y manipular las conexiones del rack. El contratista recomienda realizar un mantenimiento y organizar todo el cableado identificando las acometidas y marquillandolas, con esto se asegura un funcionamiento y operación adecuada del equipo.

Compromisos adquiridos:

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Entrega de diseño de cárcamo para manejo de aguas lluvias – sede Pto Rico		Contratista	15/01/2025
2	Entrega de informe mensual de diciembre de obra		Contratista	12/01/2025

Próximo comité de obra:

Lista Asistencia:		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Fabian Antonio Pérez Arias	Residente de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Rafael Pinto	Inspector de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Mónica Tatiana Gómez Ramos	Supervisora	Dirección seccional sede judicial Villavicencio
Alba Scarpeta	Profesional SST	INVERSIONES GYS SAS
Angie Lizeth Borda	Residente de obra	INVERSIONES GYS SAS

Registro fotográfico:




OPPO Reno6 Lite
2025.01.10 14:33


OPPO Reno6 Lite
2025.01.10 14:34

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*** ***Unidad de Infraestructura Física***

CONTRATO No	CO1.PCCNTR.6698166	**DE**	2024	**FECHA ACTA**	**DD**	**MM**	**AA**	**COMITE**
					15	01	2025	

CONTRATISTA	INVERSIONES G Y S S.A.S NIT. 830.083.258-1 R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
OBJETO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	Reunión virtual vía Google Meet Enlace de reunión: https://meet.google.com/vsj-mxmo-rjg		
HORA DE INICIO:	4:00 PM	**HORA FINAL:**	6:00 PM
CONVOCA:	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION JUDICIAL		
VALOR INCIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS ($1.451.608.104,00) COP		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR ADICIÓN N°1:	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA UN PESOS M/CTE ($523.864.231)		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	DOS (02) MESES		
VALOR TOTAL:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.975.472.335,00)		
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATO INTER No	CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA:	28 DE FEBRERO DE 2025		
SUPERVISOR	MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		


OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Revisión a cumplimiento de compromisos anteriores.
2. Estado de ejecución del contrato.
3. Recuento de actividades ejecutadas en la semana.
4. Inconvenientes presentados en obra.
5. Balance de cantidades del contrato.
6. Pago de acta parcial N°1.
7. Inicio de actividades en Sedes El Yarí y El Calvario.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Entrega de diseño de cárcamo para manejo de aguas lluvias – sede Pto Rico	No se cumplió	
2	Entrega de informe mensual de diciembre de obra	No se cumplió	

3	Visita de obra a sede Granada para evaluar habilitación de zonas para juzgados primero y segundo promiscuo	Cumplió	
4	Aprobación de diseños eléctricos para sede Pto Rico	Cumplió	
5	Concepto por escrito sobre la tecnología de los equipos de AC y la ubicación del posible equipo funcional	Cumplió	
6	Copia del acta de suspensión de los baños emitida por la secretaría de salud del municipio de Acacias.	Parcialmente cumplido	
7	Entrega de oficio para trámite ante Energuaviare	Cumplió	
8	Entrega de programación detallada para la ejecución de actividades en sedes El Yarí y el Calvario	Cumplió	

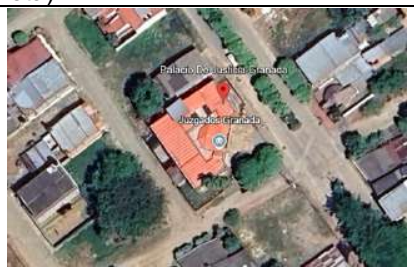LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	2. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta)	3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)
		
4. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	5. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	6.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),
		
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),		
		

ANÁLISIS DE ESTADO DEL CONTRATO:		
Fecha de inicio:	04 de septiembre de 2024	
Fecha de terminación:	28 de febrero de 2025	
Plazo:	5.93 meses	178 días
Días transcurridos:	134 días	
Días restantes:	44 días	
% tiempo transcurrido:	75,28%	
Avance programado $:	$ 1.457.645.655,90	
% avance programado	73,79%	
Avance ejecutado a corte del 12/01/2025 $:	$ 1.080.127.615,00	
% avance ejecutado	54,68%	
Atraso o adelanto	**(-)$ 377.518.040,90**	
% atraso o adelanto	**(-) 19,11%**	

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Se da inicio al comité de obra con asistencia de la interventoría, contratista y supervisión.

A continuación, se realiza un recuento por parte de la interventoría y el contratista de las actividades realizadas durante la semana anterior y la semana en transcurso:

Sede SJG Tribunales

Se realizó la instalación de cubierta, la interventoría verificó la instalación correcta de la cubierta con el debido aislante térmico,



Se realizaron las regatas para instalaciones hidráulicas y eléctricas, se inició la instalación de canaleta en el primer piso para la acometida de la red nueva.



Se realizó la maniobra de traslado de medidor a través de la empresa Energuaviare.



Se realizó el pañete de muros y se selló con mampostería un vano que no era funcional.



Se realizaron resanes con aplicación de nuevo estuco y pintura.



Sede Acacias:


La interventoría informa que la semana pasada el 7 de enero de 2025 se realizó entrega de la oficina del Juzgado Tercero Promiscuo en piso 4.



La interventoría informa que la semana pasada se realizó entrega de la oficina archivo del piso 4.



La interventoría informa que el día 13 de enero de 2025 el contratista finalizó las actividades en la oficina juzgado segundo civil del piso 4, y está pendiente de suscribir el acta de entrega y actualmente se encuentra en uso.

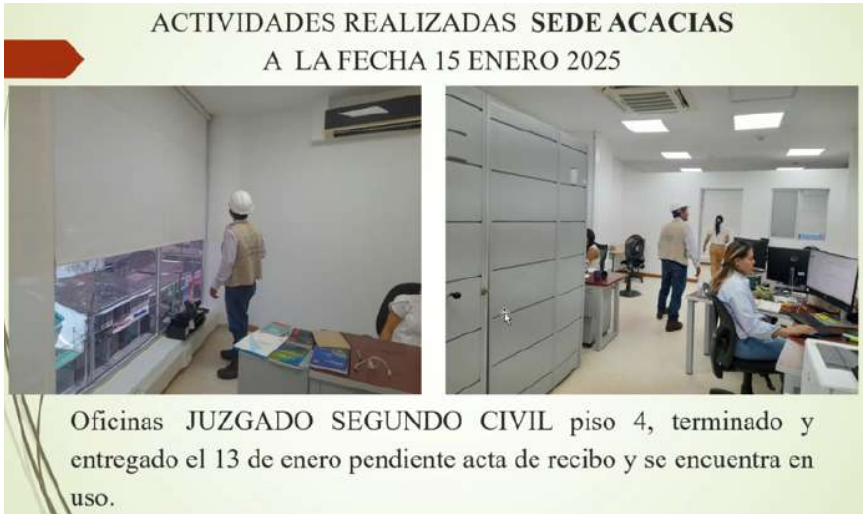

La supervisora informa que recibió una queja sobre el daño de una persiana en la oficina del juzgado segundo civil, entonces solicita a la interventoría verificar ese daño.

La interventoría informa que la oficina que se ubica al lado de la escalera de emergencia ya está terminada casi en su totalidad, está pendiente el cambio de algunos marcos de luminarias y registros.



Los pasillos ya están terminados y se realizó el resane de humedades.



La terraza está próxima a culminar, se está aplicando el alumol, y se requiere de un curado de 72 horas sobre el cual no se podrá transitar en este periodo y se dejará en el manual de mantenimiento una recomendación para no transitarlo con zapatos de suela muy rugosa o dura que le genera algún desgaste por abrasión.



En el área de la escalera de emergencia piso 4 se realizó resane de muros aplicando un empastado con pegacor y aplicación de estuco para posteriormente pintar.





Se finalizaron las actividades en la zona de la escalera principal, y se retiró el escombro y se encuentra habilitada la zona para el tránsito del personal de la sede.



Sede Puerto Rico:

Se inicia con el detalle del acabado para la parte de la fachada en la sede, se hace el resane de la viga canal con pañete haciendo falta estuco y pintura de esta.



Se inicia con la instalación eléctrica para las lámparas y se da inicia al descapote para el cárcamo en la parte oriental de la sede.



Inicio de instalación eléctrica

Inicio de descapote para cárcamo en parte oriental

Sede El Yarí:
Aún no se inician actividades en esta sede.

Sede El Calvario:
Aún no se inician actividades en esta sede.

El contratista informa que tiene proyectado iniciar actividades en sede el Yarí y Calvario dentro de 3 semanas.

La supervisión solicita la instalación del mesón pendiente en la sede Palacio SJG, solicita a la interventoría copia de las actas de entrega parciales realizadas en las sedes.

La supervisión solicita una relación de instalación de luminarias en cada oficina.

La supervisión solicita a la interventoría y al contratista realizar visita al juzgado segundo civil para verificar el daño de una persiana.

El contratista informa que no se cuenta con ducteria para fibra óptica en la sede Puerto Rico, debido a esto la entidad deberá realizar la instalación mediante canaleta.

La supervisora solicita el plazo total necesario para ejecutar todas las actividades en las sedes Yarí y Calvario y solicita un cronograma detallado de la ejecución de las actividades en esas sedes.

El contratista informa que el plazo necesario es de 1 mes para ejecutar las actividades de esas 2 sedes.

El contratista solicita a la interventoría realizar revisión en sitio de las sedes Granada y Acacias, para el recibo parcial de áreas.

La supervisión reitera la solicitud de entrega oportuna del informe mensual de diciembre.


Compromisos adquiridos:


No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Instalación de mesón en Palacio SJG		Contratista	
2	Envío de copia de las actas de entrega de cada área		Interventoría	16/01/2025
3	Diligenciar formato de instalación de luminarias en cada oficina		Contratista e Interventoría	16/01/2025
4	Visita a juzgado segundo civil para verificar el daño de persiana		Contratista e Interventoría	16/01/2025
5	Instalación de la fibra óptica en sede Puerto Rico		Entidad	
6	Cronograma de trabajo de sedes el Calvario y la sede el Yari		Contratista	20/01/2025
7	Entrega de informe mensual de diciembre 2024		Contratista	16/01/2025
8	Entrega del balance de los presupuestos		Contratista e Interventoría	20/01/2025
9	Entrega del informe mensual de diciembre		Contratista	20/01/2025
10	Remisión del informe mensual de obra e interventoría a la supervisión		Interventoría	21/01/2025

Próximo comité de obra:

Lunes 20 de enero de 2025 hora 4:00pm

Lista Asistencia:		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Fabian Antonio Pérez Arias	Residente de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Rafael Pinto	Inspector de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Leonardo Briñez	Apoyo de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Pedro Alférez	Apoyo de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Director de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Mónica Tatiana Gómez Ramos	Supervisora	Dirección seccional sede judicial Villavicencio
Nelson Enrique Gómez García	R.L. / Director de Obra	INVERSIONES GYS SAS
Angie Borda	Residente de obra	INVERSIONES GYS SAS

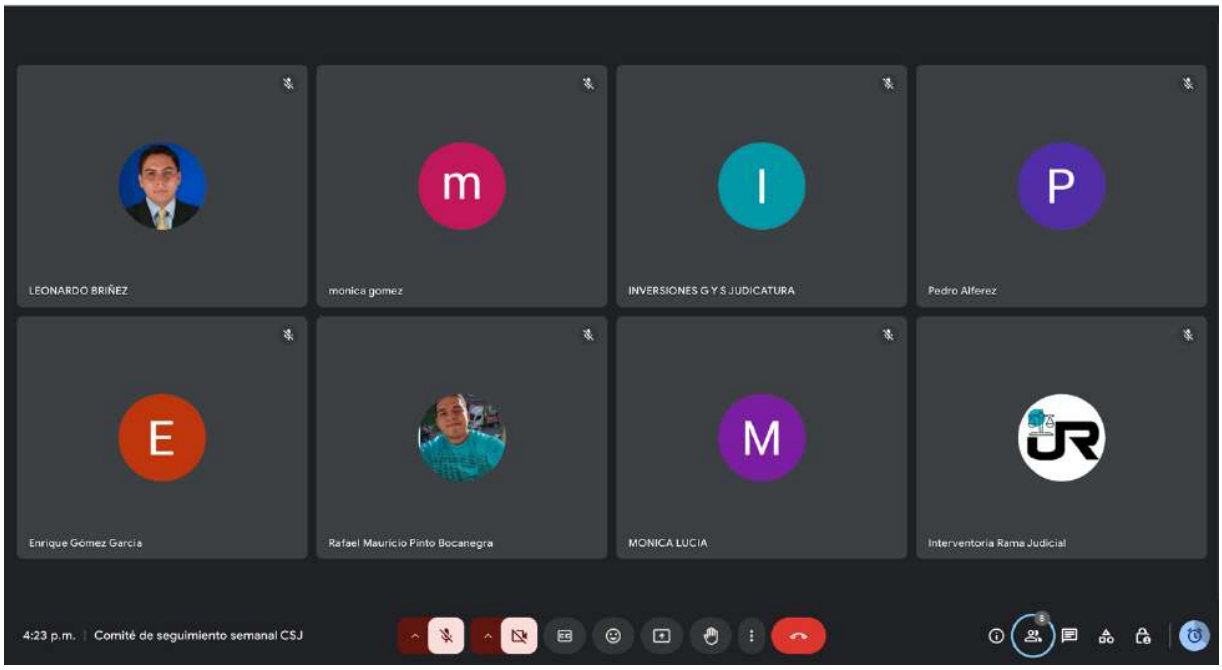
LEONARDO BRIÑEZ
monica gomez
INVERSIONES G Y S JUDICATURA
Pedro Alferez
Enrique Gómez García
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra
MONICA LUCIA
Interventoria Rama Judicial
4:23 p.m. | Comité de seguimiento semanal CSJ

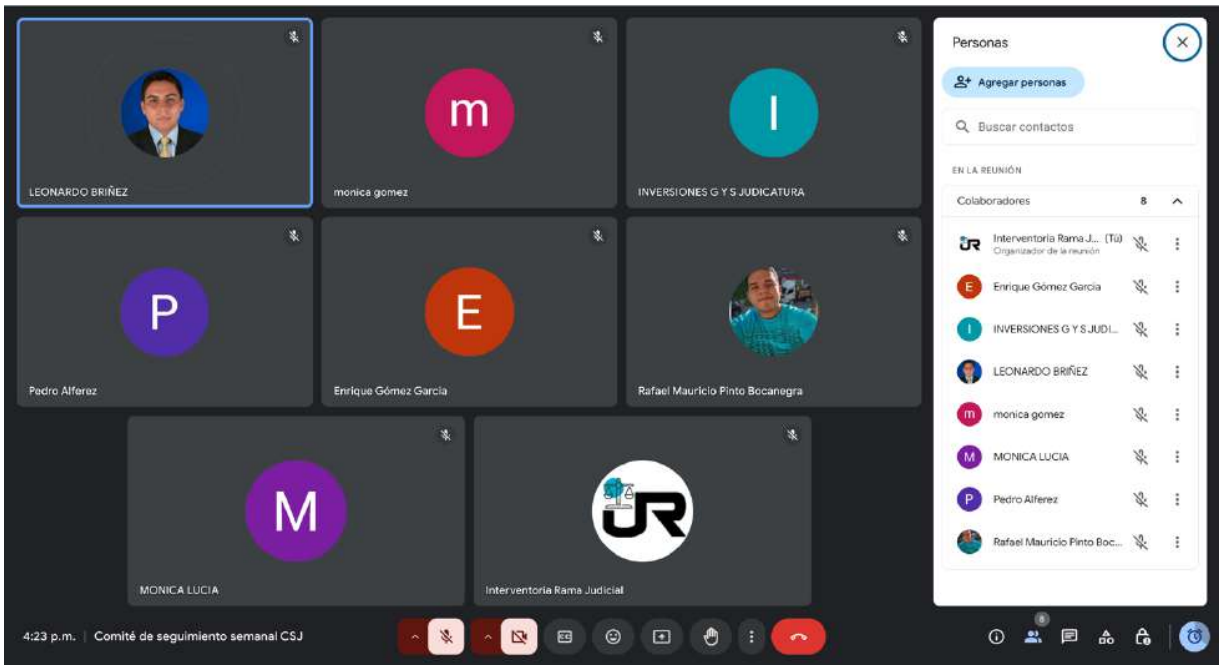
LEONARDO BRIÑEZ
monica gomez
INVERSIONES G Y S JUDICATURA
Pedro Alferez
Enrique Gómez García
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra
MONICA LUCIA
Interventoria Rama Judicial
Personas
Agregar personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 8
Interventoria Rama J... (Tú)
Organizador de la reunión
Enrique Gómez García
INVERSIONES G Y S JUDI...
LEONARDO BRIÑEZ
monica gomez
MONICA LUCIA
Pedro Alferez
Rafael Mauricio Pinto Boc...
4:23 p.m. | Comité de seguimiento semanal CSJ

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial*** ***Unidad de Infraestructura Física***

CONTRATO No	CO1.PCCNTR.6698166	**DE**	2024	**FECHA ACTA**	**DD**	**MM**	**AA**	**COMITE**
					24	01	2025	

CONTRATISTA	INVERSIONES G Y S S.A.S NIT. 830.083.258-1 R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
OBJETO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	Reunión virtual vía Google Meet Enlace de reunión: https://meet.google.com/gkq-npue-uaw		
HORA DE INICIO:	3:00 PM	**HORA FINAL:**	5:00 PM
CONVOCA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORÍA		
VALOR INCIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS ($1.451.608.104,00) COP		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR ADICIÓN N°1:	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA UN PESOS M/CTE ($523.864.231)		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	DOS (02) MESES		
VALOR TOTAL:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.975.472.335,00)		
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATO INTER No	CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA:	28 DE FEBRERO DE 2025		
SUPERVISOR	MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Revisión a cumplimiento de compromisos anteriores.
2. Estado de ejecución del contrato.
3. Recuento de actividades ejecutadas en la semana.
4. Inconvenientes presentados en obra.
5. Balance de cantidades del contrato.
6. Distribución baños primer piso Granada
7. Aires Acondicionados Puerto Rico
8. Diseños bajante cubierta SJG
9. Ubicación condensadoras SJG
10. Humedades primer piso tribunales SJG
11. Inicio de actividades en Sedes El Yarí y El Calvario.

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial*** ***Unidad de Infraestructura Física***

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR			
No.	**COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA**	**AVANCE DEL COMPROMISO**	**EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO**
1	Instalación de mesón en Palacio SJG	No se cumplió	
2	Envío de copia de las actas de entrega de cada área	Cumplió	
3	Diligenciar formato de instalación de luminarias en cada oficina	Cumplió	
4	Visita a juzgado segundo civil para verificar el daño de persiana	Cumplió	
5	Instalación de la fibra óptica en sede Puerto Rico	No se cumplió	
6	Cronograma de trabajo de sedes el Calvario y la sede el Yari	No se cumplió	
7	Entrega de informe mensual de diciembre 2024	Cumplió	
8	Entrega del balance de los presupuestos	Se cumplió parcialmente	
9	Entrega del informe mensual de diciembre interventoría	No se cumplió	
10	Remisión del informe mensual de obra e interventoría a la supervisión	No se cumplió	

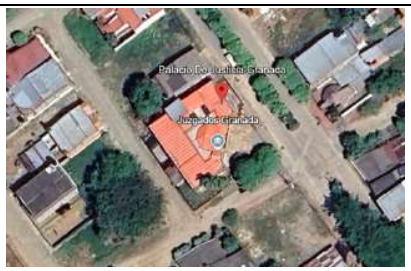LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		
		
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	2. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta)	3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)
		
4. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	5. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	6.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),



7. Sede El Calvario

ANÁLISIS DE ESTADO DEL CONTRATO:

Fecha de inicio:	04 de septiembre de 2024	
Fecha de terminación:	28 de febrero de 2025	
Plazo:	5.93 meses	178 días
Días transcurridos:	143 días	
Días restantes:	35 días	
% tiempo transcurrido:	80,34%	
Avance programado $:	$ 1.476.153.061,60	
% avance programado	74,72%	
Avance ejecutado a corte del 24/01/2025 $:	$ 1.435.404.585,00	
% avance ejecutado	72,66%	
Atraso o adelanto	**(-) $ 40.748.476,60**	
% atraso o adelanto	**(-) 2,06%**	

DESARROLLO DEL COMITÉ:
Se da inicio al comité de obra con asistencia de la interventoría, contratista y supervisión.
A continuación, se realiza un recuento por parte de la interventoría y el contratista de las actividades realizadas durante la semana anterior y la semana en transcurso:

Sede SJG Tribunales

Aplicación y lijado de estuco en todas las paredes y se aplicó la primera capa de pintura, se está iniciando la segunda capa de pintura, falta darle mejor acabado a la pintura.





Instalación de cuatro cajas de paso, en estas cajas de paso irá toda la cometida eléctrica y de voz y datos.



Instalación de canaletas que ya se instaló a su cien por ciento, hace falta instalar las tomas reguladas, normales y de datos que pasan por este.



Se sigue haciendo instalación de tuberías eléctricas para lo que es la conexión de las cámaras de vigilancia que hay en el segundo piso y para unos puntos que hace falta.



Se instalaron los puntos sanitarios en los baños, ya se hizo la red hidráulica, para los diferentes espacios, conectara desde los tanques elevados, hasta los cuatro baños que hay en la sede.



Sede Acacías:

En la oficina Juzgado Primero Laboral del Circuito, en la oficina de archivo y en el Juzgado Segundo Civil Municipal se realizaron actividades esta semana. El piso cuatro ya está terminado y entregado, también a la supervisión se le remitió copia de acta de entrega parcial a través de correo electrónico

En el pasillo piso 4 se realizó un remate de pintura de los muros pintados y ya está listo para entrega.



En la oficina SALÓN MULTIPLE ya se encuentra finalizada y lista para entrega parcial.

ACTIVIDADES REALIZADAS **SEDE ACACIAS**
A LA FECHA 24 ENERO 2025





Oficina SALON MULTIPLE terminada y se encuentra lista para la entrega.

En la cubierta azotea ya se encuentra totalmente impermeabilizada, se aplicó la película de alumol para la finalización de impermeabilización, el contratista remite a la interventoría a través de un oficio unas recomendaciones para mantenimiento el cual fue trasladado a la supervision para que tenga los cuidados al momento de ingresar a esta área, pero se le reitera al contratista que al final del contrato deben entregar un documento de manual de uso y mantenimiento en el cual presentan todas las recomendaciones de las actividades ejecutadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS **SEDE ACACIAS**
A LA FECHA 24 ENERO 2025





Cubierta azotea, totalmente impermeabilizado y se aplicó película de alumol para la protección de impermeabilizaciones, lista para entrega.

La puerta de acceso a la azotea también se encuentra finalizada y lista para hacer entrega a la supervisión



Muros salida escalera emergencias piso 4. Terminado y listo para entrega.



Pasillo salida escalera emergencias piso 4. Terminado y listo para entrega.



Se realizo reparación de la cortina en la oficina del Juzgado Segundo Civil Municipal



Durante la semana se realizó la limpieza de archivos en el Juzgado Segundo Civil Municipal, contando con el acompañamiento constante de la interventoría y se subscribió entrega parcial.



Se realizo la instalación de las 38 lámparas que estaban proyectadas y cuantificadas.



Instalación de fachada, se tiene instalado los perfiles en un 70% y se está iniciando a instalar las láminas microperforadas.



Sede Puerto Rico:

Instalación de tubería para aires acondicionados e instalación de una parte de estructura para cielo raso en la oficina donde quedará ubicado el juez.



Instalación de aire acondicionado en el cuarto donde quedará el rack.



Se sigue con la instalación eléctrica



Visita técnica de la supervisión a la sede.



Sede Granada:

Se está realizando la pintura de marcos de puertas al juzgado de familia para su debida entrega parcial.



Se hace prueba de presión para baños públicos en el segundo piso



Se hace la instalación de puertas para el baño del Juez del Juzgado 001 Promiscuo Municipal, se le da acabado final al baño del Juez 002 promiscuo Municipal, haría falta el espejo de este y se le están terminando de dar acabado al baño del Juez de Familia.



Sede El Yarí:
Aún no se inician actividades en esta sede, se propone por parte de la interventoría hacer visita técnica el jueves 30 de enero.


Sede El Calvario:
Aún no se inician actividades en esta sede, la supervisión informa que se va a hacer visita técnica el día lunes 27 de enero y necesita que esté presente el contratista de obra y la interventoría.

Sede Granada: La supervisión solicita un plazo a más tardar el miércoles 29 de enero para darle viabilidad a los baños a la sede.

Sede Puerto Rico: La interventoría solicita al contratista de obra un soporte técnico de los aires acondicionados de la sede más detallado para remitirlo a la supervisión.

Sede Acacías: El Juzgado Segundo Civil ubicado en el cuarto piso el contratista instala 4 puntos de voz y datos y 8 en la sala múltiple del cuarto piso falta conectar en el rack estos puntos y la supervisión ya hizo el requerimiento, pero manifiesta que los técnicos están en Puerto Carreño y se está programando para que realicen la visita. El contratista pregunta que las 38 iluminarias que se desmontaron en la sede a quien se le da entrega para disposición final, la supervisión aclara que primero se debe hablar con el doctor William para darle la debida disposición final.

Sede Tribunales SJG: El contratista muestra un esquema de aguas lluvias en la sede, manifiesta que el agua lluvia la arrojan a una zona verde de la sede.

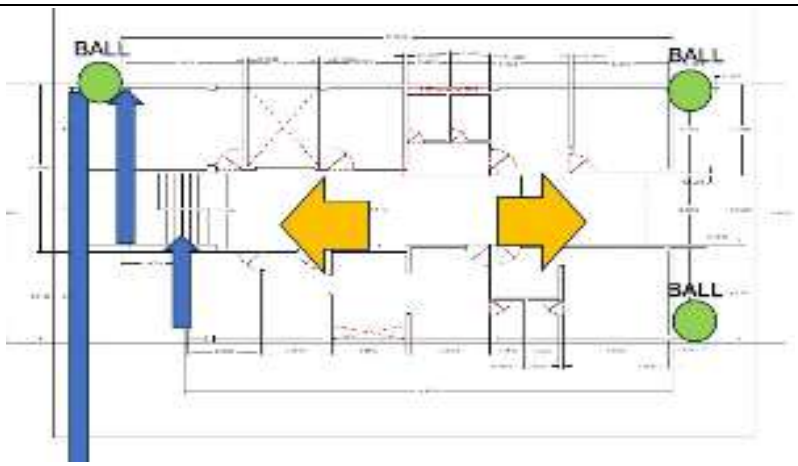

Se le trasladará a la supervisión el concepto técnico para que ellos le trasmitan al ordenador del gasto y así ellos den una alternativa





Se le deja claro al contratista dejar esa actividad suspendida por la interventoría hasta no tener el concepto técnico y hacer el debido traslado a la supervisión.









Se reitera al contratista que entre más rápido haga llegar el concepto técnico, más rápido la interventoría podrá darle traslado a la supervisión para el aval o la medida a seguir

Aires Acondicionados

Inicialmente se había hablado de que los Aires acondicionados había dos en este espacio que es un patio central, había sobre el segundo piso donde se quitó la ventana ahí había una pequeña rendija y el resto estaban en el techo, con el anterior supervisor el ingeniero Eduard se habló en su momento sobre la ubicación final de las manejadoras en donde hay un vacío sin ocupación. El profesional experto en el área de aires acondicionados contratado por el arquitecto Nelson mencionó que si se colocan las manejadoras en dicho punto tendría la pérdida de presión de gas y también en la durabilidad debido a que el área que va desde este espacio hasta los puestos de trabajo. Se deja a disposición de la supervisión donde es la que indica donde se colocarían las manejadoras.



La supervisión solicita INCLUIR EN EL INFORME UN APROXIMADO DE CUANTO SERÍA EL COSTO DE LA INSTALACION CON LA NUEVA REUBICACION Y CUANTO SERÍA EL COSTO DE REINSTALARLO EN LOS PUNTOS INICIALES. La interventoría manifiesta que debido a que el enfoque es la optimización de recursos, si se instalan los A/C en la ubicación inicial se deberán hacer acometidas independientes, lo cual no es eficiente y se generarán más cantidades de obra, y un mayor costo al proyecto.





Compromisos adquiridos:

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Instalación de mesón en Palacio SJG		Contratista	29/01/2025
2	revisión y entrega de informe de obra #4 diciembre a la supervisión		Interventoría	29/01/2025
3	Cronograma de trabajo de sedes el Calvario y la sede el Yari		Contratista	28/01/2025
4	Entregar el balance de la sede Granada		Contratista	26/01/2025
5	Informar visita técnica por parte de la Dirección para la conexión en la sede Acacías		Entidad	
6	Viabilidad para los baños en el primer piso de la sede Granada		Entidad	29/01/2025
7	Enviar informe sobre las manejadoras en la Sede Palacio de SJG		Contratista	
8	Visita de obra a la sede Calvario		Entidad, Contratista e Interventoría	27/01/2025
9	Visita de obra a la sede Yarí		Entidad, Contratista e Interventoría	27/01/2025
10				

Próximo comité de obra:

Lista Asistencia:		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Fabian Antonio Pérez Arias	Residente de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Rafael Pinto	Inspector de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Leonardo Briñez	Apoyo de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Pedro Alférez	Apoyo de Interventoría	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Mónica Tatiana Gómez Ramos	Supervisora	Dirección seccional sede judicial Villavicencio
Nelson Enrique Gómez García	R.L. / Director de Obra	INVERSIONES GYS SAS
Angie Borda	Residente de obra	INVERSIONES GYS SAS

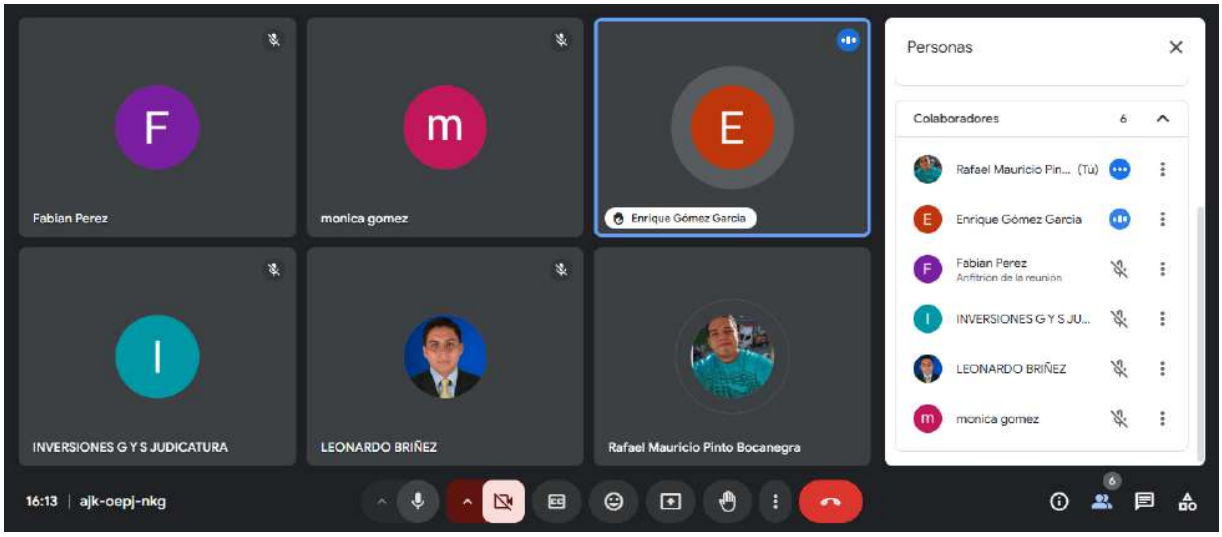
Fabian Perez
monica gomez
Enrique Gómez Garcia
INVERSIONES G Y S JUDICATURA
LEONARDO BRIÑEZ
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra
Personas
Colaboradores 6
Rafael Mauricio Pin... (Tú)
Enrique Gómez Garcia
Fabian Perez
Anfitrión de la reunión
INVERSIONES G Y S JU...
LEONARDO BRIÑEZ
monica gomez
16:13 | ajk-oepj-nkg

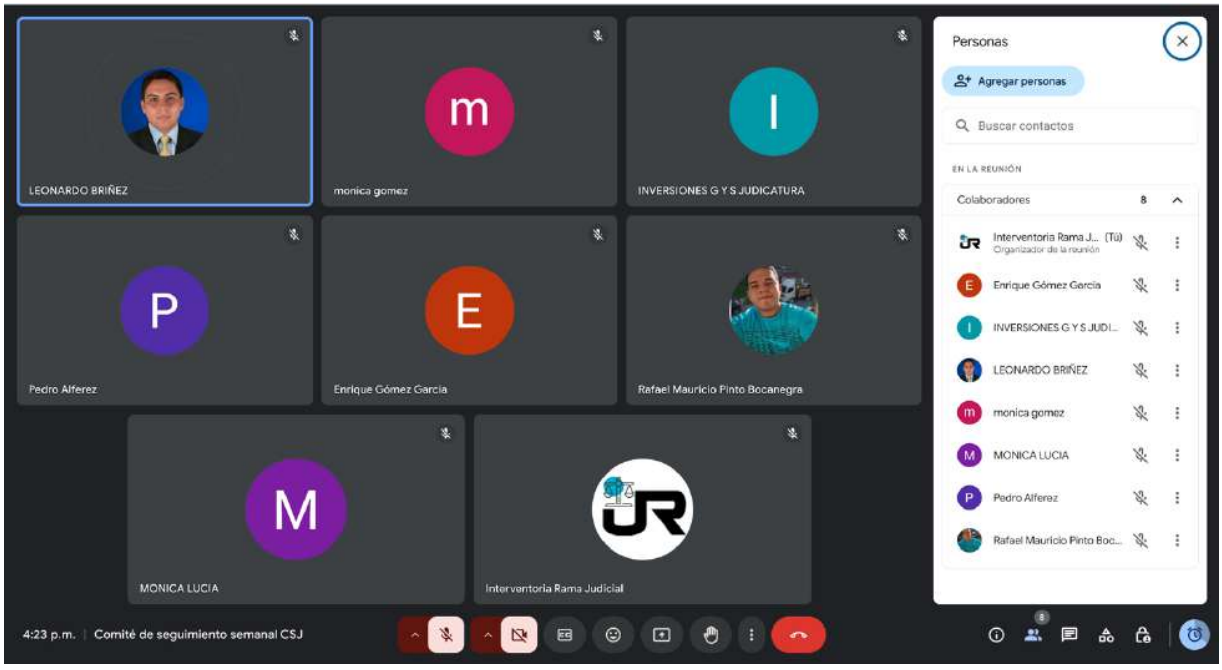
LEONARDO BRIÑEZ
monica gomez
INVERSIONES G Y S JUDICATURA
Pedro Alferez
Enrique Gómez Garcia
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra
MONICA LUCIA
Interventoria Rama Judicial
Personas
Agregar personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 8
Interventoria Rama J... (Tú)
Organizador de la reunión
Enrique Gómez Garcia
INVERSIONES G Y S JUDI...
LEONARDO BRIÑEZ
monica gomez
MONICA LUCIA
Pedro Alferez
Rafael Mauricio Pinto Boc...
4:23 p.m. | Comité de seguimiento semanal CSJ

9.3 INFORMES SEMANALES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 18 **DEL** 30/12/2024 **AL** 5/1/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 6/1/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024**

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024**

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO - META

CONTRATISTA:	INVERSIONES GYS S.A.S R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA	**NIT**	830.083.258-1
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		
APOYO A LA SUPERVISION			

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	4	**DE**	9	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA DEL CONTRATO:	28	**DE**	2	**DE**	2025

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
VALOR INICIAL	$ 1,451,608,104.00	**VALOR INICIAL**	$ 145,160,800.00
VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1	$ 1,975,472,335.00	**VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1**	$ 202,419,606.00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCION

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024

ANALISIS SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRA (SEGÚN PLAZO TRANSCURRIDO)			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	15.04%	73.40%	% Obra Ejecutada	0.96%	40.25%
Valor de la Obra Programada	$ 297,109,627.00	$ 1,449,996,230.18	Valor de la Obra Ejecutada	$ 18,887,242.00	$ 795,127,615.00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA N°1	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEDE
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	70.60%	42.02%	-28.58%	Durante la presente semana N°18 enchape de baño juez promiscuo primero municipal, aAlistado de piso para baño juez promiscuo segundo municipal, finalización de estructura metálica para cielo raso, se espera que entre hoy y mañana llegue el cielo raso, instalación de flanches, finalización de circuito regular, normal y datos del juzgado de familia
2. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	83.40%	81.35%	-2.05%	Durante la presente semana N°18 Resanes de regatas, instalación muros doble cara drywall, frescaza, estuco de muros y pintura base primera mano muros,
3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)	99.45%	46.09%	-53.37%	Durante la presente semana N°18 se realizaron actividades de lijado de techo y muros, apertura de orificio en techopara instalación de lámparas, reforzado en los cuatro costados con viguetas metálicas en la oficina lado escalera emergencia piso 4 y señalización áreas de trabajo y de acopio de materiales en los pasillos del piso 4.
4. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	100.00%	63.15%	-36.85%	Durante la presente semana N°18 En esta sede no se ejecutaron actividades debido a que la intervención ya se realizó en su totalidad, unicamente está pendiente la reposición y ajuste de un mesón en marmól.
5.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),	49.92%	5.09%	-44.84%	Durante la presente semana N°18 sacar filos al muro de la caja de medidores, pintura de perfiles metálicos, se realiza las conexiones, tendido de red electrica del primer piso, nivelación de las cuchillas entre los perfiles para la mejoría de soporte de la cubierta, recubrimiento de las canales en solados para mejorar las pendientes de las mismas, instalación de la cubierta, pañete exterior en una cuchilla faltante y nivelación de las canales
6. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta	0.00%	0.00%	0.000%	A la fecha de la presente semana N°18 EL CONTRATISTA AUN NO INICIA ACTIVIDADES EN ESTA SEDE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO ACTIVIDADES EN CUATRO (4) SEDES Y MANIFIESTA QUE HASTA NO CONCLUIR LA SEDE DE GRANADA Y ACACIAS NO INICIARÁ ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, MANIFIESTA QUE APENAS TERMINE EN ESTAS DOS SEDES PONDRÁ TODO SU PERSONAL PROFRESIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA INTERVENIR ESTA SEDE, DA UN POSIBLE INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTA SEDE LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),	0.00%	0.00%	0.00%	A la fecha de la presente semana N°18 EL CONTRATISTA AUN NO INICIA ACTIVIDADES EN ESTA SEDE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO ACTIVIDADES EN CUATRO (4) SEDES Y MANIFIESTA QUE HASTA NO CONCLUIR LA SEDE DE GRANADA Y ACACIAS NO INICIARÁ ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, MANIFIESTA QUE APENAS TERMINE EN ESTAS DOS SEDES PONDRÁ TODO SU PERSONAL PROFRESIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA INTERVENIR ESTA SEDE, DA UN POSIBLE INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTA SEDE LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


PERIODO No. 18 **DEL** 30/12/2024 **AL** 5/1/2025


FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 6/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

3. AVANCE EN TIEMPO Y ATRASOS DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	miércoles, 4 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial:	martes, 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación con prórroga:	viernes, 28 de febrero de 2025
Plazo días:	177.00
Plazo Meses:	5.90
Fecha de análisis:	domingo, 5 de enero de 2025
Plazo transcurrido días:	123.00
% transcurrido en tiempo:	69.492%
% tiempo restante:	30.508%
Avance programado $:	$ 1,449,996,230.18
Avance programado %:	**73.400%**
Avance ejecutado $:	$ 795,127,615.00
Avance ejecutado %:	**40.250%**
Atraso (-) o avance (+) $:	-$ 654,868,615.18
Atraso (-) o avance (+) %:	-33.150%

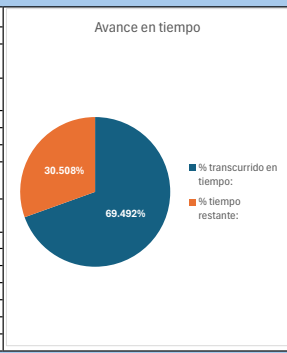

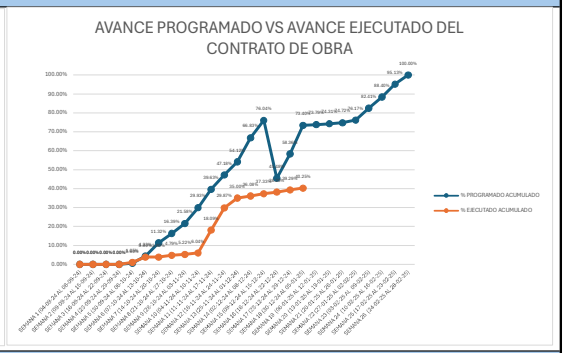

4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando actividades en 4 de las 7 sedes que se tienen establecidas como alcance al contrato de obra. A corte de la presente semana N°18 el valor ejecutado acumulado es de $ 795.127.615,00 equivalente al 40,25%, y el valor programado acumulado es de $1.449.996.230,180 que equivale al 73,40%, evidenciando un atraso de **(-) $ 654.868.615,18** los cuales corresponden al **(-) 33,150%** del valor del contrato. El atraso que se tiene actualmente es considerable y se espera reducir en las próximas semanas teniendo en cuenta el buen ritmo de trabajo que lleva el contratista.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 18 **DEL** 30/12/2024 **AL** 5/1/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 6/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

	
Sede Puerto Rico	**Sede Puerto Rico**
	
Sede Granada	**Sede Granada**
	
Sede Granada	**Sede Granada**
	
Sede SJG Tribunales	**Sede SJG Tribunales**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 18 **DEL** 30/12/2024 **AL** 5/1/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 6/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024**

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La interventoría solicita al contratista de obra implementar estrategías para recuperar y subsanar el atraso en obra. Se sugiera implementar turnos nocturnos para aumentar el rendimiento en la ejecución de actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria contratada de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, a los SEIS (06) de ENERO del 2025

SEIS 6 DE ENERO de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(Nombre) NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 19 **DEL** 6/1/2025 **AL** 12/1/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 13/1/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO - META

CONTRATISTA:	INVERSIONES GYS S.A.S R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA	**NIT**	830.083.258-1
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		
APOYO A LA SUPERVISION			

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	4	**DE**	9	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA DEL CONTRATO:	28	**DE**	2	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
VALOR INICIAL	$ 1,451,608,104.00	**VALOR INICIAL**	$ 145,160,800.00
VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1	$ 1,975,472,335.00	**VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1**	$ 202,419,606.00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN EJECUCION

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024

ANALISIS SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRA (SEGÚN PLAZO TRANSCURRIDO)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	0.39%	73.79%	% Obra Ejecutada	14.43%	54.68%
Valor de la Obra Programada	$ 7,649,425.72	$ 1,457,645,655.90	Valor de la Obra Ejecutada	$ 285,000,000.00	$ 1,080,127,615.00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA N°1	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEDE
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	70.76%	60.03%	-10.73%	Durante la presente semana N°19 Finalización de cielo raso en PVC blanco brillante de la oficina del juzgado segundo promiscuo, finalización a enchapado del juez del juzgado segundo promiscuo, instalación de cielo raso en PVC blanco brillante de la oficina del juzgado primero promiscuo, finalización de enchapado de baño de juez primero promiscuo haría falta emboquillado, se finaliza la intervención del Juzgado 001 Promiscuo Municipal y Juzgado 002 Promiscuo Municipal
2. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	83.59%	82.89%	-0.70%	Durante la presente semana N°19 instalación de superboard en la fachada, instalación de tapas en superboard en ventilaciones, falta 1 mano de pintura interior de la sede que se da después de que se hagan las instalaciones eléctricas y en el transcurso de la semana llega el eléctrico a empezar las instalaciones eléctricas.
3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)	99.49%	56.74%	-42.75%	Durante la presente semana N°19 se inicia pintura en cielo raso de la escalera principal, se termina de resanar humedades en la canal de la azotea sector escalera y se aplica una capa de refuerzo con película de manto asfaltico y se pinta la canal, oficinas piso 4 se termina de lijas todas las oficinas quedan listas para proceder a pintura, reparación de sifón del drenaje sector escalera de emergencia e instalación de cinta asfáltica para sellado de las uniones del manto en las parers de los canales azotea. . Pasillo frente a escalera emergencia piso 4, se terminan remates de pintura dejando terminada la actividad.
4. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	100.00%	84.59%	-15.41%	Durante la presente semana N°19 En esta sede no se ejecutaron actividades debido a que la intervención ya se realizó en su totalidad, unicamente está pendiente la reposición y ajuste de un mesón en marmól.
5.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),	50.33%	29.18%	-21.15%	Durante la presente semana N°19 continua instalación de cubierta, regatas para pase de tubería hidráulica de aires acondicionados, instalacion de aislante en la cubierta y el segundo tendido de teja superior, inicio de instalaciones eléctricas en el primer piso, instalación de tubería hidráulica, instalación de caballete, desmonte de gabinete antiguo, puesta en marcha de red del primer piso
6. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta	0.00%	0.00%	0.000%	A la fecha de la presente semana N°19 EL CONTRATISTA AUN NO INICIA ACTIVIDADES EN ESTA SEDE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO ACTIVIDADES EN CUATRO (4) SEDES Y MANIFIESTA QUE HASTA NO CONCLUIR LA SEDE DE GRANADA Y ACACIAS NO INICIARÁ ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, MANIFIESTA QUE APENAS TERMINE EN ESTAS DOS SEDES PONDRÁ TODO SU PERSONAL PROFRESIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA INTERVENIR ESTA SEDE, DA UN POSIBLE INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTA SEDE LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),	0.00%	0.00%	0.00%	Durante la presente semana N°19 EL CONTRATISTA AUN NO INICIA ACTIVIDADES EN ESTA SEDE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO ACTIVIDADES EN CUATRO (4) SEDES Y MANIFIESTA QUE HASTA NO CONCLUIR LA SEDE DE GRANADA Y ACACIAS NO INICIARÁ ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, MANIFIESTA QUE APENAS TERMINE EN ESTAS DOS SEDES PONDRÁ TODO SU PERSONAL PROFRESIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA INTERVENIR ESTA SEDE, DA UN POSIBLE INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTA SEDE LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


PERIODO No. 19 **DEL** 6/1/2025 **AL** 12/1/2025


FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 13/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

3. AVANCE EN TIEMPO Y ATRASOS DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	miércoles, 4 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial:	martes, 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación con prórroga:	viernes, 28 de febrero de 2025
Plazo días:	177.00
Plazo Meses:	5.90
Fecha de análisis:	domingo, 12 de enero de 2025
Plazo transcurrido días:	130.00
% transcurrido en tiempo:	73.446%
% tiempo restante:	26.554%
Avance programado $:	$ 1,457,645,655.90
Avance programado	**73.787%**
Avance ejecutado $:	$ 1,080,127,615.00
Avance ejecutado %:	**54.677%**
Atraso (-) o avance (+)	-$ 377,518,040.90
Atraso (-) o avance (+)	-19.110%

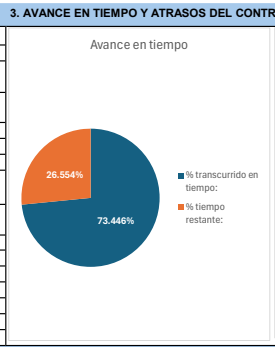

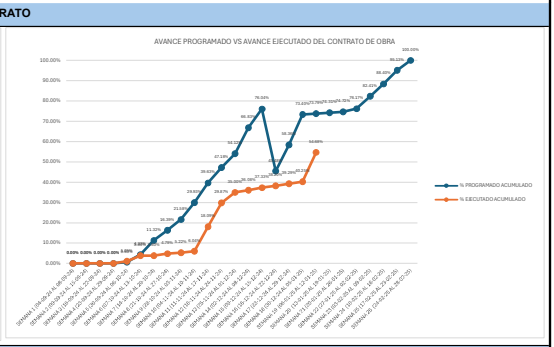

4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando actividades en 4 de las 7 sedes que se tienen establecidas como alcance al contrato de obra. A corte de la presente semana N°19 el valor ejecutado acumulado es de $ 1.080.127.615,00 equivalente al 54,677%, y el valor programado acumulado es de $1.457.645.655,90 que equivale al 73,787%, evidenciando un atraso de **(-) $ 377.518.040,90** los cuales corresponden al **(-) 19,110%** del valor del contrato. El atraso que se tiene actualmente es considerable y se espera reducir en las próximas semanas teniendo en cuenta el buen ritmo de trabajo que lleva el contratista.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 19 **DEL** 6/1/2025 **AL** 12/1/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 13/1/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

	
Sede Puerto Rico	**Sede Puerto Rico**
	
Sede Granada	**Sede Granada**
	
Sede Granada	**Sede Granada**
	
Sede SJG Tribunales	**Sede SJG Tribunales**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 19 **DEL** 6/1/2025 **AL** 12/1/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 13/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024**

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La interventoría solicita al contratista de obra implementar estrategías para recuperar y subsanar el atraso en obra. Se sugiera implementar turnos nocturnos para aumentar el rendimiento en la ejecución de actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria contratada de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, a los TRECE (13) de ENERO del 2025

TRECE 13 DE ENERO de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(Nombre) NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 20 **DEL** 13/1/2025 **AL** 19/1/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 20/1/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO - META

CONTRATISTA:	INVERSIONES GYS S.A.S R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA	**NIT**	830.083.258-1
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		
APOYO A LA SUPERVISION			

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	4	**DE**	9	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA DEL CONTRATO:	28	**DE**	2	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
VALOR INICIAL	$ 1,451,608,104.00	**VALOR INICIAL**	$ 145,160,800.00
VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1	$ 1,975,472,335.00	**VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1**	$ 202,419,606.00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN EJECUCION


2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024


ANALISIS SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRA (SEGÚN PLAZO TRANSCURRIDO)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	0.52%	74.31%	% Obra Ejecutada	10.30%	64.98%
Valor de la Obra Programada	$ 10,329,145.02	$ 1,467,974,800.92	Valor de la Obra Ejecutad	$ 203,506,970.00	$ 1,283,634,585.00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA N°1	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEDE
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	70.93%	71.23%	0.30%	Durante la presente semana N°20 se va a da inicio a enchape de baños del juez de familia, se sigue con la instalación de estructura para cielo raso, pintura de flanches, finalizó instalación de cielo raso en PVC y se da finalizacion del enchape del baño del juez de familia del circuito.
2. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	83.82%	85.26%	1.44%	Durante la presente semana N°20 Remate en fachada, inicio de instalación eléctrica, descapote para carcamo, instalación de puntos de iluminación, boca puerta en granito, guarda escoba en mortero y cerámica.
3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)	99.65%	58.00%	-41.65%	Durante la presente semana N°20 Se está realizando el cambio de marcos de lámparas y registros del cielo raso. oficinas adyacentes y laterales a la escalera de emergencia piso 4, actividades finalizadas y listo para entrega; se ha instalado la fachada en la zona de escalera de emergencia al Juzgado Segundo Civil piso 4, se está aplicando pintura con alumol en la cubierta para protección de impermeabilizaciones en la azotea del edificio, se ha instalado el cielo raso en el área, tras el resane de muros del día anterior en nicho de acceso a la azotea piso 4, se concluyen las actividades de pintura y se inicia la instalación de escaleras para acceso a la cubierta en el area de escalera de emergencia. Se finaliza el remate de pintura general, quedando listo para entrega pasillo frente a sala múltiple piso 4, se terminan de cambiar los marcos de las lámparas y se procede al aseo y limpieza para entrega en la sala múltiple piso 4.
4. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	100.00%	100.00%	0.00%	Durante la presente semana N°20 En esta sede no se ejecutaron actividades debido a que la intervención ya se realizó en su totalidad, unicamente está pendiente la reposición y ajuste de un mesón en marmól.
5.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),	50.47%	54.00%	3.53%	Durante la presente semana N°20 perfilar cuchillas, nivelar las pendientes de las cuchillas de acuerdo a las caídas de la cubierta, baseado de vigacinta, desformaletear vigacinta, organización de la teja pero en esta semana se presentan fuertes lluvias y se atrasa la instalación de la cubierta.
6. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta	0.00%	0.00%	0.000%	A la fecha de la presente semana N°20
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),	0.00%	0.00%	0.00%	Durante la presente semana N°20

3. AVANCE EN TIEMPO Y ATRASOS DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	miércoles, 4 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial:	martes, 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación con prórroga:	viernes, 28 de febrero de 2025
Plazo días:	177.00
Plazo Meses:	5.90
Fecha de análisis:	domingo, 19 de enero de 2025
Plazo transcurrido días:	137.00
% transcurrido en tiempo:	77.401%
% tiempo restante:	22.599%
Avance programado $:	$ 1,467,974,800.92
Avance programado	**74.310%**
Avance ejecutado $:	$ 1,283,634,585.00
Avance ejecutado %:	**64.979%**
Atraso (-) o avance (+)	-$ 184,340,215.92
Atraso (-) o avance (+)	-9.331%



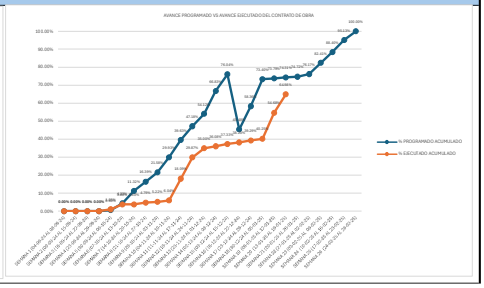

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 20 **DEL** 13/1/2025 **AL** 19/1/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 20/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando actividades en 4 de las 7 sedes que se tienen establecidas como alcance al contrato de obra. A corte de la presente semana N°20 el valor ejecutado acumulado es de $ 1.283.634.585,00 equivalente al 64,979%, y el valor programado acumulado es de $1.467.974.800,92 que equivale al 74,310%, evidenciando un atraso de **(-) $ 184.340.215,92** los cuales corresponden al **(-) 9,331%** del valor del contrato. El atraso que se tiene actualmente es leve y se espera reducir en las próximas semanas teniendo en cuenta el buen ritmo de trabajo que lleva el contratista.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico



Sede Granada



Sede Granada

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 20 **DEL** 13/1/2025 **AL** 19/1/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 20/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024**



Sede Granada



Sede Granada



Sede SJG Tribunales



Sede SJG Tribunales

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La interventoría solicita al contratista de obra implementar estrategias para recuperar y subsanar el atraso en obra. Se sugiera implementar turnos nocturnos para aumentar el rendimiento en la ejecución de actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria contratada de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, a los VEINTE (20) de ENERO del 2025

VEINTE 20 DE ENERO de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(Nombre) NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 21 **DEL** 20/1/2025 **AL** 26/1/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 27/1/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO - META

CONTRATISTA:	INVERSIONES GYS S.A.S R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA	**NIT**	830.083.258-1
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		
APOYO A LA SUPERVISION			

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	4	**DE**	9	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL SEGÚN PRÓRROGA N°1:	28	**DE**	2	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
VALOR INICIAL	$ 1,451,608,104.00	**VALOR INICIAL**	$ 145,160,800.00
VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1	$ 1,975,472,335.00	**VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1**	$ 202,419,606.00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN EJECUCION


2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024


ANÁLISIS SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRA PARA ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	0.41%	74.72%	% Obra Ejecutada	7.68%	72.66%
Valor de la Obra Programada	$ 8,178,260.68	$ 1,476,153,061.60	Valor de la Obra Ejecutada	$ 151,770,000.00	$ 1,435,404,585.00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA N°1	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEDE
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	71.04%	82.00%	10.96%	Durante la presente semana N°21 se realizaron actividades de remates en el juzgado de familia y se realizó entrega el día viernes a la interventoría.
2. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	84.11%	88.50%	4.39%	Durante la presente semana N°22 se realizó instalación de fibra de vidrio a la parte superior de la cubierta rodando el poste. Continua la instalación de cielo raso y la instalación de cableado para las acometidas electricas con sus respectivos breakers. Se está realizando la apliacación de pintura tipo Koraza en el muro oriental.
3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)	99.81%	63.00%	-36.82%	Durante la presente semana N°22 continua la instalación de la fachada flotante.
4. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	100.00%	100.00%	0.00%	Durante la presente semana N°22 se instaló el mesón en el centro de servicios, el cual estaba pendiente de ajuste.
5.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),	50.63%	66.70%	16.07%	Durante la presente semana N°22 se realizó enchape de muros de los baños de los magistrados, se realizó instalación de tomacorrientes para las lámparas, se realizó instalación de canaleta metálica.
6. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta	22.61%	0.00%	-22.611%	A la fecha de la presente semana N°22 no se ha iniciado ejecución de actividades en esta sede. Durante la presente semana se realizó visita el viernes 31 de enero entre contratista, interventoría y la supervisión, para priorizar necesidades de la sede considerando el balance de cantidades que se está realiazando al contrato y poder establer el alcance de la intervención.
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),	19.90%	0.00%	-19.90%	Durante la presente semana N°22 el dia lunes 27 de enero se realizó visita a la sede con el fin de verificar el alcance de las actividades aprobadas en el presupuesto y priorizar nuevas necesidades. El contratista está realizando actividades logísticas de traslado de los funcionarios para liberar el área de trabajo y consecución y transporte de materiales e insumos al sitio de obra para iniciar ejecución con personal el día 10 de febrero de 2025.

3. AVANCE EN TIEMPO Y ATRASOS DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	miércoles, 4 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial:	martes, 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación actual según prórroga N°1:	viernes, 28 de febrero de 2025
Plazo días:	178.00
Plazo Meses:	5.93
Fecha de análisis:	domingo, 26 de enero de 2025
Plazo transcurrido días:	145.00
% transcurrido en tiempo:	81.46%
% tiempo restante:	18.54%
Avance programado $:	$ 1,476,153,061.60
Avance programado %:	**74.724%**
Avance ejecutado $:	$ 1,435,404,585.00
Avance ejecutado %:	**72.661%**
Atraso (-) o avance (+) $:	-$ 40,748,476.60
Atraso (-) o avance (+) %:	-2.063%

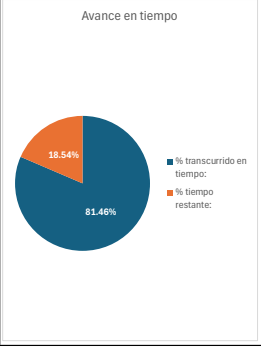

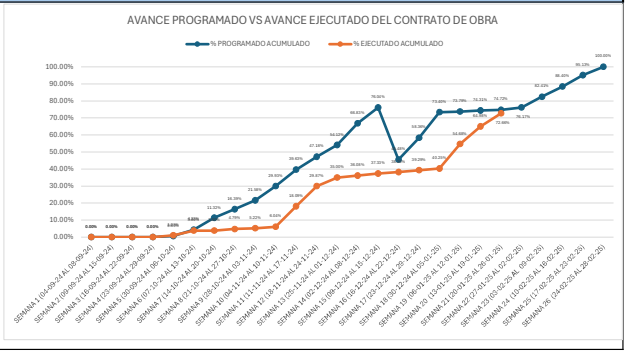

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 21 **DEL** 20/1/2025 **AL** 26/1/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 27/1/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando actividades en 4 de las 7 sedes que se tienen establecidas como alcance al contrato de obra. A corte de la presente semana N°21 el valor ejecutado acumulado es de $ 1.435.404.585,00 equivalente al 72,66%, y el valor programado acumulado es de $1.476.153.061,60 que equivale al 74,72%, evidenciando un atraso de **(-) $ 40.748.476,60** los cuales corresponden al **(-) 2,063%** del valor del contrato. El atraso que se tiene actualmente es leve y se espera reducir en las próximas semanas teniendo en cuenta el buen ritmo de trabajo que lleva el contratista.


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sede Acacias



Sede Acacias

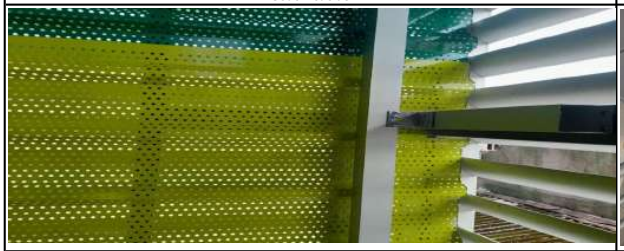

Sede Acacias



Sede Acacias




Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico

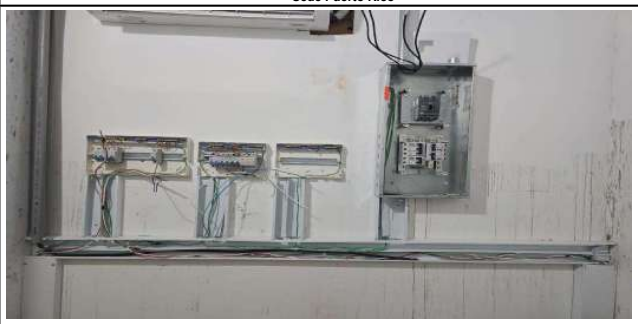

Sede Puerto Rico

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 21 **DEL** 20/1/2025 **AL** 26/1/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 27/1/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024



Sede Granada



Sede Granada



Sede Granada



Sede Granada



Sede SJG Tribunales



Sede SJG Tribunales



Sede SJG Tribunales



Sede SJG Tribunales

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La interventoría solicita al contratista entregar cuanto antes el balance de cantidades del presupuesto de la sede El Yarí para poder dar inicio a la ejecución de actividades, teniendo en cuenta que solo quedan 25 días restantes del plazo de ejecución y la interventoría no aprobará prórrogas por demoras imputables al contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria contratada de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, a los VEINTISIETE (27) dias de ENERO del 2025.

VEINTISIETE 27 DE ENERO de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(Nombre) NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 22 **DEL** 27/1/2025 **AL** 2/2/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 3/2/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO - META

CONTRATISTA:	INVERSIONES GYS S.A.S R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA	**NIT**	830.083.258-1
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS		
APOYO A LA SUPERVISION			

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	4	**DE**	9	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL SEGÚN PRÓRROGA N°1:	28	**DE**	2	**DE**	2025

Contrato de Obra			Contrato de Interventoría		
VALOR INICIAL	$	1,451,608,104.00	**VALOR INICIAL**	$	145,160,800.00
VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1	$	1,975,472,335.00	**VALOR ACTUAL SEGÚN ADICIÓN N°1**	$	202,419,606.00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCION


2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024


ANÁLISIS SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRA PARA ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	1.45%	76.17%	% Obra Ejecutada	7.15%	79.81%
Valor de la Obra Programada	$ 28,661,552.64	$ 1,504,814,614.24	Valor de la Obra Ejecutada	$ 141,250,000.00	$ 1,576,654,585.00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA PRÓRROGA N°1	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA SEDE
1. Palacio de justicia de granada (Meta)	71.10%	0.00%	-71.10%	Durante la presente semana N°22 se realizaron actividades de remates en el juzgado de familia y se realizó entrega el día viernes a la interventoría.
2. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	90.53%	92.50%	1.97%	Durante la presente semana N°22 se realizó instalación de fibra de vidrio a la parte superior de la cubierta rodando el poste. Continua la instalación de cielo raso y la instalación de cableado para las acometidas electricas con sus respectivos breakers. Se está realizando la apliacación de pintura tipo Koraza en el muro oriental.
3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)	100.00%	80.00%	-20.00%	Durante la presente semana N°22 continua la instalación de la fachada flotante.
4. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	100.00%	100.00%	0.00%	Durante la presente semana N°22 se instaló el mesón en el centro de servicios, el cual estaba pendiente de ajuste.
5.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),	50.84%	73.67%	22.84%	Durante la presente semana N°22 se realizó enchape de muros de los baños de los magistrados, se realizó instalación de tomacorrientes para las lámparas, se realizó instalación de canaleta metálica.
6. Sede judicial el Yarí, Villavicencio (Meta	30.33%	0.00%	-30.328%	A la fecha de la presente semana N°22 no se ha iniciado ejecución de actividades en esta sede. Durante la presente semana se realizó visita el viernes 31 de enero entre contratista, interventoría y la supervisión, para priorizar necesidades de la sede considerando el balance de cantidades que se está realiazando al contrato y poder establer el alcance de la intervención.
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),	27.07%	0.00%	-27.07%	Durante la presente semana N°22 el dia lunes 27 de enero se realizó visita a la sede con el fin de verificar el alcance de las actividades aprobadas en el presupuesto y priorizar nuevas necesidades. El contratista está realizando actividades logísticas de traslado de los funcionarios para liberar el área de trabajo y consecución y transporte de materiales e insumos al sitio de obra para iniciar ejecución con personal el día 10 de febrero de 2025.

3. AVANCE EN TIEMPO Y ATRASOS DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	miércoles, 4 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial:	martes, 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación actual según prórroga N°1:	viernes, 28 de febrero de 2025
Plazo días:	178.00
Plazo Meses:	5.93
Fecha de análisis:	domingo, 2 de febrero de 2025
Plazo transcurrido días:	152.00
% transcurrido en tiempo:	85.39%
% tiempo restante:	14.61%
Avance programado $:	$ 1,504,814,614.24
Avance programado %:	**76.175%**
Avance ejecutado $:	$ 1,576,654,585.00
Avance ejecutado %:	**79.812%**
Atraso (-) o avance (+) $:	$ 71,839,970.76
Atraso (-) o avance (+) %:	3.637%



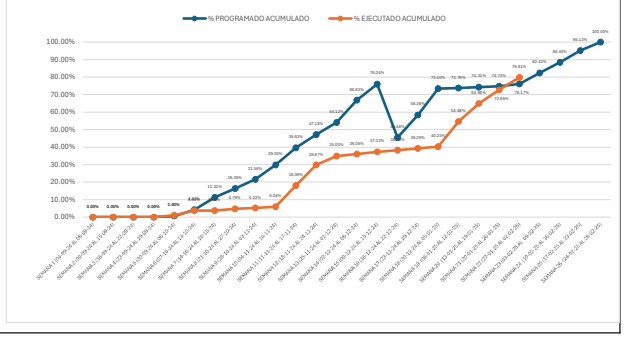

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 22 **DEL** 27/1/2025 **AL** 2/2/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 3/2/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando actividades en 4 de las 7 sedes que se tienen establecidas como alcance al contrato de obra. A corte de la presente semana N°22 el valor ejecutado acumulado es de $ 1.576.654.585,00 equivalente al 79,81%, y el valor programado acumulado es de $ 1.504.814.614,24 que equivale al 76,17%, evidenciando un adelanto de **(+) $ 71.839.970,76** los cuales corresponden al **(+) 3,637%** del valor del contrato. El adelanto que se presenta demuestra un adecuado desempeño en la ejecución del contrato y es coherente con el tiempo transcurrido a la fecha. La interventoría invita al contratista a continuar con el buen ritmo de trabajo y de esta forma se logre terminar al 100% la ejecución del contrato antes del 28 de febrero de 2025.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Acacias



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico



Sede Puerto Rico

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 22 **DEL** 27/1/2025 **AL** 2/2/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 3/2/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024

	
Sede Granada	**Sede Granada**
	
Sede Granada	**Sede Granada**
	
Sede SJG Tribunales	**Sede SJG Tribunales**
	
Sede SJG Tribunales	**Sede SJG Tribunales**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 22 **DEL** 27/1/2025 **AL** 2/2/2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 3/2/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.6703345 DE 2024



Sede El Yarí



Sede El Yarí



Sede El Yarí



Sede El Yarí



Sede El Calvario



Sede El Calvario



Sede El Calvario



Sede El Calvario

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La interventoría solicita al contratista entregar cuanto antes el balance de cantidades del presupuesto de la sede El Yarí para poder dar inicio a la ejecución de actividades, teniendo en cuenta que solo quedan 25 días restantes del plazo de ejecución y la interventoría no aprobará prórrogas por demoras imputables al contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria contratada de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, a los TRES (03) dias de FEBRERO del 2025.

TRES 3 DE FEBRERO de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Nombre) NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

9.4 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	20250217095350602156	9481725832	E	2025/02/24	2025/02/17	BANCO AV VILLAS	0	$12,777,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOJR (12 Afiliados)																								$25,452,000	$4,072,700			$26,875,500	$1,465,200			$26,875,500	$1,075,500			$26,875,500		$1,871,000		$4,584,500	$229,300		$8,713,700
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (6 Afiliados)																								$14,317,000	$2,291,000			$14,317,000	$962,600			$14,317,000	$572,900			$14,317,000		$996,700		$4,584,500	$229,300		$5,052,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																								$14,317,000	$2,291,000			$14,317,000	$962,600			$14,317,000	$572,900			$14,317,000		$996,700		$4,584,500	$229,300		$5,052,500
1	CC	93293568	ALARCON ORTEGON OSCAR HERNAN							X												23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1120570968	BRIÑEZ OROZCO LEONARDO FABIO							X												25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO																			25-14	30	$3,762,000	$602,000	EPS037	30	$3,762,000	$150,500	CCF34	30	$3,762,000	$150,500	14-11	30	$3,762,000	6.960%	$261,900	30	$0	$0	Si	$1,164,900
4	CC	1122135000	HERNANDEZ ARANGO PAULA JULIANA	X																		25-14	30	$4,584,500	$733,600	EPS002	30	$4,584,500	$573,100	CCF34	30	$4,584,500	$183,400	14-11	30	$4,584,500	6.960%	$319,100	30	$4,584,500	$229,300	No	$2,038,500
5	CC	1121966765	PINTO BOCANEGRA RAFAEL MAURICIO																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	1121822709	SANTANA TORRES KAROL PAOLA							X												23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: PROYECTO JR (6 Afiliados)																								$11,135,000	$1,781,700			$12,558,500	$502,600			$12,558,500	$502,600			$12,558,500		$874,300		$0	$0		$3,661,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																								$11,135,000	$1,781,700			$12,558,500	$502,600			$12,558,500	$502,600			$12,558,500		$874,300		$0	$0		$3,661,200
7	CC	3274632	ALFEREZ RINCON PEDRO ELADIO																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$68,000	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
8	CC	86048758	CORREA HOLGUIN HIDELBER ANTONIO																			23030 1	30	$2,338,000	$374,100	EPS005	30	$2,338,000	$93,600	CCF34	30	$2,338,000	$93,600	14-11	30	$2,338,000	6.960%	$162,800	30	$0	$0	Si	$724,100
9	CC	1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO							X												25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1120867846	LOZANO NIÑO ANA BELEN							X												23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1121878344	PEREZ ARIAS FABIAN ANTONIO																			23030 1	30	$4,250,000	$680,000	EPS005	30	$4,250,000	$170,000	CCF34	30	$4,250,000	$170,000	14-11	30	$4,250,000	6.960%	$295,800	30	$0	$0	Si	$1,315,800
12	CC	17304337	TORRES GUAVITA JAIME ADELMO							X													0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIOADMON (4 Afiliados)																								$13,124,500	$2,100,100			$13,124,500	$525,100			$13,124,500	$525,100			$13,124,500		$913,600		$0	$0		$4,063,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																								$13,124,500	$2,100,100			$13,124,500	$525,100			$13,124,500	$525,100			$13,124,500		$913,600		$0	$0		$4,063,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																								$13,124,500	$2,100,100			$13,124,500	$525,100			$13,124,500	$525,100			$13,124,500		$913,600		$0	$0		$4,063,900
13	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																			23030 1	30	$4,702,000	$752,400	EPS005	30	$4,702,000	$188,100	CCF34	30	$4,702,000	$188,100	14-11	30	$4,702,000	6.960%	$327,300	30	$0	$0	Si	$1,455,900
14	CC	1121891768	NARVAEZ CASTRO FLOR ANGELA																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
15	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO							X												23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	86063202	TORRES CASTRO JIMMY ANDRES																			23030 1	30	$4,899,000	$783,900	EPS005	30	$4,899,000	$196,000	CCF34	30	$4,899,000	$196,000	14-11	30	$4,899,000	6.960%	$341,000	30	$0	$0	Si	$1,516,900
Total Afiliados(16)																								$38,576,500	$6,172,800			$40,000,000	$1,990,300			$40,000,000	$1,600,600			$40,000,000		$2,784,600		$4,584,500	$229,300		$12,777,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIOJR	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	20250217095350602156	9481725832	E	2025/02/24	2025/02/17	BANCO AV VILLAS	0	$12,777,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$6,172,800	$0	$0	$6,172,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,335,200	$0	$0	$2,335,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,837,600	$0	$0	$3,837,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,784,600	$0	$0	$2,784,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$2,784,600	$0	$0	$2,784,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,600,600	$0	$0	$1,600,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$1,600,600	$0	$0	$1,600,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,990,300	$0	$0	$1,990,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,500	$0	$0	$150,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$725,100	$0	$0	$725,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$989,700	$0	$0	$989,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$137,600	$0	$0	$137,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$137,600	$0	$0	$137,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$91,700	$0	$0	$91,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$91,700	$0	$0	$91,700
TOTAL				16	$12,777,600	$0	$0	$12,777,600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37j 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	20250205104359602097	9481372656	I	2025/02/24	2025/02/05	BANCO AV VILLAS	0	$2,271,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,906,000	$1,004,200			$5,906,000	$738,300			$5,906,000	$118,200			$5,906,000	$411,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,906,000	$1,004,200			$5,906,000	$738,300			$5,906,000	$118,200			$5,906,000	$411,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$5,906,000	$1,004,200			$5,906,000	$738,300			$5,906,000	$118,200			$5,906,000	$411,100		$0	$0
1	CC 9658796	RODRIGUEZ JORGE	25-14	30	$5,906,000	$1,004,200	EPS010	30	$5,906,000	$738,300	CCF34	30	$5,906,000	$118,200	14-11	30	$5,906,000	$411,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$5,906,000	$1,004,200			$5,906,000	$738,300			$5,906,000	$118,200			$5,906,000	$411,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 37j 35	VILLAVICENCIO-META	6785884	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	20250205104359602097	9481372656	I	2025/02/24	2025/02/05	BANCO AV VILLAS	0	$2,271,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,004,200	$0	$0	$1,004,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,004,200	$0	$0	$1,004,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$411,100	$0	$0	$411,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$411,100	$0	$0	$411,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$118,200	$0	$0	$118,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$118,200	$0	$0	$118,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$738,300	$0	$0	$738,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$738,300	$0	$0	$738,300
TOTAL				**1**	**$2,271,800**	**$0**	**$0**	**$2,271,800**

9.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Concepto técnico de aires acondicionados de la sede judicial Puerto Rico.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 2 de enero de 2025, 7:26 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 02 de enero de 2025 CI-6703345-2024-097
Ingeniero:
INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Concepto técnico de aires acondicionados de la sede judicial Puerto Rico.

Cordial saludo.

En el oficio con consecutivo IGYS-CSJVCIO-064 y luego de la correspondiente revisión técnica, la interventoría conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto (ver ilustración 1) y al plano titulado "SISTEMA A/ C", emite el siguiente concepto técnico y las observaciones pertinentes al contratista:

1. **Nombramiento de Áreas en el Plano:**

- Es imperativo que las áreas indicadas en el plano sean denominadas de manera clara y precisa, especificando los espacios destinados a las oficinas. Como ejemplo, en lugar de un nombre genérico de "Área", debe indicarse "Área Sala de Audiencias", conforme a lo solicitado en las especificaciones del proyecto.

2. **Revisión de la Capacidad de los Equipos de Aire Acondicionado:**

- **Área de 24.15 m²:** La propuesta del contratista de instalar equipos de aire acondicionado de 18,000 BTU no se ajusta a lo establecido en las especificaciones técnicas, las cuales indican que para un área de entre 20 y 30 m² es necesario instalar unidades con una capacidad de 12.000 BTU. Por tanto, se requiere la corrección de la propuesta para cumplir con los parámetros de rendimiento energético y confort térmico.

- **Área de 32.41 m²:** La propuesta de instalación de equipos de 18,000 BTU es conforme con las especificaciones, por lo que no se requiere modificación en este caso.

- **Áreas de 12.28 m², 13.84 m² y 5.38 m²:** Para las áreas mencionadas, en las cuales se proponen unidades de 12,000 BTU, se ha detectado un incumplimiento con respecto a las especificaciones técnicas del proyecto, que indican que, para áreas de hasta 15 m² , la capacidad recomendada es de 9.000 BTU. En consecuencia, se requiere la adecuación de la propuesta del contratista para que se instalen equipos de la capacidad adecuada, según las normativas de eficiencia energética y las necesidades de climatización del espacio.

Estas observaciones son emitidas con el fin de que el contratista realice las correcciones necesarias y se verifiquen nuevamente las condiciones para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad del

proyecto. Quedamos atentos a las acciones correctivas y la presentación de las nuevas propuestas ajustadas a las observaciones realizadas.

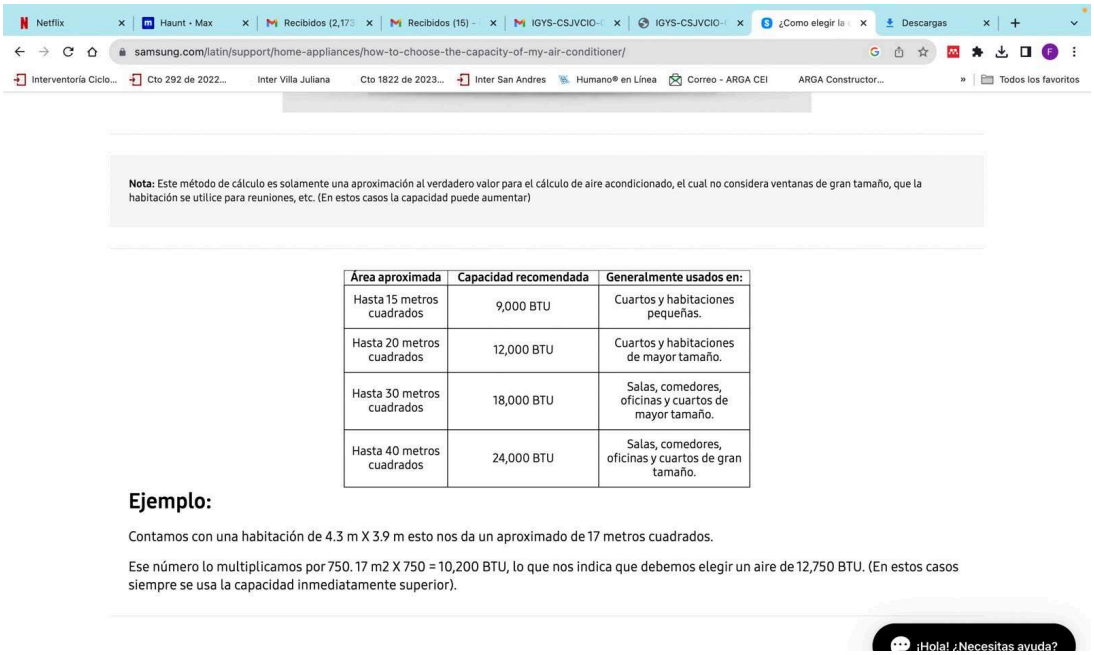


Ilustración 1: Pagina oficial de Samsung https://www.samsung.com/latin/support/home-appliances/how-to-choose-the-capacity-of-my-air-conditioner/

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA Interventoría

CI-6703345-2024-097- SOLICITUD DISPOSICION DE AIRES ACONDICIONADOS.pdf
812K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de disposicion de aires acondicionados en la sede Puerto Rico

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 2 de enero de 2025, 7:28 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 02 de enero de 2025

CI-6703345-2024-098

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de disposicion de aires acondicionados en la sede Puerto Rico

Cordial saludo,

En atención al tema relacionado con los sistemas de aire acondicionado y en referencia al oficio IGYS-CSJVCIO-064, nos permitimos informar que este fue atendido oportunamente mediante respuesta enviada el día 2 de enero de 2025. No obstante, es necesario solicitar a la supervisión un análisis detallado sobre las acciones a seguir respecto a la gestión de las regatas, tuberías y demás elementos requeridos para la instalación de dichos sistemas.

Es importante reiterar que el ítem correspondiente al suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado no está contemplado dentro del alcance del contrato vigente. Por lo anterior, solicitamos a la entidad que defina cómo proceder en este aspecto, considerando que la instalación de estos equipos resulta fundamental para garantizar el avance del proyecto sin generar retrasos en la ejecución de las actividades programadas.

Además, se subraya que, en caso de que la supervisión o la entidad asuma la instalación de los equipos, estos deberán ser de tipo split y contar con características técnicas que aseguren su eficiencia, sostenibilidad y durabilidad. Esto incluye factores como la capacidad en BTU, eficiencia energética, nivel de ruido y compatibilidad con el diseño arquitectónico del proyecto.

Asimismo, resulta crucial que se especifique claramente el tipo de equipo a instalar, ya que esto impacta directamente en el diseño eléctrico asociado. Por ejemplo:

- Si el equipo es de tipo **convencional** , el punto eléctrico estará integrado en el propio equipo de aire.
- Si se trata de un equipo **automático** , el punto eléctrico corresponderá a la unidad condensadora.

Tener claridad sobre estos aspectos técnicos es indispensable para evitar retrabajos que puedan generar demoras y sobrecostos, garantizando una ejecución eficiente y alineada con los estándares del proyecto.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

CI-6703345-2024-098- Concepto técnico de aires acondicionados de la sede judicial Puerto Rico..pdf
607K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CONTESTACION DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LAS ADECUACIONES

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 3 de enero de 2025, 3:47 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 03 de enero de 2025

CI-6703345-2024-099

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Atención a la solicitud de medidas para cumplimiento de entrega de las adecuaciones y mantenimiento de los juzgados del Palacio de Justicia de Granada del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6698166 de 2024”

Cordial saludo,

En atención a la solicitud emitida por la supervisión respecto a la entrega de los despachos judiciales intervenidos, específicamente el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Granada, el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Granada y el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Granada, se procede a informar sobre las medidas adoptadas para garantizar la entrega de los espacios en cumplimiento de las expectativas y necesidades planteadas.

Tras analizar la situación, se identificó como prioritario el acondicionamiento y entrega de los juzgados promiscuos municipales 001 y 002. Esta decisión obedece a la necesidad de brindar una solución inmediata, considerando que el personal asignado a estos despachos no cuenta con un lugar alternativo para desempeñar. sus funciones. En contraposición, el Juzgado Promiscuo de Familia, aunque igualmente importante, se encuentra temporalmente instalado en la sala de audiencias ubicada en el primer piso, lo cual le permite operar de manera provisional sin afectar significativamente sus actividades.

En coordinación con el contratista Inversiones GYS, se acordó priorizar la culminación de las actividades en los juzgados promiscuos municipales. Se estima que estos espacios serán entregados a más tardar dentro de la semana en curso, asegurando que las condiciones sean óptimas para su ocupación y funcionamiento. Una vez finalizada esta entrega, el contratista procederá a dar cierre a las actividades pendientes en el Juzgado Promiscuo de Familia, proyectando su entrega para la semana siguiente. Este cronograma tiene como propósito minimizar los inconvenientes operativos de la entidad y garantizar una transición ordenada hacia los espacios remodelados.

En conclusión, la estrategia adoptada refleja un enfoque responsable y planificado para atender las necesidades de los juzgados intervenidos. Al priorizar los juzgados promiscuos municipales, se responde de manera efectiva a la urgencia de proporcionar espacios funcionales para el personal que carece de alternativas. La programación establecida asegura que el Juzgado Promiscuo de Familia será entregado en un plazo razonable, permitiendo que la entidad continúe con sus actividades sin mayores contratiempos. Con estas acciones, se reafirma el compromiso del equipo interventor y del contratista para cumplir con los objetivos del proyecto de manera eficiente y en alineación con las expectativas de la supervisión.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

CI-6703345-2024-099- CONTESTACION DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LAS ADECUACIONES.pdf
607K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-100 Solicitud de autorización de ingreso de personal de obra a la sede judicial de Acacias – Meta.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 5 de enero de 2025, 1:44 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 05 de enero de 2025

CI-6703345-2024-100

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL".

Asunto: Solicitud de autorización de ingreso de personal de obra a la sede judicial de Acacias – Meta.

Cordial saludo,

A través del presente me permito remitir la solicitud de ingreso del personal para obra en la sede de ACACIAS, este personal de obra ingresará a trabajar a partir del día 07 de enero del presente año:

Nombre	Cedula	Cargo	Sede	Fecha de Ingreso
Henry Julian Forero Ariza	1.122.116.316	Auxiliar de obra	ACACIAS	07/01/2025
Marisol Aguilera León	40.402.380	Auxiliar de obra	ACACIAS	07/01/2025

Una vez revisada la información suministrada por el contratista de obra se da aprobación para el ingreso de personal por parte de esta interventoría:

Se anexa:
- Cedula del trabajador
- Inducción al cargo.
- Constancia de Afiliación ARL.
- Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- Formato entrega de dotación.
- Examen de ingreso.
- Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos.
- Certificado de antecedentes judiciales.
- Modelo o diseño de escarapela de identificación para personal a laborar.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

3 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-100 Solicitud de autorización de ingreso de personal de obra a la sede judicial de Acacias – Meta. .pdf
116K

HENRY FORERO.zip
4850K

MARISOL AGUILERA.zip
10710K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud acta de autorización de salida de condensadoras y aires acondicionados de la sede de Granada

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 6 de enero de 2025, 2:04 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 06 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-101

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud acta de autorización de salida de condensadoras y aires acondicionados de la sede de Granada

Cordial saludo,

Previendo que se continuará con la ejecución del contrato y actividades de obra en la sede de Granada, se solicita a la entidad la autorización para llevar a cabo el retiro de 4 aires con 4 condensadoras de la sede del palacio de justicia de Granada, todo con el fin de realizar la revisión y el mantenimiento de los mismos y se deja claridad que el contratista y la persona que los retira se hacen responsables del bienestar de los equipos.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

CI-6703345-2024-101- Solicitud acta de autorización de salida de condensadoras y aires acondicionados de la sede de Granada.pdf
612K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-103 APROBACION DE PLANOS ELECTRICOS SEDE TRIBUNALES SAN JOSE

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 10 de enero de 2025, 7:15 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 10 de enero de 2025

CI-6703345-2024-103

INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor de $145.160.800,00 y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asunto: Aprobación de planos de distribución eléctricos de la sede TRIBUNALES SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Una vez realizado el análisis a los planos remitidos por el contratista de obra, en los cuales se plasman las redes de distribución eléctricas y de iluminación de la sede de tribunales en San José del Guaviare, la interventoría aprueba y da el aval los mismos para la continuidad de las actividades eléctricas que se están desarrollando en esta sede. Por consiguiente, se sugiere al contratista tener siempre a mano estos planos impresos toda vez que se requiera llevar el debido proceso de seguimiento y control de dichas actividades.

ANEXO: planos de distribución eléctrica remitidos por contratista

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

3 archivos adjuntos

2025-01-08 REDES TRIBUNALES SJG inc ilum.dwg
452K

2025-01-08 TOMAS TRIBUNALES SJG V2-Model.pdf
136K

CI-6703345-2024-103 APROBACION DE PLANOS ELECTRICOS SEDE TRIBUNALES SAN JOSE.pdf
162K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

(sin asunto)

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 12 de enero de 2025, 8:50 a.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 12 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-104

Ingeniera: **MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS** Coordinación Administrativa Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con adición en valor de $57.111.590,00 y prórroga hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de autorización de ingreso de personal a la sede de Granada a partir del día 12/01/2025 para aseo general.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en calidad de interventoría me permito solicitar autorización de ingreso del siguiente personal a la sede de Granada a partir del 12/01/2025, con el fin de que pueda realizar un aseo a los espacios de obra. El personal se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL.

Personal de Obra				
Nombre	**Cedula**	**Asunto**	**Sede**	**Fecha de Ingreso**
ANGARITA JARA ERIKA	1.006.688.568	ASEADORA	GRANADA	12/01/2025
JARA GUEVARA AURORA	40.449.367	ASEADORA	GRANADA	12/01/2025

NOTA: Una vez revisada la información suministrada por el contratista de obra se da aprobación para el ingreso de personal por parte de esta interventoría:

Se anexa:

- Constancia de Afiliación ARL.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

3 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-104 Solicitud de autorización de ingreso de personal a la sede de Granada a partir del día 12:01:2025 para aseo general.pdf
158K

ARL AURORA JARA ENE 25.pdf
662K

ARL ERIKA ANGARITA ENE 25.pdf
563K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Entrega de documento parcial del Juzgado Primero Promiscuo Municipal, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal y Juzgado Civil del Circuito

3 mensajes

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 14 de enero de 2025, 12:52 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 14 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-105

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Entrega de documento parcial del Juzgado Primero Promiscuo Municipal, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal y Juzgado Civil del Circuito

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de interventoría, nos permitimos informar que se está realizando la entrega formal del documento de entrega parcial de los juzgados ya mencionados, el cual fue dado a conocer al contratista en reunión llevada a cabo el día 13 de enero.

Cabe resaltar que la entrega de este documento se efectúa bajo la salvedad de que aún se encuentran pendientes algunas correcciones que deben ser subsanadas por parte del contratista. Dichas observaciones fueron debidamente notificadas al contratista, quien ha asumido el compromiso de atenderlas en los plazos estipulados para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, contractuales y normativos correspondientes.

Se anexa:

- FORMATO DE ENTREGA DE AREAS.

Coordialmente

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

ENTREGA DE JUZGADOS.pdf
1321K

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 14 de enero de 2025, 5:38 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta, solicitamos se nos envíe una copia del acta que fue firmada en la sede por parte de la supervisión y los jueces de los despachos

Agradecemos su colaboración
[Texto citado oculto]

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 15 de enero de 2025, 11:23 a.m.
Para: INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta, me permito enviar la copia de las actas firmadas de los elementos entregados a los jueces de los despachos.
[Texto citado oculto]
--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
[Texto citado oculto]

---

3 archivos adjuntos

ENTREGA DE ELEMENTOS - JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO .pdf
1007K

ENTREGA DE ELEMENTOS - JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL MUNICIPIO .pdf
1116K

ENTREGA DE ELEMENTOS - JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL MUNICIPIO.pdf
1464K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-106 SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRAS PREVIAS EN SEDE EL CALVARIO

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 15 de enero de 2025, 8:11 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 15 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-106

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRAS PREVIAS EN SEDE EL CALVARIO

Cordial saludo,

Mediante el presente en calidad de interventoría al contrato de obra CO1.PCCNTR.6698166 me permito informar que el contratista INVERSIONES GYS SAS presentó oficio IGYS-CSJVCIO-66 (ver anexo 1) manifestando lo siguiente:

“(...) Con respecto al capítulo de obra de la sede de El Calvario y teniendo en cuenta que la entidad, mediante el supervisor del momento Ing. Edwar Acosta, indico que por cuestión de presupuestos la entidad se encargaría de ejecutar previo a la ejecución de las actividades asignadas al contratista, los siguientes ITEMS:

1. Redes de voz y datos
2. Sistema de iluminación
3. Sistema de redes y puntos para tomas.

Así las cosas, dichas actividades no están incluidas en el presupuesto y como son predecesoras a las actividades que debe ejecutar el contratista, el contratista no puede entrar a laborar hasta tanto la entidad no realice o haya realizado las mencionadas actividades.

En caso de que no hayan sido ejecutadas se solicita a la entidad que realice dichas actividades, previa la aclaración que cualquier retraso en el cronograma será responsabilidad de la entidad.

Se queda atentos a las indicaciones y respuesta al tema planteado. Se aclara también que el contratista dispone de toda la logística para iniciar las obras y que la entidad debe dar celeridad al tema para evitar que el personal que se tiene disponible

se ocupe en otras obras o a que llegue el invierno y no se pueda ingresar al municipio, dadas las dificultades de la vía(...)"

Con respecto a lo anterior, la interventoría considera que el contratista puede iniciar ejecución de actividades en la sede el Calvario de manera simultánea o paralela a la intervención de las redes de voz y datos, sistema de iluminación y redes y puntos eléctrico, ya que se pueden ir ejecutando actividades de divisiones en muros nuevos en drywall y resanes de humedades. Sin embargo, con el fin de evitar retrasos en el inicio de ejecución de actividades en esta sede, se solicita a la supervisión apoyo para gestionar la intervención de dichas redes o se indique si se deben incluir dentro del alcance del contrato previendo que se encuentra en proceso de elaboración un balance de cantidades de obra para todas las sedes. Esta solicitud es importante teniendo en cuenta que el plazo de ejecución restante es 44 días y se estima un tiempo de ejecución necesario para la sede de 30 días.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

---

2 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-106 SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRAS PREVIAS EN SEDE EL CALVARIO.pdf
108K

66. Solicitud de realizacion de obras previas por parte de la entidad en la sede Calvario Meta. docx.pdf
200K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-108 SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES MUEBLES DE LAVAMANOS

2 mensajes

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 16 de enero de 2025, 10:33 a.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 16 de enero de 2025

CI-6703345-2024-108

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor de $145.160.800,00 y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asunto: Solicitud de especificaciones técnicas y diseño de muebles de lavamanos y espejos para la sede GRANADA

Cordial saludo

A través del presente nos permitimos remitir las solicitudes realizadas por el contratista de obra, en las cuales se hace necesario que se especifique por parte de la supervisión, el diseño de los muebles de lavamanos y espejos a instalar en las unidades sanitarias de la sede Granada.

Es necesario que por parte de la entidad hagan esta aclaración de las especificaciones técnicas, con el fin de que tanto obra como interventoría tengamos claro cuáles son estos muebles y así el contratista pueda proceder con la debida compra e instalación, y por su parte interventoría realizar el seguimiento adecuado a las mismas.

ANEXO: solicitudes enviadas por contratista

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

3 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-108 SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES MUEBLES DE LAVAMANOS.pdf
160K

71. solicitud de especificaciones y diseño de espejos para baños sede Granada.pdf
196K

68. Solicitud de especificacion tecnica y diseños de mesones para lavamanos docx.pdf
195K

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 16 de enero de 2025, 10:51 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Saludos ingenieros.

Por favor corrigen. La especificación solicitada no es de muebles de lavamanos. Se le debe precisar a la entidad que es la especificación de los MESONES para lavamanos.
Gracias.
[Texto citado oculto]

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de ingreso al Juzgado Promiscuo 001 Municipal y el Juzgado Promiscuo 002 Municipal Sede Granada.

3 mensajes

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 16 de enero de 2025, 4:24 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 16 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-109

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de ingreso al Juzgado Promiscuo 001 Municipal y el Juzgado Promiscuo 002 Municipal Sede Granada.

Cordial saludo,

Previendo que se continuará con la ejecución del contrato y actividades de obra en la sede de Granada, se solicita a la entidad la autorización del siguiente personal operativo del contratista los cuales son los encargados de llevar a cabo labores el día 18-01-2025 al juzgado 001 Promiscuo Municipal y al Juzgado 002 Promiscuo Municipal. Esto con el fin de subsanar las correcciones ya expuestas al contratista y la instalación de las puertas en madera.

Personal de Obra			
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Sede**
ARQ NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA	79.514.504	DIRECTOR DE OBRA	GRANADA
ANGIE LIZETH BORDA PENAGOS	1.010.243.369	RESIDENTE DE OBRA	GRANADA
ALBA SCARPETTA SANCHEZ	51.849.383	PROFESIONAL SST	GRANADA
ANDRES FELIPE SUAREZ ARIAS	1.018.474.462	AUX. RESIDENTE OBRA	GRANADA
ELKIN REYES TORRES	1.120.368.471	MAESTRO	GRANADA
DUVAN LOZADA IDARRAGA	1.120.380.342	OBRERO	GRANADA

BRAYAN GARCIA RODRIGUEZ	1.120.373.917	OBRERO	GRANADA
GUSTAVO SALON ROJAS	91.244.820	TECNICO ELECTRICISTA	GRANADA
JORGE NIÑO	86.003.966	INSTALADOR DE PUERTAS	GRANADA

Nota: Se hace la aclaración a la supervisión que este personal es con el que el contratista ha venido ejecutando laborales a lo largo del proyecto por ende este personal se encuentra avalado por la interventoría con sus papeles en orden y con el último correo enviado por el contratista hacer caso omiso.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

CI-6703345-2024-109- SOLICITUD DE PERSONAL EN SEDE GRANADA.pdf
610K

Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co> 17 de enero de 2025, 10:45 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Buenos días,

De acuerdo con lo expresado, se confirma que el juez del Juzgado 002 Municipal de Granada ha autorizado el ingreso al despacho el día 18 de enero de 2025 para realizar las adecuaciones pendientes.

Sin embargo, el juez del Juzgado 001 Municipal de Granada ha indicado que no será posible llevar a cabo los trabajos pendientes el sábado 18 de enero, debido a que no habrá servidores disponibles en el despacho. En su lugar, se solicita que las tareas se realicen de lunes a viernes.

Por lo tanto, se requiere coordinar un nuevo día y las horas en que se llevará a cabo el trabajo, con el fin de programarlo adecuadamente con el despacho.

Atentamente,

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

Monica Tatiana Gómez Ramos
Profesional Universitario
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Correo: infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección: Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada - Villavicencio - Meta

De: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>
Enviado: jueves, 16 de enero de 2025 16:24
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
18 de enero de 2025, 7:58 a.m.

Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>, "interventoriaramajudicial@gmail.com" <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Buenos días,

De acuerdo a lo manifestado en horas de la noche por el Juez del juzgado 001 promuisco municipal, se pueden realizar las adecuaciones pendientes el día sábado 18 de enero, toda vez que estarán laborando en el despacho.

Por lo tanto, les indico que se pueden realizar las actividades pendientes en el despacho anteriormente mencionado.

Atentamente,

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

Monica Tatiana Gómez Ramos
Profesional Universitario
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Correo: infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección: Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada - Villavicencio - Meta

---

De: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de enero de 2025 10:45
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>
Asunto: RE: Solicitud de ingreso al Juzgado Promiscuo 001 Municipal y el Juzgado Promiscuo 002 Municipal Sede Granada.

[Texto citado oculto]

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de autorización de ingreso de personal a la sede judicial de Acacias.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 16 de enero de 2025, 4:38 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 16 de enero de 2025

CI-6703345-2024-110

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de autorización de ingreso de personal a la sede judicial de Acacias.

Cordial saludo,

A través del presente me permito remitir la solicitud de ingreso del personal para obra en la sede de ACACIAS, este personal de obra ingresará a trabajar a partir del día 17 de enero del presente año:

Nombre	Cedula	Cargo	Sede	Fecha de Ingreso
YERSON DUVAN SANTAMARIA HERNANDEZ	1.069.734.249	Auxiliar de obra	ACACIAS	17/01/2025

NOTA: Una vez revisada la información suministrada por el contratista de obra se da aprobación para el ingreso de personal por parte de esta interventoría:

Se anexa:

- Cedula del trabajador
- Inducción al cargo.
- Constancia de Afiliación ARL.
- Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- Formato entrega de dotación.
- Examen de ingreso.
- Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos.
- Certificado de antecedentes judiciales.
- Modelo o diseño de escarapela de identificación para personal a laborar.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Interventoría

C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

---

2 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-110- SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL EN SEDE ACACIAS.pdf
603K

YERSON SANTAMARIA.zip
3203K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-111 INDICACIONES PARA LIMPIEZA DE ESTANTERÍA Y EXPEDIENTES EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PISO 4 SEDE ACACIAS

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 17 de enero de 2025, 10:48 a.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 17 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-111

Señores:
INVERSIONES GYS S.A.S
Atn. Nelson Enrique Gómez García
Representante legal
inversionesgys2011@gmail.com
judicaturavillavicenciogys@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: INDICACIONES PARA LIMPIEZA DE ESTANTERÍA Y EXPEDIENTES EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PISO 4 SEDE ACACIAS

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que según lo evidenciado el día de ayer 16 de enero de 2025 en el sitio de obra sede Acacias, la estantería donde están ubicados los expedientes en el juzgado segundo civil municipal en el piso 4 se encuentra con polvo debido a las actividades de estuco que se realizaron al interior de la oficina, pese a que dichos elementos fueron cubiertos para mitigar la afectación, por lo cual es necesario realizar una limpieza superficial de la estantería y los expedientes con el fin de entregar las áreas limpias.

La limpieza se debe realizar cumpliendo las siguientes indicaciones:

- No se deben manipular en ningún momento los expedientes por parte del personal del contratista de obra y la interventoría.
- Se debe realizar la limpieza con acompañamiento permanente de un delegado de la sede judicial y el inspector de interventoría.
- La entidad contratante dispondrá de un delegado para realizar el acompañamiento permanente durante la actividad.
- Se debe realizar la limpieza en seco, es decir, sin aplicar agua o productos de limpieza.

- Se recomienda el uso de aspiradora quita pelusa con rejilla, con el fin de que el polvo no se esparza por otros espacios al interior de la oficina y la aspiradora no absorba papelería.

- La limpieza se deberá realizar el próximo lunes 20 de enero de 2025 en horario de oficina de 8am a 12m y de 2pm a 5pm.

Agradecemos la atención prestada y la gestión para coordinar la adecuada ejecución de la actividad.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-111 INDICACIONES PARA LIMPIEZA DE ESTANTERÍA Y EXPEDIENTES EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PISO 4 SEDE ACACIAS.pdf
2633K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Áreas de baño reducidas del primer piso en la sede judicial de Granada.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 4:41 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 20 de enero de 2025

CI-6703345-2024-113

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Áreas de baño reducidas del primer piso en la sede judicial de Granada.

De acuerdo con el oficio IGYS-CSJVCIO-73 emitido por el contratista de obra, se informa que los baños del primer piso de la sede Granada presentan limitaciones en sus dimensiones, lo que genera dificultades para la instalación de los aparatos sanitarios con la referencia previamente aprobada por la entidad. En su comunicación, el contratista señala que esta situación resultaría en espacios saturados e incómodos que, además, no cumplirían con las dimensiones mínimas requeridas para garantizar la ergonomía y funcionalidad de estos.

Como alternativa a este inconveniente, se propone considerar la instalación de aparatos sanitarios de menores dimensiones que permitan optimizar el uso del espacio, generando una mayor holgura y minimizando la saturación de las áreas. Esta solución busca armonizar los espacios, sin comprometer la calidad ni los estándares establecidos para la obra.

Respetuosamente, solicitamos a la entidad que evalúe esta situación y nos indique si el contratista debe proceder con la instalación de la referencia previamente aprobada o si, por el contrario, se autoriza explorar y proponer opciones de aparatos sanitarios más compactos, que cumplan con los requerimientos de calidad y contribuyan a la mejora en la distribución y funcionalidad de los baños.

ANEXO:

- Oficio IGYS-CSJVCIO-73

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

2 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-113-Áreas de baño reducidas del primer piso en la sede judicial de Granada..pdf
602K

73. Espcios reducido en baños sede Granada.pdf
241K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-114 APROBACION UBICACION AIRES ACONDICONADOS SEDE TRIBUNALES SAN JOSE

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 5:04 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 20 de enero de 2025

CI-6703345-2024-114

INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor de $145.160.800,00 y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asunto: Aprobación de planos de ubicación aires acondicionados y condensadoras de la sede TRIBUNALES SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Una vez realizado el análisis a los planos remitidos por el contratista de obra, en los cuales se plasman las redes de distribución y ubicación de los aires acondicionados y las condensadoras de la sede de tribunales en San José del Guaviare, la interventoría aprueba y da el aval de estos planos para la continuidad de las actividades que se están desarrollando en esta sede. Por consiguiente, se sugiere al contratista tener siempre a mano estos planos impresos toda vez que se requiera llevar el debido proceso de seguimiento y control de dichas actividades.

ANEXO: planos de distribución y ubicación de aires acondicionados remitidos por contratista

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Interventoría

4 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-114 APROBACION UBICACION AIRES ACONDICONADOS SEDE TRIBUNALES SAN JOSE.pdf
161K

2025-01-19 PLANO REDES REFRIGERANTE CU 2DO PISO TRIBUNALES SJGUAV.dwg
107K

2025-01-19 OFC GYS 75 - INTERV - CSJ Remision de planos lineas refrigerantes y equipos AC 2do piso edif tribunales SJGUAV.docx.pdf
240K

PLANO AIRES ACONDICIONADO TRIBUNALES.pdf
104K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-115 RECOMENDACION DE ASEO PERMANENTE EN LAS OBRAS

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 5:26 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 20 de enero de 2025

CI-6703345-2024-115

INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor de $145.160.800,00 y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asunto: RECOMENDACION DE ORDEN Y ASEO PERMANENTE EN LAS OBRAS

Cordial saludo

A través del presente documento, se recomienda al contratista de obra, el permanente aseo y orden de las diferentes obras que se están ejecutando en el momento. Además, tener todos lo implementos de seguridad y corroborar el estado de los mismos.

Con lo anterior no se menciona que no este cumpliendo con la actividad, sino que es una recomendación para tener presente en todas las sedes.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. INVERSIONES GYS S.A.S R/L Nelson Enrique Gómez García inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com

CI-6703345-2024-115 RECOMENDACION DE ASEO PERMANENTE EN LAS OBRAS.pdf
159K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-116 ATENCIÓN AL OFICIO IGYS-CSJVCIO-73 SANITARIOS BAÑOS PRIMER PISO GRANADA

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 6:36 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 20 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-116

Señores:
INVERSIONES GYS S.A.S
Atn. Nelson Enrique Gómez García
Representante legal
inversionesgys2011@gmail.com
judicaturavillavicenciogys@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: ATENCIÓN AL OFICIO IGYS-CSJVCIO-73 SANITARIOS BAÑOS PRIMER PISO GRANADA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo manifestado en el oficio IGYS-CSJVCIO-73 recibido por parte de ustedes el pasado viernes 17 de enero 11:44pm, donde nos manifiestan lo siguiente:

“(...)Con el fin de indicar a la entidad que las áreas del baño del primer piso son extremadamente reducidas y que si a ello le adicionamos que los aparatos sanitarios indicados por la entidad son aparatos de la línea más grande y robusta del mercado, el resultado va hacer espacios saturados e incomodos que de por si no cumplen con las dimensiones mínimas ergonómicas.

Como solución a ello se sugiere instalar aparatos más pequeños que generen un poco de holgura y libere en algo la saturación de los espacios(...)”

Solicitamos nos presenten TRES (03) PROPUESTAS de los sanitarios que cumplan con requisitos de ergonomía de acuerdo al espacio y áreas disponibles. Para lo anterior, se da un plazo de UN (01) DÍA HÁBIL.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-116 ATENCIÓN AL OFICIO IGYS-CSJVCIO-73 SANITARIOS BAÑOS PRIMER PISO GRANADA.docx
77K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-117 SOLICITUD DEL CUMPLIMIENTO DE SG-SST

2 mensajes

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 10:49 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 20 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-117

Señores:
INVERSIONES GYS S.A.S
Atn. Nelson Enrique Gómez García
Representante legal
inversionesgys2011@gmail.com
judicaturavillavicenciogys@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-117 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST.pdf
11231K

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 21 de enero de 2025, 10:06 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Buenos dia ingenieros

De manera atenta se indica que se han entregado dotación al personal, y que desafortunadamente no lo utilizan por cuestiones culturales alegando que no se acostumbran al casco y demás.
De todas maneras el contratista acepta su solicitud y seguirá implementando campañas de concientización . Se indica que desde ya se están tomando los respectivos correctivos.
[Texto citado oculto]

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-117 VISITA TECNICA SEDES PUERTO RICO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 8:09 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 20 de enero de 2025

CI-6703345-2024-117

INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor de $145.160.800,00 y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asunto: VISITA TECNICA A LAS SEDES DE PUERTO RICO Y SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

Cordial saludo

A través del presente documento se informa que el día martes 21 de enero del presente año, se realizará la visita técnica de supervisión a las obras que se están realizando en las sedes de Puerto Rico Meta y posteriormente San José del Guaviare. Por tal motivo, se solicita la presencia del director de obra, residente de obra y demás profesionales ofertados de cada una de estas sedes.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS. Supervisión correo: infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

CI-6703345-2024-117 VISITA TECNICA SEDES PUERTO RICO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.pdf
159K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de elaboración y entrega de plano para la sala de audiencias en la sede de Puerto Rico.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 22 de enero de 2025, 10:24 a.m.
Para: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 22 de enero de 2025

CI-6703345-2024-118

INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de elaboración y entrega de plano para la sala de audiencias en la sede de Puerto Rico.

Durante la visita técnica realizada el martes 21 de enero del presente año, la supervisión solicitó a esta interventoría la necesidad de que el contratista elabore un plano detallado que permita proyectar la distribución y localización de los diferentes elementos en la sala de audiencias de la sede de Puerto Rico. Este plano deberá incluir, entre otros aspectos:

1. Los espacios destinados al estrado.
2. La ubicación prevista para las cámaras.
3. La necesidad de cajas de inspección u otros elementos técnicos requeridos.

El objetivo principal de la entrega de este plano es garantizar que los servidores del juzgado correspondiente puedan revisar y validar la propuesta, asegurando que las necesidades tecnológicas y funcionales del espacio sean plenamente satisfechas antes de la instalación del cielo raso en PVC.

En virtud de lo anterior, solicitamos amablemente que este plano sea remitido a la interventoría en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir de la fecha de recepción de este oficio. Una vez recibido, procederemos a trasladarlo a los servidores del juzgado para que puedan realizar las observaciones y ajustes necesarios.

Agradecemos su diligencia y compromiso en la atención de esta solicitud, recordando que el cumplimiento oportuno de estos requerimientos resulta esencial para el desarrollo adecuado del proyecto.



Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS. Supervisión correo: infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

CI-6703345-2024-118-Solicitud de eleboracion y entrega de plano para la sala de audiencias en la sede Puerto Rico.pdf
601K

CI-6703345-2024-119 TRASLADO DE OFICIO IGYS-CSJVCIO-075 Manual de Mantenimiento de Cubierta Sede Acacias.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 22 de enero de 2025, 10:44 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 22 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-119

Ingeniera:

MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: TRASLADO DE OFICIO IGYS-CSJVCIO-075 MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA SEDE ACACIAS

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de interventoría al contrato de obra No CO1.PCCNTR.6698166 me permito informar que el día 20 de enero de 2025 el contratista INVERSIONES GYS SAS remitió el oficio IGYS-CSJVCIO-075 con asunto: Manual de Mantenimiento de Cubierta Sede Acacias (anexo 1), donde presenta las recomendaciones de uso y cuidado requerido y sugerido que deben ser realizadas para lograr que la vida útil de los insumos y elementos elaborados, suministrados e instalados dentro del Ítem Contractual 2.030 “Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminio) para remates de cubierta en muro”, a través del cual se realizó la impermeabilización de la cubierta en la sede de Acacias. Y considerando que esta área ya fue entregada parcialmente por el contratista a la presente interventoría y que la entidad contratante ya podrá hacer uso de este espacio para su normal funcionamiento y operación, damos traslado del documento conocimiento de la entidad, y sea divulgado e implementado por los funcionarios y demás personal operativo de la sede Judicial de Acacias.

No obstante, se aclara que el contratista de obra INVERSIONES GYS SAS deberá entregar un documento de Manual de Uso y Mantenimiento para cada una de las sedes intervenidas de acuerdo a todas las actividades ejecutadas en las mismas, el cual será revisado y aprobado por la interventoría para remisión a la entidad contratante previo la firma del acta de recibo final de las obras.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR

Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

---

2 archivos adjuntos

Anexo 1. IGYS-CSJVCIO-075.pdf
209K

CI-6703345-2024-119 TRASLADO DE OFICIO IGYS-CSJVCIO-075 Manual de Mantenimiento de Cubierta Sede Acacias..pdf
98K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-120 TRASLADO DE SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL A LA SEDE DE GRANADA

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 22 de enero de 2025, 11:02 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>

Villavicencio, 22 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-120

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: TRASLADO DE SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL A LA SEDE DE GRANADA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6698166

Cordial saludo,

Por medio del presente, en calidad de interventoría me permito dar traslado a la solicitud de autorización de ingreso del siguiente personal a la sede de Granada a partir del 23/01/2025, con el fin de que pueda realizar actividades de limpieza.

Nombre	Cedula	Asunto	Sede	Fecha de Ingreso
ANGARITA JARA ERIKA	1.006.688.568	Actividades de limpieza	Granada	A partir del 23/01/2025

Una vez revisada la información suministrada por el contratista de obra se da aprobación para el ingreso de personal por parte de la presente interventoría, anexado lo siguiente:

- Certificado de Afiliación ARL.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

2 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-120 TRASLADO DE SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL A LA SEDE DE GRANADA.pdf
106K

ARL ERIKA ANGARITA ENERO 20.pdf
609K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-121 TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR PARQUEADEROS EN ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SEDE GRANADA

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 23 de enero de 2025, 11:14 a.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>

Villavicencio, 23 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-121

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR PARQUEADEROS EN ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN SEDE GRANADA

Cordial saludo,

Por medio del presente, en calidad de interventoría me permito dar traslado al oficio IGYS-CSJVCIO-79 recibido el día de hoy 23 de enero de 2025, en el cual el contratista INVERSIONES GYS SAS se solicita autorización para ocupar los parqueaderos durante la ejecución de la actividad de impermeabilización de la fachada en la sede judicial de Granada, para lo cual se requeriría la evacuación total de esta área a partir del día de mañana 24 de enero de 2025 hasta el día 30 de enero de 2025, periodo en el cual se ejecutará en su totalidad la actividad.
--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-121 TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR PARQUEADEROS EN ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN SEDE GRANADA.pdf
99K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-122 ALCANCE AL OFICIO CI-6703345-2024-121 TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR PARQUEADEROS EN ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SEDE GRANADA

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 23 de enero de 2025, 2:55 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>

Villavicencio, 23 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-122

Ingeniera:

MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: ALCANCE AL OFICIO **CI-6703345-2024-121** TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR PARQUEADEROS EN ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SEDE GRANADA

Cordial saludo,

Por medio del presente, en calidad de interventoría me permito dar alcance al oficio **CI-6703345-2024-121** enviado esta mañana y aclarar que debido a un retraso en la llegada de los andamios a la sede de Granada se estima que se requiere la evacuación total del parqueadero del 24 de enero de 2025 hasta el 04 de febrero de 2025.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-122 ALCANCE AL OFICIO CI-6703345-2024-121 TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR PARQUEADEROS EN ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SEDE GRANADA.pdf
99K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Entrega de Juzgado de Familia, sede Granada Meta.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 23 de enero de 2025, 3:47 p.m.
Para: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 23 de enero de 2025
CI-6703345-2024-123

SEÑORES:
INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Entrega de Juzgado de Familia, sede Granada Meta.

CI-6703345-2024-123- ENTREGA DEL JUZGADO DE FAMILIA, SEDE GRANADA.pdf
1098K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-124 SOLICITUD DE NO REALIZACION DE ACTIVIDADES

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 23 de enero de 2025, 7:09 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 23 de enero de 2025

CI-6703345-2024-124

INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor de $145.160.800,00 y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asunto: SOLICITUD DE NO REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANEJADORAS DE AIRE E INTERVENCIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

Cordial saludo

A través del presente documento, se solicita al contratista NO REALIZAR la actividad de cambio de ubicación de las manejadoras de aire acondicionado, ni ninguna actividad que involucre este ítem.

Por otra parte, se solicita que tampoco se realice la conexión de la bajante de aguas lluvias de la canal posterior, debido a que, de acuerdo con la supervisión, la red existente colapsa en épocas de lluvia y esto perjudicaría el desagüe de esa bajante. Por tal motivo se solicita suspender esta actividad hasta encontrar una mejor opción.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS. Supervisión. correo: infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

CI-6703345-2024-124 SOLICITUD DE NO REALIZACION DE ACTIVIDADES.pdf
160K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de elaboración de informe con esquema sobre luminarias entregadas por la entidad.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 24 de enero de 2025, 12:53 p.m.
Para: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>, "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 24 de enero de 2025

CI-6703345-2024-125

SEÑORES:
INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de elaboración de informe con esquema sobre luminarias entregadas por la entidad.

En el marco del seguimiento y control técnico de las actividades relacionadas con el proyecto en ejecución de manera atenta solicitamos la elaboración de un informe detallado que cumpla con las siguientes características:

1. Identificación precisa de las áreas y oficinas: Incluya un esquema claro y organizado que permita identificar las zonas donde hasta la fecha se han instalado y se instalarán las luminarias suministradas por la entidad, especificando las ubicaciones exactas.
2. Organización y claridad: La interventoría sugiere utilizar el mismo formato de memorias de cálculo de cantidades para presentar el esquema, la ubicación y las cantidades de luminarias para cada sede.

Agradecemos que el informe se presente con UN (1) DIA HABIL para su revisión y análisis.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría
C.C. MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS. Supervisión correo: infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

CI-6703345-2024-125- SOLICITUD DE ESQUEMA.pdf
603K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-126 SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO PARA SEDES EL CALVARIO Y EL YARÍ

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 24 de enero de 2025, 12:42 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 24 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-126

Señores:
INVERSIONES GYS S.A.S
Atn. Nelson Enrique Gómez García
Representante legal
inversionesgys2011@gmail.com
judicaturavillavicenciogys@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO PARA SEDE EL CALVARÍO Y SEDE EL YARÍ

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato de obra No CO1.PCCNTR.6698166 es el 28 de febrero de 2025 y que el plazo de ejecución restante es de 36 días, y que según lo manifestado por ustedes en el comité de obra del 15 de enero de 2025 se requiere un plazo de ejecución de UN (01) mes para las actividades de las sedes Calvario y El Yarí, me permito **solicitar el inicio de actividades de obra en estas sedes a más tardar la próximo semana (del 27 de enero al 01 de febrero de 2025)**, con el fin de garantizar la terminación de todas las sedes en el plazo contractual.

De igual forma, se **solicita un cronograma detallado de actividades diarias** para cada una de estas con el fin de realizar un seguimiento detallado al avance y prever cualquier atraso que se pueda presentar. Adicionalmente, el cronograma de actividades de la sede El Calvario permitirá a la entidad coordinar oportunamente la ejecución de actividades de redes e iluminación que se requieran. Para la elaboración de los cronogramas se da un plazo de UN (01) día hábil.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-126 SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO PARA SEDES EL CALVARIO Y EL YARÍ.pdf

102K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-127 Solicitud de autorización de ingreso de personal sede Acacias

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 27 de enero de 2025, 5:23 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 27 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-127

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: TRASLADO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA A LA SEDE JUDICIAL DE ACACIAS

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito dar traslado a la solicitud de ingreso de personal para la sede Acacias recibida mediante correo electrónico el día de hoy 27 de enero de 2025, en la cual el contratista INVERSIONES GYS SAS solicita autorización de ingreso para el siguiente personal:

Nombre	Cedula	Asunto	Sede	Fecha de Ingreso
RODOLFO VARGAS ULLOA	1.030.601.088	Instalación de fachada flotante	Acacias	A partir del 28/01/2025
DIEGO HERRERA MUÑOZ	1.022.446.962	Instalación de fachada flotante	Acacias	A partir del 28/01/2025

Una vez revisada la información suministrada por el contratista de obra se da aprobación para el ingreso de personal por parte de esta interventoría anexando lo siguiente:

- Cedula del trabajador
- Inducción al cargo.
- Constancia de Afiliación ARL.
- Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- Formato entrega de dotación.
- Examen de ingreso.
- Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos.
- Certificado de antecedentes judiciales.
- Modelo o diseño de escarapela de identificación para personal a laborar.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

---

3 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-127 Solicitud de autorización de ingreso de personal sede Acacias.pdf
105K

DIEGO HERRERA.zip
8550K

RODOLFO VARGAS.zip
3037K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Traslado de oficio IGYS-CSJVCIO-083 Entrega de informe con esquema sobre luminarias entregadas por la entidad.

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 29 de enero de 2025, 11:55 a.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 29 de enero de 2025

CI-6703345-2024-128

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Traslado de oficio IGYS-CSJVCIO-083 Entrega de informe con esquema sobre luminarias entregadas por la entidad.

Por medio del presente, me permito dar traslado al oficio IGYS-CSJVCIO-083 entregado por el contratista de obra entregado el día 29 de enero de 2025 en el cual se presenta el esquema con las luminarias entregadas e instaladas en cada una de las sedes.

Anexo:

- Oficio IGYS-CSJVCIO-083

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

CI-6703345-2024-128- SOLICITUD DE ESQUEMA INFORME CON ESQUEMA SOBRE LUMINARIAS ENTREGADAS POR LA ENTIDAD.pdf
601K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-130 Remisión de muestras digitales para guarda escoba sede tribunales San José del Guaviare

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 29 de enero de 2025, 3:44 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 29 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-130

Ingeniera:

MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: REMISIÓN DE MUESTRAS DIGITALES PARA GUARDA ESCOBA SEDE TRIBUNALES SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir el oficio IGYS-CSJVCIO-80 recibido el día 23 de enero de 2025 donde el contratista INVERSIONES GYS SAS presenta muestras digitales para el guardaescoba en la sede Tribunales SJG. Lo anterior, con el fin de que la entidad contratante nos informe cual es la referencia de guardaescoba aprobado y autorizado para que el contratista instale.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

2 archivos adjuntos

CI-6703345-2024-130 Remisión de muestras digitales para guarda escoba sede tribunales San José del Guaviare.pdf
94K

2025-01-23 OFC GYS 75 - INTERV - CSJ Remision de muestras digitales colores gescobas SJGuav tribunales.pdf
284K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Contestación al oficio IGYS CSJVCIO-070

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 16 de enero de 2025, 10:40 a.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

Villavicencio, 16 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-108

SEÑORES:
INVERSIONES GYS S.A.S
R/L. NELSON ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
inversionesgys2011@gmail.com - judicaturavillavicenciogys@gmail.com
Calle 152 No 55 A 10 Torre 2 Apartamento 1202 – Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL" por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Contestación al oficio IGYS CSJVCIO-070

Por medio de la presente, se procede a realizar la revisión preliminar del diseño del cárcamo proyectado para ser construido en la parte posterior del juzgado. Tras el análisis efectuado, se ha podido determinar que las medidas propuestas cumplen con las especificaciones requeridas. Sin embargo, es fundamental atender algunos aspectos adicionales para garantizar la funcionalidad y la durabilidad del sistema:

1. **Distanciamiento de las rejillas:** Es necesario detallar el distanciamiento exacto entre las rejillas en el diseño. Esto permitirá verificar que la separación cumpla con los estándares técnicos y normativos, asegurando una adecuada captación y flujo del agua, así como la prevención de obstrucciones por residuos.
2. **Especificación de materiales:** Se requiere que se incluya información detallada sobre el material de las rejillas, indicando su resistencia a la corrosión y su capacidad de soportar las cargas mecánicas a las que podría estar sometido el sistema.
3. **Detallado en planos:** En los planos presentados, es fundamental incluir de manera precisa la orientación de la pendiente de la tubería. Asimismo, se debe indicar el porcentaje exacto de pendiente que se implementará, asegurándose de que este cumpla con los requisitos para un drenaje eficiente y evite acumulaciones de agua o posibles obstrucciones.
4. **Diseño del sistema de desagüe:** Se recomienda adjuntar un análisis técnico que justifique el diseño propuesto y asegure que el sistema podrá manejar eficientemente el flujo de agua durante temporadas de lluvias intensas. Esto incluye especificaciones de capacidad hidráulica y consideraciones para evitar el colapso del sistema.

Cabe resaltar la importancia de que la información requerida sea enviada de manera clara y oportuna a esta interventoría. Esto permitirá agilizar el proceso de revisión, supervisión y posterior aval del diseño, asegurando así que el desarrollo de la obra cumpla con los estándares de funcionalidad y estabilidad requeridos.

Quedamos atentos a la pronta remisión de la documentación solicitada y agradecemos de antemano su compromiso con el éxito de este proyecto.

Cordialmente

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

CI-6703345-2024-108- CONTESTACIÓN A DISEÑO DE CÁRCAMO.pdf
610K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

COPIA DE ACTAS DE ENTREGA PARCIAL DE ÁREAS SUSCRITAS A LA FECHA

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 24 de enero de 2025, 12:22 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 24 de Enero de 2025

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: ENTREGA DE COPIA DE ACTAS DE ENTREGA PARCIAL DE ÁREAS SUSCRITAS A LA FECHA

Cordial saludo,

En cumplimiento de los compromisos pactadas en el comité anterior me permito remitir copia de las actas de entrega parcial suscritas entre el contratista y la interventoría para su conocimiento. Se está a la espera que el contratista culmine la totalidad de actividades en cada sede para proceder con la entrega formal de las mismas a la entidad contratante, de acuerdo a directrices y procedimiento que establezca la supervisión.

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

2 archivos adjuntos

ENTREGA AREA SEGUNDO PISO JUZADOS.pdf
1030K

ENTREGA AREA TERMINADAS ACACIAS PISO 4.pdf
3998K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-118 PROPUESTA SANITARIOS BAÑOS PRIMER PISO GRANADA

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 22 de enero de 2025, 10:23 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 22 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-118

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: ÁREAS DE BAÑOS PRIMER PISO REDUCIDAS - PROPUESTA SEDE GRANADA

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-118 PROPUESTA SANITARIOS BAÑOS PRIMER PISO GRANADA.pdf
3526K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Fichas técnicas aparatos mas pequeños

2 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 29 de enero de 2025, 2:20 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

6 archivos adjuntos

- **sanitario-manantial-ficha-tecnica.pdf** 522K
- **81. fichas tecnicas aparatos sanitarios mas pequeños sede Granada.pdf** 246K
- **694BL - Lavamanos Arezzo.pdf** 169K
- **sanitario-laguna-ficha-tecnica.pdf** 637K
- **FT-O29411001-SANITARIO-CIMA-AL-4-compressed.pdf** 604K
- **O13591001-lavamanos-varese-ficha-tecnica.pdf** 1397K

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 29 de enero de 2025, 3:14 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Respetada:
Ing. Monica Gomez
Supervisora

Cordial saludo,

Mediante el presente remitimos fichas técnicas de TRES (03) aparatos sanitarios para instalar en el baño comunitario en el primer piso de la sede Granada. La interventoría recomienda escoger la referencia Laguna, toda vez que son los de menor tamaño y se ajustan a la necesidad de optimizar el espacio al interior de las cabinas sanitarias. Por lo anterior, se pone a criterio de la entidad las dos fichas técnicas para que nos indique la especificación del sanitario que debe instalar el contratista.

Cordialmente,

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORÍA

---------- Forwarded message ---------
De: **INVERSIONES G Y S JUDICATURA** <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
Date: mié, 29 ene 2025 a la(s) 2:20 p.m.
Subject: Fichas técnicas aparatos mas pequeños
To: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

---

6 archivos adjuntos

sanitario-manantial-ficha-tecnica.pdf
522K

81. fichas tecnicas aparatos sanitarios mas pequeños sede Granada.pdf
246K

694BL - Lavamanos Arezzo.pdf
169K

sanitario-laguna-ficha-tecnica.pdf
637K

FT-O29411001-SANITARIO-CIMA-AL-4-compressed.pdf
604K

O13591001-lavamanos-varese-ficha-tecnica.pdf
1397K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Posponer visita de obra al Yary

2 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 28 de enero de 2025, 3:55 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Teniendo en cuenta que no se recibió confirmación de la visita de la cual se había hablado para la sede del Yarí y que surgieron eventualidades urgentes de atender en las otras sedes; se solicita amablemente posponer dicha visita para el día viernes en horas de la tarde.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente.

INVERSIONES G Y S SAS

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 28 de enero de 2025, 4:51 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 28 de Enero de 2025

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de posponer visita de obra para sede el Yarí

Cordial saludo,

Mediante el presente trasladamos solicitud del contratista INVERSIONES GYS SAS para reprogramar la visita a la sede el Yarí para este viernes 31 de enero de 2025 a las 2:00pm.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024
[Texto citado oculto]
--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud De Ingreso Visita Tecnica - Sede Acacias

3 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 2:08 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,


Con el fin de realizar el levantamiento y las mediciones de área para la actividad de la fachada en la sede de Acacias solicitamos amablemente su colaboración para que el día 24 de enero de 2025 se realice esta visita técnica.

1. RICARDO MARTINEZ CC 79951285
2. ALEXANDER ALVAREZ CC 72223508

Remitimos ARL de las personas para visita.

Agradecemos su atención brindada.
ARL RICARDO MENDEZ.pdf
(540 K)ARL ALEXANDER ALVAREZ.pdf
(542 K)ANTECEDENTES ALEXANDER ALVAREZ.pdf
(291 K)ANTECEDENTES RICARDO MENDEZ.pdf
(291 K)

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 23 de enero de 2025, 3:28 p.m.
Para: INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>



Buenas tardes,

Por favor reenviar correo porque no están adjuntos correctamente los documentos de ARL.
[Texto citado oculto]
--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 6:09 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Mil disculpas.

[Texto citado oculto]

---

2 archivos adjuntos

ARL ALEXANDER ALVAREZ.pdf
542K

ARL RICARDO MENDEZ.pdf
540K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

DOCUMENTOS ADICIÓN Y PRÓRROGA OBRA

2 mensajes

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 5:30 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

18 archivos adjuntos

1.2 FACHADA Acacias Exportación..pdf
138K

1.1 Certificado PVC.pdf
307K

0. CI-6703345-2024 AVAL ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA.pdf
275K

0. CI-6703345-2024 AVAL ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA.docx
131K

2. 2024-11-26 PRGRAMACIONES 3 SEDES COMODATO PARA PRORROGA Y ADICION.pdf
411K

3. 2024-12-09 PROGRAMACION GRANADA - PRORROGA 1.pdf
276K

3. 2024-12-06 PROGRAMACION ACACIAS - PRORROGA 1.pdf
455K

3. 2024-12-06 - PROGRAMACION PUERTO RICO - PRORROGA 1.pdf
375K

4.1. CERTIFICADO DE DISCAPACITADO .pdf
394K

4. Informe de Interventoría a Obra ADICIÓN Y PRÓRROGA.pdf
4769K

4. Informe de Interventoría a Obra ADICIÓN Y PRÓRROGA.docx
4422K

1. JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA CONTRATO CONSTRUCCIÓN 42 contrato CO1PCCNTR6698166.docx
115K

0. ALSS SOLICITUD DE ADICION VALOR 1 Y PRORROGA EN TIEMPO 1 contrato CO1PCCNTR6698166.docx
7353K

1.JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN 44 - contrato CO1PCCNTR6698166.docx
215K

3. 2024-11-29 PRESUPUESTOS PARA ADICION 3 SEDES COMODATO - TRIBUNAL.pdf
294K

3. 2024-11-29 PRESUPUESTOS PARA ADICION 3 SEDES COMODATO.xlsx
295K

3. PRESUPUESTO SEDE EL CALVARIO.pdf
102K

3. PRESUPUESTO SEDE EL YARÍ.pdf
101K

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 9 de enero de 2025, 9:50 a.m.
Para: "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>

[Texto citado oculto]

---

18 archivos adjuntos

1.2 FACHADA Acacias Exportación..pdf
138K

1.1 Certificado PVC.pdf
307K

0. CI-6703345-2024 AVAL ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA.pdf
275K

0. CI-6703345-2024 AVAL ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA.docx
131K

2. 2024-11-26 PRGRAMACIONES 3 SEDES COMODATO PARA PRORROGA Y ADICION.pdf
411K

3. 2024-12-09 PROGRAMACION GRANADA - PRORROGA 1.pdf
276K

3. 2024-12-06 PROGRAMACION ACACIAS - PRORROGA 1.pdf
455K

3. 2024-12-06 - PROGRAMACION PUERTO RICO - PRORROGA 1.pdf
375K

4.1. CERTIFICADO DE DISCAPACITADO .pdf
394K

4. Informe de Interventoría a Obra ADICIÓN Y PRÓRROGA.pdf
4769K

4. Informe de Interventoría a Obra ADICIÓN Y PRÓRROGA.docx
4422K

1. JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA CONTRATO CONSTRUCCIÓN 42 contrato CO1PCCNTR6698166.docx
115K

0. ALSS SOLICITUD DE ADICION VALOR 1 Y PRORROGA EN TIEMPO 1 contrato CO1PCCNTR6698166.docx
7353K

1.JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN 44 - contrato CO1PCCNTR6698166.docx
215K

3. 2024-11-29 PRESUPUESTOS PARA ADICION 3 SEDES COMODATO - TRIBUNAL.pdf
294K

3. 2024-11-29 PRESUPUESTOS PARA ADICION 3 SEDES COMODATO.xlsx
295K

3. PRESUPUESTO SEDE EL CALVARIO.pdf
102K

3. PRESUPUESTO SEDE EL YARÍ.pdf
101K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

INFORMES MENSUALES INTERVENTORÍA N°1 Y N°2

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 8 de enero de 2025, 9:50 a.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

INFORME MENSUAL No.1 SEPTIEMBRE.zip

INFORME MENSUAL No.2 OCTUBRE.zip

INFORME MENUSAL No.1 INTERVENTORIA UNIFICADO.pdf

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

INFORMES MENSUALES OBRA N°1, N°2 Y N°3

1 mensaje

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 7 de enero de 2025, 6:48 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1. 2024-09 INFORME 1 - V2.pdf

2024-10-31 INFORME 2.pdf

INFORME 3.zip

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

9.6 CORRESPONDECIA RECIBIDA

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio OFC- GYS -CJSVCIO - 077. Respuesta a Solicitud de Cumplimiento SG-SST

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 21 de enero de 2025, 8:41 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio de la presente remitimos respuesta a el oficio en cuestión

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente
INVERSIONES GYS S.A.S

21-01-2025 CSJVCIO. Oficio 077.pdf
374K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

CI-6703345-2024-117 SOLICITUD DEL CUMPLIMIENTO DE SG-SST

2 mensajes

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 20 de enero de 2025, 10:49 p.m.
Para: "inversionesgys2011@gmail.com" <inversionesgys2011@gmail.com>, "judicaturavillavicenciogys@gmail.com" <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 20 de Enero de 2025

CI-6703345-2024-117

Señores:
INVERSIONES GYS S.A.S
Atn. Nelson Enrique Gómez García
Representante legal
inversionesgys2011@gmail.com
judicaturavillavicenciogys@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

CI-6703345-2024-117 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST.pdf
11231K

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 21 de enero de 2025, 10:06 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Buenos dia ingenieros

De manera atenta se indica que se han entregado dotación al personal, y que desafortunadamente no lo utilizan por cuestiones culturales alegando que no se acostumbran al casco y demás.
De todas maneras el contratista acepta su solicitud y seguirá implementando campañas de concientización . Se indica que desde ya se están tomando los respectivos correctivos.
[Texto citado oculto]

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Entrabamiento y no respuesta para retiro de aires y condensadoras.

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 6 de enero de 2025, 11:53 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>
CC: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día ingenieros:

Con la dinámica de poder entregar las oficinas de juzgados de la sede de Granada para el dia 12 de enero, la empresa INVERSIONES G Y S SAS, a pesar de la idiosincrasia de la zona de no trabajar festivos, logró que varios de sus trabajadores vinieran a laborar todos los días del puente festivo del 6 de enero.

Se había avisado a través del grupo de chat que se haría todo lo posible para trabajar en estos días por lo cual tanto la interventoría como la supervisión estaban enterados, esto con el fin de buscar colaboración y ayuda.

En el dia de hoy de hizo urgente realizar el retiro de los aires y de las condensadoras para llevarlas al taller a realizar el mantenimiento. Actividad que no fue posible realizar, dado que no fue posible obtener respuesta alguna por parte de la interventoría como tampoco de la supervisión.

Este entrabamiento, conlleva a dos días de retraso en la actividad de los aires que es una actividad precedente para poder instalar el cielo raso.

Así las cosas, para la empresa INVERSIONES G Y S SAS, es imposible realizar entrega de las áreas el día 12 de enero. conlleva al menos dos días más por los percances mencionados, dado que el técnico manifestó se ocupará con otro cliente.

Cordialmente
Arq. Nelson Gomez
Director de obra

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Entrega Juzgado Promiscuo de Famila Sede Granada

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 9:50 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

DE manera atenta solicitamos acompañamiento para realizar entrega del juzgado de faamilia sede granada

23-01-2025 CSJVCIO. Oficio 078.pdf
196K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Fichas técnicas aparatos mas pequeños

2 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 29 de enero de 2025, 2:20 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

6 archivos adjuntos

- **sanitario-manantial-ficha-tecnica.pdf** 522K
- **81. fichas tecnicas aparatos sanitarios mas pequeños sede Granada.pdf** 246K
- **694BL - Lavamanos Arezzo.pdf** 169K
- **sanitario-laguna-ficha-tecnica.pdf** 637K
- **FT-O29411001-SANITARIO-CIMA-AL-4-compressed.pdf** 604K
- **O13591001-lavamanos-varese-ficha-tecnica.pdf** 1397K

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 29 de enero de 2025, 3:14 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Respetada:
Ing. Monica Gomez
Supervisora

Cordial saludo,

Mediante el presente remitimos fichas técnicas de TRES (03) aparatos sanitarios para instalar en el baño comunitario en el primer piso de la sede Granada. La interventoría recomienda escoger la referencia Laguna, toda vez que son los de menor tamaño y se ajustan a la necesidad de optimizar el espacio al interior de las cabinas sanitarias. Por lo anterior, se pone a criterio de la entidad las dos fichas técnicas para que nos indique la especificación del sanitario que debe instalar el contratista.

Cordialmente,

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORÍA

---------- Forwarded message ---------
De: **INVERSIONES G Y S JUDICATURA** <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>
Date: mié, 29 ene 2025 a la(s) 2:20 p.m.
Subject: Fichas técnicas aparatos mas pequeños
To: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

---

6 archivos adjuntos

sanitario-manantial-ficha-tecnica.pdf
522K

81. fichas tecnicas aparatos sanitarios mas pequeños sede Granada.pdf
246K

694BL - Lavamanos Arezzo.pdf
169K

sanitario-laguna-ficha-tecnica.pdf
637K

FT-O29411001-SANITARIO-CIMA-AL-4-compressed.pdf
604K

O13591001-lavamanos-varese-ficha-tecnica.pdf
1397K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

IGYS-CSJVCIO -074. INFORME DE OBRA No. 04

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 19 de enero de 2025, 4:04 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señores:
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Atn. Ing. Jorge Rodriguez
Director de Interventoria

Respetuoso saludo,

Remitimos por este medio el oficio en asunto en el cual se adjunta el informe mensual de contratista y documentos anexos como son:

Informe SG-SST
Informe Gestion Ambiental
Informe Gestión de la Calidad
Bitácora de Obra sedes Acacias, Puerto Rico y San José del Guaviare

Estamos atentos a cualquier inquietud

INFORME 4 - Diciembre.zip

NELSON GOMEZ
INVERSIONES GYS SAS
3125464083

19-01-2025 CSJVCIO. Oficio 074.pdf
198K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

INFORME SST Y AMBIENTAL No 4.

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 9 de enero de 2025, 9:38 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señores:
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
Interventoría

Respetuoso saludo.

Con el objetivo del óptimo desarrollo del contrato, se adjunta el informe SST y ambiental No. 4. y sus anexos del periodo entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

Inversiones G Y S SAS.

INFORME SST 4.zip

INFORME AMBIENTAL 4.zip

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

No disponibilidad en el mercado de lavamanos razionales

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 29 de enero de 2025, 6:28 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Saludos señores interventoría.

Se Anexa oficio al respecto.

82. No disponibilidad en el mercado de lavamanos razionale. Sede Granada.pdf
295K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Posponer visita de obra al Yary

2 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 28 de enero de 2025, 3:55 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Teniendo en cuenta que no se recibió confirmación de la visita de la cual se había hablado para la sede del Yarí y que surgieron eventualidades urgentes de atender en las otras sedes; se solicita amablemente posponer dicha visita para el día viernes en horas de la tarde.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente.

INVERSIONES G Y S SAS

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 28 de enero de 2025, 4:51 p.m.
Para: Infraestructura Administrativa 2 - Meta - Villavicencio <infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Villavicencio, 28 de Enero de 2025

Ingeniera:
MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Coordinación Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial de Villavicencio
Calle 4D No. 22 - 58 Barrio Alborada. Conmutador Tel (08) 6701040
infra2vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024, cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL” por valor inicial de $145.160.800,00 y su plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 con Prórroga en valor de $57.111.590,00 y ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.

Asunto: Solicitud de posponer visita de obra para sede el Yarí

Cordial saludo,

Mediante el presente trasladamos solicitud del contratista INVERSIONES GYS SAS para reprogramar la visita a la sede el Yarí para este viernes 31 de enero de 2025 a las 2:00pm.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024
[Texto citado oculto]
--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de autorización de retiro de 4 aires para mantenimiento

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 6 de enero de 2025, 10:05 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo:

De manera atenta se solicita la autorización para sacar el día de hoy y llevar al taller a realizar el mantenimiento de 4 aires con sus respectivas condensadoras de la sede de Granada.
Todo con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Cordialmente
Arq. Nelson Gomez Garcia
Director de obra

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD DE DEFINICIONES DE OBRA

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 29 de enero de 2025, 9:17 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

De manera atenta se solicita dar respuesta a los planteamientos de obra de manera urgente. Esto teniendo en cuenta que el contratista sugirió soluciones y está a la espera de definiciones por parte de la entidad.

Se debe entender que la falta de definición causa al contratista retrasos en la programación y cumplimiento de fechas.

Se espera respuesta urgente de:
1. baños piso 1 Granada . (Las divisiones de baño se deben solicitar de Bogotá y la elaboración requiere tiempo)
2 Ubicación de condensadoras de los aires en la sede de tribunales de San José.
3. Se solicita indicar la fecha en que la interventoría reciba la oficina del juzgado de familia piso 2 en la sede de Granada.
Recordar que el avance de las redes sanitarias del set de baños del piso 2 depende de la disponibilidad de la sala de audiencias del piso 1 para poder realizarlas por el cielo raso de esa área.

Cordialmente.

Arq. Nelson Gomez

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud De Ingreso Visita Tecnica - Sede Acacias

3 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 2:08 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,


Con el fin de realizar el levantamiento y las mediciones de área para la actividad de la fachada en la sede de Acacias solicitamos amablemente su colaboración para que el día 24 de enero de 2025 se realice esta visita técnica.

1. RICARDO MARTINEZ CC 79951285
2. ALEXANDER ALVAREZ CC 72223508

Remitimos ARL de las personas para visita.

Agradecemos su atención brindada.
ARL RICARDO MENDEZ.pdf
(540 K)ARL ALEXANDER ALVAREZ.pdf
(542 K)ANTECEDENTES ALEXANDER ALVAREZ.pdf
(291 K)ANTECEDENTES RICARDO MENDEZ.pdf
(291 K)

Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com> 23 de enero de 2025, 3:28 p.m.
Para: INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com>



Buenas tardes,

Por favor reenviar correo porque no están adjuntos correctamente los documentos de ARL.
[Texto citado oculto]
--
Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Contrato de Interventoría No.6703345 DE 2024

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 6:09 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Mil disculpas.

[Texto citado oculto]

---

2 archivos adjuntos

ARL ALEXANDER ALVAREZ.pdf
542K

ARL RICARDO MENDEZ.pdf
540K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de realización de obras previas por parte de la entidad

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 15 de enero de 2025, 5:42 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

De manera atenta se envía solicitud.

66. Solicitud de realizacion de obras previas por parte de la entidad en la sede Calvario Meta. docx.pdf
200K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud ingreso a laborar durante las 24 horas. - SEDE ACACIAS

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 9 de enero de 2025, 2:28 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que el plazo de terminación de las obras es relativamente corto y previendo un posible atraso de actividades frente a lo proyectado en la programación, solicitamos amablemente autorización para el ingreso a laborara en la sede durante las 24 horas. Esta solicitud está motivada para prevenir atrasos y extender las jornadas de trabajo en los diferentes frentes de cada uno.

cordialmente

Inversiones GYS SAS

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO PERSONAL SEDE ACACIAS

2 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 15 de enero de 2025, 8:27 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,

Amablemente solicitamos su colaboración para el ingreso de personal en la sede ACACIAS agradecemos su atención brindada.

Remitimos documentación del personal

Estamos atentos a sus comentarios.

YERSON SANTAMARIA.zip
3203K

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 20 de enero de 2025, 12:04 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

[Texto citado oculto]

YERSON SANTAMARIA.zip
3203K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO PERSONAL SEDE ACACIAS

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 27 de enero de 2025, 2:42 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,

Amablemente solicitamos su colaboración para el ingreso de personal en la sede ACACIAS agradecemos su atención brindada.

Remitimos documentación del personal

Estamos atentos a sus comentarios.

2 archivos adjuntos

RODOLFO VARGAS.zip
3037K

DIEGO HERRERA.zip
8550K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO PERSONAL SEDE ACACIAS

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 4 de enero de 2025, 1:38 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,

Amablemente solicitamos su colaboración para el ingreso de personal en la sede ACACIAS agradecemos su atención brindada.

Remitimos documentación del personal

Estamos atentos a sus comentarios.

2 archivos adjuntos

HENRY FORERO.zip
4850K

MARISOL AGUILERA.zip
10710K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO SEDE GRANADA

2 mensajes

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 17 de enero de 2025, 7:58 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,

Amablemente solicitamos su colaboración para el ingreso de estas personas para las tareas de limpieza en la sede de Granada, agradecemos su atención brindada.

Estamos atentos a sus comentarios.

ARL NOHORA.pdf
540K

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 20 de enero de 2025, 12:03 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

[Texto citado oculto]

ARL NOHORA.pdf
540K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO SEDE GRANADA

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 20 de enero de 2025, 7:04 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,

Amablemente solicitamos su colaboración para el ingreso de estas personas para las tareas de limpieza en la sede de Granada, agradecemos su atención brindada.

Estamos atentos a sus comentarios.

ARL ERIKA ANGARITA ENERO 20.pdf
609K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO SEDE GRANADA

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 10 de enero de 2025, 9:43 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo,

Amablemente solicitamos su colaboración para el ingreso de estas personas para las tareas de limpieza en la sede de Granada, agradecemos su atención brindada.

Estamos atentos a sus comentarios.

2 archivos adjuntos

ARL ERİKA ANGARİTA ENE 25.pdf
563K

ARL AURORA JARA ENE 25.pdf
662K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio GYS-CSJVCIO-068 Remisión de planos eléctricos ajustados redes P2 edificio tribunales incluye iluminación

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 10 de enero de 2025, 10:46 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señores: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Señores:
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría del Contrato CO1.PCCNTR.6698166
Atn. Ing. Jorge Augusto
Director de Obra

Cordial saludo

Remitimos adjunto al presente el oficio en asunto y los planos en autocad con los ajustes eléctricos a realizar en redes normales, reguladas, datos y de iluminación, conforme a lo establecido en comite de obra del 7 de enero de 205, pasado.

Agradecemos su atención

2 archivos adjuntos

2025-01-08 TOMAS TRIBUNALES SJG V2-Model.pdf
136K

2025-01-08 REDES TRIBUNALES SJG inc ilum.dwg
452K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de especificaciones técnicas para mesones de lavamanos.

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 15 de enero de 2025, 5:37 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

De manera atenta se envía solicitud.

68. Solicitud de especificacion tecnica y diseños de mesones para lavamanos docx.pdf
195K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

IGYS CSJVCIO-070 Diseño sistema de conducción de aguas lluvias de sede judicial de puerto rico

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 15 de enero de 2025, 6:25 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Granada, enero 15 de 2025

IGYS CSJVCIO-070

Señor:
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
Atn. Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Director de Interventoría

Ref. Contrato No CO1.PCCNTR.6698166 cuyo Objeto es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"

Asunto: Diseño sistema de conducción de aguas lluvias de sede judicial de puerto rico

Respetado ingeniero:

Por medio de la ´presente, me permitió remitir el diseño del sistema de conducción de aguas lluvias correspondiente al costado occidental de la sede judicial de Puerto Rico. Dicho diseño consiste en una canal que permite el direccionamiento del agua a través de dos bajantes de 4", los cuales están ubicados en los costados norte y sur.

Estas bajantes se conectarán a un cárcamo, con dimensiones de 0.50 x 0.40 m y una longitud de 6.40 m. El cárcamo, a su vez, se enlazará con la red de sifones del patio, mediante un ducto de 4", asegurando la correcta evacuación del agua hacia el sistema de drenaje correspondiente.

IGYS-CSJVCIO-70.pdf
446K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de especificaciones y diseños para espejos de baños

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 15 de enero de 2025, 6:26 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo ingenieros:

De manera atenta se envía solicitud

71. solicitud de especificaciones y diseño de espejos para baños sede Granada.pdf
196K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

IGYS-CSJVCIO-072 RELACIÓN LUMINARIAS ENTREGADAS

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 17 de enero de 2025, 3:16 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

Adjuntamos la relación de luminarias LED (0,60 x 0,60) entregadas, destinadas a las sedes correspondientes. Agradecemos confirmar la fecha de entrega de las luminarias faltantes en la sede Tribunal de San José para programar las actividades pendientes.

Quedamos atentos

Cordialmente
INVERSIONES GYS S.A.S

17-01-2025 CSJVCIO. Oficio 072.pdf
202K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Espacios reducido en baños piso 1 sede Granada.

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 17 de enero de 2025, 11:44 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo ingenieros:

Se envía oficio pertinente.

73. Espcios reducido en baños sede Granada.pdf
241K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio OFC-GYS-CSJVCIO-075 Remision de planteamiento de redes y ubicación equipos Aire Acondicionado 2do piso Edif Tribunales SJGUAV

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 19 de enero de 2025, 4:41 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señores:
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Atn. Ing. Jorge Rodriguez
Director de Interventoria

Respetuoso saludo,

Remitimos adjunto al oficio en asunto los planos de redes de refrigerantes y ubicación de máquinas condensadoras y manejadoras de aire acondicionado del segundo Piso del edificio de tribunales de San José del Guaviare, para su respectivo proceso de aprobación y así; iniciar el montaje de elementos antes del montaje de cielo raso en pvc.

Agradecemos su atención

NELSON GOMEZ
INVERSIONES GYS SAS
3125464083

2 archivos adjuntos

2025-01-19 OFC GYS 75 - INTERV - CSJ Remision de planos lineas refrigerantes y equipos AC 2do piso edif tribunales SJGUAV.docx.pdf
240K

2025-01-19 PLANO REDES REFRIGERANTE CU 2DO PISO TRIBUNALES SJGUAV.dwg
318K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio OFC - GYS -CJSVCIO - 076 Remisión Manual de mantenimiento Cubierta Acacias

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 20 de enero de 2025, 6:48 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

De acuerdo con nuestras obligaciones en el presente contrato, remitimos manual de mantenimiento para cubierta con manto asfaltico en sede acacias

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente;
INVERSIONES GYS

20-01-2025 CSJVCIO. Oficio 076.pdf
209K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud para laborar en parqueaderos actividad impermeabilización fachada

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 9:35 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Buen dia ing.

De manera atenta y con el fin de cumplir tiempos de entrega, se solicita permiso.

79. Solicitud para ocupar parquederos en actividad de lavado de fachada sede Granada.pdf
196K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

IGYS-CSJVCIO-068 Reiteración Entrega Luminarias

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 13 de enero de 2025, 2:12 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señor:
JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
Atn. Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Director de Interventoría

Ref. Contrato No CO1.PCCNTR.6698166 cuyo Objeto es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"

Asunto: Reiteracion entrega luminarias

13-01-2025 CSJVCIO. Oficio 068.pdf
201K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio GYS-CSJ-079 Remision de muestras digitales para color y referencia a definir para guarda escoba edificio tribunales de justicia SJGuav.

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 23 de enero de 2025, 3:56 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señor:
Ing. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Contrato Electrónico CO1.PCCNTR.6703345 de 2024.
Interventor del contrato

Remitimos el oficio en asunto el cual contiene las muestras digitales de alterbativas de color para la instalacion de guardaescobas en el area de segundo piso del edificio de Tribunales de Justicia de San Jose del Guaviare, para su concepto y definición.

Agradecemos su atención

NELSON GOMEZ
INVERSIONES GYS SAS
3125464083

2025-01-23 OFC GYS 75 - INTERV - CSJ Remision de muestras digitales colores gescobas SJGuav tribunales.pdf
284K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio GYS-CSJVCIO-081 Solicitud de la Interventoría de entrega de Programaciones detalladas de obras en sedes El Calvario y El Yari

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 26 de enero de 2025, 12:02 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Señor:
Ing. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Contrato Electrónico CO1.PCCNTR.6703345 de 2024.
Interventor del contrato

Respetuoso saludo,

Por medio del presente correo, se remite el oficio en asunto en el que se da respuesta a la solicitud de interventoría generada por el oficio CI-6703345-2024-126

Cordialmente

NELSON GOMEZ
INVERSIONES GYS SAS
3125464083

2025-01-25 OFC GYS 81 - INTERV - CSJ Solictud entrega programacion detallada sedes El calvario y El yari.docx.pdf
234K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio GYS-CSJUD-083 Respuesta Solicitud esquema sobre luminarias entregadas por la entidad.

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 29 de enero de 2025, 10:38 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta damos respuesta a su solicitud, de esquema de luminarias instaladas en cada una de las sedes

3 archivos adjuntos

29-01-2025 CSJVCIO. Oficio 083.pdf
499K

Acta entreg paneles ofic Juzg 2 civil municipal Acaci.pdf
406K

Acta entreg paneles ofic Juzg 2 civil municipal Acaci.pdf
406K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Oficio GYS- CSJUD-084 - Entrega Sede Judicial Puerto Rico

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 30 de enero de 2025, 9:55 a.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta remitimos solicitud de acompañamiento para entrega de sede judicial Puerto Rico.

Cordialmente
INVERSIONES GYS SAS

30-01-2025 CSJVCIO. Oficio 084.pdf
198K

Gmail Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Solicitud de ingreso a juzgados en sede Granada

1 mensaje

INVERSIONES G Y S JUDICATURA <judicaturavillavicenciogys@gmail.com> 15 de enero de 2025, 5:32 p.m.
Para: Interventoria Rama Judicial <interventoriaramajudicial@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta se envía solicitud.

69. Solicitud de ingreso a juzgado promiscuo 1 y juzgado promiscuo 2 Sede Granada. docx.pdf
196K

9.7 BITACORA DE OBRA

ANEXO 3 BITACORA 01 ENERO A 31 DE ENERO DEL 2025

Calle 152 # 55 A – 10 Tor 2 Apto 1201 – Bogotá D.C
Teléfonos: 3142759244 – 3125464083
NIT:830 083 258-1
Email: inversionesgys2011@gmail.com

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	SEDE JUDICIAL DE PUERTO RICO - META
Fecha:	1/01/2025
Estado Del Tiempo:	N/A

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Actividades Del Dia

1. No se labora, dia festivo
2.
3
4
5
6
7

Compromisos Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - Contratista:

1
2
3

Compromisos Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - Supervision

1
2

Observaciones Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	SEDE JUDICIAL DE PUERTO RICO - META
Fecha:	2/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Actividades Del Dia

1. Resanes lineales pañete muros exteriores corredor hacia patio posterior
2. Instalación estructura para muros dry wall
3 Instalacion de tapas dry wall y frescaza
4
5
6
7

Compromisos Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - Contratista:

1
2
3

Compromisos Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - Supervision

1
2

Observaciones Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	SEDE JUDICIAL DE PUERTO RICO - META
Fecha:	3/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Actividades Del Dia

1. Inicio aplicación de estucos en muros resanados area recepcion atencion al ususario
2. Instalación estructura para muros dry wall
3 Instalacion de tapas dry wall y frescaza
4
5
6
7

Compromisos Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - Contratista:

1
2
3

Compromisos Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - Supervision

1
2

Observaciones Sede de Justicia de Puerto Rico Meta - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	4/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Se recibe especificaciones de aparatos sanitarios para instalacion en baños
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se inicia con la instalacion de drywall de techo, sala de audencias

se inicia pintura de muros

se inicia con instalacion de estructura de cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	5/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro, Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	6/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continia con la instalacion de pvc de techo, sala de audencias

se continua con pintura de muros
se continua con instalacion de estructura de cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	7/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continia con la instalacion de pvc de techo, zona de ingreso

se continua con pintura de muros
se continua con instalacion de estructura de cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	8/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se termina con la instalacion de pcv de techo, pasillo principal
se continua con pintura de muros
se continua con instalacion de estructura de cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	9/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se termina con la instalacion de pcv de techo, sala de audencias
se continua con pintura de muros
se continua con instalacion de estructura de cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	10/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.

3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

Se termina con la instalacion de pcv de techo, sala de audencias

se continua con pintura de muros

se continua con instalacion de estructura de cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	11/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se realiza jornada de aseo

2. se continua con pintura de cielo raso en pasillo frente a baños piso 4

Se termina con la instalacion de pcv de techo, sala de audencias

se continua con pintura de muros

se continua con instalacion de estructura de cielo raso zona de pasillo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	12/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	13/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

se inicia instalacion de muros en drywall oficina de juez

se continua con pintura de muros

se continua con instalacion de estructura de cielo raso zona de pasillo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	14/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se inicia instalacion de salidas de iluminacion
se continua con pintura de muros
se inicia instalacion de marcos de luminarias

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	15/01/2025
Estado Del Tiempo:	

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua instalacion de salidas de iluminacion
se continua con pintura de muros
se continua instalacion de marcos de luminarias

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	16/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua instalacion de salidas de iluminacion

se continua con pintura de muros

se continua instalacion de marcos de luminarias

se inicia masillado de muros de drywall

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	17/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.



Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

se continua instalacion de salidas de iluminacion
se continua con pintura de muros
se continua instalacion de marcos de luminarias

se inicia masillado de muros de drywall

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

	
Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	
Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	18/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua instalacion de salidas de iluminacion
se continua con pintura de muros
se continua instalacion de marcos de luminarias

se inicia masillado de muros de drywall

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	19/01/2025
Estado Del Tiempo:	Lluvioso

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro, Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	20/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

se inicia instalacion de caneta

se realiza maniobra de desconeccion de la red principal a tablero principal
se inicia con instalacion de salidas de tomas

se inicia instalacion de canaleta metalica

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	21/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continia con instalacion de caneta

se continua con instalacion de salidas de tomas

se continua instalacion de canaleta metalica

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	22/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de salidas de tomas

se continua instalacion de canaleta metalica

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	23/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.

3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de salidas de tomas
se continua instalacion de canaleta metalica

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	24/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de salidas de tomas
se continua instalacion de canaleta metalica

se realiza recorrido con interventoria,

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	25/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

Se realiza jornada de aseo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	26/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro. Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	27/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se realiza instalacion de braker
Se realiza jornada de aseo
se realiza instalacion de aire acondionado, sala de rack

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	28/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: Lluvia Fuerte

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se inicia excavacion para carmo en patio

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	29/01/2025
Estado Del Tiempo:	

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continua con excavacion para carmo en patio

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	30/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continua con excavacion para carmo en patio

se hace solado para solado

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA PUERTO RICO
Fecha:	31/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se termina con excavacion para carmo en patio
se termina solado para solado

actividades de instalacion de puntos fueron culmindas

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	1/01/2025
Estado Del Tiempo:	no aplica-festivo

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.
2.
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	2/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Desmonte de cableado UTP segundo piso
2. Mamposteria Bloque # 4 Para cofre exterior centro de medida electrica
3. Pañete impermeabilizado 1:4 muros culatas

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	3/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Conexiones a tablero para posterior solictud de permiso a empresa de energia para conexión a transformador
2. Regatas en muros para redes desague aires
3. Resanes de muros

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	4/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Conexiones a tablero para posterior solictud de permiso a empresa de energia para conexión a transformador
2. Regatas en muros para redes desague aires
3. Resanes de muros

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	5/01/2025
Estado Del Tiempo:	N/A DIA FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.
2.
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	6/01/2025
Estado Del Tiempo:	N/A DIA FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.
2.
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	7/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Conexiones a tablero para posterior solictud de permiso a empresa de energia para conexión a transformador
2. Regatas en muros para redes desague aires
3. Resanes de muros

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	8/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Conexión de acometida nueva electrica a transformador, cofre de medida realziada por EnerGuaviare
2. Instalación de medidor existente en cofre de medida nuevo exterior
3. Resanes de muros

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	9/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Conexión de acometida desde centro de medida a tablero nuevo TGD en cuarto electrico
2. Instalación de cubierta tipo sandwich
3. Resanes de muros en pañete y estuco

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	10/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Conexión de acometida desde centro de medida a tablero nuevo TGD en cuarto electrico
2. Instalación de cubierta tipo sandwich
3. Resanes de muros en pañete y estuco

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	11/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Armado de tablero TGD y conexión de red potencia electrica, limpieza primer piso
2. Instalación de cubierta tipo sandwich
3. Resanes de muros en pañete y estuco

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	12/01/2025
Estado Del Tiempo:	N/A DIA FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.
2.
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	13/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Instalación de tuberia electrica EMT diferentes diametros
2. Instalacion de mamposteria muros bloque # 4
3. Resanes de muros en pañete y estuco

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	14/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Instalación de tuberia electrica EMT diferentes diametros
2. Instalacion de mamposteria muros bloque # 4
3. Instalacion de puntos hidraulicos para baños comunes y magistrados

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	15/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. se solicito aprobacion al Contratante para retiro de elementos desmontados de cubierta y cielo raso edificio de tribunales
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Instalación de tuberia electrica EMT diferentes diametros
2. Pañete interior muros Eje D entre 3-4
3. Instalacion de puntos hidraulicos para baños comunes y magistrados

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	16/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Retiro de elementos RCD de obra previs autorización del contratante
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Aplicación pintura T1 Primera mano muros interiores

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	17/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Resanes de regatas en mortero 1:4
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Aplicación pintura T1 Primera mano muros interiores

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Cambio de meson en granito de centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	18/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Resanes de regatas en mortero 1:4
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Instalacion red hidraulica acometida para baños 2do piso

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Demolicion muro en maposteria soporte original antiguo meson centro servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	19/01/2025
Estado Del Tiempo:	N/A DIA FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.
2.
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	20/01/2025
Estado Del Tiempo:	NUBLADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Estuco en muro de resanes de regatas
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Instalacion red hidraulica acometida para baños 2do piso

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalacion muro en drywall doble cara

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	20/01/2025
Estado Del Tiempo:	NUBLADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Base para placa contrapiso base tanques en placa cubierta ejes B-C entre 4-5

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalacion muro en drywall doble cara

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	22/01/2025
Estado Del Tiempo:	SOLEADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Recorrido de sedes en intervención con supervision del contrato e interventoria

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalacion muro en drywall doble cara

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	23/01/2025
Estado Del Tiempo:	NUBLADO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Instalacion de flanches en lamina Glav C 20 en remate superior y remtes contra cubiertas predios vecinos

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalacion muro en drywall doble cara

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	24/01/2025
Estado Del Tiempo:	LLUVIAS EN NTRE 2:00 PM HASTA LAS 5:30 PM

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Detallado de estuco filos ventanas y lijado y repaso detalles

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalacion muro en drywall doble cara

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	24/01/2025
Estado Del Tiempo:	LLUVIAS EN TODO EL DIA DIFERENTES INTENSIDADES

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Suspender porceso de BALL en eje C entre 4-5
2. No inicra con proceso de redes refrigerentes sistema Aires hasta definir ubicación definitiva equipos
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Instalacion de redes electricas tuberia EMT diferentes diametros
3. Detallado de estuco filos ventanas y lijado y repaso detalles

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalacion muro en drywall doble cara

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	26/01/2025
Estado Del Tiempo:	N/A DIA FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.
2.
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	27/01/2025
Estado Del Tiempo:	LLUVIAS EN TODO EL DIA DIFERENTES INTENSIDADES

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Suspender porceso de BALL en eje C entre 4-5
2. No iniciar con proceso de redes refrigerentes sistema Aires hasta definir ubicación definitiva equipos
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Cableado redes iluminación 2do piso (cable # 12 2F + 1 N)
3.

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- detallado de muro en drywall, estuco y lijado

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	28/01/2025
Estado Del Tiempo:	LLUVIAS EN TODO EL DIA DIFERENTES INTENSIDADES

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Suspender porceso de BALL en eje C entre 4-5
2. No iniciar con proceso de redes refrigerentes sistema Aires hasta definir ubicación definitiva equipos
3.

Eventualidades Del Dia

1. Pintura Vinilo T1 segunda mano en muros interiores
2. Cableado redes iluminación 2do piso (cable # 12 2F + 1 N)
3. Instalacion canaleta metalica en muros oficinas 2do piso

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Fundida de grano pulido en sitio donde se demolio antiguo muro soporte primer meson instalado

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	29/01/2025
Estado Del Tiempo:	LLUVIAS TENUES CONTINUAS EN TODO EL DIA

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Suspender porceso de BALL en eje C entre 4-5
2. No iniciar con proceso de redes refrigerentes sistema Aires hasta definir ubicación definitiva equipos
3.

Eventualidades Del Dia

1. cableado Puntos electricos Normal y regulados en canaleta (3F + 1N)
2. Cableado redes iluminación 2do piso (cable # 12 2F + 1 N)
3. Instalacion canaleta metalica en muros oficinas 2do piso

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Fundida de grano pulido en sitio donde se demolio antiguo muro soporte primer meson instalado

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	30/01/2025
Estado Del Tiempo:	LLUVIAS INTENSAS EN LA MAÑANA

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Suspender porceso de BALL en eje C entre 4-5
2. No iniciar con proceso de redes refrigerentes sistema Aires hasta definir ubicación definitiva equipos
3.

Eventualidades Del Dia

1. cableado Puntos electricos Normal y regulados en canaleta (3F + 1N)
2. Cableado redes iluminación 2do piso (cable # 12 2F + 1 N)
3. Instalacion CABLEADO utp cat 6a EN CANALETA

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1- Instalación de meson en granito negro San Gabriel oficina centro de servicios

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
	SEDE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha:	31/01/2025
Estado Del Tiempo:	NUBLADO EN LA MAÑANA SOLEADO EN LA TARDE

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Suspender porceso de BALL en eje C entre 4-5
2. No iniciar con proceso de redes refrigerentes sistema Aires hasta definir ubicación definitiva equipos
3.

Eventualidades Del Dia

1. cableado Puntos electricos Normal y regulados en canaleta (3F + 1N)
2. Enchape de muros baños magistrados formato 60*30 color blanco plana brillante
3. Instalacion CABLEADO utp cat 6a EN CANALETA

Compromisos SJGuav Palacio Justicia- Contratista:

1-

Compromisos SJGuav Sede Tribunales- Contratista:

1-
2-
3-

Compromisos SJGuav Palacio Justicia - Supervision

1

Observaciones SJGuav Palacio Justicia - interventoria

1-

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorgue Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	1/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. Remision De Corte De Obra No.01
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	2/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. Remision de Lsitado de Personal Por Sede
2. Corte de Puerto Rico
3. Solicitud para autorizacion de ingreso Juzgado
4. Entrega área intervenidas terminadas día sábado 7 de diciembre
5. Oficio GYS-CSJVCIO-056 Remisión Informe Mensual No 3 del Contratista

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

- Se continua con instalacion de estructura para teja tipo sandwinch
- Se continua con nivelacion y pañete de muros para enchape de muro y piso en baños
- Se continua con aplicación de estuco plastico en muros
- Se continua con actividad de pañete impermeabilizado
- Se continua con desmonte de cubierta, se revisan pendientes de cubierta
- Se continua con instalacion de cubierta, se revisan pendientes de cubierta
- Se continua con la instalacion de estructura para cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	3/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. SOLICITUD INGRESO VISITA TECNICA - ACACIAS
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

- Se continua con instalacion de estructura para teja tipo sandwinch

- Se continua con nivelacion y pañete de muros para enchape de muro y piso en baños

- Se continua con aplicación de estuco plastico en muros

- Se continua con actividad de pañete impermeabilizado

- Se continua con desmonte de cubierta, se revisan pendientes de cubierta

- Se continua con instalacion de cubierta, se revisan pendientes de cubierta

- Se continua con la instalacion de estructura para cielo raso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	4/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Se recibe especificaciones de aparatos sanitarios para instalacion en baños
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se realiza instalacion de cieo raso en juzgado de familia

2. Se realiza instalacion de muro divisorio entre el juzgado primero y juzgado segundo

3. se continua con el adelanto de actividades a el interior de las oficinas, como pintura, instalacion de tapas

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	5/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro, Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	6/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se Retiran aires acondicionados, para realizar mantenimiento correspondiente
2. Se Realiza instalacion enchape de piso en baño juez promiscuo primeroo municipal
3. Se finaliza la instalacion de red de circuito normal y regulado, para juzgado de familia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	7/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se continua con instalacion de enchape
2. Alistado de piso para baño juez promiscuo segundo municipal
3. Se realiza instalacion de flanches

4. Se continua con instalacion de cielo raso en juzgado primero y segundo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	8/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se continua con instalacion de enchape
2. Alistado de piso para baño juez promiscuo segundo municipal
3. Se realiza instalacion de flanches
4. Se continua con instalacion de cielo raso en juzgado primero y segundo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	9/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se continua con instalacion de enchape
2. Alistado de piso para baño juez promiscuo segundo municipal
3. Se realiza instalacion de flanches
4. Se continua con instalacion de cielo raso en juzgado primero y segundo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	10/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.

3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. Finalizacion de instalaccion de cielo raso en Pvc blanco brillante de la oficina juzgado segundo promiscuo
2. Se finaliza enchapado de baño de juez juzgado segundo del promiscuo

3. Se reitera a la supervision y a interventoria la entrega de paneles led para realizar instalacion

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	11/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se realiza instalacion de marcos para luminarias, panel led 0,60 x 0,60
2. Se realiza pintura de guarda escoba negro
3. se aplica ultima capa de pintura sobre muros

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	12/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

- Se realiza jornada de aseo para entrega de despacho promiscuo primero y juzgado segundo
- Se continua con actividades de acabados de pintura
- Instalacion de luminarias panel led 0,60 x 0,60

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	13/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

- Se Realiza entrega de juzgado promiscuo municipal primero y segundo

- La interventoria realiza acta de entrega de espacios, en la cual queda pendiente enboquillado de cornisa, instalacion de puertas de madera, innstalacion de muebles de baño y espejo

- Se realiza traslado de mobiliario de juzgados entregados

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	14/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con actividades en juzgado de familia, acabados de obra blanca
- Se inicia enchape de baños de juzgado de familia
- Se continua con instalacion de cielo raso juzgafo de familia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	15/01/2025
Estado Del Tiempo:	

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con actividades en juzgado de familia, acabados de obra blanca
- Se inicia enchape de baños de juzgado de familia

- Se continua con instalacion de cielo raso juzgafo de familia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	16/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con actividades en juzgado de familia, acabados de obra blanca

- Se inicia enchape de baños de juzgado de familia

- Se continua con instalacion de cielo raso juzgafo de familia

- Se realiza la instalacion de equipos de aire acondicionado

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	17/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.



Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

- Se continua con actividades en juzgado de familia, acabados de obra blanca
- Se inicia enchape de baños de juzgado de familia
- Se continua con instalacion de cielo raso juzgafo de familia

- Se realiza la instalacion de equipos de aire acondicionado

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

	
Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	
Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	18/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con actividades en juzgado de familia, acabados de obra blanca
- Se inicia enchape de baños de juzgado de familia
- Se continua con instalacion de cielo raso juzgafo de familia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	19/01/2025
Estado Del Tiempo:	Lluvioso

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro, Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	20/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con actividades en juzgado de familia, acabados de obra blanca
- Se inicia enchape de baños de juzgado de familia
- Se continua con instalacion de cielo raso juzgado de familia
- Se realiza la instalacion de equipos de aire acondicionado

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	21/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se realizan resanes de cronisa del juzgado 001 y 002 promiscuo municipal
- Finalizó enchape del baño del juez de familia del circuito

- Finalizó instalación de cielo raso en PVC

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	22/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

-Se Realiza jornada de aseo para entrega de juzgado

- Se inicia lavado de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	23/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.

3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se realiza instalacion de divisiones de baño segundo piso
Lavado de fachada en parte trasera el juzgado
se realiza instalacion de lamina de drywall en cielo raso, en sala de reuniones primer piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	24/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se realiza instalacion de divisiones de baño segundo piso

Lavado de fachada en parte trasera el juzgado

se continua con instalacion de lamina de drywall en cielo raso, en sala de reuniones primer piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	25/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

Se realiza instalacion de divisiones de baño segundo piso
Lavado de fachada en parte trasera el juzgado

reparacion de drywall en cielo raso, en sala de reuniones primer piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	26/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro. Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	27/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con lavado de fachada
- se realiza instalacion de frescaza en juzgado 004
- Se continua con instalacion de de enchape de baños en segundo nivel

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	28/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: Lluvia Fuerte

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con lavado de fachada
- se realiza instalacion de frescaza en juzgado 004
- Se continua con instalacion de de enchape de baños en segundo nivel
- Se realiza inspeccion de red de suministro de agua en baño de primer piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	29/01/2025
Estado Del Tiempo:	

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con lavado de fachada
- se ontinua con instalacion de muro divisorio en juzgado 004
- Se continua con instalacion de de enchape de baños en segundo nivel
- Se realiza inspeccion de red de suministro de agua en baño de primer piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	30/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con lavado de fachada

- se ontinua con instalacion de muro divisorio en juzgado 004

- Se continua con instalacion de de enchape de baños en segundo nivel
- Se realiza inspeccion de red de suministro de agua en baño de primer piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA GRANADA
Fecha:	31/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

- Se continua con lavado de fachada
- se ontinua con instalacion de muro divisorio en juzgado 004
- Se continua con instalacion de de enchape de baños en segundo nivel
- Se realiza inspeccion de red de suministro de agua en baño de primer piso

se realiza emboquillado de baños

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	1/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. Remision De Corte De Obra No.01
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	2/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. Remision de Lsitado de Personal Por Sede
2. Corte de Puerto Rico
3. Solicitud para autorizacion de ingreso Juzgado
4. Entrega área intervenidas terminadas día sábado 7 de diciembre
5. Oficio GYS-CSJVCIO-056 Remisión Informe Mensual No 3 del Contratista

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

- Se continua con la instalacion de manto con recubrimento de foil de aluminio
- Se continua con lavado de canales para instalacion de cinta fria en junta de manto asfaltico
- Se inicia repacion de flanche de parte frontal, costado sur y norte

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	3/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1. SOLICITUD INGRESO VISITA TECNICA - ACACIAS
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

- Se continua con la instalacion de manto con recubrimento de foil de aluminio

- Se continua con lavado de canales para instalacion de cinta fria en junta de manto asfaltico

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	4/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1. Se recibe especificaciones de aparatos sanitarios para instalacion en baños
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.Revision general de humedaddes despues de las lluvias, se empeiza reparacion en viga metalica costado posterior

2. Se realiza delimitacion en escaleras de emergencia

3. Masillado de cielo raso en oficina sal multiple

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	5/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro, Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	6/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.Revision general de humedaddes despues de las lluvias, se empeiza reparacion en viga metalica costado posterior

2. Se inicia actividad de instalacion de marcos par luminarias

3. Masillado de cielo raso en oficina sal multiple

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	7/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1.Revision general de humedades despues de las lluvias, se empeiza reparacion en viga metalica costado posterior

2. Se inicia actividad de instalacion de marcos par luminarias

3. Masillado de cielo raso en oficina sal multiple

4. S continua con lijado de muros en oficinas de intervencion y sala de archivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	8/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se inicia pintura en cielo raso de la escalera principal
2. se termina reparacion canal metalica costado fachada principal
3. Se inicia pintura en cielo raso y muros en juzgado primero laboral
4. Se continua con instalacion de cielo raso en juzgado primero y segundo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	9/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se continua con pintura en cielo raso de la escalera principal
2. se inicia limpieza de marcos de luminarias instaladas
3. Se inicia pintura en cielo raso y muros en juzgado primero laboral
4. Se continua con instalacion de cielo raso en juzgado primero y segundo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	10/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.

3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. Se continua con pintura en cielo raso de la escalera principal

2. se continua con pintura de cielo raso en pasillo frente a baños piso 4

3. Se inicia pintura en cielo raso y muros en juzgado primero laboral
4. la supervision hace entrega de luminarias a instalar
5, se continua con actividades de la instalacion de fachada interna de las escalera de emergencia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	11/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

1. Se continua con pintura en cielo raso de la escalera principal
2. se continua con pintura de cielo raso en pasillo frente a baños piso 4
3. Se inicia pintura en cielo raso y muros en juzgado primero laboral
4. Se inicia jornada de aseo
5, se continua con actividades de la instalacion de fachada interna de las escalera de emergencia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	12/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	13/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

- Se Realiza reparacion de acceso azotea a la terraza

- Se realiza instalacion de luminarias en sala de audiencia

se realiza aseo en archivo 4 piso

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	14/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continua instalacion de fachada
Se inicia con instalacion de estructura de cielo raso, escalera de emergencia
se aplica primera capa de alumol en la cubierta de la azotea para proteccion de impermeabilizacion

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	15/01/2025
Estado Del Tiempo:	

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se inicia resane de muro de escalera de emergencias en 4 piso,
se instala cielo raso en pasillo de emergencia

se retira material sobrante de obra

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	16/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continua con instalacion de fachada

se continua con reapacion de acceso a la fachada

se inicia reparacion de pañete para acceso de la fachada

se inicia masillado de cielo raso de en costado de escalera de emergencia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	17/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

Se continua con instalacion de fachada
se continua con reapacion de acceso a la fachada
se continua reparacion de pañete para acceso de la fachada

se continua masillado de cielo raso de en costado de escalera de emergencia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

SUPERVISIÓN	CONTRATISTA CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	INTERVENTORIA No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	18/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se continua con instalacion de fachada
se continua con reapacion de acceso a la fachada
se continua reparacion de pañete para acceso de la fachada

se continua masillado de cielo raso de en costado de escalera de emergencia

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	19/01/2025
Estado Del Tiempo:	Lluvioso

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro, Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	20/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

se continua con instacion de luminarias y tapas de inspeccion

se realiza instalacion de cortinas desmontadas

Se realiza limpieza de archivos de expedientes, luego de intervencion

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	21/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Protesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda
Apoyo a Residente De Obra	Ing. Andres Suarez

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instacion de luminarias y tapas de inspeccion
se realiza instalacion de cortinas desmontadas

Se realiza limpieza de archivos de expedientes, luego de intervencion

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	22/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

Se realiza limpieza de archivos de expedientes, luego de intervencion

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	23/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.

2.

3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada

se realiza recorrido con interventoria, ya que se culminan actividades

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	24/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada

se realiza recorrido con interventoria, ya que se culminan actividades

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	25/01/2025
Estado Del Tiempo:	NO APLICA - FESTIVO

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada
Se realiza jornada de aseo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GYS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	UR
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	26/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: nublado Tarde: Lluvia

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.

Eventualidades Del Dia

1. No se Laboro. Dia Festivo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	27/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada
Se realiza jornada de aseo

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	28/01/2025
Estado Del Tiempo:	Mañana: Lluvia Fuerte

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Director De Obra	Arq. Nelson Gomez
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodríguez Reina
Cargo: Residente de Interventoria	Cargo: Director de Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA** **CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024**	**INTERVENTORIA** **No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	29/01/2025
Estado Del Tiempo:	

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director Interventoria

SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	No.6703345 DE 2024

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	30/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director Interventoria

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INVERSIONES GyS S.A.S DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	
SUPERVISIÓN	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
	CO1.PCCNTR.6698166 DE 2024	**No.6703345 DE 2024**

FECHA INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO

"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, para realizar las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes a cargo de la Dirección Seccional Villavicencio de la Rama Judicial"

FRENTE DE OBRA	PALACIO DE JUSTICIA ACACIAS
Fecha:	31/01/2025
Estado Del Tiempo:	Soleado - Despejado

Personal En Obra

Cargo	Nombre
Profesional SST	Arq. Alba Scarpetta
Profesional Ambiental	Ing. Lina Sierra
Residente De Obra	Arq. Angie Borda

Solicitudes Enviadas a La entidad o Interventoria

1.
2.
3.

Comunicaciones Recibidas

1.
2.
3.

Eventualidades Del Dia

se continua con instalacion de fachada

CONTRATISTA INVERSIONES GYS S.A.S

Arq. Angie L. Borda Penagos	Arq. Nelson Enrique Gómez
Cargo: Residente de Obra Contratista	Cargo: Director de obra Contratista

INTERVENTOR JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Ing. Fabian Antonio Pérez Arias	Ing. Jorge Augusto Rodriguez Reina
Cargo: Residente Interventoria	Cargo: Director de Interventoria


9.8 CERTIFICACIONES VARIAS

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente yo HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY en mi condición de contadora al contrato de INTERVENTORÍA No. 6703345 DE 2024 representado legalmente por JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con cedula de ciudadanía No. 9.658.796 de Yopal persona natural, certifico que en el periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025:

- Se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que se han vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con cedula de ciudadanía No. 9.658.796 de Yopal persona natural, se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

En constancia, se firma en Villavicencio a los TREINTA (31) días del mes de enero de 2025.



HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C 1.121.884.207 de Villavicencio
T.P 189521-T

9.9 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO N°	**6703345 DE 2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT: 901658796-1		

							PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de enero de 2025		a		31 de enero de 2025
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Tipo de Vinculacion**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Retiro**	**Asignación Salarial**	**# PLANILLAS**	**AFILIACIÓN**									**Ingreso Base de Cotización**
						NOVIEMBRE	**EPS**	**%**	**Pensión**	**%**	**ARL**	**NIVEL**	**Caja de Compensación**	**%**		
PERSONAL OFERTADO																
Jorge Augusto Rodíguez Reina	Director de Interventoria	Independiente	4/9/2024	N/A	$ 4.900.000,00	9478123755	EPS Sura	12%	Colpensiones	16%	Sura	5	Cofrem	4%	$ 2.450.000,00	
Fabian antonio Perez areas	Residente de Interventoria	Dependiente	4/9/2024	N/A	$ 4.250.000,00	9478123755	Sanitas	12%	Porvenir	16%	Sura	5	Cofrem	4%	$ 4.250.000,00	
Pedro Eladio Alférez Rincón	Auxiliar No.1	Dependiente	4/9/2024	N/A	$ 1.700.000,00	9478123755	Nueva EPS Movilidad	12%	Porvenir	16%	Sura	5	Cofrem	4%	$ 1.700.000,00	
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra	Auxiliar No.2	Dependiente	10/11/2024	N/A	$ 1.700.000,00	9478123755	Salud Total	12%	Protección	16%	Sura	5	Cofrem	4%	$ 1.700.000,00	
Eyleen Dayana Montilla Beltrán	Auxiliar No.3	Dependiente	4/9/2024	3/01/25	$ 1.700.000,00	9478123755	Sanitas	12%	Porvenir	16%	Sura	5	Cofrem	4%	$ 1.700.000,00	
Flor Angela Narváez Castro	Profesional en Salud Ocupacional	Dependiente	4/9/2024	N/A	$ 2.100.000,00	9478123755	Fosyga régimen de excepción	12%	Porvenir	16%	Sura	5	Cofrem	4%	$ 2.100.000,00	

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

9.10 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO N°	**6703345 DE 2024**	**PROYECTO N°**	
OBJETO	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"		
INTERVENTORIA	R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 901658796-1		
FECHA DE INSPECCIÓN:	31/01/2025	N° DE TRABAJADORES:	7

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación			x		
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)			x		
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa		X			
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	x				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	x				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	50	5	6	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	76%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					x
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	x				
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	x				
14	Los equipos y herramientas están organizados	X				
15	las herramientas de trabajo estan cubiertas y protegidas	x				
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ITEM	GESTION DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					x
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	X				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	10	0	0	0	6
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes		X			
30	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro		X			
31	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado		X			
32	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.					X
	SUBTOTAL	10	15	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	50%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	76%	50	5	6	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	86%	60	0	0	0	5
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	60	0	0	0	1
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	30	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	100%	10	0	0	0	6
6	SEÑALIZACIÓN	33%	10	0	0	0	2
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	50%	10	15	0	0	1
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	**77.9%**	**230**	**20**	**6**	**0**	**16**

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas					X
37	Se cuenta con barbuquejo					X
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada					X
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.				x	
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.					x
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.					X
	SUBTOTAL	60	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	86%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.					X
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos					X
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo				x	
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención				x	
	SUBTOTAL	10	0	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	33%				

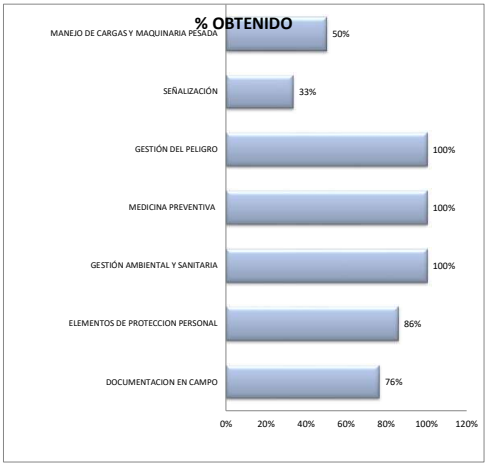


GRAFICO DE GESTION SISO

Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

9.11 INFORME PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 6703345 DE 2024



"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"



PERIODO DEL INFORME

01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Objeto de Interventoría:	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"	
Título de Documento:	Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo No 5.	
Documento No:	INF-SST-005	
APROBACIÓN		
	Nombre:	**FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	31-01-2025
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA**
Vo Bo director de interventoría:	Firma:	
		31-01-2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos específicos 5

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 6
3.1. Localización del proyecto y descripción 6
3.2. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo. 7

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA 7
4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría. 7
4.2. Generalidades contrato de interventoría. 8
4.3. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9
4.4. Instalaciones administrativas de la interventoría. 9
4.5. Personal de interventoría. 9
4.6. Pagos de seguridad social de interventoría. 10
4.7. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo. 10
4.8. Inspecciones realizadas a interventoría. 11
4.9. Charlas de seguridad a interventoria. 11
4.10. Reporte de accidentalidad del personal de interventoria. 12

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA 12
5.1. Generalidades contrato de obra. 12
5.2. Instalaciones administrativas del contratista. 13
5.3. Relación personal del contratista. 13
5.4. Seguimiento a compromisos laborales. 16
5.5. Exámenes medicos. 17
5.6. Supervision charlas pre operacionales. ..... ¡Error! Marcador no definido.
5.7. Pagos de seguridad social del contratista. 14
5.8. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT. 18
5.9. Certificado de accidentalidad de la ARL del contratista. 20

6. CONCLUSIONES 24

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un área multidisciplinaria y está relacionada no solo con la seguridad, también vincula la salud y la calidad en el ámbito de los trabajadores, su función es la de proteger a todo trabajador que se vea afectado por el ambiente ocupacional.

La Salud Ocupacional, se construye por medio de un ambiente psicosocial, físico, emocional, donde el trabajador pueda desarrollar una actividad con dignidad, con libre expresión, con ser respetado donde sus condiciones sean seguras y las más adecuadas, no solamente la salud ocupacional se encarga de la parte de salud física si no de la actividad o estado emocional en que se encuentre el trabajador, ya que ellos pueden llegar a presentar algún tipo de inconformidad, problema, y esto afectará el rendimiento en sus diferentes actividades laborales.

Tomando como base esto, este informe que realizará mensualmente la interventoría JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA, tiene como prioridad cumplir con la supervisión y seguimiento a las actividades que, han sido planificadas y presentadas por el contratista y de esta forma velar por el cumplimiento de condiciones idóneas para los trabajadores, respaldados siempre con la normatividad vigente, garantizando siempre la divulgación y sensibilización de las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, por el contratista de obra en desarrollo de la interventoría, durante el periodo del presente informe.

2.2. Objetivos específicos

- Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo evaluado; las cuales se encuentran divididas por componentes y programas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción SST de la interventoría y del Contratista, junto con lo establecido en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento a estas por parte de la interventoría.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
- Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementen las medidas de manejo de SST por parte del contratista.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas y el contrato de interventoría.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto y descripción

1. Palacio de justicia de granada (Meta)	2. Sede judicial el Yary, Villavicencio (Meta)	3. Palacio De Justicia Acacías (Meta)
		
4. Sede Judicial Puerto Rico (Meta),	5. Palacio De Justicia De San José Del Guaviare (Guaviare),	6.Sede Tribunal San José Del Guaviare (Guaviare),
		
7. Sede Judicial Del Calvario (Meta),		
		

"Es de señalar, que algunas de las sedes judiciales a intervenir corresponden al Palacio de Justicia Acacías (Meta), Palacio de Justicia de Granada (Meta), Sede Judicial Puerto Rico (Meta), Palacio de Justicia de San José del Guaviare (Guaviare), Sede Tribunal San José del Guaviare (Guaviare), requieren reparaciones según las necesidades que se requieran.

3.2. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015), por lo anterior esta interventoría tiene como objetivo principal garantizar que los trabajadores, que hacen parte del Proyecto, desarrollen las actividades que han sido planeadas de manera segura y responsable siempre brindando al personal vinculado con el contrato las condiciones idóneas y seguras en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA

4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por los profesionales SST de la interventoría, en cumplimiento de sus actividades de supervisión al contrato de obra CO1.PCCNTR.6698166 cuyo objeto es “REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL”

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista en el área SST, este seguimiento se ha realizado dejando como evidencia un registro fotográfico, formatos de control, seguimiento y cumplimiento a los indicadores SST, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoría, en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución del contrato de obra en el periodo del presente informe.

4.2. Generalidades contrato de interventoría.

La rama judicial seccional Villavicencio suscribió el contrato de interventoría No No.6703345 DE 2024 con JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA: cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES A CARGO DE LA SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL", el cual presenta las siguientes generalidades:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
PROCESO CONTRACTUAL:	LP003 DE 2024
CONTRATO DE:	OBRA
No. DEL CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6698166
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($145.160.800,00)
VALOR ADICIONAL 1:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($ 57.111.590,00)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 202.272.390,00)
NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE EJECUCION PRORROGA 1:	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA	28 DE FEBRERO DE 2025

4.3. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los requisitos legales relacionados con el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra incluido dentro del SGSST que fue entregado a la interventoría, en la fase preliminar. En el seguimiento realizado al SG SST, se evidencia que se cuenta con la matriz de requisitos legales ajustados a la ejecución de las actividades establecidas para el contrato.

4.4. Instalaciones administrativas de la interventoría.

Las instalaciones de la interventoría están ubicadas en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 Barrio el Caudal en el municipio de Villavicencio Meta. Allí se llevan a cabo todos los procesos administrativos por parte de la interventoría y se atenderá al público en general en caso de ser necesario.

4.5. Personal de interventoría.

Durante el presente periodo la interventoría, realizó el acompañamiento de forma permanente con los profesionales en salud ocupacional con sus debidas funciones de supervisar, verificar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, por tanto, la interventoría a velado por que se cumpla la normativa vigente legal, y se exigió al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de los trabajos, con el fin de mitigar los riesgos presentes en obra y crear un ambiente de trabajo seguro, y adecuado para cada labor y así mismo evitar accidentes e incidentes de trabajo y/o enfermedades laborales futuras.

Para estas labores se relaciona el grupo de profesionales de interventoría.

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	Fecha de ingreso	Fecha de retiro
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Director de interventoría	Independiente	04/09/2024	N/A
Fabian Antonio Pérez Arias	Residente de interventoría	Dependiente	04/09/2024	N/A
Pedro Eladio Alférez Rincón	Auxiliar de ingeniería No.1	Dependiente	04/09/2024	N/A
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra	Auxiliar de ingeniería No.2	Dependiente	10/11/2024	N/A
Flor Angela Narváez Castro	Profesional en Salud Ocupacional	Dependiente	04/09/2024	N/A

Teniendo en cuenta la oferta económica para el periodo de prórroga N°1, comprendido del 04/01/2025 al 28/02/2025, se realiza el retiro del auxiliar de ingeniería N°3 el día 03/01/2025 ya que hasta esa fecha estuvo ofertado de acuerdo con las condiciones iniciales del contrato.

4.6. Pagos de seguridad social de interventoría.

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	AFILIACIÓN				Fecha de ingreso	Fecha de retiro	No. Planilla NOVIEMBRE 2024
			EPS	Pensión	ARL	CCF			
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Director de interventoría	Independiente	EPS Sura	Colpensiones	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9478123755
Fabian Antonio Pérez Arias	Residente de interventoría	Dependiente	Sanitas	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9478123755
Pedro Eladio Alférez Rincón	Auxiliar de ingeniería No.1	Dependiente	Nueva EPS Movilidad	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9478123755
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra	Auxiliar de ingeniería No.2	Dependiente	Salud Total	Colpensiones	Sura	Cofrem	10/11/2024	N/A	9478123755
Flor Angela Narváez Castro	Profesional en Salud Ocupacional	Dependiente	Fosyga régimen de excepción	Porvenir	Sura	Cofrem	04/09/2024	N/A	9478123755

Teniendo en cuenta la oferta económica para el periodo de prórroga N°1, comprendido del 04/01/2025 al 28/02/2025, se realiza el retiro del auxiliar de ingeniería N°3 el día 03/01/2025 ya que hasta esa fecha estuvo ofertado de acuerdo con las condiciones iniciales del contrato.

4.7. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo.

La Interventoría ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista de manera permanente y se ha realizado un seguimiento a las actividades realizadas por medio de un registro fotográfico y formatos de control y seguimiento.
Para cumplir de manera idónea la interventoría le solicitó al contratista la siguiente documentación:

- ✓ Documentación del SG.SST de la empresa en cumplimiento de la Resolución 1072 del 2015 y la Resolución 0312 2019.
- ✓ Plan de trabajo SST anual.
- ✓ Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos ocupacionales.
- ✓ Antecedentes
- ✓ Cedula del trabajador
- ✓ Inducción al cargo.
- ✓ Constancia de Afiliación ARL.
- ✓ Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- ✓ Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- ✓ Formato entrega de dotación.
- ✓ Formato inducción al cargo.
- ✓ Contrato laboral.
- ✓ Examen médico ocupacional de ingreso.

- ✓ Planillas de seguridad social.
- ✓ Certificado de accidentalidad emitido por la ARL
- ✓ Carta de Idoneidad (para actividades de alto riesgo)
- ✓ Paz y salvos de personal retirado.
- ✓ Informes de SST. Con evidencia fotográfica.
- ✓ Inspecciones a los siguientes formatos:
- ✓ Formato Entrega de EPP
- ✓ Formato Asistencia - charlas pre operacionales
- ✓ Formato capacitaciones programadas
- ✓ Formato inspección herramienta y equipos
- ✓ Formato de Inspección punto ecológico, punto sanitario.
- ✓ Formato de inspección locativa.
- ✓ Formato ATS.
- ✓ Formato inspección camilla y extintores.
- ✓ Formato inspección de botiquín acondicionado de acuerdo con la cantidad de trabajadores

4.8. Inspecciones realizadas a interventoría.

INSPECCIONES GENERALES DE SST.	PERIODO	FECHA
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE INTERVENTORÍA.	MENSUAL	30/1/2025

4.9. Charlas de seguridad a interventoria.

TEMA	PERIODO	FECHA
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL TRABAJO	SEMANAL	01/1/2025
EL CASCO DE SEGURIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LESIONES	SEMANAL	08/1/2025
PAUSA ACTIVA	SEMANAL	15/1/2025
LA UNIÓN HACE LA FUERZA	SEMANAL	22/1/2025

4.10. Reporte de accidentalidad del personal de interventoria.

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT Mes:	1430	Total, HHTT acumuladas:	1430
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR: No se presentaron accidentes e incidentes de trabajo en el periodo relacionado.			

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA

5.1. Generalidades contrato de obra.

La rama judicial seccional Villavicencio suscribió el contrato de obra No CO1.PCCNTR.6698166 cuyo objeto contractual es "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL"

con las siguientes generalidades:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
PROCESO CONTRACTUAL:	LP003 DE 2024
CONTRATO DE:	OBRA
No. DEL CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6698166
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN

	SECCIONAL VILLAVICENCIO DE LA RAMA JUDICIAL
FECHA ACTA MODIFICATORIA N°1 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.451.608.104,00)
VALOR ADICIONAL 1:	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 523.864.231,00)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.975.472.335,00)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	INVERSIONES G y S S.A.S NIT: 830.083.258-1
NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE EJECUCION PRORROGA 1:	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA	28 DE FEBRERO DE 2025

5.2. Instalaciones administrativas del contratista.

El contratista cuenta con una oficina ubicado en CALLE 152 # 55ª – 10 TORRE 2 APTO 1201 en la ciudad de Bogotá, adicionalmente cuentan con sedes en Granada – Meta, Puerto Rico – Meta y San José del Guaviare, donde se coordina todos los aspectos administrativos y de ejecución referentes al avance y cumplimiento de las actividades y las metas propuestas por el contratista para dar cumplimiento al contrato.

5.3. Relación personal del contratista.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

No.	Nombre	No. CC	No. Matricula profesional	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de retiro
1	NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA	79514504	25700-65306	DIRECTOR DE OBRA	09/09/2024	N/A
2	ANGIE LIZETH BORDA PENAGOS	1010243369	A1112021-1010243369	RESIDENTE DE OBRA	09/09/2024	N/A
3	ALBA SCARPETTA SANCHEZ	51849383	25700-64790	PROFESIONAL SST	09/09/2024	N/A

PERSONAL ADMINISTRATIVO

No.	Nombre	No. C.C.	No. Matricula profesional	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de retiro
4	ANDRES FELIPE SUAREZ ARIAS	1018474462	091037-0636796 CND	AUX. RESIDENTE OBRA	09/09/2024	N/A
5	LAURA CAMILA GÓMEZ SCARPETTA	1010240909	385117	AUX. SST Y RECURSOS HUMANOS	09/09/2024	N/A

5.4. Pagos de seguridad social del contratista.

PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE PLANILLA	NO. MATRICULA PROFESIONAL
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO							
1	ARQ NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA	79514504	DIRECTOR DE OBRA	09/09/2024	N/A	9478897287	25700-65306
2	ANGIE LIZETH BORDA PENAGOS	1010243369	RESIDENTE DE OBRA	09/09/2024	N/A	9478012133	A1112021-1010243369
3	ARQ. ALBA SCARPETTA SANCHEZ	51849383	PROFESIONAL SST	09/09/2024	N/A	9478897287	25700-64790
PERSONAL ADMINISTRATIVO							

4	ANDRES FELIPE SUAREZ ARIAS	1018474462	AUX. RESIDENTE OBRA	09/09/2024	N/A	9478897287	091037-0636796 CND
5	LAURA CAMILA GÓMEZ SCARPETTA	1010240909	AUX. SST Y RECURSOS HUMANOS	09/09/2024	N/A	9478897287	385117

PERSONAL OPERATIVO						
No	**NOMBRE**	**NUMERO DE CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	No. DE PLANILLA
6	GILDARDO RINCON	17280388	OBRERO	17/10/2024	02/01/2025	9480327445 Documentos de egreso
7	DUVAN LOZADA IDARRAGA	1120380342	OBRERO	24/10/2024	N/A	9478897287
8	CARLOS ANDRES GALEANO	1006690886	OBRERO	24/10/2024	N/A	9478897287
9	ELKIN REYES TORRES	1120368471	OBRERO	25/10/2024	N/A	9478897287
10	OSCAR AGUDELO VILLEGAS	1133259075	OBRERO	30/10/2024	02/01/2025	9480327445 Documentos de egreso
11	RICARDO BALLESTEROS	80769234	OBRERO	07/11/2024	02/01/2025	9480327445 Documentos de egreso
12	BRAYAN GARCIA RODRIGUEZ	1120373917	OBRERO	07/11/2024	N/A	9478897287
13	DANIEL MORENO QUIROGA	1006692052	OBRERO	08/11/2024	N/A	9478897287
14	JOSE ALFONSO RODRIGUEZ	3250376	OBRERO	26/11/2024	N/A	9478897287
15	GUSTAVO SALON ROJAS	91244820	ELECTRICISTA	27/11/2024	N/A	9478897287
16	FIYER FABIAN PEÑA	120574629	AUXILIAR ELECTRICO	20/12/2024	N/A	Documento de ingreso
17	GERSON GALLEGO ARBOLEDA	1120571864	AUXILIAR ELECTRICO	20/12/2024	N/A	Documento de ingreso
18	CRISTIAN RICARDO BARRETO	1110556578	AUXILIAR ELECTRICO	20/12/2024	N/A	Documento de ingreso
19	DANIEL FELIPE ROJAS ROMERO	1122145201	AYUDANTE DE OBRA	02/12/2024	03/01/2025	9480327445 Documentos de egreso
20	JOSE ALVEIRO REY FERNANDEZ	1118565567	AYUDANTE DE OBRA	17/12/2024	N/A	Documento de ingreso
21	LISANDRO RAMOS VARGAS	1120964082	AYUDANTE DE OBRA	17/12/2024	02/01/2025	9480327445 Documento de egreso
22	HECTOR FERNANDO CIRO HENAO	79125059,	ORNAMENTADOR	20/12/2024	08/01/2025	9480327445 Documento de egreso
23	ANDRES MURCIA AYALA	86008796	ONAMENTADOR	20/12/2024	08/01/2025	948032744 Documento de egreso
24	MAIKOL ESTIVEN ROJAS OLMOS	1120373715	AYUDANTE DE OBRA	21/12/2024	N/A	Documento de ingreso

25	OVERNEYER QUIROZ GUTIERREZ	1120362259	AYUDANTE DE OBRA	21/12/2024	03/01/2025	9480327445 Documento de ingreso
26	CRISTIAN PUIN NIEVES	1006702320	AYUDANTE DE OBRA	26/12/2024	08/01/2025	9480327445 Documento de ingreso
27	YELCIN DIOMEDES DAZA GARZON	1120581333	AYUDANTE DE OBRA	26/12/2024	08/01/2025	9480327445 Documento de ingreso
28	JAIME ARIEL AGATON MARTINEZ	80523591	OFICIAL DE OBRA	26/12/2024	N/A	Documento de ingreso

PERSONAL SUBCONTRATISTA							
No	EMPRSA RESPONSABLE	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE PLANILLA
26	THERMIACABADO	RODOLFO VARGAS ULLOA	1030601088	OBRERO	28/1/2025	N/A	Documento de egreso
27	THERMIACABADO	DIEGO FERNANDO HERRERA MUÑOZ	1022446962	OBRERO	28/1/2025	N/A	Documento de egreso

5.5. Seguimiento a compromisos laborales.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1ª Quincena		2ª Quincena		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
El contratista ha entregado a la interventoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		

Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

NOTA: La documentación adjunta en cuanto a afiliaciones, contratos y a planillas de seguridad se adjuntadas en el informe SST N°5 de obra.

5.6. Exámenes médicos.

En verificación documental se evidenció que el contratista realizó los exámenes médicos ocupacionales e ingresó a todo su personal y fueron adjuntados en su informe mensuales de SST, así mismo adjunto el certificado de habilitación de la IPS para toma de exámenes ocupacionales.

No.	Nombre	No. CC	No. Matricula profesional	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	No. PLANILLA
1	NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA	79514504	25700-65306	DIRECTOR DE OBRA	09/09/2024	N/A	9473137980
2	ANGIE LIZETH BORDA PENAGOS	1010243369	A1112021-1010243369	RESIDENTE DE OBRA	09/09/2024	N/A	9472112732
3	ALBA SCARPETTA SANCHEZ	51849383	25700-64790	PROFESIONAL SST	09/09/2024	N/A	9473137980
4	ANDRES FELIPE SUAREZ ARIAS	1018474462	091037-0636796 CND	AUX. RESIDENTE OBRA	09/09/2024	N/A	9473137980
5	LAURA CAMILA GÓMEZ SCARPETTA	1010240909	385117	AUX. SST Y RECURSOS HUMANOS	09/09/2024	N/A	9473137980

5.7. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control y supervisión al contratista, en la implementación de cada uno de los ítems relacionados, con el fin de evaluar los indicadores de AT.

ESTADO				
DESCRIPCIÓN	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**OBSERVACIONES**
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa		x		
Buen estado	x			
Uso según zona de trabajo	x			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
Dotación completa		x		
Buen estado	x			
Fácil acceso y operación	x			
Uso según zona de trabajo	x			
Existencia de elementos primeros auxilios		x		
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo				N/A
Regularidad del mantenimiento				N/A
Vibraciones /Ruidos				N/A
Protecciones / Guardas / Frenos				N/A
Idoneidad operarios				N/A
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN.				
Uso permanente		X		
Uso según zona de trabajo		x		
VIGILANCIA				
Personal suficiente	X			

Diurna	X			
Nocturna	X			
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia		X		
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	X			

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT Mes:	142	Total, HHTT acumuladas:	142
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR: No se presenta accidentes de trabajo.			

5.8. Certificado de accidentalidad de la ARL del contratista.

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Página 1 de 1

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **INVERSIONES G Y S S.A.S** identificada con tipo y número de documento **NI 830083258** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **07/01/2012** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2024** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Septiembre	0	0	0	0	**0**
Octubre	0	0	0	0	**0**

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **02/10/2024 02: 57**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=Xwe/XTchZIjF909Esjw6F1NEQNCkiejyip2kB2kcQtA=)

Para verificación de Positiva

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **INVERSIONES G Y S S.A.S** identificada con tipo y número de documento **NI 830083258** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **07/01/2012**, con actividad económica principal código **5421001-CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2024** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Noviembre	0	0	0	0	**0**

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **29/11/2024 12: 20**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=Xwe/XTchZIjF909Esjw6F3Tjw9OD+dLPTq+OgGVIiE0=)

Para verificación de Positiva

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **INVERSIONES G Y S S.A.S** identificada con tipo y número de documento **NI 830083258** registra afiliación ACTIVA a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **07/01/2012**, con actividad económica principal código **5421001-CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2024** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
DICIEMBRE	0	0	0	0	0

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **30/12/2024 08: 08**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=Xwe/XTchZIJF909Esjw6F5Fb2eyp4dV83IPrUxHubTI=)

Para verificación de Positiva

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **INVERSIONES G Y S S.A.S** identificada con tipo y número de documento **NI 830083258** registra afiliación ACTIVA a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **07/01/2012** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2025** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Enero	0	0	0	0	0

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **30/01/2025 12: 20**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=coN/FdVhK03YKtHVipyB8uwKhRlqcg5ddPWdcLK8U70=)

Para verificación de Positiva

6. CONCLUSIONES

En el presente informe se establece las capacidades y el personal, con el que cuenta el contratista el cual está capacitado y soporta la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos que son requeridos para la realizar cada una de las tareas del proyecto.

Así mismo se evidencia el control realizado por la sección de seguridad y salud en el trabajo, de la interventoría el cual presenta en el informe los diferentes puntos de inspección y supervisión, con los debidos soportes.

Es esencial fomentar una cultura de seguridad que incluya a todos los niveles de la organización para asegurar el compromiso continuo

En relación con la normatividad se ha logrado un mayor cumplimiento con las normativas de SST, lo que no solo mejora la seguridad laboral, sino que también protege a la organización frente a posibles sanciones legales.
