INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.

CONTRATO DE OBRA No. **BGA-044-2024**

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34- 52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

PERIODO DE OBRA:

10 de febrero al 23 de marzo 2025

FEBRERO-MARZO 2025

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603
Celular: 315 848 7874 Correo: consorcioinfraestructuraav@gmail.com
Neiva - Huila

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3

2. OBJETIVOS 4

2.1 Objetivos Generales 4

3.1 Actividades de Obra 5

4. RECURSOS HUMANOS 7

5. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA 8

6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9

6.1 PROGRAMA DE CAPACITACION PERSONAL 9

7. SISTEMA DE SUPERVISION E IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS 11

7.1 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 11

8. INDICADORES SST. 12

9. REGISTRO FOTOGRAFICO. 13

10. ACTIVIDADES AMBIENTALES 20

11. ANEXOS 23

1. INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un elemento esencial para el adecuado desempeño de las actividades laborales. Garantiza no solo la integridad física y mental de los trabajadores, sino también el cumplimiento de las normativas vigentes que regulan las condiciones de trabajo. Este informe presenta los resultados obtenidos durante la ejecución de actividades entre el 10 de febrero y el 21 de marzo de 2025, analizando los riesgos laborales y las condiciones actuales de seguridad, salud y bienestar en el entorno laboral. Además, propone medidas correctivas y preventivas que mejoren la gestión de la SST.

Mediante la recopilación de datos, observación directa y revisión de documentos relacionados con la seguridad, se busca ofrecer una visión completa de la situación de los trabajadores y las instalaciones. Se evaluará el cumplimiento de las políticas implementadas, su efectividad y se realizarán recomendaciones para fomentar una cultura de seguridad que prevenga accidentes y enfermedades laborales, favoreciendo el bienestar de todos los trabajadores y contratistas de la obra, así como mejora la productividad general.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal durante la ejecución de la obra es tener **CERO INCIDENTES O ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES**, para lo cual propiciamos y motivamos que cada trabajador tenga una actitud y un compromiso permanente con la seguridad y salud en eltrabajo y medio Ambiente.

2.1 OBJETIVOS GENERALES:

- Monitorear y evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo durante el mes: Analizar las condiciones laborales, identificando los riesgos existentes y evaluando las medidas implementadas para prevenir accidentes y enfermedades.

- Verificar el cumplimiento de las normativas y procedimientos de seguridad establecidos:Asegurar que la empresa esté cumpliendo con las normativas legales vigentes en materiade seguridad y salud, y detectar cualquier desviación que requiera acción.

- Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas implementadas.

- Promover la capacitación y sensibilización en SST: Asegurar que todos los trabajadores hayan recibido la formación y sensibilización necesaria en seguridad y salud.

- Fomentar una cultura de seguridad y salud en el trabajo: Incentivar el compromiso de los trabajadores con la seguridad en el trabajo, asegurando que los principios de SST sean parte integral de la cultura organizacional.

- Detectar y proponer mejoras en las condiciones de trabajo: Identificar áreas de mejora en los procesos y las condiciones laborales que puedan incrementar la seguridad y bienestar de los trabajadores.

3. GENERALIDADES.

El consorcio Infraestructura A&V, viene ejecutando de acuerdo al objeto del contrato, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34- 52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un manual de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a las actividades de obra ya mencionada, y según el cronograma establecido en el manual.

3.1 ACTIVIDADES DE OBRA.

Durante el periodo del 10 de febrero al 23 de marzo 2025, se vienen desarrollando enla obra las siguientes actividades:

- Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)
- Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)
- Desmonte de ventanearía metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)
- Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)
- Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)
- Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)
- Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)
- Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)
- Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)
- Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)
- Piso en cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)
- Media caña en Granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)
- Enchape pared cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye win)
- Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y

- salpicaderos necesarios).
- Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)
- Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)
- Película tipo Frost con logo institucional de máximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalación)
- suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio
- Reinstalación Sanitarios existentes.
- Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, canastilla, desagüe, accesorios)
- Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar
- Suministro e instalación de detector de movimiento
- Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto Conduit SCH 40 Ø 1/2", clavija aérea tipo hembra 15 A, clavija aérea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH
- Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara
- Suministro, transporte e instalación de Canaleta metálica 12x5 cm, en pintura electrostática blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte
- Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH
- suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)
- suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)
- Suministro e instalación de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m
- Suministro e instalación de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m
- Suministro e instalación de ducteria de aire acondicionado lamina de polisocianurato (PirAlum)
- Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidro lavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla
- Suministro e instalación de troquel metálico piramidal sencillo 12 x 5 blanco
- Suministro e instalación de troquel metálico piramidal triple 12 x 5 blanco
- Suministro e instalación de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalación y fijación al suelo
- Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas, limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior
- Suministro e instalación de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio
- Suministro e instalación de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3
- Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)
- Suministro e instalación de acometida de control y tubería doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesorios y soportes necesarios para su instalación

- Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno).
- Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR
- Montaje, instalación y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final. Y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimétrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificación de parámetros
- Suministro e instalación de tubo Metálico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)
- Suministro e instalación de manguera Coraza 1 1/2"
- Pulida y brillada de guarda escoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)
- Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)
- Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)
- Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)
- Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)
- Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)
- Suministro e Instalación de Gabinete Eléctrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifásicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifásicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofásicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP, barrajes de neutro y tierra, acrílicos de protección.
- Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o título, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.
- Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio
- Sofá de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera
- Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera
- Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4
- Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2
- Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m
- Silla tipo ejecutiva
- Silla tipo presidencial
- Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura
- Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts.

- Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diámetro.
- Suministro de silla sin brazo Khao o similar.
- Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE.
- Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE.
- Jornada de aseo y limpieza.

4.RECURSOS HUMANOS

Para la ejecución de las actividades, el consorcio cuenta con el personal mano de obra calificada contratada directamente por el consorcio y mano de obra no calificada, los cuales están vinculados con cada uno de los subcontratistas, el personal se distribuye de la siguiente manera.

N°	EMPRESA	No DE TRABAJADORES EN OBRA	OBSERVACION
1	Consorcio Infraestructura A&V	2 administrativos	El personal responsable de la coordinación para la ejecución de las actividades.
2	Proveedores de obra civil	3 obra civil	El personal contratado para diversas actividades durante la ejecución del contrato.
3	Contratista interventoría	4 interventores	Personal encargado en la parte como interventor de la obra y ejecución de las actividades.
4	Proveedor pulido de pisos	1 pulidor de piso	Personal encargado en la parte de limpieza y pulida de pisos durante la ejecución de las actividades.
5	Proveedor arkos vidrios	2 instaladores de vidrios	Personal encargado en suministro e instalación de vidrios durante la ejecución de las actividades.
6	Proveedor de aires acondicionados	5 instaladores de aires acondicionados	Personal encargado en suministro e instalación de aires acondicionados durante la ejecución de las actividades
7	Proveedor limpieza de fachada	1 limpiador de fachada	Personal encargado en lavado y limpieza de fachada durante la ejecución de las actividades.
8	Proveedor contratista eléctrico	1 técnico eléctrico	Personal encargado en instalaciones e suministro de cableado eléctrico e iluminarias durante en la ejecución de las actividades.

4. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Durante el periodo se ha utilizado en obra los siguientes equipos para la adecuada ejecución del proyecto:

- Palín
- pala
- punteros laser
- Herramientas menores
- Taladro eléctrico
- Pulidoras
- Taladro inalámbrico
- Escaleras de tijeras
- Metro
- Decámetro
- Máquina de brillador de pisos
- Máquina polichadora de pisos
- Brochas
- Rodillos
- Espátula
- Máquina sierra circular
- hidro lavadora
- equipos de trabajo en aturas

5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo comprendido del 10 de febrero al 21 de marzo 2025, se handesarrollado actividades que se contemplan en el manual del SG- SST, elaborado para los servicios de la obra, tratando en todo momento de cumplir con los estándares planteados parael presente periodo

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones se da estricto cumplimiento al manual del SG-SST derivado del plan de gestión, donde el cumplimiento se entiende como el seguimiento y la respectiva ejecución de acciones para el constante mejoramiento de la seguridad y así mismo el acatamiento de los requisitos legales y empresariales actuales. Se realizaron las respectivas charlas de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los anexos se encuentra el reporte de asistencia a las charlas diarias. A continuación, se detalla los temas tratados respecto a la seguridad y salud en el trabajo.

6.1PROGRAMA DE CAPACITACION PERSONAL

- **Plan de inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo**

La inducción en SST es una de las actividades de mayor importancia antes del ingreso de cualquier trabajador nuevo a la obra. A cada trabajador que labora para el consorcio Infraestructura A&V, se le brindan lineamientos básicos para su desempeño en la obra y consta de la difusión y actividades como:

- Se realizan la respectiva verificación de afiliación al sistema de seguridad social y parafiscal del personal.
- Inducción de seguridad y salud en el trabajo; por parte del área SST a todo el personal el cual se encuentra vinculado directa o indirectamente con el consorcio para el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar. (Mano de obra calificada, oficiales, personal mano de obra no calificada), se da a conocer las políticas, los peligros y riesgos, normas de seguridad. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo y se evalúa el tema con soporte de evaluación.
- Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.

- Diariamente se realizan las charlas preoperacionales de seguridad y salud en el trabajo, recomendaciones para la ejecución de actividades, inspección de elementos de protección personal.
- Se realizan actividades, encaminadas a la prevención de incidentes y accidentes laborales dentro de las áreas de trabajo.
- Con los diferentes grupos de trabajo se realizan pausas activas y descansos prolongados durante la ejecución de las actividades con el fin de evitar lesiones osteomusculares o cansancio muscular.
- De acuerdo con lo estipulado dentro de las normas de seguridad se hace Entrega de dotación y elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores, con el fin de garantizar la seguridad de cada uno de ellos durante la ejecución de las diferentes actividades.
- Señalización y delimitación de áreas de trabajo, con el fin de advertir los riesgos y peligros tanto al personal de obra como al personal externo y así garantizar áreas de trabajo seguro.
- Elaboración y divulgación de (ATS) para cada una de las actividades.
- Permiso de trabajos para equipos eléctricos.
- Permiso trabajo en alturas
- Permiso izaje de cargas
- Inspección Preoperacional del camión grúa
- Inspección preoperacional equipos trabajo en alturas
- Inspección de herramienta manual y equipos a usar con el fin de verificar las condiciones actuales en la que se encuentran y así prevenir cualquier incidente o accidente.
- inspección de equipos de primeros auxilios con el fin de verificar las condiciones de los elementos y en caso de una emergencia pueda ser usado sin inconvenientes.

Todas estas actividades se registran en los diferentes formatos creados por el Consorcio para manejo del Manual del SG- SST.

6. SISTEMA DE SUPERVISION E IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS

Se realizo el análisis de riesgos al inicio de la jornada laboral, tomando como consideraciones los posibles riesgos durante la ejecución de cada una de las actividades en los diferentes puntos de trabajo.

6.1 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Inducción al personal (socialización de políticas del no consumo de alcohol drogas y tabaquismo, política de prevención de acoso laboral. Socialización de los riesgos a los cuales están expuestos.
- Recomendaciones para la realización de las actividades de obra (Pausas Activas)
- Precauciones para el uso adecuado de la escalera tipo tijera.
- Clasificación de residuos en el punto ecológico
- Divulgación de normas según la GTC 45
- Que es accidente de trabajo, incidente y enfermedad laboral. Se explica a colaboradores como se debe reportar un accidente y la ARL que cada colaborador está afiliado.
- Responsabilidades de colaboradores, contratista, subcontratista e inspector SST en cuanto a las funciones designadas en el contrato dentro de las instalaciones donde se desarrolla la obra.
- Consecuencias del consumo de tabaco y alcohol
- Importancia de la señalización y delimitación de áreas de trabajo.
- Importancia de los elementos de protección personal y su uso obligatorio.
- Importancia de orden y aseo en los lugares de trabajo.
- Socialización de izaje de cargas.
- Socialización de la resolución de 4272 del 2021 sobre el trabajo en alturas.
- Prevención sobre el manejo de sustancias químicas y productos químicos.
- Plan manejo de tránsito.

7. INDICADORES SST.

INDICADOR	
Horas Hombres Trabajadas	2992
Número de trabajadores	19
Número de atenciones médicas comunes reportadas y días perdidos	0
Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas y días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0


INDICADOR De GESTIÓN SST	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE INCIDENTES DE TRABAJO	INDICE DE SEVERIDAD	INDICE DE LESIO-NES INCAPACITAN-TES
VALOR	0	0	0	0


8. REGISTRO FOTOGRAFICO.

a) Charlas e Inducción de Seguridad y salud en el trabajo.

CHARLAS SST



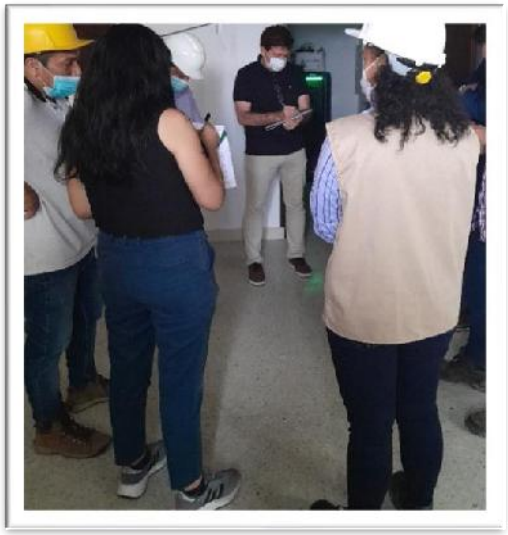

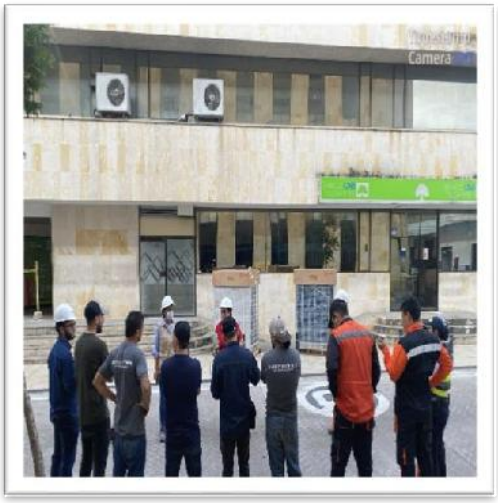




INDUCCIÓN SST





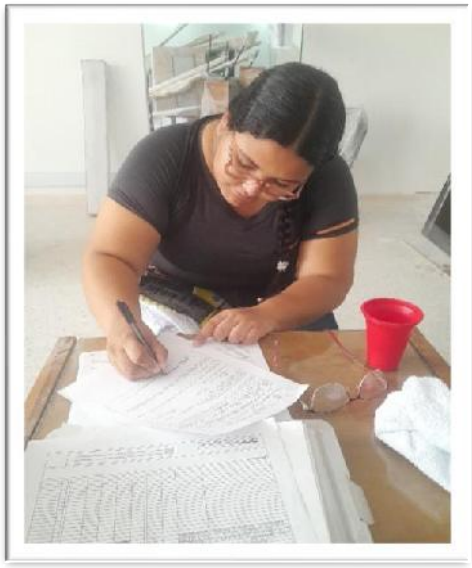

REGISTRO DE CAPACITACION

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades se efectúa con el personal, capacitación de acuerdo con las actividades que se vienen ejecutado de acuerdo con el objeto del contrato.

Capacitación trabajo seguro en alturas e izaje de cargas





b) Pausas Activas

Se realiza con los grupos de trabajo calistenia y pausas activas para así evitar el agotamiento musculo esquelético o cansancio muscular en los trabajadores.





c) PROGRAMA DE DOTACION O RENOVACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y son renovados por desgaste o deterioro.









d). SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE ZONAS DE TRABAJO










e) Equipos de Primeros Auxilios



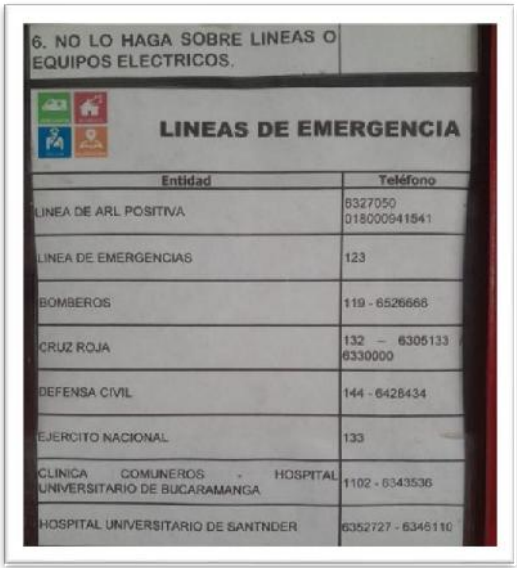



f) INSPECCION DE AREAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Se inician actividades con las respectivas inspecciones de las zonas a intervenir y a los equipos a usar.

- **Se realiza inspección visual a herramienta menor y eléctrica como:**

- Palín
- pala
- punteros laser
- Herramientas menores
- Taladro eléctrico
- Pulidoras
- Taladro inalámbrico
- Escaleras de tijeras
- Metro
- Decámetro
- Máquina de brillar pisos
- Maquina polichadora
- Brochas
- Rodillos
- Espátula
- Hidrolavadora
- Sierra circular

g) Inspección de Equipos y Herramientas.









h) Instalación hoja de seguridad productos químicos.








i) Cartelera informativa, políticas y recomendaciones SST.



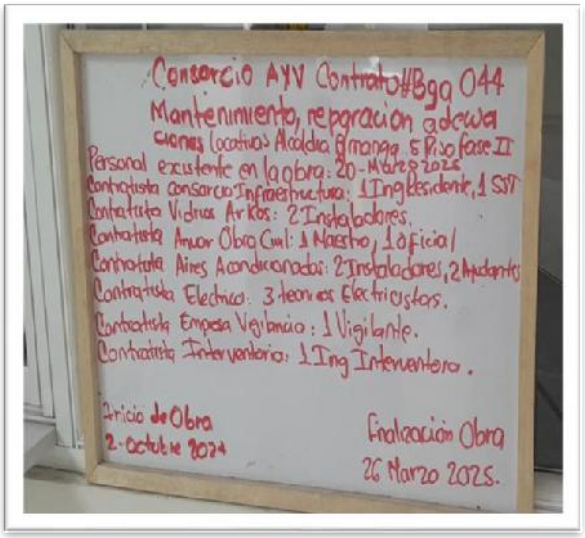

9.ACTIVIDADES AMBIENTALES.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se realizan actividades ambientales para así evitar la contaminación del medio.

- Diariamente se realizan jornadas de orden y aseo para finalmente hacer recolección y disposición de residuos.
- Se realiza las respectivas recomendaciones para el buen manejo de los residuos y así evitar la contaminación del medio.
- En este mes de marzo no se ha realizado la disposición de los residuos ordinarios y escombros.

➢ Clasificación y retiro de escombros









➢ JORNADA DE ORDE N Y ASEO









Punto ecológico



Punto de acopio de escombro y materiales



9.ANEXOS

8.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES SST

Los anexos del Informe mensual de SST son enviados como archivo adjunto.

- Pago seguridad social personal administrativo y de obra
- Registro de inducción y charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Registro de la entrega de la Respectiva dotación y EPP al personal administrativo y de obra.
- Registro del formato ATS.
- Registro en trabajo en alturas.
- Registro inspección equipos trabajos en alturas
- Registro izaje de cargas
- Registro preoperacional camión grúa
- Registro preoperacional de máquinas, herramientas /o equipos.
- El plan manejo de tráfico PMT

Elaboración	Revisión	Aprobación
Elva Viviana Ramírez Leal		
Viviana Ramírez Tecnóloga SST	Francisco Javier Villanueva Director De Obra	Saides Guerrero SST de Interventoría
Fecha.21-03-2025	Fecha.21-03-2025	Fecha.

ANEXO N°1

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-19, 10:50:15 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76671956

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 19/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AYV	**Nombre Sucursal**	CONTRATO RAMA	**Código Sucursal**	3
Documento	NI901863382	**Dirección**	CL 9 #4 - 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63506940	ELVA VIVIANA RAMIREZ LEAL	01	00	X									X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.148.986	$ 343.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.148.986	$ 86.000	6,960	$ 2.148.986	$ 149.600	(CCF39) CAJASAN	$ 2.148.986	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.500
CC 77179645	ALEXANDER RAMIREZ MARQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.437.500	$ 390.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.437.500	$ 97.500	6,960	$ 2.437.500	$ 169.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.437.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.586.486	$ 4.586.486	$ 4.586.486	$ 4.586.486	$ 733.900	$ 183.500	$ 319.300	$ 183.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.420.200	$ 0	$ 1.420.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N°2

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

Su Aporte

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 11:15 AM **Tipo Planilla:** E: EMPLEADO **Número Planilla:** 76010055

Periodo Cotización: Marzo de 2025 **Periodo Servicio:** Abril de 2025

PAGADA 13/03/2025

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRATIVO	**Código Sucursal**	002
Documento	CC 80072840	**Dirección**	CL131C #126 - 82		
Tipo de Empresa	DEPENDIENTE	**Teléfono**	2000000		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTAD.C.	**Departamento**	BOGOTAD.C.		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESA	Aporte Ministerio	Total
CC 80072840	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	01	00																		0	30	0	0		$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR	$1.423.500	$177.937	$ 0	$ 0	$ 0		$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTALSIN INTERESESDE MORA	TOTAL, INTERESES DE MORA	TOTAL, FINAL
$ 0	$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegerel medio ambienteestá en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800222462	4	LOS MAGNIFICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOS MAGNIFICOS SAS	calle 70 44w-567 km 5 via giron	BUCARAMANGA-SANTANDER	6912502	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330657271	9483067217	E	2025/03/14	2025/03/12	BANCOLOMBIA	0	$14,895,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LOS MAGNIFICOS SAS (24 Afiliados)																							$50,728,198	$8,197,400			$50,728,198	$2,030,100			$50,719,965	$2,029,800			$50,728,198		$2,638,600		$0	$0		$14,895,900
Centro de Trabajo: OPERADOR (6 Afiliados)																							$12,692,500	$2,031,000			$12,692,500	$507,800			$12,692,500	$507,800			$12,692,500		$63,400		$0	$0		$3,110,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																							$12,692,500	$2,031,000			$12,692,500	$507,800			$12,692,500	$507,800			$12,692,500		$63,400		$0	$0		$3,110,000
1	CC	91043277	ARDILA SAAVEDRA PRIMITIVO																		25-14	30	$2,957,000	$473,200	EPS005	30	$2,957,000	$118,300	CCF40	30	$2,957,000	$118,300	14-11	30	$2,957,000	0.522%	$15,500	30	$0	$0	Si	$725,300
2	CC	91277308	LOPEZ VERGARA LUIS FERNANDO																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF40	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
3	CC	1005182180	MONSALVE CRUZ MARIA ISABEL																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
4	CC	37726102	RODRIGUEZ GUTIERREZ YENNY ANDREA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	91074170	ROJAS ROJAS FELIX AURELIO													X					230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF40	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$148,100
6	CC	91074170	ROJAS ROJAS FELIX AURELIO																		230301	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF40	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	0.522%	$4,300	17	$0	$0	Si	$198,000
7	CC	1095936387	TORRES DURAN SANDRA VIOLETA																		230201	30	$2,012,000	$322,000	EPS005	30	$2,012,000	$80,500	CCF40	30	$2,012,000	$80,500	14-11	30	$2,012,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$493,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800222462	4	LOS MAGNIFICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOS MAGNIFICOS SAS	calle 70 44w-567 km 5 via giron	BUCARAMANGA-SANTANDER	6912502	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330657271	9483067217	E	2025/03/14	2025/03/12	BANCOLOMBIA	0	$14,895,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$8,197,400	$0	$0	$8,197,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,266,500	$0	$0	$2,266,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,407,400	$0	$0	$2,407,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,523,500	$0	$0	$3,523,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,638,600	$0	$0	$2,638,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,638,600	$0	$0	$2,638,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,029,800	$0	$0	$2,029,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,029,800	$0	$0	$2,029,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$2,030,100	$0	$0	$2,030,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$566,300	$0	$0	$566,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$295,100	$0	$0	$295,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$214,800	$0	$0	$214,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$62,800	$0	$0	$62,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$218,400	$0	$0	$218,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$672,700	$0	$0	$672,700
TOTAL				**24**	**$14,895,900**	**$0**	**$0**	**$14,895,900**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.005.541.961

FLOREZ ARIZA
APELLIDOS

GERALDYN
NOMBRES

Geraldin Flórez
FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-2003**

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

19-ABR-2021 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2716000-01231360-F-1005541961-20210503 **00742**98071A 1 8501910244

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) GERALDYN FLOREZ ARIZA identificado(a) con CC 1005541961 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/08/2008

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **U.T. FOSCAL-ESCANOGRAFIA S.A-PIEDECUESTA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 25 días del mes 3 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **FLOREZ ARIZA GERALDYN** identificado(a) con **CC** número **1.005.541.961** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de mayo de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 25 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025032508554

Medellín, 24 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ANVAR CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 ALCALDIA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1005541961	FLOREZ ARIZA GERALDYN	25/03/2025		188183AH	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2025 23:24:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.233.169.85, 198.143.41.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.005.541.494**

CRUZ HERNANDEZ

APELLIDOS

CAMILA ALEJANDRA

NOMBRES

Camila Cruz

FIRMA





INDICE DERECHO

26-SEP-2002

FECHA DE NACIMIENTO

PIEDECUESTA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-SEP-2020 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2716000-01166675-F-1005541494-20201001 **0071**925569A 1 8500704975

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) CAMILA ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ identificado(a) con CC 1005541494 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/02/2022

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **SUBSIDIADO-E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 25 días del mes 3 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO
VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CAMILA ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.541.494**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 25 de Marzo del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 24 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ANVAR CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 ALCALDIA			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1005541494	CRUZ HERNANDEZ CAMILA ALEJANDRA	25/03/2025		235M2496	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/03/2025 23:20:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.233.169.85, 198.143.41.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649112	1	ANVAR CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 83 # 58 - 37	BUCARAMANGA-SANTANDER	3027154838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1028065759	94768298745	E	2025/03/05	2025/03/10	Bancolombia	0	1,134,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	odigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	ías	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,147,000	$166,000			$4,270,500		$114,100		$0	$0		$1,134,500
Centro de Trabajo: ALCALDIA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	1098713857	MOSQUERA MARLON																		3030	30	$1,423,500	$227,800	PS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1098823056	PEREZ DEIBY		x																3030	30	$1,423,500	$227,800	PS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$435,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$435,900
3	CC	1095929680	VARGAS ANDRES																		3100	30	$1,423,500	$227,800	PS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
Total			**Afiliados(3)**																				$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,147,000	$166,000			$4,270,500		$114,100		$0	$0		$1,134,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649112	1	ANVAR CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 83 # 58 - 37	BUCARAMANGA-SANTANDER	3027154838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1028065759	94768298745	E	2025/03/05	2025/03/10	Bancolombia	0	1,134,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,100	$0	$0	$114,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$114,100	$0	$0	$114,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$166,000	$0	$0	$166,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$166,000	$0	$0	$166,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**3**	**$1,134,500**	**$0**	**$0**	**$1,134,500**

Su Aporte

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 11:15 AM **Tipo Planilla:** E: EMPLEADO **Número Planilla:** 76010055

Periodo Cotización: Marzo de 2025 **Periodo Servicio:** Abril de 2025

PAGADA 13/03/2025

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRATIVO	**Código Sucursal**	002
Documento	CC 80072840	**Dirección**	CL131C #126 - 82		
Tipo de Empresa	DEPENDIENTE	**Teléfono**	2000000		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTAD.C.	**Departamento**	BOGOTAD.C.		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESA	Aporte Ministerio	Total
CC 80072840	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	01	00																		0	30	0	0		$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR	$1.423.500	$177.937	$ 0	$ 0	$ 0		$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTALSIN INTERESESDE MORA	TOTAL, INTERESES DE MORA	TOTAL, FINAL
$ 0	$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegerel medio ambienteestá en nuestras manos.

mibanco

Ref. 1189585

OFICINA : VILLAVICENCIO
CAJERO : MIRLEY SANCHEZ LOPEZ
FECHA : 19/02/2025
HORA : 14:59:19
SECUENCIA : 00005290

7701-RECAUDO CONVENIOS

Convenio : SIMPLE S A SISTEMA INTE GRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS
Tipo de Recaudo : Codigo de Barras
CODIGO CONVENIO : 7709998485884
NUMERO DE PRODUCT: 8822997645
VALOR : 0000000
FECHA : 20991221
Periodo de Pago : 202502
Tipo de Pago : Deposito
Efectivo : $509.400,00*
Cheque Propio : $0,00*
Cheque Otro Banco: $0,00*
Total Pagado : $509.400,00*

- CLIENTE -

$509.400=

Préstamos: Pago Normal ☐ Abono a Cuotas ☐ Pago Total ☐
Reducir Plazo ☐ Reducir Cuota ☐ Otros ☐
Ahorro: Depósito ☐ Rec. Convenio ☐
Cta. Cte.: Depósito ☐ Rec. Convenio ☐
CDT: Constitución ☐

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE SU TRANSACCIÓN ANTES DE RETIRARSE

PAGOSIMPLE | Prefactura

26 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 Referencia pago (PIN): 8822997645

Fecha límite de pago: 2025-03-05

GUARDADA 19/03/2025

Dirección	CL 1 #1 - 1 CIUDAD DEL CAMPO CS2		
Teléfono	3123293811		
Forma Presentación	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Departamento	META		
Identificación			

DACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la ncia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las ervicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	CAMPF	Aporte Minhacienda	Total
ONES	$ 1.423.500	$ 227.800	CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	MINCULTURA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.400

IS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Sanción	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES OR	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.400	$ 0	$ 509.400

Periodo cotización salud

brero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Exito

(415)7709998485884(8020)8822997645(3900)0000000(96)20991231

unto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - cos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362744		DELGADO GUTIERREZ ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 an # 1wa34	PIEDECUESTA-SANTANDER	6482426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319625983	9482251370	I	2025/03/12	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 99.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362744		DELGADO GUTIERREZ ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 an # 1wa34	PIEDECUESTA-SANTANDER	6482426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319625983	9482251370	I	2025/03/12	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098742342		NIÑO MAZA RONALD ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 4 casa 3 villas de San Pedro	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3227229324	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319594384	9482163538	I	2025/03/11	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1098742342	NIÑO MAZA RONALD ARLEY	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 99.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098742342		NIÑO MAZA RONALD ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 4 casa 3 villas de San Pedro	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3227229324	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319594384	9482163538	I	2025/03/11	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

Medellín, 13 de marzo de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que JAIME PRADA ROJAS identificado(a) con C4100020 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C41000202507241215

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 10.205.28.11

ARL

Medellin, 13 de marzo de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que **GERSON JULIAN DELGADO GUTIERREZ** con documento de identidad **C1102370313**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **GERSON JULIAN DELGADO GUTIERREZ** con NIT **C1102370313**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2025-03-13	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	PRINCIPAL SANTANDER	0000000001	5	6.96	EN COBERTURA



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL

Medellin, 14 de marzo de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que **WILLIAM TOSCANO MAYORGA** con documento de identidad **C1098699774**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **WILLIAM TOSCANO MAYORGA** con NIT **C1098699774**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2025-03-14	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	PRINCIPAL SANTANDER	0000000001	5	6.96	EN COBERTURA



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N°3

REGISTRO INGRESO DE PERSONAL

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-005
	SG-SST	
FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS	Fecha:	ago-24
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA		DOCUMENTOS RELACIONADOS					ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	
		EMPLEADO	CONTRATISTA	PLANILLA DE PAGO	EPS	AFP	ARL	CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA	SI	CUAL?
Rodrigo Rojas Cortez	1,075,283,451	x		x	Sanitas	Porvenir	Sura	x	N/A	
Solanyi Viviana Fernandez	1,081,152,704		x	x	Nueva EPS	Colpensiones	Sura	x	N/A	
Jose Hernandez	1005101[illegible]		X	✓	C				N/A	
Luis Harbey Quintero	17377914		X		Colsanitas	Colfondos	Sura		N/A	
Jose Hernandez Nuño	1005 162 [illegible]		X		Nueva EPS	Porvenir	Sura		N/A	
Geraldin Florez Ariza	1005547461		X		Nueva EPS	Protección	ARL			

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADOR

FECHA DD/ 10 MM/ 03 AAAA/ 2025

* Por favor anexe los soportes de afiliaciones al sistema de seguridad social según aplique y el certificado de aptitud médica.
* Diligencie un registro cada vez que ingrese o cambie de personal en la obra, con el fin de que sean autorizados.

Powered by CamScanner

ANEXO N°4

REGISTRO INDUCCION SST.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 13-03-2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Luis Herbay Gutiérrez. CEDULA: 17'327-914

AREA/SECCION: Operativa – Fachada CARGO: Limpieza fachada

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Elva Yuvana Ramírez Cel

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 17'327914 Vlle

Elva Yuvana Ramírez Cel
Responsable del SG-SST
C.C. 63506940 Bmga

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 13-03-2025. INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Jose Hernandez Nova CEDULA: 1005162787

AREA/SECCION: Operativo - Aires Acondicionados CARGO: Instalador Aires.

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Elva Ines Ramirez Leal

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Jose Nova
Firma del Trabajador
c.c. 1005 162 787

Elva Ines Ramirez Leal
Responsable del SG-SST
c.c. 63506940

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:	FT-SST-026	
	SG-SST		
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST		Fecha:	/2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 25-03-25 **INDUCCIÓN** [Y] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Yeral Florez Anza **CEDULA:** 1005541961

AREA/SECCION: Operativa, Oficios Varios **CARGO:** oficios Varios

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Elver Vuelta Lamo

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que Ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO
PSICOSOCIAL
FENOMEROS NATURALES
FÍSICO
BIOMECÁNICOS
QUÍMICO
CONDICIONES DE SEGURIDAD

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

x Geraldin Florez Anza
Firma del Trabajador
c.c. x1005541961

Elver Vuelta Lamo
Responsable del SG-SST
c.c. 6350694

Powered by CamScanner

ANEXO N°5

REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto- 2024
		Versión:	001
			Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Rionegro S Pro	Alcaldía Rionegro	26	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cristian Castro	1098713857	[illegible]	[signature]
2	Miguel Angel Ramos Romero	1096193769	Aprendiz	[signature]
3	Alvaro Delgado	4102362744	Tecnico	[signature]
4	William Mauricio Toscano	1040914774	TECNICO	[signature]
5	Jorson Julian Dorado.	1062370313	Auxiliar Tecnico	Jorson
6	Andres M Vargas	1095927680	Electricista	[signature]
7	Alberto Sanchez	80072820	instalador	[signature]
8	Geraldin Florez Arza	1005511461	Oficios Varios	Geraldin F
9	Alexander Pinzon	77.179.645	Residente	[signature]
10	Jaime Ramon Ruiz	1100020	oficial	[signature]
11	Jercy Juliana Martinez	1098721099	P. Interventor	[signature]
12	Javier Arroca	1062315137	P. Auxiliar	[signature]
13	Jaider Guevara	57.371.342	SST Practicante	[signature]
14	Jose Luis Duarte	1098326457	Electricista	[signature]
15	[illegible]	1125054[illegible]	[illegible]	[signature]
16	[illegible]	72129802	Tecnico	[signature]
17	Gailay Villamizar	1098698888	Ensamble	[signature]
18	Jeider Duvan Villamizar	1007.769.795	Ensamble	[signature]
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elder Ussier Ramirez	[signature]

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024	
	Versión:	001	
	Pagina 1 de 1		

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldia Bmanga Piso 2	25	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? La importancia de cuidar nestra manor.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andres Vargas	1098929682	Maestro	
2	Andres Castro R	1098713853		
3	Alvaro Sandra	80072840	Profesional	
4	Geraldin Florez	1005541961	Oficios varios	Geraldin F
5	Jenson Julian Delgado	1102370313	Aux.	
6	Oriol Pacheco	91250544	Policia	
7	Juan Bautista Reyes	21100020	Oficial	
8	Alvaro Delgado	1102362741	Tecnico	
9	WILLIAM MANTILLA TARAZONA	1098699774	TECNICO	
10	Alexander Ramirez	77.179.645	Resident	
11	Jancy Adriana Martinez	1098721099	E-Tatn	
12	Jaime Agoca	1062345432	Escolta	
13	Saulo Guerrero	37.371.302	SST Tatn	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Elsa Ximena Ramos	Firma:

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
B/manga.	Alcaldia B/manga	22	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Importancia de la señalizacion y demarcacion en nuestra area de trabajo.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andrés M Vargas	1095929680	Maestro	
2	Jaime Jesús Reyes	91120020	oficial	
3	Albeiro Sanchez	80078540	oficial	
4	WILMAN MANGUNA T	1098699774	TECNICO	
5	Luis Alberto Celis C.	91256993	Ayudante	
6	Miguel Angel Romero Romero	1696193789	Ayudante	
7	Andres Castro	1098713857	Oficial	
8	Jose Hernandez Nuvo	1005162787	tecnico	Jose Nuvo
9	Ronald Viño	1098742342	Tecnico	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Eleu Uribe Lora	Eleu Uribe Lora

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldia Bmanga SPuc	20	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Condiciones + actos inseguros
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andres M Vargas	1095929680	Maestro	
2	Johan Cedeño	1095309588	Electricista	
3	Jaime Prado Ruiz	1100070	oficial	
4	[illegible]	1761962	oficial	
5	Edward Quiroz Rocha	1084924276	Electrico	Edward Quiroz
6	Jeison Julian Delgado	1102370313	AUX	
7	Alvaro Reyes	1102367744	tecnico	
8	WILLIAM MAYORGA TORRADO	1098699774	TRANSIS	
9	Jercy Liliana Martinez	1098721099	E. Intv.	Jercy M
10	JAVIER AROCA	1062851135	Intv.	
11	Jose Luis Duarte	1098724158	SST Intv	
12	Saulo Gutierrez	37.371.342	Electrico Sst	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Elva Viviana Ramirez	Elva Viviana Ramirez

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldia Bmanga SPA	19	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Lesiones por movimientos repetitivos en el trabajo.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alvaro Delgado	1102362744	Tecnico ayte	
2	William Mayorga T	1098699774	TECNICO	
3	Alberto Jaimes	80072866	Instalador	
4	Jorge Prada Rojas	1100020	oficial	
5	Angelo Castro	1095713857	oficial	
6	Edward Quiroz Rocha	1094694276	electrigo	Edward Quiroz
7	Andy Jose Ortiz	1765261	Lego	
8	Fabian M Vargas	1095929680	Tecnico	
9	Jency Juliana Martinez	1098721099	P Interventor	Jency M
10	JAVIER AROCA	1062315135	Intv.	JAA
11	Jaydo Guerrero	37.371.342	SST Intv	Jaydo G
12	Jose Luis Duque	1098724157	Electricista	Jose Duque
13	Alberto Jaimes	80072866	Instalador	
14	Jose Fernandez NOVA	1005162787	tecnico	JOSE NOVA
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Eva Vivas Ramirez	Eva Vivas

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmga.	Alcaldía Bmga's Pud	18	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andrés M Vargas	1099729680	Auxiliar	
2	Cristian Julian Delgado	1102370313	AUX	
3	William Mayorga T	1098699799	TECNICO	
4	Alvaro Ayala	1102362704	Técnico	
5	Rodrigo Cristancho	1058713857	Oficial	
6	Fernanda Ramirez	77.179.641	Residente	
7	Hamilton Gutiérrez	17327914	Fachadas	
8	Jercy Juliana Martinez	1098721099	P. Inter	Jercy M
9	Jaime Arcos	1062315135	P. Interventor	T-A
10	Jaider Guerrero	37.371.342	JT Inter	
11	Juan Pablo Rojas	1100020	Oficial	
12	Alberto Sanchez	80078940	Instalador	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elio Vera Ramos	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024 Versión: 001 Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldia Bmanga 5 Piso	27	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Los ojos, posesión inestimables.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	Jorge Ricardo Reyes	1100020	oficial	
2	Alexander Sanchez	80072860	Inspectores	
3	Luis Harbey Gutierrez	17327 914	Fachadas	
4	Mauricio Ospina	91250	Pintor	
5	Sandra Caicedo	1098713857	Oficios	
6	Andrés M Borrero	1095796	Maestro	
7	Nilson Delgado	1102362744	tecnico ark	
8	Jerson Delgado	1102370313	Auxiliar	
9	William Mateo Tafur	1098699777	Tecnico	
10	Alexander Ramirez	771179.608	Lineier	
11	Jonier Ledel	1055309388	Electrico	
12	Jency Juliana Martinez	1098721099	E. Interv	
13	Jaider Guerrero	37.371.342	SST INT.	
14	JAVIER AROCA	1062315135	E. Interv	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elder Viera Ramirez	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldía Floridablanca Piso 4	15	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Autocuidado
Charla de seguridad	x	Izaje de carga
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		trabajo en Altura.
Seminario / Taller / Curso		Señalizacion de Areas y tipos de trabajo
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Diana Marcela Castro	1095921730	Aux Vial	
2	Luisa Fernanda Niño	1234341130	Aux. Vial	
3	Robinson Rico	1100956345	Operador Gru	
4	Martin Morales	1.098.227.274	AP Civil	
5	Juan Taschas	1.094.894.464	Ing Proyecto	
6	Alvaro Delgado	1102362711	Tecnico	
7	William Mayorga Tarazona	1098699774	Tecnico	
8	Gerson Alvaro Delgado	1102370313	Aux Mantenimiento	
9	Jose Daniel Rodriguez	1093774594	Gerente	
10	Faisal Yamid Duarte Cruz	1098806212	Coordinador	
11	Alexander Pinto	37.179.641	Vendedor	
12	Jency Martinez	1092721099	P. Intv	
13	Jaider Guerrero	37.371747	SST Int	
14	Jhonier Mesa	1062315135	E. Ind	
15	Luis Heiber Contreras	1752279114	Of: Fachada	
16	Andrés M Vargas	1098296861	Electricista	
17	Jaime Pinto Reyes	21100020	Oficial	
18	Alvaro Sanchez	80072840	Instalador	
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elba Nuñez Ramirez	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldia Bmanga Sptd	14	03	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		(Cual?) Peligros Electricos y sus consecuencias al manipularlos
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	Johan Cediel	1095309386	electricu	Johan
2	Andrés M Vargas	1095929680	Mecanico	
3	Mly una alt	1AGRAL	Alst	
4	Edyad Gomez Rocha	1084974276	Electrico	Edyard
5	Fernando Ramirez	77'179.645	Ingeniero	
6	Ronald Niño	1098342342	Electricista	
7	Jose Hernandez Nava	1005162787	tecnico	Jose Naa
8	Sandra Carreño	1098713857	Oficial	
9	Hanoy Gutierrez	17377914	maestro	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elva Viviana Ramirez	Elva Viviana Ramirez

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto- 2024
		Versión:	001
			Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldía Bmanga 5 piso	13	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alexander Reyes	Cedula de	Contratista	
2	Andres Pacheco	1098721857	Apoyo	
3	Yadira Yamile Vargas	37572968	Asesora	
4	Orlando Acevedo	91250509	Profesional	
5	Adelaida Maria Ariz	176846	Profesional	
6	Alvaro Delgado	1102362764	Tecnico ave	
7	Jose Hernandez	1005162787	tecnico	JOSE N.
8	Ronald Niño	1098742342	Tecnico	
9	Jency Juliana Martinez	1098721099	P. Interventor	JencyM
10	JAVIER ARCOS	1062315135	Residente Interv	J. A
11	Saudes Guevara	37.371.342	SST Interv.	Saudes G
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elva Yuvera Ramirez	Elva Yuvera Ramirez

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto- 2024
		Versión:	001
			Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldo Bmanga SP	12	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Es necesario proteger los pies en los lugares de trabajo.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alex Urrea ortiz	1762961	electricista	
2	Edward Reina Rocha	1084924276	Electrico	Edward Reina
3	Johan Ramirez Cadiel	1075309388	electrico	Johan Cadiel
4	Orlando Higuera	91250541	Perito	
5	Andres Castro	1098713851	Oficial	
6	Andrés M Vargas	1095919620	Electro	
7	Alexander Ramirez	77'174.645	Conductor	
8	Jency Juliana Martinez	1098721099	E. INT.	Jency M
9	JAVIER ARCA	1037137J	E - INT	T.A
10	Saides Figueroa	37.371.342	SST Intv	Saides F
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elva Urrea Ramz	Elva Urrea Ramz

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bmanga	Alcaldía Bmanga 5 Pi	11	03	27

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Buen manejo y Apilamiento de materiales y residuos sólidos
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Mogollones	91250541	Residente	
2	Andrés F Vargas	1095929680	Ayudante	
3	Andrés Castro	1098713857	Ayudante Residente	
4	Jaider Guevara	37-371342	Sst Tec IV	
5	JAVIER AROCA	1062315635	R. Interventoría	T.A
6	Jency Tatiana Martinez	1098721099	Residente Interv	Jency Mart
7	Alexander Ramirez	77.179.647	Residente	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Elva Ana Ramirez	Elva Ana Ramirez

Powered by CamScanner

ANEXO N°6

REGISTRO INSPECCIONES SST

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-061
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Fecha: ago-24 Versión: 001 Pagina 1 de 1

FECHA: 12 de Marzo - 2025

AREA INSPECCIONADA: Areas administrativas Piso Apartado Bodega II fase

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Elva Viviana Ramirez Cad

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Orlando Marchan	Pulidor	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓							✓			
2	Andres Mosquera	Oficial de obra	✓	-	✓	✓	✓	✓			✓		✓							✓			
3	Jaime Prada	Instalador de Vidrio	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
4	Andres Narso	maestro	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
5	Alberto Sanchez	Instalador de Vidrio.	✓	✓	-	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
6	Alvaro Delgado	tecnico Aires Acondicionado	✓	-	-	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
7	William Medina	tecnico Aires Acondicionado	✓	-	-	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
8	Jose Hernandez.	Ayudante Aires Acondicionado	✓	✓	-	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
9	Gerson Delgado	Ayudante Aires Acondicionado	✓	-	-	✓	✓		✓		✓		✓							✓			
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA									
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									


DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- OVEROL / CAMISA -PANTALON	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? CAMIBUSO	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES: Se socializa al personal el uso obligatorio de los Elementos Proteccion Personal dependiendo las actividades

FIRMA: Elva Viviana Ramirez Cad
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: Elva Viviana Ramirez
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

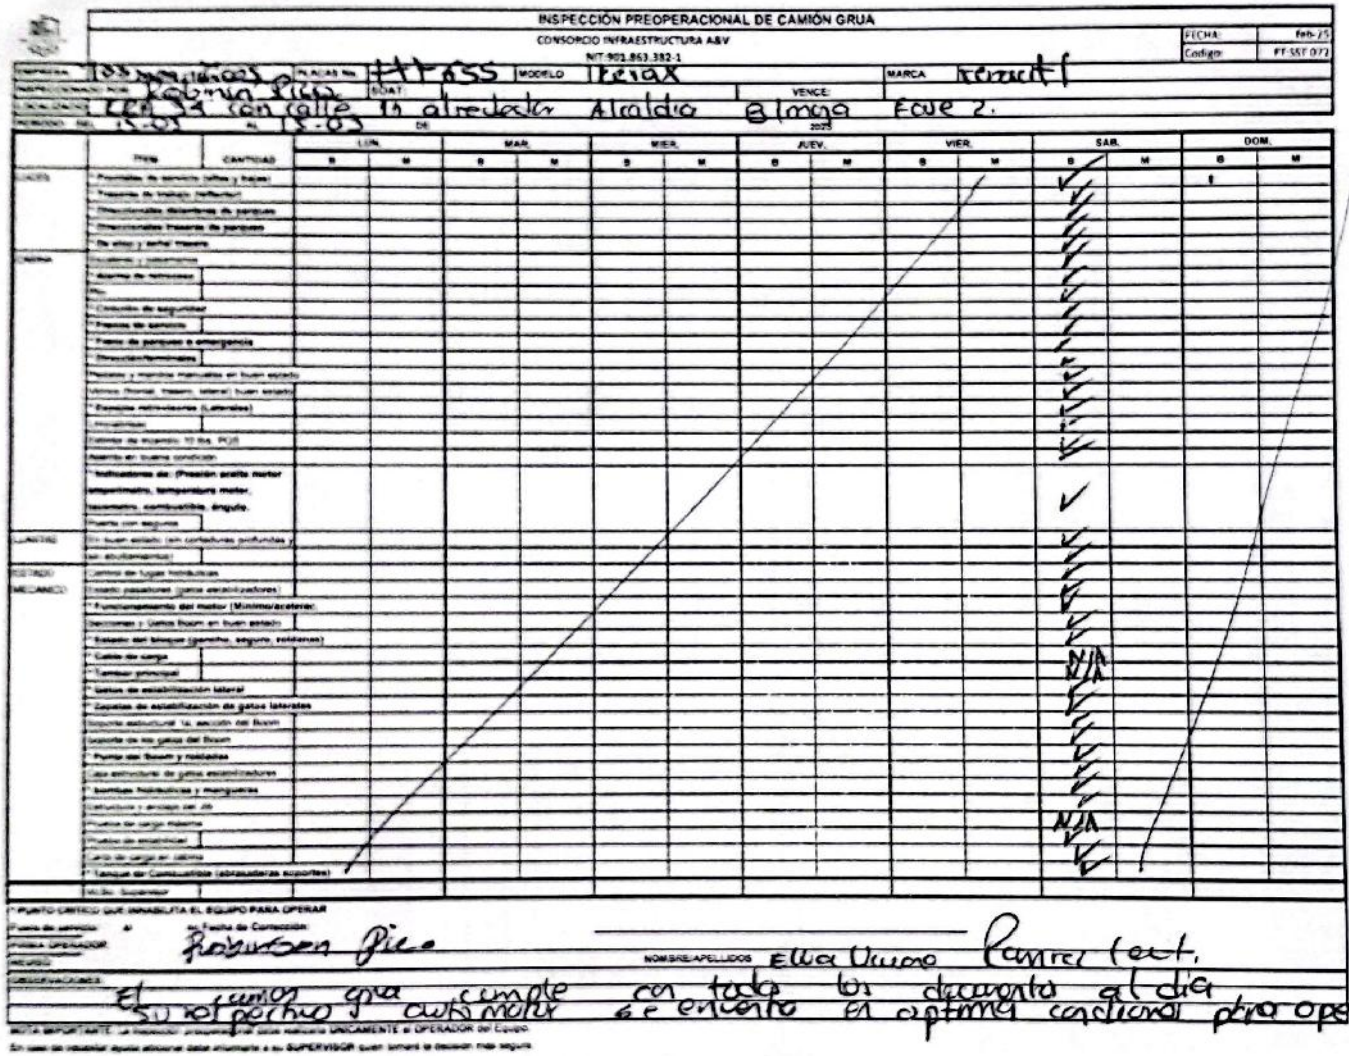

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CAMIÓN GRUA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

NIT 901.863.382-1

FECHA: Feb-25

Código: PT-SST 072

EMPRESA: Transportes Pico | PLACAS No.: HTP 055 | MODELO: Peiax | MARCA: Foton

CONDUCTOR: Roberto Pico | SOAT: | VENCE:

UBICACIÓN: Cra 34 con calle 19 alrededor Alcaldia Almaga Fase 2.

PERIODO: No. 15-03 AL 15-03 DE 2025

	ITEM	CANTIDAD	LUN. D	LUN. N	MAR. D	MAR. N	MIER. D	MIER. N	JUEV. D	JUEV. N	VIER. D	VIER. N	SAB. D	SAB. N	DOM. D	DOM. N
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)												✓		✓	
	* Traseras de trabajo (reflectivas)												✓			
	Direccionales delanteras de parqueo												✓			
	Direccionales traseras de parqueo												✓			
	De stop y señal reversa												✓			
CABINA	Asientos y cinturones												✓			
	Apertura de retrovisores												✓			
	Pito												✓			
	Extintor de seguridad												✓			
	Frenos de servicio												✓			
	Freno de parqueo o emergencia												✓			
	Direccion/limpiabrisas												✓			
	Espejos y mandos manuales en buen estado												✓			
	Llantas (frontal, trasero, lateral) buen estado												✓			
	* Pasadores retrovisores (Laterales)												✓			
	Pitos/alarmas												✓			
	Cabina de izqueirdo TD 6x4, P08												✓			
	Asiento en buena condición												✓			
	* Indicadores de: (Presión aceite motor amperimetro, temperatura motor, kilometro, combustible, angulo.												✓			
	Puerta con seguros												✓			
LLANTAS	En buen estado, sin cortaduras profundas y sin abultamientos												✓			
	Cantos de lugas hidraulicas												✓			
	Puesto pasadores (pines estabilizadores)												✓			
	* Funcionamiento del motor (Mínimo/acelerar)												✓			
	Mangueras y cables frozm en buen estado												✓			
	* Estado del bloque (gancho, seguro, roldanas)												N/A			
	* Cable de carga												✓			
	* Tambor principal												✓			
	* Gatos de estabilización lateral												✓			
	* Zapatas de estabilización de gatos laterales												✓			
	Soporte estructural de sección del fluom												✓			
	Soporte de los gatos del fluom												✓			
	* Pumo del fluom y mandatos												✓			
	Las estructura de gatos estabilizadores												✓			
	* bombas hidraulicas y mangueras												✓			
	Estructura y anclaje del JIB												N/A			
	Prueba de carga maxima												✓			
	Prueba de estabilidad												✓			
	Carga de carga en cabina															
	* Tanque de Combustible (abrazaderas soportes)															
	Nivel Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Firma de aprobación: | Fecha de Corrección:

FIRMA OPERADOR: Roberto Pico | NOMBRE/APELLIDOS: Elkin Ulises Pantoja Fest.

RECIBIO:

OBSERVACIONES: El camion que cumple con todos los documentos al dia su estado mecanico y automotor se encuentra en optimas condiciones para operar.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo

En caso de novedad deberá informar dicha situación a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

CODIGO: FT-SST-84
Version: 01

1 Generalidades

FECHA: DIA 08 | MES 03 | AÑO 2025
HORA: Desde(00:00) 7:30am | Hasta (aa) 6:00pm
EMPRESA EJECUTORA: Contratista Arkos Vidrio
Nº CONTRATO: Bga 044
ÁREA O LUGAR: Alcabia Bimaga 5 Piso Fase II
Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2
ACTIVIDAD A REALIZAR: Manejo de soldadora y maquina de corte de laminol y vidrio - perforcion de huecos en el piso
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: soldadora, Maquina de corte

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			✓
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	✓		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?			✓
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	✓		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?			✓
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)			✓
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?			✓
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	SI	NO	N/A
3 Equipos y elementos de protección personal requeridos			
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?			✓
El trabajador cuenta con la careta para soldar con libre para soldadura			✓
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			✓
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			✓
		SI	NO
4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)		✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.		✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)		✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES N/A			

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [ ] NO [✓]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____ Marque con "X" según aplique

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [X]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [ ]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) Mitigar el riesgo y el uso obligatorio de los elementos Proteccion Personal

7 Firmas finales y Responsabilidades

EMISOR: He verificado en compañía con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

NOMBRE: Elisa Vivas Ramos CC 63 506 940 Bga
FIRMA: Elisa Vivas Ramos

EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
X 08-11-24	X Jairo Yovani Rueda	X 80021820	X
X 28-11-24		X 2100020	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V


PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS


Codigo: FT-SST: 027
Version: 01
Fecha: 29-08-2024


INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO	02-03-2025	PERMISO VALIDO HASTA	15-03-2025.
ACTIVIDAD A REALIZAR	instalacion y mantenimiento puerta del Vid	NUMERO DE PERSONAS EJECUTADORAS	2
EMPRESA EJECUTADORA	Contratista Arkos SA	AREA O LUGAR	Alcaldia Monteria 5 PISO Torre 1

TIPO DE EQUIPO A OPERAR

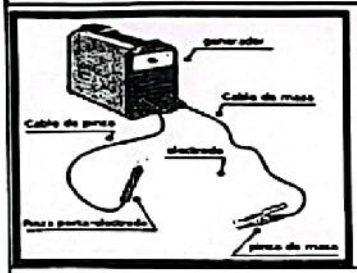

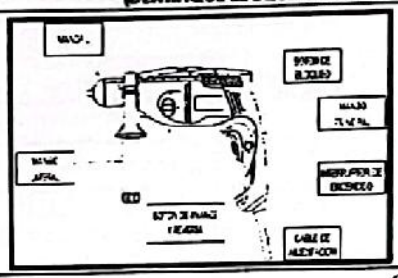

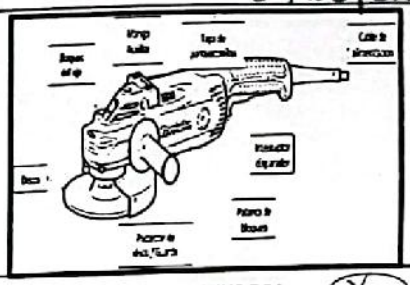

EQUIPO PARA ELECTRODOS		TALADRO	X	PULIDORA	X

OTROS EQUIPOS ¿Cuáles?

ASPECTOS A VERIFICAR PARA SU USO

CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO
1. Estado General del equipo			1. Estado general del mando auxiliar	✓		1. Estado general del mando auxiliar	✓	
2. Estado General de los interruptores de encendido y regulador			2. Estado general del boton de bloqueo	✓		2.Estado general de la guarda de seguridad	✓	
3. Estado General del cable de la masa - Incluye pinzas			3.Estado general de la boton de avance y reverso	✓		3. Estado general de la palanca de bloqueo	✓	
4. Estado General del cable electrodo - incluye el porta electrodo			4.Estado general de interruptor de encendido	✓		4. Estado general de interruptor de encendido	✓	
5. Estado General del electrodo o barra de soldadura			5.Estado general del mandril y llave	✓		5.Estado general del cable de alimentaciónEstado general del cable de alimentación	✓	
6. Estado General de las conexiones eléctricas del			6.Estado general de la carcaza del taladro	✓		6. Estado general de la carcaza de la pulidora	✓	
7. Extintor cerca al área de trabajo			7. Estado general de las conexiones electricas	✓		7.Estado general de la conexiones electicas	✓	
			8. Extintor cerca al área de trabajo	✓		8.Estado general del disco de la pulidora	✓	
DOCUMENTACION	SI	NO	DOCUMENTACION	SI	NO	DOCUMENTACION	SI	NO
8.Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida		
9. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos		
10. Cuenta con Programa de Mantenienio de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenienio de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenienio de equipo		
11. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12.Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

MANTENIMIENTO

PULIDORAS	FECHA ULTIMO MANTTO	OBSERVACIONES
INVERSORES	FECHA ULTIMO MANTTO	
TALADROS	FECHA ULTIMO MANTTO	
ROTOMARTILLOS	FECHA ULTIMO MANTTO	

EL EQUIPO CUENTA CON EXTINTOR DE INCENDIOS EN FRENTE DE TRABAJO		FECHA DE RECARGA	VENCIMIENTO	PROX RECARGA	OBSERVACIONES
LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU USO?	SI	X	NO		

Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	X	
Se ha delimitado y señalizado el area de trabajo	X	

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	X		PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	
GAFAS DE SEGURIDAD O CARETA PARA PULIR	X		BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	
GUANTES DE CARNAZA	X		CARETA ESMERILAR		
GUANTES DE VAQUETA			ROPA TRABAJO (PANTALON, CHAQUETA)	X	
PROTECCIÓN AUDITIVA	X		CARETA DE SOLDADOR		
PETO EN CARNAZA O VAQUETA			MANGAS EN CARNAZA O VAQUETA		

FIRMAS EMISION Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA Desde(dd/mm/aa): 08-03-2025 Hasta(dd/mm/aa) 15-03-2025.

HORA: Desde/Hasta (hra/hra): 7:30am hasta las 6:00pm.

EMISOR: Firma Elvia Viviana Pantra cc 63506240 Y/SST

EJECUTORES

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA EJECUTORES	VALIDACION / SST
08-03-2025	X Alberto Sanchez	X	OK
08-03-2025	X Jaime Prado Reyes	X	OK

OBSERVACIONES.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024


LUGAR QUE SE INSPECCIONA: Oficinas Administrativas SPIVO Alcaldía Bmanga Fase II FECHA: 08-03 / 2025.

HERRAMIENTA	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
	BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.					
MARTILLOS /MAZOS	X		X		
PUNZONES/MACETA/CINCELES					
OTRAS. ¿CUÁL?					
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.					
LLAVE MIXTA					
LLAVE INGLESA					
LLAVE ESTRIA O DE TUBO					
LLAVE ALEMANA					
COPAS/DADOS					
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO:	X		+		
ACCESORIOS					
RATCHES Y TORQUES					
OTRAS. ¿CUÁL?					
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar..					
SEGUETAS	X		+		
SERRUCHO					
CORTA TUBOS					
TIJERAS					
MACHETE					
OTRAS. ¿CUÁL?					
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.					
TALADROS	X		+		
LIJADORA					
MOTORTOOL					
OTRAS. ¿CUÁL? X+ G	+		+		
Sierra Circular corte de lamina y perfiles	X		X		
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.					
TALADRO DE MANO	X		+		
TALADRO DE ÁRBOL					
ESMERIL					
PULIDORAS	X		+		
CALADORA					
PINZAS					
OTRAS. ¿CUÁL?					
METROS	X		+		
PISTOLA DE SILICONA	X		+		
OTRAS. ¿CUÁL?					

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN						
BARRA						
EQUIPO DE SOLDADURA						
MANGUERAS						
DESTORNILLADORES	X		X			
NIVELADORA DE MADERA						
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.	X		X			
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas						
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado					no tien tablero Herramientes	
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)	X		X			
OTRAS. ¿CUÁL?						

Responsable de la Inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Jaime Andres Ramirez	NOMBRE: Alberto Sanchez	NOMBRE: Elva Vivian Ramirez
CARGO: operario de soldador	CARGO: instalador	CARGO: Residente SST
CÉDULA:	CÉDULA: 80072821	CÉDULA: 63506440
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024


LUGAR QUE SE INSPECCIONA: Oficinas administrativas, Parillo + recepcion Alcaldia Fonseca S PUO - Contratista polvo Pasa FECHA: 19-03-2025.

HERRAMIENTA	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
	BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.					
MARTILLOS /MAZOS					
PUNZONES/MACETA/CINCELES					
OTRAS. ¿CUÁL?					
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado, El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.					
LLAVE MIXTA					
LLAVE INGLESA					
LLAVE ESTRIA O DE TUBO					
LLAVE ALEMANA					
COPAS/DADOS					
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO:					
ACCESORIOS					
RATCHES Y TORQUES					
OTRAS. ¿CUÁL?					
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.					
SEGUETAS					
SERRUCHO					
CORTA TUBOS					
TIJERAS					
MACHETE					
OTRAS. ¿CUÁL?					
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y mangultos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.					
TALADROS					
LIJADORA					
MOTORTOOL					
OTRAS. ¿CUÁL?					
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeados, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.					
TALADRO DE MANO					
TALADRO DE ÁRBOL					
ESMERIL					
PULIDORAS					
CALADORA					
PINZAS					
OTRAS. ¿CUÁL?					
METROS					
PISTOLA DE SILICONA	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL?					
maguna polichada para pisos	✓		✓		

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN						
BARRA						
EQUIPO DE SOLDADURA						
MANGUERAS						
DESTORNILLADORES						
NIVELADORA DE MADERA						
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.	✓		✓			
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceites grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas						
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguno de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado						
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)						
OTRAS. ¿CUÁL?						

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Orlando Manuel	NOMBRE: Orlando Herrera	NOMBRE: Elida Lucia Ramos
CARGO: pulidor de pisos	CARGO: pulidor de Pisos	CARGO: SSTA
CÉDULA: 91250541	CÉDULA: 91250541	CÉDULA: 63506940
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 03 al 15 Mes Marzo 2025	AREA: Opecion operativa	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Ulloa Ramirez	GRUPO DE TRABAJO:	Contratista Arkul

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE MANO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES


Se recomienda el uso del guardo o protector en las pulideras.

x Alberto Suarez	x Jhon Fredy Reyes	Elda Ulloa Ramirez
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN						
BARRA						
EQUIPO DE SOLDADURA						
MANGUERAS	✓					
DESTORNILLADORES	✓					
NIVELADORA DE MADERA	✓					
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.	✓					
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas						
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidos contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, estén señalizado					No tienen tablero de Herramientas.	
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)					No tienen caja de Herramientas	
OTRAS ¿CUÁL?						

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: André Vargas	NOMBRE: Andres Vargas	NOMBRE: Elva Yuca Rume
CARGO: Yacilo	CARGO: Yacilo	CARGO: Padre SSTA
CÉDULA: 1049724620	CÉDULA: 1095729620	CÉDULA: 63506940
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT- SST: 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 08-2024

LUGAR QUE SE INSPECCIONA: corre: Administrativa oficinal Alcaldia 5 Piso Bitrongo — Grupo: Obra Civil FECHA: 18-03-2025

HERRAMIENTA	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
	BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o flojo con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.					
MARTILLOS /MAZOS	✓		✓		
PUNZONES/MACETA/CINCELES	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL?					
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.					
LLAVE MIXTA	✓		✓		
LLAVE INGLESA					
LLAVE ESTRIA O DE TUBO					
LLAVE ALEMANA					
COPAS/DADOS	✓		✓		
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO:	✓		✓		
ACCESORIOS	✓		✓		
RATCHES Y TORQUES					
OTRAS. ¿CUÁL?					
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.					
SEGUETAS	✓		✓		
SERRUCHO					
CORTA TUBOS	✓		✓		
TIJERAS	✓		✓		
MACHETE					
OTRAS. ¿CUÁL?					
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y mangultos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y nudos que obstaculicen el paso del aire.					
TALADROS	✓		✓		
LIJADORA					
MOTORTOOL	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL? polidora	✓		✓		
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.					
TALADRO DE MANO	✓		✓		
TALADRO DE ÁRBOL					
ESMERIL			✓		
PULIDORAS	✓				
CALADORA					
PINZAS	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL?			✓		
METROS	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL?					
Ratchet	✓		✓		

Powered by CamScanner

ANEXO N°7

REGISTRO PERMISOS DE TRABAJO

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: FT-SST :030 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Agosto - 2024 PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa Persona: Cinthya Catalina Fajardo	Ciudad: Bmga	Lugar de Trabajo: 6 piso zona	
Area/Proceso: Operativo - Logistica	Sede donde se realiza el trabajo: Alcaldia Bmga 6 Piso	Vigencia del Permiso: 7-03-25.	
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): 14-03-25	Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm	

Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
1732?-01[illegible]	[illegible] H-Entrenador	apto	oficial fachad	apto	

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos de trabajos en alturas a realizar: Limpieza y lavado de fachada, retiro pintura anormal

Herramientas a utilizar: hidrolavadora, Herramientas manuales, extension, manejo de agua.

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 9 mts.

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☐	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	Se involucran otras Trabajo Alto Riesgo TAR:	SI ☒ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐
Otros (¿Cuáles?) Línea de vida, eslinga de retroceso				Otras (¿Cuáles?) Izaje de Cargas.				

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Línea de vida vertical	SI ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	SI ☐ No ☐	Sistemas de anclaje	SI ☒ No ☐	Arnés de cuerpo entero	SI ☒ No ☐	Guantes	SI ☒ No ☐
Línea de vida horizontal	SI ☒ No ☐	Eslinga	SI ☒ No ☐	Casco con barboquejo	SI ☒ No ☐	Señalización del área	SI ☒ No ☐	Gafas	SI ☒ No ☐

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuales?)

Casco Dieléctrico	☒	Guantes	☒	Protección Arco Eléctrico	☐
Manguitos Seguridad	☒	Botas Dieléctricas	☒	Peto Carnaza	☐
Prot. Auditiva	☒	Botas de Seguridad	☐	Kit Guantes Dieléctricos	☐
Mascarilla	☐	Ropa de Trabajo	☒	Careta Protección	☐
Respirador	☒	Otros	☐		
Equi. Protecc. Respiratoria	☐				

Equipos de comunicación: celular

Equipo de rescate: kit de retroceso en Altura. Mincadado 2 mosquetones alendador,

Otros:

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)	X			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos.	X		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	X			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.	X		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	X			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	X		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	X			Existe presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	X		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	X			El lugar donde realizara la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador cuenta permanece.	X		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	X			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	X		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está señalado y señalizado completamente.	X			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			X
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.	X			Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			X
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.			X	Los cases o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			X
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.	X			Se ha dispuesto de los elementos necesarios para subir y descender la herramienta.	X		
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	X			Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			X
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.	X			Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			X
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.	X			Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.			X
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	X						

Nombre y Cedula del Supervisor: Luis Hernan Cortes [illegible]	73227417 Firma:
Nombre y firma de persona autorizada Coordinador Alturas: Edwin Ramos Cel 3350940	Firma:
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo): Hernan Gomez 77179 CAS	Firma:

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, pamillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Cuando se designe un vigilante de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT-SST 034
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	VERSIÓN: 001
	Formato de Inspección Trabajo en Alturas	FECHA: 08-2024

ÁREA DE TRABAJO: fachada exterior CRA 11 con 34 — FECHA: 15-03-2025.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TAREA QUE REQUIERE EL TRABAJO EN ALTURA: Limpieza, lavado, retiro brecha, tendidonuevo brecha, tendido de Bajante

Nombre y apellidos del funcionario: Harvey Gutierrez — C.C: 77.327.914 — Cargo: oficial de mantenimiento

Nota: verificar el estado en que se encuentran los equipos de protección contra caídas, epp, sistemas de acceso y los equipos de seguridad.
Colocar X (SI) cuando se cumpla con el criterio, colocar (NO) cuando no se cumpla con el criterio, el control del presente documento de realizará de manera semanal.

Marque con una X (SI), (NO) ó N/A realizando la inspección de cada uno de los elementos que se relaciona a continuación

		15/03/25			16/03/25			17/03/25			18/03/25			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			Observaciones
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	
CAPACITACIÓN (CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN)	Conoce la tarea a realizar?	X			X			X			X																											
	Recibió capacitación en el procedimiento y estándar para trabajos en altura?	X			X			X			X																											
	El estado de salud del trabajador es ideal para realizar la tarea?	X			X			X			X																											
CUENTA CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Casco con barbuquejo?	X			X			X			X																											
	Botas de seguridad?	X			X			X			X																											
	Protección visual?	X			X			X			X																											
	Guantes?	X			X			X			X																											
	Ropa de trabajo adecuada a los factores de riesgo	X			X			X			X																											
CUENTA CON EQUIPOS DE SEGURIDAD	Equipos de rescate? (cuerdas, escaleras otros)	X			X			X			X																											
	Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X																											
	Señalización y demarcación de área de trabajo?	X			X			X			X																											
CUENTA CON SISTEMAS DE ACCESO	Andamios?		X						X			X																											
	Plataformas?		X						X			X																											
	Escaleras?		X						X			X																											
	Barandas?		X						X			X																											
	Otros?	X			X			X																														
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Arnés de cuerpo completo?	X			X			X			X																											
	Puntos de anclaje?	X			X			X			X																											
	Mecanismos de anclaje?	X			X			X			X																											
	Eslingas?	X			X			X			X																											
	Líneas de vida?	X			X			X			X																											
	Conectores?	X			X			X			X																											
	Otros?																																					

ELABORÓ:	REVISÓ: Elva Vivas Ramos	APROBÓ: si
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE: Elva Vivas Ram
CARGO	CARGO: SSTA	CARGO: SSTA

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ASV	FECHA FEB 2026	Código	FT:SST 073
			Versión	1
	FORMATO PERMISO IZAJE DE CARGAS		Página 1 de 2	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	15	3	2025	HORA	7:00	LUGAR	calle 34 con LEA 11 alrededor Arabia Mimanga fase 2

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD", AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	CONDICIÓN DE SALUD (Apto, no apto)	EPS	AFP	ARL
Robinson Pico	OP Grua	apto	Sanitas	Porvenir	Sura

Firma de los trabajadores (ejecutores) (nombre, firma y nro. De cedula)
conocen los riesgos, comprenden las precauciones que deben ser tomadas y me comprometo a desarrollar el trabajo cumpliendo las medidas de seguridad establecidas, procurando el autocuidado, cumpliendo procedimientos y evitando actos inseguros, así como reportar cualquier daño de equipos o incidentes y/o accidentes presentados

TIPO DE TRABAJO: IZAJE DE CARGA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Izaje de Carga de levantar y bajar maquina condensadora y manejadora Hilos Acondicionados

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: DESCENTE: X ASCENTE: X

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	15	03	2025	HORA:	7:00	HASTA:	FECHA	15	03	2025	HORA:	12:00 pm

LISTA DE VERIFICACION

ITEM		SI	NO	NA	ITEM		SI	NO	NA
1	El personal se encuentra afiliado a seguridad social	✓			10	El personal ha sido capacitado en relación con las actividades a desarrollar	✓		
2	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	✓			11	El personal ha sido instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante el trabajo	✓		
3	Se verificó que solo intervenga en la maniobra personal entrenado y autorizado para su ejecución	✓			12	El personal cuenta con todos sus elementos de protección personal adecuados a la labor	✓		
4	Se encuentran identificados los riesgos propios de la labor a realizar	✓			13	Permite los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas, etc.) realizar los trabajos con seguridad	✓		
5	Disponen de los equipos y/o maquinaria disponible realizar la labor con facilidad	✓			14	Los equipos y maquinarias se encuentran ubicados en un lugar seguro	✓		
6	Se conocen las especificaciones técnicas del equipo / carga a movilizar	✓			15	Se verifico que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración	✓		
7	Se tienen en cuenta las dimensiones (alto, ancho, largo, peso, volumen) del material a movilizar	✓			16	Se tiene claro un plan en caso de emergencia (vías de evacuación, ubicación de extintores, etc.)	✓		
8	Se verificó que las condiciones del suelo permitan una maniobra segura de los equipos y vehículos	✓			17	En caso de maniobras con productos químicos se tienen las hojas de seguridad disponibles	✓		
9	Se verificó el estado de la maquinaria o equipo disponible para realizar la labor (preoperacional)	✓			18	Requiere permiso adicional: TRABAJO EN ALTURA			X

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS		KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES		ESCALERA TIJERA	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPÓSITO O DIELÉCTRICO, SEGÚN APLIQUE)		DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

reatas, ganchos, brazo hidraulico, poleas, conecal, pretales,

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

Firma del supervisor y/o jefe (emisor) (nombre, firma y nro. De cedula) " personalmente he verificado la preparación de los equipos y/o área para el trabajo y lo considero seguro para proceder con su ejecución y me comprometo a velar para que se mantengan durante la ejecución del trabajo las condiciones de seguridad establecidas en el presente permiso, con el objetivo de evitar que ocurran accidentes y/o incidentes a las personas, equipos, instalaciones, medio ambiente."

NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Elda Viviana Ramirez	Elda Viviana Ramirez	63.566.940
Alexander Alemnez	Alexander	77.191.695.
Jency Martinez	Jency M	1.098.721.099.

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

FECHA	15-03-25	HORA	9:00 AM	FIRMA		RESPONSABLE DEL AREA	Alexander Ramirez	FIRMA	
RESPONSABLE DEL TRABAJO	Robinson Pico			Robinson Pico					

Powered by CamScanner

ANEXO N°8

CERTIFICADO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Carrera 37 # 52 - 43 Of 401
Tel: 6455295
proinpark.sa@gmail.com
Bucaramanga, Santander

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN No. BOT314-2103

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICIÓN FINAL
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Documento de identificación o NIT	901.863.382-1
Representante Legal	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
Dirección domicilio	CALLE 19 No. 4 – 19 0FICINA 603, NEIVA HUILA
Teléfono	315 8487874
Correo electrónico	consorcioinfraestructuraav@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CRA 11 No. 34 – 52 FASE II ALCALDIA DE BUCARAMANGA PISO 5 CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA RAMA JUDICIAL
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	11,2 t
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	11,2 t
Fecha de recepción de los RCD	17 DE DICIEMBRE DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1m3 equivale a 1,6t
** Certificado ajustado a la Resolución 1257 de 2021*

Powered by CamScanner

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Carrera 37 # 52 - 43 Of 401
Tel: 6455295
proinpark.sa@gmail.com
Bucaramanga, Santander

ProinPark

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN No. BOT270-1813

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICIÓN FINAL
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Documento de identificación o NIT	901.863.382-1
Representante Legal	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
Dirección domicilio	CALLE 19 No. 4 – 19 0FICINA 603, NEIVA HUILA
Teléfono	315 8487874
Correo electrónico	consorcioinfraestructuraav@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CRA 11 No. 34 – 52 FASE II ALCALDIA DE BUCARAMANGA PISO 5 CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA RAMA JUDICIAL
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	6,4 t
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	6,4 t
Fecha de recepción de los RCD	19 DE OCTUBRE DE 2024

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1m3 equivale a 1,6t
** Certificado ajustado a la Resolución 1257 de 2021*

Powered by CamScanner

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Carrera 37 # 52 - 43 Of 401
Tel: 6455295
proinpark.sa@gmail.com
Bucaramanga, Santander

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN No. BOT314-1807

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICIÓN FINAL
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Documento de identificación o NIT	901.863.382-1
Representante Legal	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
Dirección domicilio	CALLE 19 No. 4 – 19 0FICINA 603, NEIVA HUILA
Teléfono	315 8487874
Correo electrónico	consorcioinfraestructuraav@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CRA 11 No. 34 – 52 FASE II ALCALDIA DE BUCARAMANGA PISO 5 CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA RAMA JUDICIAL
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	22,4 t
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	22,4 t
Fecha de recepción de los RCD	12 DE OCTUBRE DE 2024

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1m3 equivale a 1,4t
** Certificado ajustado a la Resolución 1257 de 2021*

Powered by CamScanner

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA con cédula de ciudadanía No. 7.688.899, y con tarjeta profesional No. **164666-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador publico de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V** identificada con NIT No. **901.863.382-1,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que el **Consorcio Infraestructura A&V** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 21 días del mes de marzo de 2025.

FRANICISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
C.C. Nro 12.370.591 de Rivera-Huila
Representante Legal Consorcio Infraestructura A&V

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
C.C. Nro 7.688.899 de Neiva-Huila
T.P No.164666-T
Contador Publico Consorcio Infraestructura A&V

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F22B664A944F1903

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7688899 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 164666-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

164666-T



DIEGO ARMANDO
ROJAS LAGUNA
C.C. 7688899
RES. INSCRIPCION 12 DEL 16/02/2012
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

285070

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

175373

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.688.899

ROJAS LAGUNA
APELLIDOS

DIEGO ARMANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1971
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-DIC-1989 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1900100-50155942-M-0007688899-20070507 05087 07127A 02 210601952

ANEXO N°1

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-19, 10:50:15 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76671956

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 19/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AYV	**Nombre Sucursal**	CONTRATO RAMA	**Código Sucursal**	3
Documento	NI901863382	**Dirección**	CL 9 #4 - 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63506940	ELVA VIVIANA RAMIREZ LEAL	01	00	X									X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.148.986	$ 343.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.148.986	$ 86.000	6,960	$ 2.148.986	$ 149.600	(CCF39) CAJASAN	$ 2.148.986	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.500
CC 77179645	ALEXANDER RAMIREZ MARQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.437.500	$ 390.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.437.500	$ 97.500	6,960	$ 2.437.500	$ 169.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.437.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.586.486	$ 4.586.486	$ 4.586.486	$ 4.586.486	$ 733.900	$ 183.500	$ 319.300	$ 183.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.420.200	$ 0	$ 1.420.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N°2

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

Su Aporte

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 11:15 AM **Tipo Planilla:** E: EMPLEADO **Número Planilla:** 76010055

Periodo Cotización: Marzo de 2025 **Periodo Servicio:** Abril de 2025

PAGADA 13/03/2025

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRATIVO	**Código Sucursal**	002
Documento	CC 80072840	**Dirección**	CL131C #126 - 82		
Tipo de Empresa	DEPENDIENTE	**Teléfono**	2000000		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTAD.C.	**Departamento**	BOGOTAD.C.		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESA	Aporte Ministerio	Total
CC 80072840	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	01	00																		0	30	0	0		$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR	$1.423.500	$177.937	$ 0	$ 0	$ 0		$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTALSIN INTERESESDE MORA	TOTAL, INTERESES DE MORA	TOTAL, FINAL
$ 0	$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegerel medio ambienteestá en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800222462	4	LOS MAGNIFICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOS MAGNIFICOS SAS	calle 70 44w-567 km 5 via giron	BUCARAMANGA-SANTANDER	6912502	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330657271	9483067217	E	2025/03/14	2025/03/12	BANCOLOMBIA	0	$14,895,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LOS MAGNIFICOS SAS (24 Afiliados)																							$50,728,198	$8,197,400			$50,728,198	$2,030,100			$50,719,965	$2,029,800			$50,728,198		$2,638,600		$0	$0		$14,895,900
Centro de Trabajo: OPERADOR (6 Afiliados)																							$12,692,500	$2,031,000			$12,692,500	$507,800			$12,692,500	$507,800			$12,692,500		$63,400		$0	$0		$3,110,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																							$12,692,500	$2,031,000			$12,692,500	$507,800			$12,692,500	$507,800			$12,692,500		$63,400		$0	$0		$3,110,000
1	CC	91043277	ARDILA SAAVEDRA PRIMITIVO																		25-14	30	$2,957,000	$473,200	EPS005	30	$2,957,000	$118,300	CCF40	30	$2,957,000	$118,300	14-11	30	$2,957,000	0.522%	$15,500	30	$0	$0	Si	$725,300
2	CC	91277308	LOPEZ VERGARA LUIS FERNANDO																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF40	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
3	CC	1005182180	MONSALVE CRUZ MARIA ISABEL																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
4	CC	37726102	RODRIGUEZ GUTIERREZ YENNY ANDREA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	91074170	ROJAS ROJAS FELIX AURELIO													X					230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF40	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$148,100
6	CC	91074170	ROJAS ROJAS FELIX AURELIO																		230301	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF40	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	0.522%	$4,300	17	$0	$0	Si	$198,000
7	CC	1095936387	TORRES DURAN SANDRA VIOLETA																		230201	30	$2,012,000	$322,000	EPS005	30	$2,012,000	$80,500	CCF40	30	$2,012,000	$80,500	14-11	30	$2,012,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$493,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800222462	4	LOS MAGNIFICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOS MAGNIFICOS SAS	calle 70 44w-567 km 5 via giron	BUCARAMANGA-SANTANDER	6912502	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330657271	9483067217	E	2025/03/14	2025/03/12	BANCOLOMBIA	0	$14,895,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$8,197,400	$0	$0	$8,197,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,266,500	$0	$0	$2,266,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,407,400	$0	$0	$2,407,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,523,500	$0	$0	$3,523,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,638,600	$0	$0	$2,638,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,638,600	$0	$0	$2,638,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,029,800	$0	$0	$2,029,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,029,800	$0	$0	$2,029,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$2,030,100	$0	$0	$2,030,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$566,300	$0	$0	$566,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$295,100	$0	$0	$295,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$214,800	$0	$0	$214,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$62,800	$0	$0	$62,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$218,400	$0	$0	$218,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$672,700	$0	$0	$672,700
TOTAL				**24**	**$14,895,900**	**$0**	**$0**	**$14,895,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649112	1	ANVAR CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 83 # 58 - 37	BUCARAMANGA-SANTANDER	3027154838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1028065759	94768298745	E	2025/03/05	2025/03/10	Bancolombia	0	1,134,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	odigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,147,000	$166,000			$4,270,500		$114,100		$0	$0		$1,134,500
Centro de Trabajo: ALCALDIA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	1098713857	MOSQUERA MARLON																		3030	30	$1,423,500	$227,800	PS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1098823056	PEREZ DEIBY		x																3030	30	$1,423,500	$227,800	PS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$435,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$435,900
3	CC	1095929680	VARGAS ANDRES																		3100	30	$1,423,500	$227,800	PS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
Total	**Afiliados(3)**																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,147,000	$166,000			$4,270,500		$114,100		$0	$0		$1,134,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649112	1	ANVAR CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 83 # 58 - 37	BUCARAMANGA-SANTANDER	3027154838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1028065759	94768298745	E	2025/03/05	2025/03/10	Bancolombia	0	1,134,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,100	$0	$0	$114,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$114,100	$0	$0	$114,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$166,000	$0	$0	$166,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$166,000	$0	$0	$166,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**3**	**$1,134,500**	**$0**	**$0**	**$1,134,500**

Su Aporte

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 11:15 AM **Tipo Planilla:** E: EMPLEADO **Número Planilla:** 76010055

Periodo Cotización: Marzo de 2025 **Periodo Servicio:** Abril de 2025

PAGADA 13/03/2025

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRATIVO	**Código Sucursal**	002
Documento	CC 80072840	**Dirección**	CL131C #126 - 82		
Tipo de Empresa	DEPENDIENTE	**Teléfono**	2000000		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTAD.C.	**Departamento**	BOGOTAD.C.		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESA	Aporte Ministerio	Total
CC 80072840	ALBEIRO FERNEY SANCHEZ CORTES	01	00																		0	30	0	0		$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR	$1.423.500	$177.937	$ 0	$ 0	$ 0		$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTALSIN INTERESESDE MORA	TOTAL, INTERESES DE MORA	TOTAL, FINAL
$ 0	$1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177,937

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegerel medio ambienteestá en nuestras manos.

mibanco

Ref. 1189585

OFICINA : VILLAVICENCIO
CAJERO : MIRLEY SANCHEZ LOPEZ
FECHA : 19/02/2025
HORA : 14:59:19
SECUENCIA : 00005290

7701-RECAUDO CONVENIOS

Convenio : SIMPLE S A SISTEMA INTE GRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS
Tipo de Recaudo : Codigo de Barras
CODIGO CONVENIO : 7709998485884
NUMERO DE PRODUCT: 8822997645
VALOR : 0000000
FECHA : 20991221
Periodo de Pago : 202502
Tipo de Pago : Deposito
Efectivo : $509.400,00*
Cheque Propio : $0,00*
Cheque Otro Banco: $0,00*
Total Pagado : $509.400,00*

- CLIENTE -

$509.400=

Préstamos: Pago Normal ☐ Abono a Cuotas ☐ Pago Total ☐
Reducir Plazo ☐ Reducir Cuota ☐ Otros ☐
Ahorro: Depósito ☐ Rec. Convenio ☐
Cta. Cte.: Depósito ☐ Rec. Convenio ☐
CDT: Constitución ☐

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE SU TRANSACCIÓN ANTES DE RETIRARSE

PAGOSIMPLE | Prefactura

26 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 Referencia pago (PIN): 8822997645

Fecha límite de pago: 2025-03-05

GUARDADA 19/03/2025

Dirección	CL 1 #1 - 1 CIUDAD DEL CAMPO CS2		
Teléfono	3123293811		
Forma Presentación	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Departamento	META		
Identificación			

DACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la ncia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las ervicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	CAMPF	Aporte Minhacienda	Total
ONES	$ 1.423.500	$ 227.800	CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	MINCULTURA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.400

IS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Sanción	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES OR	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.400	$ 0	$ 509.400

Periodo cotización salud

brero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Exito

(415)7709998485884(8020)8822997645(3900)0000000(96)20991231

unto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - cos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362744		DELGADO GUTIERREZ ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 an # 1wa34	PIEDECUESTA-SANTANDER	6482426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319625983	9482251370	I	2025/03/12	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 99.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362744		DELGADO GUTIERREZ ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 an # 1wa34	PIEDECUESTA-SANTANDER	6482426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319625983	9482251370	I	2025/03/12	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098742342		NIÑO MAZA RONALD ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 4 casa 3 villas de San Pedro	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3227229324	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319594384	9482163538	I	2025/03/11	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1098742342	NIÑO MAZA RONALD ARLEY	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 99.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098742342		NIÑO MAZA RONALD ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 4 casa 3 villas de San Pedro	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3227229324	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1319594384	9482163538	I	2025/03/11	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL __4__ FINAL _____

PERIODO DE 10 FEBRERO 2025 y al 23 MARZO 2025

CONTRATO No. : BGA-044-2024 del 06/09/2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : LICITACION DE OBRA PUBLICA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024

OBJETO : CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

LOCALIZACIÓN : Departamento de Santander, en el Área Metropolitana de Bucaramanga, en las instalaciones del edificio ubicado en la Carrera 11 No. 34-52 piso 5° - Centro administrativo municipal – Fase II, así como otras sedes judiciales que son requeridas en dicha municipalidad. (Indicar el sitio(s) donde se desarrollará el contrato)

VALOR INICIAL : MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.940.000.000) INCLUIDO IVA Y AIU

PLAZO INICIAL : 3 meses, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio.

FECHA DE INICIO : 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 27/12/2024

OTRO SI No 001	: 26/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 001	: 20/12/2024
FECHA DE PRORROGA No 001	: 04/02/2025
OTRO SI No 002	: 10/02/2025
OTRO SI No 003	: 21/03/2025
FECHA DE PRORROGA No 002	: 26/03/2025
ADICIÓN No 001 (26/03/2025)	: $ 48.382.032
VALOR CONTRATO	: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($1.988.382.032) INCLUIDO IVA Y AIU
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	: 05/04/2025
CONTRATISTA	: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V, conformado por: INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S con una participación de (50.00%) ARMELCO SAS con una participación de (50.00%)
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL, conformado por: ELOHIM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación de (99.00%) ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA con una participación de (1.00%)

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Oferta económica del contrato de obra BGA-044-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1	Suministro e instalación de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33.566
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36.403
1.5	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 34.654
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 28.517
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aproximado 2,5 m x1,63 m. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517
1.11	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	M	$ 6.832
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655
1.14	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	$ 34.905
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067
1.16	Desmonte de ducteria Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556
1.17	Retiro de impermeabilización actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16.479
1.18	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 18.835

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26.335
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13.408
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240
1.23	Demolición de muro en Drywall y/o eterboard. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	$ 25.958
1.24	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 36.555
1.25	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	$ 237.379
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13.632
1.27	Mantenimiento y limpieza de viga canal incluye tela asfáltica, emulsión asfáltica y pintura alumol.	M	$ 91.633
1.28	Desmonte, reinstalación y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornillería, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338.275
2	**IMPERMEABILIZACIONES**		
2.1	Suministro e instalación sistema de impermeabilización con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic Smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de ángulo (Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341
3.	**MAMPOSTERÍA**		
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**		
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescaza, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793
4.2	División para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120.640
4.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 111.662

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
4.4	Muro en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescaza, acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 148.596
4.5	División para mueble en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm ANCHO <80CM, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 131.057
4.6	Muro en ETERBOARD una cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescaza, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 124.131
5.	**ALISTADO DE PISOS, POLLOS**		
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54.791
5.2	Suministro e instalación de Concreto base mueble h= 0,05 M. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 96.362
6.	**PAÑETES**		
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36.849
6.2	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	$ 41.864
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21.565
7.	**CIELO RASOS**		
7.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 89.134
7.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	$ 84.080
7.3	Ventana de inspección en cielo raso Drywall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 91.277
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de elección (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalación)	M2	$ 108.342
7.5	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 100.942

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
8.	**ESTUCO Y PINTURA**		
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450
8.2	Resane de muros con estuco plástico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 14.014
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17.650
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 19.374
8.5	Suministro y aplicación de Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 23.103
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**		
9.1	Piso en cerámica antideslizante (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 137.243
9.2	Suministro e instalación de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 152.514
9.3	Piso en baldosa granito (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, pulida, cristalizada y brillada	M2	$ 172.774
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54.886
9.5	Suministro e instalación de Boca puerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	M	$ 82.180
9.6	Guarda escoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	M	$ 71.564
9.7	Piso en cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 106.315
9.8	Piso en cerámica Pizarra madera o similar (Suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M2	$ 113.398
9.9	Guarda escoba en Cerámica. (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M	$ 49.433
9.10	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	M	$ 16.845
9.11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	M	$ 46.392

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye win)	M2	$ 85.366
9.13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	M	$ 771.243
9.14	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	$ 48.991
10.	**CUBIERTA**		
10.1	Suministro e instalación de toldo fijo flotante, Incluye estructura metálica tubería 3 x 1 1/2 cal 18, perfilería en aluminio arquitectónico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748
10.2	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	M	$ 102.624
10.3	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.367
10.4	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación)	M	$ 40.989
11.	**CARPINTERIA EN MADERA**		
11.1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	$ 473.775
11.2	Mantenimiento y restauración de puerta y marco en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, así como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 149.324
11.3	Mantenimiento y restauración de mueble en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, así como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 179.286
11.4	Mueble en madera Tríplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,40-0,60 m ancho=0,40-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 346.007
11.5	Mueble en madera Tríplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 404.249
12.	**CARPINTERIA METÁLICA**		
12.1	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 911.911

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
12.2	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado e=6mm. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 1.010.623
12.3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 517.351
12.4	Rejilla piso 5x4". (Suministro e instalación)	UN	$ 50.388
12.5	Mantenimiento de ventanas en hierro (incluye inspección, pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras y cerraduras, reparación y remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 66.302
12.6	Suministro e instalación de ventana proyectante con vidrio templado laminado 3+3, Marco en ángulo cal 18 (Incluye Andamios certificados, anticorrosivo, esmalte negro, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su instalación)	M2	$ 804.776
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**		
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (métodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Código temporales) sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	UN	$ 2.471.279
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 333.723
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con porta cerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 537.954
13.4	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm, estructura en aluminio anclado para sostenerlo fabricado en tubular de aluminio y dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente (incluye herrajes, bisagras, anclajes, accesorios y todo lo necesario para su instalación	M2	$ 634.701
13.5	Suministro e instalación de dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente riel superior e inferior	M2	$ 384.860
13.6	suministro e instalación de bisagra hidráulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalación	UN	$ 569.848
13.7	Cerradura tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	$ 101.483
13.8	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 281.611
13.9	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75.774

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
13.10	Película Polarizado Nano Cerámica . (Suministro e instalación)	M2	$ 104.541
13.11	Película tipo frost con logo institucional de máximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalación)	UN	$ 59.536
13.12	Suministro e instalación de vidrio templado laminado 3+3 mm, incluye silicona antihongos	M2	$ 372.103
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	M2	$ 403.997
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**		
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126
14.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	$ 45.126
14.3	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 663.539
14.4	Lavamanos línea institucional con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería tipo push, sifón, desagüe, accesorios)	UN	$ 573.224
14.5	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 775.412
14.6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, canastilla, desagüe, accesorios)	UN	$ 380.099
14.7	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push . (Suministro e instalación)	UN	$ 313.528
14.8	Instalación grifería para aparato sanitario. (Suministro e instalación)	UN	$ 139.516
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
15.1	Red PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería abrazaderas y accesorios)	M	$ 8.365
15.2	Registro plástico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34.832
15.3	Registro plástico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.122
15.4	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 40.942
15.5	Suministro e instalación de Ducha Antivandálica con Regadera de Empotrar	UN	$ 679.904
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria, incluye revisión y destape con sonda.	M	$ 36.849
16.2	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, abrazadera y accesorios)	M	$ 54.135
16.3	Buje sanitario 4x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 15.271

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
17.1	Suministro e instalación de lampara Led 6 W de empotrar	UN	$ 17.880
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UN	$ 27.062
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	UN	$ 106.798
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aérea tipo hembra 15 A, clavija aérea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN	$ 120.813
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159.473
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803
17.8	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UN	$ 165.909
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	$ 98.119
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141
17.11	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6	M	$ 6.029
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847
17.14	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1-1/2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 27.352
17.15	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 35.761
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 71.134

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 88.145
17.18	suministro, transporte e instalación de ducto imc 2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 105.735
18.	**OBRAS EXTERIORES**		
18.1	Matera rectangular con bordes redondeados en cemento color a definir alto 0,5m ancho 0,4m largo 1 m (Incluye especie natural para exteriores altura min 50 cm, estrato y abono)	UN	$ 336.743
18.2	Base rectangular en hierro para materas, con 6 rodachines de 1x 0,4	UN	$ 164.208

	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	
	Administración	**20,00%**
	Imprevistos	**1,00%**
	Utilidad	**5,00%**
	IVA sobre Utilidad	19%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
19	**SUMINISTRO E INSTALACION**		
19.1	Juego de 2 Sillones de Exterior 1,80x 0,9 m con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura.	UN	$ 13.434.350

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
19.2	Sillón de exterior sin brazos de 0,9x 0,9 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura, Mesas de centro con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 3.479.400
19.3	Mesa de centro para exterior 0,9x0,6 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm soldada, totalmente pulida y pintada con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 2.512.900
19.4	Mesa para exterior de 180 x 90 cm, con superficie en tablones de WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger. Estructura en aluminio acabada con pintura poliéster electrostática de color a escoger. Altura 75cm. Niveladores en las patas.	UN	$ 5.895.650
19.5	Sillas para exterior con estructura de aluminio, herraje de unión exclusivo y tornillería en acero inoxidable sin soldaduras. Terminado de la estructura en pintura electrostática color a escoger Tapones en ABS inyectados de alta resistencia con Sling importado americano tipo malla con recubrimiento sintético de alta resistencia en color a escoger con protección U.V.	UN	$ 1.159.800
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o título, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	UN	$ 1.614.055
19.7	Juego Bandera de 1,50 x 1,10 m incluye bandera para interior, base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.35 m, asta desarmable de 2 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 592.877
19.8	Juego Bandera de 2,38 m x1,45 m incluye bandera para interior, base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.50 m, asta desarmable de 3 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 756.511
19.9	Banderas para exterior, material impermeable (Tempestad), doble faz con agarraderas, costuras reforzadas. Medidas de 3 x 2 metros.	UN	$ 536.729
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN	$ 5.315.750

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
19.11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera	UN	$ 4.832.500
19.12	Sofá de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4.059.300
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 2.416.250
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	UN	$ 918.175
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	$ 434.925
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	$ 4.059.300
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	UN	$ 2.107.252
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN	$ 468.753
19.19	Silla tipo presidencial	UN	$ 628.225
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	$ 4.155.950
19.21	Parasol telescópico de 3x2m con estructura 100% inoxidable	UN	$ 7.828.650
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	$ 106.315
19.23	Letras para aviso de entrada principal en Aluminio de altura 12 cm	UN	$ 77.320
19.24	Placa en bronce de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.623.720
19.25	Placa en Aluminio de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.063.150
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN	$ 2.416.250

OTRO SI No 001 del 26 noviembre de 2024 Ítems no previstos

20	NO PREVISTOS	UNIDAD	VALOR
NP.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijación y soporte.	M	$ 145.746,00
NP.2	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo	M	$ 124.352,00
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419,00
NP.4	NP 4. Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	$ 448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112,00
NP.6	Suministro e instalación de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UN	$ 49.616,00

NP.7	Suministro e instalación de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UN	$ 46.399,00
NP.8	Suministro de automáticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitos de iluminación tomas normales y reguladas	UN	$ 30.046,00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoría 6A	M	$ 10.110,00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoría 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoría 6A, ponchado del cable y marcación	UN	$ 159.385,00
NP.11	Suministro e instalación de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354.386,00
NP.12	Soporte metálico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35.881,00
NP.13	Suministro e instalación de ducteria de aire acondicionado, lamina galvanizada con aislamiento en Yumbolon plateado	M2	$ 313.535,00
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798,00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518,00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tubería cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14.427.003,00
NP.17	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 10 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 547.000,00
NP.18	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 15 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 587.067,00
NP.19	Suministro e instalación de Salida interruptor doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 185.297,00
NP.20	Salida tomacorriente doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 188.101,00
NP.21	Suministro e instalación de ducteria reforzada en lámina de poliisocianurato (PirAlum) para la conexión entre los equipos 10 TR y 15 TR. Este servicio incluye la fabricación, instalación y fijación de los tramos de ductería según el diseño especificado, así como todos los accesorios necesarios para garantizar su instalación.	GL	$ 11.000.000,00

NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$	116.351,00
NP.23	Suministro e instalación de Rejilla de suministro 12x12. Incluye tornillería para su instalación.	UN	$	232.301,00
NP.24	Suministro e instalación de Rejilla de retorno 18x18. Incluye tornillería para su instalación.	UN	$	319.567,00
NP.25	Suministro e instalación de Rejilla de retorno 12x12. Incluye tornillería para su instalación.	UN	$	222.463,00
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$	39.308,00

OTRO SI No 002 del 10 febrero de 2025 Ítems no previstos

20	NO PREVISTOS	UNIDAD	VALOR	
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidro lavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	M2	$	80.386,00
NP.28	Suministro e instalación de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes	UND	$	79.502.161,00
NP.29	Suministro e instalación de troquel metálico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UND	$	32.564,00
NP.30	Suministro e instalación de troquel metálico piramidal triple 12 x 5 blanco	UND	$	39.680,00
NP.31	Suministro e instalación de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalación y fijación al suelo	UND	$	29.155,00
NP.32	Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas, limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior	UND	$	1.664.947,00
NP.33	Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diámetro	UND	$	3.902.293,00
NP.34	Suministro e instalación de sombrilla de apoyo central estructura metálica diámetro 3.60m	UND	$	4.020.443,00
NP.35	Suministro de silla sin brazo Khao o similar	UND	$	403.067,00
NP.36	Suministro e instalación de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio	M2	$	645.969,00
NP.37	Suministro e instalación de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$	494.062,00
NP.38	Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	ML	$	19.484,00

NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UND	$ 92.447.200,00
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UND	$ 62.110.964,00
NP.41	Suministro e instalación de acometida de control y tubería doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesorios y soportes necesarios para su instalación	ML	$ 488.208,00
NP.42	Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	UND	$ 589.392,00
NP.43	Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	LBS	$ 53.198,00
NP.44	Montaje, instalación y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final. Y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimétrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificación de parámetros	UND	$ 36.879.063,00
NP.45	Suministro e instalación de tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	ML	$ 67.069,00
NP.46	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3x10	ML	$ 24.536,00
NP.47	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3x12	ML	$ 18.001,00
NP.48	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3X14	ML	$ 12.787,00
NP.49	Suministro e instalación de manguera Coraza 3/4"	ML	$ 19.903,00
NP.50	Suministro e instalación de manguera tipo Coraza 1"	ML	$ 25.771,00
NP.51	Suministro e instalación de manguera Coraza 1 1/2"	ML	$ 40.300,00

OTRO SI No 003 del 21 marzo de 2025 Ítems no previstos

20	NO PREVISTOS	UNIDAD	VALOR
NP.52	Pulida y brillada de guardaescoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)	M	$ 20.218,00
NP.53	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)	M	$ 165.234,00
NP.54	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)	M	$ 114.398,00
NP.55	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)	M	$ 41.255,00
NP.56	Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)	M	$ 34.118,00
NP.57	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)	M	$ 487.548,00
NP.58	Suministro e Instalación de Gabinete Electrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifasicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifasicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofasicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP , barrajes de neutro y tierra, acrilicos de proteccion.	UND	$ 8.540.637,00
NP.59	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 15x15. Incluye tornilleria para su instalacion.	UND	$ 259.495,00
NP.60	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x12. Incluye tornilleria para su instalacion.	UND	$ 262.070,00
NP.61	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 24x24. Incluye tornilleria para su instalacion.	UND	$ 445.947,00
NP.62	Suministro e instalacion de Damper para difusor de suministro 12x12.	UND	$ 113.430,00
NP.63	Suministro e instalacion de Damper para difusor de suministro 15x15	UND	$ 117.897,00
NP.64	Suministro e instalacion de Damper para difusor de suministro 18x18	UND	$ 202.230,00
NP65	Suministro e instalacion de mueble metalico, de dimensiones 1m de alto, 2.30 ancho y 0.70 profundidad, con un entrepaño en lamina a 50cm de alto, el espaldar y parte superior es en lámina perforada en círculos.	UND	$ 5.881.537,00

1.2 GARANTÍAS

	GARANTIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	No DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CONTRATO No BGA-044-2024	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	198.838.203,20	27/09/2024	05/10/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	99.419.101,60	27/09/2024	05/04/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	397.676.406,40	27/09/2024	26/09/2029
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	397.676.406,40	27/09/2024	26/10/2025
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-40-101081342	427.050.000	27/09/2024	05/04/2025

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

	VALOR PRESUPUESTAL EJECUTADO		AVANCE TIEMPO EJECUCIÓN	
	VALOR CONTRACTUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
PORCENTAJE	100%	83,94%	100%	93,10%
VALOR	$1.988.382.032	$ 1.668.964.785,47	5 MESES	4.66 MES

ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 PERIODO DEL 1 FEBRERO AL 23 MARZO 2025									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VR. UNITARIO CONTRACTUAL	CANTIDADES			VALORES		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 4	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 4	ACUMULADO TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						**$ 49.670.469,75**	**$ 268.622,62**	**$ 49.939.092,37**
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313,00	7,50		7,50	$ 114.847,50	$ -	$ 114.847,50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220,00	200,61		200,61	$ 3.855.724,20	$ -	$ 3.855.724,20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33.566,00	1,00	1,00	2,00	$ 33.566,00	$ 33.566,00	$ 67.132,00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36.403,00	23,00	5,00	28,00	$ 837.269,00	$ 182.015,00	$ 1.019.284,00
1.5	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 34.654,00					$ -	
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 28.517,00		1,86	1,86		$ 53.041,62	$ 53.041,62
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254,00	78,00		78,00	$ 2.749.812,00	$ -	$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548,00	41,09		41,09	$ 1.542.847,32	$ -	$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586,00	8,00		8,00	$ 972.688,00	$ -	$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517,00	66,53		66,53	$ 1.897.236,01	$ -	$ 1.897.236,01
1.11	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	M	$ 6.832,00					$ -	
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965,00	102,00		102,00	$ 3.056.430,00	$ -	$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655,00	1.564,50		1.564,50	$ 2.589.247,50	$ -	$ 2.589.247,50
1.14	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	$ 34.905,00					$ -	
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067,00	616,86		616,86	$ 19.163.874,67	$ -	$ 19.163.874,67

1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556,00	156,47		156,47	$ 7.597.557,32	$ -	$ 7.597.557,32
1.17	Retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16.479,00	82,74		82,74	$ 1.363.472,46	$ -	$ 1.363.472,46
1.18	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 18.835,00					$ -	
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26.335,00	36,94		36,94	$ 972.814,90	$ -	$ 972.814,90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767,00	37,42		37,42	$ 926.741,51	$ -	$ 926.741,51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13.408,00	56,23		56,23	$ 753.931,84	$ -	$ 753.931,84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240,00	6,65		6,65	$ 194.387,52	$ -	$ 194.387,52
1.23	Demolición de muro en Drywall y/o eterboard. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	$ 25.958,00					$ -	
1.24	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 36.555,00					$ -	
1.25	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	$ 237.379,00					$ -	
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13.632,00	27,25		27,25	$ 371.472,00	$ -	$ 371.472,00
1.27	Mantenimiento y limpieza de viga canal incluye tela asfaltica,emulsion asfaltica y pintura alumol.	M	$ 91.633,00					$ -	
1.28	Desmonte, reinstalacion y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338.275,00	2,00		2,00	$ 676.550,00	$ -	$ 676.550,00
2	**IMPERMEABILIZACIONES**						**$ 8.579.288,51**	**$ -**	**$ 8.579.288,51**
2.1	Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341,00	87,24		87,24	$ 8.579.288,51	$ -	$ 8.579.288,51
3	**MAMPOSTERÍA**						**$ 494.980,98**	**$ 30.125,86**	**$ 525.106,84**
3,1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491,00	7,56	0,46	8,02	$ 494.980,98	$ 30.125,86	$ 525.106,84
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**						**$ 402.365,83**	**$ 554.216,11**	**$ 956.581,94**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793,00	2,31	4,27	6,58	$ 299.821,83	$ 554.216,11	$ 854.037,94

4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120.640,00	0,85		0,85	$ 102.544,00	$ -	$ 102.544,00
4.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 111.662,00					$ -	
4.4	Muro en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescasa, acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 148.596,00					$ -	
4.5	Division para mueble en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm.ANCHO <80CM, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 131.057,00					$ -	
4.6	Muro en ETERBOARD una cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescasa, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 124.131,00					$ -	
5	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**						**$ 2.071.647,71**	**$ 21.368,49**	**$ 2.093.016,20**
5,1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54.791,00	37,81	0,39	38,20	$ 2.071.647,71	$ 21.368,49	$ 2.093.016,20
5,2	Suministro e instalación de Concreto base mueble h= 0,05 M. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 96.362,00					$ -	
6.	**PAÑETES**						**$ 570.248,65**	**$ 39.796,92**	**$ 610.045,57**
6,1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36.849,00	14,10	1,08	15,18	$ 519.570,90	$ 39.796,92	$ 559.367,82
6,2	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	$ 41.864,00					$ -	
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21.565,00	2,35		2,35	$ 50.677,75	$ -	$ 50.677,75
7.	**CIELO RASOS**						**$ 66.831.878,62**	**$ -**	**$ 66.831.878,62**
7,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 89.134,00					$ -	
7,2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	$ 84.080,00					$ -	
7,3	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 91.277,00					$ -	
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	M2	$ 108.342,00	616,86		616,86	$ 66.831.878,62	$ -	$ 66.831.878,62

7.5	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 100.942,00					$ -		
8.	**ESTUCO Y PINTURA**						**$ 4.529.035,79**	**$ 13.441.276,40**	**$ 17.970.312,19**	
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450,00	127,62	16,91	144,53	$ 2.354.555,79	$ 311.989,50	$ 2.666.545,29	
8.2	Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 14.014,00		2,91	2,91		$ 40.780,74	$ 40.780,74	
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17.650,00	123,20	701,12	824,32	$ 2.174.480,00	$ 12.374.768,00	$ 14.549.248,00	
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 19.374,00		36,84	36,84		$ 713.738,16	$ 713.738,16	
8.5	Suministro y aplicación de Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 23.103,00					$ -		
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**						**$ 27.439.248,62**	**$ 36.162.793,78**	**$ 63.602.042,40**	
9,1	Piso en ceramica antideslizante (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 137.243,00					$ -		
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152.514,00	87,09		87,09	$ 13.282.444,26	$ -	$ 13.282.444,26	
9,3	Piso en baldosa granito (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, pulida, cristalizada y brillada	M2	$ 172.774,00					$ -		
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54.886,00		620,37	620,37		$ 34.049.627,82	$ 34.049.627,82	
9.5	Suministro e instalación de Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	M	$ 82.180,00					$ -		
9.6	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	M	$ 71.564,00					$ -		
9,7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 106.315,00	76,65	1,32	77,97	$ 8.148.874,65	$ 140.335,80	$ 8.289.210,45	
9.8	Piso en cerámica Pizarra madera o similar(Suministro e instalación , incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M2	$ 113.398,00					$ -		
9,9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49.433,00	119,43		119,43	$ 5.903.783,19	$ -	$ 5.903.783,19	
9.10	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	M	$ 16.845,00					$ -		

9,11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	M	$ 46.392,00		5,40	5,40		$ 250.516,80	$ 250.516,80
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85.366,00	1,22	3,01	4,23	$ 104.146,52	$ 256.951,66	$ 361.098,18
9,13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	M	$ 771.243,00		1,90	1,90		$ 1.465.361,70	$ 1.465.361,70
9.14	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	$ 48.991,00					$ -	
10.	**CUBIERTA**						**$ 35.678.576,64**	**$ -**	**$ 35.678.576,64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748,00	71,68		71,68	$ 35.678.576,64	$ -	$ 35.678.576,64
10.2	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	M	$ 102.624,00					$ -	
10,3	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.367,00					$ -	
10.4	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación)	M	$ 40.989,00					$ -	
11.	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	$ 5.100.353,97	$ 5.100.353,97
11,1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	$ 473.775,00		8,18	8,18		$ 3.875.479,50	$ 3.875.479,50
11.2	Mantenimiento y restauracion de puerta y marco en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, asi como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 149.324,00					$ -	
11.3	Mantenimiento y restauracion de mueble en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, asi como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 179.286,00					$ -	
11.4	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,40-0,60 m ancho=0,40-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 346.007,00					$ -	
11.5	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 404.249,00		3,03	3,03		$ 1.224.874,47	$ 1.224.874,47
12.	**CARPINTERIA METÁLICA**						$ -	**$ 32.380.999,09**	**$ 32.380.999,09**
12,1	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 911.911,00					$ -	

12,2	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado e=6mm .(Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 1.010.623,00					$ -	
12,3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 517.351,00		62,59	62,59		$ 32.380.999,09	$ 32.380.999,09
12,4	Rejilla piso 5x4". (Suministro e instalación)	UN	$ 50.388,00					$ -	
12.5	Mantenimiento de ventanas en hierro (incluye inspeccion, pintura anticorrosiva, lubricacion de bisagras y cerraduras, reparacion y remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 66.302,00					$ -	
12.6	Suministro e instalacion de ventana proyectante con vidrio templado laminado 3+3, Marco en angulo cal 18 (Incluye Andamios certificados, anticorrosivo, esmalte negro,herrajes, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	M2	$ 804.776,00					$ -	
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**						**$ 119.607.006,70**	**$ 19.107.986,95**	**$ 138.714.993,65**
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	UN	$ 2.471.279,00	1,00		1,00	$ 2.471.279,00	$ -	$ 2.471.279,00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 333.723,00	202,98		202,98	$ 67.739.094,54	$ -	$ 67.739.094,54
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	M2	$ 537.954,00	39,35		39,35	$ 21.168.489,90	$ -	$ 21.168.489,90
13.4	suministro e instalacion de entrepaño en vidrio templado incoloro con borddes pulidos en 8mm, estructura en aluminio anclado para sostenerlo fabricado en tubular de aluminio y dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente (incluye herrajes, bisagras, anclajes, accesorios y todo lo necesario para su instalacion	M2	$ 634.701,00					$ -	
13.5	Suministro e instalacion de dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente riel superior e inferior	M2	$ 384.860,00					$ -	
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	UN	$ 569.848,00	2,00		2,00	$ 1.139.696,00	$ -	$ 1.139.696,00
13.7	Cerradura tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	$ 101.483,00					$ -	
13.8	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 281.611,00					$ -	

13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75.774,00	357,49		357,49	$ 27.088.447,26	$ -	$	27.088.447,26
13.10	Película Polarizado NanoCerámica . (Suministro e instalación)	M2	$ 104.541,00					$ -		
13.11	Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)	UN	$ 59.536,00		20,00	20,00		$ 1.190.720,00	$	1.190.720,00
13.12	Suministro e instalacion de vidrio templado laminado 3+3 mm, incluye silicona antihongos	M2	$ 372.103,00					$ -		
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	M2	$ 403.997,00		44,35	44,35		$ 17.917.266,95	$	17.917.266,95
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**						**$ 45.126,00**	**$ 425.225,00**	**$**	**470.351,00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126,00	1,00	1,00	2,00	$ 45.126,00	$ 45.126,00	$	90.252,00
14.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	$ 45.126,00					$ -		
14.3	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 663.539,00					$ -		
14.4	Lavamanos linea institucional con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería tipo push, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 573.224,00					$ -		
14,5	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 775.412,00					$ -		
14,6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 380.099,00		1,00	1,00		$ 380.099,00	$	380.099,00
14,7	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push . (Suministro e instalación)	UN	$ 313.528,00					$ -		
14,8	Instalación grifería para aparato sanitario.(Suministro e instalación)	UN	$ 139.516,00					$ -		
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						**$ 34.832,00**	**$ -**	**$**	**34.832,00**
15.1	Red PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería abrazaderas y accesorios)	M	$ 8.365,00					$ -		
15,2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34.832,00	1,00		1,00	$ 34.832,00	$ -	$	34.832,00
15,3	Registro plastico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.122,00					$ -		
15,4	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 40.942,00					$ -		
15,5	Suministro e instalacion de Ducha Antivandálica con Regadera de Empotrar	UN	$ 679.904,00					$ -		
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**						**$ 530.625,60**	**$ -**	**$**	**530.625,60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36.849,00	14,40		14,40	$ 530.625,60	$ -	$	530.625,60
16.2	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, abrazadera y accesorios)	M	$ 54.135,00					$ -		

16.3	Buje sanitario 4x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 15.271,00					$ -	
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						**$ 97.870.581,71**	**$ 10.794.660,52**	**$ 108.665.242,23**
17.1	Suministro e instalación de lampara Led 6 W de empotrar	UN	$ 17.880,00					$ -	
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UN	$ 27.062,00		6,00	6,00		$ 162.372,00	$ 162.372,00
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	UN	$ 106.798,00		6,00	6,00		$ 640.788,00	$ 640.788,00
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473,00	110,00	10,00	120,00	$ 17.542.030,00	$ 1.594.730,00	$ 19.136.760,00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN	$ 120.813,00	109,00	10,00	119,00	$ 13.168.617,00	$ 1.208.130,00	$ 14.376.747,00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159.473,00	115,00		115,00	$ 18.339.395,00	$ -	$ 18.339.395,00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803,00	115,00		115,00	$ 20.562.345,00	$ -	$ 20.562.345,00
17.8	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UN	$ 165.909,00					$ -	
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	$ 98.119,00	124,09	13,38	137,47	$ 12.175.586,71	$ 1.312.832,22	$ 13.488.418,93
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141,00	830,00	84,42	914,42	$ 13.397.030,00	$ 1.362.623,22	$ 14.759.653,22
17.11	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6	M	$ 6.029,00					$ -	
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141,00	108,00		108,00	$ 1.743.228,00	$ -	$ 1.743.228,00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847,00	50,00		50,00	$ 942.350,00	$ -	$ 942.350,00

17.14	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1-1/2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 27.352,00					$ -	
17.15	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 35.761,00					$ -	
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 71.134,00		43,62	43,62		$ 3.102.865,08	$ 3.102.865,08
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 88.145,00		16,00	16,00		$ 1.410.320,00	$ 1.410.320,00
17.18	suministro, transporte e instalación de ducto imc 2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 105.735,00					$ -	
18	**OBRAS EXTERIORES**						$ -	$ -	$ -
18.1	Matera rectangular con bordes redondeados en cemento color a definir alto 0,5m ancho 0,4m largo 1 m (Incluye especie natural para exteriores altura min 50 cm, estrato y abono)	UN	$ 336.743,00					$ -	
18.2	Base rectangular en hierro para materas, con 6 rodachines de 1x 0,4	UN	$ 164.208,00					$ -	
20	**NO PREVISTOS**						**$ 196.324.847,40**	**$ 236.229.147,92**	**$ 432.553.995,32**
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145.746,00	39,45		39,45	$ 5.749.679,70	$ -	$ 5.749.679,70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124.352,00	17,03		17,03	$ 2.117.714,56	$ -	$ 2.117.714,56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419,00	1,00		1,00	$ 1.509.419,00	$ -	$ 1.509.419,00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	$ 448.016,00	1,00		1,00	$ 448.016,00	$ -	$ 448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112,00	1,00		1,00	$ 7.448.112,00	$ -	$ 7.448.112,00
NP.6	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UN	$ 49.616,00		110,00	110,00		$ 5.457.760,00	$ 5.457.760,00
NP.7	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UN	$ 46.399,00		116,00	116,00		$ 5.382.284,00	$ 5.382.284,00
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	UN	$ 30.046,00	45,00		45,00	$ 1.352.070,00	$ -	$ 1.352.070,00

NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	$ 10.110,00	4.230,00		4.230,00	$ 42.765.300,00	$ -	$ 42.765.300,00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159.385,00	115,00		115,00	$ 18.329.275,00	$ -	$ 18.329.275,00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354.386,00	279,00	20,47	299,47	$ 98.873.694,00	$ 7.254.281,42	$ 106.127.975,42
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35.881,00	33,00		33,00	$ 1.184.073,00	$ -	$ 1.184.073,00
NP.13	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado, lamina galvanizada con aislamiento en yumbolon plateado	M2	$ 313.535,00					$ -	
NP.17	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 10 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 547.000,00					$ -	
NP.18	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 15 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 587.067,00					$ -	
NP.19	Suministro e instalacion de Salida interruptor doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 185.297,00					$ -	
NP.20	Salida tomacorriente doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 188.101,00					$ -	
NP.21	Suministro e instalación de ductería reforzada en lámina de poliisocianurato (PirAlum) para la conexión entre los equipos 10 TR y 15 TR. Este servicio incluye la fabricación, instalación y fijación de los tramos de ductería según el diseño especificado, así como todos los accesorios necesarios para garantizar su instalación.	GL	$ 11.000.000,00					$ -	

NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116.351,00	107,70		107,70	$ 12.531.002,70	$ -	$ 12.531.002,70
NP.23	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12. Incluye tornilleria para su instalacion.	UN	$ 232.301,00					$ -	
NP.24	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x18. Incluye tornilleria para su instalacion.	UN	$ 319.567,00					$ -	
NP.25	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 12x12. Incluye tornilleria para su instalacion.	UN	$ 222.463,00					$ -	
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39.308,00	102,18		102,18	$ 4.016.491,44	$ -	$ 4.016.491,44
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidro lavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	M2	$ 80.386,00		52,43	52,43		$ 4.214.637,98	$ 4.214.637,98
NP.28	Suministro e instalación de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes	UN	$ 79.502.161,00		1,00	1,00		$ 79.502.161,00	$ 79.502.161,00
NP.29	Suministro e instalación de troquel metálico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN	$ 32.564,00		24,00	24,00		$ 781.536,00	$ 781.536,00
NP.30	Suministro e instalación de troquel metálico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN	$ 39.680,00		78,00	78,00		$ 3.095.040,00	$ 3.095.040,00
NP.31	Suministro e instalación de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalación y fijación al suelo	UN	$ 29.155,00		66,00	66,00		$ 1.924.230,00	$ 1.924.230,00
NP.32	Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas, limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior	UN	$ 1.664.947,00		9,00	9,00		$ 14.984.523,00	$ 14.984.523,00
NP.36	Suministro e instalación de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio	M2	$ 645.969,00		27,15	27,15		$ 17.538.058,35	$ 17.538.058,35
NP.37	Suministro e instalación de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$ 494.062,00		8,47	8,47		$ 4.184.705,14	$ 4.184.705,14
NP.38	Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	M	$ 19.484,00		4,20	4,20		$ 81.832,80	$ 81.832,80
NP.41	Suministro e instalación de acometida de control y tubería doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesorios y soportes necesarios para su instalación	M	$ 488.208,00		56,25	56,25		$ 27.461.700,00	$ 27.461.700,00

NP.42	Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	UN	$ 589.392,00		2,00	2,00		$ 1.178.784,00	$ 1.178.784,00
NP.43	Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	LBS	$ 53.198,00		40,00	40,00		$ 2.127.920,00	$ 2.127.920,00
NP.44	Montaje, instalación y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final. Y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimétrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificación de parámetros	UN	$ 36.879.063,00		1,00	1,00		$ 36.879.063,00	$ 36.879.063,00
NP.45	Suministro e instalación de tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	M	$ 67.069,00		19,38	19,38		$ 1.299.797,22	$ 1.299.797,22
NP.46	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3x10	M	$ 24.536,00					$ -	
NP.47	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3x12	M	$ 18.001,00					$ -	
NP.48	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3X14	M	$ 12.787,00					$ -	
NP.49	Suministro e instalación de manguera Coraza 3/4"	M	$ 19.903,00					$ -	
NP.50	Suministro e instalación de manguera tipo Coraza 1"	M	$ 25.771,00					$ -	
NP.51	Suministro e instalación de manguera Coraza 1 1/2"	M	$ 40.300,00		1,76	1,76		$ 70.928,00	$ 70.928,00
NP.52	Pulida y brillada de guardaescoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)	M	$ 20.218,00		298,95	298,95		$ 6.044.171,10	$ 6.044.171,10
NP.53	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)	M	$ 165.234,00		12,10	12,10		$ 1.999.331,40	$ 1.999.331,40
NP.54	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)	M	$ 114.398,00		14,00	14,00		$ 1.601.572,00	$ 1.601.572,00
NP.55	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)	M	$ 41.255,00		11,45	11,45		$ 472.369,75	$ 472.369,75
NP.56	Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)	M	$ 34.118,00		78,82	78,82		$ 2.689.180,76	$ 2.689.180,76
NP.57	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)	M	$ 487.548,00		3,00	3,00		$ 1.462.644,00	$ 1.462.644,00

NP.58	Suministro e Instalación de Gabinete Electrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifasicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifasicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofasicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP , barrajes de neutro y tierra, acrilicos de proteccion.	Un	$ 8.540.637,00		1,00	1,00		$ 8.540.637,00	$ 8.540.637,00
NP.59	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 15x15. Incluye tornilleria para su instalacion.	Un	$ 259.495,00					$ -	
NP.60	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x12. Incluye tornilleria para su instalacion.	Un	$ 262.070,00					$ -	
NP.61	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 24x24. Incluye tornilleria para su instalacion.	Un	$ 445.947,00					$ -	
NP.62	Suministro e instalacion de Damper para difusor de suministro 12x12.	Un	$ 113.430,00					$ -	
NP.63	Suministro e instalacion de Damper para difusor de suministro 15x15	Un	$ 117.897,00					$ -	
NP.64	Suministro e instalacion de Damper para difusor de suministro 18x18	Un	$ 202.230,00					$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 610.680.760,51**	**$ 354.556.573,63**	**$ 965.237.334,14**
	ADMINISTRACIÓN	**20%**					$ 122.136.152,00	$ 70.911.315,00	$ 193.047.467,00
	IMPREVISTOS	**1%**					$ 6.106.807,00	$ 3.545.566,00	$ 9.652.373,00
	UTILIDAD	**5%**					$ 30.534.038,00	$ 17.727.829,00	$ 48.261.867,00
	TOTAL AIU	**26%**					$ 158.776.997,00	$ 92.184.709,00	$ 250.961.706,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**					$ 5.801.467,22	$ 3.368.287,51	$ 9.169.754,73
	COSTO TOTAL DE OBRA						**$ 775.259.224,73**	**$ 450.109.570,14**	**$ 1.225.368.794,87**

				CANTIDAD			VALORES		
OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS		**UNDIAD**	**VR. UNITARIO CONTRACTUAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA No. 4**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA No. 4**	**ACUMULADO TOTAL**
19.1	Juego de 2 Sillones de Exterior 1,80x 0,9 m con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura.	UN	$ 13.434.350,00					$ -	

19.2	Sillon de exterior sin brazos de 0,9x 0,9 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura, Mesas de centro con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 3.479.400,00					$ -	
19.3	Mesa de centro para exterior 0,9x0,6 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm soldada, totalmente pulida y pintada con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 2.512.900,00					$ -	
19.4	Mesa para exterior de 180 x 90 cm, con superficie en tablones de WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger. Estructura en aluminio acabada con pintura poliéster electrostática de color a escoger. Altura 75cm. Niveladores en las patas.	UN	$ 5.895.650,00					$ -	
19.5	Sillas para exterior con estructura de aluminio, herraje de unión exclusivo y tornillería en acero inoxidable sin soldaduras. Terminado de la estructura en pintura electrostática color a escoger Tapones en ABS inyectados de alta resistencia con Sling importado americano tipo malla con recubrimiento sintético de alta resistencia en color a escoger con protección U.V.	UN	$ 1.159.800,00					$ -	
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	UN	$ 1.614.055,00		2,00	2,00		$ 3.228.110,00	$ 3.228.110,00
19.7	Juego Bandera de 1,50 x 1,10 m incluye bandera para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.35 m, asta desarmable de 2 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 592.877,00					$ -	
19.8	Juego Bandera de 2,38 m x1,45 m incluye bandera para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.50 m, asta desarmable de 3 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 756.511,00					$ -	
19.9	Banderas para exterior, material impermeable (Tempestad), doble faz con agarraderas, costuras reforzadas. Medidas de 3 x 2 metros.	UN	$ 536.729,00					$ -	
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN	$ 5.315.750,00		3,00	3,00		$ 15.947.250,00	$ 15.947.250,00

19.11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera	UN	$ 4.832.500,00					$ -	
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4.059.300,00		4,00	4,00		$ 16.237.200,00	$ 16.237.200,00
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 2.416.250,00		1,00	1,00		$ 2.416.250,00	$ 2.416.250,00
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	UN	$ 918.175,00		3,00	3,00		$ 2.754.525,00	$ 2.754.525,00
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	$ 434.925,00		6,00	6,00		$ 2.609.550,00	$ 2.609.550,00
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	$ 4.059.300,00		1,00	1,00		$ 4.059.300,00	$ 4.059.300,00
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	UN	$ 2.107.252,00		1,00	1,00		$ 2.107.252,00	$ 2.107.252,00
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN	$ 468.753,00		14,00	14,00		$ 6.562.542,00	$ 6.562.542,00
19.19	Silla tipo presidencial	UN	$ 628.225,00		3,00	3,00		$ 1.884.675,00	$ 1.884.675,00
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	$ 4.155.950,00		1,00	1,00		$ 4.155.950,00	$ 4.155.950,00
19.21	Parasol telescópico de 3x2m con estructura 100% inoxidable	UN	$ 7.828.650,00					$ -	
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	$ 106.315,00		101,00	101,00		$ 10.737.815,00	$ 10.737.815,00
19.23	Letras para aviso de entrada principal en Aluminio de altura 12 cm	UN	$ 77.320,00					$ -	
19.24	Placa en bronce de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.623.720,00					$ -	
19.25	Placa en Aluminio de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.063.150,00					$ -	
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN	$ 2.416.250,00		8,00	8,00		$ 19.330.000,00	$ 19.330.000,00
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798,00	1,00		1,00	$ 4.662.798,00	$ -	$ 4.662.798,00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518,00	2,00		2,00	$ 13.409.036,00	$ -	$ 13.409.036,00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14.427.003,00	4,00		4,00	$ 57.708.012,00	$ -	$ 57.708.012,00
NP.33	Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diámetro	UN	$ 3.902.293,00		3,00	3,00		$ 11.706.879,00	$ 11.706.879,00

NP.34	Suministro e instalación de sombrilla de apoyo central estructura metálica diámetro 3.60m	UN	$ 4.020.443,00					$ -	
NP.35	Suministro de silla sin brazo Khao o similar	UN	$ 403.067,00		96,00	96,00		$ 38.694.432,00	$ 38.694.432,00
NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN	$ 92.447.200,00		1,00	1,00		$ 92.447.200,00	$ 92.447.200,00
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN	$ 62.110.964,00		1,00	1,00		$ 62.110.964,00	$ 62.110.964,00
NP.65	Suministro e instalacion de mueble metalico, de dimensiones 1m de alto, 2.30 ancho y 0.70 profundidad, con un entrepaño en lamina a 50cm de alto, el espaldar y parte superior es en lámina perforada en círculos.	UN	$ 5.881.537,00						
	TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 75.779.846,00**	**$ 296.989.894,00**	**$ 372.769.740,00**
	IVA	**19,00%**					$ 14.398.170,74	$ 56.428.079,86	$ 70.826.250,60
	COSTO TOTAL SUMINISTROS						**$ 90.178.016,74**	**$ 353.417.973,86**	**$ 443.595.990,60**

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 803.527.544,00**

ACUMULADO TOTAL	**$ 1.668.964.785,47**
PORCENTAJE ACUMULADO	**83,94%**

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO OBRA				
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		**Contrato N°/Año**	BGA-044-2024
NIT o Cédula	901863382-1			
CONCEPTO	**VALORES**		**ORDEN DE PAGO**	**FECHA**
	VALOR TOTAL	**PAGOS**		
VALOR DEL CONTRATO (A)	$ 1.988.382.032,00			
ACTA PARCIAL No 1	$ 75.969.178,96	$ -	1	28/10/2024
ACTA PARCIAL No 2	$ 454.358.390,32	$ -	2	11/12/2024
ACTA PARCIAL No 3	$ 335.109.672,19	$ -	3	22/02/2025
ACTA PARCIAL No 4		$ 803.527.544,00	4	31/03/2025
PAGO 5				
PAGO 6				
VALOR EJECUTADO Y PAGADO (B)	865.437.241,47			
VALOR PENDIENTE DE PAGO (C)	803.527.544,00			
VALOR SIN EJECUTAR (D) = (A) - (B) - (C)	319.417.246,53			
SUMA TOTAL (E) = (B) + (C) +(D)	1.988.382.032,00			

CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR TOTAL DE CONTRATO	1.988.382.032,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		865.437.241,47
VALOR PENDIENTE DE PAGO		803.527.544,00
VALOR SIN EJECUTAR		319.417.246,53
SUMAS IGUALES	1.988.382.032,00	1.988.382.032,00

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

El contrato de obra BGA-044-2024 presenta un avance gasto presupuestal por un valor de $ 803.527.544,00 pesos correspondiente al periodo comprendido entre el 10 febrero al 23 marzo 2025 y un avance presupuestal acumulado de $ 1.668.964.785,47 pesos.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V firma contrato de obra no recibió anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se presenta excedentes o rendimientos financieros en el contrato de obra.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

La empresa INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S quien hace parte del 50% del Consorcio Infraestructura A&V cuenta con un personal de discapacidad la cual se relaciona a continuación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Yessica Tatiana Losada Yañez	C.C 1081152131

Se adjunta soporte de:

- Planilla de seguridad social
- Certificado de discapacidad
- Constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

En el periodo del 10 febrero al 23 marzo 2025 no se presentaron accidentes laborales y número de reclamaciones laborales o de pagos por parte del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 14.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**	
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2
20	**NO PREVISTOS**	
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	UN

5.2. SEMANA. 15.

No se presenta avance de obra

5.3. SEMANA. 16.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN
20	**NO PREVISTOS**	
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN
NP.37	Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**	
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN

5.4. SEMANA. 17.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
8.	**ESTUCO Y PINTURA**	

8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2

5.5. SEMANA. 18.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2
3.	**MAMPOSTERÍA**	
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**	
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**	
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2
6.	**PAÑETES**	
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2
8.	**ESTUCO Y PINTURA**	
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**	
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2
9.11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	M
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2
9.13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	M

20	**NO PREVISTOS**	
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidrolavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	M2
NP.44	Montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final.y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimetrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificacion de parámetros	UN
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**	
NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN

5.6. SEMANA 19.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
8.	**ESTUCO Y PINTURA**	
8.2	Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2
11.	**CARPINTERIA EN MADERA**	
11.1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2
11.5	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M
12.	**CARPINTERIA METÁLICA**	
12.3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**	
13.11	Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)	un
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	M2
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN
14.6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN

17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UN
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	UN
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M
20	**NO PREVISTOS**	
NP.6	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UN
NP.7	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UN
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2
NP.28	Suministro e instalacion de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes.	UN
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN
NP.32	Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas,limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior	UN
NP.36	Suministro e instalacion de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio	M2
NP.38	Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	M
NP.41	Suministro e instalación de acometida de control y tuberia doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesoriso y soportes necesarios para su instalación	M
NP.42	Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	UN
NP.43	Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	LBS
NP.45	Suministro e instalación de tubo Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	M
NP.51	Suministro e instalacion de manguera Coraza 1 1/2"	M
NP.52	Pulida y brillada de guardaescoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)	M
NP.53	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)	M
NP.54	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)	M

NP.55	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)	M
NP.56	Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)	M
NP.57	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)	M
NP.58	Suministro e Instalación de Gabinete Electrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifasicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifasicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofasicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP , barrajes de neutro y tierra, acrilicos de proteccion.	UN
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**	
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	UN
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	UN
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	UN
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN
19.19	Silla tipo presidencial	UN
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	un
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN
NP.33	Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diametro	UN
NP.35	Suministro de silla sin brazo Khao o similar	UN

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Se identificaron como riesgos que pueden afectar el contrato y el proyecto los tiempos de entrega de suministro mobiliario en los tiempos pactados, los cuales dieron lugar a la prorroga No 002 del 26 de marzo de 2025 con la finalidad de dar cumplimiento a la entrega del suministro NP.28.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

A continuación, se relaciona el personal activo durante el periodo del 10 febrero al 23 marzo 2025.

NOMBRE	IDENTIFICACIÒN	CARGO
ALEXANDER RAMIREZ MARQUEZ	77179645	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
ELVA VIVIANA RAMIREZ LEAL	63506940	RESIDENTE SISO
ANDRES MAURICIO VARGAS	1095929680	MAESTRO DE OBRA
DEIBI PEREZ DIAS	1098893056	AUXILIAR DE OBRA
MARLON ANDRES MOSQUERA	1058713857	OFICIAL DE OBRA
JAIME PRADA ROJAS	4100020	PERSONAL VIDRIOS
ALBEIRO SANCHEZ	80072840	PERSONAL VIDRIOS
ALVARO ANDRES DELGADO	1102362744	TECNICO AIRES ACONDICIONADO
WILLIAM MAYORGA TOSCANO	1098699774	TECNICO AIRES ACONDICIONADO
JUAN PABLO DESCANS	1094899499	TECNICO AIRES ACONDICIONADO
ARLEY URREA NOGUERA	17652967	TECNICO ELECTRICO
JOHAN ANDREY RAMIREZ CEDIEL	10755309388	TECNICO ELECTRICO
EDUARD QUINA ROCHA	1084924276	TECNICO ELECTRICO
LUIS HERBEY GUTIÉRREZ CARDONA	17327914	PERSONAL MANTENIMIENTO FACHADA
ORLANDO MERCHAN ALVARADO	91250541	PERSONAL PULIDA DE PISO

En el periodo del 10 FEBRERO al 23 MARZO el contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V no realizo disposición de residuos de construcción y demolición – RCD.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- Se recomienda al Contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V entregar de manera oportuna los informes semanales.

9. OBSERVACIONES

El Contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V atiende a las observaciones manifestadas por el CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL proporcionando el personal mínimo que requiere cada actividad con el fin de realizar una correcta ejecución de las actividades y un correcto manejo de seguridad y salud en el trabajo.

Anexo estado de Ejecución del proyecto

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los TREINTA Y UN (31) días, del mes de MARZO de 2025



ING. JAVIER AROCA GUASTUMAL

Representante Legal

CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL

Contratista Interventoría

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-10, 09:07:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76671921

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	**Nombre Sucursal**	OFICINA 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901612248	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 501		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088659817		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1081152131	YESSICA TATIANA LOSADA YAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 7.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300	$ 0	$ 349.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE			
1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
YESSICA	TATIANA	LOSADA	YAÑEZ
1.5 Departamento de Residencia		1.6 Municipio de Residencia	
HUILA		RIVERA	

1.7 Documento de Identidad															
Certificado de Nacido Vivo		Registro civil		Tarjeta de identidad		Cédula de ciudadanía	X	Cédula de extranjería		Pasaporte		Carnet diplomático		Permiso especial de permanencia	
Número de documento de identidad:	1081152131														

b. LUGAR Y FECHA DE LA VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA CERTIFICACIÓN			
	2.2 Fecha de la Certificación		
2.1 IPS donde se realiza la certificación	Año	Mes	Día
SEMEP IPS	2023	12	18

2.3 Tipo de Entidad Valoradora	2.4 Nro. ID Entidad Valoradora
NI	901057957

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD				
Física	SI	X	NO	
Visual	SI		NO	X
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI		NO	X
Psicosocial (Mental)	SI		NO	X
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI		NO	X

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO	
Dominio	Puntaje
Cognición	0.00
Movilidad	75.00
Cuidado Personal	12.50
Relaciones	5.00
Actividades de la Vida Diaria	50.00
Participación	40.63

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO
1. Codigos Funciones Corporales
b280.3 b710.3 b729.3
2. Codigos Estructuras Corporales
s770.373 s798.373 s799.373
3. Codigos Actividades y Participación
d4501.3 d4602.3 d640.3

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD		
Nombre	Profesión	Tipo y Número de Identificación
MARIA CAMILA MEDINA NARVAEZ	Psicología	CC-1075301041
NORMA CONSTANZA SUAREZ ALVAREZ	Fisioterapia	CC-1080291660
JORGE MAURICIO ESCOBAR LOPEZ	Medicina	CC-12127878

El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la perdida de capacidad laboral y ocupacional.

No. Radicado: 08SE2024714100100006416
Fecha: 2024-10-04 03:34:34 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destinatario: INGEVILL
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2024714100100006416

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL HUILA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2024714100100004209
FECHA RADICADO:	26/09/24
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	901612248

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	0,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:……
……

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en**, Neiva Huila a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2024**

DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA
Coordinador Grupo A.C.T.

Verificó y Elaboró:

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141127013136

(415)7707212489984(8020) 000014112701313 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 3 3 8 2	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 4 19 OF 603

42. Correo electrónico consorcioinfraestructuraav@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 4 8 7 8 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 7 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	1 6	4 8	5 2	5 5																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 19 / 13 : 30: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127013136

(415)7707212489984(8020) **000014112701313 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 3 3 8 2	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 7 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 7 1 8	
81. Hasta	2 0 4 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127013136

(415)7707212489984(8020) **000014112701313 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 3 3 8 2	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 2 3 7 0 5 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLANUEVA	TOVAR	FRANCISCO	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 4 0 4 7 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LUNA	NARANJO	CARMEN	EMILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127013136

(415)7707212489984(8020) **000014112701313 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 3 3 8 2	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 1 2 2 4 8	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,472,656,751	5 0	2 0 2 4 0 7 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 9 2 4 2 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ARMELCO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,472,656,751	5 0	2 0 2 4 0 7 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT: 901.863.382 - 1. RESPONSABLE IVA.
CL 9 4 19 OF 603. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 3158487874
consorcioinfraestructuraav@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764079649851. FECHA 2024/09/17
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FECI1 HASTA FECI100
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4290

Factura Electrónica De Venta No.FECI11

SEÑOR(ES) : RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTA	**FECHA EMISIÓN**	**F.VALIDACIÓN**	**VENDEDOR**
NIT/CED : 800.165.941-6	2025/03/31 00:00:00	2025/03/31 2:16:40 p.m.	**VENDEDOR UNICO**
DIRECCION: CR 11 34 52 P 5 CEN AD MUNICIPAL FASE 2	**VENTA CREDITO ***		**PAGINA N° 01/02**
CIUDAD : BUCARAMANGA - SANTANDER. TEL: 6422095	**VENCE: 2025/05/30(60 días)**		
EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacie. A.Económica: 8424			

Medio de pago: [Crédito] Consignación bancaria. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	007	CARTELERA TIPO VITRINA MAGNÉTICA DE 150×100 CM, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, RESPALDO METÁLICO, PERSONALIZADA CON LOGO Y/O TITULO, PUERTAS CORREDIZAS EN VIDRIO Y CHAPA CON 2 LLAVES. INCLUYE 48 IMANES TIPO MONEDAS.	UNIDAD	2,00	1.614.055,00	19%	3.841.450,90
2	008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN U TIPO MAGISTRADO CONFORMADO POR TRES MÓDULOS EN MADERA Y VIDRIO	UNIDAD	3,00	5.315.750,00	19%	18.977.227,50
3	009	SOFA DE DOS PUESTOS (JUEGO DESPACHO MAGISTRADO) TAPIZADO EN PRANNA CON DETALLES DE MADERA	UNIDAD	4,00	4.059.300,00	19%	19.322.268,00
4	010	POLTRONA (JUEGO DESPACHO MAGISTRADO) TAPIZADO EN PRANNA CON DETALLES DE MADERA	UNIDAD	1,00	2.416.250,00	19%	2.875.337,50
5	011	MESA DE CENTRO EN MADERA DE MEDIDAS 0,9X0,6X0,4	UNIDAD	3,00	918.175,00	19%	3.277.884,75
6	012	SILLA INTERLOCUTORA TIPO MAGISTRADO	UNIDAD	6,00	434.925,00	19%	3.105.364,50
7	013	MESA EN MADERA RECTANGULAR CON LATERALES OVALADOS PARA JUNTAS TIPO MAGISTRADO DE 3.20 X 1.2	UNIDAD	1,00	4.059.300,00	19%	4.830.567,00
8	014	MESA EN MADERA RECTANGULAR CON LATERALES OVALADOS PARA JUNTAS TIPO MAGISTRADO DE 1,50 M X 1.2M	UNIDAD	1,00	2.107.252,00	19%	2.507.629,88
9	015	SILLA TIPO EJECUTIVA	UNIDAD	14,00	468.753,00	19%	7.809.424,98
10	016	SILLA TIPO PRESIDENCIAL	UNIDAD	3,00	628.225,00	19%	2.242.763,25
11	017	MUEBLE DE RECEPCIÓN EN MADERA Y SUPERFICIES EN WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) DE 2 M DE LARGO A DOBLE ALTURA	UNIDAD	1,00	4.155.950,00	19%	4.945.580,50
12	018	LETRAS PARA AVISO DE ENTRADA PRINCIPAL EN BRONCE DE ALTURA 12 CM	UNIDAD	101,00	106.315,00	19%	12.777.999,85
13	019	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	8,00	2.416.250,00	19%	23.002.700,00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS COP

#$27-01-02-021;BGA-044-2024;infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Consorciados: Ingevill Diseño y Construcción SAS Nit. 901612248-4 Participación 50%, Armelco SAS Nit 901192425-8 Participación 50%

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	296.989.894,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	296.989.894,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	56.428.079,86
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	353.417.973,86

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: c2d966fad8f9a8a91665eb09e05d9f461f8b38ea1dd13db2058c9ca3fd0d7d2c8dd779119d930171bc2da98bcfb6cc92

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT: 901.863.382 - 1. RESPONSABLE IVA.
CL 9 4 19 OF 603. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 3158487874
consorcioinfraestructuraav@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764079649851. FECHA 2024/09/17
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FECI1 HASTA FECI100
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4290

Factura Electrónica De Venta No.FECI11

SEÑOR(ES): RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTA	**FECHA EMISIÓN**	**F.VALIDACIÓN**	**VENDEDOR**
NIT/CED : 800.165.941-6	2025/03/31 00:00:00	2025/03/31 2:16:40 p.m.	**VENDEDOR UNICO**
DIRECCION: CR 11 34 52 P 5 CEN AD MUNICIPAL FASE 2	**VENTA CREDITO ***		**PAGINA N° 02/02**
CIUDAD : BUCARAMANGA - SANTANDER. TEL: 6422095	**VENCE: 2025/05/30(60 días)**		
EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacie. A.Económica: 8424			

Medio de pago: [Crédito] Consignación bancaria. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
		EN ACERO INOXIDABLE, P:1000W V 110 CAPACIDAD >22 LTS					
14	020	SUMINISTRO DE MESA REDONDA EN MADERA TECA DE 1.80 M DE DIÁMETRO	UNIDAD	3,00	3.902.293,00	19%	13.931.186,01
15	021	SUMINISTRO DE SILLA SIN BRAZO KHAO O SIMILAR	UNIDAD	96,00	403.067,00	19%	46.046.374,08
16	022	SUMINISTRO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF EQUIPO 15 TR. INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA TVR PRO 192.000 BTU 220V//3F, UNIDAD MANEJADORA DE 15 TR 220V/3F, R410A Y SU RESPECTIVO COMBINABLE AHU CONNECTION KIT TRANE	UNIDAD	1,00	92.447.200,00	19%	110.012.168,00
17	023	SUMINISTRO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF EQUIPO 10 TR. INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA TVR PRO 140.000 BTU 220V//3F, UNIDAD MANEJADORA DE 10 TR 220V/3F, R410A Y SU RESPECTIVO COMBINABLE AHU CONNECTION KIT TRANE	UNIDAD	1,00	62.110.964,00	19%	73.912.047,16

Total Items: 17

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS COP

#$27-01-02-021;BGA-044-2024;infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Consorciados: Ingevill Diseño y Construcción SAS Nit. 901612248-4 Participación 50%, Armelco SAS Nit 901192425-8 Participación 50%

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	296.989.894,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	296.989.894,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	56.428.079,86
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	353.417.973,86

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: c2d966fad8f9a8a91665eb09e05d9f461f8b38ea1dd13db2058c9ca3fd0d7d2c8dd779119d930171bc2da98bcfb6cc92

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT: 901.863.382 - 1. RESPONSABLE IVA.
CL 9 4 19 OF 603. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 3158487874
consorcioinfraestructuraav@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764079649851. FECHA 2024/09/17
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FECI1 HASTA FECI100
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4290

Factura Electrónica De Venta No.FECI12

SEÑOR(ES) : RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTA	**FECHA EMISIÓN**	**F.VALIDACIÓN**	**VENDEDOR**
NIT/CED : 800.165.941-6	2025/03/31 00:00:00	2025/03/31 4:48:01 p.m.	**VENDEDOR UNICO**
DIRECCION: CR 11 34 52 P 5 CEN AD MUNICIPAL FASE 2	**VENTA CREDITO ***		**PAGINA N° 01/01**
CIUDAD : BUCARAMANGA - SANTANDER. TEL: 6422095	**VENCE: 2025/05/30(60 días)**		
EMAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacie. A.Económica: 8424			

Medio de pago: [Crédito] Consignación bancaria. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	001	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 CTO BGA-044-2024	UNIDAD	1,00	354.556.573,63	0%	354.556.573,63
2	002	ADMINISTRACION 20%	UNIDAD	1,00	70.911.314,00	0%	70.911.314,00
3	003	IMPREVISTOS 1%	UNIDAD	1,00	3.545.566,00	0%	3.545.566,00
4	004	UTILIDAD 5%	UNIDAD	1,00	17.727.829,00	19%	21.096.116,51

Total Items: 4

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CATORCE COP

#$27-01-02-021;BGA-044-2024;infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Consorciados: Ingevill Diseño y Construcción SAS Nit. 901612248-4 Participación 50%, Armelco SAS Nit 901192425-8 Participación 50%

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	446.741.282,63
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	429.013.453,63
GRAVADA 19 %	17.727.829,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	3.368.287,51
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	450.109.570,14

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: 6f3be0eb3655b820a77ea6619c165fb3c40b48dd75033d08361a18277f11cd0fde84cb63f3c25ed150bd8afae858a71a

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

Formato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 14

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	BGA-044-2024
Valor Inicial:	$ 1.940.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.940.000.000,00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2024
Fecha fin inicial:	27 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	20 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	3 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de marzo de 2025

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 14 Del: 10-02-25 Al: 16-02-25 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias desde acta de inicio: 100 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 74,07%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ -

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,45%	46,06%
Valor de la Obra Ejecutada:	**$ 28.149.031,52**	**$ 893.586.273,99**

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	44,61%	46,06%
Durante el periodo	0,00%	1,45%	
Acumulado actual	0,00%	46,06%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA	La Obra se Ejecuta Normalmente		
DIAS DE RETRASO	0		



REGISTRO FOTOGRÁFICO

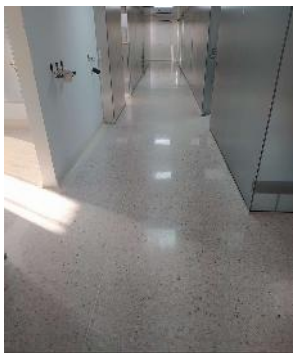

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	CANT.	UNIDAD
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	368,93	M2
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	66,00	UN

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades de obra se realizan con normalidad sin presentar retrasos en el cronograma de obra.

OBSERVACIONES

- Se calcula porcentaje de avance en tiempo a partir del acta de inicio de obra hasta la fecha de corte del informe semanal.
- Se calcula porcentaje de avance en valor de obra ejecutado con base a las cantidades medidas en obra con respecto a los valores de refencia para el contrato de obra sobre los items ejecutados durante la semana comprendida desde el 10 febrero al 16 febrero 2025

FIRMAS

Representante legal de Interventoría

JAVIER AROCA GUASTUMAL

Ingeniero Residente

JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

PRESUPUESTO DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 12 15-12-2024 AL 19-12-2024		SEMANA 13 03-02-2025 AL 09-02-2025		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 49.670.469,75**
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313,00		$ -		$ -		$ -	7,50	$ 114.847,50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220,00		$ -		$ -		$ -	200,61	$ 3.855.724,20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33.566,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 33.566,00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36.403,00		$ -		$ -		$ -	23,00	$ 837.269,00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254,00		$ -		$ -		$ -	78.00	$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548,00		$ -		$ -		$ -	41,09	$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586,00		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517,00		$ -		$ -		$ -	66,53	$ 1.897.236,01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965,00		$ -		$ -		$ -	102,00	$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655,00		$ -		$ -		$ -	1.564,50	$ 2.589.247,50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067,00		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 19.163.874,67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556,00		$ -		$ -		$ -	156,47	$ 7.597.557,32
1.17	retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16.479,00		$ -		$ -		$ -	82,74	$ 1.363.472,46
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26.335,00		$ -		$ -		$ -	36.94	$ 972.814,90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767,00		$ -		$ -		$ -	37,4184	$ 926.741,51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13.408,00		$ -		$ -		$ -	56,23	$ 753.931,84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240,00		$ -		$ -		$ -	6,65	$ 194.387,52
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13.632,00		$ -		$ -		$ -	27.25	$ 371.472,00
1.28	| (incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338.275,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 676.550,00
2.	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.579.288,51**
2.1	suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341,00		$ -		$ -		$ -	87,24	$ 8.579.288,51
3.	**MAMPOSTERÍA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 494.980,98**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491,00		$ -		$ -		$ -	7,56	$ 494.980,98
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 402.365,83**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793,00		$ -		$ -		$ -	2,31	$ 299.821,83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120.640,00		$ -		$ -		$ -	0,85	$ 102.544,00
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.071.647,71**
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54.791,00		$ -		$ -		$ -	37,81	$ 2.071.647,71
6.	**PAÑETES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 570.248,65**
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36.849,00		$ -		$ -		$ -	14.10	**$ 519.570,90**
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21.565,00		$ -		$ -		$ -	2,35	$ 50.677,75
7.	**CIELO RASOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 66.831.878,62**
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estruc	M2	$ 108.342,00		$ -		$ -		$ -	616,86	$ 66.831.878,62
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.529.035,79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450,00		$ -		$ -		$ -	127,62	$ 2.354.555,79
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17.650,00		$ -		$ -		$ -	123,20	$ 2.174.480,00
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 20.249.091,98**		**$ 47.688.340,60**
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152.514,00		$ -		$ -		$ -	87,09	$ 13.282.444,26
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54.886,00		$ -		$ -	368,93	$ 20.249.091,98	368,93	$ 20.249.091,98
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y tod	M2	$ 106.315		$ -		$ -		$ -	76,65	$ 8.148.874,65
9.9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49.433,00		$ -		$ -		$ -	119,43	$ 5.903.783,19
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85.366,00		$ -		$ -		$ -	1,22	$ 104.146,52
10.	**CUBIERTA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 35.678.576,64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748,00		$ -		$ -		$ -	71,68	$ 35.678.576,64

13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 84.603.952,44**		**$ 27.088.447,26**		**$ 0,00**		**$ 119.607.006,70**		
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	un	$ 2.471.279,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.471.279,00		
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f e	m2	$ 333.723	$ 202,98	$ 67.739.094,54		$ -		$ -	202,98	$ 67.739.094,54		
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas p	m2	$ 537.954	$ 31,35	$ 16.864.857,90		$ -		$ -	39,35	$ 21.168.489,90		
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	un	$ 569.848,00	$ -	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.139.696,00		
13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75.774,00		$ -	$ 357,49	$ 27.088.447,26		$ -	357,49	$ 27.088.447,26		
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 45.126,00**		
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 45.126,00		
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 34.832,00**		
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34.832,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 34.832,00		
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 530.625,60**		
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria . incluve revision v destape con sonda .	M	$ 36.849,00		$ -		$ -		$ -	14.40	$ 530.625,60		
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 97.870.581,71**		
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473,00		$ -		$ -		$ -	110,00	$ 17.542.030,00		
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye ma	UN	$ 120.813		$ -		$ -		$ -	109,00	$ 13.168.617,00		
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159.473,00		$ -		$ -		$ -	115,00	$ 18.339.395,00		
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803,00		$ -		$ -		$ -	115,00	$ 20.562.345,00		
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica bla	M	$ 98.119		$ -		$ -		$ -	124,09	$ 12.175.586,71		
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141		$ -		$ -		$ -	830,00	$ 13.397.030,00		
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141,00		$ -		$ -		$ -	108,00	$ 1.743.228,00		
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847		$ -		$ -		$ -	50,00	$ 942.350,00		
20	**NO PREVISTOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.924.230,00**		**$ 198.249.077,40**		
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145.746		$ -		$ -		$ -	39,45	$ 5.749.679,70		
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124.352		$ -		$ -		$ -	17,03	$ 2.117.714,56		
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.509.419,00		
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	M	$ 448.016		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 448.016,00		
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 7.448.112,00		
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	UN	$ 30.046		$ -		$ -		$ -	45,00	$ 1.352.070,00		
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP. LSZH. categoria 6A	M	$ 10.110		$ -		$ -		$ -	4.230,00	$ 42.765.300,00		
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159.385		$ -		$ -		$ -	115,00	$ 18.329.275,00		
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354.386		$ -		$ -		$ -	279,00	$ 98.873.694,00		
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35.881		$ -		$ -		$ -	33,00	$ 1.184.073,00		
NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116.351		$ -		$ -		$ -	107,70	$ 12.531.002,70		
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39.308		$ -		$ -		$ -	102,18	$ 4.016.491,44		
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	UN	$ 29.155					66,00	$ 1.924.230,00	66,00	$ 1.924.230,00		
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 84.603.952,44**		**$ 27.088.447,26**		**$ 22.173.321,98**		**$ 632.854.082,49**		
	A.I.U 26 %	**20%**			**$ 16.920.790,00**		**$ 5.417.689,00**		**$ 4.434.664,00**		**$ 126.570.816,00**		
		1%			**$ 846.040,00**		**$ 270.884,00**		**$ 221.733,00**		**$ 6.328.541,00**		
		5%			**$ 4.230.198,00**		**$ 1.354.422,00**		**$ 1.108.666,00**		**$ 31.642.704,00**		
	VALOR COSTO DIRECTO + AIU				**$ 106.600.980,44**		**$ 34.131.442,26**		**$ 27.938.384,98**		**$ 797.396.143,49**		
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				**$ 803.737,62**		**$ 257.340,18**		**$ 210.646,54**		**$ 6.012.113,76**		
	AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO				**$ 107.404.718,06**		**$ 34.388.782,44**		**$ 28.149.031,52**		**$ 803.408.257,25**		
	AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO + SUMINISTRO			**1,74%**	**$ 107.404.718,06**	**5,54%**	**$ 34.388.782,44**	**1,77%**	**$ 28.149.031,52**	**1,45%**	**$ 893.586.273,99**	**46,06%**	
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL	**$ 1.940.000.000,00**											

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 12 15-12-2024 AL 20-12-2024		SEMANA 13 03-02-2025 AL 08-02-2025		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 75.779.846,00**
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798							1,00	$ 4.662.798,00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518							2,00	$ 13.409.036,00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14.427.003							4,00	$ 57.708.012,00
					$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 75.779.846,00**
TOTAL					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 14.398.170,74**
IVA		**19%**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 90.178.016,74**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	9.4 Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	**CANTIDAD:**	368,93

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina Seccional Judicatura	7,90	3,79	2,19	29,94		M2	27,75
Oficina Director	6,40	5,20	0,55			M2	32,73
Oficina Secretaria Director	6,40	3,50				M2	22,40
Salon Admon	6,50	1,50				M2	9,75
Salon Admon	7,95	2,67				M2	21,23
Salon Admon	9,40	5,25				M2	49,35
Salon Admon	18,40	8,65	0,71	159,16		M2	158,45
Salon Admon	6,35	7,45				M2	47,29
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	368,93



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.31 Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	**CANTIDAD:**	66,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA					66,00	UN	66,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	66,00



OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	BGA-044-2024

ANTES	**DESPUES**
	
ITEM 9.4 Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	**ITEM 9.4** Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)
ANTES	**DESPUES**
	
ITEM NP.31 Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	**ITEM NP.31** Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo

Formato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 13

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	BGA-044-2024
Valor Inicial:	$ 1.940.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.940.000.000,00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2024
Fecha fin inicial:	27 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	20 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	3 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de marzo de 2025

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 15 Del: 17-02-25 Al: 23-02-25 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias desde acta de inicio: 107 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 79,26%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ -

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,77%	46,06%
Valor de la Obra Ejecutada:	**$ 34.388.782,44**	**$ 893.586.273,99**

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	46,06%	46,06%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	0,00%	46,06%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA	La Obra Presenta Retrasos		
DIAS DE RETRASO	5		



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES **CANT.** **UNIDAD**

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Rotacion de personal
- Definicion de subcontratista para realizar actividad mantenimiento de fachada.
- Demoras en entrega de enchape piedra muñeca

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

El contratista de obra se compromete a mantener personal minimo requerido para ejecutar cada actividad sin que esto afecte el avance de obra.
El contratista informara durante el transcurso de la semana el contratista que realizara la actividad de mantenimientode fachada y la fecha en que se realizara la actividad.
Se esta revisando la alternativa de cambiar el proveedor del enchape el cual le garantice la pronta entrega de la piedra muñeca.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta retraso de las actividades programadas dentro del cronograma de actividades en Suministro e instalacion de meson en granito, Suministro e instalacion de logo en puertas de vidrio, Mantenimiento de fachada. Lo anterior debido a que se encuentra pendiente instalar enchape de piedra muñeca en muro adyacente tras imprevisto por demolicion de muro en mamposteria, no se ha definido por parte del contratista de obra el contratista que realizara la actividad de mantenimiento de fachada.

OBSERVACIONES

- Se calcula porcentaje de avance en tiempo a partir del acta de inicio de obra hasta la fecha de corte del informe semanal.
- Se calcula porcentaje de avance en valor de obra ejecutado con base a las cantidades medidas en obra con respecto a los valores de refencia para el contrato de obra sobre los items ejecutados durante la semana comprendida desde el 17 febrero al 23 febrero 2025

FIRMAS

Representante legal de Interventoría

JAVIER ARCCA GUASTUMAL

Ingeniero Residente

JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

PRESUPUESTO DE OBRA:
CONCRETO OBRA ARQUITECTONICA S.A.C.
LICITACION PUBLICA No. 0006-2024-CJ-CSJ/PJ-TOTAL
CONSTRUCCION EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN: 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 10-35 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN SEDES JUDICIALES DE DIVISA MUNICIPAL LOCAL EN LA CANTIDAD TOTAL Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA No. 1 30-09-2024 AL 06-10-2024		SEMANA No. 2 7-10-2024 AL 13-10-2024		SEMANA No. 3 14-10-2024 AL 20-10-2024		SEMANA No. 4 21-10-2024 AL 26-10-2024		SEMANA No. 5 28-10-2024 AL 3-11-2024		SEMANA No. 6 4-11-2024 AL 10-11-2024		SEMANA No. 7 11-11-2024 AL 17-11-2024		SEMANA No. 8 18-11-2024 AL 22-11-2024		SEMANA No. 9 25-11-2024 AL 30-11-2024		SEMANA No. 10 01-12-2024 AL 07-12-2024		SEMANA No. 11 8-12-2024 AL 14-12-2024		SEMANA No. 12 15-12-2024 AL 19-12-2024		SEMANA No. 13 01-02-2025 AL 09-02-2025		SEMANA No. 14 10-02-2025 AL 15-02-2025		SEMANA No. 15 17-02-2025 AL 22-02-2025		CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO		
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 17.940.268,56**		**$ 14.863.231,20**		**$ 5.767.363,92**		**$ 1.973.761,92**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 33.536,00**		**$ 3.877.360,12**		**$ 1.944.547,77**		**$ 3.869.770,98**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 48.670.430,79**
1.1	Suministro e instalación de Cerramiento provisional en prefabricados. Incluye postes cada 1.5 , puertas y accesorios	M	$ 19.313,00	-	$ 0,00	7,50	$ 144.847,50	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,50	$ 144.847,50
1.2	Demolición de concreto simple de Oficina. (Incluye Acarreos y disposición final)	M2	$ 25.220,00	-	$ 0,00	109,61	$ 2.803.224,20	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	109,61	$ 2.803.224,20
1.3	Demolición de concreto reforzado. (Incluye Acarreos y disposición final)	UN	$ 33.500,00	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 33.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 33.536,00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, traslado a disposición final)	UN	$ 36.400,00	-	$ 0,00	15,00	$ 546.000,00	8,00	$ 291.224,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23,00	$ 837.224,00
1.7	Desmonte y retiro de muebles bajos en madera. (Incluye traslado a disposición final)	UN	$ 261.244,00	40,44	$ 2.305.313,92	-	$ -	-	$ 0,00	7,56	$ 268.967,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	48,00	$ 2.748.613,92
1.8	Desmonte y retiro de muebles bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye traslado y disposición final)	M	$ 37.946,00	32,52	$ 1.223.060,96	8,57	$ 325.186,36	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	41,09	$ 1.548.247,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2.5 m x1.60 m . (Incluye traslado y disposición final)	UN	$ 121.586,00	6,00	$ 729.516,00	1,00	$ 121.586,00	1,00	$ 121.586,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 972.688,00
1.10	Desmonte de mamdamiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye traslado y disposición final)	M	$ 28.517,00	21,30	$ 607.412,10	46,23	$ 1.318.323,91	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66,53	$ 1.897.236,01
1.12	Desmonte de ventanería existente. (Incluye Acarreos y disposición final)	UN	$ 29.966,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	sin uso	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 0,00
1.13	Desmonte Cielo UTP Equivalente a 40 de tablería o cielofalso. (Incluye traslado y disposición final)	M	$ 1.670,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1.564,50	$ 2.589.247,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.564,50	$ 2.589.247,00
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye traslado y disposición final)	M2	$ 23.060,00	438,59	$ 12.699.969,50	244,81	$ 4.466.453,41	-	$ 0,00	29,41	$ 1.224.105,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,12	$ 798.339,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	824,86	$ 19.192.867,79
1.16	Desmonte de ductería tiene Acondicionado Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye traslado y disposición final)	M	$ 49.936,00	-	$ 0,00	80,62	$ 3.914.584,72	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	75,95	$ 3.663.972,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	156,57	$ 7.597.557,32
1.17	retiro de impermeabilización actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio. (Incluye acarreo, traslado y disposición final)	M2	$ 16.476,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	82,74	$ 1.363.472,46	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	82,74	$ 1.363.472,46
1.19	Demolición de pañetes (Incluye acarreo, traslado y disposición final)	M2	$ 26.339,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,94	$ 972.914,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 972.914,66
1.20	Demolición de pañetes Muy Duros. (Incluye acarreo y disposición final)	M2	$ 24.567,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,39	$ 896.529,77	-	$ -	1,67	$ 38.213,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 934.743,57
1.21	Demolición de mamposteria en muchero. (Incluye acarreo y disposición final)	M	$ 12.408,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	59,23	$ 753.553,98	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 753.553,98
1.22	Demolición muros en mampostería en Ecrito. (Incluye acarreo, traslado y disposición final)	M2	$ 25.246,00	$ -	$ -	+	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,65	$ 194.387,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,65	$ 194.387,52
1.26	Demolición de cubierta. (Incluye acarreo y disposición final)	M2	$ 13.652,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,35	$ 373.472,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 373.472,20
1.28	Incluye Suministro de brocheria, duelo de base y herrajes	UN	$ 238.276,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	$ 476.552,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 476.552,00
2.					**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 6.134.754,03**		**$ 442.334,98**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.577.089,01**
2.1	suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Poliuretano monocomponente de elevada elasticidad (puentes de fisuras >1 mm) tipo impetanto sicurf + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye acarreo y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 86.241,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	82,74	$ 6.134.754,03	4,50	$ 462.334,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	87,24	$ 6.579.088,53
3.	**MAMPOSTERIA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 439.284,17**		**$ 0,00**		**$ 99.999,45**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 551.283,62**
3.1	Muro en Mirroca No.4. (Suministro e instalación. Incluye acarreo de mezcla)	M2	$ 65.451,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,65	$ 435.284,17	-	$ -	1,53	$ 99.999,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,18	$ 535.283,62
4.	**CONSTRUCCION EN SECO**				**$ 0,00**		**$ 0,00**										**$ 33.536,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 33.536,00**
4.1	Muro en Drywall doble cara, en 12 cm, con aislamiento acustico interior (tipo fonacoustyl y fonadry) y estructura en perfiles de lamina galvanizada estandarizados. Incluye perfileria, tornillos, cinta, malla, pañete, lijado y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	$ 129.763,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,31	$ 299.621,83	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,31	$ 299.621,83
4.2	Division para muebles en Drywall doble cara, en 12 cm, ancho=80 cm, con acabado en pintura vinilo tipo 1 y estructura en perfiles galvanizados e instalación. Incluye perfileria, malla, cinta, pañete, lijado, vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	$ 105.446,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,80	$ 163.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,80	$ 163.944,00
5.	**ALISTADO DE PISOS - POLLOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.071.047,71**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.071.047,71**
5.1	Suministro e instalación de Alistado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye distanciones, maestras, nivelación, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 54.791,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 2.071.047,71	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	37,80	$ 2.071.047,71
6.	**PISOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 370.268,65**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 370.268,65**
6.1	Suministro e instalación de Baldosa tipo piedra 1.5 Incluye Boz y Alistamiento	M2	$ 36.999,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	sin uso	$ 10.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 10.000,00
6.2	Suministro e instalación de Baldosa tipo piedra 1.5 Incluye Boz y Alistamiento	M2	$ 21.365,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	1,50	$ 32.047,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,50	$ 32.047,50
7.	**CIELO RASOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 93.158.097,96**		**$ 6.933.760,98**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 100.091.858,94**
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de ejecución. Suministro e instalación. Incluye perfileria, etc	M2	$ 198.362,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	535,63	$ 93.158.097,96	81,23	$ 6.933.760,98	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	616,86	$ 100.091.858,94
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.594.930,79**										**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.174.480,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.329.333,79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, fibra y adherentes)	M2	$ 18.492,00	-	$ -	-	$ -	127,62	$ 2.594.930,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	127,62	$ 2.594.930,79
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, fibra y adherentes)	M2	$ 17.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	121,20	$ 2.174.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	121,20	$ 2.174.480,00
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 5.186.810,16**		**$ 4.607.897,39**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.794.707,55**
9.2	Suministro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable cl. + embaquetado en nucleo,pega junta claro CGP004 (Suministro e instalación , incluye pegamento , baquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152.314,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	87,09	$ 13.262.444,26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	87,09	$ 13.262.444,26
9.4	Rodeo y bolleda de piso-rodenden en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, herramienta, subte, cortes en sitio)	M2	$ 54.886,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	368,93	$ 20.249.091,98	-	$ -	-	$ -	368,93	$ 20.249.091,98
9.7	Suministro e instalación de Guardaescoba en Ceramica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , baquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 139.315	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,35	$ 9.848.473,50	49,45	$ 6.888.446,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	105,80	$ 16.736.920,25
9.9	Suministro e instalación de Guardaescoba en Ceramica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , baquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49.432,00	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,28	$ 1.316.177,44	88,35	$ 5.367.436,55	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	109,63	$ 6.901.783,19
9.11	Enchape pared cerámica 1 Suministro e instalación , incluye pegamento , baquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etc	M2	$ 85.366,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,22	$ 104.146,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,22	$ 104.146,52
10.	**CUBIERTA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 35.678.576,64**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 35.678.576,64**
10.1	Suministro e instalacion de teja tipo Roberlo, incluye estructura metalica tubería 2 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrilico Mildu en resina Sunbrat y Schmeller +PTL, con soportes en tubo de 7"	M2	$ 497.748,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	71,68	$ 35.678.576,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	71,68	$ 35.678.576,64
11.	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 6.779.911,00**		**$ 1.139.494,00**		**$ 0,00**		**$ 84.683.552,44**		**$ 27.280.457,24**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 119.887.564,70**
11.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetes pivotados en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital Yale modelo YDM 4109 A/W/B/V/0 o similar con lectora de proximidad, teclado y código de seguridad. Con botón RFID. Cuelga temporizado, sandblasting de rosarios 1.20 con cajas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	un	$ 2.471.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.471.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.471.276,00
11.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm. incluye cierre en	m2	$ 233.723	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ 282,98	$ 67.739.099,54	-	$ -	-	$ -	-	$ -	sin uso	$ 67.739.099,54
11.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas	m2	$ 537.994	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 4.303.632,00	-	$ -	-	$ -	$ 31,35	$ 16.864.852,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	39,35	$ 21.168.485,80
11.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye rigida para cipa y todo lo necesario para su correcta instalación	un	$ 569.846,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.139.496,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.139.496,00
11.9	Aire de cord Mother - Suministro e instalación	M2	$ 76.774,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 357,46	$ 27.280.457,24	-	$ -	357,46	$ 27.280.457,24
12.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
14.1	Reinstalacion lamparas existentes	UN	$ 40.126	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	sin uso	$ -	$ 40.126,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	+	$ 40.126,00
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**												**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 34.912,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 34.912,00**
15.1	Reposito obertura de 12" . Suministro	UN	$ 34.912,00	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 34.912,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 34.912,00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**										**$ 530.625,60**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 530.625,60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria. incluye aseo y destape con varilla	M	$ 36.855,00	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	530.625,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,40	$ 530.625,60

| | | |

		CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES MODELADO CONFORMADAS 7-OCT-2024			SEMANA 2 7-10-2024 AL 13-10-2024		SEMANA 3 14-10-2024 AL 20-10-2024		SEMANA 4 21-10-2024 AL 26-10-2024		SEMANA 5 28-10-2024 AL 3-11-2024		SEMANA 6 4-11-2024 AL 10-11-2024		SEMANA 7 11-11-2024 AL 17-11-2024		SEMANA 8 18-11-2024 AL 22-11-2024		SEMANA 9 25-11-2024 AL 30-11-2024		SEMANA 10 01-12-2024 AL 07-12-2024		SEMANA 11 8-12-2024 AL 14-12-2024		SEMANA 12 15-12-2024 AL 20-12-2024		SEMANA 13 03-02-2025 AL 08-02-2025		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO AIRES DE DIA	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO			CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
19	2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS				$ 128.248.700,00																$ 75.779.866,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00							$ 75.779.866,00
NP-14	Suministro e instalación de una Ausubicmada de 12.000PTL. Incluye tubería cobre aislada en cubierta. Acometimiento a tierra más complementos.	UN	$ 4.662.796																	1,00	$ 4.662.796,00														1,00	$ 4.662.796,00
NP-15	Suministro e instalación de una Ausubicmada de 9.000PTL. Incluye tubería cobre aislada en cubierta. Acometimiento a tierra más complementos.	UN	$ 9.779.518																	2,00	$ 19.559.036,00														2,00	$ 19.559.036,00
NP-16	Suministro e instalación de una Ausubicmada de 36.000PTL. Incluye tubería cobre aislada en cubierta. Acometimiento a tierra más complementos.	UN	$ 14.427.022																	4,00	$ 57.708.012,00														4,00	$ 57.708.012,00
TOTAL																					$ 75.779.866,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00					$ 75.779.866,00
30%		15%																			$ 11.366.979,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00					$ 11.366.979,90
																					$ 87.146.845,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00					$ 87.146.845,90

Formato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 16

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	BGA-044-2024
Objeto	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD
Valor Inicial:	$ 1,940,000,000.00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1,940,000,000.00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2024
Fecha fin inicial:	27 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	20 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	3 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de marzo de 2025

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 16 Del: 24-02-25 Al: 02-03-25 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato
Numero dias desde acta de inicio: 114 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 84.44%
Nombre del Supervisor ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	0.00%
Valor de la Obra programada:	$ 0.00	$ -

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1.06%	47.12%
Valor de la Obra Ejecutada:	**$ 20,553,874.46**	**$ 914,140,148.45**

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	46.06%	47.12%
Durante el periodo	0.00%	1.06%	
Acumulado actual	0.00%	47.12%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra Presenta Retrasos	
DIAS DE RETRASO		10	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

		CANT.	UNIDAD
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN	8
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	2
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN	18
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN	65
NP.37	Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	8.47

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En relacion al cronograma de actividades para la semana 16 se presenta retraso en actividades de instalacion muro en drywall en cuarto rack, instalacion de luminarias led 18 w en baños, instalacion de detector de moviemiento.
Aun continua pendiente ejecutar actividad por parte del contratista de obra programada en la semana 15 de Instalacion meson en granito en terraza, instalacion de logos en puertas vidrio, mantenimiento de fachada. Los retrasos son asociados a que el contratista de obra esta pendiente por definir el contratista que realizara el mantenimeinto de la fachada, presenta retrasos en los tiempos de entrega del meson en granito, pendiente por realizar compra de insumos electricos.

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

Contratista de obra se compromete a informar a la interventoria sobre la reprogramacion de actividades que a la fecha presenta retrasos con el fin de dar cumplimiento al plazo contractual. Asi mismo revisara tiempos de entrega por parte de proveedores de elementos electricos y mobiliario para realizar la respectiva instalacion.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra presenta un porcentaje de avance presupuestal del 47.14% con respecto al valor contractual. Se identifica ruta critica con respecto a la instalacion de buitrones en virdio los cuales se tiene programado iniciar actividad el 3 al 7 de marzo 2025. Se realizan en obra actividades de terminacion en acabos en oficinas administrativas con el fn de iniciar la instalacion del mobiliario que se encuentra acopiado en oficinas de magistrados para continuar con adecuaciones en dicha zona. Se presenta un atraso de dos semanas de actividades programadas en la semana 15 y la semana 16.

OBSERVACIONES

- Se calcula porcentaje de avance en tiempo a partir del acta de inicio de obra hasta la fecha de corte del informe semanal.
- Se calcula porcentaje de avance en valor de obra ejecutado con base a las cantidades medidas en obra con respecto a los valores de refencia para el contrato de obra sobre los items ejecutados durante la semana comprendida desde el 24 febrero al 2 marzo 2025

FIRMAS

Representante legal de Interventoría
JAVIER AROCA GUASTUMAL

Ingeniero Residente
JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

PRESUPUESTO DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025		SEMANA 15 17-02-2025 AL 22-02-2025		SEMANA 16 24-02-2025 AL 02-03-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 49,670,469.75**
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15,313.00		$ -		$ -		$ -	7.50	$ 114,847.50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19,220.00		$ -		$ -		$ -	200.61	$ 3,855,724.20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33,566.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 33,566.00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36,403.00		$ -		$ -		$ -	23.00	$ 837,269.00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35,254.00		$ -		$ -		$ -	78.00	$ 2,749,812.00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37,548.00		$ -		$ -		$ -	41.09	$ 1,542,847.32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121,586.00		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 972,688.00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28,517.00		$ -		$ -		$ -	66.53	$ 1,897,236.01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29,965.00		$ -		$ -		$ -	102.00	$ 3,056,430.00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1,655.00		$ -		$ -		$ -	1,564.50	$ 2,589,247.50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31,067.00		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 19,163,874.67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48,556.00		$ -		$ -		$ -	156.47	$ 7,597,557.32
1.17	retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16,479.00		$ -		$ -		$ -	82.74	$ 1,363,472.46
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26,335.00		$ -		$ -		$ -	36.94	$ 972,814.90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24,767.00		$ -		$ -		$ -	37.42	$ 926,741.51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13,408.00		$ -		$ -		$ -	56.23	$ 753,931.84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29,240.00		$ -		$ -		$ -	6.65	$ 194,387.52
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13,632.00		$ -		$ -		$ -	27.25	$ 371,472.00
1.28	((incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338,275.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 676,550.00
2.	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 8,579,288.51**
2.1	suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98,341.00		$ -		$ -		$ -	87.24	$ 8,579,288.51
3.	**MAMPOSTERÍA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 494,980.98**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65,491.00		$ -		$ -		$ -	7.56	$ 494,980.98
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 402,365.83**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129,793.00		$ -		$ -		$ -	2.31	$ 299,821.83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120,640.00		$ -		$ -		$ -	0.85	$ 102,544.00
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 2,071,647.71**
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54,791.00		$ -		$ -		$ -	37.81	$ 2,071,647.71
6.	**PAÑETES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 570,248.65**
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36,849.00		$ -		$ -		$ -	14.10	$ 519,570.90
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21,565.00		$ -		$ -		$ -	2.35	$ 50,677.75
7.	**CIELO RASOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 66,831,878.62**
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y t	M2	$ 108,342.00		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 66,831,878.62
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 4,529,035.79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18,450.00		$ -		$ -		$ -	127.62	$ 2,354,555.79
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17,650.00		$ -		$ -		$ -	123.20	$ 2,174,480.00
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 20,249,091.98**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 47,688,340.60**
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152,514.00		$ -		$ -		$ -	87.09	$ 13,282,444.26
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54,886.00	368.93	$ 20,249,091.98		$ -		$ -	368.93	$ 20,249,091.98
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo ne	M2	$ 106,315		$ -		$ -		$ -	76.65	$ 8,148,874.65
9.9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49,433.00		$ -		$ -		$ -	119.43	$ 5,903,783.19
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85,366.00		$ -		$ -		$ -	1.22	$ 104,146.52
10.	**CUBIERTA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 35,678,576.64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497,748.00		$ -		$ -		$ -	71.68	$ 35,678,576.64

13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 119,607,006.70**
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	un	$ 2,471,279.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$	2,471,279.00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructu	m2	$ 333,723		$ -		$ -		$ -	202.98		$ 67,739,094.54
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotada	m2	$ 537,954		$ -		$ -		$ -	39.35	$	21,168,489.90
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	un	$ 569,848.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$	1,139,696.00
13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75,774.00		$ -		$ -		$ -	357.49	$	27,088,447.26
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 45,126.00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45,126		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 45,126.00
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 34,832.00**
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34,832.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$	34,832.00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 530,625.60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36,849.00		$ -		$ -		$ -	14.40		$ 530,625.60
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 966,504.00**			**$ 98,837,085.71**
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159,473.00		$ -		$ -		$ -	110.00		$ 17,542,030.00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco so	UN	$ 120,813		$ -		$ -	8.00	$ 966,504.00	117.00		$ 14,135,121.00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159,473.00		$ -		$ -		$ -	115.00	$	18,339,395.00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178,803.00		$ -		$ -		$ -	115.00	$	20,562,345.00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, co	M	$ 98,119		$ -		$ -		$ -	124.09		$ 12,175,586.71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16,141		$ -		$ -		$ -	830.00		$ 13,397,030.00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16,141.00		$ -		$ -		$ -	108.00		$ 1,743,228.00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18,847		$ -		$ -		$ -	50.00		$ 942,350.00
20	**NO PREVISTOS**				**$ 1,924,230.00**		**$ 0.00**		**$ 7,350,057.14**			**$ 205,599,134.54**
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145,746		$ -		$ -		$ -	39.45		$ 5,749,679.70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124,352		$ -		$ -		$ -	17.03		$ 2,117,714.56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1,509,419		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 1,509,419.00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	M	$ 448,016		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 448,016.00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7,448,112		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 7,448,112.00
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	UN	$ 30,046		$ -		$ -		$ -	45.00		$ 1,352,070.00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	$ 10,110		$ -		$ -		$ -	4,230.00		$ 42,765,300.00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159,385		$ -		$ -		$ -	115.00		$ 18,329,275.00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354,386		$ -		$ -		$ -	279.00		$ 98,873,694.00
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35,881		$ -		$ -		$ -	33.00		$ 1,184,073.00
NP.22	Suministro e instalación de tuberia de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116,351		$ -		$ -		$ -	107.70		$ 12,531,002.70
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39,308		$ -		$ -		$ -	102.18		$ 4,016,491.44
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN	$ 32,564		$ -		$ -	18.00	$ 586,152.00	18.00		$ 586,152.00
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN	$ 39,680		$ -		$ -	65.00	$ 2,579,200.00	65.00		$ 2,579,200.00
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	UN	$ 29,155	66.00	$ 1,924,230.00		$ -		$ -	66.00		$ 1,924,230.00
NP.37	Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$ 494,062		$ -		$ -	8.47	$ 4,184,705.14	8.47		$ 4,184,705.14
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 22,173,321.98**		**$ 0.00**		**$ 8,316,561.14**			**$ 641,170,643.63**
	A.I.U 26 %	**20%**			**$ 4,434,664.00**		**$ 0.00**		**$ 1,663,312.00**			**$ 128,234,129.00**
		1%			**$ 221,733.00**		**$ 0.00**		**$ 83,166.00**			**$ 6,411,706.00**
		5%			**$ 1,108,666.00**		**$ 0.00**		**$ 415,828.00**			**$ 32,058,532.00**
	VALOR COSTO DIRECTO + AIU				**$ 27,938,384.98**		**$ 0.00**		**$ 10,478,867.14**			**$ 807,875,010.63**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				**$ 210,646.54**		**$ 0.00**		**$ 79,007.32**			**$ 6,091,121.08**
	AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO				**$ 28,149,031.52**		**$ 0.00**		**$ 10,557,874.46**			**$ 813,966,131.71**
	AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO + SUMINISTRO			**1.77%**	**$ 28,149,031.52**	**1.45%**	**$ 0.00**	**0.00%**	**$ 20,553,874.46**	**1.06%**		**$ 914,140,148.45** **47.12%**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL	**$ 1,940,000,000.00**										

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025		SEMANA 15 17-02-2025 AL 22-02-2025		SEMANA 16 24-02-2025 AL 02-03-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 8,400,000.00**		**$ 84,179,846.00**
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4,200,000		$ -		$ -	2.00	$ 8,400,000.00	2.00	$ 8,400,000.00
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4,662,798		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 4,662,798.00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6,704,518		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 13,409,036.00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14,427,003		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 57,708,012.00
					$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 8,400,000.00**		**$ 84,179,846.00**
TOTAL					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 1,596,000.00**		**$ 15,994,170.74**
IVA		**19%**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,996,000.00**		**$ 100,174,016.74**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	17.5 Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	**CANTIDAD:**	8.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DIRECTOR					1.00	UN	1.00
BAÑOS PUBLICOS					2.00	UN	2.00
CUARTO RACK					2.00	UN	2.00
PASILLO RECEPCION					1.00	UN	1.00
BAÑO VICEPRESIDENTE					1.00	UN	1.00
BAÑO PRESIDENTE					1.00	UN	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	8.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.12 Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	**CANTIDAD:**	2.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PALACIO DE JUSTICIA					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	2.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.29 Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	**CANTIDAD:**	18.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA SECCIONAL					1.00	UN	1.00
OFICINA ASISTENCIA LEGAL					1.00	UN	1.00
OFICINA TALENTO HUMANO					3.00	UN	3.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS					3.00	UN	3.00
OFICINA TALENTO HUMANO LIQUIDADOR					1.00	UN	1.00
OFICINA FINANCIERA					2.00	UN	2.00
OFICINA SECRETARIA DIRECCION					2.00	UN	2.00
OFICINA DIRECCION					2.00	UN	2.00
OFICINA PRESIDENTE					1.00	UN	1.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1.00	UN	1.00
SALA JUNTAS					1.00	UN	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL :	18.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.30 Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	**CANTIDAD:**	65.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA SECCIONAL					6.00	UN	6.00
OFICINA ASISTENCIA LEGAL					6.00	UN	6.00
OFICINA TALENTO HUMANO					16.00	UN	16.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS					9.00	UN	9.00
OFICINA TALENTO HUMANO LIQUIDADOR					6.00	UN	6.00
OFICINA FINANCIERA					5.00	UN	5.00
OFICINA SECRETARIA DIRECCION					2.00	UN	2.00
OFICINA DIRECCION					3.00	UN	3.00
CABINA RECEPCION					1.00	UN	1.00
RECEPCION					1.00	UN	1.00
RACK					4.00	UN	4.00
OFICINA PRESIDENTE					1.00	UN	1.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1.00	UN	1.00
SALA JUNTAS					4.00	UN	4.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	65.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	NP.37 Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	**CANTIDAD:**	8.47

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PUERTA VENTANA TERRAZA	2.35	2.35				M2	5.52
PUERTA VENTANA OFICINA PRESIDENTE	1.30	2.27				M2	2.95
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**8.47**



OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	BGA-044-2024

ANTES	**DESPUES**
	
ITEM 17.5 Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm	**ITEM 17.5** Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm
ANTES	**DESPUES**
	
ITEM NP.29 Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	**ITEM NP.29** Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco
ANTES	**DESPUES**
	
ITEM NP.30 Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	**ITEM NP.30** Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco
	
ITEM NP.37 Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	**ITEM NP.37** Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3

Formato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 17

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	BGA-044-2024
Valor Inicial:	$ 1,940,000,000.00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1,940,000,000.00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2024
Fecha fin inicial:	27 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	20 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	3 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de marzo de 2025

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 17 Del: 03-03-25 Al: 09-03-25 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias desde acta de inicio: 121 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 89.63%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	0.00%
Valor de la Obra programada:	$ 0.00	$ -

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.36%	47.47%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 7,065,273.30	$ 920,870,554.75

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	47.10%	47.47%
Durante el periodo	0.00%	0.36%	
Acumulado actual	0.00%	47.47%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra Presenta Retrasos	
DIAS DE RETRASO		5	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES	CANT.	UNIDAD
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	315.32

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En relacion al cronograma de actividades para la semana 17 se presenta retraso en actividades de instalacion de puertas en madera, panel led 18W, cortavientos en terraza. En la semana 16 continua con retraso en instalacion muro en drywall en cuarto rack, instalacion de detector de moviemiento.
Aun continua pendiente ejecutar actividad por parte del contratista de obra programada en la semana 15 de Instalacion meson en granito en terraza, instalacion de logos en puertas vidrio, manteniiento de fachada. Los retrasos son asociados a que el contratista de obra esta pendiente por definir el contratista que realizara el mantenimeinto de la fachada, presenta retrasos en los tiempos de entrega del meson en granito, pendiente por realizar compra de insumos electricos, madera y

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

Contratista de obra se compromete a informar a la interventoria sobre la reprogramacion de actividades que a la fecha presenta retrasos con el fin de dar cumplimiento al plazo contractual. Asi mismo revisara tiempos de entrega por parte de proveedores de elementos electricos y mobiliario para realizar la respectiva instalacion.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra presenta un porcentaje de avance presupuestal del 47.48% con respecto al valor contractual. Se identifica ruta critica con respecto a la instalacion de buitrones en virdio los cuales se tiene programado iniciar actividad el 3 al 7 de marzo 2025 presentando estas retrasos en inicio de actividad. en la semana 17 se realizan actividades de aplicacion depintura tercera mano en oficinas administrativas, permitiendo mover el moviliario existente de la oficina de magistrado a las oficinas admnistrativas para continuar con las actividades de adecuacion en dicha zona.

OBSERVACIONES

- Se calcula porcentaje de avance en tiempo a partir del acta de inicio de obra hasta la fecha de corte del informe semanal.
- Se calcula porcentaje de avance en valor de obra ejecutado con base a las cantidades medidas en obra con respecto a los valores de refencia para el contrato de obra sobre los items ejecutados durante la semana comprendida desde el 3 marzo al 9 marzo 2025

FIRMAS

Representante legal de Interventoría
JAVIER AROCA GUASTUMAL

Ingeniero Residente
JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

PRESUPUESTO DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025		SEMANA 15 17-02-2025 AL 22-02-2025		SEMANA 16 24-02-2025 AL 02-03-2025		SEMANA 17 3-03-2025 AL 09-03-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 49,670,469.75**
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15,313.00		$ -		$ -		$ -		$ -	7.50	$ 114,847.50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19,220.00		$ -		$ -		$ -		$ -	200.61	$ 3,855,724.20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33,566.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 33,566.00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36,403.00		$ -		$ -		$ -		$ -	23.00	$ 837,269.00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35,254.00		$ -		$ -		$ -		$ -	78.00	$ 2,749,812.00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37,548.00		$ -		$ -		$ -		$ -	41.09	$ 1,542,847.32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121,586.00		$ -		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 972,688.00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28,517.00		$ -		$ -		$ -		$ -	66.53	$ 1,897,236.01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29,965.00		$ -		$ -		$ -		$ -	102.00	$ 3,056,430.00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1,655.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,564.50	$ 2,589,247.50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31,067.00		$ -		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 19,163,874.67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48,556.00		$ -		$ -		$ -		$ -	156.47	$ 7,597,557.32
1.17	retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16,479.00		$ -		$ -		$ -		$ -	82.74	$ 1,363,472.46
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26,335.00		$ -		$ -		$ -		$ -	36.94	$ 972,814.90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24,767.00		$ -		$ -		$ -		$ -	37.42	$ 926,741.51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13,408.00		$ -		$ -		$ -		$ -	56.23	$ 753,931.84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29,240.00		$ -		$ -		$ -		$ -	6.65	$ 194,387.52
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13,632.00		$ -		$ -		$ -		$ -	27.25	$ 371,472.00
1.28	I (incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338,275.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 676,550.00
2.	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 8,579,288.51**
2.1	suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98,341.00		$ -		$ -		$ -		$ -	87.24	$ 8,579,288.51
3.	**MAMPOSTERÍA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 494,980.98**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65,491.00		$ -		$ -		$ -		$ -	7.56	$ 494,980.98
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 402,365.83**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129,793.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.31	$ 299,821.83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120,640.00		$ -		$ -		$ -		$ -	0.85	$ 102,544.00
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 2,071,647.71**
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54,791.00		$ -		$ -		$ -		$ -	37.81	$ 2,071,647.71
6.	**PAÑETES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 570,248.65**
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36,849.00		$ -		$ -		$ -		$ -	14.10	**$ 519,570.90**
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21,565.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.35	$ 50,677.75
7.	**CIELO RASOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 66,831,878.62**
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y t	M2	$ 108,342.00		$ -		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 66,831,878.62
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 5,565,398.00**		**$ 10,094,433.79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18,450.00		$ -		$ -		$ -		$ -	127.62	$ 2,354,555.79
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17,650.00		$ -		$ -		$ -	315.32	$ 5,565,398.00	438.52	$ 7,739,878.00
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 20,249,091.98**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 47,688,340.60**
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152,514.00		$ -		$ -		$ -		$ -	87.09	$ 13,282,444.26
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54,886.00	368.93	$ 20,249,091.98		$ -		$ -		$ -	368.93	$ 20,249,091.98
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo ne	M2	$ 106,315		$ -		$ -		$ -		$ -	76.65	$ 8,148,874.65
9.9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49,433.00		$ -		$ -		$ -		$ -	119.43	$ 5,903,783.19
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85,366.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.22	$ 104,146.52
10.	**CUBIERTA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 35,678,576.64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrilico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497,748.00		$ -		$ -		$ -		$ -	71.68	$ 35,678,576.64
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 119,607,006.70**
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	un	$ 2,471,279.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,471,279.00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructu	m2	$ 333,723		$ -		$ -		$ -		$ -	202.98	$ 67,739,094.54
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotada	m2	$ 537,954		$ -		$ -		$ -		$ -	39.35	$ 21,168,489.90
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	un	$ 569,848.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,139,696.00
13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75,774.00		$ -		$ -		$ -		$ -	357.49	$ 27,088,447.26
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 45,126.00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45,126		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 45,126.00
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 34,832.00**
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34,832.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 34,832.00

16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 530,625.60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36,849.00		$ -		$ -		$ -		$ -	14.40		$ 530,625.60
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 966,504.00**		**$ 0.00**			**$ 98,837,085.71**
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159,473.00		$ -		$ -		$ -		$ -	110.00		$ 17,542,030.00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco so	UN	$ 120,813		$ -		$ -	8.00	$ 966,504.00		$ -	117.00		$ 14,135,121.00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159,473.00		$ -		$ -		$ -		$ -	115.00		$ 18,339,395.00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178,803.00		$ -		$ -		$ -		$ -	115.00		$ 20,562,345.00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, co	M	$ 98,119		$ -		$ -		$ -		$ -	124.09		$ 12,175,586.71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16,141		$ -		$ -		$ -		$ -	830.00		$ 13,397,030.00
17.11	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6	M	$ 6,029.00		$ -		$ -		$ -		$ -	-		$ -
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16,141.00		$ -		$ -		$ -		$ -	108.00		$ 1,743,228.00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18,847		$ -		$ -		$ -		$ -	50.00		$ 942,350.00
20	**NO PREVISTOS**				**$ 1,924,230.00**		**$ 0.00**		**$ 7,350,057.14**		**$ 0.00**			**$ 205,599,134.54**
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145,746		$ -		$ -		$ -		$ -	39.45		$ 5,749,679.70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124,352		$ -		$ -		$ -		$ -	17.03		$ 2,117,714.56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1,509,419		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 1,509,419.00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	M	$ 448,016		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 448,016.00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7,448,112		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 7,448,112.00
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	UN	$ 30,046		$ -		$ -		$ -		$ -	45.00		$ 1,352,070.00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	$ 10,110		$ -		$ -		$ -		$ -	4,230.00		$ 42,765,300.00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159,385		$ -		$ -		$ -		$ -	115.00		$ 18,329,275.00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de polisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354,386		$ -		$ -		$ -		$ -	279.00		$ 98,873,694.00
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35,881		$ -		$ -		$ -		$ -	33.00		$ 1,184,073.00
NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116,351		$ -		$ -		$ -		$ -	107.70		$ 12,531,002.70
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39,308		$ -		$ -		$ -		$ -	102.18		$ 4,016,491.44
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN	$ 32,564		$ -		$ -	18.00	$ 586,152.00		$ -	18.00		$ 586,152.00
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN	$ 39,680		$ -		$ -	65.00	$ 2,579,200.00		$ -	65.00		$ 2,579,200.00
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	UN	$ 29,155	66.00	$ 1,924,230.00		$ -		$ -		$ -	66.00		$ 1,924,230.00
NP.37	Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$ 494,062		$ -		$ -	8.47	$ 4,184,705.14		$ -	8.47		$ 4,184,705.14
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 22,173,321.98**		**$ 0.00**		**$ 8,316,561.14**		**$ 5,565,398.00**			**$ 646,736,041.63**
	A.I.U 26 %	**20%**			**$ 4,434,664.00**		**$ 0.00**		**$ 1,663,312.00**		**$ 1,113,080.00**			**$ 129,347,208.00**
		1%			**$ 221,733.00**		**$ 0.00**		**$ 83,166.00**		**$ 55,654.00**			**$ 6,467,360.00**
		5%			**$ 1,108,666.00**		**$ 0.00**		**$ 415,828.00**		**$ 278,270.00**			**$ 32,336,802.00**
	VALOR COSTO DIRECTO + AIU				**$ 27,938,384.98**		**$ 0.00**		**$ 10,478,867.14**		**$ 7,012,402.00**			**$ 814,887,411.63**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				**$ 210,646.54**		**$ 0.00**		**$ 79,007.32**		**$ 52,871.30**			**$ 6,143,992.38**
	AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO				**$ 28,149,031.52**		**$ 0.00**		**$ 10,557,874.46**		**$ 7,065,273.30**			**$ 821,031,404.01**
	AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO + SUMINISTRO			**1.77%**	**$ 28,149,031.52**	**1.45%**	**$ 0.00**	**0.00%**	**$ 20,219,008.46**	**1.04%**	**$ 7,065,273.30**	**0.36%**		**$ 920,870,554.75** **47.47%**

COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL	**$ 1,940,000,000.00**

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 14 10-02-2025 AL 15-02-2025		SEMANA 15 17-02-2025 AL 22-02-2025		SEMANA 16 24-02-2025 AL 02-03-2025		SEMANA 17 3-03-2025 AL 09-03-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 8,118,600.00**		**$ 0.00**		**$ 83,898,446.00**
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4,059,300		$ -		$ -	2.00	$ 8,118,600.00		$ -	2.00	$ 8,118,600.00
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4,662,798		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 4,662,798.00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6,704,518		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 13,409,036.00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14,427,003		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 57,708,012.00
					$ 0.00		**$ 0.00**		**$ 8,118,600.00**		**$ 0.00**		**$ 83,898,446.00**
TOTAL					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 1,542,534.00**		**$ 0.00**		**$ 15,940,704.74**
IVA		**19%**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,661,134.00**		**$ 0.00**		**$ 99,839,150.74**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	8.3 Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	**CANTIDAD:**	315.32

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	1.77	2.17					3.84
	0.78	2.17					1.69
	0.17	0.74					0.13
	2.05	2.17					4.45
	3.65	1.27					4.64
	0.90	0.89			4.00		3.20
	2.64	0.57					1.50
	0.93	2.64					2.46
	0.57	1.10					0.63
	0.93	1.10					1.02
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	1.61	2.17					3.49
	0.16	1.10					0.18
	3.33	2.17					7.23
	3.77	0.95					3.58
	3.39	0.18					0.61
	1.43	0.37					0.53
	1.43	0.22					0.31
	3.29	2.17					7.14
	1.70	2.17					3.69
	0.15	1.10					0.17
	0.15	2.06			2.00		0.62
	3.34	2.17					7.25
	1.52	0.25					0.38
	3.80	0.18					0.68
	3.80	0.93					3.53
OFICINA ASISTENCIA LEGAL	4.32	0.18					0.78
	1.51	0.20					0.30
	4.32	0.93					4.02
	1.98	0.12					0.24
	1.00	2.17					2.17
	5.12	2.17					11.11
	3.69	2.17					8.01
	0.20	2.17					0.43
	1.37	2.17					2.97
	0.75	2.17					1.63
	0.16	2.28			6.00		2.19
OFICINA TALENTO HIMANO GRANDE	0.12	2.10			3.00		0.76
	0.75	0.79			6.00		3.56
	2.16	0.81			3.00		5.25





	2.16	0.48			3.00		3.11
	1.58	2.20			2.00		6.95
	2.20	0.75			4.00		6.60
	1.56	2.17					3.39
	0.75	2.20			4.00		6.60
	1.61	2.20			2.00		7.08
	0.17	1.30			2.00		0.44
	0.12	2.10			2.00		0.50
OFICINA AREA FINANCIERA	0.75	0.88			4.00		2.64
	2.10	0.82			2.00		3.44
	2.10	0.48			2.00		2.02
	0.12	0.80			3.00		0.29
	3.23	2.18					7.04
	3.88	2.18					8.46
	2.74	1.53					4.19
	0.18	0.83			2.00		0.30
	0.93	0.82			7.00		5.34
	0.94	0.61					0.57
	0.94	1.81					1.70
OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	1.81	0.59					1.07
	0.59	0.61					0.36
	0.58	2.73					1.58
	2.73	0.95					2.59
	2.73	0.11					0.30
	0.64	1.45					0.93
	1.84	2.18					4.01
	1.57	0.70					1.10
	1.55	0.66					1.02
	0.90	0.81			3.00		2.19
	2.78	0.92					2.56
	2.78	0.58					1.61
	0.92	1.83					1.68
	0.58	1.83					1.06
	1.42	1.09					1.55
OFICINA TALENTO HUMANO LIQUIDADOR	3.18	0.11					0.35
	0.20	0.82					0.16
	2.28	0.73					1.66
	5.71	0.21			2.00		2.40
	5.71	0.25			2.00		2.86
	0.15	2.17					0.33
	5.71	0.15			2.00		1.71
	0.15	1.06			2.00		0.32
	0.90	0.80			2.00		1.44
	3.30	0.90					2.97
	3.30	0.58					1.91
	1.55	1.26					1.95
	2.14	0.12					0.26
	2.24	0.73					1.64







	2.27	0.70					1.59
OFICINA SECRETARIA DIRECCION	2.95	2.17					6.40
	0.17	1.07					0.18
	1.72	2.17					3.73
	0.19	1.10					0.21
	2.29	2.17					4.97
	0.15	1.07					0.16
	0.15	2.05			2.00		0.62
	0.13	2.00					0.26
	3.94	2.15					8.47
	0.12	0.94					0.11
	4.20	2.15					9.03
	1.58	2.15					3.40
	0.19	1.07					0.20
	0.15	0.88					0.13
	1.56	2.15					3.35
	0.66	2.42					1.60
	2.42	0.48					1.16
OFICINA DIRECCION	0.12	2.08					0.25
	2.08	0.71					1.48
	2.08	0.65					1.35
	0.66	0.81			2.00		1.07
	0.73	2.15					1.57
	0.77	2.15					1.66
	0.75	2.15					1.61
	1.10	2.15					2.37
	3.56	2.15					7.65
	2.40	2.17					5.21
	0.21	1.10					0.23
	2.03	2.17					4.41
	5.38	2.17					11.67
	0.80	2.17					1.74
	0.87	2.17					1.89
PASILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.77	2.17					1.67
	0.18	2.50					0.45
	2.50	0.37					0.93
	0.45	2.00					0.90
	0.79	0.10					0.08
	0.49	2.00					0.98
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	315.32






OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	BGA-044-2024

ANTES	DESPUES
	
	
	
	
ITEM 8.3 Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	**ITEM 8.3** Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

	Formato	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 18	Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	BGA-044-2024
Valor Inicial:	$ 1.940.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.940.000.000,00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2024
Fecha fin inicial:	27 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	20 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	3 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de marzo de 2025

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 18 Del: 10-03-25 Al: 16-03-25 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias desde acta de inicio: 128 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 94,81%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ -

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	13,74%	61,20%
Valor de la Obra Ejecutada:	**$ 266.496.166,99**	**$ 1.187.366.721,74**

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	47,47%	61,20%
Durante el periodo	0,00%	13,74%	
Acumulado actual	0,00%	61,20%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	




REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**CANT.**	**UNIDAD**
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	1,00	UN
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	5,00	UN
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	1,86	M2
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	0,46	M2
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	4,27	M2
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	0,39	M2
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	1,08	M2
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	16,91	M2
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	385,80	M2
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	251,44	M2
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	1,32	M2
9.11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	5,40	M
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	3,01	M2
9.13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	1,90	M
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidrolavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	52,43	M2
NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	1,00	UN
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	1,00	UN
NP.44	Montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final.y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimetrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (	1,00	UN

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El contratista de obra da cumplimiento a las actividades que presentaba retraso, se ejecutan las actividades sin inconvenientes, se realiza entrega de suministros a la Entidad levantando acta de entrega de suministro para anexar a la factura de cobro.

OBSERVACIONES	FIRMAS
- Se calcula porcentaje de avance en tiempo a partir del acta de inicio de obra hasta la fecha de corte del informe semanal. - Se calcula porcentaje de avance en valor de obra ejecutado con base a las cantidades medidas en obra con respecto a los valores de refencia para el contrato de obra sobre los items ejecutados durante la semana comprendida desde el 10 marzo al 16 marzo 2025	**Representante legal de Interventoría**  **JAVIER AROCA GUASTUMAL** **Ingeniero Residente**  **JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE**

PRESUPUESTO DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 17 3-03-2025 AL 09-03-2025		SEMANA 18 3-03-2025 AL 09-03-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0,00**		**$ 268.622,62**		**$ 49.939.092,37**
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313,00		$ -		$ -	7,50	$ 114.847,50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220,00		$ -		$ -	200,61	$ 3.855.724,20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33.566,00		$ -	1,00	$ 33.566,00	2,00	$ 67.132,00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36.403,00		$ -	5,00	$ 182.015,00	28,00	$ 1.019.284,00
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 28.517,00		$ -	1,86	$ 53.041,62	1,86	$ 53.041,62
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254,00		$ -		$ -	78,00	$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548,00		$ -		$ -	41,09	$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586,00		$ -		$ -	8,00	$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517,00		$ -		$ -	66,53	$ 1.897.236,01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965,00		$ -		$ -	102,00	$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655,00		$ -		$ -	1.564,50	$ 2.589.247,50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067,00		$ -		$ -	616,86	$ 19.163.874,67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556,00		$ -		$ -	156,47	$ 7.597.557,32
1.17	retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16.479,00		$ -		$ -	82,74	$ 1.363.472,46
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26.335,00		$ -		$ -	36,94	$ 972.814,90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767,00		$ -		$ -	37,42	$ 926.741,51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13.408,00		$ -		$ -	56,23	$ 753.931,84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240,00		$ -		$ -	6,65	$ 194.387,52
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13.632,00		$ -		$ -	27,25	$ 371.472,00
1.28	| (incluye suministro de tornillería, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338.275,00		$ -		$ -	2,00	$ 676.550,00
2.	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.579.288,51**
2.1	suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341,00		$ -		$ -	87,24	$ 8.579.288,51
3.	**MAMPOSTERÍA**				**$ 0,00**		**$ 30.125,86**		**$ 525.106,84**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491,00		$ -	0,46	$ 30.125,86	8,02	$ 525.106,84
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 0,00**		**$ 554.216,11**		**$ 956.581,94**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793,00		$ -	4,27	$ 554.216,11	6,58	$ 854.037,94
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120.640,00		$ -		$ -	0,85	$ 102.544,00
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**				**$ 0,00**		**$ 21.368,49**		**$ 2.093.016,20**
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54.791,00		$ -	0,39	$ 21.368,49	38,20	$ 2.093.016,20
6.	**PAÑETES**				**$ 0,00**		**$ 39.796,92**		**$ 610.045,57**
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36.849,00		$ -	1,08	$ 39.796,92	15,18	$ 559.367,82
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21.565,00		$ -		$ -	2,35	$ 50.677,75
7.	**CIELO RASOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 66.831.878,62**
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estruc	M2	$ 108.342,00		$ -		$ -	616,86	$ 66.831.878,62
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 5.565.398,00**		**$ 7.121.359,50**		**$ 17.215.793,29**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450,00		$ -	16,91	$ 311.989,50	144,53	$ 2.666.545,29
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17.650,00	315,32	$ 5.565.398,00	385,80	$ 6.809.370,00	824,32	$ 14.549.248,00

9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 0,00**		**$ 15.913.701,80**			**$ 63.602.042,40**
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152.514,00		$ -		$ -	87,09	$	13.282.444,26
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54.886,00		$ -	251,44	$ 13.800.535,84	620,37	$	34.049.627,82
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y toc	M2	$ 106.315		$ -	1,32	$ 140.335,80	77,97	$	8.289.210,45
9.9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49.433,00		$ -		$ -	119,43	$	5.903.783,19
9.11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y	M	$ 46.392		$ -	5,40	$ 250.516,80	5,40		$ 250.516,80
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85.366,00		$ -	3,01	$ 256.951,66	4,23	$	361.098,18
9.13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpi	M	$ 771.243		$ -	1,90	$ 1.465.361,70	1,90	$	1.465.361,70
10.	**CUBIERTA**				**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 35.678.576,64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748,00		$ -		$ -	71,68	$	35.678.576,64
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 119.607.006,70**
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	un	$ 2.471.279,00		$ -		$ -	1,00	$	2.471.279,00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f	m2	$ 333.723		$ -		$ -	202,98		$ 67.739.094,54
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas p	m2	$ 537.954		$ -		$ -	39,35	$	21.168.489,90
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	un	$ 569.848,00		$ -		$ -	2,00	$	1.139.696,00
13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75.774,00		$ -		$ -	357,49	$	27.088.447,26
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 45.126,00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126		$ -		$ -	1,00		$ 45.126,00
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 34.832,00**
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34.832,00		$ -		$ -	1,00	$	34.832,00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 530.625,60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36.849,00		$ -		$ -	14,40		$ 530.625,60
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 98.837.085,71**
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473,00		$ -		$ -	110,00		$ 17.542.030,00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye ma	UN	$ 120.813		$ -		$ -	117,00		$ 14.135.121,00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159.473,00		$ -		$ -	115,00	$	18.339.395,00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803,00		$ -		$ -	115,00	$	20.562.345,00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica bla	M	$ 98.119		$ -		$ -	124,09		$ 12.175.586,71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141		$ -		$ -	830,00		$ 13.397.030,00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141,00		$ -		$ -	108,00		$ 1.743.228,00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847		$ -		$ -	50,00		$ 942.350,00
20	**NO PREVISTOS**				**$ 0,00**		**$ 41.093.700,98**			**$ 246.692.835,52**
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145.746		$ -		$ -	39,45		$ 5.749.679,70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124.352		$ -		$ -	17,03		$ 2.117.714,56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419		$ -		$ -	1,00		$ 1.509.419,00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	M	$ 448.016		$ -		$ -	1,00		$ 448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112		$ -		$ -	1,00		$ 7.448.112,00
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y requladas	UN	$ 30.046		$ -		$ -	45,00		$ 1.352.070,00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	$ 10.110		$ -		$ -	4.230,00		$ 42.765.300,00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159.385		$ -		$ -	115,00		$ 18.329.275,00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354.386		$ -		$ -	279,00		$ 98.873.694,00
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35.881		$ -		$ -	33,00		$ 1.184.073,00

NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116.351		$ -		$ -	107,70	$ 12.531.002,70	
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39.308		$ -		$ -	102,18	$ 4.016.491,44	
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidrolavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	M2	$ 80.386		$ -	52,43	$ 4.214.637,98	52,43	$ 4.214.637,98	
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN	$ 32.564		$ -		$ -	18,00	$ 586.152,00	
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN	$ 39.680		$ -		$ -	65,00	$ 2.579.200,00	
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	UN	$ 29.155		$ -		$ -	66,00	$ 1.924.230,00	
NP.37	Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$ 494.062		$ -		$ -	8,47	$ 4.184.705,14	
NP.44	Montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final.y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimetrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificacion de parámetros	UN	$ 36.879.063		$ -	1,00	$ 36.879.063,00	1,00	$ 36.879.063,00	
VALOR COSTOS DIRECTOS					**$ 5.565.398,00**		**$ 65.042.892,28**		**$ 711.778.933,91**	
A.I.U 26 %			**20%**		**$ 1.113.080,00**		**$ 13.008.578,00**		**$ 142.355.786,00**	
			1%		**$ 55.654,00**		**$ 650.429,00**		**$ 7.117.789,00**	
			5%		**$ 278.270,00**		**$ 3.252.145,00**		**$ 35.588.947,00**	
VALOR COSTO DIRECTO + AIU					**$ 7.012.402,00**		**$ 81.954.044,28**		**$ 896.841.455,91**	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD					**$ 52.871,30**		**$ 617.907,55**		**$ 6.761.899,93**	
AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO					**$ 7.065.273,30**		**$ 82.571.951,83**		**$ 903.603.355,84**	
AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO + SUMINISTRO				**1,04%**	**$ 7.065.273,30**	**0,36%**	**$ 266.496.166,99**	**13,74%**	**$ 1.187.366.721,74**	**61,20%**

COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL	**$ 1.940.000.000,00**

		CONDICIONES CONTRACTUALES		**SEMANA 17 3-03-2025 AL 09-03-2025**		**SEMANA 18 3-03-2025 AL 09-03-2025**			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**				**$ 0,00**		**$ 154.558.164,00**		**$ 238.456.610,00**
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4.059.300		$ -		$ -	2,00	$ 8.118.600,00
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798		$ -		$ -	1,00	$ 4.662.798,00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518		$ -		$ -	2,00	$ 13.409.036,00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14.427.003		$ -		$ -	4,00	$ 57.708.012,00
NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN	$ 92.447.200		$ -	1,00	$ 92.447.200,00	1,00	$ 92.447.200,00
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN	$ 62.110.964		$ -	1,00	$ 62.110.964,00	1,00	$ 62.110.964,00
					$ 0,00		**$ 154.558.164,00**		**$ 238.456.610,00**
TOTAL					**$ 0,00**		**$ 29.366.051,16**		**$ 45.306.755,90**
IVA		**19%**			**$ 0,00**		**$ 183.924.215,16**		**$ 283.763.365,90**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	1.3 Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑO PUBLICO MUJERES					1,00	UNIDAD	1,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	1.4 Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	5,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PUERTA BAÑO DIRECTOR					1,00	UNIDAD	1,00
PUERTA BAÑO PRESIDENTE					1,00	UNIDAD	1,00
PUERTA BAÑO VICEPRESIDENTE					1,00	UNIDAD	1,00
PUERTA OFICINA VICEPRESIDENTE A SALA DE JUNTAS					1,00	UNIDAD	1,00
PUERTA CABINA RECEPCION					1,00	UNIDAD	1,00
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	5,00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.6 Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,86

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
VENTANA MAGISTRADO PALACIO DE JUSTICIA	1,29	1,45				M2	1,86
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1,86**

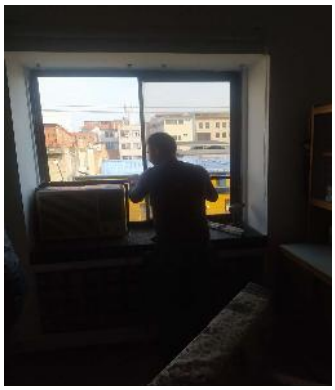

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	3,1 Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	**CANTIDAD:**	0,46

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO MESON EN GRANITO	0,55	0,83				1,00	m2	**0,46**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**0,46**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO		**UNIDAD:**	M2
ITEM:	4,1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	**CANTIDAD:**	4,27

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO CUARTO DE RACK		1,96	2,18				M2	**4,27**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**4,27**

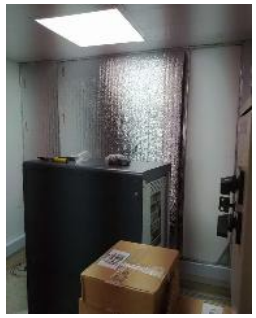

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ALISTADO DE PISOS , POLLOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	5,1 Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	**CANTIDAD:**	0,39

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
ENTREPAÑO MESON	0,52	0,76					M2	**0,39**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**0,39**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	PAÑETES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	6,1 Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	**CANTIDAD:**	1,08

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO MESON EN GRANITO		0,55	0,83			2,00	M2	0,91
		0,12	1,40			1,00	M2	0,17
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	1,08



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	8.1 Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	**CANTIDAD:**	16,91

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA TERRAZA	1,60	1,96					3,14
	1,10	2,23					2,45
	4,34	0,82					3,56
	1,40	1,34					1,88
	0,90	0,80					0,72
	2,18	1,27					2,77
		0,80	3,00				2,40
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	16,91



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	8.3 Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	**CANTIDAD:**	385,80

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA CABINA RECEPCION	1,96	2,13					4,17
	1,00	1,83					1,83
	1,00	1,98					1,98
	0,38	2,23					0,85
	0,78	2,23					1,74
	0,40	0,97			2,00		0,78
	0,45	0,64			2,00		0,58
	0,79	0,25					0,20
RECEPCION	1,00	2,21					2,21
	1,00	2,10					2,10
	2,12	2,30	0,65				4,23
	0,48	2,12					1,02
	0,14	1,23					0,17
	0,15	2,12					0,32
	1,28	2,12					2,71
	0,20	0,87					0,17
	0,80	2,12					1,70
	0,21	2,12					0,45
	0,10	2,12			4,00		0,85
	0,12	0,90					0,11
	2,84	2,12					6,02
	0,15	2,12					0,32
	0,15	0,85					0,13
	1,25	2,12					2,65
	0,10	2,12					0,21
	0,15	0,85					0,13
	0,15	2,12					0,32
	0,15	0,83					0,12
	0,93	2,12					1,97
	0,15	0,76					0,11
	0,48	2,12					1,02
	0,98	2,12					2,08
	6,30	2,12					13,36
	0,24	2,12					0,51
	0,63	2,12					1,34

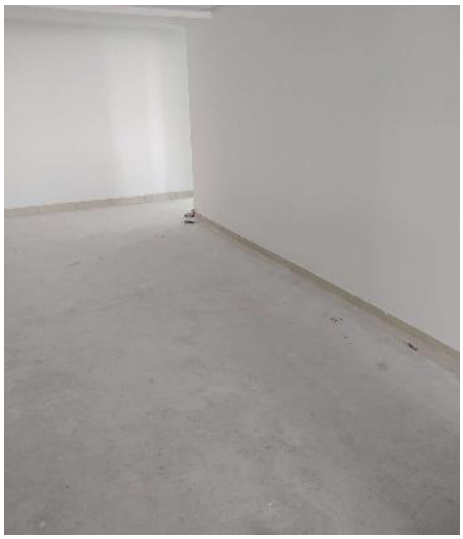



	0,77	2,12					1,63
	1,13	2,12					2,40
	0,70	2,06					1,44
	0,15	1,10					0,17
	0,75	0,88			2,00		1,32
	0,81	2,05					1,66
	0,50	2,05					1,03
	0,13	2,05					0,27
	2,50	0,09					0,23
	2,50	0,15					0,38
	0,76	2,01			2,00		3,06
	1,76	2,01					3,54
	0,15	2,01					0,30
	0,10	2,18					0,22
	0,81	2,18					1,77
	0,48	2,18					1,05
	0,76	0,08			2,00		0,12
	4,89	2,15					10,51
	0,85	2,15					1,83
	0,79	2,15					1,70
	2,09	2,15					4,49
PASILLO OFICINAS MAGISTRADOS	1,20	2,15					2,58
	0,16	2,15					0,34
	0,17	1,08					0,18
	3,11	2,11					6,56
	2,49	0,62					1,54
	0,10	2,20					0,22
	3,21	2,11					6,77
	0,10	1,00					0,10
	4,85	2,11					10,23
	0,10	2,10					0,21
	0,90	1,05					0,95
	2,87	2,10					6,03
	1,85	2,10					3,89
	1,98	2,10					4,16
	4,85	2,15					10,43
	0,78	2,11			2,00		3,29
	1,79	2,11					3,78
	0,15	2,15					0,32
	0,10	2,14					0,21
	0,83	2,14					1,78
	0,48	2,14					1,03
	0,78	0,80			2,00		1,25
	1,20	2,15					2,58

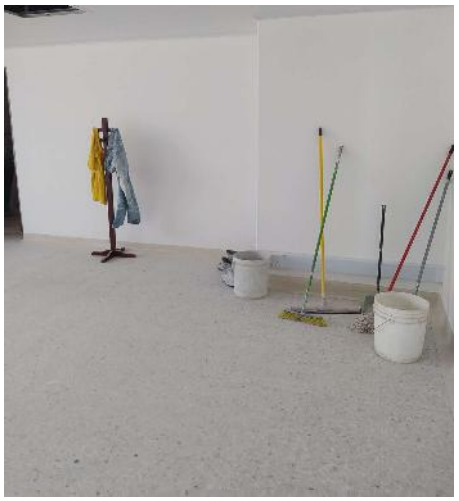



OFICINA PRESIDENTE CONSEJO	1,59	2,15					3,42
	0,20	0,76					0,15
	0,85	2,15					1,83
	0,70	2,15					1,51
	0,91	2,15					1,96
	1,04	2,15					2,24
	0,23	1,07					0,25
	0,52	2,15					1,12
	4,61	2,15					9,91
	0,26	1,07					0,28
OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE	0,12	2,07					0,25
	0,13	1,07					0,14
	0,22	1,07					0,24
	0,89	2,15					1,91
	1,64	2,15					3,53
	0,13	2,15					0,28
	3,43	2,15					7,37
	1,00	0,40					0,40
	0,56	1,00					0,56
	2,05	2,15					4,41
	2,78	2,15					5,98
	0,18	1,05					0,19
	0,52	2,15					1,12
	0,15	2,07			2,00		0,62
	0,14	1,06					0,15
	1,76	2,15					3,78
OFICINA TERRAZA	1,68	2,20					3,70
	6,58	2,20					14,48
	1,28	2,20					2,82
	0,80	2,20					1,76
	0,85	2,20					1,87
	0,17	2,20					0,37
	3,45	2,20					7,59
	0,40	0,80					0,32
	0,81	1,00					0,81
	1,35	2,20					2,97
	3,00	0,81					2,43
	1,10	2,20					2,42
	1,88	2,20					4,14
	0,12	2,20					0,26
	2,55	2,17					5,53
	1,48	2,17					3,21
	0,60	2,17					1,30
	2,99	2,17					6,49



	0,18	0,85					0,15
	0,50	2,17					1,09
	0,62	2,17					1,35
	0,75	2,17					1,63
	0,95	2,17					2,06
OFICINA VICEPRESIDENTE	0,12	2,17					0,26
	0,95	2,17					2,06
	0,81	0,93			2,00		1,51
	0,48	2,17					1,04
	0,96	2,17					2,08
	3,94	2,17					8,55
	0,20	1,06					0,21
	1,56	2,17					3,39
	0,49	2,17					1,06
	0,20	1,05					0,21
	6,75	2,17					14,65
	0,98	2,15					2,11
	0,12	2,15					0,26
	0,21	0,95			2,00		0,40
	0,56	2,15					1,20
SALA DE JUNTAS	1,47	2,17					3,19
	3,92	2,17					8,51
	0,20	1,00					0,20
	1,62	2,17					3,52
	2,17	2,57					5,58
	0,23	0,96					0,22
PINTURA 5TO PISO	17,24	2,30					39,65
Muro drywall oficina director			2,31				- 2,31
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	385,80



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	9.4 Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	**CANTIDAD:**	251,44

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina cabina de recepcion	2,25	1,90		4,28		M2	4,28
Oficina Vicepresidente	1,45	4,12				M2	5,97
	4,73	4,38				M2	20,72
	1,26	0,88				M2	1,11
	1,10	2,00				M2	2,20
	4,12	0,62				M2	2,55
Oficina Presidente	5,95	4,66				M2	27,73
	2,14	0,94				M2	2,01
	2,32	1,84				M2	4,27
	1,38	0,85				M2	1,17
	1,75	0,78				M2	1,37
Oficina Secretaria Presidente	5,45	2,07				M2	11,28
	3,77	0,50				M2	1,89
Recepcion	9,50	4,77				M2	45,32
Recepcion	3,67	2,33				M2	8,55
pasillo Magistrado	2,53	0,79				M2	2,00
pasillo Magistrado	1,81	0,77				M2	1,39
pasillo Magistrado	5,45	3,50				M2	19,08
pasillo Magistrado	3,17	1,14				M2	3,61
pasillo Magistrado	9,65	2,51				M2	24,22
Sala de Juntas	6,60	3,62				M2	23,89
Oficiina Terraza	6,00	6,00				M2	36,00
	0,70	1,20				M2	0,84
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**251,44**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	9.7 Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	**CANTIDAD:**	1,32

AREA O LUGAR	ANCHO(M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Meson	0,75	0,54				M2	0,40
	0,76	0,52				M2	0,39
	0,75	0,52				M2	0,39
	0,06	0,75				M2	0,05
	0,06	1,60				M2	0,10
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1,32**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	9.11 Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	**CANTIDAD:**	5,40

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina Director	1,20					M	1,20
Pasillo oficinas administrativas	1,20						1,20
Oficina Secretaria presidente	2,60						2,60
Oficina seccional	0,40						0,40
							-
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**5,40**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	9.12 Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	**CANTIDAD:**	3,01

AREA O LUGAR	ANCHO(M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Meson	0,53	0,87			4,00	M2	1,84
	0,15	0,89			2,00	M2	0,26
	0,53	0,34			2,00	M2	0,36
	0,53	0,43			2,00	M3	0,46
	0,10	0,89					0,09
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**3,01**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	9.13 Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	**CANTIDAD:**	1,90

AREA O LUGAR	ANCHO(M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Meson en granito		1,90				M2	1,90
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	1,90



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.39 Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EQUIPO 15 TR					1,00	UNIDAD	1,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.40 Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EQUIPO 15 TR					1,00	UNIDAD	1,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.44. Montaje, instalación y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el izaje de condensadoras VRF. Incluye grua, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final.y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimetrica y soporte Software Trane). Pruebas de funcionamiento del sistema	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EQUIPOS 10 Y 15 TR					1,00	UN	1,00
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	1,00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	NP.27 Mantenimiento de fachada piedra muñeca. incluye hidrolavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	**CANTIDAD:**	52,43

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	ALTO (M)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	1,06	42,17				M2	44,70
	0,15	1,82				M2	0,27
	0,15	0,62				M2	0,09
	0,15	2,77				M2	0,41
Terraza antepecho	0,15	2,83				M2	0,42
	0,15	2,10				M2	0,32
	0,15	3,13				M2	0,47
	0,15	2,16				M2	0,32
	0,30	6,60				M2	1,98
	0,23	1,10				M2	0,25
Muro perimetral	0,27	3,50				M2	0,95
	0,60	0,40				M2	0,24
Fachada calle 35	0,80	2,50				M2	2,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**52,43**



OBSERVACIONES:


REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	BGA-044-2024

ITEM 1.3 Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)

ANTES	DESPUES
	

ITEM 4.1 Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm

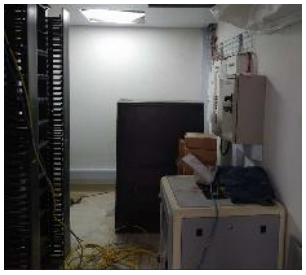ANTES	DESPUES
	

ITEM 8.3 Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

ANTES	DESPUES
	

ITEM 9.4 Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)

ANTES	DESPUES
	

ITEM NP.39 Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR

ANTES	DESPUES

	
ITEM NP.40 Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR	
ANTES	**DESPUES**
	
ITEMNP.27 Mantenimiento de fachada piedra muñeca	
ANTES	**DESPUES**
	

Formato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 19

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	BGA-044-2024
Valor Inicial:	$ 1,940,000,000.00
Valor adicional 1	$ 48,382,032.00
Valor Actualizado:	$ 1,988,382,032.00
Plazo Inicial:	5 MESES
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2024
Fecha fin inicial:	27 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	20 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	3 de febrero de 2025
Fecha prorroga 001	4 de febrero de 2025
Fecha prorroga 002	26 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	5 de abril de 2025

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 19 Del: 17-03-25 Al: 23-03-25 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias desde acta de inicio: 135 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 93.10%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	0.00%
Valor de la Obra programada:	$ 0.00	$ -

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	24.22%	83.94%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 469,879,645.16	$ 1,668,964,785.47

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	59.72%	83.94%
Durante el periodo	0.00%	24.22%	
Acumulado actual	0.00%	83.94%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES	CANT.	UNIDAD
8.2	Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	2.91	M2
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	36.84	M2
11.1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	8.18	M2
11.5	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	3.03	M
12.3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	62.59	M2
13.11	Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)	20.00	un
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	44.35	M2
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	1.00	UN
14.6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	1.00	UN
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	6.00	UN
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	6.00	UN
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	10.00	UN
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	2.00	UN
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	13.38	M
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	84.42	M
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	43.62	M
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	16.00	M
NP.6	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	110.00	UN
NP.7	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	116.00	UN
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	20.47	M2
NP.28	Suministro e instalacion de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes.	1.00	UN
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	6.00	UN
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	13.00	UN

NP.32	Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas,limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior	9.00	UN
NP.35	Suminstro de silla sin brazo Khao o similar	96.00	UN
NP.36	Suministro e instalacion de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio	27.15	M2
NP.38	Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	4.20	M
NP.41	Suministro e instalación de acometida de control y tuberia doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesoriso y soportes necesarios para su instalación	56.25	M
NP.42	Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	2.00	UN
NP.43	Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	40.00	LBS
NP.45	Suministro e instalación de tubo Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	19.38	M
NP.51	Suministro e instalacion de manguera Coraza 1 1/2"	1.76	M
NP.52	Pulida y brillada de guardaescoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)	298.95	M
NP.53	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)	12.10	M
NP.54	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)	14.00	M
NP.55	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)	11.45	M
NP.56	Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)	78.82	M
NP.57	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)	3.00	M
NP.58	Suministro e Instalación de Gabinete Electrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifasicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifasicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofasicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP , barrajes de neutro y tierra, acrilicos de proteccion.	1.00	UN
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	2.00	un
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	3.00	UN
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	2.00	UN
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	1.00	UN
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	3.00	UN
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	6.00	UN
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	1.00	UN
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	1.00	UN
19.18	Silla tipo ejecutiva	14.00	UN
19.19	Silla tipo presidencial	3.00	UN
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	1.00	UN
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	101.00	UN
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	8.00	UN
NP.33	Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diametro	3.00	UN
NP.35	Suminstro de silla sin brazo Khao o similar	96.00	UN

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se realiza ajuste de porcentaje de avance de obra tras adicional aprobado para el contrato de obra BGA-044-2024.
Las actividades se ejecutan con normalidad, se realizan actividades adicionales de terminacion de acabados, jornada de aseo.

OBSERVACIONES

- Se calcula porcentaje de avance en tiempo a partir del acta de inicio de obra hasta la fecha de corte del informe semanal.
- Se calcula porcentaje de avance en valor de obra ejecutado con base a las cantidades medidas en obra con respecto a los valores de refencia para el contrato de obra sobre los items ejecutados durante la semana comprendida desde el 17 marzo al 23 marzo 2025

FIRMAS

Representante legal de Interventoría

JAVIER AROCA GUASTUMAL

Ingeniero Residente

JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

PRESUPUESTO DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

		CONDICIONES CONTRACTUALES		SEMANA 17 3-03-2025 AL 09-03-2025		SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025		SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 0.00**		**$ 268,622.62**		**$ 0.00**		**$ 49,939,092.37**
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15,313.00		$ -		$ -		$ -	7.50	$ 114,847.50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19,220.00		$ -		$ -		$ -	200.61	$ 3,855,724.20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33,566.00		$ -	1.00	$ 33,566.00		$ -	2.00	$ 67,132.00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36,403.00		$ -	5.00	$ 182,015.00		$ -	28.00	$ 1,019,284.00
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 28,517.00		$ -	1.86	$ 53,041.62		$ -	1.86	$ 53,041.62
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35,254.00		$ -		$ -		$ -	78.00	$ 2,749,812.00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37,548.00		$ -		$ -		$ -	41.09	$ 1,542,847.32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121,586.00		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 972,688.00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28,517.00		$ -		$ -		$ -	66.53	$ 1,897,236.01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29,965.00		$ -		$ -		$ -	102.00	$ 3,056,430.00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1,655.00		$ -		$ -		$ -	1,564.50	$ 2,589,247.50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31,067.00		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 19,163,874.67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48,556.00		$ -		$ -		$ -	156.47	$ 7,597,557.32
1.17	retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16,479.00		$ -		$ -		$ -	82.74	$ 1,363,472.46
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26,335.00		$ -		$ -		$ -	36.94	$ 972,814.90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24,767.00		$ -		$ -		$ -	37.42	$ 926,741.51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13,408.00		$ -		$ -		$ -	56.23	$ 753,931.84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29,240.00		$ -		$ -		$ -	6.65	$ 194,387.52
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13,632.00		$ -		$ -		$ -	27.25	$ 371,472.00
1.28	((incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338,275.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 676,550.00
2.	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 8,579,288.51**
2.1	suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98,341.00		$ -		$ -		$ -	87.24	$ 8,579,288.51
3.	**MAMPOSTERÍA**				**$ 0.00**		**$ 30,125.86**		**$ 0.00**		**$ 525,106.84**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65,491.00		$ -	0.46	$ 30,125.86		$ -	8.02	$ 525,106.84
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 0.00**		**$ 554,216.11**		**$ 0.00**		**$ 956,581.94**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129,793.00		$ -	4.27	$ 554,216.11		$ -	6.58	$ 854,037.94
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120,640.00		$ -		$ -		$ -	0.85	$ 102,544.00
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**				**$ 0.00**		**$ 21,368.49**		**$ 0.00**		**$ 2,093,016.20**
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54,791.00		$ -	0.39	$ 21,368.49		$ -	38.20	$ 2,093,016.20
6.	**PAÑETES**				**$ 0.00**		**$ 39,796.92**		**$ 0.00**		**$ 610,045.57**
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36,849.00		$ -	1.08	$ 39,796.92		$ -	15.18	**$ 559,367.82**
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21,565.00		$ -		$ -		$ -	2.35	$ 50,677.75
7.	**CIELO RASOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 66,831,878.62**
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y t	M2	$ 108,342.00		$ -		$ -		$ -	616.86	$ 66,831,878.62
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 5,565,398.00**		**$ 7,121,359.50**		**$ 754,518.90**		**$ 17,970,312.19**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18,450.00		$ -	16.91	$ 311,989.50		$ -	144.53	$ 2,666,545.29
8.2	Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 14,014.00		$ -		$ -	2.91	$ 40,780.74	2.91	$ 40,780.74
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17,650.00	315.32	$ 5,565,398.00	385.80	$ 6,809,370.00		$ -	824.32	$ 14,549,248.00
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 19,374.00		$ -		$ -	36.84	$ 713,738.16	36.84	$ 713,738.16
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 0.00**		**$ 15,913,701.80**		**$ 0.00**		**$ 63,602,042.40**
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152,514.00		$ -		$ -		$ -	87.09	$ 13,282,444.26
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54,886.00		$ -	251.44	$ 13,800,535.84		$ -	620.37	$ 34,049,627.82
9.7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo ne	M2	$ 106,315		$ -	1.32	$ 140,335.80		$ -	77.97	$ 8,289,210.45
9.9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49,433.00		$ -		$ -		$ -	119.43	$ 5,903,783.19
9.11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada	M	**$ 46,392**		$ -	5.40	$ 250,516.80		$ -	5.40	$ 250,516.80
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85,366.00		$ -	3.01	$ 256,951.66		$ -	4.23	$ 361,098.18
9.13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero	M	$ 771,243		$ -	1.90	$ 1,465,361.70		$ -	1.90	$ 1,465,361.70

10.	**CUBIERTA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 35,678,576.64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñiido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497,748.00		$ -		$ -		$ -	71.68	$	35,678,576.64
11.	**CARPINTERIA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 5,100,353.97**			**$ 5,100,353.97**
11.1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	$ 473,775.00		$ -		$ -	8.18	$ 3,875,479.50	8.18	$	3,875,479.50
11.5	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 404,249.00		$ -		$ -	3.03	$ 1,224,874.47	3.03	$	1,224,874.47
12.	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 32,380,999.09**			**$ 32,380,999.09**
12.3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 517,351		$ -		$ -	62.59	$ 32,380,999.09	62.59	$	32,380,999.09
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 19,107,986.95**			**$ 138,714,993.65**
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	un	$ 2,471,279.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$	2,471,279.00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructu	m2	$ 333,723		$ -		$ -		$ -	202.98		$ 67,739,094.54
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotada	m2	$ 537,954		$ -		$ -		$ -	39.35	$	21,168,489.90
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	un	$ 569,848.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$	1,139,696.00
13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75,774.00		$ -		$ -		$ -	357.49	$	27,088,447.26
13.11	Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)	un	$ 59,536.00		$ -		$ -	20.00	$ 1,190,720.00	20.00	$	1,190,720.00
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	M2	$ 403,997.00		$ -		$ -	44.35	$ 17,917,266.95	44.35	$	17,917,266.95
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 425,225.00**			**$ 470,351.00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45,126		$ -		$ -	1.00	$ 45,126.00	2.00		$ 90,252.00
14.6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 380,099.00		$ -		$ -	1.00	$ 380,099.00	1.00	$	380,099.00
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 34,832.00**
15.2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34,832.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$	34,832.00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 530,625.60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36,849.00		$ -		$ -		$ -	14.40		$ 530,625.60
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,828,156.52**			**$ 108,665,242.23**
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UN	$ 27,062.00		$ -		$ -	6.00	$ 162,372.00	6.00	$	162,372.00
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	UN	$ 106,798		$ -		$ -	6.00	$ 640,788.00	6.00		$ 640,788.00
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159,473.00		$ -		$ -	10.00	$ 1,594,730.00	120.00		$ 19,136,760.00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco so	UN	$ 120,813		$ -		$ -	2.00	$ 241,626.00	119.00		$ 14,376,747.00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159,473.00		$ -		$ -		$ -	115.00	$	18,339,395.00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178,803.00		$ -		$ -		$ -	115.00	$	20,562,345.00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, co	M	$ 98,119		$ -		$ -	13.38	$ 1,312,832.22	137.47		$ 13,488,418.93
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16,141		$ -		$ -	84.42	$ 1,362,623.22	914.42		$ 14,759,653.22
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soladura y accesorio terminal.	M	$ 16,141.00		$ -		$ -		$ -	108.00		$ 1,743,228.00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soladura y accesorio terminal.	M	$ 18,847		$ -		$ -		$ -	50.00		$ 942,350.00
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 71,134.00		$ -		$ -	43.62	$ 3,102,865.08	43.62	$	3,102,865.08
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 88,145.00		$ -		$ -	16.00	$ 1,410,320.00	16.00	$	1,410,320.00
20	**NO PREVISTOS**				**$ 0.00**		**$ 41,093,700.98**		**$ 185,861,159.80**			**$ 432,553,995.32**
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145,746		$ -		$ -		$ -	39.45		$ 5,749,679.70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124,352		$ -		$ -		$ -	17.03		$ 2,117,714.56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1,509,419		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 1,509,419.00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	M	$ 448,016		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 448,016.00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7,448,112		$ -		$ -		$ -	1.00		$ 7,448,112.00
NP.6	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UN	$ 49,616		$ -		$ -	110.00	$ 5,457,760.00	110.00		$ 5,457,760.00
NP.7	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UN	$ 46,399		$ -		$ -	116.00	$ 5,382,284.00	116.00		$ 5,382,284.00
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	UN	$ 30,046		$ -		$ -		$ -	45.00		$ 1,352,070.00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	$ 10,110		$ -		$ -		$ -	4,230.00		$ 42,765,300.00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, iack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159,385		$ -		$ -		$ -	115.00		$ 18,329,275.00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de polisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354,386		$ -		$ -	20.47	$ 7,254,281.42	299.47		$ 106,127,975.42
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35,881		$ -		$ -		$ -	33.00		$ 1,184,073.00
NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116,351		$ -		$ -		$ -	107.70		$ 12,531,002.70
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39,308		$ -		$ -		$ -	102.18		$ 4,016,491.44
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidrolavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	M2	$ 80,386		$ -	52.43	$ 4,214,637.98		$ -	52.43		$ 4,214,637.98
NP.28	Suministro e instalacion de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes.	UN	$ 79,502,161		$ -		$ -	1.00	$ 79,502,161.00	1.00	$	79,502,161.00
NP.29	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UN	$ 32,564		$ -		$ -	6.00	$ 195,384.00	24.00		$ 781,536.00
NP.30	Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	UN	$ 39,680		$ -		$ -	13.00	$ 515,840.00	78.00		$ 3,095,040.00
NP.31	Suministro e instalacion de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalacion y fijacion al suelo	UN	$ 29,155		$ -		$ -		$ -	66.00		$ 1,924,230.00
NP.32	Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas,limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior	UN	$ 1,664,947		$ -		$ -	9.00	$ 14,984,523.00	9.00		$ 14,984,523.00
NP.36	Suministro e instalacion de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio	M2	$ 645,969		$ -		$ -	27.15	$ 17,538,058.35	27.15		$ 17,538,058.35
NP.37	Suministro e instalacion de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$ 494,062		$ -		$ -		$ -	8.47		$ 4,184,705.14
NP.38	Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	M	$ 19,484		$ -		$ -	4.20	$ 81,832.80	4.20		$ 81,832.80
NP.41	Suministro e instalación de acometida de control y tuberia doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesoriso y soportes necesarios para su instalación	M	$ 488,208		$ -		$ -	56.25	$ 27,461,700.00	56.25		$ 27,461,700.00

NP.42	Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	UN	$ 589,392		$ -		$ -	2.00	$ 1,178,784.00	2.00	$ 1,178,784.00		
NP.43	Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	LBS	$ 53,198		$ -		$ -	40.00	$ 2,127,920.00	40.00	$ 2,127,920.00		
NP.44	Montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final.y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimetrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificacion de parámetros	UN	$ 36,879,063		$ -	1.00	$ 36,879,063.00		$ -	1.00	$ 36,879,063.00		
NP.45	Suministro e instalación de tubo Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	M	$ 67,069		$ -		$ -	19.38	$ 1,299,797.22	19.38	$ 1,299,797.22		
NP.51	Suministro e instalacion de manguera Coraza 1 1/2"	M	$ 40,300		$ -		$ -	1.76	$ 70,928.00	1.76	$ 70,928.00		
NP.52	Pulida y brillada de guardaescoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)	M	$ 20,218		$ -		$ -	298.95	$ 6,044,171.10	298.95	$ 6,044,171.10		
NP.53	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)	M	$ 165,234		$ -		$ -	12.10	$ 1,999,331.40	12.10	$ 1,999,331.40		
NP.54	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)	M	$ 114,398		$ -		$ -	14.00	$ 1,601,572.00	14.00	$ 1,601,572.00		
NP.55	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)	M	$ 41,255		$ -		$ -	11.45	$ 472,369.75	11.45	$ 472,369.75		
NP.56	Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)	M	$ 34,118		$ -		$ -	78.82	$ 2,689,180.76	78.82	$ 2,689,180.76		
NP.57	Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)	M	$ 487,548		$ -		$ -	3.00	$ 1,462,644.00	3.00	$ 1,462,644.00		
NP.58	Suministro e Instalación de Gabinete Electrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifasicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifasicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofasicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP , barrajes de neutro y tierra, acrilicos de proteccion.	UN	$ 8,540,637		$ -		$ -	1.00	$ 8,540,637.00	1.00	$ 8,540,637.00		
VALOR COSTOS DIRECTOS					**$ 5,565,398.00**		**$ 65,042,892.28**		**$ 253,458,400.23**		**$ 965,237,334.14**		
A.I.U 26 %			**20%**		**$ 1,113,080.00**		**$ 13,008,578.00**		**$ 50,691,680.00**		**$ 193,047,467.00**		
			1%		**$ 55,654.00**		**$ 650,429.00**		**$ 2,534,584.00**		**$ 9,652,373.00**		
			5%		**$ 278,270.00**		**$ 3,252,145.00**		**$ 12,672,920.00**		**$ 48,261,867.00**		
VALOR COSTO DIRECTO + AIU					**$ 7,012,402.00**		**$ 81,954,044.28**		**$ 319,357,584.23**		**$ 1,216,199,041.14**		
IVA 19% SOBRE UTILIDAD					**$ 52,871.30**		**$ 617,907.55**		**$ 2,407,854.80**		**$ 9,169,754.73**		
AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO					**$ 7,065,273.30**		**$ 82,571,951.83**		**$ 321,765,439.03**		**$ 1,225,368,794.87**		
AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO + SUMINISTRO				**1.04%**	**$ 7,065,273.30**	**0.36%**	**$ 266,496,166.99**	**13.74%**	**$ 481,598,063.73**	**24.22%**	**$ 1,668,964,785.47**	**83.94%**	

COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL INICIAL	**$ 1,940,000,000.00**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL	**$ 1,988,382,032.00**

		CONDICIONES CONTRACTUALES		**SEMANA 17 3-03-2025 AL 09-03-2025**		**SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025**		**SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025**			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
19	**2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS**				**$ 0.00**		**$ 154,558,164.00**		**$ 134,313,130.00**		**$ 372,769,740.00**
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	un	$ 1,614,055		$ -		$ -	2.00	$ 3,228,110.00	2.00	$ 3,228,110.00
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN	$ 5,315,750		$ -		$ -	3.00	$ 15,947,250.00	3.00	$ 15,947,250.00
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4,059,300		$ -		$ -	2.00	$ 8,118,600.00	4.00	$ 16,237,200.00
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 2,416,250		$ -		$ -	1.00	$ 2,416,250.00	1.00	$ 2,416,250.00
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	UN	$ 918,175		$ -		$ -	3.00	$ 2,754,525.00	3.00	$ 2,754,525.00
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	$ 434,925		$ -		$ -	6.00	$ 2,609,550.00	6.00	$ 2,609,550.00
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	$ 4,059,300		$ -		$ -	1.00	$ 4,059,300.00	1.00	$ 4,059,300.00
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	UN	$ 2,107,252		$ -		$ -	1.00	$ 2,107,252.00	1.00	$ 2,107,252.00
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN	$ 468,753		$ -		$ -	14.00	$ 6,562,542.00	14.00	$ 6,562,542.00
19.19	Silla tipo presidencial	UN	$ 628,225		$ -		$ -	3.00	$ 1,884,675.00	3.00	$ 1,884,675.00
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	$ 4,155,950		$ -		$ -	1.00	$ 4,155,950.00	1.00	$ 4,155,950.00
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	$ 106,315		$ -		$ -	101.00	$ 10,737,815.00	101.00	$ 10,737,815.00
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN	$ 2,416,250		$ -		$ -	8.00	$ 19,330,000.00	8.00	$ 19,330,000.00
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4,662,798		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 4,662,798.00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6,704,518		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 13,409,036.00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14,427,003		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 57,708,012.00
NP.33	Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diametro	UN	$ 3,902,293		$ -		$ -	3.00	$ 11,706,879.00	3.00	$ 11,706,879.00
NP.35	Suminstro de silla sin brazo Khao o similar	UN	$ 403,067		$ -		$ -	96.00	$ 38,694,432.00	96.00	$ 38,694,432.00
NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN	$ 92,447,200		$ -	1.00	$ 92,447,200.00		$ -	1.00	$ 92,447,200.00
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UN	$ 62,110,964		$ -	1.00	$ 62,110,964.00		$ -	1.00	$ 62,110,964.00
TOTAL					**$ 0.00**		**$ 154,558,164.00**		**$ 134,313,130.00**		**$ 372,769,740.00**
IVA		**19%**			**$ 0.00**		**$ 29,366,051.16**		**$ 25,519,494.70**		**$ 70,826,250.60**
					$ 0.00		**$ 183,924,215.16**		**$ 159,832,624.70**		**$ 443,595,990.60**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	8.2 Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	**CANTIDAD:**	2.91

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD(M)	LONGITUD (M)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA TERRAZA	0.15	5.30			2.00		1.59
	0.15	1.77					0.27
	0.15	1.10			4.00		0.66
	0.15	1.30			2.00		0.39
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL :	2.91



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	8.4 Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	**CANTIDAD:**	36.84

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	6.00	6.00				M2	36.00
OFICINA TERRAZA	0.70	1.20				M2	0.84
							-
							-
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL :**	**36.84**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CARPINTERIA EN MADERA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	11.1 Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	**CANTIDAD:**	8.18

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑO DIRECTOR	0.80	2.06				M2	1.65
BALO SECCIONAL JUDICATURA	0.74	2.06				M2	1.52
BAÑO VICEPRESIDENTE	0.80	2.03				M2	1.62
BAÑO PRESIDENTE	0.70	1.90				M2	1.33
PUERTE ENTRE OFICINA VICEPRESIDENTE Y SALA DE JUNTAS	1.01	2.03				M2	2.05
							-
							-
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	8.18

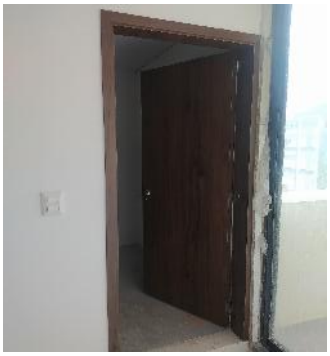

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CARPINTERIA EN MADERA	**UNIDAD:**	M
ITEM:	11.5 Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	**CANTIDAD:**	3.03

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MESON	1.63					M	1.63
MUBLE SUPERIOR MESON	1.40					M	1.40
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	3.03



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CARPINTERIA METÁLICA	UNIDAD:	M2
ITEM:	12.3 Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	CANTIDAD:	62.59

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
VENTANA OFICINA MAGISTRADO	1.45	1.29				M2	1.86
Oficina Director	2.18	0.88				M2	1.92
	1.12	2.30				M2	2.57
Oficina Talento humano 2	1.83	0.89				M2	1.64
	2.83	0.89				M2	2.53
Oficina financiera Talente humano 1	2.16	0.87			4.00	M2	7.55
	1.60	2.32			4.00	M2	14.88
Pasillo oficinas administrativas	2.15	0.87				M2	1.88
Oficina Seccional Judicatura	2.64	0.89				M2	2.36
	1.10	0.90				M2	0.99
Oficina Administrativa	0.62	0.90				M2	0.56
	1.82	0.90				M2	1.64
	2.77	0.89				M2	2.46
Recepcion	2.10	0.89				M2	1.86
Pasillo oficina magistrados	1.77	2.11				M2	3.75
	2.17	0.90				M2	1.95
Oficina Vicepresidente	3.13	0.88				M2	2.75
Oficina Sala de juntas	2.16	0.86				M2	1.86
Oficina Presidente	1.18	2.22				M2	2.61
	2.17	0.90				M2	1.96
Oficina secretaria Director	3.37	0.90				M2	3.03
Aproxima Resultado a				2 Decimales		TOTAL	62.59





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	13.11 Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)	**CANTIDAD:**	20.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS					15.00	UND	15.00
OFICINAS MAGISTRADOS					5.00	UND	5.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**20.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	UNIDAD:	M2
ITEM:	13.13 suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	CANTIDAD:	44.35

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DIRECTOR	0.59	2.15				M2	1.27
OFICINA SECRETARIA DIRECTOR	0.82	3.33				M2	2.73
OFICINA SECCIONAL	0.85	1.06				M2	0.90
	0.77	2.62				M2	2.02
OFICINA FINANCIERA	0.67	1.59			3.00	M2	3.20
	0.66	1.35				M2	0.89
	0.66	1.58			3.00	M2	3.13
OFICINA TALENTO HUMANO 1	0.66	2.16				M2	1.43
	0.66	1.58			3.00	M2	3.13
	0.67	2.14				M2	1.43
	0.67	1.59			3.00	M2	3.20
	0.66	2.15				M2	1.42
OFICINA TALENTO HUMANO LIQUIDACION	0.83	1.81				M2	1.50
	0.81	1.80				M2	1.46
OFICINA ADMINISTRATIVA	0.84	1.79				M2	1.50
	0.84	0.58				M2	0.49
	0.83	2.76				M2	2.29
OFICINA PRESIDENTE	0.67	2.15				M2	1.44
	0.71	1.12			3.00	M2	2.39
OFICINA VICEPRESIDENTE	0.83	1.56				M2	1.29
SALA DE JUNTAS	0.86	2.12				M2	1.82
PASILLO MAGISTRADOS	0.68	2.15				M2	1.46
	0.66	1.76				M2	1.16
RECEPCION	0.67	2.08				M2	1.39
PASILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.66	2.14				M2	1.41
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	44.35



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	14.1 Reinstalación Sanitarios existentes.	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑO MUJERES					1.00	UNIDAD	1.00
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	1.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	14.6 Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MESON GRANITO TERRAZA					1.00	UNIDAD	1.00
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	17.2 Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	**CANTIDAD:**	6.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑO OFICINA SECCIONAL					1.00	UNIDAD	1.00
OFICINA CABINA RECEPCION					2.00	UNIDAD	2.00
ILUMINACION TERRAZA					3.00	UNIDAD	3.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**6.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	17.3 Suministro e instalación de detector de movimiento	**CANTIDAD:**	6.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PASILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL					4.00	UNIDAD	4.00
PASILLO MAGISTRADOS					2.00	UNIDAD	2.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**6.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	17.4 Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts d	**CANTIDAD:**	10.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
BAÑOS PUBLICOS					2.00	UN	2.00
CUARTO RACK					2.00	UN	2.00
PASILLO RECEPCION					1.00	UN	1.00
BAÑO VICEPRESIDENTE					1.00	UN	1.00
BAÑO PRESIDENTE					1.00	UN	1.00
ILUMINACION TERRRAZA					3.00	UN	3.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	10.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	17.5 Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	**CANTIDAD:**	2.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA TERRAZA					2.00	UN	2.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	2.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.9 Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	**CANTIDAD:**	13.38

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA		0.85				M	0.85
OFICINA FINANCIERA		1.45				M	1.45
OFICINA ASISTENCIA LEGAL		2.40				M	2.40
OFICINA MAGISTRADO PALACIO DE JUSTICIA		5.58				M	5.58
OFICINA VICEPRESIDENTE		3.10				M	3.10
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	13.38



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.10 Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	**CANTIDAD:**	84.42

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TABLERO A CONDENSADORA OFICINA SECCIONAL		24.82				M	24.82
TABLERO A CONDENSADORA OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE		24.30				M	24.30
TABLERO A CONDENSADORA RACK		22.30				M	22.30
TABLERO A OUTKICK Q1		6.50				M	6.50
TABLERO A OUTKICK Q2		6.50				M	6.50
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	84.42



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.16 suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	**CANTIDAD:**	43.62

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TABLERO A CONDENSADORAS EQUIPO DIRECTOR Y SECCIONAL		8.66				M	8.66
TABLERO A CONDENSADORAS EQUIPOS VICEPRESIDENTE, PRESIDENTE Y RACK		14.78				M	14.78
TABLERO A CONDENSADORAS EQUIPOS OFICINA TERRAZA, SECRETARIA PRESIDENTE		20.18				M	20.18
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	43.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.17 suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	**CANTIDAD:**	16.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TABLERO A CONDENSADORAS EQUIPO 10 TR		8.21				M	8.21
TABLERO A CONDENSADORAS EQUIPO 15 TR		7.79				M	7.79
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	16.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.6 Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	**CANTIDAD:**	2.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	2.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.10Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	**CANTIDAD:**	3.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DIRECTOR					1.00	UND	1.00
OFICINA PRESIDENTE					1.00	UND	1.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	3.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.12 Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	**CANTIDAD:**	2.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA PRESIDENTE					1.00	UND	1.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	2.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.13 Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MAGISTRADO PALACIO JUSTICIA					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	1.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.14 Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	**CANTIDAD:**	3.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA PRESIDENTE					1.00	UND	1.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1.00	UND	1.00
OFICINA DIRECTOR					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	3.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.15 Silla interlocutora tipo magistrado	**CANTIDAD:**	6.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DIRECTOR					2.00	UND	2.00
OFICINA PRESIDENTE					2.00	UND	2.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	6.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.16 Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	1.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.17 Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	1.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.18 Silla tipo ejecutiva	**CANTIDAD:**	14.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA 403 PALACIO DE JUSTICIA					10.00	UND	10.00
5TO PISO					4.00	UND	4.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	14.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.19 Silla tipo presidencial	**CANTIDAD:**	3.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DIRECTOR					1.00	UND	1.00
OFICINA PRESIDENTE					1.00	UND	1.00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	3.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.20 Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
RECEPCION 5TO PISO					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	1.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.22 Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	**CANTIDAD:**	101.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO ALCALDIA BUCARAMANGA FASE II					101.00	UND	101.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	101.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	19.26 Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	**CANTIDAD:**	8.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
HORNOS PALACIO JUSTICIA					6.00	UND	6.00
HORNOS 5TO PISO					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	8.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.6. Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	**CANTIDAD:**	110.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL					110.00	UNIDAD	110.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	110.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.7. Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	**CANTIDAD:**	116.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL					116.00	UNIDAD	116.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**116.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	NP.11. Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	**CANTIDAD:**	20.47

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAMA JUDICIAL	2.92	7.00				M2	20.47
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	20.47



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.28 Suministro e instalacion de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes.	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CUARTO DE RACK					1.00	UN	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.29 Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	**CANTIDAD:**	6.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA ASISTENCIA LEGAL					1.00	UN	1.00
OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE					1.00	UN	1.00
OFICINA TERRAZA					3.00	UN	3.00
OFICINA FINANCIERA					1.00	UN	1.00
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		**TOTAL**	**6.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.30 Suministro e instalacion de troquel metalico piramidal triple 12 x 5 blanco	**CANTIDAD:**	13.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA SECCIONAL					1.00	UN	1.00
OFICINA ASISTENCIA LEGAL					1.00	UN	1.00
OFICINA SECRETARIA DE PRESIDENTE					2.00	UN	2.00
OFICINA FINANCIERA					1.00	UN	1.00
OFICINA TERRAZA					8.00	UN	8.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL :**	**13.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.32 Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diametro en madera teca. Incluye limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior.	**CANTIDAD:**	9.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TERRAZA PALACIO JUSTICIA					9.00	UN	9.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	9.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.33 Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diametro	**CANTIDAD:**	3.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MESAS PALACIO JUSTICIA					3.00	UNIDAD	3.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**3.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.35 Suminstro de silla sin brazo Khao o similar	**CANTIDAD:**	96.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
SILLAS PALACIO JUSTICIA					96.00	UNIDAD	96.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**96.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	NP.36 Suministro e instalacion de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio.	**CANTIDAD:**	27.15

AREA O LUGAR	IONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TERRAZA	7.12	0.70				M2	4.98
	1.50	0.70				M2	1.05
	2.70	0.70				M2	1.89
	12.24	0.86				M2	10.53
	2.73	0.78				M2	2.13
	1.20	0.78				M2	0.94
	6.44	0.78				M2	5.02
	0.78	0.78				M2	0.61
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	27.15



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP.38 Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	**CANTIDAD:**	4.20

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA TERRAZA Y PASILLO MAGISTRADOS		4.20				M	4.20

Aproxima Resultado a 2 Decimales **TOTAL** **4.20**

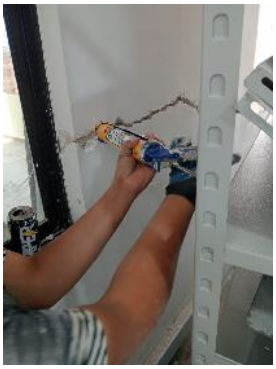

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.41 Suministro e instalación de acometida de control y tuberia doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesoriso y soportes necesarios para su instalación.	**CANTIDAD:**	56.25

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EQUIPO AIRES 10 TR		25.04				M	25.04
EQUIPO AIRES 15 TR		31.21				M	31.21	
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**56.25**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.42 Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	**CANTIDAD:**	2.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
10 TR					1.00	UN	1.00
15 TR					1.00	UN	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	2.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	LBS
ITEM:	NP.43 Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	**CANTIDAD:**	40.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
10 TR					20.00	LB	20.00
15 TR					20.00	LBS	20.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**40.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP.45 Suministro e instalación de tubo Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	**CANTIDAD:**	19.38

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TUBERIA CONDENSADORA DIRECTOR		3.26				M	3.26
TUBERIA CONDENSADORA SECCIONAL		12.32				M	12.32
TUBERIA CONDENSADORA RACK Y PRESIDENTE		3.80				M	3.80
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	19.38



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP. 51 Suministro e instalacion de manguera Coraza 1 1/2"	**CANTIDAD:**	1.76

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CONDENSADORA EQUIPO 10TR		0.97				M	0.97
CONDENSADORA EQUIPO 15TR		0.79				M	0.79
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**1.76**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	UNIDAD:	M
ITEM:	NP. 52 Pulida y brillada de guardaescoba existentes en granito. (Incluye equipos, resane, pulida, cristalizada y brillada)	CANTIDAD:	298.95

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	22.14					M	22.14
OFICINA ASISTENCIA LEGAL	12.55					M	12.55
OFICINA TALENTO HUMANO GRANDE	23.21					M	23.21
OFICINA FINANCIERA	5.44					M	5.44
PASILLO OFICINAS ADMINISRATIVAS	14.37					M	14.37
OFICINA SECRETARIA DIRECCION	18.33					M	18.33
OFICINA DIRECTOR	20.30					M	20.30
OFICINA TALENTO HUMANO LIQUIDADOR	9.52					M	9.52
OFICINA ADMINISTRACION	15.25					M	15.25
RECEPCION	29.44					M	29.44
PASILLO OFICINAS MAGISTRADOS	36.19					M	36.19
OFICINA VICEPRESIDENTE	19.60					M	19.60
OFICINA SALA DE JUNTAS	18.17					M	18.17
OFICINA PRESIDENTE	21.14					M	21.14
OFICINA SECRETARIA DE PRESIDENTE	11.58					M	11.58
OFICINA TERRAZA	21.72					M	21.72
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	298.95



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP. 53 Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x2 AWG (3 Fases) +1x4 AWG (1 Tierra)	**CANTIDAD:**	12.10

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CONDENSADORA EQUIPO 10TR		12.10				M	12.10
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	12.10



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP. 54 Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x4 AWG (3 Fases) +1x6 AWG (1 Tierra)	**CANTIDAD:**	14.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CONDENSADORA EQUIO 15 TR		14.00				M	14.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	14.00

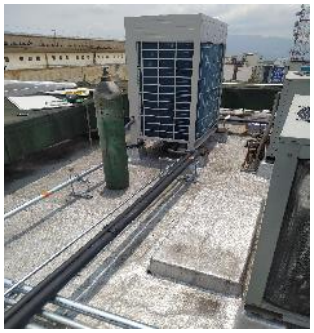

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP. 55 Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 4 conductores, 3x10 AWG (3 Fases) +1x12 AWG (1 Tierra)	**CANTIDAD:**	11.45

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TABLERO A MANEJADORA 10 TR		6.80				M	6.80
TABLERO A MANEJADORA 15 TR		4.65				M	4.65
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	11.45



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP. 56 Suministro e instalación de red eléctrica Bifásica en Cable en cobre (Cu) 3 conductores, 2x10 AWG (2 Fases) +1x10 AWG (1 Tierra)	**CANTIDAD:**	78.82

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TABLERO A CONDENSADORA OFICINA DIRECTOR		16.62				M	16.62
TABLERO A CONDENSADORA OFICINA TERRAZA		23.00				M	23.00
TABLERO A CONDENSADORA OFICINA VICEPRESIDENTE		17.80				M	17.80
TABLERO A CONDENSADORA OFICINA PRESIDENTE		21.40				M	21.40
Aproxima Resultado a			2 Decimales			**TOTAL**	**78.82**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP. 57 Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5 conductores, 3x300 MCM AWG (3 Fases) +1x2 AWG (1 Neutro) +1x2 AWG (1 Tierra)	**CANTIDAD:**	3.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS		3.00				M	3.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	3.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP. 58 Suministro e Instalación de Gabinete Electrico para Aires Acondicionados de 100x80x30cm. Incluye totalizador principal 300 AMP fijo, 2 breaker trifasicas 3x32 AMP y 3x20 AMP, 7 breaker bifasicas 2x32 AMP (4 und), 2x20 AMP (2 und), 2x16 AMP (1 und), 2 breaker monofasicas 1x16 (2 und), emplatinado de 300 AMP , barrajes de neutro y tierra, acrilicos de proteccion.	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO(M2)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TABLERO ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADO 5TO PSO					1.00	UNIDAD	1.00
Aproxima Resultado a			2 Decimales			TOTAL	1.00



OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	BGA-044-2024

11.1 Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)

ANTES	DESPUES
	

13.11 Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)





19.12 Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera



