3

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 2

Aguazul, 07 de abril de 2025

Doctor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0224 - MA-CD-SI-220-2025 de 2025-02-12.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0224
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR QUE SE ENMARQUEN DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
VALOR	:	$20.400.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$20.400.000,00 MCTE.
PLAZO	:	Cuatro (4) MESES
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	2025-02-13
FECHA TERMINACIÓN	:	2025-06-12

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Generar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías SGR de la Secretaría de Infraestructura"	Este informe proporciona una actualización sobre el estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaría de Infraestructura. Esta actualización se realiza de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0224-2025, que requiere la generación de un informe mensual sobre el estado de cada proyecto financiado con recursos del SGR. Actualmente, el sistema GESPROY registra un total de 10 proyectos, que se encuentran en diferentes estados: en ejecución y terminados. A continuación, se detallan los proyectos en cuestión: Evidencia: Informe estado de proyectos1 Medio: Medio físico: 10 folios Medio digital: Anexo 1

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 2

Generar un (1) informe mensual con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión que se encuentran en los estados: sin contratar, en ejecución y terminados sin acto administrativo de cierre, financiados con recursos del sistema general de regalizas SGR de la secretaria de infraestructura"	En Atención al cumplimiento de esta actividad y según las instrucciones del supervisor, se preparó un informe que proporciona una actualización detallada del estado de las alertas identificadas en los proyectos de inversión gestionados por la Secretaría de Infraestructura, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) Evidencia: Informe de alertas Medio: Medio físico: 4 folios Medio digital: Anexo 2
Brindar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.	En atención al cumplimiento de esta actividad de asistencia profesional y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó la reprogramación del proyecto de inversión **BPIN 2019850100004, "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul**. Teniendo en cuenta la prórroga, el nuevo plazo de ejecución del proyecto es desde junio de 2020 hasta junio de 2025.. Evidencia: Asistencia profesional Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 3
Registrar la información derivada de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, y actualizar el avance físico de los mismos.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de información del siguiente proyecto en el aplicativo GESPROY: BPIN **2019850100004 Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul**; se realizó: 1. Registro de prorroga al contrato 684-2019 obra 901350227-CONSORCIO PLAZA DE TOROS AGUAZUL 2. Registro de prórroga al contrato 685-2019 (interventoría). Evidencia: Cargue de información Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 4
Otras Actividades Inherentes al Objeto Contractual Ejecutar las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto contractual.	En atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizaron las siguientes acciones: El día 27 de marzo de 2025, se envió un caso a la mesa de ayuda del proyecto 2019850100002, "Construcción de vía, puente vehicular sobre el caño Aguaazulero y obras complementarias para el acceso al Parque del Arroz del municipio de Aguazul, Casanare", debido a la duplicidad de contratos y errores en la cadena presupuestal. El 31 de marzo se envió un caso a la mesa de ayuda del proyecto **BPIN 2019850100004, "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul", debido a la duplicidad de contratos** Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 5

Para una ejecución acumulada del contrato 0224 - MA-CD-SI-220-2025 de 2025-02-12 es del **40%**

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 2

OBSERVACIONES:

ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. 9483135221 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

ANEXO AJUSTE DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. 9483699823 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

Atentamente,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

ANEXOS

CONTRATO N. 0224 2025-02-12

ACTA No. 3 PARCIAL 2

Yopal, 01 de abril de 2025

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: 01 de marzo al 31 de marzo de 2025

Este informe proporciona una actualización sobre el estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaría de Infraestructura. Esta actualización se realiza de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0224-2025, que requiere la generación de un informe mensual sobre el estado de cada proyecto financiado con recursos del SGR.

Actualmente, el sistema GESPROY registra un total de 10 proyectos, que se encuentran en diferentes estados: en ejecución y terminados. A continuación, se detallan los proyectos en cuestión:

Proyectos en Estado en Ejecución:

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2018850100001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
2	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
3	2021850100006	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
4	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Proyectos en Estado Para Cierre

1	2021850100024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION


Proyecto 1.

BPIN: 2019850100004
PROYECTO: Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 90,18% a diciembre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 87,91% a julio de 2024

OBSERVACIÓN: El proyecto tenía una programación inicial que abarcaba de junio de 2020 a junio de 2024 y presenta un avance físico del 90,18%, se volvió a reprogramar y su horizonte quedo de junio de 2020 a junio de 2025. Presenta un plan administrativo de control **PAC-1141-24** para ajustar la programación, que inicialmente estaba propuesta.

Presenta contrato duplicado de apoyo a la supervisión N. **220-2020**, en el SPGR se modificó la información correspondiente a los RP y se asociación al contrato **N. 20200220, sin embargo a la fecha no ha migrado la información.** Por lo tanto, se envió el caso a mesa de ayuda el día 18 de septiembre para revisión por parte del DNP.

ALERTA: No presenta alertas
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

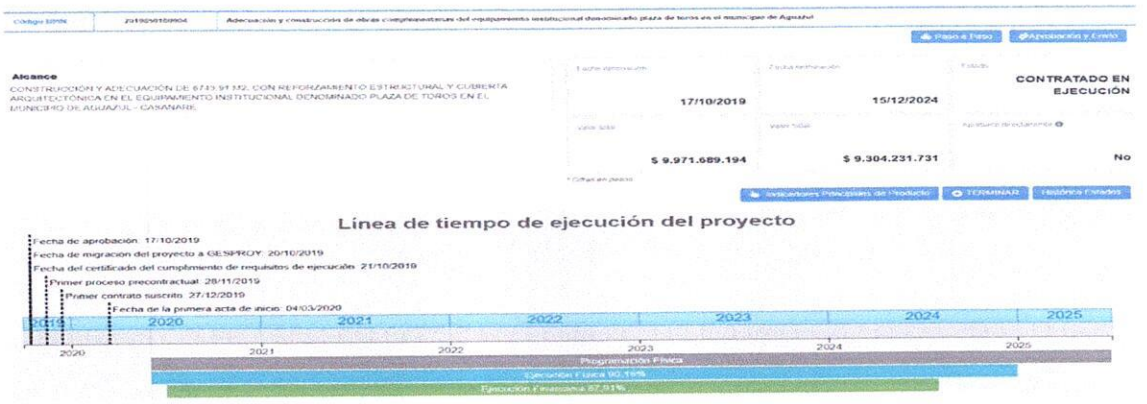


Proyecto 2.

BPIN: 2020850100007
PROYECTO: Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 77,24% a marzo 2024
AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024
OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."

- ✓ "En la visita se observó que, aunque el contrato de obra tiene acta de terminación en octubre de 2023, están pendientes por desarrollar actividades para la funcionalidad del proyecto, tales como la sincronización del software para el cobro del servicio, instalación del sistema de cobro prepago y la creación de la entidad encargada de atender el servicio eléctrico prestado por los paneles instalados en cada beneficiario, careciendo así de la debida sostenibilidad del proyecto.
- ✓ Las actividades pendientes por desarrollar impiden que los beneficiarios tengan el debido soporte técnico del sistema, que garantice el correcto funcionamiento en el momento en que se presenten fallas en el servicio eléctrico.


- ✓ El proyecto no cuenta con acciones que permiten la continuidad y operación, situación que puede llegar a comprometer el uso eficiente de los sistemas fotovoltaicos instalado en los 137 beneficiarios los cuales pueden presentar posibles fallas irreparables que comprometen la estabilidad del proyecto.

PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020
Teniendo en cuenta que la actividad de interventoría no se ejecutó al 100 %, se va a realizar la solicitud ante el DNP para ajustar el porcentaje de ejecución de la interventora, la cuál va de acuerdo al avance de la obra.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

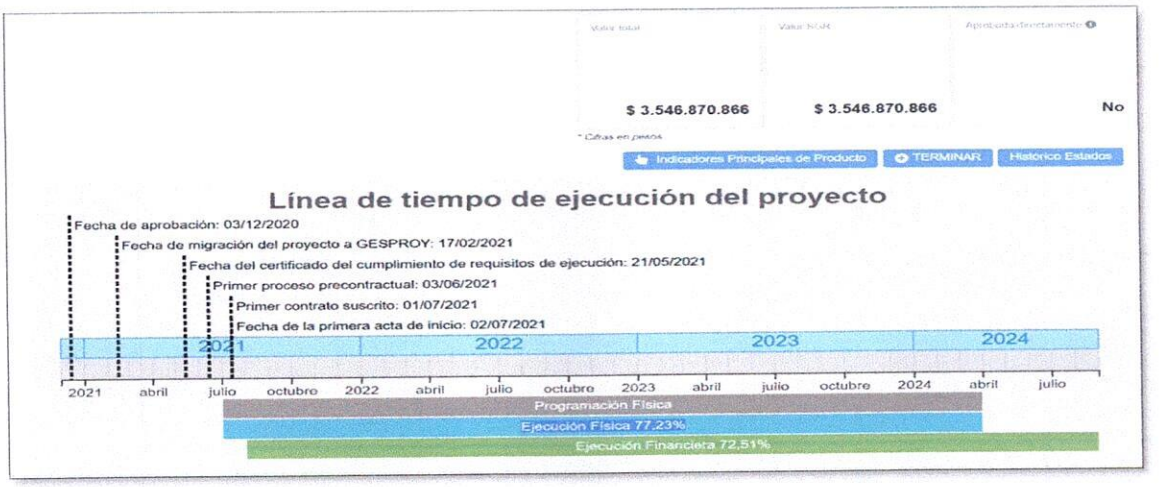


Proyecto 3.

BPIN: 2021005850074
PROYECTO: Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 91,03% a septiembre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 78,60% a agosto de 2024
OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de septiembre de 2022 a diciembre de 2024, falta realizar el cargue con recibo final.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR TERCER TRIMESTRE: 98

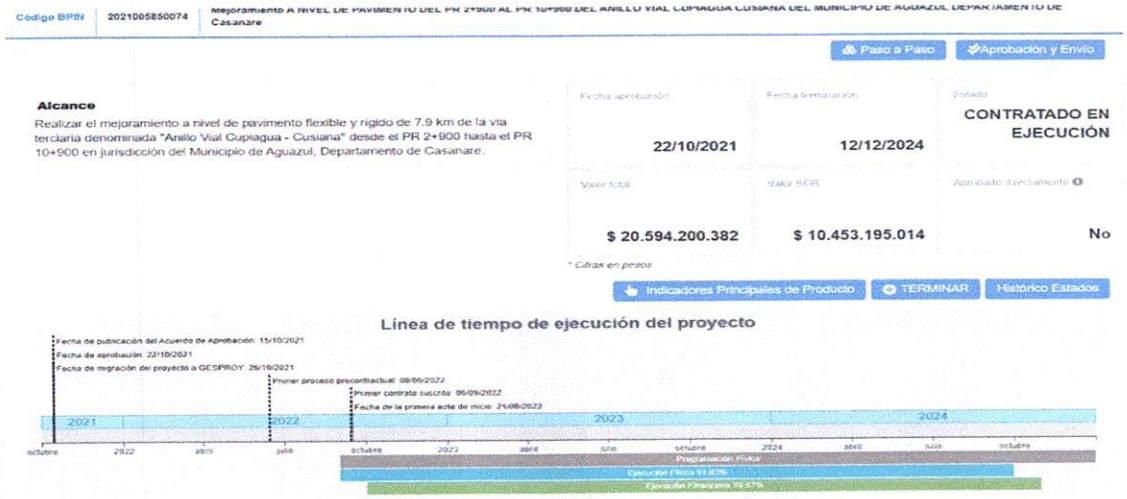


Proyecto 4.

BPIN: 2022005850010
PROYECTO: Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 86,15 a octubre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 87,88 a julio de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con una programación oficial que abarca desde agosto de 2022 hasta junio de 2024. Se encuentra suspendido hasta el 01 de marzo de 2025.
El valor actual del proyecto es de $11.354.926.038
Presenta un PAC-1163-24 (programación vencida), al cual se le dio respuesta.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

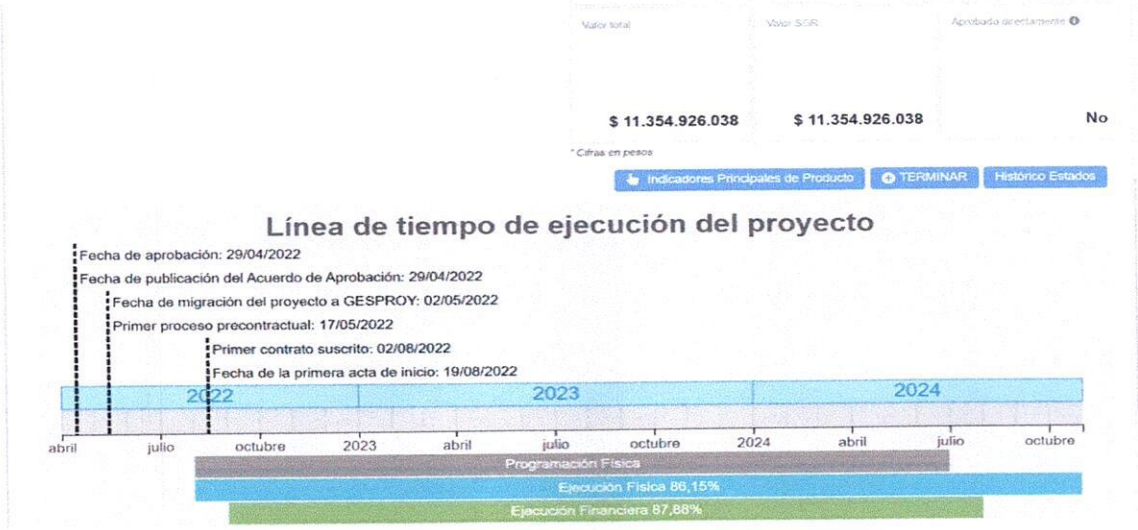

Proyecto 5.

BPIN: 2022850100009
PROYECTO: Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 54,23 a diciembre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto tiene una programación oficial que se extiende desde septiembre de 2023 hasta abril de 2025.
El valor actual del proyecto es de **$ 1.150.418.293**
Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida) – tiene suspensión de girsos
ALERTA: No presenta alertas
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

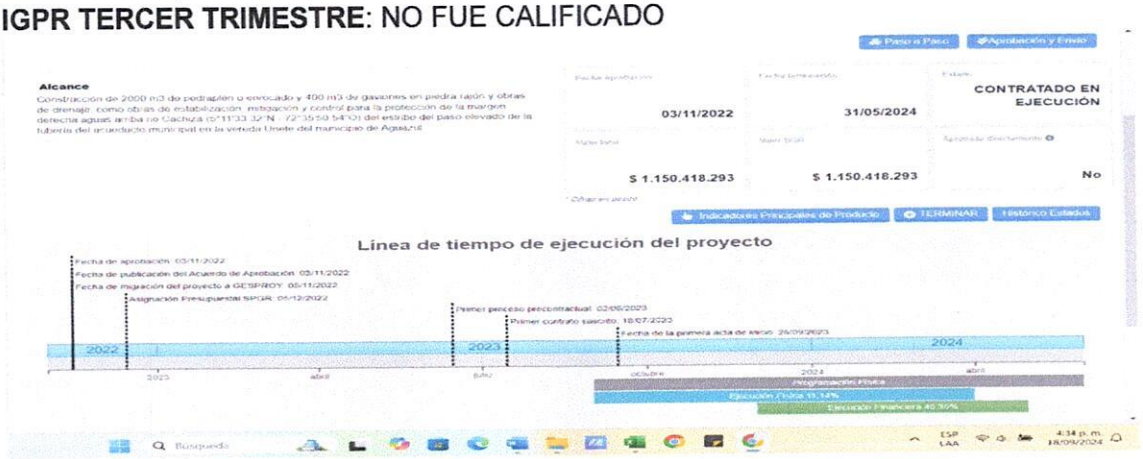


PROYECTOS TERMINADOS

Proyecto 1.

BPIN: 2018850100001
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANAR
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,30 reporte a febrero de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,90 Reporte a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: hacer un cuadro resumiendo los rp y las fuentes
El valor actual del proyecto es de **$ 9.179.844.769**
ALERTA: EJ -1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 311


EJ-2-27: Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$237,741,006.02;,esta alerta indica que realizando pagos de la fuente Asignaciones directas por mayor valor del asignado
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

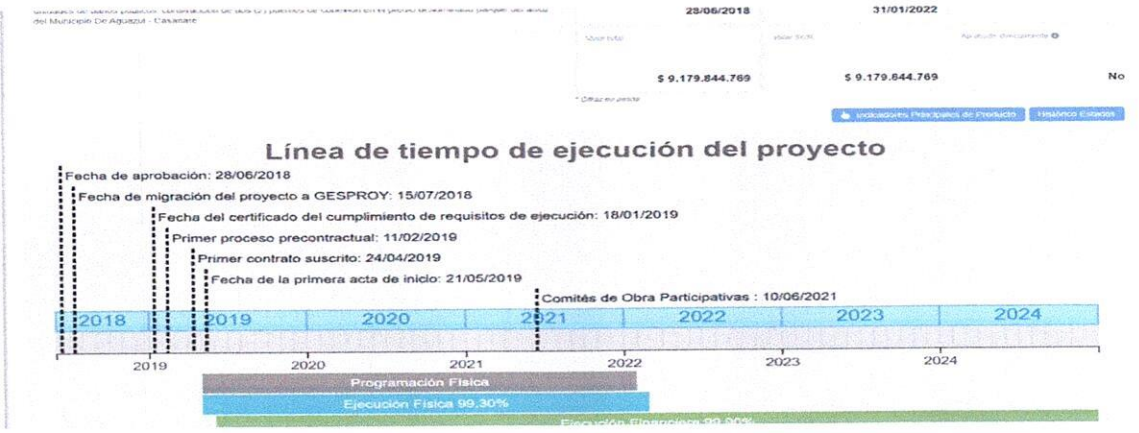

Proyecto 2


BPIN: 2019850100002
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022
AVANCE FINANCIERO: 89,53 registrada a diciembre de 2022
OBSERVACIÓN: Se evidencia en el aplicativo GESPROY la duplicidad del contrato principal N. 699-2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 el cual fue registrado por aplicación, y el contrato N. 20190699 del 14 de octubre de 2020 creado por SPGR., (adjunto pantallazo).
Se procedió a eliminar la información registrada en el contrato N. 699-2019 registrado por aplicación, para dejar la información que migro del SPGR, sin embargo al realizar el proceso de eliminación de los RP muestra un error, lo cual no ha permitido registrar el acta de liquidación.

Verificar los pagos por mayor valor
El valor actual del proyecto es de **$ 4.541.149.572**
ALERTA: EJ -1-24 proyectos terminados sin cerrar N. días 629
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

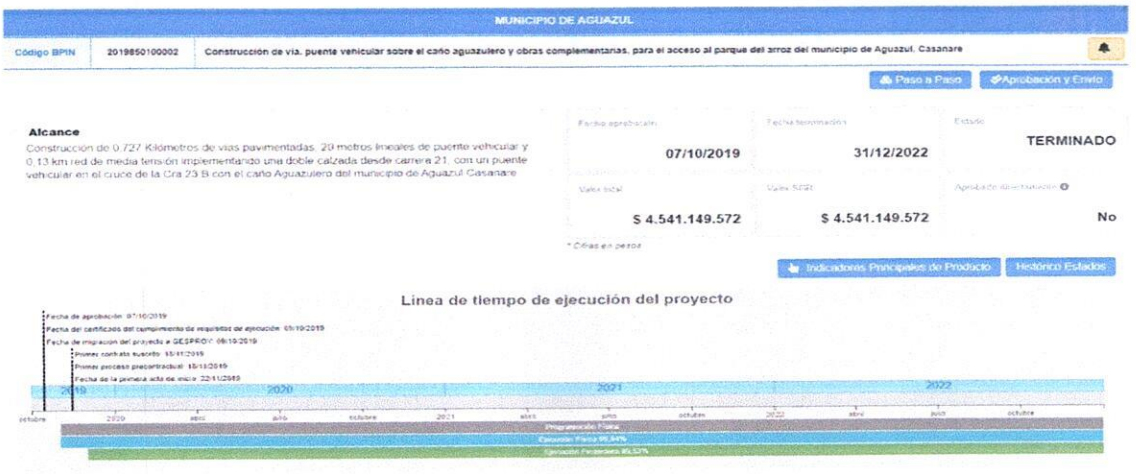


Proyecto 3.

BPIN: 2021850100006
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,97 registrado a abril de 2023
AVANCE FINANCIERO: 99,97 registrado a diciembre 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto tuvo programación de diciembre de 2021 a abril de 2023, aunque se encuentra en estado terminado, aun esta pendiente el acta de liquidación del contrato de interventoría N. **689-2021.**
El valor actual del proyecto es de **$ 1.823.834.445**
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 311
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

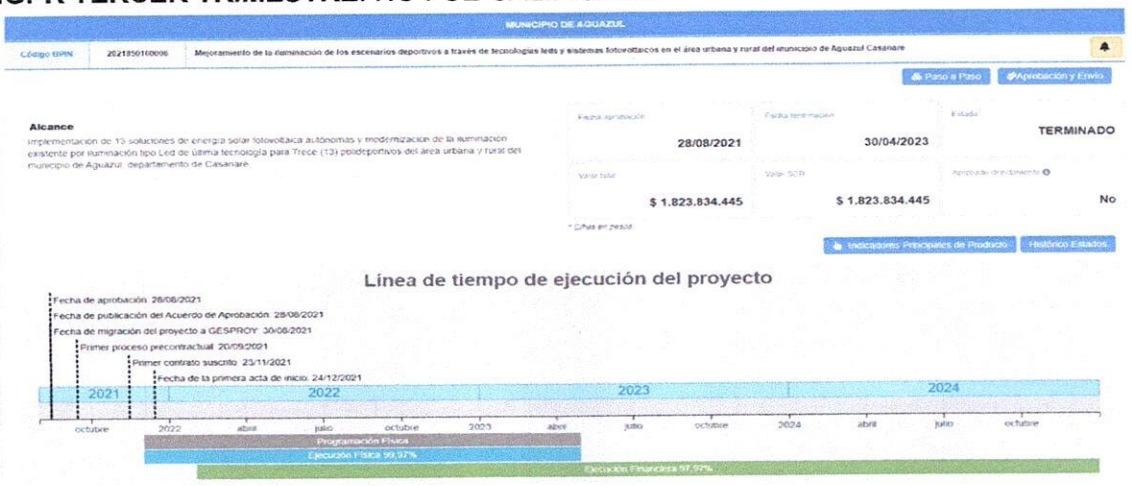


Proyecto 4.

BPIN: 2021850100024
PROYECTO: Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 100 registrado a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 99,97 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto cambio de estado de Terminado a Para cierre (20 de febrero de 2025)
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 312
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

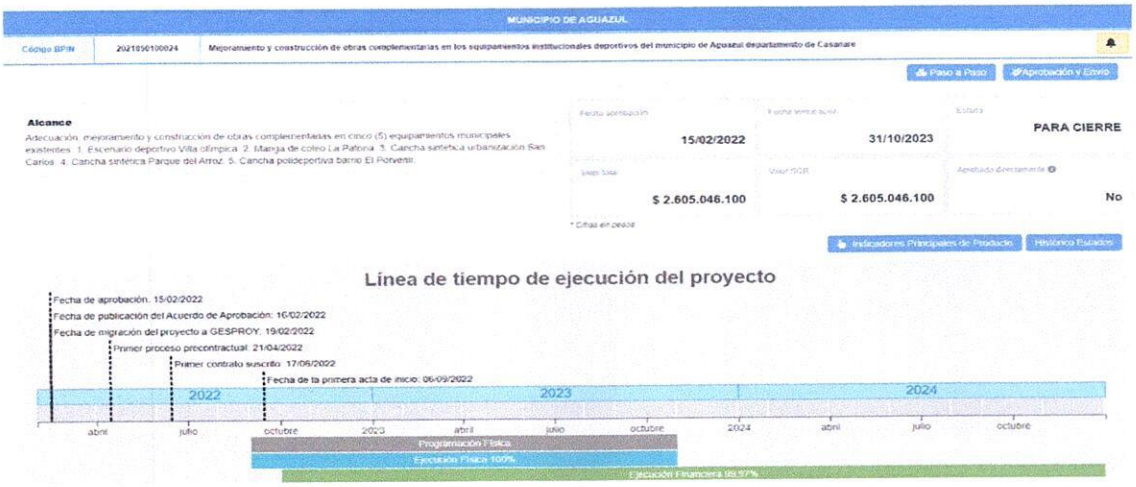

Proyecto 5.

BPIN: 2022850100011
PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 98,81 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN:
El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)
El contrato de obra N. 341-2022, esta liquidado
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 314
IGPR TERCER TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

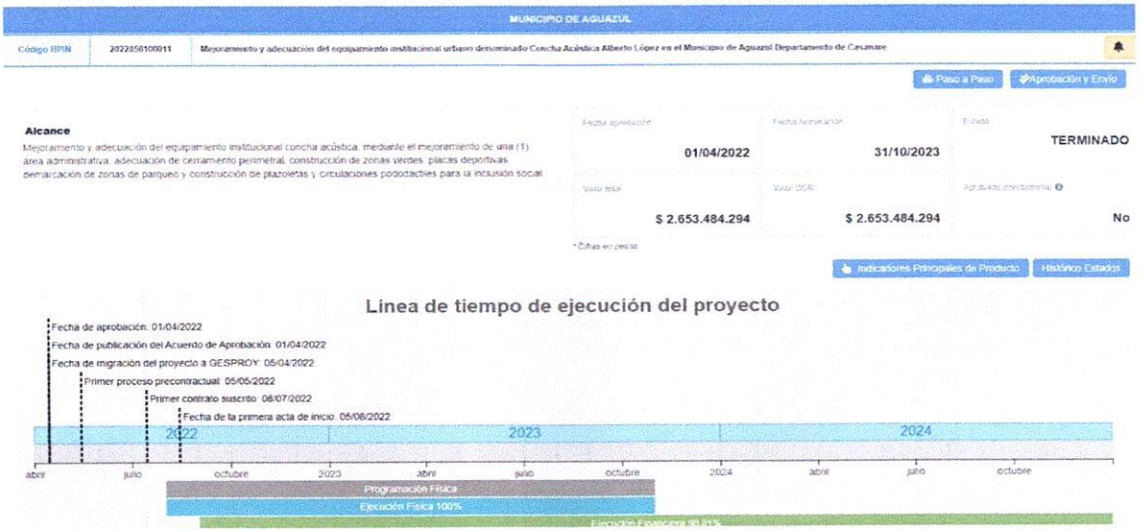

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 del 12 de febrero de 2025

ACTIVIDAD 2. -INFORME DE ALERTAS

Generar un informe Mensual sobre Alertas en Proyectos de Inversión Elaborar un informe mensual que actualice el estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fase sin TERMINAR financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y según las instrucciones del supervisor, se preparó un informe que proporciona una actualización detallada del estado de las alertas identificadas en los proyectos de inversión gestionados por la Secretaría de Infraestructura, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.

PERIODO: 01 de marzo al 31 de marzo de 2025

Este informe presenta una actualización del estado de alertas de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 2 del Contrato CPS No. 0224-2025 de "Generar un (1) informe mensual con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión que se encuentran en los estados: sin contratar, en ejecución y terminados sin acto administrativo de cierre, financiados con recursos del sistema general de regalizas SGR de la secretaria de infraestructura"

ALERTAS SIN SUBSANAR

A continuación, se describe la alerta de ***tipo "EJ-1-24"*** Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.


ALERTA EJ-1-24

BPIN: 2022850100011

NOMBRE: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 354

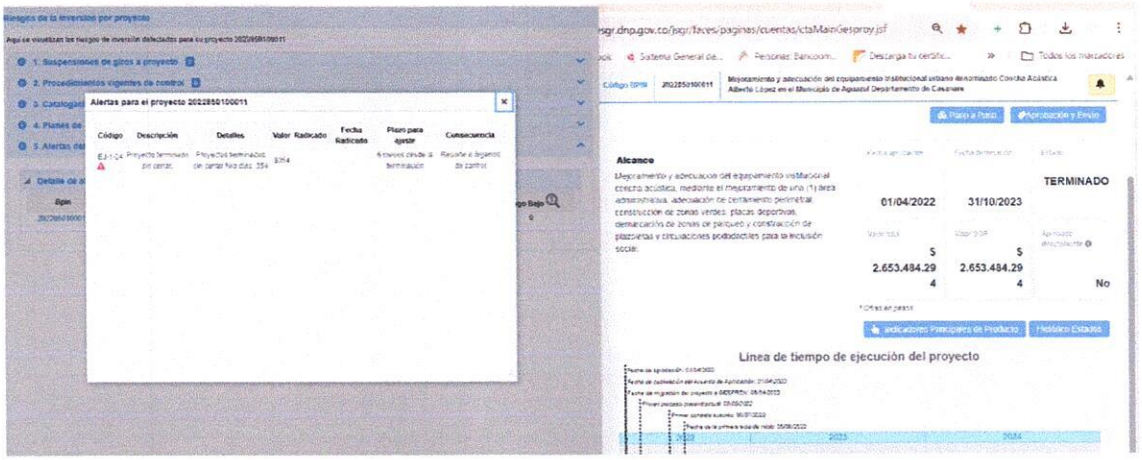


BPIN: 2018850100001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 351

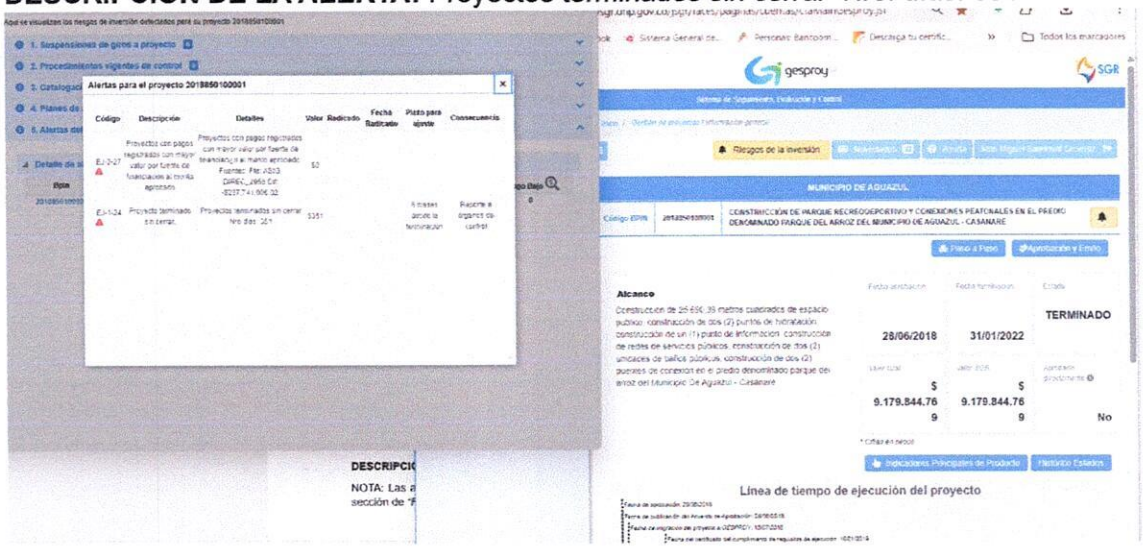


BPIN: 2019850100002

NOMBRE: Construcción de vía, puente vehicular sobre el caño aguazulero y obras complementarias, para el acceso al parque del arroz del municipio de Aguazul, Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 350

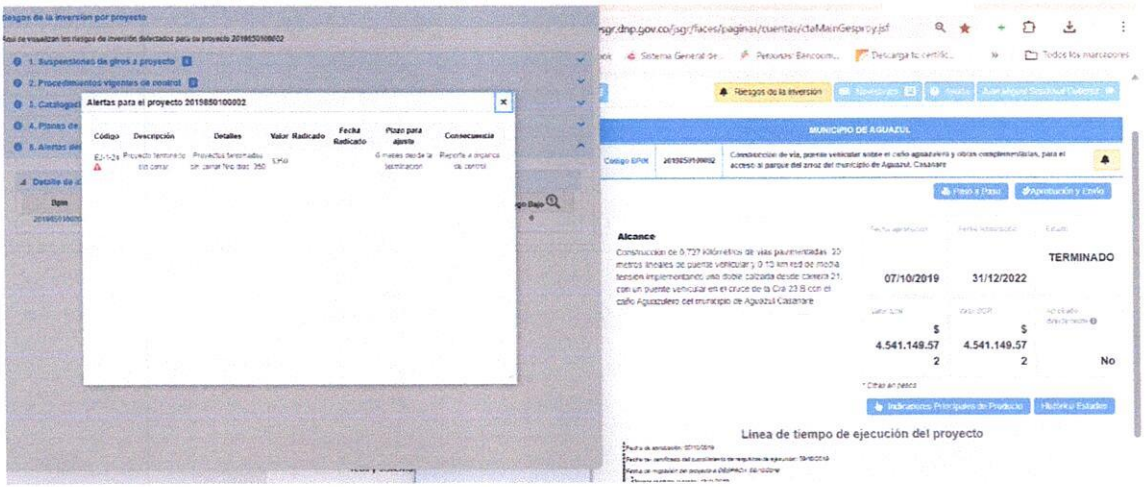


BPIN: 2021850100006


NOMBRE: Mejoramiento de la iluminación de los escenarios deportivos a través de tecnologías leds y sistemas fotovoltaicos en el área urbana y rural del municipio de Aguazul Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 351

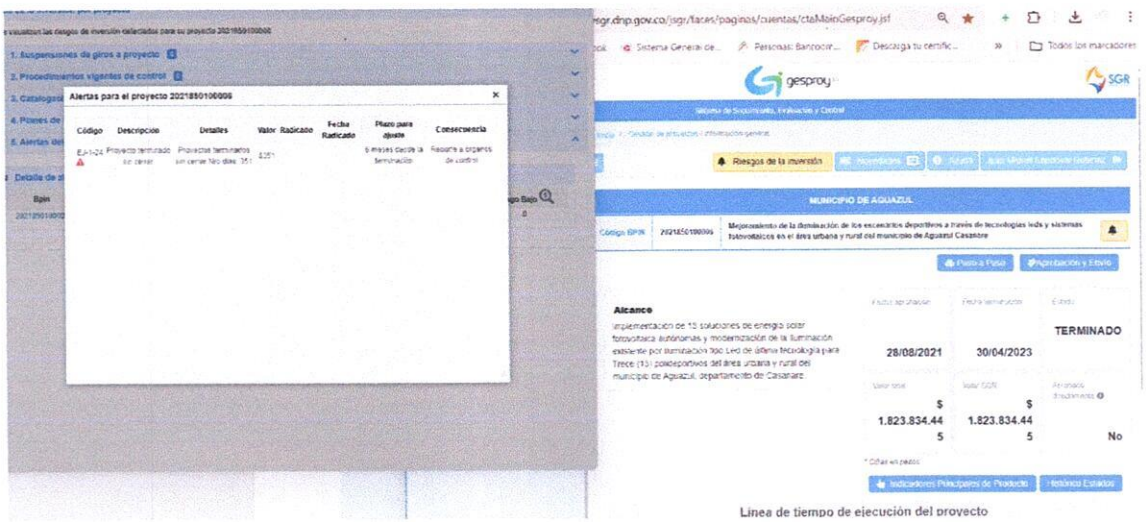

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*

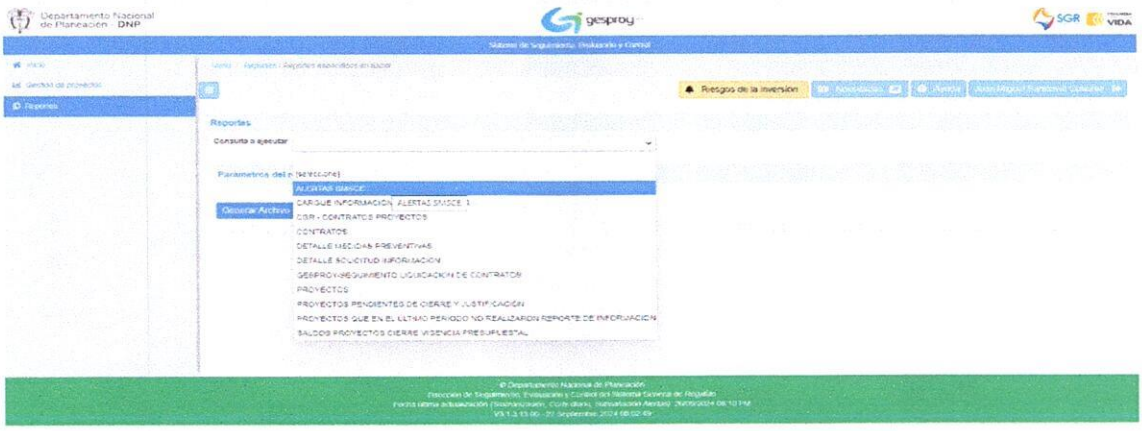

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO


CONTRATO 0224 del 12 de febrero de 2025

ACTIVIDAD 3.

1. Brindar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.

En atención al cumplimiento de esta actividad de asistencia profesional y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó la reprogramación del proyecto de inversión BPIN 2019850100004, "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul.

Teniendo en cuenta la prórroga, el nuevo plazo de ejecución del proyecto es desde junio de 2020 hasta junio de 2025.

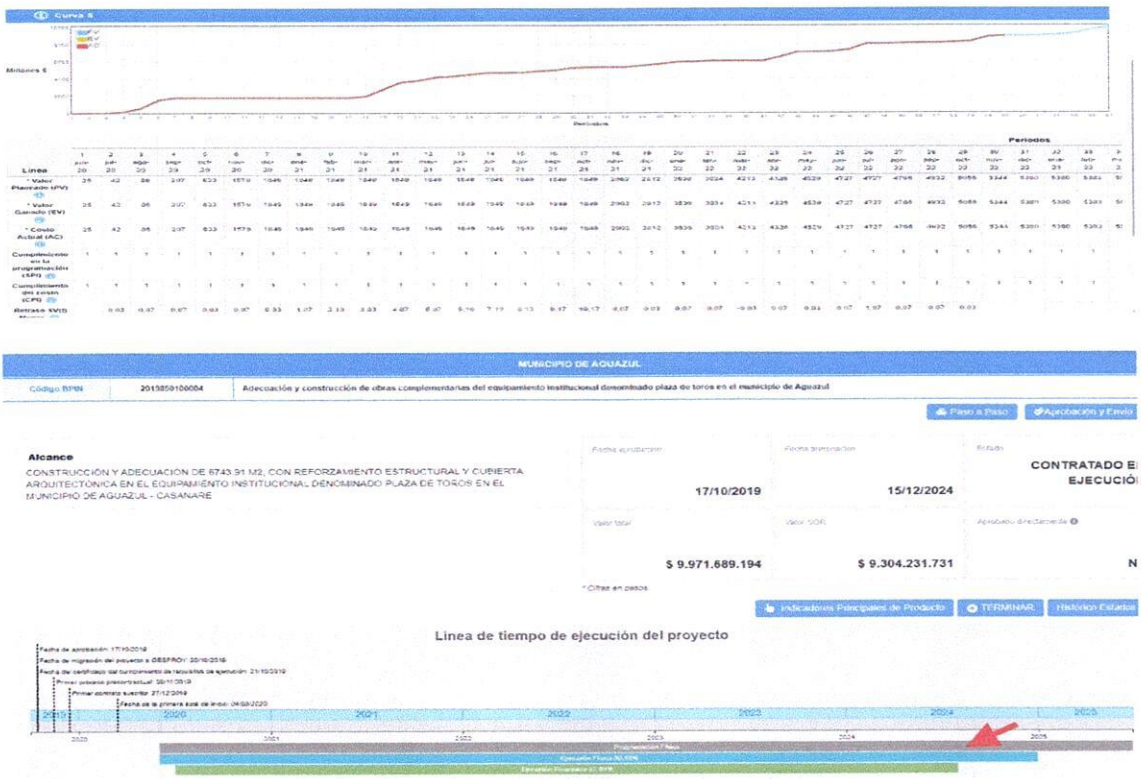

ELABORÓ:


ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD 4.- CARGUE DE INFORMACIÓN GESPROY

Registrar la información derivada de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, y actualizar el avance físico de los mismos.

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de información del siguiente proyecto en el aplicativo GESPROY: BPIN 2019850100004 Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul; se realizo:

1. Registro de prorroga al contrato 684-2019 obra 901350227-CONSORCIO PLAZA DE TOROS AGUAZUL
2. Registro de prórroga al contrato 685-2019 (interventoría).

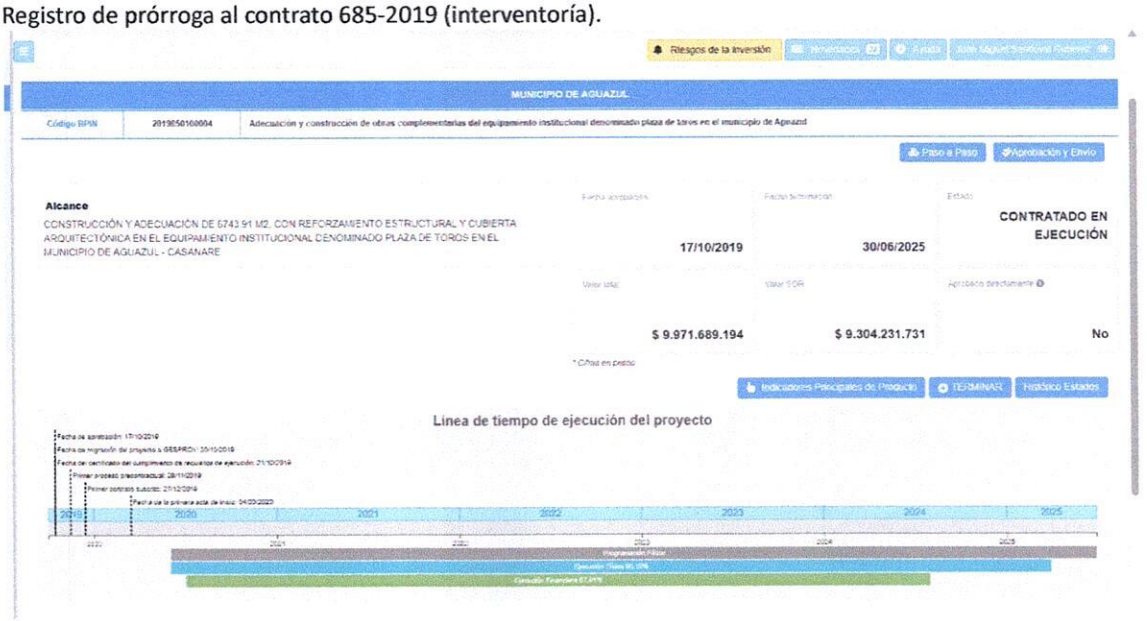


ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD 5.

Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual

D/A: En atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizaron las siguientes acciones:
El día 27 de marzo de 2025, se envió un caso a la mesa de ayuda del proyecto 2019850100002, "Construcción de vía, puente vehicular sobre el caño Aguaazulero y obras complementarias para el acceso al Parque del Arroz del municipio de Aguazul, Casanare", debido a la duplicidad de contratos y errores en la cadena presupuestal.



Mesa de ayuda SGR caso del proyecto BPIN 2019850100002 denominado "CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


obraspublicas aguazul-casanare <obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co> 27 de marzo de 2025, 10:20 a.m.
Para: infosgr@dnp.gov.co, servicioalciudadano@dnp.gov.co
CC: yudy lizeth solano vallejo <ing.lizethsolano@gmail.com>

Buenos días,

--
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL

10. REITERO Caso proyecto 2019850100002 Caño aguazulero.pdf 709K

El 31 de marzo se envió un caso a la mesa de ayuda del proyecto BPIN 2019850100004, "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul", debido a la duplicidad de contratos.



1 de 1

Fwd: Reiteramos caso mesa ayuda DNP 2019850100004 plaza toros Recibidos x

obraspublicas aguazul-casanare 10:19 (hace 23 minutos)
para servicioalciudadano, yudy, mi

--
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 47442426		SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21A 13-19	YOPAL-CASANARE	6329277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1371159423	9483699823	N	2025/04/07	2025/03/31	NU	0	$341,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$137,500			$1,100,000	$22,000			$1,100,000	$5,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$137,500			$1,100,000	$22,000			$1,100,000	$5,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$137,500			$1,100,000	$22,000			$1,100,000	$5,700		$0	$0
1	CC	47442426	SERRANO GENNY	25-14	30	($1,962,000)	($314,000)	EPS005	30	($1,962,000)	($245,300)	CCF69	30	($1,962,000)	($39,300)	14-23	30	($1,962,000)	($10,300)	30	$0	$0
2	CC	47442426	SERRANO GENNY	25-14	30	$3,062,000	$490,000	EPS005	30	$3,062,000	$382,800	CCF69	30	$3,062,000	$61,300	14-23	30	$3,062,000	$16,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$137,500			$1,100,000	$22,000			$1,100,000	$5,700		$0	$0

2025/03/31 11:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 47442426		SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21A 13-19	YOPAL-CASANARE	6329277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1371159423	9483699823	N	2025/04/07	2025/03/31	NU	0	$341,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$176,000	$0	$0	$176,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$176,000	$0	$0	$176,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,700	$0	$0	$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,700	$0	$0	$5,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,000	$0	$0	$22,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$22,000	$0	$0	$22,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$137,500	$0	$0	$137,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$137,500	$0	$0	$137,500
TOTAL				1	$341,200	$0	$0	$341,200

2025/03/31 11:02 AM

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica


Que nuestro(a) cliente **GENNY PAOLA SERRANO DELGADO**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 47.442.426** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 981580301** aperturada el **19 de enero de 2021**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el primer 01 día del mes de **abril de 2025**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0981580301**
Cuenta de 16 dígitos: **0981000200580301**
Cuenta de 20 dígitos: **00130981000200580301**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
