“ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES”

CONTRATISTA: JEMAD INGENIERÍA S.A.S

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

Rep. Legal de JEMAD INGENIERÍA S.A.S

INTERVENTORIA: INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

Rep. Legal De INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO

FRANCY LORENA HERNÁNDEZ ARRIETA

SINCELEJO - SUCRE

INFORME FINAL EJECUTIVO

FEBRERO DEL 2025

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

23 DE DICIEMBRE DE 2024-10 DE FEBRERO DE 2024

REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

Representante legal INGENORTE

Interventoría.

APROBO:

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SUPERVISION.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO 5
INFORMACIÓN GENERAL 5
CUADRO DE RESPONSABILIDADES 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
CONTRATOS SUSCRITOS 7
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 7
CONTROL DE POLIZAS 8
CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 8
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO 9
CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA 11
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 12
CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 12
DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA 13
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA 13
CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS 18
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA 18
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 18
FORMA DE PAGO 19
FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA 19
FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA 19
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 19
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE 20
AVANCE DE OBRA 21
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura de las salas de audiencias en la torre Gentium de **SINCELEJO**, en departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**

Mediante el **Contrato N°. MC 22 DE 2024** celebrado el **19 DE DICIEMBRE DE 2025** e iniciado el **23 DE DICIEMBRE DE 2024**; fecha correspondiente también al acta de inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORIA,** firmado por **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.,** ejerciendo las labores de **INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**, Con el propósito de adelantar las actividades de control y seguimiento sobre la ejecución del **CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA Nº MC-22-2024**, suscrito entre el **CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el JEMAD INGENIERÍA S.A.S**, cuyo objeto es la **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**

En aras de cumplir con el control y seguimiento del proyecto se constituye el presente documento, correspondiente al informe de interventoría número 1 del contrato de obra MC-22-2024 con objeto "**ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**, del periodo referente al 23 de diciembre del 2024 al 10 de febrero de 2025.

En el cual se reporta el estado final de las obras con relación a los aspectos generales y particulares del estado del Proyecto, los cuales son de orden técnico, administrativo, operativo, financiero y socio ambiental, donde se describe el seguimiento de la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas por el contratista de obra, anexando el registro fotográfico, la medición y el cálculo del avance porcentual de ejecución.

Además, en el presente informe se presentan conclusiones y recomendaciones acerca de la finalización del proyecto, imprevistos, cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y demás aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública, objeto de esta Interventoría.

Resaltando que, a partir de las conclusiones y recomendaciones que esta interventoría ponga en conocimiento del ente contratante, se tomen las acciones que contribuyan al buen desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que las actividades de ejecución, seguimiento y control, deben enmarcarse dentro de un código de integridad moral y ética profesional.

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA	“ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES”					
INFORME No	2	**INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CIVILES DE** “ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES”				
PERIODO		ENTRE	23/diciembre/ 2024	Y	10/FEBRERO/2025	
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SINCELEJO, SUCRE-TORRE GENTIUM					

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	ROBINSON VILLAMIL ROJAS
REVISÓ	OSCARLUISHERAZOSEBA R. Legal Interventoría
APROBÓ	OSCARLUISHERAZOSEBA R. Legal Interventoría

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISOR	No COPIAS	FECHA DE ENVIO	OBSERVACIONES
INGENIERA FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	1	20 de FEBRERO de 2025	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto a desarrollar con **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES",** objeto del contrato de obra **MC 22 DE 2024** y tiene como finalidad la adecuacion y mejoramiento de las salas de audiencias ubicadas en la torres gemtium.

Las intervenciones del proyecto consistirán inicialmente ubicar nuevos elementos como aires acondicionados, muros en drywall, levante en muros, como también cambio de luminarias y mantenimiento al cielo razo, mantenimiento electrico y sistema de voz de datos .

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EDIFICIO GEMTIUM, SINCELEJO SUCRE

El edificio gemtium esta ubicado en la zona centrica de Sincelejo.



CONTRATOS SUSCRITOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA MC 22 DE 2024
CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
C.C NIT:	
CONTRATISTA:	JEMAD INGENIERÍA S.A.S R/L JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
NIT:	NIT. 901.539.452-9
OBJETO:	"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"
VALOR INICIAL:	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 76.658.982
VALOR ADICIONAL:	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($ 25.314.090,00)
VALOR TOTAL OBRA:	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS ($101.973.072)
PLAZO:	HASTA 31 DE ENERO DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	10 DIAS
PLAZO FINAL	10 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORÍA:	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L OSCAR LUIS HERAZO SEBA
NIT:	901.752.114-6
OBJETO:	"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"
VALOR INICIAL:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($7.234.729,95)
VALOR ADICIONAL:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (11.417.031,72 M/CTE)
VALOR TOTAL:	DIECIOCHO MILLNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SITE CENTAVOS 18.651.761,67
SUPERVISIÓN:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DICINUEVE 19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL DE OBRA	10 DE FEBRERO DE 2025

CONTROL DE POLIZAS

CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
POLIZA INICIAL

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	17/12/2024	30/04/2025	$15,331,796.40
Estabilidad de la Obra	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$22,997,694.60
Salarios y prestaciones Sociales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	17/12/2024	31/12/2027	$11,498,847.30
Predios labores y operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-74 - 994000007121	17/12/2024	31/12/2024	$260,000,000.00

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	06/05/2025	$15,331,796.40
Estabilidad de la Obra	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$22,997,694.60
Salarios y prestaciones Sociales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	31/12/2027	$11,498,847.30
Predios labores y operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-74 - 994000007121	17/12/2024	31/12/2024	$260,000,000.00

ACTUALIZACION DE POLIZA CON PRORROGA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	31/07/2025	$15,331,796.40
Estabilidad de la Obra	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA		$22,997,694.60

			DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		
Salarios y prestaciones Sociales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	31/01/2028	$11,498,847.30
Predios labores y operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-74 -994000007121	17/12/2024	31/01/2025	$260,000,000.00

POLIZA CON ADICION Y PRORROGA 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	**540- 47 -994000007121**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	10/08/2025	15,331,796.40
PRESTACIONES SOCIALES	23/12/2024	10/02/2028	11,498,847.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	2 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		22,997,694.60
PÓLIZA No.	**540- 47 -994000007121**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/01/2025	10/02/2025	**260,000,000**

CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA

POLIZAS INICIALES

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	19/12/2024	30/06/2025	$1.446.946,00
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	19/12/2024	31/12/2027	$723.473,00
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	31/12/2024	31/12/2027	$1.446.946,00

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/07/2025	$1.446.946,00
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/01/2028	$723.473,00
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	04/01/2024	04/01/2028	$1.446.946,00

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON ADICIONAL Y PRORROGA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/08/2025	$3.730.352,40
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/02/2028	$1.865.176,20
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	31/01/2025	31/01/2028	$3.730.352,40

ACTUALIACION DE POLIZAS CON PRORROGA NUMERO 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
PÓLIZA No.	**CRC-100022185**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	14/08/2025	3,730,352.40.
PRESTACIONES SOCIALES	23/12/2024	14/02/2028	1,865,176.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/01/2025	31/01/2028	3,730,352.40

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
Vigentes las pólizas	**SI**		
Tiene reclamaciones		**NO**	
Certificación de parafiscales	**SI**		
Exámenes ocupacionales de ingreso	**SI**		

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista, el cual fue verificado en obra.

N°	**CANTIDAD**	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEDICACIÓN**
1	1	CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	DIRECTOR DE OBRA	50%
2	1	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	1	MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	SISO	100%

Se anexan certificados de ingreso ocupacional.

DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en obra durante el periodo relacionado, dando cumplimiento al contrato de interventoría.

N°	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	70%
2	1	CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
3	1	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	PROFESIONAL SISO	100%

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA

A continuación se presentan los cuadros resumen de los oficios enviados y oficios recibidos por la interventoría durante el periodo del presente informe, los cuales se presentan de manera completa en los anexos.

OFICIOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO			
N° DE RADICADO	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
JM-001-MC22-2024	SINCELEJO, 27 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN INICIAL
JM-002-MC22-2024	SINCELEJO, 27 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE PRORROGA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.
NO APLICA-VIA CORREO	SINCELEJO, 28 DE DICIEMBRE DE 2024	SUPERVISION	SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO MC 22 DE 2024 Y APORTE DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO MC 24 DE 2024

JM-003-MC22-2024	SINCELEJO, 30 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-004-MC22-2024	SINCELEJO, 30 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-005-MC22-2024	SINCELEJO, 30 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	REMISIÓN DE AFILIACIONES A ARL DEL PERSONAL
JM-006-MC22-2024	SINCELEJO, 01 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-007-MC22-2024	SINCELEJO, 03 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-008-MC22-2024	SINCELEJO, 03 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-009-MC22-2024	SINCELEJO, 07 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	RESPUESTA A OFICIO CE-INC-MC_25_2024-002-

			2024 DE ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN OBRA
JM-010-MC22-2024	SINCELEJO, 07 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-011-MC22-2024	SINCELEJO, 07 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-012-MC22-2024	SINCELEJO, 08 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-013-MC22-2024	SINCELEJO, 09 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-014-MC22-2024	SINCELEJO, 12 DE ENERO DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA

			EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-016-MC22-2024	16 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-018-MC22-2024	18 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-019-MC22-2024	21 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-020-MC22-2024	21 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA DE AVANCE DE OBRA
JM-021-MC22-2024	28 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
VIA CORREO	29 DE ENERO DE 2025	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBSERVACIONES A BALANCE Y PRORROGA
JM-022-MC22-2024	29DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

			SOLICITADA MEDIANTE OFICIO JM- 021-MC22-2024
JM-023-MC22-2024	29 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA
JM-026-MC22-2024	29 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA
VIA CORREO	29 DE ENERO DE 2025	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	AVAL DE PRORROGA NUMERO 2 Y ADICIONAL 1
JM-028-MC22-2024	03 DE FEBRERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-030-MC22-2024	04 DE FEBRERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA RETIRO DE LUMINARIAS DESMONTADAS

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA

El 27 de diciembre de 2024 fue aprobado el otrosí modificatorio N°1 mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses, posteriormente se legalizo la prorroga numero 2 mediante el cual fueron adicionados 10 días más de ejecución quedando como tiempo limite el 10 de febrero de 2025, de los cuales transcurrió el tiempo de ejecución con normalidad.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
49 DIAS	**49 DIAS**	**0 DIAS**

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 30 de diciembre de 2024 fue aprobado el otrosí modificatorio N°1 mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses, posteriormente se prorrogo hasta el día 10 de febrero de 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
49	**49**	**0**

ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

En el período transcurrido la Interventoría realizó el seguimiento y control de los aspectos financieros así:

- **Control de la Inversión del contrato de obra**
- **Seguimiento financiero del contrato de obra.**

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA

ACTAS PARCIALES	**EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA ACTAS PARCIALES CORRESPONDIENTES AL AVANCE DE LAS OBRAS**

No se radicaron actas parciales

FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA

ACTAS PARCIALES	**EL CONTRATANTE PAGARA AL INTERVENTOR MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA**

No se radicaron actas parciales

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA


Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

	Inversión programada (p)	**Inversión ejecutada (E)**	**E/P (%)**
PERIODO:	**$ 101.973.072**	**$ 99.939.766**	**98%**
ACUMULADO:	**$ 101.973.072**	**$ 99.939.766**	**98%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE

	Inversión programada (p)	Inversión ejecutada (E)	RETRASO
ACUMULADO	**100%**	**98%**	**0%**

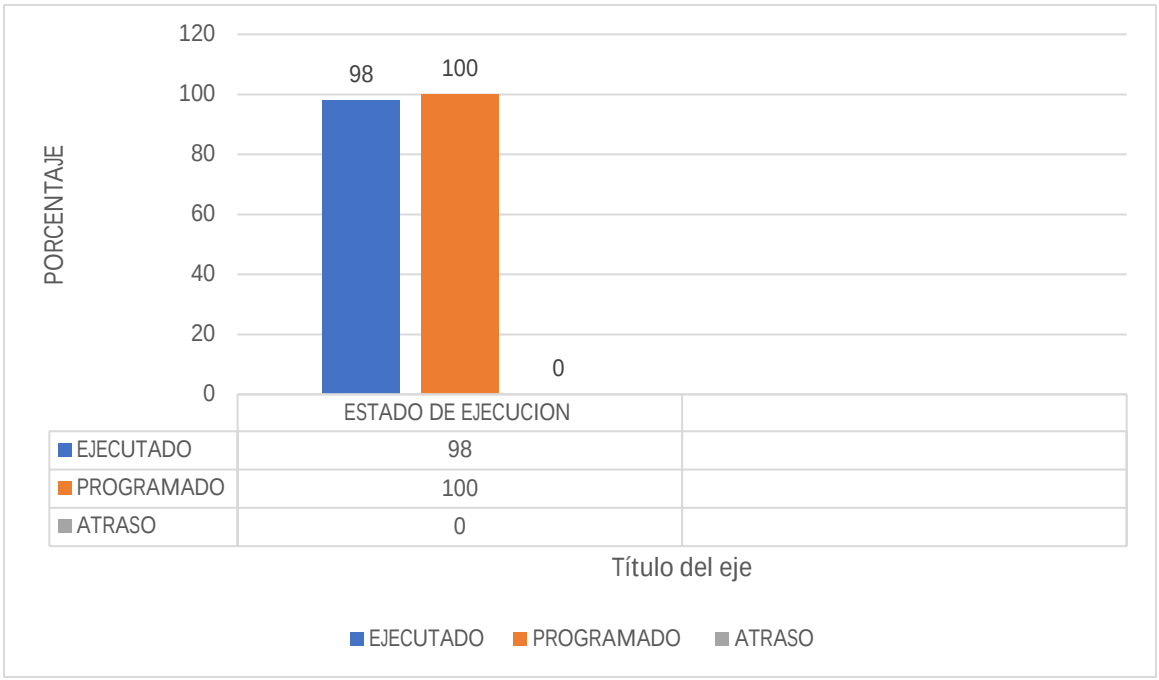

Se presenta una ejecución del 98% faltando un 2% por ejecutar, que no es necesario para alcanzar la meta física del proyecto.

AVANCE DE OBRA

IMÁGENES SALA DE AUDIENCIA 1





ITEM 1,01: DESMONTE LUMINARIA 60X60
Se realizo el desmonte de las luminarias led 60x60 de la sala de audiencia N°1 y N°2







ITEM 1,02: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE 40W, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
Se realizo la instalación de luminarias 60x60




ITEM 1,05: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A 110V SOBRE CANALETA METALICA




ITEM 1,06: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE A 120V SOBRE METALICA



ITEM 1,07: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
Se realizo la instalación de interruptores de la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,08: SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE
Se realizo la instalación de interruptores triple la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,09: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON CERRADURA TIPO PALANCA, MARCO ANCHO: 0,95MTS H:2,05MTS
Se realizo la instalación de puertas metálicas en la sala de audiencia N°1 y N°2



ITEM 1,10: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SUPERIOR PARA PUERTAS METALICAS EN VIDRIO.
Se realizo la instalación de modulo superior en vidrio en la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,11: MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTES Y LUBRICACIÓN DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS CON CAMBIO DE CERRADURA



ITEM 1,14: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA CONDUIT 1" PARA CABLE UTP DATOS.



ITEM 1,15: SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA RECIBIDOR CON ALTURA DE 1,10 MTS; ANCHO DE 2,20MTS Y 1CM DE ESPESOR; SOPORTADO POR 3 PARALES DE 1,30 MTS EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE.





ITEM 1,16: LEVANTE DE MURO EN DRYWALL
Se realizo el levante de muro en drywall de la sala de audiencia N°1 y N°2



ITEM 1,17: Suministro e instalación de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.



ITEM 1,18: Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.





ITEM 1,19: LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA 0,09 M PARA MESÓN DE RECIBO (INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO SEPARADOS CADA 40 CM, DOVELAS Y ACARREO INTERNO DE MATERIALES)
Levante de muro en mampostería sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,2: VIGA DE 0,25*0,09 MTS SOBRE MURO PARA MESON DE RECIBO (ICLUYE ACERO DE REFUERZO)
Viga sala de audiencia N°1 y N°2




ITEM 1,21: PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MUROS EN MAMPOSTERIA PARA MESÓN DE RECIBO (INCLUYE ACARREO INTERNO DE MATERIALES EN OBRA)
Pañete en Mortero 1:4 sala de audiencia N°1 y N°2






ITEM 1,22: ESTUCO ACRILICO EN MUROS PARA MESON DE RECIBO (INCLUYE ACARREO INTERNO DE MATERIALES) Viga sala de audiencia N°1 y N°2

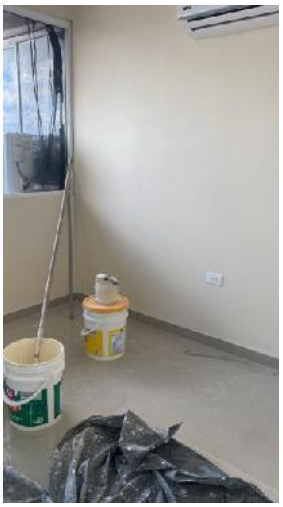



ITEM 1,23: PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES, TRES MANOS SOBRES PAÑETE O ESTUCO INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Viga sala de audiencia N°1 y N°2

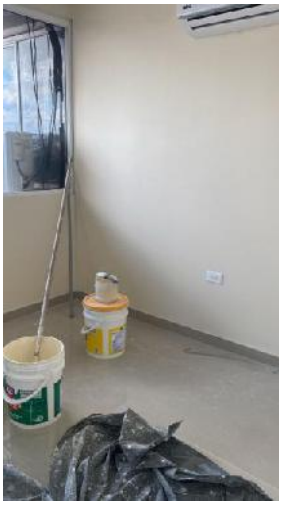



ITEM 1,24: CONSTRUCCIÓN ZÓCALO EN PORCELANATO ANCHO 8 CM.
Se instalaron sócalos en las nuevas divisiones de la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,25: CONSTRUCCION DE FILOS Y VANOS PARA PUERTAS Y MESONES INCLUYE PAÑETE. Se realizaron en las salas de audiencia N°1 y N°2



ITEM 1,26: PINTURA PARA INTERIORES SOBRE CIELO RASO, COLOR SEGÚN ELECCIÓN. Se realizaron en las salas de audiencia N°1 y N°2




ITEM 1,27: MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Se realizaron en las salas de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,28: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMERILADO PARA PUERTAS DE VIDRIO.

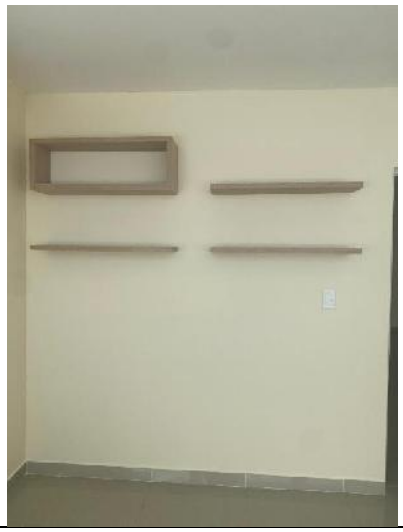

ITEM 1,29: SUMINISTRO E INSTALACION DE BIBLIOTECA TIPO ESTANTERIA EN MADERA RH RECUBIERTA EN MELAMINA, INCLUYE TRES PELDAÑOS Y UN MARCO.






ITEM 1,31: PERSIANAS TIPO BLACK-OUT



ITEM 4,10: SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 1 MTS.

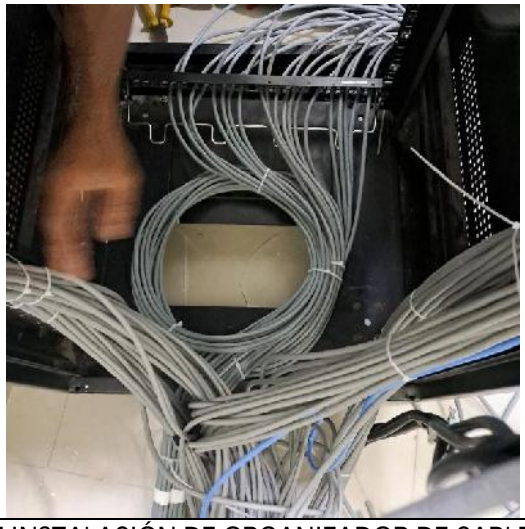


ITEM 4,11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES EN EL RACK




ITEM 4,12: SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6



ITEM 4,13: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS

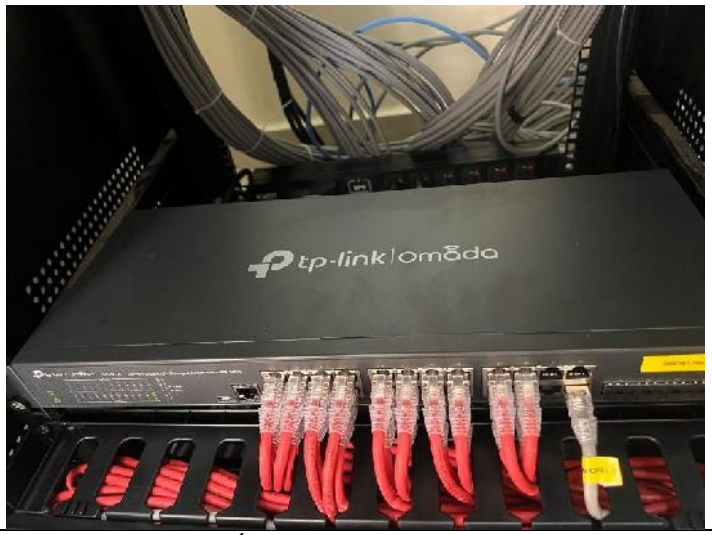

ITEM 4,14: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA RACKEABLE DE 8 SERVICIOS.

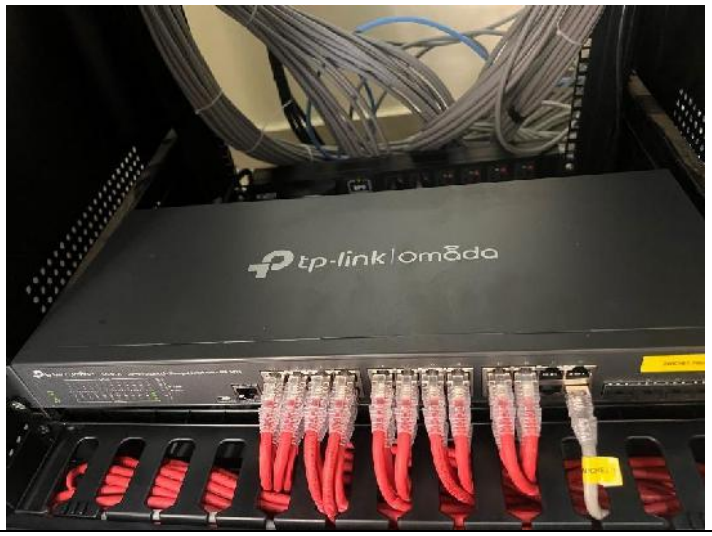

ITEM 5,1: SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES EN ESPIRAL



NP -1: Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU



NP -2:
Instalación de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)




NP -3:
Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)



NP -4:
Suministro e instalación de soporte pie de amigo




NP -5:
Salida para aire acondicionado de tablero a condensadora

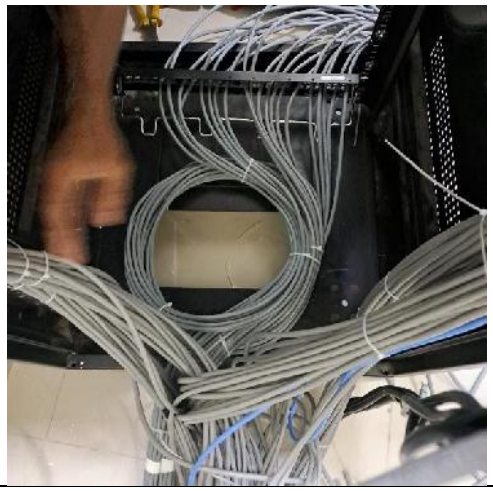


NP -6:
Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a




NP -7:
Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)

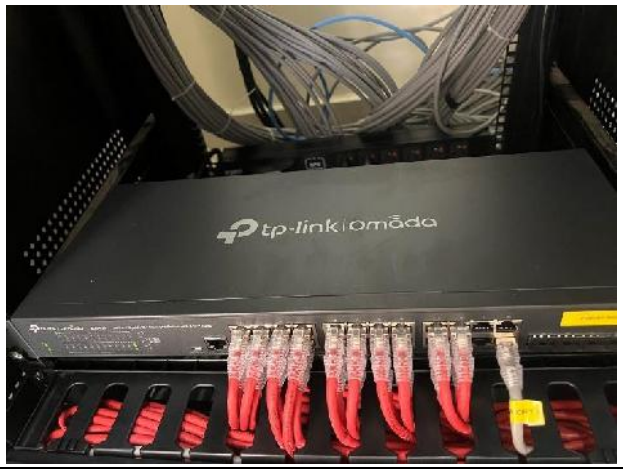

NP -8:
Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a

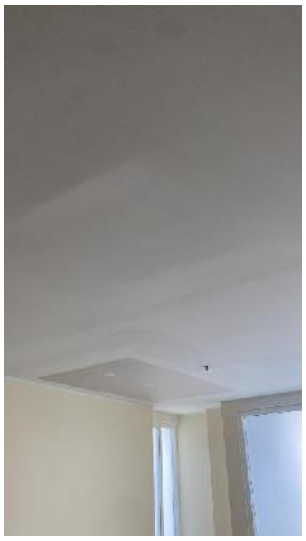

NP -9:
Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)

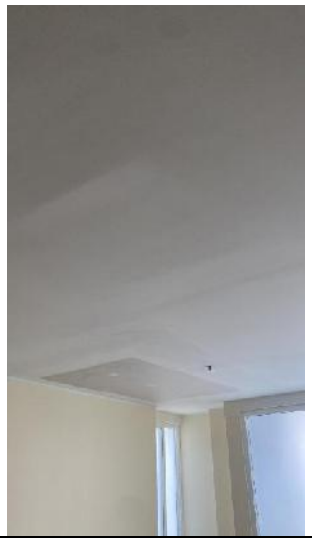

NP -10:
Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)



NP -11:
Salida de luminaria



NP -12:
Suministro e instalacion de interruptor doble



NP -13:
Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"



NP -14:
Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"



NP -15:
Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V



NP -16:
Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division



NP -17:
Suministro e instalacion de troquel triple metalico



NP -18:
Suministro e instalacion de troquel doble metalico




NP -19:
Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica



NP -20:
Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w



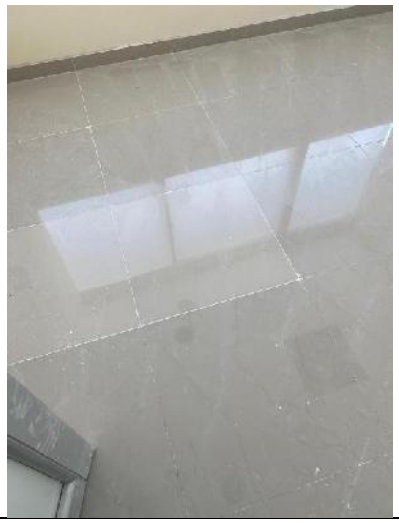

NP -21:
Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

EXAMENES DE INGRESO CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-12-30

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	Documento:	CC 1100622659
Fecha de nacimiento:	1985-04-15	Lugar de nacimiento:	MORROA (Sucre)
Edad:	39 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 5A #17-49 BRR EL ROSARIO	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3215337391	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OBRERO	EPS:	Cajacopi
Responsable**:	VALENTINA CHAVEZ (HIJA)	Teléfono:	3023284288
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis Ninguna - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA con documento de identificación No. 1100622659 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
higiene postural
uso de EPP


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario Indice der
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA
Documento: 1100622659

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: kevin.fuentes
Fecha: 2024-12-30 Hora: 12:06

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	Documento:	CC 1102876220
Fecha de nacimiento:	1996-12-11	Lugar de nacimiento:	Sincelejo (Sucre)
Edad:	28 años	Identidad de Género:	Femenino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CRA 30 N 18-28 BRR DULCE NOMBRE	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3004864378	Escolaridad:	Universitario_completo
Ocupación:	RESIDENTE DE OBRA	EPS:	Salud Total
Responsable**:	OLGA ATENCIA (MADRE)	Teléfono:	3017670411
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - Ultima dosis: 2

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA con documento de identificación No. 1102876220 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de RESIDENTE DE OBRA del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas


CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana



Firma para identificación de usuario
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
Documento: 1102876220



Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-08 Hora: 15:05

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-12-30

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	Documento:	CC 1100543948
Fecha de nacimiento:	1987-09-28	Lugar de nacimiento:	GALERAS (Sucre)
Edad:	37 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Casado	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 12A #8-91 BRR CENTENARIO	Municipio:	GALERAS
Teléfono:	3135219709	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OBRERO	EPS:	Regimen Subsidiado
Responsable**:	LUDIS LOPEZ (MADRE)	Teléfono:	3126296563
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ con documento de identificación No. 1100543948 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
higiene postural
uso de EPP


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ
Documento: 1100543948

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: kevin.fuentes
Fecha: 2024-12-30 Hora: 12:06

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	OSCAR DAVID CHADID VERGARA	Documento:	CC 1007770716
Fecha de nacimiento:	2000-05-27	Lugar de nacimiento:	COROZAL (SUCRE)
Edad:	24 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CLL 40 B N 03-40 BRR BOLIVAR	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3008999872	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AUXILIAR EN REFRIGERACIÓN	EPS:	Regimen Subsidiado
Responsable**:	FIYAD CHADID (PADRE)	Teléfono:	3213173193
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a OSCAR DAVID CHADID VERGARA con documento de identificación No. 1007770716 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AUXILIAR EN REFRIGERACIÓN del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario Indice der
OSCAR DAVID CHADID VERGARA
Documento: 1007770716

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-17 Hora: 15:18

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	YUSMED JOSE MARTINEZ MONTIEL	Documento:	CC 1038103909
Fecha de nacimiento:	1988-09-17	Lugar de nacimiento:	Sincelejo (Sucre)
Edad:	36 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Casado	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CLL 40 B N 3-56 BRR BOLIVAR	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3215580697	Escolaridad:	Tecnico_completo
Ocupación:	TECNICO EN REFRIFERACIÓN	EPS:	Salud Total
Responsable**:	ANDREA LOPEZ (ESPOSA)	Teléfono:	3014837603
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a YUSMED JOSE MARTINEZ MONTIEL con documento de identificación No. 1038103909 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de TECNICO EN REFRIFERACIÓN del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso .

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario
YUSMED JOSE MARTINEZ MONTIEL
Documento: 1038103909

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de

Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-17 Hora: 15:18

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**150593,5**	**Fecha Impresión**	**30/12/2024**
Fecha Ingreso	**30/12/2024**	**Nombre**	**SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO**
CC	**1100522249**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**DIRECTOR DE OBRA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**18/08/1990**	**Edad**	**34**
Dirección	**Kra19D#42D-21**	**Teléfono**	**3156943182**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**JEMAD INGENIERIA**	**Fecha de salida**	**30/12/2024**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO
CC:CC1100522249

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**150594,5**	**Fecha Impresión**	**30/12/2024**
Fecha Ingreso	**30/12/2024**	**Nombre**	**PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL**
CC	**1192727333**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SISO**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**10/08/2001**	**Edad**	**24**
Dirección	**KR 24 CL 1P**	**Teléfono**	**3015704340**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**JEMAD INGENIERIA**	**Fecha de salida**	**30/12/2024**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL
CC:CC1192727333

EXAMENES DE INGRESO INTERVENTOR

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**2277652,693**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**HERAZO SEBA OSCAR LUIS**
CC	**1103118425**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SECRETARIO DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**24/09/1996**	**Edad**	**28**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA**	**Teléfono**	**3114893115**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: HERAZO SEBA OSCAR LUIS
CC:CC1103118425

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2266851,113**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA**
CC	**24339586**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SISO DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**23/08/1985**	**Edad**	**39**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO**	**Teléfono**	**3005785192**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR:	**SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**
ALTURAS:	**N/A.**
ESPACIOS CONFINADOS:	**N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1032395042

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA
CC:CC24339586

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2288454,273**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO**
CC	**1100622776**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**15/12/1985**	**Edad**	**39**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA**	**Teléfono**	**3043572148**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO
CC:CC1100622776

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2310057,433**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**VILLAMIL ROJAS ROBINSON**
CC	**79048393**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**1/07/1966**	**Edad**	**58**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA**	**Teléfono**	**3004918397**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: VILLAMIL ROJAS ROBINSON
CC:CC79048393

CERTIFICADO DE AFILIACION

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

AFILIACIONES ARL

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-005-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: REMISIÓN DE AFILIACIONES A ARL DEL PERSONAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de remitir la afiliación a ARL del personal que laborará el dia de hoy 30/12/2024 en las instalaciones objeto del contrato de la referencia

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
-Se adjuntan afiliaciones ARL

AFILIACIONES ARL

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	15	31/12/2024	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:55:59 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JADER DE JESUS
CHAVEZ CANCHILA
1100622659

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	14	31/12/2024	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:49:51 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LEONARDO JOSE
ESCAÑO LOPEZ
1100543948

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA idenəficado con CC No. 1102876220, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 14/06/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO Clase de Riesgo: 5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emiəda en este cerəficado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022655922.

Esta cerəficación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

CORRESPONDENCIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CORRESPONDENCIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

Solicitud de inicio de actividades propias del contrato MC 22 DE 2024 y aporte de personal mínimo requerido contrato MC 24 DE 2024

1 mensaje

Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co> 28 de diciembre de 2024, 12:13
Para: "ingenorteconstruccionessas@gmail.com" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>

Buenos días, 28 de diciembre del 2024
Señor:
OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Cordial saludo,

Por la presente, se solicita al contraəsta encargado de la interventoría del contrato MC 24 de 2024 que, una vez firmado el acta de inicio del presente contrato, se compromeəó a proporcionar el personal mínimo requerido según lo esəpulado en la invitación pública. Hasta la fecha, no se ha informado acerca del personal asignado para llevar a cabo el control y seguimiento de las acəvidades correspondientes al contrato de obra MC 22 de 2024. A conənuación los requisitos mínimos requeridos son:

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO DE LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION
Para garanãa de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contraəsta seleccionado, esta Enədad requiere que cuente con el personal idóneo para garanəzar una adecuada ejecución del objeto y de las obligaciones pactadas en este. En todo caso el contraəsta deberá acreditar que cuenta con el siguiente perfil profesional y con los respecəvos requerimientos mínimos que se citan:

CARGO	***REQUISITOS***
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (1)	• *Poseer ãtulo profesional en Ingeniería Civil o arquitectura.* • *Experiencia general: diez (10) años a parər de la expedición de la tarjeta profesional como ingeniero civil o arquitectura.* • *Experiencia específica: Deberá acreditar mínimo tres (3) contratos de experiencia como director de interventoría con objetos de construcción, mantenimiento, adecuaciones o reparaciones locaəvas y/o no menor a tres (3) contratos en la dirección de interventoría con objeto igual o similar a la de esta contratación.* • *Dedicación 50%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento, y en general cuando la Enədad lo requiera y hasta la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.*
CARGO	***REQUISITOS***
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1)	• *Poseer ãtulo profesional en Ingeniería Civil o arquitecto.* • *Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a seis (06) años, contados a parər de la fecha de la matricula profesional.* • *Experiencia específica: Acreditar experiencia laboral como director o residente de interventoría en mínimo tres (3) contratos, con objeto igual y/o similar a la de esta contratación.*

	• *Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento y en general cuando la Enədad lo requiera y hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.*

CARGO	***REQUISITOS***
SISO (1)	• *Tecnólogo o Técnico en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente; y/o estudios superiores que cuente con posgrado en SST, con licencia en SST vigente.* • *Experiencia general: Experiencia no menor a cuatro (04) años contados a parər de la fecha de grado como técnico o tecnólogo y/o dos (04) años para estudios superiores desde la especialidad.* • *Experiencia específica: acreditar experiencia laboral verificable como SISO (Técnico, tecnólogo o profesional) en áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto o alcance contemple acəvidades iguales y/o similares al del presente proceso.* • *Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento y en general cuando la Enədad lo requiera y hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.*

Cerəficación de compromiso de aporte de personal:

A. COMPROMISO DE PERSONAL

SAN JUAN DE BETULIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

SEÑORES

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Área Administrativa
Calle 22 Nº 16-40 Torre B piso 1
Sincelejo – Sucre

REFERENCIA: COMPROMISO DE PERSONAL MINIMA CUANTIA MC No. 24 DE 2024

Nosotros los suscritos **ZULLY ESPERANZA GUEVARA ARROYO EN REPRESENTACION DE INGENORTE CONSTUCCIONES S.A.S. CON NIT. 901752114-6,** me comprometo a que en caso de ser adjudicatario a la firma del acta de inicio pondremos al servicio del contrato el personal mínimo ofertado en nuestra propuesta y que además dispondremos en caso de ser necesario de personal adicional con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

ZULLY ESPERANZA GUEVARA ARROYO
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Asimismo, se solicita al responsable de la interventoría que realice el requerimiento correspondiente al contraəsta de obra JEMAD INGENIERÍA S.A.S., para que proceda con el inicio inmediato de las acəvidades previstas en el contrato. Se ha observado que, a pesar de haber transcurrido seis (6) días calendario desde el inicio del plazo esəpulado, no se ha evidenciado avance en la ejecución de las mismas. Este retraso resulta preocupante, especialmente considerando que las prorrogas de ambos contratos se formalizarán a parər del 1 de enero de 2025. Es imprescindible que las acəvidades en campo inicen lo antes posible, a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta ejecución del proyecto.

Atentamente;

Francy Hernandez
Supervisora del contrato MC 24 DE 2024.

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Ingeniera
Dirección Seccional de Administración Judicial
Oficina de Contratación.
Sincelejo – Sucre.
PBX: (5) 2754780 Ext. 1110
Celular: 301-304-1331

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

San Juan de Betulia, 28 de Diciembre de 2024

Señores
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
JEMAD INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO JM-002-MC22-2024

ASUNTO: AVAL DE PRORROGA

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, revisada la solicitud emitida por el contratista JEMAD INGENIERIA S.A.S. en el oficio con código de la referencia, expresamos que dicha solicitud de prorroga se ajusta a la realidad de la época de ejecución del proyecto por lo tanto esta interventoría AVALA las programaciones presentadas y las solicitud de prórroga, dándole traslado al ente contrante para su respectiva aprobación y legalización de la modificación numero 1.

Se anexa oficios y programación

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 27 de diciembre de 2024

JM-001-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: ENTREGA DE PROGRAMACIÓN INICIAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal del JEMAD INGENIERIA S.A.S, para radicar la programación inicial, documentación que hace parte integral del presente contrato.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
- Se anexa programación de actividades


JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES				$ 76,658,982.00	9 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24
2		TORRE GENTIUM - 7MO PISO - SALA DE AUDIENCIA No.1 Y SALA DE AUDIENCIA No.2 - PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO				$ 76,658,982.00	9 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24
3	1	Sala de a d!e"#!a$ No. 1				%&2'( ) 7'7(1.((	9 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24
4	1.(1	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24
5	1.(2	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,413.85	$ 1,324,139.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
6	1.(&	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12 !1x12N!1x12" # $2 600%	& '	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
7	1.(*	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	& '	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
	1.(+	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110(sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
!	1.( )	Suministro e instalacion de tomacorriente re)ulado doble a 120(sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
1"	1.(7	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
11	1.(,	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
12	1.(-	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco *nc+o, 0,-.mts /,2,0.mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
13	1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en (idrio▯	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
14	1.11	&antenimiento de puerta met1lica de acceso a dependencias incluye ni(elaci2n, a▯ustes y lubricaci2n de bisa)ra y▯o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
15	1.12	Suminstro e instalacion de punto de (o5 y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
16	1.1&	Suministro e instalacion de cable U"6 C*" 6	m '	700	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
17	1.1*	Suministro e instalacion tuber▯a conduit 1▯ para cable U"6 datos▯	m '	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
1	1.1+	Suministro e instalacion de (idrio para recibidor con altura de 1,10 mts: anc+o de 2,20mts y 1cm de espesor: soportado por 7 parales de 1,70 mts en tuberia de acero inoxidable▯	m2	7	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
1!	1.1)	' e(ante de muro en dry ; all, incluye estructura metalica, pintura a 7 manos en ambas caras▯	m2	24	$ 153,620.39	$ 3,686,890.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
2"	1.17	Suministro e instlacion de piedra en)ranito pulido para recepci2n, con un anc+o de 0,4.mts▯	m '	7	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
21	1.1,	Suministro e instalaci2n de se<ali5aci2n institucional aproximadamente de 0▯70m x 0▯70m▯ impresi2n di)ital en (inilo ad+esi(o plasti-icado sobre acr▯lico de 2 && de)rosor, en alta resoluci2n incluye cinta y doble -a5 para instalaci2n o sistemas de -▯aci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24

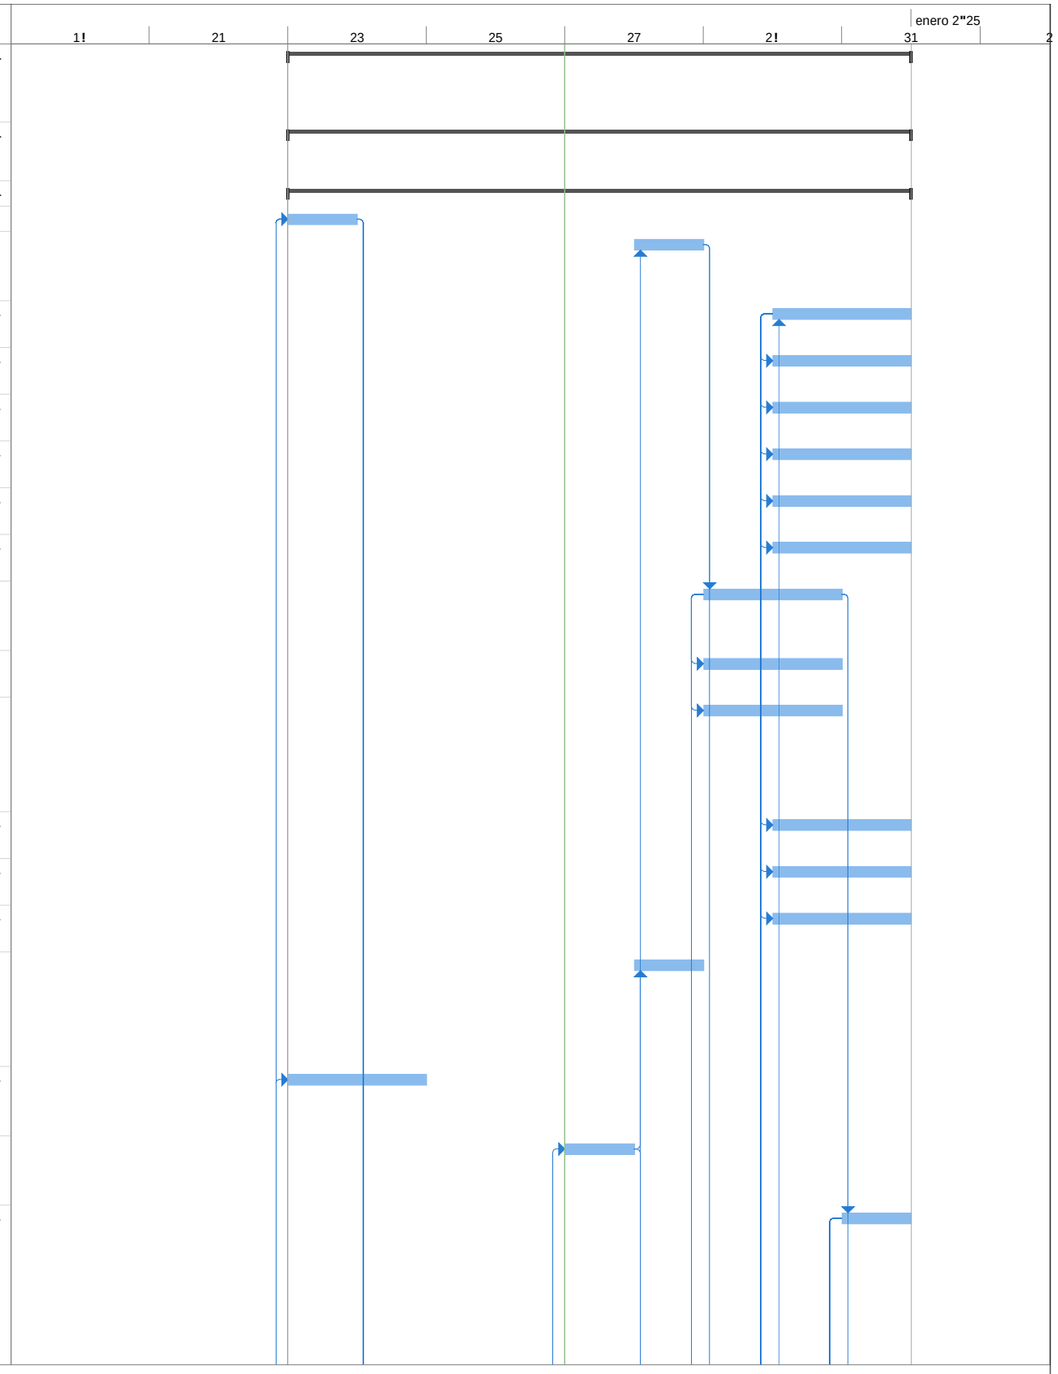

-ro(ecto▯ 1D2CU1Cl3N24 52N#lU6
-ro.ramacion de obra

#area	&esumen inacti$o	#areas e*ternas	#area de resumen de 'redecesor de ruta de acceso
Di$isión	#area manual	%ito e*terno	#area normal de 'redecesor de ruta de acceso
%ito	solo duración	Fec+a l,mite	-ro.reso
&esumen	In)orme de resumen manual	#area +ito de sucesor de ruta de acceso	-ro.reso manual
&esumen del 'ro(ecto	&esumen manual	#area de resumen de sucesor de ruta de acceso	
#area inacti$a	solo el comienzo	#area normal de sucesor de ruta de acceso	
%ito inacti$o	solo)in	#area +ito de 'redecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
22	1.1-	'e(ante de muro en mamposteria 0,0- m para mes2n de recibo >incluye ancla?e con epoxico separados cada 40 cm, do(elas y acarreo interno de materiales?	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
23	1.2	%i)a de 0,2 .@0,0- mts sobre muro para meson de recibo >icluye acero de re=uer5o?	m'	.	$ 82,910.70	$ 414,553.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
24	1.21	6a<ete en mortero 1,4 para muros en mamposteria para mes2n de recibo >incluye acarreo interno de materiales en obra?	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
25	1.22	Bstuco acrilico en muros para meson de recibo >incluye acarreo interno de materiales?	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
26	1.2&	6intura (inilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pa<ete o estuco incluye suministro, limpie5a, y todos los elementos necesario para su correcta e?ecucion	m2	C0	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	2 días	sáb 28/12/24	dom 29/12/24
27	1.2*	Construcci2n 52calo en porcelanato anc+o 8 cm@	m'	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
2	1.2+	Construccion de ilos y %anos para 6uertas y mesones incluye 6a<ete@	m'	-	$ 65,390.84	$ 588,518.00	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
2!	1.2)	6intura para interiores sobre cielo raso, color se)Dn elecci2n@	m2	.C	$ 16,472.46	$ 938,930.00	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
3"	1.27	&antenimiento de cielo raso en dry ; all, incluye todos los elementos necesarios para su correcta e?ecuci2n@	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
31	1.2,	Suministro e instalaci2n de esmerilado para puertas de (idrio@	m2	7	$ 53,187.24	$ 159,562.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
32	1.2-	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera E / recubierta en melamina, incluye tres pelda<os y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
33	1.&1	6ersianas tipo blacF$out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
34	2	Sala de a d!e"#!a$ No. 2			$ -	$ 32,067,835.00	9 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24
35	1.(1	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24
36	1.(2	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,424.25	$ 1,324,242.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
37	1.(&	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12 !1x12N!1x12" # $2 600%	& '	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
3	1.(*	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	& '	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
3!	1.(+	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110(sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
4"	1.( )	Suministro e instalacion de tomacorriente re)ulado doble a 120(sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
41	1.(7	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
42	1.(,	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
43	1.(-	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco *nc+o, 0,-.mts /,2,0.mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
44	1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en (idrio@	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24

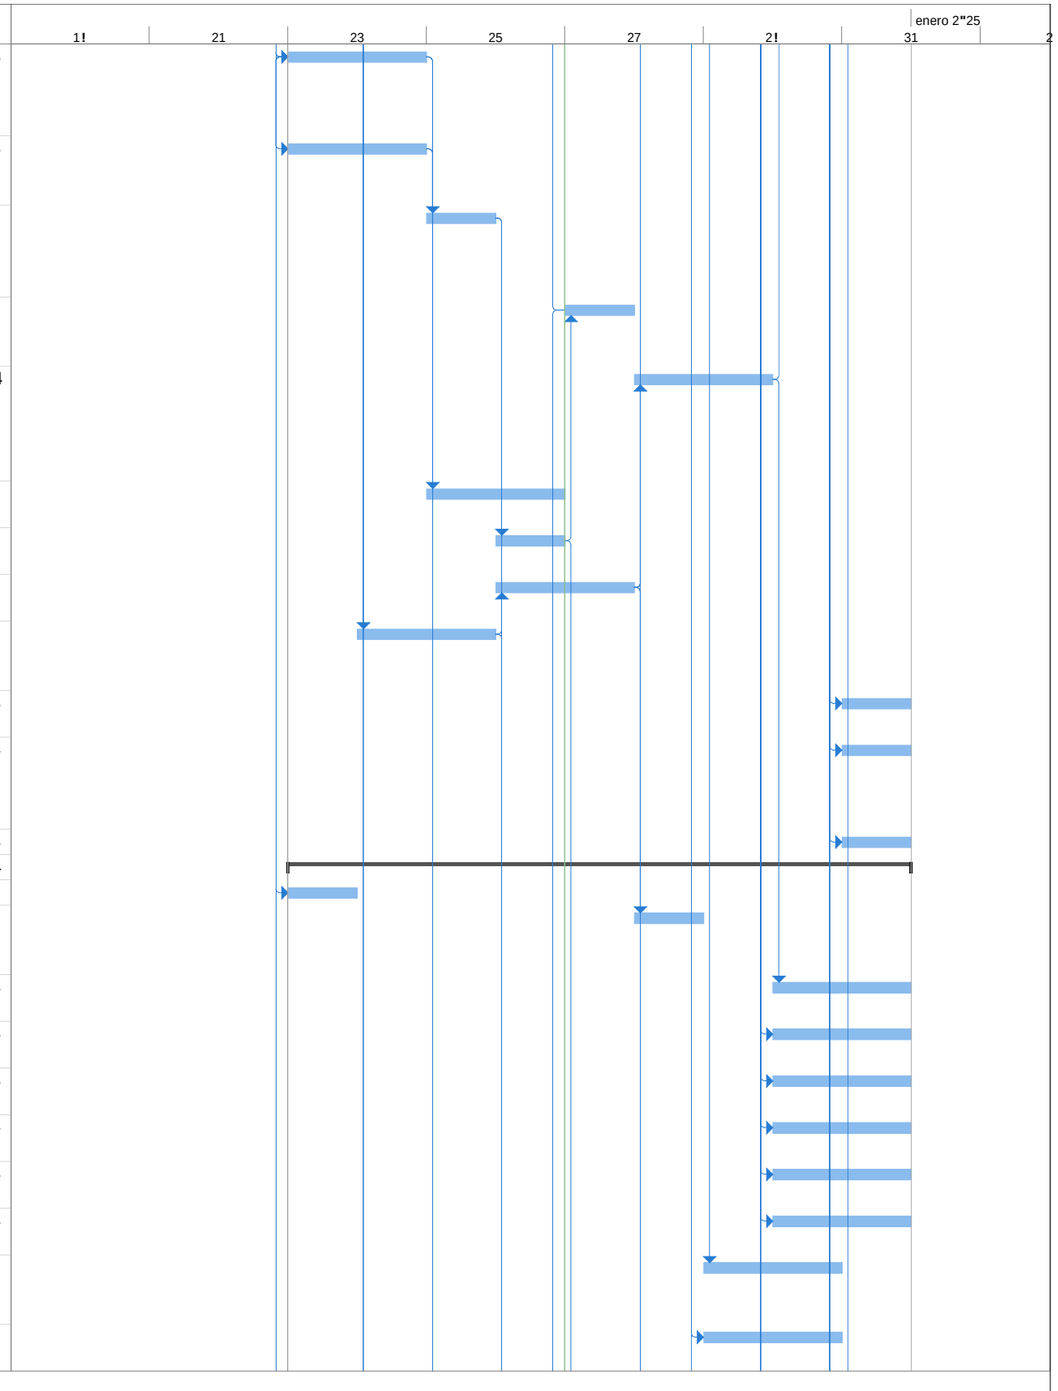

-ro(ecto@ 1D2CU1Cl3N24 52N#lU6
-ro.ramacion de obra

#area	&esumen inacti$o	#areas e*ternas	#area de resumen de 'redecesor de ruta de acceso
Di$isión	#area manual	%ito e*terno	#area normal de 'redecesor de ruta de acceso
%ito	solo duración	Fec+a l,mite	-ro.reso
&esumen	In)orme de resumen manual	#area +ito de sucesor de ruta de acceso	-ro.reso manual
&esumen del 'ro(ecto	&esumen manual	#area de resumen de sucesor de ruta de acceso	
#area inacti$a	solo el comienzo	#area normal de sucesor de ruta de acceso	
%ito inacti$o	solo)in	#area +ito de 'redecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45	1.11	&antenimiento de puerta met1lica de acceso a dependencias incluye ni(elaci2n, a2ustes y lubricaci2n de bisa)ra y4o rodamientos0	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
46	1.12	Suminstro e instalacion de punto de (o5 y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
47	1.1&	Suministro e instalacion de cable U" 6 C*" 6	m'	700	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
4	1.1*	Suministro e instalacion tuber0a conduit 19 para cable U" 6 datos0	m'	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
4!	1.1+	Suministro e instalacion de (idrio para recibidor con altura de 1,10 mts: anc+o de 2,20mts y 1cm de espesor: soportado por 7 parales de 1,70 mts en tuberia de acero inoxidable0	m2	7	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
5"	1.1)	'e(ante de muro en dry ; all, incluye estructura metalica, pintura a 7 manos en ambas caras0	m2	24	$ 153,621.69	$ 3,686,921.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
51	1.17	Suministro e instlacion de piedra en)ranito pulido para recepci2n, con un anc+o de 0,4 . mts0	m'	7	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
52	1.1,	Suministro e instalaci2n de se<ali5aci2n institucional aproximadamente de 0070m x 0070m0 impresi2n di)ital en (inilo ad+esi(o plasti=icado sobre acr0lico de 2 && de)rosor, en alta resoluci2n incluye cinta y doble =a5 para instalaci2n o sistemas de =i0aci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
53	1.1-	'e(ante de muro en mamposteria 0,0- m para mes2n de recibo >incluye ancla2e con epoxico separados cada 40 cm, do(elas y acarreo interno de materiales?	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
54	1.2	%i)a de 0,2 . @0,0- mts sobre muro para meson de recibo >icluye acero de re=uer5o?	m'	.	$ 82,910.70	$ 414,553.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
55	1.21	6a<ete en mortero 1,4 para muros en mamposteria para mes2n de recibo >incluye acarreo interno de materiales en obra?	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
56	1.22	Bstuco acrilico en muros para meson de recibo >incluye acarreo interno de materiales?	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
57	1.2&	6intura (inilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pa<ete o estuco incluye suministro, limpie5a, y todos los elementos necesario para su correcta e2ecucion	m2	C0	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	2 días	sáb 28/12/24	dom 29/12/24
5	1.2*	Construcci2n 52calo en porcelanato anc+o 8 cm0	m'	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
5!	1.2+	Construccion de ilos y %anos para 6uertas y mesones incluye 6a<ete0	m'	-	$ 65,390.84	$ 588,518.00	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
6"	1.2)	6intura para interiores sobre cielo raso, color se)Dn elecci2n0	m2	.C	$ 16,472.46	$ 938,930.00	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
61	1.27	&antenimiento de cielo raso en dry ; all, incluye todos los elementos necesarios para su correcta e2ecuci2n0	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
62	1.2,	Suministro e instalaci2n de esmerilado para puertas de (idrio0	m2	7	$ 53,187.24	$ 159,562.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24

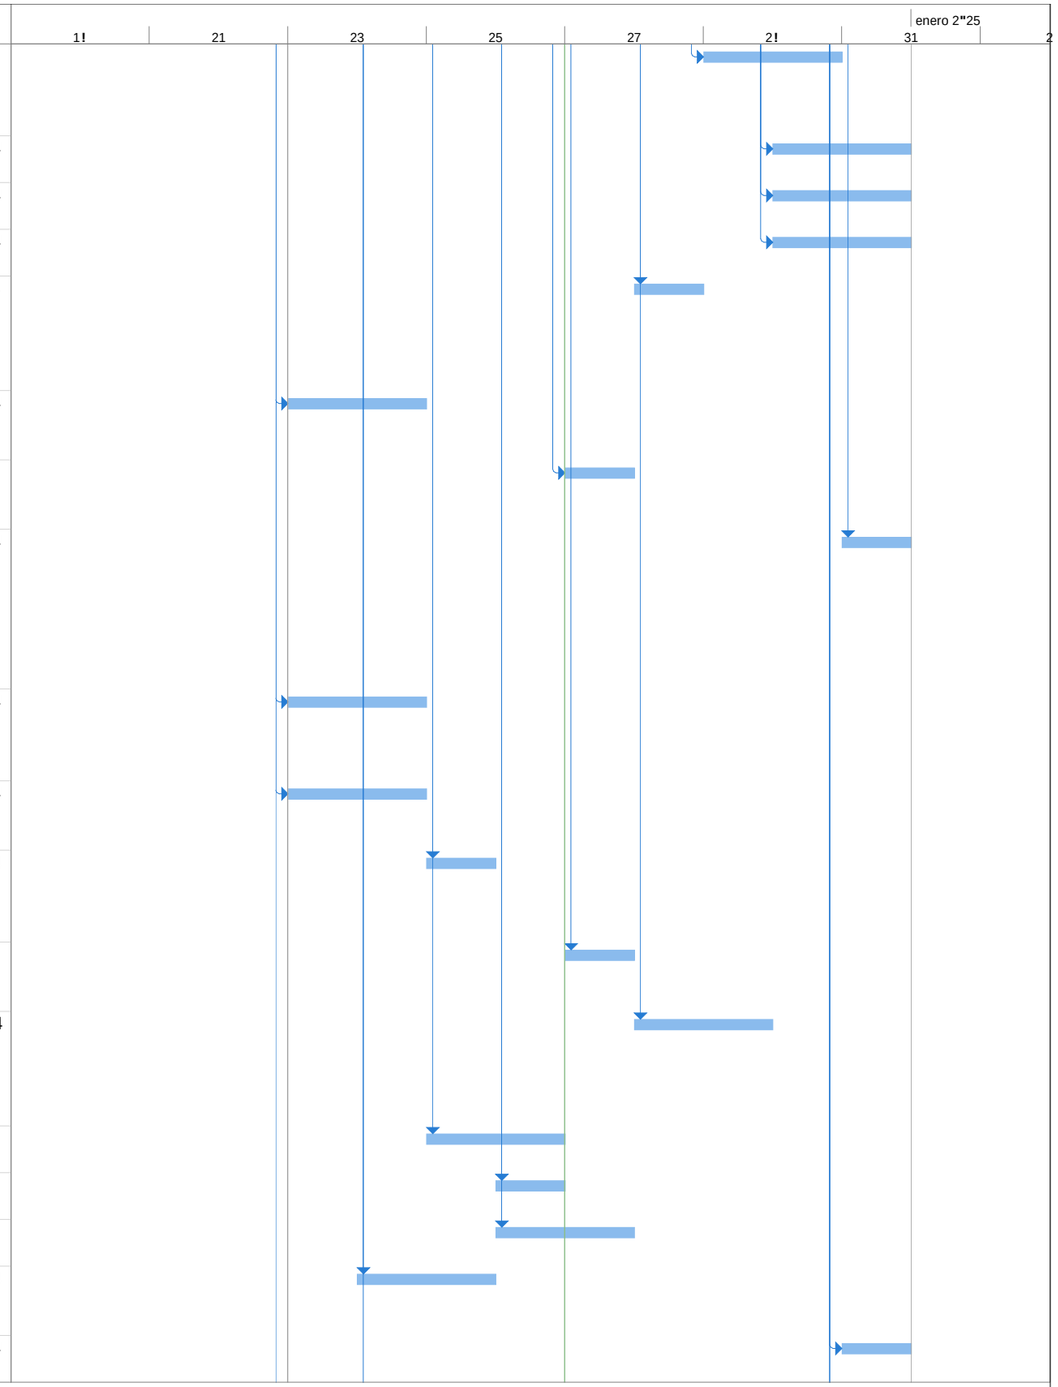

-ro(ecto0 1D2CU1CI3N24 52N#IU6
-ro.ramacion de obra

#area	&esumen inacti$o	#areas e*ternas	#area de resumen de 'redecesor de ruta de acceso
Di$isión	#area manual	%ito e*terno	#area normal de 'redecesor de ruta de acceso
%ito	solo duración	Fec+a l,mite	-ro.reso
&esumen	In)orme de resumen manual	#area +ito de sucesor de ruta de acceso	-ro.reso manual
&esumen del 'ro(ecto	&esumen manual	#area de resumen de sucesor de ruta de acceso	
#area inacti$a	solo el comienzo	#area normal de sucesor de ruta de acceso	
%ito inacti$o	solo)in	#area +ito de 'redecesor de ruta de acceso	

Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
63	1.2-	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera E / recubierta en melamina, incluye tres pelda<os y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
64	1.&1	6ersianas tipo blacF$out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
65	*	Ade# a#!o" e$ .ede$ de / o0 1 da2ɔ$ e" CUARTO DE RAC3				%2') 7, '7*, .((	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
66	*.1(	Suministro e instalacion de patc+ cord de 1 mts◊	UND	16	$ 30,960.59	$ 495,369.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
67	*.11	Suministro e instalaci2n de or)ani5ador de cables en el racF	UND	1	$ 75,328.12	$ 75,328.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
6	*.12	Suministro e instalacion de patc+ panel 24 puertos cate)oria 6	UND	1	$ 528,792.54	$ 528,793.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
6!	*.1&	Suministro e instalaci2n de SW"C / 24 puertos	UND	1	$ 1,436,025.47	$ 1,436,025.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
7"	*.1*	Suministro e instalaci2n de multitoma racFeable de 8 ser(icios◊	UND	1	$ 143,232.19	$ 143,233.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
71	+	Ade# a#!o" e$ de #a4leado $al!e" 2ɔ$ de #o5 6 2ado.e$ To..e Ge" 2 5			$ -	$ 4,367,100.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
72	+.1(	Suministro e instalacion de or)ani5ador de cables en espiral	UND	100	$ 43,671.00	$ 4,367,100.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
73		PLAN D ! AN "# A ! $% N&AL				%+'* 77'+- , .((	9 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24

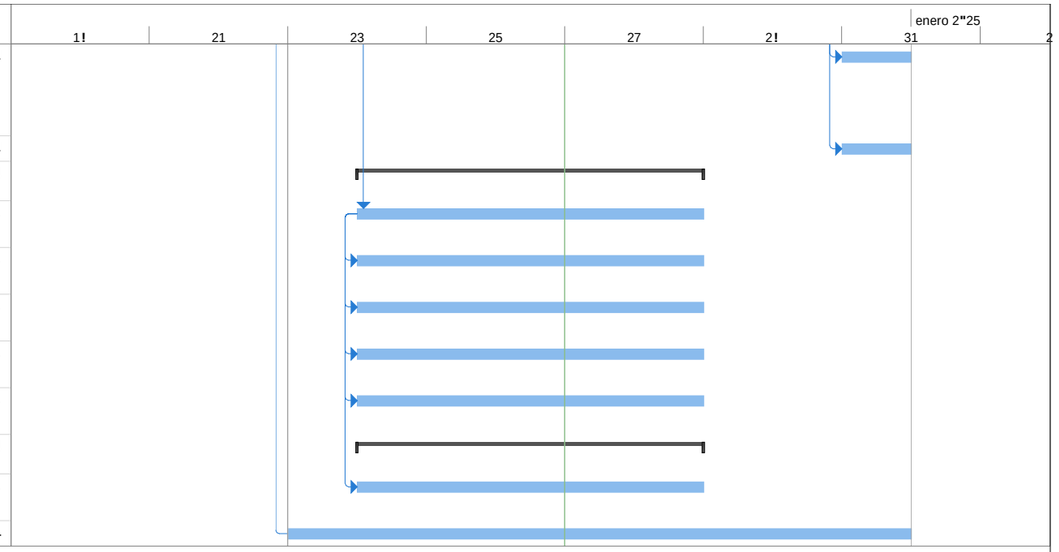

-ro(ecto‼ 1D2CU1CI3N24 52N#IU6
-ro.ramacion de obra

#area		&esumen inacti$o		#areas e*ternas		#area de resumen de 'redecesor de ruta de acceso	
Di$isión		#area manual		%ito e*terno		#area normal de 'redecesor de ruta de acceso	
%ito		solo duración		Fec+a l,mite		-ro.reso	
&esumen		In)orme de resumen manual		#area +ito de sucesor de ruta de acceso		-ro.reso manual	
&esumen del 'ro(ecto		&esumen manual		#area de resumen de sucesor de ruta de acceso			
#area inacti$a		solo el comienzo		#area normal de sucesor de ruta de acceso			
%ito inacti$o		solo)in		#area +ito de 'redecesor de ruta de acceso			

Sincelejo, 27 de diciembre de 2024

JM-002-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal del JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la prorroga N°1, en la cual solicitamos la ampliación del plazo contractual por un mes calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento actual, es decir, desde el 31 de diciembre de 2024.

Esta solicitud se fundamenta en diversas circunstancias que han impactado el normal desarrollo de las actividades programadas dentro del contrato, comprometiendo nuestra capacidad para culminar la obra en el plazo originalmente estipulado; es decir, lo que comprendería nueve (9) días calendario. A continuación, se expone detalladamente las razones y fundamentos que justifican esta petición, con el propósito de asegurar la calidad y cumplimiento del objeto contractual:

1. Limitaciones en la adquisición de materiales durante la temporada navideña: Dado el acta de inicio 23 de diciembre del 2024, próximos al cierre del año, nos encontramos en una temporada en la que gran parte de los proveedores del sector construcción disminuyen y/o suspenden temporalmente sus actividades comerciales, como es característico en épocas navideñas, y reactivan parcialmente a mediados de enero. Esta situación ha dificultado la adquisición de materiales esenciales para la ejecución del proyecto, especialmente aquellos que cumplen con los estándares de calidad exigidos.

A pesar de nuestros esfuerzos para asegurar el suministro oportuno, la limitada disponibilidad en el mercado ha impactado el desarrollo de las actividades, obligándonos a reajustar los tiempos y procedimientos previstos en la planificación inicial.

2. La temporada navideña también ha generado una disminución en la disponibilidad del personal de obra, dada la naturaleza cultural y social de esta época, en la que tradicionalmente se presentan ausencias y una menor productividad en los trabajadores del sector construcción. Si bien hemos implementado estrategias para mitigar estos efectos, no se ha podido compensar el impacto en el cronograma de trabajo.

Es importante destacar que, a pesar de las dificultades descritas, mantenemos nuestro firme compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tanto en términos de plazos como de calidad. Sin embargo, consideramos sean comprendidas estas causales y se amplíe el plazo en un (1) mes calendario; es decir, hasta 31 de enero de 2025, de tal manera que este tiempo nos permita superar las circunstancias adversas señaladas, garantizando la ejecución completa, eficiente y de alta calidad del proyecto.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
- Se anexa reprogramación de actividades


JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES				$ 76,658,982.00	40 días	lun 23/12/24	vie 31/01/25
2		TORRE GENTIUM - 7MO PISO - SALA DE AUDIENCIA No.1 Y SALA DE AUDIENCIA No.2 - PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO				$ 76,658,982.00	40 días	lun 23/12/24	vie 31/01/25
3	1	Sala de a d!e"#!a$ No. 1				%&2'( ) 7'7(1.((	35 días	lun 23/12/24	dom 26/01/25
4	1.(1	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
5	1.(2	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,413.85	$ 1,324,139.00	4 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25
6	1.(&	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12 !1x12N!1x12" # $2 600%	& '	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
7	1.(*	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	& '	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
	1.(+	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110(sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
!	1.( )	Suministro e instalacion de tomacorriente re)ulado doble a 120(sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
1"	1.(7	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
11	1.(,	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
12	1.(-	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco *nc+o, 0,-.mts /,2,0.mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
13	1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en (idrio▯	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
14	1.11	&antenimiento de puerta met1lica de acceso a dependencias incluye ni(elaci2n, a▯ustes y lubricaci2n de bisa)ra y↓o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
15	1.12	Suminstro e instalacion de punto de (o5 y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
16	1.1&	Suministro e instalacion de cable U" 6 C*" 6	m '	700	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
17	1.1*	Suministro e instalacion tuber▯a conduit 1↓ para cable U" 6 datos▯	m '	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
1	1.1+	Suministro e instalacion de (idrio para recibidor con altura de 1,10 mts: anc+o de 2,20mts y 1cm de espesor: soportado por 7 parales de 1,70 mts en tuberia de acero inoxidable▯	m2	7	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	7 días	mié 15/01/25	mar 21/01/25
1!	1.1)	' e(ante de muro en dry ; all, incluye estructura metalica, pintura a 7 manos en ambas caras▯	m2	24	$ 153,620.39	$ 3,686,890.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
2"	1.17	Suministro e instlacion de piedra en)ranito pulido para recepci2n, con un anc+o de 0,4.mts▯	m '	7	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25
21	1.1,	Suministro e instalaci2n de se<ali5aci2n institucional aproximadamente de 0▯70m x 0▯70m▯ impresi2n di)ital en (inilo ad+esi(o plasti=icado sobre acr▯lico de 2 && de)rosor, en alta resoluci2n incluye cinta y doble =a5 para instalaci2n o sistemas de =i▯aci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25

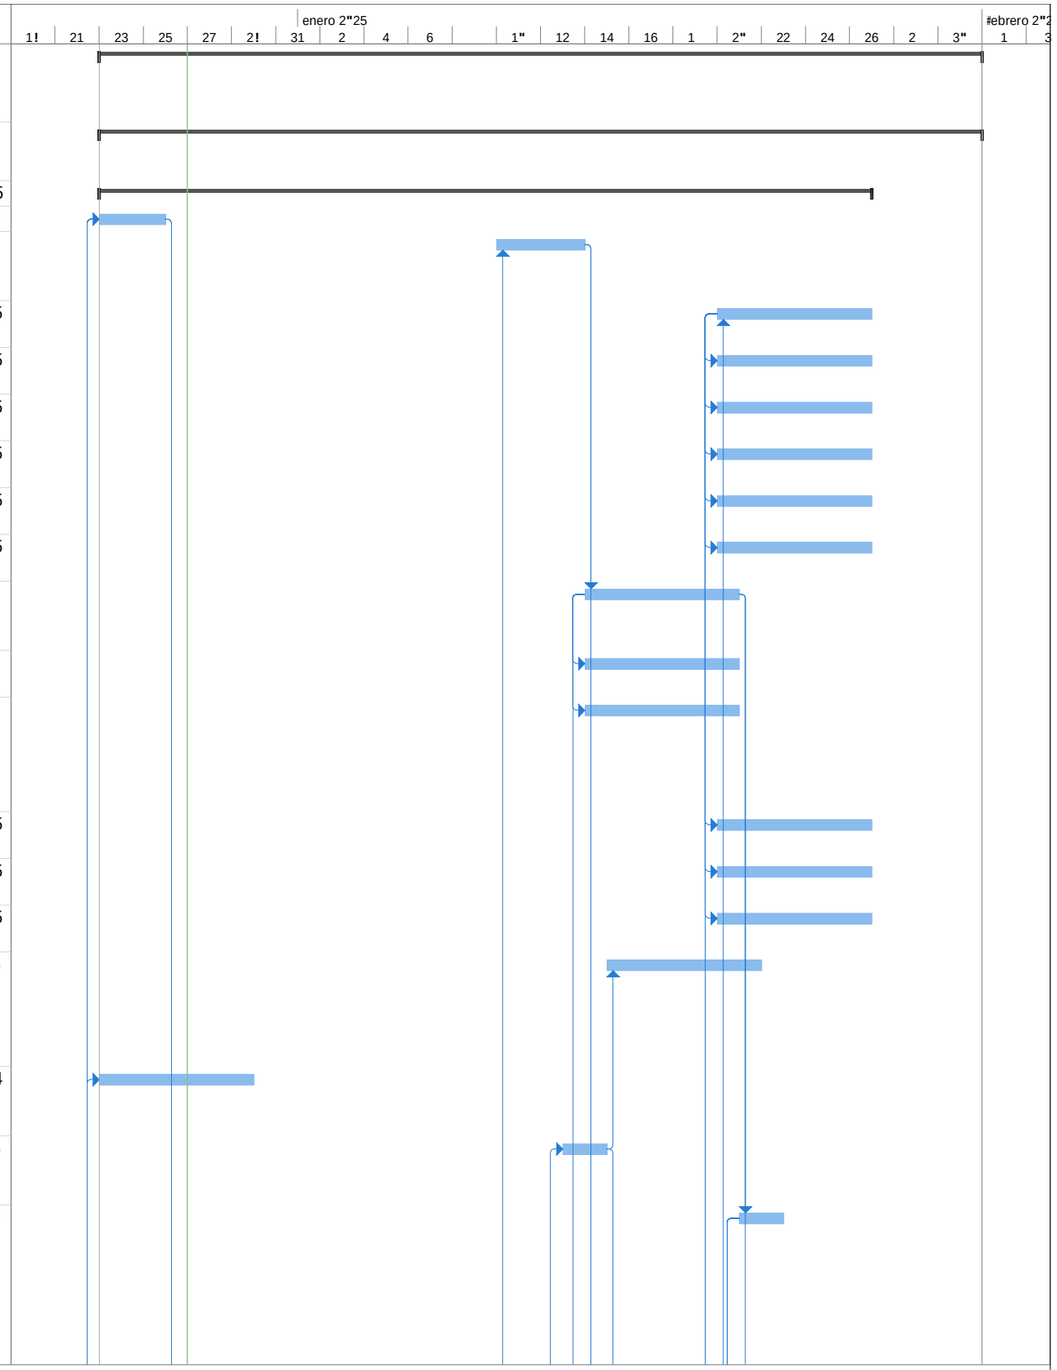

-ro)ecto▯ 1D2CU1CI3N24 52N$IU6
-ro.ramacion de obra 7 -rorro.a

$area	'esumen inacti%o	$areas e*ternas	$area de resumen de (redecesor de ruta de acceso
Di%isión	$area manual	&ito e*terno	$area normal de (redecesor de ruta de acceso
&ito	solo duración	Fec+a l,mite	-ro.reso
'esumen	In#orme de resumen manual	$area +ito de sucesor de ruta de acceso	-ro.reso manual
'esumen del (ro)ecto	'esumen manual	$area de resumen de sucesor de ruta de acceso	
$area inacti%a	solo el comienzo	$area normal de sucesor de ruta de acceso	
&ito inacti%o	solo #in	$area +ito de (redecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
22	1.1-	'e(ante de muro en mamposteria 0,0- m para mes2n de recibo >incluye ancla?e con epoxico separados cada 40 cm, do(elas y acarreo interno de materiales?	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
23	1.2	%i)a de 0,2 .@0,0- mts sobre muro para meson de recibo >icluye acero de re=uer5o?	m'	.	$ 82,910.70	$ 414,553.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
24	1.21	6a<ete en mortero 1,4 para muros en mamposteria para mes2n de recibo >incluye acarreo interno de materiales en obra?	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
25	1.22	Bstuco acrilico en muros para meson de recibo >incluye acarreo interno de materiales?	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	7 días	lun 13/01/25	dom 19/01/25
26	1.2&	6intura (inilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pa<ete o estuco incluye suministro, limpie5a, y todos los elementos necesario para su correcta e?ecucion	m2	C0	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	10 días	vie 10/01/25	dom 19/01/25
27	1.2*	Construcci2n 52calo en porcelanato anc+o 8 cm@	m'	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
2	1.2+	Construccion de ilos y %anos para 6uertas y mesones incluye 6a<ete@	m'	-	$ 65,390.84	$ 588,518.00	7 días	lun 6/01/25	dom 12/01/25
2!	1.2)	6intura para interiores sobre cielo raso, color se)Dn elecci2n@	m2	.C	$ 16,472.46	$ 938,930.00	10 días	mar 31/12/24	jue 9/01/25
3"	1.27	&antenimiento de cielo raso en dry ; all, incluye todos los elementos necesarios para su correcta e?ecuci2n@	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
31	1.2,	Suministro e instalaci2n de esmerilado para puertas de (idrio@	m2	7	$ 53,187.24	$ 159,562.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
32	1.2-	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera E / recubierta en melamina, incluye tres pelda<os y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
33	1.&1	6ersianas tipo blacF$out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25
34	2	Sala de a d!e"#!a$ No. 2			$ -	$ 32,067,835.00	35 días	lun 23/12/24	dom 26/01/25
35	1.(1	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
36	1.(2	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,424.25	$ 1,324,242.00	4 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25
37	1.(&	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12 !1x12N!1x12" # $2 600%	& '	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
3	1.(*	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	& '	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
3!	1.(+	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110(sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
4"	1.( )	Suministro e instalacion de tomacorriente re)ulado doble a 120(sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
41	1.(7	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
42	1.(,	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
43	1.(-	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco *nc+o, 0,-.mts /,2,0.mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
44	1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en (idrio@	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25

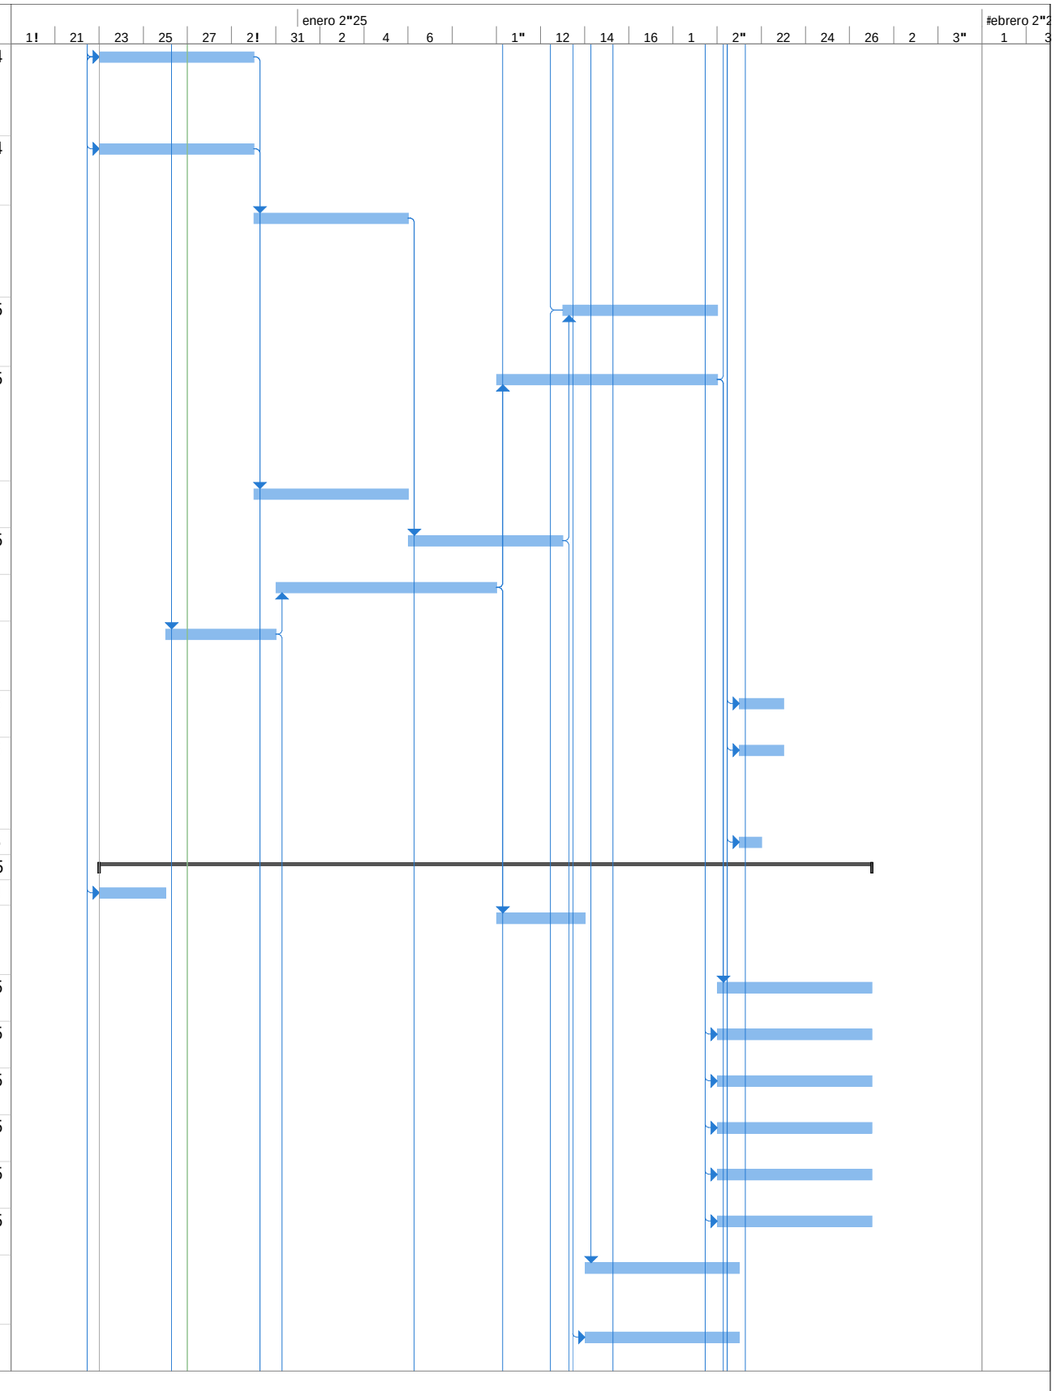

-ro)ecto@ 1D2CU1CI3N24 52N$IU6
-ro.ramacion de obra 7 -rorro.a

$area
Di%isión
&ito
'esumen
'esumen del (ro)ecto
$area inacti%a
&ito inacti%o
'esumen inacti%o
$area manual
solo duración
In#orme de resumen manual
'esumen manual
solo el comienzo
solo #in
$areas e*ternas
&ito e*terno
Fec+a l,mite
$area +ito de sucesor de ruta de acceso
$area de resumen de sucesor de ruta de acceso
$area normal de sucesor de ruta de acceso
$area +ito de (redecesor de ruta de acceso
$area de resumen de (redecesor de ruta de acceso
$area normal de (redecesor de ruta de acceso
-ro.reso
-ro.reso manual


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45	1.11	&antenimiento de puerta met1lica de acceso a dependencias incluye ni(elaci2n, a¿ustes y lubricaci2n de bisa)ra y¼o rodamientos▯	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
46	1.12	Suminstro e instalacion de punto de (o5 y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
47	1.1&	Suministro e instalacion de cable U" 6 C* " 6	m '	700	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
4	1.1*	Suministro e instalacion tuber▯a conduit 1⅑ para cable U" 6 datos▯	m '	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
4!	1.1+	Suministro e instalacion de (idrio para recibidor con altura de 1,10 mts: anc+o de 2,20mts y 1cm de espesor: soportado por 7 parales de 1,70 mts en tuberia de acero inoxidable▯	m2	7	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	7 días	mié 15/01/25	mar 21/01/25
5"	1.1)	' e(ante de muro en dry ; all, incluye estructura metalica, pintura a 7 manos en ambas caras▯	m2	24	$ 153,621.69	$ 3,686,921.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
51	1.17	Suministro e instlacion de piedra en)ranito pulido para recepci2n, con un anc+o de 0,4 . mts▯	m '	7	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25
52	1.1,	Suministro e instalaci2n de se<ali5aci2n institucional aproximadamente de 0▯70m x 0▯70m▯ impresi2n di)ital en (inilo ad+esi(o plasti=icado sobre acr▯lico de 2 && de)rosor, en alta resoluci2n incluye cinta y doble =a5 para instalaci2n o sistemas de =i▯aci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
53	1.1-	' e(ante de muro en mamposteria 0,0- m para mes2n de recibo >incluye ancla¿e con epoxico separados cada 40 cm, do(elas y acarreo interno de materiales?	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
54	1.2	%i)a de 0,2 . ▯0,0- mts sobre muro para meson de recibo >icluye acero de re=uer5o?	m '	.	$ 82,910.70	$ 414,553.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
55	1.21	6a<ete en mortero 1,4 para muros en mamposteria para mes2n de recibo >incluye acarreo interno de materiales en obra?	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
56	1.22	Bstuco acrilico en muros para meson de recibo >incluye acarreo interno de materiales?	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	7 días	lun 13/01/25	dom 19/01/25
57	1.2&	6intura (inilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pa<ete o estuco incluye suministro, limpie5a, y todos los elementos necesario para su correcta e¿ecucion	m2	C0	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	10 días	vie 10/01/25	dom 19/01/25
5	1.2*	Construcci2n 52calo en porcelanato anc+o 8 cm▯	m '	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
5!	1.2+	Construccion de ilos y %anos para 6uertas y mesones incluye 6a<ete▯	m '	-	$ 65,390.84	$ 588,518.00	7 días	lun 6/01/25	dom 12/01/25
6"	1.2)	6intura para interiores sobre cielo raso, color se)Dn elecci2n▯	m2	.C	$ 16,472.46	$ 938,930.00	10 días	mar 31/12/24	jue 9/01/25
61	1.27	&antenimiento de cielo raso en dry ; all, incluye todos los elementos necesarios para su correcta e¿ecuci2n▯	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
62	1.2,	Suministro e instalaci2n de esmerilado para puertas de (idrio▯	m2	7	$ 53,187.24	$ 159,562.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25

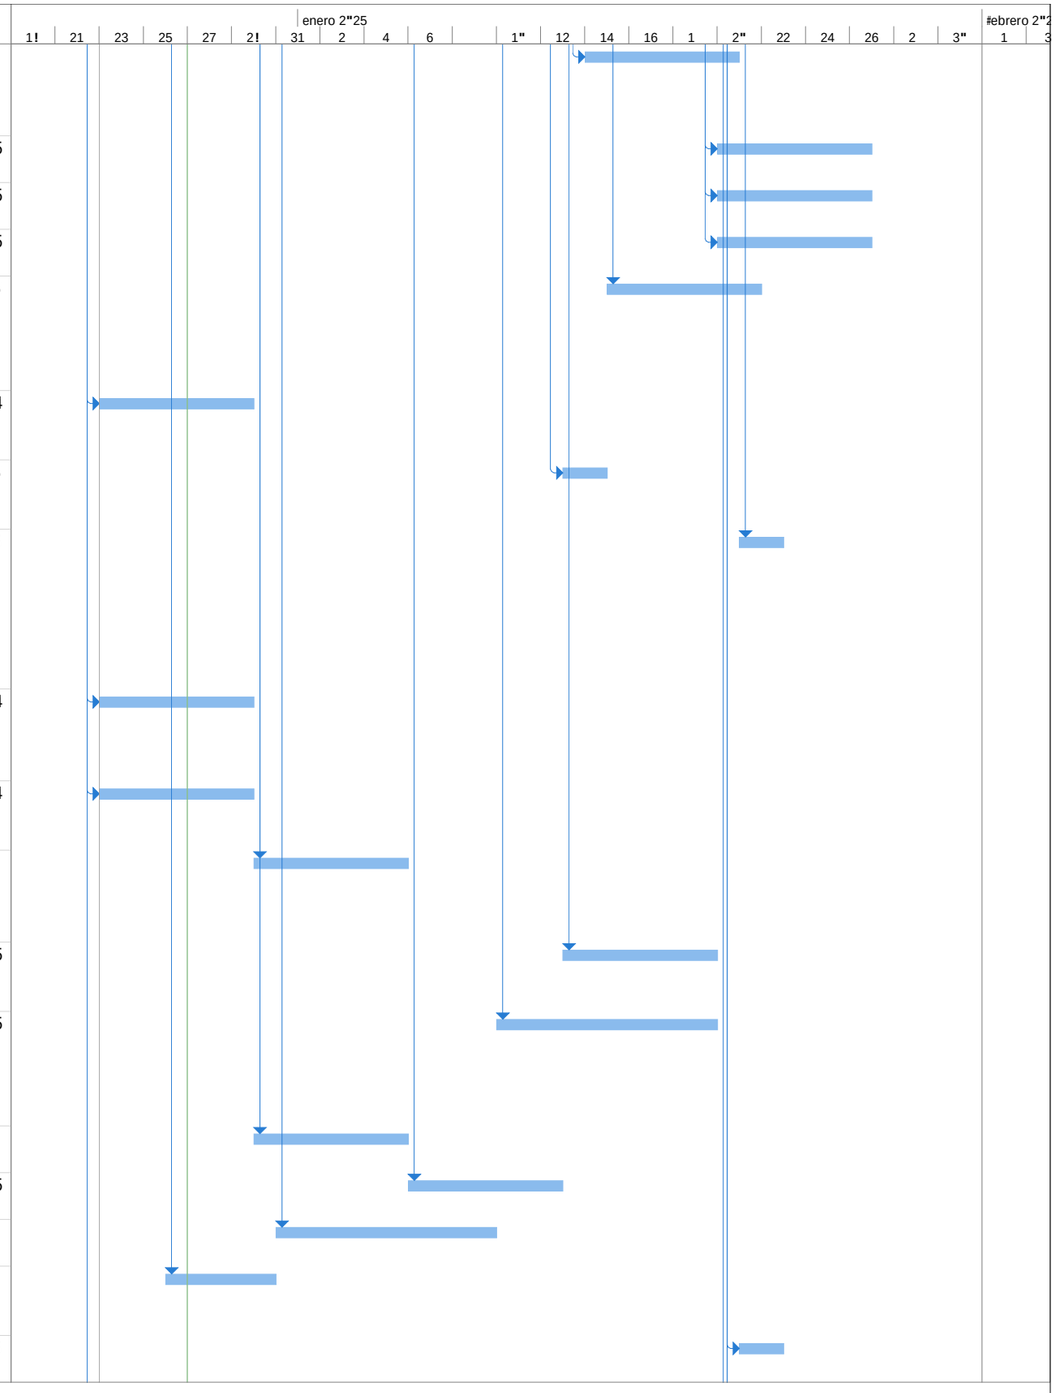

-ro)ecto▯ 1D2CU1CI3N24 52N$IU6
-ro.ramacion de obra 7 -rorro.a

$area	' esumen inacti%o	$areas e*ternas	$area de resumen de (redecesor de ruta de acceso
Di%isión	$area manual	&ito e*terno	$area normal de (redecesor de ruta de acceso
&ito	solo duración	Fec+a l,mite	-ro.reso
' esumen	In=orme de resumen manual	$area +ito de sucesor de ruta de acceso	-ro.reso manual
' esumen del (ro)ecto	' esumen manual	$area de resumen de sucesor de ruta de acceso
$area inacti%a	solo el comienzo	$area normal de sucesor de ruta de acceso
&ito inacti%o	solo =in	$area +ito de (redecesor de ruta de acceso

Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
63	1.2-	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera E / recubierta en melamina, incluye tres pelda<os y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
64	1.&1	6ersianas tipo blacF$out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25
65	*	Ade# a#!o"e$ .ede$ de / o0 1 da2ɔ$ e" CUARTO DE RAC3				%2') 7, '7*, .((	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
66	*.1(	Suministro e instalacion de patc+ cord de 1 mts◊	UND	16	$ 30,960.59	$ 495,369.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
67	*.11	Suministro e instalaci2n de or)ani5ador de cables en el racF	UND	1	$ 75,328.12	$ 75,328.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
6	*.12	Suministro e instalacion de patc+ panel 24 puertos cate)oria 6	UND	1	$ 528,792.54	$ 528,793.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
6!	*.1&	Suministro e instalaci2n de SW"C / 24 puertos	UND	1	$ 1,436,025.47	$ 1,436,025.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
7"	*.1*	Suministro e instalaci2n de multitoma racFeable de 8 ser(icios◊	UND	1	$ 143,232.19	$ 143,233.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
71	+	Ade# a#!o"e$ de #a4leado $al!e"2ɔ$ de #o5 6 2ɔdo.e$ To..e Ge"2 5			$ -	$ 4,367,100.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
72	+.1(	Suministro e instalacion de or)ani5ador de cables en espiral	UND	100	$ 43,671.00	$ 4,367,100.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
73		PLAN ! "AN!#$ A "%!N'AL				%+'*77'+-,.((	40 días	lun 23/12/24	vie 31/01/25

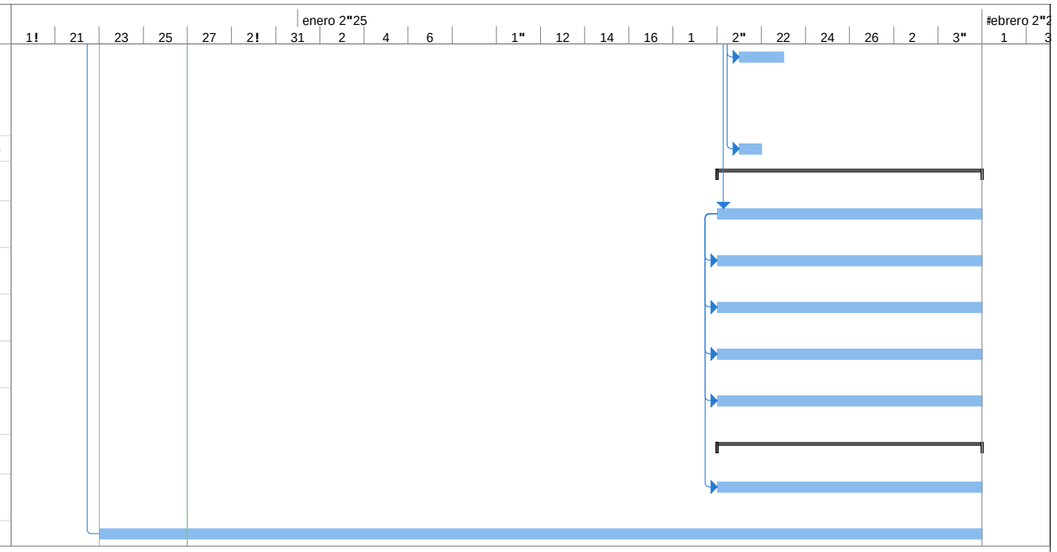

-ro)ecto⁞ 1D2CU1CI3N24 52N$IU6
-ro.ramacion de obra 7 -rorro.a

$area		'esumen inacti%o		$areas e*ternas		$area de resumen de (redecesor de ruta de acceso	
Di%isión		$area manual		&ito e*terno		$area normal de (redecesor de ruta de acceso	
&ito		solo duración		Fec+a l,mite		-ro.reso	
'esumen		In#orme de resumen manual		$area +ito de sucesor de ruta de acceso		-ro.reso manual	
'esumen del (ro)ecto		'esumen manual		$area de resumen de sucesor de ruta de acceso			
$area inacti%a		solo el comienzo		$area normal de sucesor de ruta de acceso			
&ito inacti%o		solo #in		$area +ito de (redecesor de ruta de acceso			

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-003-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización para el ingreso de los materiales para dar inicio a la ejecución de las actividades y de igual forma se nos indique el lugar asignado para el almacenamiento de estos.

Solicitamos pronta respuesta para dar inicio a las actividades el día de hoy 30 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-004-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 30 de diciembre de 2024 hasta el día 07 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

AFILIACIONES ARL

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-005-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: REMISIÓN DE AFILIACIONES A ARL DEL PERSONAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de remitir la afiliación a ARL del personal que laborará el dia de hoy 30/12/2024 en las instalaciones objeto del contrato de la referencia

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
-Se adjuntan afiliaciones ARL

AFILIACIONES ARL

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	15	31/12/2024	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:55:59 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JADER DE JESUS
CHAVEZ CANCHILA
1100622659

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	14	31/12/2024	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:49:51 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LEONARDO JOSE
ESCAÑO LOPEZ
1100543948

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA idenəficado con CC No. 1102876220, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 14/06/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO Clase de Riesgo: 5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emiəda en este cerəficado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022655922.

Esta cerəficación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

Sincelejo, 01 de enero de 2025

JM-006-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 02 de enero de 2025 hasta el día 07 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 03 de enero de 2025

JM-007-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización para el ingreso de materiales el día 04 de enero de 2025 entre las 7:30am y 12:00pm para la ejecución de las actividades

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 03 de enero de 2025

JM-008-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 04 de enero de 2025 hasta el día 13 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 07 de enero de 2025

JM-009-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CE-INC-MC_25_2024-002-2024 DE ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN OBRA

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de dar respuesta al oficio del asunto:

- El día 07 de enero de 2025, en horas de la mañana no se evidencia en obra el personal profesional Director de obra y Residente de obra, toda vez que los profesionales se encuentran realizando el balance de obra, cuya necesidad surgió del recorrido realizado el día 03 de enero de 2025 y 04 de enero de 2025, lo cual es de total conocimiento de la supervisión del contrato. Estas labores se están realizando en oficina toda vez que en obra no se cuenta con las condiciones optimas para llevarlas a cabo.

- Con respecto al área SISO, ya nos encontramos en las actividades de limpieza y adecuación de las áreas objeto de intervención

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 07 de enero de 2025

JM-010-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 08 de enero de 2025 hasta el día 20 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
YASBLEIDIS SOFIA HERNANDEZ CRUZ	1.101.124.236
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

Sincelejo, 07 de enero de 2025

JM-011-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 08 de enero de 2025 hasta el día 20 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
YASBLEIDIS SOFIA HERNANDEZ CRUZ	1.101.124.236
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 08 de enero de 2025

JM-012-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 08 de enero de 2025 hasta el día 20 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
YASBLEIDIS SOFIA HERNANDEZ CRUZ	1.101.124.236
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 09 de enero de 2025

JM-013-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 10 de enero de 2025 hasta el día 20 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	1.193.098.423

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 12 de enero de 2025

JM-014-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 13 de enero de 2025 hasta el día 20 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
YERALDINE CAMELO VERGARA	1.102.879.550
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	1.193.098.423

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 16 de enero de 2025

JM-016-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 17 de enero de 2025 hasta el día 27 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
YERALDINE CAMELO VERGARA	1.102.879.550
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934
AFETH PALENCIA	1.100.307.087
JULIO PALENCIA	1.102.866.132
DIEGO DAVILA	1.102.868.738
JOSIAS ROMERO	1.102.889.075
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	1.193.098.423
FERNEL MONTERROZA BUELVAS	1.102.823.335

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 20 de enero de 2025

JM-018-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 20 de enero de 2025 hasta el día 27 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
YERALDINE CAMELO VERGARA	1.102.879.550
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934
AFETH PALENCIA	1.100.307.087
JULIO PALENCIA	1.102.866.132
DIEGO DAVILA	1.102.868.738
JOSIAS ROMERO	1.102.889.075
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	1.193.098.423
JHANCAR LARA VERGARA	1.082.858.732
JAINER LOPEZ	1.102.842.875
FERNEL MONTERROZA BUELVAS	1.102.823.335

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 21 de enero de 2025

JM-019-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 22 de enero de 2025 hasta el día 27 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
FERNEL MONTERROZA BUELVAS	1.102.823.335
RAFAEL EDUARDO ARAUJO HERNANDEZ	1.005.419.648

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 27 de enero de 2025

JM-020-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

En el marco del cumplimiento de mis funciones como contratista de obra del contrato de la referencia, más específicamente el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado, y tomando como precedente las recomendaciones y solicitudes de la interventoría y la supervisión en cada una de las visitas técnicas; se llevó a cabo un análisis técnico para cada uno de los espacios descritos en los acuerdos del objeto, definiendo ítems y cantidades requeridas para llevar a cabo la ejecución de obras funcionales, de calidad y con una vida útil adecuada conforme a la necesidad de la entidad.

Dentro de las actividades requeridas para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, se identificaron ítems que no hacen parte del presupuesto oficial contrato, razón por la cual surgió la necesidad de realizar el respectivo análisis de precios unitarios, basado en un exhaustivo estudio de mercado para la regulación y determinación de los costos totales necesarios para la ejecución de cada uno; en ese orden de ideas dentro del balance de obra No. 1 adjunto a este oficio se encuentra cada ítem no previsto con su respectiva descripción, código de identificación, unidad y su valor unitario, aclarando de antemano que adjunto a este oficio encontrará también las respectivas memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, cotizaciones y especificaciones técnicas de los ítems nuevos.

Una vez identificadas las actividades y definidos los costos para el caso específico de los ítems nuevos, se llevó a cabo el balance presupuestal No. 1, basado en las cantidades identificadas en campo con sus respectivos costos unitarios, arrojando como resultado la necesidad de adicionar al contrato un valor equivalente a $27.161.462,00 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE).

Como consecuencia de las actividades adicionales descritas con anterioridad, para poder cumplir con la ejecución de las mismas, se requerirá un plazo adicional al plazo restante del contrato en la actualidad; por lo cual, una vez evaluados los tiempos con los rendimientos estimados al momento de la elaboración de la programación de obra, se determinó la necesidad de solicitar la adición de un total de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación actual del contrato.

En mi condición de contratista de obra, y con el principio que me caracteriza de entregar no solo obras de calidad, sino también obras totalmente funcionales, que le permitan a los usuarios sacar el mejor provecho de las mismas, en esta ocasión expreso mi compromiso por ejecutar el 100% del objeto contratado; por lo cual me permito elevar la presente solicitud de adición y prórroga, la cual se compone de diez (10) días calendarios, y un total de $27.161.462,00 adicionales en valor requeridos para la terminación exitosa del objeto contratado. A la presente se adjuntan los soportes requeridos para tal fin.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 28 de enero de 2025

JM-021-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 28 de enero de 2025 hasta el día 31 de enero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
JEINER JOSÉ FLOREZ RIVERO	1.102.848.292
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
RAFAEL EDUARDO ARAUJO HERNANDEZ	1.005.419.648

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 28 de enero de 2025

JM-022-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO JM-021-MC22-2024

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la firma interventora, INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS, en lo que respecta a la solicitud de adición y prórroga al contrato que fue solicitada por nuestra parte el día 27 de enero de 2025 mediante oficio JM-020-MC22-2024, me permito responder en los siguientes términos a cada una de las solicitudes realizadas por interventoría:

Solicitud 1: Anexar cámara de comercio de las empresas cotizantes que denoten que pueden ejecutar la actividad de suministrar materiales

Respuesta a solicitud 1: Se anexan las cámaras de comercio de cada una de las empresas cotizantes, haciendo la salvedad que en su revisión debe tener en cuenta que el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1258 de 2008 permite que las Sociedades por Acciones Simplificadas, por sus siglas SAS, pueden tener objeto social indeterminado, pudiendo realizar cualquier actividad lícita.

Solicitud 2: Revisar costos del NP-11 Salida de luminaria y justificación del precio de mano de obra.

Respuesta a solicitud 2: Una vez revisado el análisis de precio unitario del ítem NP-11 el cual inicialmente fue presentado por valor de $ 75.912,00, este fue revisado y ajustado y en el balance adjunto a este oficio se encuentra por valor de $ 62.910,00.

Solicitud 3: Revisar NP 10 y la necesidad de inclusión de este ítem comprendiendo que existe un ítem 1.27. Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.

Respuesta a solicitud 3: Una vez verificado el NP-10 se pudo corroborar que la actividad *NP-10 Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye reforzamiento de estructura metalica)* difiere del ítem *1.27. Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución* al tratarse el NP-10 de intervenciones puntuales para realizar resanes en donde se encontraban las luminarias, condición que indudablemente incrementa el costo de la mano de obra; adicionalmente, el NP-10 contempla el reforzamiento de la estructura metálica, aspecto que no es contemplado dentro del ítem 1.27; además, la unidad de medida para la ejecución del ítem 1.27 es el metro cuadrado considerando que esta actividad de forma predominante se realiza en amplias superficies con largo y ancho variable, sin embargo, por la naturaleza de las actividades a realizar con el ítem NP-10 las actividades serán realizadas en vanos de luminarias de 60x60cm, por lo que la unidad de medida predominante para su cuantificación no es el metro cuadrado sino la unidad de vano 60x60cm que sea intervenido, así las cosas no es posible cuantificar las actividades del ítem NP-10 dentro del ítem 1.27 al tratarse de actividades diferentes y con unidades de medida distintas. En lo que respecta al valor unitario del ítem, este inicialmente fue presentado por $77.160,83, sin embargo producto de la revisión y de lo solicitado por la interventoría el mismo fue ajustado y su valor unitario corresponde a $ 51.188,00.

Solicitud 4: Mostrar soportes NP-16 Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 con división.

Respuesta a solicitud 4: Su solicitud no es clara ni específica considerando que no indica textualmente a qué soportes hace referencia, sin embargo, la justificación de este ítem podrá encontrarla dentro del archivo denominado *Justificación de ítems nuevos* adjunto a este documento, así mismo también encuentra en los anexos el análisis de precio unitario y las respectivas cotizaciones.

Solicitud 5: Anexar acta de pactación de precios.

Respuesta a solicitud 5: Se anexa acta de pactación de precios debidamente diligenciada.

Solicitud 6: Anexar documentación en modificable y pdf.

Respuesta a solicitud 6: Se anexa documentación en modificable y pdf.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 28 de enero de 2025

JM-023-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

En el marco del cumplimiento de mis funciones como contratista de obra del contrato de la referencia, más específicamente el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado, y tomando como precedente las recomendaciones y solicitudes de la interventoría y la supervisión en cada una de las visitas técnicas; se llevó a cabo un análisis técnico para cada uno de los espacios descritos en los acuerdos del objeto, definiendo ítems y cantidades requeridas para llevar a cabo la ejecución de obras funcionales, de calidad y con una vida útil adecuada conforme a la necesidad de la entidad.

Dentro de las actividades requeridas para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, se identificaron ítems que no hacen parte del presupuesto oficial contrato, razón por la cual surgió la necesidad de realizar el respectivo análisis de precios unitarios, basado en un exhaustivo estudio de mercado para la regulación y determinación de los costos totales necesarios para la ejecución de cada uno; en ese orden de ideas dentro del balance de obra No. 1 adjunto a este oficio se encuentra cada ítem no previsto con su respectiva descripción, código de identificación, unidad y su valor unitario, aclarando de antemano que adjunto a este oficio encontrará también las respectivas memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, cotizaciones y especificaciones técnicas de los ítems nuevos.

Una vez identificadas las actividades y definidos los costos para el caso específico de los ítems nuevos, se llevó a cabo el balance presupuestal No. 1, basado en las cantidades identificadas en campo con sus respectivos costos unitarios, arrojando como resultado la necesidad de adicionar al contrato un valor equivalente a $26.143.745,00 (VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE).

Como consecuencia de las actividades adicionales descritas con anterioridad, para poder cumplir con la ejecución de las mismas, se requerirá un plazo adicional al plazo restante del contrato en la actualidad; por lo cual, una vez evaluados los tiempos con los rendimientos estimados al momento de la elaboración de la programación de obra, se determinó la necesidad de solicitar la adición de un total de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación actual del contrato.

En mi condición de contratista de obra, y con el principio que me caracteriza de entregar no solo obras de calidad, sino también obras totalmente funcionales, que le permitan a los usuarios sacar el mejor provecho de las mismas, en esta ocasión expreso mi compromiso por ejecutar el 100% del objeto contratado; por lo cual me permito elevar la presente solicitud de adición y prórroga, la cual se compone de diez (10) días calendarios, y un total de $26.143.745,00 adicionales en valor requeridos para la terminación exitosa del objeto contratado. A la presente se adjuntan los soportes requeridos para tal fin.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 29 de enero de 2024

JM-024-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA RETIRO DE MATERIALES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización de ingreso para retirar materiales sobrantes de la ejecución del contrato de la referencia

- 1 VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA: MHX 712
- ARTURO ROMERO REGINO
  C.C 92.516.436

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 29 de enero de 2025

JM-026-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

En el marco del cumplimiento de mis funciones como contratista de obra del contrato de la referencia, más específicamente el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado, y tomando como precedente las recomendaciones y solicitudes de la interventoría y la supervisión en cada una de las visitas técnicas; se llevó a cabo un análisis técnico para cada uno de los espacios descritos en los acuerdos del objeto, definiendo ítems y cantidades requeridas para llevar a cabo la ejecución de obras funcionales, de calidad y con una vida útil adecuada conforme a la necesidad de la entidad.

Dentro de las actividades requeridas para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, se identificaron ítems que no hacen parte del presupuesto oficial contrato, razón por la cual surgió la necesidad de realizar el respectivo análisis de precios unitarios, basado en un exhaustivo estudio de mercado para la regulación y determinación de los costos totales necesarios para la ejecución de cada uno; en ese orden de ideas dentro del balance de obra No. 1 adjunto a este oficio se encuentra cada ítem no previsto con su respectiva descripción, código de identificación, unidad y su valor unitario, aclarando de antemano que adjunto a este oficio encontrará también las respectivas memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, cotizaciones y especificaciones técnicas de los ítems nuevos.

Una vez identificadas las actividades y definidos los costos para el caso específico de los ítems nuevos, se llevó a cabo el balance presupuestal No. 1, basado en las cantidades identificadas en campo con sus respectivos costos unitarios, arrojando como resultado la necesidad de adicionar al contrato un valor equivalente a $25.314.090,00 (VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA PESOS M/CTE).

Como consecuencia de las actividades adicionales descritas con anterioridad, para poder cumplir con la ejecución de las mismas, se requerirá un plazo adicional al plazo restante del contrato en la actualidad; por lo cual, una vez evaluados los tiempos con los rendimientos estimados al momento de la elaboración de la programación de obra, se determinó la necesidad de solicitar la adición de un total de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación actual del contrato.

En mi condición de contratista de obra, y con el principio que me caracteriza de entregar no solo obras de calidad, sino también obras totalmente funcionales, que le permitan a los usuarios sacar el mejor provecho de las mismas, en esta ocasión expreso mi compromiso por ejecutar el 100% del objeto contratado; por lo cual me permito elevar la presente solicitud de adición y prórroga, la cual se compone de diez (10) días calendarios, y un total de $25.314.090,00 adicionales en valor requeridos para la terminación exitosa del objeto contratado. A la presente se adjuntan los soportes requeridos para tal fin.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 03 de febrero de 2025

JM-028-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del día 04 de febrero de 2025 hasta el día 10 de febrero de 2025 a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: TORRE GENTIUM DE SINCELEJO, con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JEINER JOSÉ FLOREZ RIVERO	1.102.848.292
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
RAFAEL URZOLA TORRES	1.102.796.640
ANDRÉS ALFONSO MARTINEZ TAMARA	1.005.603.747
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
BRAWDON ENRIQUE MEJIA LORA	1.102.887.133
RAFAEL EDUARDO ARAUJO HERNANDEZ	1.005.419.648

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de enero de 2024

JM-030-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA RETIRO DE LUMINARIAS DESMONTADAS

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización de ingreso para realizar el retiro y recolección de luminarias desmontadas.

- CONDUCTOR: EFRAÍN PICO NEGRETE
  CC 6890577
- AUXILIAR: CAMILO NEGRETE PASTRANA
  CC 1003435558
- VEHÍCULO CON PLACA: MXY 603

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 14 de febrero de 2024

JM-032-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA RETIRO DE RCD

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización de ingreso para realizar el retiro y recolección de RCD producto de ejecución del contrato de la referencia

- CONDUCTOR: RINCON CHAMORRO JUAN CAMILO
  CC 1102881098
- VEHÍCULO CON PLACA: VOLQUETA VQ2047 (PLACAS LKN-388)
- PERSONAL:
  ELDER ANDRE CHAMORRO MUÑOZ
  Cc:1102817522
  JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
  C.C 1.102.876.220
  JOSE DAVID BARBOSA OSORIO
  C.C1.010.128.187
  HENRY SAMUEL MUÑOZ
  1.103.121.299

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 17 de febrero de 2024

JM-034-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE INGRESO PARA ASEO GENERAL DE LA OBRA

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización de ingreso del personal que se relaciona en el presente oficio para realizar el aseo general de la obra el día 17 de febrero de 2024 en las instalaciones objeto del contrato.

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
C.C 1.102.876.220

HENRY SAMUEL MUÑOZ
C.C 1.103.121.299

JORGE JAIR MARTINEZ ATENCIA
C.C 1.102.816.109

JEINER JOSÉ FLOREZ RIVERO
C.C 1.102.848.292

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

San Juan de Betulia, 29 de enero de 2024

Señores
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
JEMAD INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO JM-020-MC22-2024

ASUNTO: AVAL DE PRORROGA NUMERO 2 Y ADICIONAL 1

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, identificada

Revisada la solicitud emitida por el contratista **JEMAD INGENIERIA S.A.S.** en el oficio con código de la referencia, expresamos que dicha solicitud de prorroga numero 2 y adicional numero 1 se ajusta a la realidad de ejecución del proyecto por lo tanto esta interventoría AVALA las programaciones presentadas, las solicitudes de prórroga y adicional presentadas, dándole traslado al ente contratante para su respectiva aprobación y legalización de la modificación número 2. Se anexa la siguiente información.

Reprogramación de obra
Cotizaciones
Especificaciones técnicas
Balance de obra número 1
Acta de pactacion de precios
Justificación de ítems no previstos

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. MC 22 DE 2024

5 mensajes

JEMAD INGENIERÍA <jemadingenieria@gmail.com> 27 de enero de 2025, 15:41
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>
Cc: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto lo del asunto

--
Atentamente;

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
INGENIERA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE DE OBRA 1.rar
7430K

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 28 de enero de 2025, 8:49
Para: JEMAD INGENIERÍA <jemadingenieria@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos dias comprendiendo su solicitud se hace necesario atender las siguientes observaciones :

1. Anexar camara de comercio de las empresas cotizantes que denoten que pueden ejecutar la actividad de suministrar materiales
2. revisar costos del NP-11 Salida de luminaria y justificacion de precio de mano de obra
3. Revisar NP 10 y la necesidad de inclucion de este item comprendiendo que existe un item 1.27. Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
4. mostrar soportes NP-16 Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division
5. Anexar acta de pactacion de precios
6. Anexar documentacion en modificable y pdf

[El texto citado está oculto]

JEMAD INGENIERÍA <jemadingenieria@gmail.com> 28 de enero de 2025, 22:59
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>
Cc: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo;

Se adjunta oficio con código JM-022-MC22-2024, en respuesta a las observaciones presentadas por la firma interventora, de igual forma se adjuntan todos los documentos que soportan la solicitud de adición y prórroga del contrato MC-22-2024

[El texto citado está oculto]
--
Atentamente;

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
INGENIERA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL

2 adjuntos

JM-022-MC22-2024 - Respuesta a observaciones.pdf
211K

BALANCE DE OBRA No. 1 MC-24-2024.rar
13929K

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 29 de enero de 2025, 17:01
Para: JEMAD INGENIERÍA <jemadingenieria@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes, revisada la documentación V2 y atendiendo las sugerencias de la supervisión se le solicita:
la revisión total de los análisis de precios unitarios de los siguientes ítems

1. NP2- Instalación de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)
2. NP3- Instalación de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento
3. NP4-Suministro e instalación de soporte pie de amigo
4. NP5-Salida de Aire acondicionado de tablero a condensadora

se le solicita estudiar y explicar los rendimientos y cantidades colocadas porque suponen un posible sobrecosto
[El texto citado está oculto]

JEMAD INGENIERÍA <jemadingenieria@gmail.com> 29 de enero de 2025, 18:49
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>
Cc: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

En virtud de lo solicitado en el correo precedente, me permito informar a las partes que los análisis de precios unitarios fueron revisados integralmente y en algunos casos ajustados, obteniendo como resultado que los valores totales de las actividades NP1, NP2, NP3 y NP4 fueron reducidos, mientras que el valor total de la actividad NP5 se mantiene igual.

[El texto citado está oculto]
--
Atentamente;

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
INGENIERA CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE DE OBRA No. 1 - MC-22-2024.rar
14043K

Gmail

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>

solicitud de prorroga 2 CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: “ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES”.

1 mensaje

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 29 de enero de 2025, 7:15
Para: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 adjuntos

AVAL DE PRORROGA NUMERO 2 Y ADICIONAL 1.pdf
162K

solicitud de prorroga interventoria.pdf
169K

BALANCE DE OBRA No. 1 MC-24-2024.rar
13962K

San Juan de Betulia, 28 de ENERO de 2025

Señores
FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 24 DE 2024- "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES",

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN REFERENCIA

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de prórroga Y adición al mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, el plazo de ejecución del contrato se estipulo para el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, previa autorización y orden de inicio impartida por la Dirección seccional de administración judicial.

2. Que el día 23 de Diciembre se realizó la orden de inicio de interventoría.

3. Desde la visita técnica realizada se hace necesario establecer de manera detallada las actividades de cada punto a intervenir, y comprender el alcance de la obra.

4. Que realizada la programación de las actividades se detalla que los rendimientos óptimos no permiten una terminación de las actividades antes del 31 de diciembre.

5. Que con la programación realizada establece una terminación del contrato de obra hasta 31 de enero de 2024.

6. Que el plazo de ejecución se modifico mediante OTRO SI 1, estableciéndose hasta el 31 de enero.

7. Que el contratista solicito prorroga por 10 días y esta interventoría avalo dicha solicitud.

8. Que la interventoría debe ir acorde con los tiempos de obra para llevar una ejecución paralela a los tiempos establecidos.

9. Que para garantizar que los tiempos de interventoría esten acorde con los tiempos de ejecución del contratista de obra, esta interventoria asumirá los costos de dicha prorroga sin ocasionar gastos al ente contratante.

Por los motivos anteriormente descritos se solicita la prorroga del contrato en mención por termino de 10 dias.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

PLANILLAS INTERVENTOR

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	Ì Ï Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	27/01/2025	83537881	$561.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.200	0		0		0	0	0	0	246.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	315.200	0	0	0	0	0	0		315.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	246.200	246.200
Pensión	1	315.200	315.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	561.400	561.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS		Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I ï Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	27/01/2025	83537881	$561.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.969.600	315.200	0	0	0	0	EPS005	1.969.600	246.200		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	Ì Ï Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	03/01/2025	83081771	$770.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	337.800	0		0		0	0	0	0	337.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.400	0	0	0	0	0	0		432.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	337.800	337.800
Pensión	1	432.400	432.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	770.200	770.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS		Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I ï Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	03/01/2025	83081771	$770.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	3	0			N							X										25-14	2.702.000	432.400	0	0	0	0	EPS005	2.702.000	337.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	Ì Ï Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84400199	$561.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.200	0		0		0	0	0	0	246.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	315.200	0	0	0	0	0	0		315.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	246.200	246.200
Pensión	1	315.200	315.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	561.400	561.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS		Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I ï Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84400199	$561.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.969.600	315.200	0	0	0	0	EPS005	1.969.600	246.200		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	32335697	Y	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	91.700	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32335697	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	1.300.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	90.500	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	32335697	Y	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	91.700	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32335697	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	90.500	0	1.200	0	91.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	90.500	0	1.200	0	91.700
Gran Total					90.500	0	1.200	0	91.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32340529	Y	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.500	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32340529	2025-02-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	1.423.500																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	99.100	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32340529	Y	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.500	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32340529	2025-02-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	400	0	99.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	99.100	0	400	0	99.500
Gran Total					99.100	0	400	0	99.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32586157	Y	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32586157	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	1.423.500																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	99.100	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32586157	Y	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32586157	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	99.100	0	0	0	99.100
Gran Total					99.100	0	0	0	99.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32013474	E	2024-12-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	698.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32013474	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1005662343	ALEMAN MEDINA JOSE ANTONIO	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	346.667	55.500	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
2	CC 1102818450	PEREZ CERVERA ANCIZAR	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1131201
3	CC 3837772	SIERRA ATANACIO VICENTE	1.300.000	F	X	X														0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	173.334	27.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	173.334	7.000	CCF DE SUCRE-CCF41	173.334	7.000	173.334	12.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S	4429001
4	CC 1103098698	TOVAR QUIROZ MANUEL DAVID	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
5	CC 79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	3	110.800	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32013474	E	2024-12-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	698.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32013474	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.166.668	3.466.668	3.466.668	3.466.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	346.800	0	0	0	346.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	83.300	0	0	0	83.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	0	0	55.500
EPS(Administradoras: 4)				5	138.800	0	0	0	138.800
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	13.900	0	0	0	13.900
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	7.000	0	0	0	7.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	13.900	0	0	0	13.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				5	74.100	0	0	0	74.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	74.100	0	0	0	74.100
CCF(Administradoras: 1)				5	138.800	0	0	0	138.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	138.800	0	0	0	138.800
Gran Total					698.500	0	0	0	698.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO	3043572148	INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32336247	E	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	219.300	3.100	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	32336247	2025-01-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1103118425	HERAZO SEBA OSCAR LUIS	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	1.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	85.200	S	1711001
2	CC 1100622776	RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO	2.000.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	533.334	85.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	533.334	21.400	CCF DE SUCRE-CCF41	533.334	21.400	533.334	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	131.000	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO	3043572148	INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32336247	E	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	219.300	3.100	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	32336247	2025-01-07	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
880.001	880.001	880.001	880.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	140.900	0	2.000	0	142.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	800	0	56.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	85.400	0	1.200	0	86.600
EPS(Administradoras: 2)				2	35.300	0	500	0	35.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	13.900	0	200	0	14.100
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	21.400	0	300	0	21.700
ARP(Administradoras: 1)				2	4.700	0	100	0	4.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	4.700	0	100	0	4.800
CCF(Administradoras: 1)				2	35.300	0	500	0	35.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	35.300	0	500	0	35.800
Gran Total					216.200	0	3.100	0	219.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32512576	E	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.471.000	6.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32512576	2025-02-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1103118425	HERAZO SEBA OSCAR LUIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
2	CC 1102818450	PEREZ CERVERA ANCIZAR	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	SANITAS-EPS005	47.450	1.900	CCF DE SUCRE-CCF41	47.450	1.900	47.450	300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	11.700	S	1131201
3	CC 1100622776	RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	2.000.000	80.000	CCF DE SUCRE-CCF41	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	4429001
4	CC 79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	CCF DE SUCRE-CCF41	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32512576	E	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.471.000	6.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32512576	2025-02-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.970.950	5.970.950	5.970.950	5.970.950	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	955.400	0	4.000	0	959.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.600	0	100	0	7.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	720.000	0	2.900	0	722.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	1.000	0	228.800
EPS(Administradoras: 3)				4	238.900	0	1.200	0	240.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	80.000	0	400	0	80.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	101.900	0	500	0	102.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				4	31.400	0	200	0	31.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	31.400	0	200	0	31.600
CCF(Administradoras: 1)				4	238.900	0	1.000	0	239.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	4	238.900	0	1.000	0	239.900
Gran Total					1.464.600	0	6.400	0	1.471.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32586128	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.269.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32586128	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1103118425	HERAZO SEBA OSCAR LUIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
2	CC 1100622776	RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO	2.000.000	F		X														0			25	25	25	25	COLPENSIONES-25-14	1.666.667	266.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.666.667	66.700	CCF DE SUCRE-CCF41	1.666.667	66.700	1.666.667	8.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	408.800	S	4429001
3	CC 79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	2.500.000	F		X														0			25	25	25	25	COLPENSIONES-25-14	2.083.334	333.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.083.334	83.400	CCF DE SUCRE-CCF41	2.083.334	83.400	2.083.334	10.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	511.100	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32586128	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.269.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32586128	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.173.501	5.173.501	5.173.501	5.173.501	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	827.900	0	0	0	827.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	600.100	0	0	0	600.100
EPS(Administradoras: 3)				3	207.100	0	0	0	207.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	83.400	0	0	0	83.400
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	66.700	0	0	0	66.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	27.100	0	0	0	27.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	27.100	0	0	0	27.100
CCF(Administradoras: 1)				3	207.100	0	0	0	207.100
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	207.100	0	0	0	207.100
Gran Total					1.269.200	0	0	0	1.269.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLAS CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32264059	E	2025-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	215.900	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32264059	2025-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
2	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32264059	E	2025-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	215.900	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32264059	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
693.334	693.334	693.334	693.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	111.000	0	400	0	111.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	55.500	0	200	0	55.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	200	0	55.700
EPS(Administradoras: 2)				2	27.800	0	200	0	28.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	13.900	0	100	0	14.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	13.900	0	100	0	14.000
ARP(Administradoras: 1)				2	48.400	0	200	0	48.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	48.400	0	200	0	48.600
CCF(Administradoras: 1)				2	27.800	0	100	0	27.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	27.800	0	100	0	27.900
Gran Total					215.000	0	900	0	215.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951274687**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1208420308

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 644.800	$ 5.300	$ 650.100
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 5.300**	**$ 650.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 503.800	$ 4.100	$ 0	$ 507.900
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 507.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.100	$ 21.100	$ 200	$ 0	$ 21.300
SUBTOTALES:									**$ 21.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 21.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 80.600	$ 700	$ 81.300
SUBTOTALES:			**$ 80.600**	**$ 700**	**$ 81.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1102876220	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.030.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 644.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.030.000	$ 503.800	$ 0	$ 503.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.030.000	110287622	$ 21.100	30	$ 4.030.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.260.600**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32530122	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.616.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32530122	2025-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007770716	CHADID VERGARA OSCAR DAVID	1.426.500	X	X	X														0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	569.400	22.800	SUCRE-CCF41	399.420	16.000	569.400	39.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	169.700	S	4429001
2	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER DE JESUS	1.426.500	X	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	474.500	19.000	SUCRE-CCF41	332.850	13.400	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.500	S	4429001
3	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO JOSE	1.423.500	X	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	996.450	39.900	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	423.800	S	4429001
4	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001
5	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32530122	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.616.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32530122	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.314.400	5.314.400	5.314.400	4.575.720	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	850.600	0	0	0	850.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	91.200	0	0	0	91.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	531.600	0	0	0	531.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				5	212.800	0	0	0	212.800
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	19.000	0	0	0	19.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	79.800	0	0	0	79.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				5	370.100	0	0	0	370.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	370.100	0	0	0	370.100
CCF(Administradoras: 1)				5	183.300	0	0	0	183.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	183.300	0	0	0	183.300
Gran Total					1.616.800	0	0	0	1.616.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7957567031**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1263345189

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 644.800	$ 3.000	$ 647.800
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 3.000**	**$ 647.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 503.800	$ 2.400	$ 0	$ 506.200
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 506.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 280.500	$ 1.400	$ 0	$ 281.900
SUBTOTALES:									**$ 280.500**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 281.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 24.200	$ 200	$ 24.400
SUBTOTALES:			**$ 24.200**	**$ 200**	**$ 24.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32587042	E	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.600	0	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32587042	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO JOSE	1.423.500	X		X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	332.150	13.300	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.400	S	4429001
2	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	474.500	76.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	4429001
3	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32587042	E	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.600	0	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32587042	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.281.150	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	228.000	0	0	0	228.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	76.000	0	0	0	76.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	152.000	0	0	0	152.000
EPS(Administradoras: 3)				3	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	19.000	0	0	0	19.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	19.000	0	0	0	19.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	19.000	0	0	0	19.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	99.300	0	0	0	99.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	99.300	0	0	0	99.300
CCF(Administradoras: 1)				3	51.300	0	0	0	51.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	51.300	0	0	0	51.300
Gran Total					435.600	0	0	0	435.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:				**7961746102**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1298745863

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.800	$ 0	$ 644.800
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 0**	**$ 644.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 0	$ 503.800
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 503.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 280.500	$ 0	$ 0	$ 280.500
SUBTOTALES:									**$ 280.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 280.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 24.200	$ 0	$ 24.200
SUBTOTALES:			**$ 24.200**	**$ 0**	**$ 24.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1102876220	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.030.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 644.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.030.000	$ 503.800	$ 0	$ 503.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.030.000	110287622	$ 280.500	30	$ 4.030.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.453.300**

SOPORTES AMBIENTALES

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

INFORME FINAL
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

Contrato No. MC 22 DE 2024

ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ALCANCE 4
3. OBJETIVO 4
4. LISTA DE RESPONSABLES 5
5. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5
6. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO 5
6.1. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SEGÚN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR 6
6.1.1. Matriz de aspectos e impactos actividades preliminares 6
6.1.2. Matriz de aspectos e impactos actividades constructivas 7
6.1.3. Matriz de aspectos e impactos actividades de cierre y entrega final 9
7. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 9
7.1.1. ATMOSFERICO: 9
7.1.2. SUELOS: 22
7.2. SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 28
7.2.1. Social: 28
7.2.2. Social y Económico 30
7.2.3. Social 32
7.2.4. Social y Económico 34
8. PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE COMPONEN EL PGAS 34
8.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 35
8.1.1. Grupo de gestión ambiental y social 35
9.1.1. Trámite y cumplimiento de requisitos legales 37
9.1.2. Capacitación ambiental y social 37

9.2. PROGRAMA COMPONENTE ABIÓTICO 38
9.2.1. Manejo integral de materiales de construcción, mobiliario y equipos 38
9.2.2. Control de las excavaciones y demoliciones 42
9.2.3. Residuos líquidos y sustancias peligrosas 48
9.2.4. Manejo de la maquinaria y equipos 48
9.2.5. Control de la calidad del aire y las emisiones 48
9.3. PROGRAMA DE LA GESTIÓN SOCIAL 51
9.3.1. Atención a la comunidad y autoridades 51
9.3.2. Gestión de la mano de obra 51
10. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PGAS .. 52
11. SEGUIMIENTO E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 53
11.1.1. Grupo de gestión ambiental y social 53
11.1.2. Trámite y cumplimiento de requisitos legales 53
11.1.3. Capacitación ambiental y social 53
11.2. PROGRAMA COMPONENTE ABIÓTICO 54
11.2.1. Manejo integral de materiales de construcción, mobiliario y equipos 54
11.2.2. Control de las excavaciones y demoliciones 54
11.2.3. Residuos líquidos y sustancias peligrosas 55
11.2.4. Manejo de la maquinaria y equipos 55
11.3. PROGRAMA DE LA GESTIÓN SOCIAL 55
11.3.1. Atención a la comunidad y autoridades 55
11.3.2. Gestión de la mano de obra 56
12. LISTADO DE ANEXOS 56
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Definición del tipo de proyecto según las actividades a ejecutar. 6

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Descripción de actividades preliminares. 7
Tabla 2: Descripción de actividades constructivas..... 8
Tabla 3: Actividades de cierre y entrega final. 9
Tabla 4: Personal Vinculado al contrato. 34
Tabla 5: Programas y proyectos que componen el PGAS. 35

1. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de ingeniería civil incluyéndose obras de mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, por su naturaleza durante su ejecución generan alteraciones de tipo social y ambiental, por lo cual es de suma importancia contar con planes y/o guías propias de cada contrato que nos permitan ejercer control de las actividades a ejecutar para minimizar los impactos negativos tanto de ámbito social, como ambiental. En el presente plan se describirá cada uno de los programas a implementar en la ejecución de las obras con el fin de lograr la menor afectación posible, así como también los profesionales y personal del contratista de obra que hacen parte de la implementación del mismo.

2. ALCANCE

El presente plan de gestión se implementará dentro del marco de la ejecución de las actividades administrativas y de obra derivadas del contrato de obra **No. MC 22 DE 2024**, que tiene como objeto **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**, suscrito entre el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO** y **JEMAD INGENIERIA SAS.**

3. OBJETIVO

Elaborar e implementar programas que nos permitan llevar a cabo el seguimiento y control desde el ámbito ambiental y social sobre cada una de las actividades enmarcadas en el cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra **No. MC 22 DE 2024**; todo lo anterior con el fin de poder mitigar y disminuir los impactos ambientales y sociales a causa del desarrollo de las actividades mencionadas, dentro de las cuales se encuentran actividades tanto del ámbito administrativo como actividades de obra.

4. LISTA DE RESPONSABLES

El control, seguimiento, medición de indicadores de cumplimiento estará a cargo del profesional ambiental vinculado al contrato de obra por parte del contratista, pero la responsabilidad de estudio, conocimiento y aplicación del mismo se encuentra sobre cada uno de los empleados tanto administrativos como operativos del contratista, los cuales se enumeran a continuación.

Profesional ambiental.
Director de obras.
Residente de obras.
Profesional SST.
Jefes de cuadrilla.
Empleados operativos.
Empleados administrativos adicionales al personal profesional minimo exigido.

5. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Guía para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social – PGAS
NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.

6. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO

Tomando como referencia la guía de la guía para la elaboración e implementación del PGAS de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, a través de la Unidad de Infraestructura Física – UIF aplicable al presente plan, clasificamos el tipo de proyecto como se muestra:

CUADRO NO. 3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DEAJ – UIF

Tipo de Proyecto	Actividades Principales a Realizar
Obras Nuevas con o sin Dotación de Mobiliario	✓ Diseño y ajustes de diseño ✓ Adecuación de instalaciones temporales para obra ✓ Transporte de maquinaria y equipos a la obra ✓ Desmonte, descapote y excavaciones ✓ Demolición de estructuras ✓ Cimentación de la edificación ✓ Construcción de la estructura ✓ Instalación de mampostería ✓ Instalación de cubiertas ✓ Instalación de redes hidrosanitarias ✓ Instalaciones eléctricas, voz y datos ✓ Acabados en general ✓ Adecuaciones eléctricas, voz y datos ✓ Instalación de aire acondicionado ✓ Instalación de equipos especiales ✓ Adecuación sistema contra incendio ✓ Instalación de mobiliario ✓ Aseo y Limpieza
Ampliación de Sedes Judiciales	
Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	
Proyectos de Oralidades	

Nota: Todas las actividades incluyen suministro e instalación.

Ilustración 1: *Definición del tipo de proyecto según las actividades a ejecutar.*

6.1. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SEGÚN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

El presente contrato, al igual que la mayoría de las obras publicas de ingeniera civil, en su etapa de ejecución contempla 3 sub etapas, como lo son: actividades preliminares, actividades constructivas y las actividades de cierre y entrega final de los proyectos, según la anterior clasificación y tomando como base la guía para PGAS de la rama judicial, a continuación, se describen de forma general las actividades, así como también los aspectos ambientales de cada una de ellas.

6.1.1. Matriz de aspectos e impactos actividades preliminares

Ítem	Nombre	Descripción	Aspecto Ambiental
1	Actividades Sociales	Presentación ante autoridades municipales. Contratación de la mano de obra.	Puede ocasionar conflictos sociales y culturales. Generación de empleo. Residuos sólidos y líquidos.

Ítem	Nombre	Descripción	Aspecto Ambiental
2	Entrega del terreno y replanteo.	Visita de obra para identificación de los puntos a intervenir y recibo del área de ejecución de los trabajos, realiza la localización del diseño en campo.	Generación residuos sólidos y líquidos. Conflictos con vecinos. Diseño construcción sostenible.
3	Localización de redes.	Se deberá revisar la ubicación de redes de servicios públicos, consultar catastros de redes en el área de influencia directa de la obra.	Conflictos con la comunidad. Afectación redes de servicios.
4	Identificación de proveedores de materiales y sitios de disposición final.	Previo al inicio de los trabajos se realizará la identificación de los proveedores de materiales pétreos, canteras, concreto, ladrillo y demás. También los sitios de disposición final de RCD, excavaciones y lodos, que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para la obra, sino también que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes.	Cambios en el uso del suelo.

Tabla 1: *Descripción de actividades preliminares.*

6.1.2. Matriz de aspectos e impactos actividades constructivas

Ítem	Nombre	Descripción	Aspecto Ambiental
2	Demolición y desmontes.	Actividades de demoliciones y desmontes de estructuras, aparatos hidrosanitarios y mobiliarios en mal estado, ya sea para rehabilitación o para reemplazo total; incluyéndose el retiro y disposición final adecuada, cumpliendo la norma correspondiente.	Generación de ruido Emisiones atmosféricas Generación de RCD Generación de RAEE Generación de empleo.
5	Concreto estructural.	Es el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos, utilizados para la construcción de las estructuras, en este caso aplica para la construcción de viguetas y columnetas para el levante de muros con la resistencia exigida en los diseños.	Uso y transporte materiales y sustancias peligrosas Generación emisiones Residuos de concreto Consumo de agua Generación de empleo.
6	Acero de refuerzo.	Comprende el diseño, fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras de acero,	Transporte de materiales Generación de residuos

Ítem	Nombre	Descripción	Aspecto Ambiental
		soldadas y/o pernadas. También incluye el suministro de los materiales requeridos para la fabricación de las estructuras como láminas, platinas, elementos para soldadura y otros.	Generación de empleo.
8	Transporte de materiales y de escombros.	Es el transporte de los materiales y residuos provenientes de las demoliciones.	Emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación de empleo.
9	Redes eléctrica, voz, datos, hidrosanitaria y de incendio.	Constituye la adecuada instalación de redes de servicio para funcionamiento del edificio, obedeciendo a su diseño y especificaciones.	Generación de residuos convencionales y RAEE Generación de ruido Generación de empleo.
	Instalación de aire acondicionado y equipos especiales	Se trata de equipos necesarios para funcionamiento de las edificaciones, como motobombas, plantas eléctricas, ascensor, UPS, entre otros.	Generación de residuos peligrosos sólidos y RESPEL. Generación de residuos convencionales y RAEE. Emisiones atmosféricas Generación de ruido. Generación de empleo.
10	Instalación de pisos, muros prefabricados, mampostería, pañetes, pintura, enchapes, cubiertas.	Comprende varias actividades específicas, que una vez construidas las piezas estructurales de la edificación deben ser colocados como fachadas y muros internos, ventanas, entre otros acabados que permiten su uso y vida útil.	Transporte de materiales Emisiones atmosféricas Generación de ruido Generación RCD Generación de empleo. Mejora de los espacios
11	Instalación de mobiliario.	Todo lo que se requiere para funcionamiento de las oficinas, salas, archivos para todos los espacios, además de equipos de cómputo, circuitos de televisión y todo lo requerido para seguridad.	Generación de ruido Generación de residuos convencionales y RAEE Generación de empleo.

Tabla 2: *Descripción de actividades constructivas.*

6.1.3. Matriz de aspectos e impactos actividades de cierre y entrega final

Ítem	Nombre	Descripción	Aspecto Ambiental
1	Aseo y limpieza.	Terminadas las actividades en la obra, el Contratista deberá limpiar muros, pisos, enchapes, vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación. Hacer la debida separación y disposición de todos los residuos.	Generación de residuos convencionales y RESPEL. Afectación a la calidad del aire. Generación de ruido. Emisiones atmosféricas.
2	Actividades sociales finales de cierre.	Se deben cerrar todas las quejas presentadas por los usuarios y/o funcionarios que harán usos de las instalaciones entregadas. Informar a la comunidad beneficiaria del proyecto sobre la finalización del proyecto. Certificado de las autoridades de no existencia de pendientes ambientales, sociales, compromisos, quejas o reclamos. Revisiones con las empresas de servicios públicos.	Conflicto con las comunidades o con autoridades locales.


Tabla 3: *Actividades de cierre y entrega final.*

7. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

7.1.1. ATMOSFERICO:

Alteración de la calidad del aire: Por aporte de gases efecto invernadero y de material particulado: Debido a los cortes de pisos, cortes de muros y cielorraso, se genera material particulado que afecta la calidad del aire, ante lo cual se tomaron las siguientes medidas:

1. Programación de actividades fuera del horario laboral de los empleados que hacen uso de las salas, por lo que se ejecutan este tipo de actividades los fines de semana, y en horarios nocturnos, evitando afectar a los usuarios mencionados.

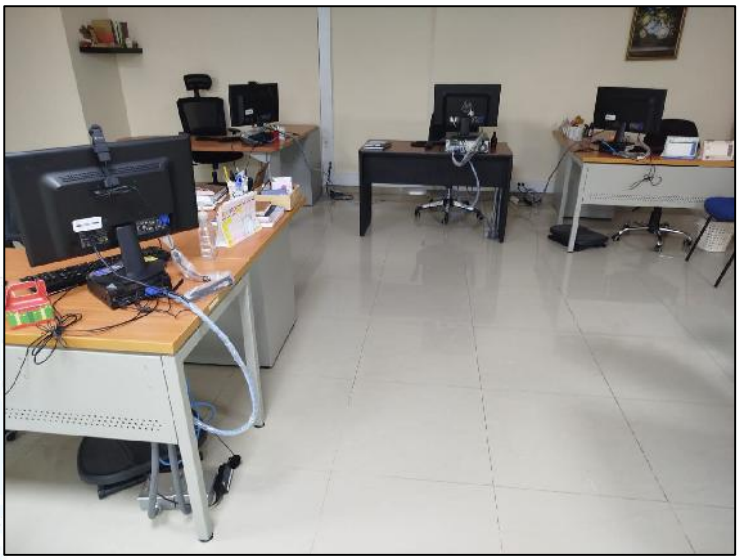

2. Cobertura de equipos de aire acondicionado y demás elementos que hacen parte de las zonas intervenidas, con el fin de evitar que el material particulado genere daños.





3. Recolección de polvo y limpieza realizada fuera de los horarios laborales de los usuarios de la Rama para evitar afectaciones.



















4. Entrega de dotación y control del correcto uso de los elementos de protección personal. En este caso se evidencia a los trabajadores con toda la respectiva dotación realizando sus actividades.









Aumento de niveles de ruido: Se toman las siguientes medidas de control, con el fin de mitigar los impactos.

1. Programación de actividades fuera del horario laboral de los empleados que hacen uso de las salas, por lo que se ejecutan este tipo de actividades los fines de semana, y en horarios nocturnos, evitando afectar a los usuarios mencionados.












7.1.2. SUELOS:

Pérdida de suelo: compra de materiales pétreos en establecimientos autorizados, en este caso se realiza compra directamente en la ferretería DISTRISUCRE de la ciudad de Sincelejo.

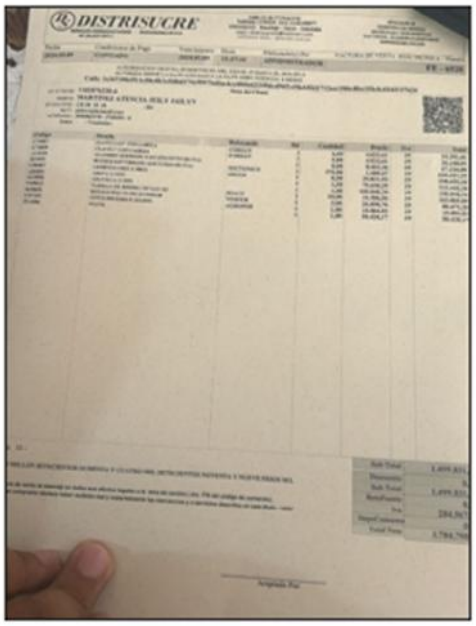

Contaminación del suelo: Con el fin de evitar la contaminación por residuos sólidos, los mismos fueron retirados por la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P y en el caso de aquellos residuos peligrosos fueron retirados por la empresa B I O - R E S I D U O S S.A.S; de esta manera se mitigan los impactos de afectación del suelo por una incorrecta disposición de residuos solidos y residuos de construcción.


Super GIROS


UN 3291
RESIDUOS



Es válido aclara, que, para evitar la salida de residuos, el transporte de los mismos hasta el sitio de disposición mencionado, se realizó por medio del llenado de costales, que posteriormente se cargaron al vehículo encargado del transporte por parte de la empresa INTERASEO; en el caso de aquellos residuos peligrosos, los mismos fueron embalados en cajas de cartón recubiertas en la parte superior y debidamente rotulados para garantizar la integridad de los mismos durante el proceso de disposición final.


McQUAY


McQUAY





7.2. SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

7.2.1. Social:

Afectación de la infraestructura de predios: En este caso, aplica el cuidado y control de los elementos que hacen parte de la edificación, los cuales durante la ejecución de las actividades se les realizó la debida protección con plástico, así como también se utilizó esta alternativa de protección para el transporte y fabricación de materiales hechos en obra, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:









7.2.2. Social y Económico

Alteración dinámica de las instituciones: para evitar inconvenientes con respecto a la dinámica institucional, se llevó a cabo la aplicación de las siguientes alternativas:

1. Trabajos en horarios nocturnos.
2. Trabajos en fines de semanas.
3. Protección de la infraestructura física, por medio de la cobertura.





7.2.3. Social

Afectación movilidad peatonal y vehicular: se aplicaron las siguientes alternativas:

1. Programación de descargues de materiales en horarios con tráfico poco transcurrido, contando con la programación del personal para el descargue oportuno.



2. Retiro de escombros y residuos solidos en horarios con tráfico poco concurrido, contando con el personal programado para la ejecución oportuna del cargue.



7.2.4. Social y Económico

Generación de empleo: durante la ejecución de la obra se generaron un total de 6 empleos directos, siendo el 100% de habitantes de la zona de influencia del proyecto (Departamento de sucre):

PERSONAL OPERATIVO Y PROFESIONAL		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	LEONARDO ESCAÑO LOPEZ (OPERATIVO)	Oficial de obra
2	JADER CHAVEZ CANCHILA (OPERATIVO)	Ayudante de obra
3	OSCAR DAVID CHADID VERGARA (OPERATIVO)	Oficial de obra
4	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN (PROFESIONAL)	Residente de Obra
5	CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROZA (PROFESIONAL)	Director de Obra
6	MARIA ISABEL PIÑEREZ SUAREZ (PROFESIONAL)	Profesional SISO

Tabla 4: *Personal Vinculado al contrato.*

8. PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE COMPONEN EL PGAS

Tomando como referencia la guía para elaboración e implementación de PGAS de la rama judicial, el tipo de proyecto, la descripción de las actividades a ejecutar y la definición de los posibles impactos ambientales, el presente plan se conformará por los siguientes programas subdividíos en proyectos, los cuales cuentan con su descripción y los respectivos indicadores de cumplimiento y periodicidad de la medición de los mismos.

Ítem	Programas	Proyectos
1	Gestión Ambiental del Proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social
		2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales
		3. Capacitación Ambiental y Social
		1. Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos

Ítem	Programas	Proyectos
2	Componente Abiótico	2. Control de las Excavaciones y Demoliciones
		3. Residuos Sólidos Generados
		4. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas
		5. Manejo de la Maquinaria y Equipos
		6. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones
4	Gestión Social	1. Atención a la Comunidad y Autoridades
		2. Información y Participación de la Comunidad
		3. Gestión de la Mano de Obra

Tabla 5: Programas y proyectos que componen el PGAS.

8.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En este programa se encuentran establecidos los proyectos que permiten determinar las herramientas para planificar, gestionar y desarrollar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales que lleguen a producirse en el proyecto de obra civil.

8.1.1. Grupo de gestión ambiental y social

En cabeza del director de obra, y con la colaboración del grupo de profesionales y empleados operativos, se llevó a cabo el cumplimiento del presente proyecto.

Evaluación del Objetivo Principal

Los documentos técnicos del contrato de obra, exigen la contratación del siguiente personal:

15.2.2. CAPACIDAD TECNICA

A. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad requiere que el oferente cuente con el personal idóneo para garantizar una adecuada ejecución del objeto y de las obligaciones pactadas en este. En todo caso deberán acreditar que cuentan con el siguiente perfil profesional y con los respectivos requerimientos mínimos que se citan:

CARGO	REQUISITOS
DIRECTOR DE OBRA (1)	• Poseer título profesional en Ingeniería Civil o arquitectura. • Experiencia general: seis (06) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional como ingeniero civil o arquitectura y tres (3) años contados a partir de la fecha del título como especialista. • Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia laboral verificable en no menos de tres (3) contratos en la Dirección de proyectos y/o obras con objeto igual o similar al de la presente contratación o como contratista en objeto cuyo alcance contemple actividades relacionadas con adecuaciones, reparaciones y/o mantenimientos. • Dedicación 50%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de

	seguimiento, y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.

CARGO	REQUISITOS
RESIDENTE DE OBRA (1)	• Poseer título profesional en Ingeniería Civil o arquitectura. • Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a tres (03) años, contados a partir de la fecha de la matrícula profesional. • Experiencia específica: Acreditar experiencia laboral verificable como director o residente de obra en mínimo tres (3) contratos, con objeto igual y/o similar a la de esta contratación. • Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.
CARGO	**REQUISITOS**
SISO (1)	• Tecnólogo o Técnico en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente; y/o estudios superiores que cuente con posgrado en SST, con licencia en SST vigente. • Experiencia general: Experiencia no menor a dos (02) años contados a partir de la fecha de grado como técnico o tecnólogo y/o dos (02) año para estudios superiores desde la especialidad. • Experiencia específica: acreditar experiencia laboral verificable como SISO (Técnico, tecnólogo o profesional) en áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto o alcance contemple actividades iguales y/o similares al del presente proceso. • Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.

PERSONAL EXIGIDO		
No.	**CANTIDAD**	**CARGO**
1	1	Residente de Obra
2	1	Director de Obra
3	1	Profesional SISO

PERSONAL CONTRATADO		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	Residente de Obra
2	CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROZA	Director de Obra
3	MARIA ISABEL PIÑEREZ SUAREZ	Profesional SISO

9. Cumpliéndose de esta forma el 100% de lo presente en este programa; para constancia de lo anterior, se anexan las planillas de seguridad social del periodo reportado. (Ver Anexo 1)

9.1.1. Trámite y cumplimiento de requisitos legales

El presente proyecto no tuvo aplicación en el presente periodo, debido a que no se requirió trámite de permisos o licencias para las actividades ejecutadas.

Evaluación del Objetivo Principal

Se cumplió el 100% del objetivo, debido a lo expuesto en el párrafo anterior.

9.1.2. Capacitación ambiental y social

Durante el presente periodo, se llevaron a cabo 4 capacitaciones, todas según lo programado en el cronograma presentado en el PGAS aprobado.

Evaluación Objetivo Principal

Como objetivo se planteó realizar 4 capacitaciones durante el primer mes de ejecución del contrato, de las cuales a continuación se describen las capacitaciones llevadas a cabo:

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semanal	4 100%	(Cap. ejecutadas/Cap. Programadas)*100% (4/4)*100% R = 100% = Cumple	Se ejecutaron 4 capacitaciones en el presente periodo. (Ver Anexo No. 2)

Se cumplió con el total de las capacitaciones programadas durante el periodo.

9.2. PROGRAMA COMPONENTE ABIÓTICO

9.2.1. Manejo integral de materiales de construcción, mobiliario y equipos


A continuación, se presenta la evaluación del objetivo del presente proyecto, describiendo las acciones ejecutadas durante el periodo reportado, según cada caso especifico.

Evaluación Del Objetivo Principal
Establecer las medidas de control, prevención y mitigación por los impactos que pueda generar el manejo integral de los materiales de construcción en las obras.

Manejo de Materiales de Construcción

Para la ejecución de las obras, se utilizaron solo materiales suministrados a través de proveedores que cuenten con los permisos y autorizaciones para comercializar.



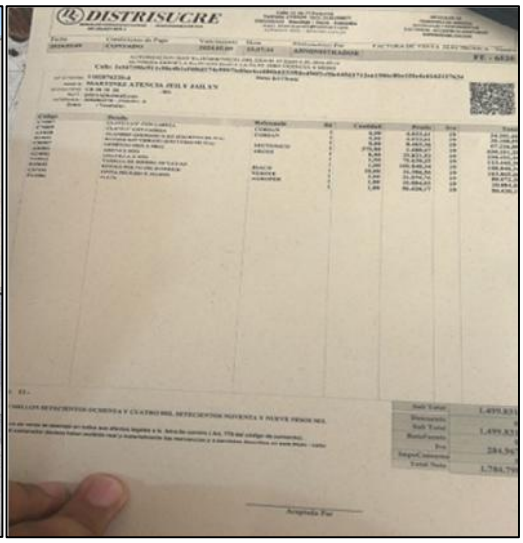

El material almacenado en los frentes de obra se mantuvo adecuadamente acopiado, señalizado.





Las actividades ejecutadas, y lo materiales usados en obra, se pueden identificar en la bitácora de obra y los respectivos informes.

El material almacenado en los frentes de obra deberá estar adecuadamente acopiado, señalizado y cubierto, para prevenir aporte de sedimentos cuando llueva y aumento de material particulado en el aire ambiente por la acción del viento.

Manejo del Concreto

Se realiza acopio temporal de cemento y preparación de manera adecuada, aclarando que dicho acopio no tuvo en ninguno de los casos una duración mayor a 2 días.

Para preparación de mezclas de cemento y concreto en el frente de obra, el suelo se cubrió adecuadamente con plástico, con el fin de evitar afectaciones al mismo.





Para la manipulación de las mezclas, .se utilizan recipientes y plásticos para el cubrimiento de las zonas en las cuales se ejecutan las actividades.



Manejo de Prefabricados, Mobiliario y Equipos Especiales

Los bloques se almacenan y se transportan de forma segura y ordenada, protegidos y sin generar riesgos para peatones o para la obra.



9.2.2. Control de las excavaciones y demoliciones


Dentro de las actividades del contrato de obra, no contamos con excavaciones, solo con cortes y demoliciones que producen pocos volúmenes objeto de disposición final; a continuación, se presentan los soportes de cumplimiento del presente proyecto.

Evaluación Del Objetivo Principal

Durante la aplicación del presente proyecto, abarcamos el procedimiento correcto para la recolección, transporte y disposición final de RCD; como se evidencia:

Durante la ejecución de las actividades que generan RCD, se tuvo estricto cuidado para evitar accidentes labores o daños a la infraestructura adyacente en bien estado.



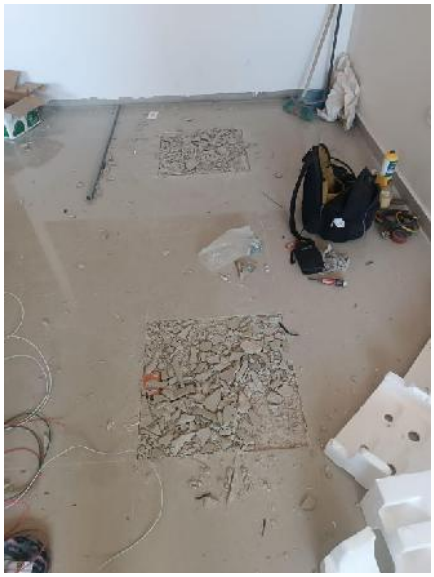

Una vez generados los RCD estos son recolectados, de forma que se eviten los daños a las estructuras adyacentes.





Una vez recolectados, llevamos a cabo el almacenamiento temporal, el cual en ninguno de los caso fue superior a 24 horas.



Para la disposición final, durante la ejecución se realizó la disposición final de escombros y otros residuos mediante la empresa INTERASEO SA ESP y la disposición final de residuos peligrosos con la empresa B I O - R E S I D U O S S.A.S


UN 3291
RESIDUOS PELIGROSOS


pegaso
INTERASEO

9.2.3. Residuos líquidos y sustancias peligrosas

Las sustancias peligrosas manipuladas durante el periodo, fueron las requeridas para los acabos de la instalaciones adecuadas, como lo son pinturas, estucos y materiales para impermeabilizaciones, los cuales se almacenaron correctamente y se controló su uso por medio de nuestro profesional SISO.

9.2.4. Manejo de la maquinaria y equipos

El contrato de obra, solo se utilizaron equipos y manuales, para lo cual se contó con la entrega de los EPP requeridos para cada caso específico, y con la precaución de la verificación del estado de los equipos antes del uso diario.

9.2.5. Control de la calidad del aire y las emisiones

Debido a los cortes de pisos, cortes de muros y cielorraso, se genera material particulado que afecta la calidad del aire, ante lo cual se tomaron las siguientes medidas:

1. Programación de actividades fuera del horario laboral de los empleados que hacen uso de las salas, por lo que se ejecutan este tipo de actividades los fines de semana, y en horarios nocturnos, evitando afectar a los usuarios mencionados.



2. Cobertura de equipos y demás elementos que hacen parte de la edificación, con el fin de evitar que el material particulado genere daños.



3. Recolección de polvo disposición final para evitar, fuera de los horarios laborales para evitar inconvenientes.



9.3. PROGRAMA DE LA GESTIÓN SOCIAL

El Programa de Gestión Social estuvo liderado por Director de Obra del Contratista, quien finalmente es el directo responsable de su cumplimiento, a continuación se adjuntan los soportes de la aplicación de cada uno de los proyectos.

9.3.1. Atención a la comunidad y autoridades

Durante la ejecución de los trabajos en el presente periodo, estuvieron a disposición los canales oficiales para el recibo de la PQRS.

Persona de contacto	**JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA**	
Dirección	CR 30 18 28 DULCE NOMBRE	
Teléfono	3004864378	3004864378
e-mail	jemadingenieria@gmail.com	

Obteniendo como resultado un total de cero (0) PQRS por atender durante el periodo del presente informe.

9.3.2. Gestión de la mano de obra

En el PGAS se estipuló que para el presente plan, Área de Influencia Directa – AID del proyecto puede definirse como el departamento de sucre, por lo cual se garantizará como mínimo un 50% de la mano de obra de la zona descrita.

Como resultado de la aplicación del presente programa encontramos:

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS OPERATIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS OPERATIVOS DE LA AID	3
% EMPLEADOS OPERATIVOS DEL AID CONTRATADOS	100,00%

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA AID	3
% EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL AID CONTRATADOS	100,00%

Como soporte se presenta la tabla resumen del personal contratado durante el periodo:

PERSONAL OPERATIVO Y PROFESIONAL			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPARTAMENTO RESIDENCIA**
1	LEONARDO ESCAÑO LOPEZ (OPERATIVO)	Oficial de obra	SUCRE
2	JADER CHAVEZ CANCHILA (OPERATIVO)	Ayudante de obra	SUCRE
3	OSCAR DAVID CHADID VERGARA (OPERATIVO)	Oficial de obra	SUCRE
4	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN (PROFESIONAL)	Residente de Obra	SUCRE
5	CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROZA (PROFESIONAL)	Director de Obra	SUCRE
6	MARIA ISABEL PIÑEREZ SUAREZ (PROFESIONAL)	Profesional SISO	SUCRE

10. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PGAS

Los costos para la ejecución del PGAS, están contemplados dentro de la oferta realizada por el contratista. De la misma forma, las demás obligaciones de tipo ambiental, están dentro del AIU que haya sido asignado para dicho proyecto, es decir, que no se hará pago por separado de actividades incluidas en el PGAS. Dicho lo anterior el valor total del presente plan incluyendo elaboración e implementación es el definido dentro del rubro denominado Plan de Manejo Ambiental.

11. SEGUIMIENTO E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presentan los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos aplicado al PGAS.

11.1.1. Grupo de gestión ambiental y social

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Número de profesionales contratados	Mensual	4 100%	(Prof. Contratados/Prof. Exigidos)*100% (4/4)*100% R = 100% = Cumple	Se contrató el 100% de los profesionales exigidos para el contrato

11.1.2. Trámite y cumplimiento de requisitos legales

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Obligaciones, solicitud de permisos y requerimientos de las autoridades ambientales	Mensual	0 100%	(Prof. Contratados/Prof. Exigidos)*100% (0/0)*100% R = 100% = Cumple	No se requirieron permisos

11.1.3. Capacitación ambiental y social

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación

Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semanal	4 100%	(Cap. ejecutadas/Cap. Programadas)*100% (4/4)*100% R = 100% = Cumple	Se ejecutaron 4 capacitaciones en el presente periodo. (Ver Anexo No. 2)

11.2. PROGRAMA COMPONENTE ABIÓTICO

11.2.1. Manejo integral de materiales de construcción, mobiliario y equipos

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Fuentes de materiales con permisos vigentes.	Mensual	100%	(No. Fuentes/Fuentes con permisos vigentes)*100% (1/1)*100% R = 100% = Cumple	Todas las fuentes de materiales utilizadas en el contrato, son fuentes autorizadas.

11.2.2. Control de las excavaciones y demoliciones

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Residuos dispuestos adecuadamente	Mensual	100%	(M3 de RCD Dispuesto/M3 de RCD Generados)*100% (1 Glb/1 Glb)*100% R = 100% = Cumple	Los RCD generados fueron dispuestos finalmente por empresas especializadas para tal fin.

11.2.3. Residuos líquidos y sustancias peligrosas

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Manejo de sustancias peligrosas (Global)	Mensual	100%	(Cant. Correctamente manejadas/Cant. Utilizada en obra)*100% (1 Glb/1 Glb)*100% R = 100% = Cumple	Las sustancias peligrosas, tipo pintura, estuco y materiales para impermeabilización, fueron manejados de forma correcta en su totalidad.

11.2.4. Manejo de la maquinaria y equipos

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
No. de Accidentes laborales por equipos y herramientas	Mensual	Cant, 0 100 %	(Cant. Accidente ocurridos/Cant. Esperada)*100% (0/0)*100% R = 100% = Cumple	No se presentaron accidentes por el uso de equipos o herramientas en mal estado.

11.3. PROGRAMA DE LA GESTIÓN SOCIAL

11.3.1. Atención a la comunidad y autoridades

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación

Quejas y reclamos durante el proyecto.	Mensual	100 % de las metas sean atendidas	(PQRS Resueltas/PQRS recibidas)*100% (0/0)*100% R = 100% = Cumple	No se presentaron PQRS por resolver en el presente periodo.

11.3.2. Gestión de la mano de obra

Nombre del indicador	Frecuencia	Meta esperada	Calculo	Observación
Generación de empleo en el Área de Influencia Directa – AID.	Mensual	Mayor al 50%	(No. empleados del AID/No. total de Empleados)*100% (6/6)*100% R = 100% = Cumple	El 100% de los empleados pertenecen a la AID del contrato de obra.

12. LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1: Planillas de seguridad social.
Anexo No. 2: Soporte de capacitaciones.
Anexo No. 3: Soportes disposición final de RCD.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumplió con la aplicación del 100% de los programas y proyectos estipulados en el PGAS.
No se presentaron accidentes durante le periodo, relacionados con el mal estado o falta de mantenimiento de equipos y herramientas.
Se hizo uso de la opción de reutilización de los RCD generados, siendo recolectados y dispuesto de forma correcta.
El 100% de los empleados que ejecutan actividades en el contrato, son del AID, superando con creces el porcentaje mínimo exigido (50%).
Los resultados de la evaluación de los indicadores de cumplimiento, nos evidencian un cumplimiento total de las metas esperadas durante el presente periodo.



JEILY MARTINEZ ATENCIA
Representante legal
JEMAD INGENIERIA SAS

	DOCUMENTO		
	CERTIFICACION		
Fecha de emisión: 27 de Marzo de 2015	**Versión: 01**	**Proceso: Gestión Ambiental**	**Página: 1: 1**

B I O - R E S I D U O S S.A.S
NIT. 900.808.189-7

CERTIFICA QUE:

Que la entidad que lleva por razón social JEMAD INGENIERIA S.A.S con NIT No 901539452-9, realizo el día 06 de febrero de 2025 en Sincelejo (INSTALACIONES PALACIO JUSTICIA), bajo manifiesto N°36518, la entrega de los siguientes residuos:

Tipo de Residuo	Descripción	Peso Kg
RESIDUOS PELIGROSOS	LUMINARIAS	48,3

Los residuos aquí relacionados fueron enviados a BIOGER SA ESP NIT 806.006.669-8, ubicado en el corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18 – 720, Cartagena, Resolución No. 0120 de 2014, Resolución No. 0398 de 2020 y Resolución No. 1642 de 2022CARDIQUE – Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique para su tratamiento y certificación.

Nota aclaratoria: Este certificado es informativo y se expide a los días 25 de febrero del 2025 para informar que la disposición final es emitida por BIOGER SA ESP.

FEBR 33108

JABIB NEGRETE GUTIERREZ
Gerente Operativo

Carrera 3 # 21-60, Oficina 201 Teléfonos 7827275 - 7811125 Fax: 7815219.
E- mail: ventas@bio-residuos.com.co – Celulares 3045666839
Montería – Córdoba
"CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESTA EN MANOS DE TODOS"

BIOGER S.A.S. ESP.
Nit 806.006.669 – 8

CERTIFICADO No. 7285-2025

CERTIFICA QUE:

Recibió en el mes de febrero del 2025, de la empresa BIORESIDUOS SAS. identificado con Nit 900808189-7 Los siguientes residuos generados por la empresa JEMAD INGENIERIA SAS identificado con nit 901539452-9

Tipo de residuo	Residuo	Codigo Respel	Cantidad	Unidad	Servicio
Peligroso	METALES PESADOS (LUMINARIAS,BATERIAS,AMALGAMAS)	Y35	48,3	Kg	Celda de seguridad

Dichos Residuos fueron recibidos y dispuestos en nuestro Parque Ambiental Bioger, ubicado en el corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18 – 720. Nuestro Parque Ambiental BIOGER, cuenta con los Permisos y Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Ambiental competente “CARDIQUE” – Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique a través de la Resolución No. 0120 de 2014, Resolución No. 0398 de 2020 y Resolución No. 1642 de 2022

El presente certificado se expide el día 12 de marzo de 2025, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C.

Cordialmente,

NELSON GARCIA GRAU.
Gerente Parque Ambiental Bioger
BIOGER S.A.S ESP.
E-mail: directorcomercial.pab@biogersaesp.com
Elaboró: SAB

F-GCO-027 Versión 3
Elaborado: 07/02/2023

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

Control de Asistencia a Capacitaciones

Código: N/A	Fecha: 23/12/2024	Versión: 01

FECHA 30/12/2024 **HORA INICIO / HORA FIN** 9:30 am – 10:15 am

CAPACITADOR Cesar Roberto Salcedo Montenoza.

TEMA Alcance del contrato de obra, especificaciones técnicas, presupuesto y aspectos contractuales del proyecto.

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Jeiry Martinez	Residente de obra	
	María Piñeres	Siso	Maria Piñeres.

OBSERVACIONES:

INTERASEO

INTERASEO S.A.S E.S.P

CERTIFICA

Que la empresa **JEMAD INGENIERIA S.A.S** con Nit. 901.539.452-9, se le presto el servicio especial de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios del Proyecto u Obra "**MC 22 de 2024 - Adecuaciones de Salas de Audiencia Ubicadas en la Torre Gentium de Sincelejo para el Funcionamiento de Despachos Judiciales"** ubicados en el municipio de Sincelejo, como se relaciona a continuación.

FECHA	Cantidad M3
15 de Febrero de 2025	2

Los residuos recogidos por nuestra empresa son dispuestos en el Relleno Sanitario "El Oasis" de la ciudad de Sincelejo, el cual cuenta con licencia ambiental No 0444de 2001, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE.

Este certificado se expide a Solicitud del usuario.

Para constancia se firma en Sincelejo el día 19 de Febrero de 2025.

Atentamente.

ANNY GOMEZ ARAUJO
Directora Regional Mercado Regulado
INTERASEO S.A.S E.S.P

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

Control de Asistencia a Capacitaciones

Código: N/A	Fecha: 23/12/2024	Versión: 01

FECHA 03/01/2025 HORA INICIO / HORA FIN 9:00 AM - 9:30 AM

CAPACITADOR María Isabel Piñerez Suarez

TEMA Documento PGAS, Programas, Proyectos y Alcance.

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cesar Salcedo Montenura	Director de Obra	
	Jeily Martinez	Residente de obra	
	Leonardo Escano	Maestro de obra	Leonardo Escano

OBSERVACIONES:

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

Control de Asistencia a Capacitaciones

Código: N/A	Fecha: 23/12/2024	Versión: 01

FECHA 08/01/2025 **HORA INICIO / HORA FIN** 10:30 AM - 11:15 AM

CAPACITADOR Maria Isabel Piñerez Suarez.

TEMA Plan de Contingencias, Simulacros, Seguridad y Salud en el trabajo

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Leonardo Escaño	Maestro de obra	Leonardo Escaño.
	Jeily Martinez	Residente de obra	
	Cesar Salcedo Montenegro	Director de Obra.	Salcedo
	Jader Chavez	Oficial	Jader Chavez
	Oscar Chadid	Oficial	Oscar Chadid

OBSERVACIONES:

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

Control de Asistencia a Capacitaciones

Código: N/A	Fecha: 23/12/2024	Versión: 01

FECHA 15/01/2025 **HORA INICIO / HORA FIN** 2:00PM - 2:30PM

CAPACITADOR Maria Isabel Pinzon Suarez

TEMA Seguridad y Salud en el trabajo, buen manejo de residuos, PGAS.

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Leonardo Escaño	Maestro de obra	Leonardo Escaño
	Jeily martinez	Residente de obra	
	Oscar Chadid	Oficial	Oscar Chadid
	Jaider Chavez	oficial.	Jaider Chavez
	Cesar Salcedo Montenegro	Director de Obra.	

OBSERVACIONES:

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

SINCELEJO, 28 DE FEBRERO DE 2025

SEÑORES:
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024

OBJETO: ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

LUZ ANGELA MIER RODRIGUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.102.233.009, suscrita como Contador Público con Tarjeta Profesional TP-320776 -T, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa JEMAD INGENIERIA SAS, identificada con NIT 901539452-9, bajo la gravedad de juramento, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados al contrato de la referencia.

En constancia, se expide en Sincelejo, a los 28 días del mes de febrero de 2025.

Luz Angela Mier R.

LUZ ANGELA MIER RODRIGUEZ
C.C. No. 1.102.233.009
TP-320776
Contador Público

SINCELEJO, 28 DE FEBRERO DE 2025

SEÑORES:
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024

OBJETO: ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES


ASUNTO: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

LUZ ANGELA MIER RODRIGUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.102.233.009, suscrita como Contador Público con Tarjeta Profesional TP-320776 -T, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa JEMAD INGENIERIA SAS, identificada con NIT 901539452-9, bajo la gravedad de juramento, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO con los Pagos de Salarios y Prestaciones Sociales correspondientes a todos los empleados vinculados al contrato de la referencia.

En constancia, se expide en Sincelejo, a los 28 días del mes de febrero de 2025.

Luz Angela Mier R.


LUZ ANGELA MIER RODRIGUEZ
C.C. No. 1.102.233.009
TP-320776
Contador Público

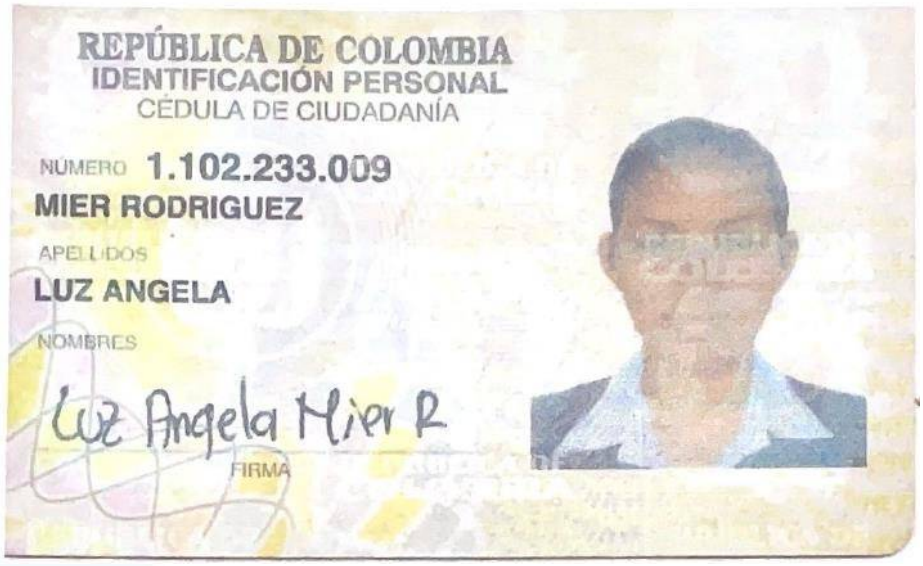

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.102.233.009
MIER RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUZ ANGELA
NOMBRES

Luz Angela Mier R
FIRMA

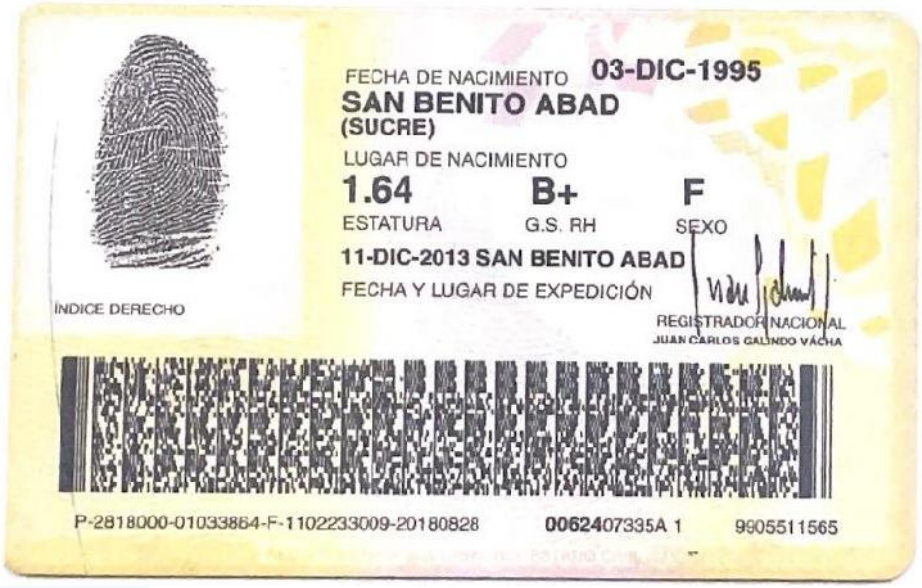

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1995
SAN BENITO ABAD
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

11-DIC-2013 SAN BENITO ABAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2818000-01033864-F-1102233009-20180828 0062407335A 1 9905511565



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

320776-T

LUZ ANGELA
MIER RODRIGUEZ
C.C. 1102233009
RES. INSCRIPCION 1 **DEL 17/01/2024**
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE CORPOSUCRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

370806 **377298**

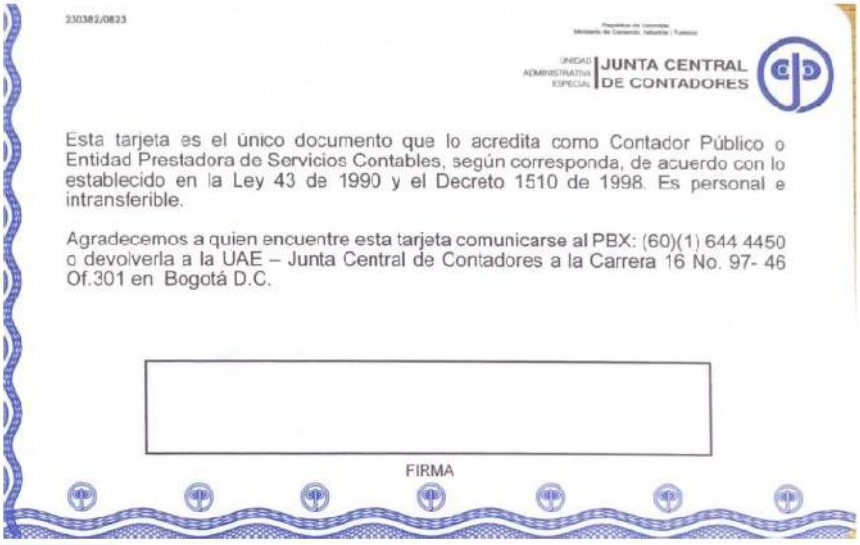

230382/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F71B85A4B82F3916

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ANGELA MIER RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102233009 de SAN BENITO ABAD (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 320776-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32264059	E	2025-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	215.900	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32264059	2025-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
2	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32264059	E	2025-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	215.900	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32264059	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
693.334	693.334	693.334	693.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	111.000	0	400	0	111.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	55.500	0	200	0	55.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	200	0	55.700
EPS(Administradoras: 2)				2	27.800	0	200	0	28.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	13.900	0	100	0	14.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	13.900	0	100	0	14.000
ARP(Administradoras: 1)				2	48.400	0	200	0	48.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	48.400	0	200	0	48.600
CCF(Administradoras: 1)				2	27.800	0	100	0	27.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	27.800	0	100	0	27.900
Gran Total					215.000	0	900	0	215.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951274687**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1208420308

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 644.800	$ 5.300	$ 650.100
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 5.300**	**$ 650.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 503.800	$ 4.100	$ 0	$ 507.900
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 507.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.100	$ 21.100	$ 200	$ 0	$ 21.300
SUBTOTALES:									**$ 21.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 21.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 80.600	$ 700	$ 81.300
SUBTOTALES:			**$ 80.600**	**$ 700**	**$ 81.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1102876220	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.030.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 644.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.030.000	$ 503.800	$ 0	$ 503.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.030.000	110287622	$ 21.100	30	$ 4.030.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.260.600**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32530122	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.616.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32530122	2025-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007770716	CHADID VERGARA OSCAR DAVID	1.426.500	X	X	X														0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	569.400	22.800	SUCRE-CCF41	399.420	16.000	569.400	39.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	169.700	S	4429001
2	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER DE JESUS	1.426.500	X	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	474.500	19.000	SUCRE-CCF41	332.850	13.400	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.500	S	4429001
3	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO JOSE	1.423.500	X	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	996.450	39.900	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	423.800	S	4429001
4	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001
5	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32530122	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.616.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32530122	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.314.400	5.314.400	5.314.400	4.575.720	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	850.600	0	0	0	850.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	91.200	0	0	0	91.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	531.600	0	0	0	531.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				5	212.800	0	0	0	212.800
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	19.000	0	0	0	19.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	79.800	0	0	0	79.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				5	370.100	0	0	0	370.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	370.100	0	0	0	370.100
CCF(Administradoras: 1)				5	183.300	0	0	0	183.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	183.300	0	0	0	183.300
Gran Total					1.616.800	0	0	0	1.616.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7957567031**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1263345189

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 644.800	$ 3.000	$ 647.800
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 3.000**	**$ 647.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 503.800	$ 2.400	$ 0	$ 506.200
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 506.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 280.500	$ 1.400	$ 0	$ 281.900
SUBTOTALES:									**$ 280.500**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 281.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 24.200	$ 200	$ 24.400
SUBTOTALES:			**$ 24.200**	**$ 200**	**$ 24.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32587042	E	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.600	0	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32587042	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO JOSE	1.423.500	X		X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	332.150	13.300	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.400	S	4429001
2	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	474.500	76.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	4429001
3	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32587042	E	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.600	0	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32587042	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.281.150	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	228.000	0	0	0	228.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	76.000	0	0	0	76.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	152.000	0	0	0	152.000
EPS(Administradoras: 3)				3	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	19.000	0	0	0	19.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	19.000	0	0	0	19.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	19.000	0	0	0	19.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	99.300	0	0	0	99.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	99.300	0	0	0	99.300
CCF(Administradoras: 1)				3	51.300	0	0	0	51.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	51.300	0	0	0	51.300
Gran Total					435.600	0	0	0	435.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:				**7961746102**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1298745863

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.800	$ 0	$ 644.800
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 0**	**$ 644.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 0	$ 503.800
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 503.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 280.500	$ 0	$ 0	$ 280.500
SUBTOTALES:									**$ 280.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 280.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 24.200	$ 0	$ 24.200
SUBTOTALES:			**$ 24.200**	**$ 0**	**$ 24.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1102876220	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.030.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 644.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.030.000	$ 503.800	$ 0	$ 503.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.030.000	110287622	$ 280.500	30	$ 4.030.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.453.300**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE
CARSUCRE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
REPUBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN 0444

(06 JUN 2001

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y su decreto reglamentario No. 1753 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que el ingeniero IVAN ORTEGA NASSIFF, en su calidad de Gerente Aseo Sincelejo Limpio S.A. E S P., mediante escrito recibido el día 18 de mayo de 1999, solicito a esta Despacho los Términos de Referencia para la Construcción y Operación del Nuevo Relleno Sanitario del Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre.

Que mediante Auto No.0444 del 21 de mayo de 1999, se admitió el conocimiento de la solicitud presentada, y se remitió el expediente a la Subdirección de Gestión ambiental, para la practica de una visita de inspección ocular y técnica y conceptúen sobre la viabilidad del permiso solicitado.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental emiten el Concepto No.484 de 12 de agosto de 1999, en el que se fijan Términos de Referencia para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (folio 240).

Que el día 27 de abril de 2001, el señor **HUGO RAMÍREZ GARCÍA,** en su condición de Gerente de la empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A. ESP., presenta el Estudio de Impacto Ambiental para el desarrollo de las Obras de Construcción y Operación del Nuevo Relleno Sanitario del Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental emiten el Concepto No.329 de 30 de mayo de 2001, en el que consideran que es procedente la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental presentado, previa las siguientes consideraciones:

1. El señor Hugo Ramirez Garcia, Gerente Aseo Sincelejo Limpio S.A ESP, solicita Licencia Ambiental para las obras de Construcción y Operación del Nuevo Relleno de Sincelejo, localizado en la finca Oasis, Km 2 en la vía que comunica con el corregimiento de Chocho, jurisdicción municipal de Sincelejo, Departamento del Sucre, con una extensión de 21 hectáreas, con la matricula inmobiliaria No 00-02-0007-0150-000-001.

2. Las actividades que se plantean en el proyecto son las de diseño y construcción, operación y post-clausura del Nuevo Relleno de Sincelejo, que ocasionarán efectos negativos sobre los recursos naturales renovables que allí se encuentran y sobre el medio ambiente, sin embargo, éstos pueden ser mitigados por ser transitorios y de valoración baja.

3. El proyecto global consta de tres etapas: diseño y construcción, operación y post-clausura

4. Las Etapas del proyecto se describen en las memorias técnicas Tomo (2) dos

5. La localización del nuevo relleno sanitario del municipio esta de acuerdo con el Plan de ordenamiento del municipio de Sincelejo.

6. El proyecto generará fuentes de trabajo tanto en la parte constructiva y operativa como en la etapa de post-clausura.

7. La adquisición de recursos naturales renovables, necesarios para la ejecución del proyecto, se adquirirán en canteras debidamente legalizadas.

8. La ejecución del proyecto trae consigo efectos positivos, tales como mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno y generación de empleos.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia Ambiental a la Empresa **Aseo Sincelejo Limpio S.A ESP**, representada Legalmente por el señor **HUGO RAMÍREZ GARCÍA,** en su calidad de Gerente General, para las obras de Construcción y Operación del Nuevo Relleno de Sincelejo, localizado en la finca Oasis, Km 2 en la vía que comunica con el corregimiento de Chocho, jurisdicción municipal de Sincelejo, Departamento del Sucre, con una extensión de 21 hectáreas, con la matricula inmobiliaria No 00-02-0007-0150-000-001, por considerar que los efectos negativos que se causarán a los recursos naturales renovables y al medio ambiente pueden ser mitigables y compensables.

ARTÍCULO SEGUNDO: El proyecto que se realizará consta de tres etapas: 1). Diseño y Construcción, 2). Operación y 3). Post-clausura. Las Etapas del proyecto se describen en las memorias técnicas.

ARTÍCULO TERCERO: La localización del nuevo relleno sanitario es la definida en el Plan de ordenamiento territorial del municipio de Sincelejo.

ARTÍCULO CUARTO: El Consorcio Sincelejo Limpio, deberá dar al predio donde funcionará el relleno sanitario, la seguridad que para el caso se amerita, ello se puede realizar con barreras vivas o con otros elementos que garanticen tal objetivo, sin deteriorar el paisaje.

ARTÍCULO QUINTO: La construcción del proyecto tendrá una duración de 3 meses y el Plan de Manejo Ambiental tendrá una duración igual a la etapa de post-clausura del proyecto, sin embargo las actividades de mantenimiento y seguimiento serán rutinarias.

ARTÍCULO SEXTO: Durante la operación se realizarán monitoreo del arroyo Caimán, con el fin de garantizar la eficacia de las medidas diseñadas en el PMA. Al menos se tendrán en cuenta las siguientes variables: pH, temperatura, DBO_5, DQO, Sólidos suspendidos, grasas y aceites, nitrógeno total, oxígeno disuelto, Coliformes fecales y totales, además determinarán los caudales. CARSUCRE podrá aumentar el número de variables a monitorear.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se implementará un Programa de Educación a la Comunidad de la Cabecera Municipal de Sincelejo, sobre la importancia de clasificar en la fuente, separación y reciclar los residuos sólidos domiciliarios.

ARTÍCULO OCTAVO: CARSUCRE hará seguimiento a las actividades de construcción y operación del relleno sanitario.

ARTÍCULO NOVENO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las siguientes obligaciones y medidas.

9.1. Demarcarán con cintas amarillas las zonas donde se esté realizando cualquier tipo de excavación.

9.2. La maquinaria y equipos a emplear en la obra, no deben presentar fugas de aceite, combustibles y contar con sus respectivos filtros de aire y silenciadores.

9.3. El transporte de materiales se hará cumpliendo lo estipulado en el Artículo 2 de la Resolución 541, en cuanto al cargue, descargue y transporte de material de construcción.

9.4. Los cortes de suelo que se tengan que realizar, se ejecutará mediante impregnación previa en época de verano, con lo que se evitará una excesiva emisión de material particulado y en invierno evitar el arrastre de material.

9.5. Ejecutará un mantenimiento constante del manejo de aguas lluvias, chimeneas, filtros, tuberías de conducción de lixiviados y canales, cuidando especialmente aspectos de vegetación circundante.

9.6. Las zonas de las lagunas de pondaje deben ser impermeabilizadas el fondo con una membrana de geotextil para evitar que los lixiviados puedan escaparces al subsuelo y puedan contaminar el recurso hídrico del área del proyecto.

9.7. Por ningún motivo se dispondrá material excedente producto de las excavaciones en cuerpos de agua o en predios vecinos.

9.8. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial, con el fin de prevenir accidentes.

9.9. Reforestar en el perímetro del lote, áreas cercanas al relleno sanitario y en las márgenes de los arroyos La Caimán y La monja, la cual involucrará 200 robles, 100 orejeros, 100 varas de huma, 40 ceibas blancas, 300 camajones, 40 bajaguas y 40 acacias.

9.10. Hacer revisión al sistema de recolección de lixiviados, para verificar su correcto funcionamiento, el cual se hará periódicamente, de acuerdo al plan de mantenimiento.

9.11. Asignar una interventoria Ambiental al proyecto, para el fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

9.12. Presentar semestralmente la información general referente a la evolución de las fases de construcción y operación en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO: El fondo y los taludes del relleno sanitario deberán ser impermeabilizados con un material que garantice cualquier infiltración y así evitar la posible contaminación de agua subterránea de la zona.

ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO: Para garantizar que los lixiviados generados no contaminen las aguas superficiales, el Consorcio Sincelejo Limpio S.A. ESP, deberá construir máximo cuatro piezómetros con el fin de hacer un monitoreo continuo de la calidad de las aguas. Se recomienda que dos piezómetros se construyan en el actual relleno (zona de transición) y dos en la zona nueva (Licencia aprobada), todos cerca del arroyo Caimán.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Para garantizar un buen manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, la firma contratista deberá programar eventos de capacitación, tales como: talleres, seminarios y charlas a trabajadores en la fase constructiva. Esta programación deberá ser enviada a CARSUCRE antes de su iniciación y un informe al culminarlo.

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: Las medidas y obligaciones que contiene la presente providencia, se verificarán mediante visitas de seguimiento por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE.

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Cualquier afectación que ocurra a terceros o a los recursos naturales renovables y del medio ambiente en desarrollo del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de la empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A. ESP.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Cualquier modificación que sufra el proyecto, deberá ser notificada a CARSUCRE, en forma inmediata, para que la Subdirección de Gestión Ambiental, tome las decisiones del caso.

ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las normas ambientales vigentes y aquellas que posteriormente sufran modificaciones.

ARTÍCULO DÉCIMOSEPTIMO: La Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, verificará mediante visitas de seguimiento el cumplimiento de las medidas y obligaciones contenidas en la presente Resolución.

ARTÍCULO DÉCIMOOCTAVO: El beneficiario de la presente Resolución asume toda la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones impuestas mediante la presente Resolución.

ARTÍCULO DÉCIMONOVENO: El beneficiario queda obligado al estricto cumplimiento de las obligaciones en ella impuesta, a las contenidas en la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario y/o a las que posteriormente se adicionen o modifiquen.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El beneficiario de la presente Resolución deberá adelantar ante las autoridades o entidades que así lo exijan los permisos, autorizaciones o licencias, concesiones o adjudicaciones necesarias para llevar a cabo el presente proyecto.

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO VIGÉSIMOPRIMERO: Se deberá efectuar un seguimiento ambiental en forma directa o a través de una interventoría contratada con una firma especializada, con el objeto de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Plan de Manejo Ambiental y rendir informe al 50% del inicio de la obra y al finalizar la misma.

ARTÍCULO VEGÉSIMOSEGUNDO: Durante su vigencia la Licencia Ambiental que mediante esta Resolución se impone podrá ser cedido a favor de terceros, previa solicitud y autorización de la Corporación, en cuyo caso una vez autorizada la misma es Cesionario continuara siendo responsables de las obligaciones impuestas en los plazas pendientes o restantes.

ARTÍCULO VEGÉSIMOTERCERO: En la zona transición debe iniciarse las actividades de post clausuras en un término no mayor de treinta (30) a partir de la notificación de la presente providencia de acuerdo al plan de manejo ambiental aprobado por esta Corporación, para lo cual deben ser coordinadas dichas actividades con la Subdirección de Gestión Ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMOCUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía municipal de Sincelejo, Personería Municipal de Sincelejo, Procuraduría Judicial y Agraria de Sincelejo, y Subdirección de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMOQUINTO: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, y 45 del Código Contencioso Administrativo, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Corporación, a costa del interesado quien debe consignar en la cuenta número 650-04031-4 del Banco Popular de la ciudad de Sincelejo, a favor de CARSUCRE, la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000,oo) por cada página, y entregar el recibo de consignación correspondiente en la Secretaría General para ser agregado al expediente.

ARTÍCULO VEGÉSIMOSEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General y el de apelación ante el Ministerio del Medio Ambiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo, a los 06 JUN 2001

ELEMILETH OVOLA BUSTAMANTE
Director General
CARSUCRE

Olga Gil/

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE

RESOLUCIÓN No. No 0480

20 ABR. 2003

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS AMBIENTALES DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0444 DE 6 DE JUNIO DE 2001"

EL DIRECTGOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 articulo 32, decreto 1728 articulo 25 y

CONSIDERANDO

Que a través de resolución No.0444 de 6 de JUNIO de 2001, se otorgó Licencia Ambiental a favor de la empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A.E.S.P., representada legalmente por el señor HUGO RAMIREZ GARCIA, para la construcción y operación del Nuevo Relleno Sanitario de la ciudad de Sincelejo, localizado en la finca El Oasis, Km 2 en la via que comunica con el corregimiento de Chocho, jurisdicción municipal de Sincelejo, departamento de Sucre, con una extensión de 21 Ha., con la matricula inmobiliaria No. 00-02-0007-0150-000-001, por considerar que los efectos negativos que se causaran a los recursos naturales renovables y al medio ambiente pueden ser mitigables y compensables.

Que el articulo Vigésimo Segundo de la precitada resolución establece que el beneficiario de la Licencia Ambiental podrá cederla a favor de terceros previa solicitud y autorización de la Autoridad ambiental, en cuyo caso una vez autorizada el cesionario será el responsable de las obligaciones impuestas en la resolución inicial, además de quedar sujeto al estricto cumplimiento de las disposiciones referente a la materia, la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Que mediante oficio ASL-0185-03 fechado 18 de marzo de 2003, la empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A.E.S.P., solicita la CESION de la Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 0444 de junio 6 de 2001, para el manejo y operación del Relleno Sanitario de la Ciudad de Sincelejo a favor de la empresa INTERASEO S.A.E.S.P. por un termino de cinco años.

Que de acuerdo a lo anterior la Empresa INTERASEO S.A.E.S.P. a través de su representante legal CARLOS ARIZA DUQUE envia oficio fechado febrero 5 de 2003, en donde manifiesta la aceptación de la cesión de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A.E.S.P., aportando certificado de Existencia y Representación Legal o inscripción de documentos en la Cámara de Comercio de Santa Marta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del decreto 1728 de 2002.

Que en cuanto a la cesión de la Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE, es procedente considerar que la empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A.E.S.P. y la empresa INTERASEO S.A.E.S.P., cumplen con lo indicado en el articulo 25 del decreto 1728 de 2002, el cual prevé:

"El beneficiario de la Licencia Ambiental en cualquier momento podrá cederla a otra persona, lo que implicará la cesión de los derechos y las obligaciones que se deriven de ella."

Que en tal caso, el cedente de la licencia ambiental deberá solicitar autorización previa a la autoridad ambiental competente. Por el incumplimiento de dicha condición, no se producirá la cesión y en consecuencia el cedente continuará siendo responsable de todas las obligaciones contenidas en la licencia ambiental.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de la Licencia ambiental otorgada mediante de resolución No.0444 de 6 de junio de 2001, a favor

de la empresa INTERASEO S.A.E.S.P., para las obras de Construcción y Operación del Nuevo Relleno Sanitario de la ciudad de Sincelejo, localizado en la finca El Oasis, Km 2 en la vía que comunica con el corregimiento de Chocho, jurisdicción municipal de Sincelejo, departamento de Sucre, con una extensión de 21 Ha., con la matrícula inmobiliaria No. 00-02-0007-0150-000-001, a favor de la Sociedad Comercial INTERASEO S.A.E.S.P., quien deberá cumplir las obligaciones y condiciones contenidas en la resolución precitada.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad INTERASEO S.A.E.S.P., deberá publicar por una sola vez a sus costas en un diario de amplia circulación nacional el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia, copia de esta deberá allegarse a CARSUCRE con destino al expediente No.462 de 20 de mayo de 1999. dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario de la Licencia Ambiental queda sujeto al estricto cumplimiento de las disposiciones referente a la recolección y disposición de los residuos sólidos y similares, su manejo tratamiento, a fin de garantizar la salubridad e higiene pública, y aquellos que sobre los mismos rijan en el futuro, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al representante legal de la Empresa Aseo Sincelejo Limpio S.A. E.S.P., a la Sociedad INTERASEO S.A. E.S.P.

ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente providencia a la Procuraduría Ambiental y Agraria y a la Subdirección de Gestión Ambiental.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, ante el Director General de CARSUCRE, tal como lo contempla el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ELEMIELET OYOLA B.

ELEMIELET OYOLA BUSTAMANTE
Director General
CARSUCRE

Y.S.P.

BITACORA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº MC 22 de 2024

"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

CONTRATO Nº MC 24 de 2024

"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 10 DE FEBRERO DE 2025

Lunes, 23 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Martes, 24 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo debido a las festividades de fin de año.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Miércoles, 25 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo debido a las festividades de fin de año.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Jueves, 26 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría,

Actividades realizadas:

Visita técnica y de inspección

Contratista de obra Contratista de interventoría

Viernes, 27 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría

Actividades realizadas:

Visita técnica y de inspección

Contratista de obra Contratista de interventoría

Sábado, 28 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Domingo, 29 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Lunes, 30 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Actividades realizadas:

Levante de muro en drywall

Contratista de obra

Contratista de interventoría

martes, 31 de diciembre de 2024

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo debido a las festividades de fin de año.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Miércoles. 01 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo debido a las festividades de fin de año.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

jueves. 02 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo debido a las festividades de fin de año.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

viernes. 03 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Actividades realizadas:

Levante de muro en drywall

Contratista de obra

Contratista de interventoría

sábado. 04 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Actividades realizadas: Se continuo con el levante de muro en drywall, se inició el levante de muro en mampostería para mesón.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Domingo. 05 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra

Contratista de interventoría

lunes. 06 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Actividades realizadas: Se continuo con levante de muro en mampostería, se fundió viga sobre muro para mesón.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Martes. 07 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro.

Actividades realizadas: Se continuo con levante de muro en mampostería

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Miercoles. 08 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se inició con el pañete en muro de mampostería, se continuo con el muro en drywall

Contratista de obra

Contratista de interventoría

jueves. 09 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se continuo con el pañete en muro de mampostería y se continuo con el muro en dry wall.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

viernes. 10 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se inició con el estuco en los muros de mampostería

Contratista de obra Contratista de interventoría

Sábado. 11 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se inicio con el suministro e instalación de puertas y modulo superior, se hizo el mantenimiento de puertas.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Domingo. 12 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Lunes. 13 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se continuo con el estuco en muros de mampostería, se inició con el mantenimiento en cielo raso, se inicio el resane en muros de drywall

Contratista de obra Contratista de interventoría

Martes. 14 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se inició la instalación de zócalos, se continuo con el mantenimiento en cielo raso en drywall.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Miercoles. 15 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora y taladro

Actividades realizadas:

Se comenzó la actividad de pintura para cielo raso, se continuo con la instalación de zócalos.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Jueves. 16 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores

Actividades realizadas:

Se continuo con la pintura muros y detalles en estuco en muro de mampostería.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Viernes. 17 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores

Actividades realizadas:

Se continuo con la pintura muros.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Sábado. 18 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Instalación de repisas.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Domingo. 19 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Lunes. 20 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Actividades realizadas:

Se continuo con la pintura en muros.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Martes. 21 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Instalación de persianas e instalación de mesón en mármol.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Miércoles. 22 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

jueves. 23 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

viernes. 24 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

sábado. 25 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Domingo. 26 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Lunes. 27 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Instalación de vidrio en recibidor

Contratista de obra Contratista de interventoría

Martes. 28 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Se continuó con la instalación de vidrio en recibidor

Contratista de obra Contratista de interventoría

Miércoles. 29 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Jueves. 30 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Viernes. 31 de enero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Actividades realizadas:

No se realizaron actividades en el frente de trabajo

Contratista de obra Contratista de interventoría

Sábado. 01 febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, escalera

Actividades realizadas:

Desmonte de aires acondicionados

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Domingo. 02 febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, escalera

Actividades realizadas:

Salida para aire acondicionado de tablero a condensadora, instalación de soportes pie amigo e instalación de aires acondicionados

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Lunes. 03 febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores, escalera

Actividades realizadas:

Instalación de aires acondicionados e instalación de luminarias

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Martes. 04 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Instalación de canaletas metálicas, retiro de piezas de porcelanato en mal estado

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Miercoles. 05 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Se continuó con la instalación de canaletas metálicas, instalación cable utp y cableado eléctrico, instalación de piezas en porcelanato.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Jueves. 06 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas

Se continuó con la instalación de cable utp y cableado eléctrico, se instalaron punto normal, punto regulado y punto de datos.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Viernes. 07 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Se continuó con la instalación de punto normal, punto regulado y punto de datos.

Contratista de obra Contratista de interventoría

Sábado. 08 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores y taladro.

Actividades realizadas:

Se realizó el armado de cuarto de rack

Contratista de obra Contratista de interventoría

Domingo. 09 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada y no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores

Actividades realizadas:

Se realizó el esmerilado en ventanas y la instalación de organizador de cables en espiral.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

Lunes. 10 de febrero de 2025

Estado de tiempo: Soleado

Personal en obra: Equipo de obra, equipo de interventoría, mano de obra calificada no calificada

Herramientas y equipos: Herramientas menores

Actividades realizadas:

Instalación de organizador de cables en espiral.

Contratista de obra

Contratista de interventoría

INFORME CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

INFORME FINAL TÉCNICO DE EJECUCIÓN OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º MC 22 de 2024

"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 10 DE FEBRERO DE 2025

INFORME FINAL TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N.º MC 22 de 2024

"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

PLAZO DE EJECUCION:
1 MES Y 19 DIAS

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE.

CONTRATISTA:
JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT No 901.539.452-9
REP. LEGAL JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

SUPERVISORA:
FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOCALIZACIÓN 5
3. INFORMACION CONTRACTUAL 6
3.1 CONTRATO 6
3.2 ACTAS SUSCRITAS 7
3.3 POLIZAS 7
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 CONDICIONES INICIALES 8
4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 18
4.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 18
4.5 AVANCE DE OBRA 56
4.6 CUMPLIMIENTO CON LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 57
4.7 CUMPLIMIENTO CON LA REALIZACIÓN DE EXAMENES DE INGRESO Y ENTREGAS DE EPP 57
4.8 CUMPLIMIENTO CON EL PAGO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES 58
5. CONCLUSIONES 58

1. INTRODUCCIÓN

La dirección seccional de administración judicial de Sincelejo - sucre. mediante proceso de licitación pública Nacional, convocó a personas naturales o jurídicas, individualmente, en consorcio, o en unión temporal, para presentar propuestas para el proceso, cuyo objeto es: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES". Proceso en el cual se adjudicó como contratista a JEMAD INGENIERIA S.A.S, NIT No 901.539.452-9, representada legalmente por JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA, por un valor inicial de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($76.658.982) M/CTE. Por lo anterior, el día 23 de diciembre del 2024 se dio inicio a dicho contrato de MINIMA CUANTIA NO. MC 22 DE 2024, para ejecutar todas las actividades que hagan parte integral del mismo.

El presente documento relaciona el informe final de las actividades llevadas a cabo por el Contratista de Obra en el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2024 hasta el 10 de febrero de 2025, Inicialmente se detallan los aspectos generales y contractuales más relevantes del contrato, luego se describen las actividades desarrolladas por el Contratista.

2. LOCALIZACIÓN

La obra se ejecutó en la sede del palacio de justicia del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.

Sincelejo es la capital del departamento de Sucre, ubicado en la región Caribe de Colombia. Se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de la costa del Mar Caribe. La ciudad está situada en una zona llana y tiene una altitud promedio de unos 250 metros sobre el nivel del mar.



Ilustración 1. Localización municipio de Sincelejo

3. INFORMACION CONTRACTUAL

3.1 CONTRATO

A continuación, se presenta la relación del Contrato suscrito para el desarrollo de las Obras correspondientes al "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA
NATURALEZA DEL CONTRATO	MINIMA CUANTIA
No. DEL CONTRATO	MC 22 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo - Sucre.
CONTRATISTA	JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT /REP. LEGAL	NIT No. 901.539.452-9 REP. LEGAL JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
SUPERVISORA	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
OBJETO	"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$76,658,982.00 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$25,314,090.00 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 101,973,072.00 M/CTE
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 99,939,766.00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS
FECHA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
CLAUSULADO MODIFICACIÓN N° 1	PRORROGA N° 1 UN (1) MES
CLAUSULADO MODIFICACIÓN N° 2	PRORROGA N° 2 DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA	10 DE FEBRERO DE 2025

3.2 ACTAS SUSCRITAS

Durante la ejecución del contrato SAMC 01 DE 2024 se suscribieron las siguientes actas:

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE D 2024.
PRORROGA N.º 1	UN (1) MES HASTA 31 DE ENERO DE 2025.
PRORROGA N.º 2	DIEZ (10) DÍAS HASTA 10 DE FEBRERO DE 2025.

3.3 POLIZAS

Como contratista, se constituyó a favor de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO, la póliza de seguro de responsabilidad civil N° 540 - 74 – 994000007121 de aseguradora solidaria de Colombia y la póliza de seguro de cumplimiento 540 - 47- 994000033919 de aseguradora solidaria de Colombia, con las respectivas ampliaciones de vigencia de acuerdo a las modificaciones presentadas al contrato de obra. (VER ANEXOS).

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 CONDICIONES INICIALES

Se muestra a continuación las actividades contratadas inicialmente:

OBJETO:	ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TORRE GENTIUM - 7MO PISO - SALA DE AUDIENCIA No.1 Y SALA DE AUDIENCIA No.2 - PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO				
1	Sala de audiencias No. 1				
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 11,253.00	$ 90,024.00
1.02	Suministro e instalación de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	UND	10	$ 101,896.00	$ 1,018,960.00
1.03	Suministro e instalación de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 52,130.00	$ 4,170,400.00
1.04	Suministro e instalación de canaleta metálica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 58,952.00	$ 1,061,136.00
1.05	Suministro e instalación de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metálica	UND	8	$ 32,982.00	$ 263,856.00
1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 40,982.00	$ 327,856.00
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 28,366.00	$ 28,366.00
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 42,982.00	$ 85,964.00
1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 778,755.00	$ 1,557,510.00
1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 98,755.00	$ 98,755.00

1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1	$ 161,265.00	$ 161,265.00
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 98,953.00	$ 791,624.00
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 3,592.00	$ 1,077,600.00
1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 5,934.00	$ 106,812.00
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 542,530.00	$ 1,627,590.00
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 118,215.00	$ 2,837,160.00
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 737,075.00	$ 2,211,225.00
1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1	$ 70,255.00	$ 70,255.00
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 101,136.00	$ 606,816.00
1.2	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 63,802.00	$ 319,010.00
1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 22,971.00	$ 367,536.00
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 14,995.00	$ 239,920.00

1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 11,929.00	$ 835,030.00
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 17,420.00	$ 348,400.00
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 50,320.00	$ 452,880.00
1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 12,676.00	$ 722,532.00
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 91,803.00	$ 918,030.00
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 40,929.00	$ 122,787.00
1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 654,012.00	$ 654,012.00
1.31	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 107,403.00	$ 1,503,642.00
2	Sala de audiencias No. 2				
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 11,253.00	$ 90,024.00
1.02	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 101,904.00	$ 1,019,040.00
1.03	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 52,130.00	$ 4,170,400.00
1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 58,952.00	$ 1,061,136.00
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 32,982.00	$ 263,856.00
1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 40,982.00	$ 327,856.00
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 28,366.00	$ 28,366.00
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 42,982.00	$ 85,964.00

1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 778,755.00	$ 1,557,510.00
1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 98,755.00	$ 98,755.00
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1	$ 161,265.00	$ 161,265.00
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 98,953.00	$ 791,624.00
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 3,592.00	$ 1,077,600.00
1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 5,934.00	$ 106,812.00
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 542,530.00	$ 1,627,590.00
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 118,216.00	$ 2,837,184.00
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 737,075.00	$ 2,211,225.00
1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1	$ 70,255.00	$ 70,255.00
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 101,136.00	$ 606,816.00
1.2	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 63,802.00	$ 319,010.00

1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 22,971.00	$ 367,536.00
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 14,995.00	$ 239,920.00
1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 11,929.00	$ 835,030.00
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 17,420.00	$ 348,400.00
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 50,320.00	$ 452,880.00
1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 12,676.00	$ 722,532.00
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 91,803.00	$ 918,030.00
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 40,929.00	$ 122,787.00
1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 654,012.00	$ 654,012.00
1.31	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 107,403.00	$ 1,503,642.00
4	Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK				
4.10	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	16	$ 23,825.00	$ 381,200.00
4.11	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1	$ 57,967.00	$ 57,967.00

4.12	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	1	$ 406,920.00	$ 406,920.00
4.13	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1	$ 1,105,060.00	$ 1,105,060.00
4.14	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1	$ 110,221.00	$ 110,221.00
5	Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium				
5.10	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100	$ 33,606.00	$ 3,360,600.00
				TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 54,775,978.00
				ADMINISTRACION 22.00%	$ 12,050,715.00
				IMPREVISTOS 2.00%	$ 1,095,520.00
				UTILIDAD 5.00%	$ 2,738,799.00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 10.00%	$ 5,477,598.00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00%	$ 520,372.00
				TOTAL OFERTA ECONOMICA	$ 76,658,982.00

Se muestra a continuación el presupuesto actualizado de acuerdo a modificación N°2:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE OBRA No. 2		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TORRE GENTIUM - 7MO PISO				
1	Sala de audiencias No. 1				
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8.00	$ 11,253.00	$ 90,024.00
1.02	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	8.00	$ 101,896.00	$ 815,168.00
1.03	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	0.00	$ 52,130.00	$ 0.00
1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	0.00	$ 58,952.00	$ 0.00
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	9.00	$ 32,982.00	$ 296,838.00
1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	7.00	$ 40,982.00	$ 286,874.00
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1.00	$ 28,366.00	$ 28,366.00
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	1.00	$ 42,982.00	$ 42,982.00

1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2.00	$ 778,755.00	$ 1,557,510.00
1.10	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1.00	$ 98,755.00	$ 98,755.00
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1.00	$ 161,265.00	$ 161,265.00
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	0.00	$ 98,953.00	$ 0.00
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	0.00	$ 3,592.00	$ 0.00
1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	13.50	$ 5,934.00	$ 80,109.00
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	2.58	$ 542,530.00	$ 1,399,727.00
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	16.85	$ 118,215.00	$ 1,991,923.00
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	2.05	$ 737,075.00	$ 1,511,004.00
1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1.00	$ 70,255.00	$ 70,255.00
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	3.63	$ 101,136.00	$ 367,124.00
1.20	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	2.93	$ 63,802.00	$ 186,940.00
1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	8.94	$ 22,971.00	$ 205,361.00
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	8.97	$ 14,995.00	$ 134,505.00
1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	67.76	$ 11,929.00	$ 808,309.00
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	21.26	$ 17,420.00	$ 370,349.00
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	5.87	$ 50,320.00	$ 295,378.00
1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	44.18	$ 12,676.00	$ 560,026.00
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	5.99	$ 91,803.00	$ 549,900.00
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	11.89	$ 40,929.00	$ 486,646.00

1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1.00	$ 654,012.00	$ 654,012.00
1.31	Persianas tipo black-out	m2	10.18	$ 107,403.00	$ 1,093,363.00
	ITEMS NUEVOS				
NP-1	Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU	UND	1.00	$ 151,640.00	$ 151,640.00
NP-2	Instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00	$ 650,860.00	$ 650,860.00
NP-3	Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00	$ 706,418.00	$ 706,418.00
NP-4	Suministro e instalación de soporte pie de amigo	UND	1.00	$ 68,344.00	$ 68,344.00
NP-6	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a	ML	493.00	$ 7,195.00	$ 3,547,135.00
NP-7	Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)	UND	9.00	$ 140,034.00	$ 1,260,306.00
NP-8	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a	UND	9.00	$ 58,504.00	$ 526,536.00
NP-10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)	UND	8.00	$ 51,188.00	$ 409,504.00
NP-11	Salida de luminaria	UND	11.00	$ 62,910.00	$ 692,010.00
NP-12	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1.00	$ 37,782.00	$ 37,782.00
NP-13	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"	ML	9.35	$ 11,846.00	$ 110,760.00
NP-14	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"	ML	20.81	$ 15,530.00	$ 323,179.00
NP-15	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	119.40	$ 46,584.00	$ 5,562,130.00
NP-16	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division	ML	31.98	$ 77,897.00	$ 2,491,146.00
NP-17	Suministro e instalacion de troquel triple metalico	UND	7.00	$ 65,880.00	$ 461,160.00
NP-18	Suministro e instalacion de troquel doble metalico	UND	2.00	$ 40,030.00	$ 80,060.00
NP-19	Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica	UND	0.00	$ 22,527.00	$ 0.00
NP-20	Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w	UND	3.00	$ 38,445.00	$ 115,335.00
NP-21	Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)	UND	9.00	$ 52,311.00	$ 470,799.00
2	Sala de audiencias No.2				
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8.00	$ 11,253.00	$ 90,024.00
1.02	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	9.00	$ 101,904.00	$ 917,136.00
1.03	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	0.00	$ 52,130.00	$ 0.00

1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	0.00	$ 58,952.00	$ 0.00
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	11.00	$ 32,982.00	$ 362,802.00
1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	9.00	$ 40,982.00	$ 368,838.00
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1.00	$ 28,366.00	$ 28,366.00
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	1.00	$ 42,982.00	$ 42,982.00
1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2.00	$ 778,755.00	$ 1,557,510.00
1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1.00	$ 98,755.00	$ 98,755.00
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1.00	$ 161,265.00	$ 161,265.00
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	0.00	$ 98,953.00	$ 0.00
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	0.00	$ 3,592.00	$ 0.00
1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	12.00	$ 5,934.00	$ 71,208.00
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3.52	$ 542,530.00	$ 1,909,706.00
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	14.46	$ 118,216.00	$ 1,709,403.00
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	2.80	$ 737,075.00	$ 2,063,810.00
1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1.00	$ 70,255.00	$ 70,255.00
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	3.83	$ 101,136.00	$ 387,351.00
1.20	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	3.38	$ 63,802.00	$ 215,651.00
1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	9.22	$ 22,971.00	$ 211,793.00
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	9.18	$ 14,995.00	$ 137,654.00
1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73.24	$ 11,929.00	$ 873,680.00
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	19.80	$ 17,420.00	$ 344,916.00
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	6.65	$ 50,320.00	$ 334,628.00

1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	46.77	$ 12,676.00	$ 592,857.00
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	1.43	$ 91,803.00	$ 131,278.00
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	11.13	$ 40,929.00	$ 455,540.00
1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1.00	$ 654,012.00	$ 654,012.00
1.31	Persianas tipo black-out	m2	11.14	$ 107,403.00	$ 1,196,469.00
	ITEMS NUEVOS				
NP-1	Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU	UND	1.00	$ 151,640.00	$ 151,640.00
NP-2	Instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00	$ 650,860.00	$ 650,860.00
NP-3	Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	2.00	$ 706,418.00	$ 1,412,836.00
NP-4	Suministro e instalación de soporte pie de amigo	UND	1.00	$ 68,344.00	$ 68,344.00
NP-5	Salida para aire acondicionado de tablero a condensadora	UND	1.00	$ 446,040.00	$ 446,040.00
NP-6	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a	ML	377.00	$ 7,195.00	$ 2,712,515.00
NP-7	Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)	UND	11.00	$ 140,034.00	$ 1,540,374.00
NP-8	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a	UND	11.00	$ 58,504.00	$ 643,544.00
NP-10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)	UND	8.00	$ 51,188.00	$ 409,504.00
NP-11	Salida de luminaria	UND	13.00	$ 62,910.00	$ 817,830.00
NP-12	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1.00	$ 37,782.00	$ 37,782.00
NP-13	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"	ML	7.40	$ 11,846.00	$ 87,660.00
NP-14	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"	ML	12.10	$ 15,530.00	$ 187,913.00
NP-15	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	138.83	$ 46,584.00	$ 6,467,257.00
NP-16	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division	ML	41.56	$ 77,897.00	$ 3,237,500.00
NP-17	Suministro e instalacion de troquel triple metalico	UND	9.00	$ 65,880.00	$ 592,920.00
NP-18	Suministro e instalacion de troquel doble metalico	UND	2.00	$ 40,030.00	$ 80,060.00
NP-19	Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica	UND	0.00	$ 22,527.00	$ 0.00
NP-20	Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w	UND	4.00	$ 38,445.00	$ 153,780.00

NP-21	Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)	UND	8.00	$ 52,311.00	$ 418,488.00
4	Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK				
4.10	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	0.00	$ 23,825.00	$ 0.00
4.11	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1.00	$ 57,967.00	$ 57,967.00
4.12	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	0.00	$ 406,920.00	$ 0.00
4.13	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1.00	$ 1,105,060.00	$ 1,105,060.00
4.14	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1.00	$ 110,221.00	$ 110,221.00
	ITEMS NUEVOS				
NP-9	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6a	UND	1.00	$ 1,317,530.00	$ 1,317,530.00
5	Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium				
5.10	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100.00	$ 33,606.00	$ 3,360,600.00
				TOTAL, COSTO DIRECTO OBRA CIVIL:	$ 72,863,931.00
				ADMINISTRACIÓN: 22.0%	$ 16,030,065.00
				IMPREVISTOS: 2.0%	$ 1,457,279.00
				UTILIDAD: 5.0%	$ 3,643,197.00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 10.0%	$ 7,286,393.00
				IVA SOBRE UTILIDAD: 19.0%	$ 692,207.00
				TOTAL, COSTO OBRA CIVIL:	$ 101,973,072.00

4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La ejecución de las actividades se realizó de lunes a viernes, fines de semanas y festivos en el horario de 7:00 a.m. a 05:00 p.m.

Se anexa la programación de obras en la que se muestra la proyección que se realizó para la ejecución de las labores.

4.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el lapso de tiempo del 23 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025, periodo que comprende el presente informe, en cada una de las salas de audiencia se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD (CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE OBRA No. 2)	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
	TORRE GENTIUM - 7MO PISO				
1	Sala de audiencias No. 1				
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8.00	8.00	100.0%
1.02	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	8.00	8.00	100.0%
1.03	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	0.00	0.00	0.0%
1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	0.00	0.00	0.0%
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	9.00	9.00	100.0%
1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	7.00	7.00	100.0%
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1.00	1.00	100.0%
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	1.00	1.00	100.0%
1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2.00	2.00	100.0%
1.10	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1.00	1.00	100.0%
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1.00	1.00	100.0%
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	0.00	0.00	0.0%
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	0.00	0.00	0.0%
1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	13.50	13.50	100.0%
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	2.58	2.58	100.0%
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	16.85	16.85	100.0%
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	2.05	2.05	100.0%

1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1.00	1.00	100.0%
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	3.63	3.63	100.0%
1.20	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	2.93	2.93	100.0%
1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	8.94	8.94	100.0%
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	8.97	8.97	100.0%
1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	67.76	67.76	100.0%
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	21.26	21.26	100.0%
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	5.87	5.87	100.0%
1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	44.18	44.18	100.0%
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	5.99	5.99	100.0%
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	11.89	11.89	100.0%
1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1.00	1.00	100.0%
1.31	Persianas tipo black-out	m2	10.18	10.18	100.0%
	ITEMS NUEVOS				
NP-1	Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-2	Instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-3	Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su	UND	1.00	1.00	100.0%

	correcta instalación y puesta en funcionamiento)				
NP-4	Suministro e instalación de soporte pie de amigo	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-6	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a	ML	493.00	493.00	100.0%
NP-7	Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)	UND	9.00	9.00	100.0%
NP-8	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a	UND	9.00	9.00	100.0%
NP-10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)	UND	8.00	8.00	100.0%
NP-11	Salida de luminaria	UND	11.00	11.00	100.0%
NP-12	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-13	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"	ML	9.35	9.35	100.0%
NP-14	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"	ML	20.81	20.81	100.0%
NP-15	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	119.40	119.40	100.0%
NP-16	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division	ML	31.98	23.98	75.0%
NP-17	Suministro e instalacion de troquel triple metalico	UND	7.00	7.00	100.0%
NP-18	Suministro e instalacion de troquel doble metalico	UND	2.00	2.00	100.0%
NP-19	Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica	UND	0.00	0.00	0.0%
NP-20	Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w	UND	3.00	3.00	100.0%
NP-21	Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)	UND	9.00	9.00	100.0%
2	Sala de audiencias No.2				
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8.00	8.00	100.0%
1.02	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	9.00	9.00	100.0%
1.03	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	0.00	0.00	0.0%
1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	0.00	0.00	0.0%
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	11.00	11.00	100.0%

1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	9.00	9.00	100.0%
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1.00	1.00	100.0%
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	1.00	1.00	100.0%
1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2.00	2.00	100.0%
1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1.00	1.00	100.0%
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1.00	1.00	100.0%
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	0.00	0.00	0.0%
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	0.00	0.00	0.0%
1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	12.00	12.00	100.0%
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3.52	3.52	100.0%
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	14.46	14.46	100.0%
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	2.80	2.80	100.0%
1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1.00	1.00	100.0%
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	3.83	3.83	100.0%
1.20	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	3.38	3.38	100.0%
1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	9.22	9.22	100.0%

1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	9.18	9.18	100.0%
1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73.24	73.24	100.0%
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	19.80	19.80	100.0%
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	6.65	6.65	100.0%
1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	46.77	46.77	100.0%
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	1.43	1.43	100.0%
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	11.13	11.13	100.0%
1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1.00	1.00	100.0%
1.31	Persianas tipo black-out	m2	11.14	11.14	100.0%
	ITEMS NUEVOS				0.0%
NP-1	Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-2	Instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-3	Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	2.00	2.00	100.0%
NP-4	Suministro e instalación de soporte pie de amigo	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-5	Salida para aire acondicionado de tablero a condensadora	UND	1.00	1.00	100.0%
NP-6	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a	ML	377.00	377.00	100.0%
NP-7	Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)	UND	11.00	11.00	100.0%
NP-8	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a	UND	11.00	11.00	100.0%
NP-10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)	UND	8.00	8.00	100.0%
NP-11	Salida de luminaria	UND	13.00	13.00	100.0%
NP-12	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1.00	1.00	100.0%

NP-13	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"	ML	7.40	7.40	100.0%
NP-14	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"	ML	12.10	12.10	100.0%
NP-15	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	138.83	138.83	100.0%
NP-16	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division	ML	41.56	30.91	74.4%
NP-17	Suministro e instalacion de troquel triple metalico	UND	9.00	9.00	100.0%
NP-18	Suministro e instalacion de troquel doble metalico	UND	2.00	2.00	100.0%
NP-19	Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica	UND	0.00	0.00	0.0%
NP-20	Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w	UND	4.00	4.00	100.0%
NP-21	Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)	UND	8.00	8.00	100.0%
4	Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK				
4.10	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	0.00	0.00	0.0%
4.11	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1.00	1.00	100.0%
4.12	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	0.00	0.00	0.0%
4.13	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1.00	1.00	100.0%
4.14	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1.00	1.00	100.0%
	ITEMS NUEVOS				0.0%
NP-9	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6a	UND	1.00	1.00	100.0%
5	Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium				
5.10	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100.00	100.00	100.0%

A continuación se muestra la evidencia fotográfica del cumplimiento de cada uno de los ítems del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	TORRE GENTIUM - 7MO PISO			
1	Sala de audiencias No. 1			
1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8.00	
1.02	Suministro e instalación de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	UND	8.00	
1.03	Suministro e instalación de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	0.00	
1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	0.00	
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	9.00	

1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	7.00	
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1.00	
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	1.00	
1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2.00	

1.10	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1.00	
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1.00	
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	0.00	
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	0.00	

1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	13.50	
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	2.58	
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	16.85	
1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	2.05	

1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1.00		
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	3.63		
1.20	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	2.93		

1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	8.94		
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	8.97		
1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	67.76		
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	21.26		

1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	5.87		
1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	44.18		
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	5.99		

				
1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	11.89	 


1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1.00		
1.31	Persianas tipo black-out	m2	10.18		
	ITEMS NUEVOS				
NP-1	Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU	UND	1.00		
NP-2	Instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00		



NP-3	Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00	 
NP-4	Suministro e instalación de soporte pie de amigo	UND	1.00	


NP-6	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a	ML	493.00		
NP-7	Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)	UND	9.00		 
NP-8	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a	UND	9.00		

NP-10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)	UND	8.00		
NP-11	Salida de luminaria	UND	11.00		

NP-12	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1.00			
NP-13	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"	ML	9.35			
NP-14	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"	ML	20.81			

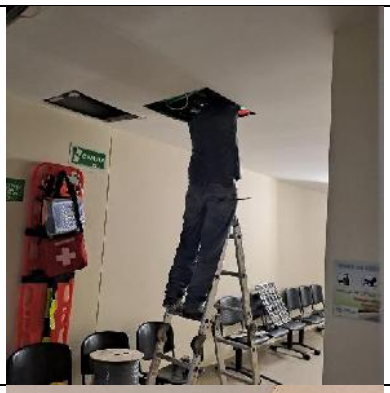					
NP-15	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	119.40		
NP-16	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division	ML	23.98		
NP-17	Suministro e instalacion de troquel triple metalico	UND	7.00		

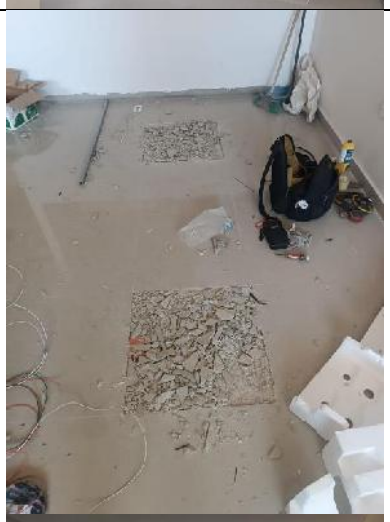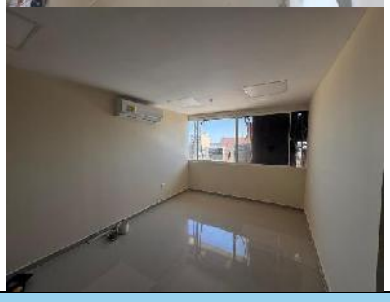NP-18	Suministro e instalacion de troquel doble metalico	UND	2.00	
NP-19	Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica	UND	0.00	
NP-20	Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w	UND	3.00	
NP-21	Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)	UND	9.00	 
2	Sala de audiencias No.2			

1.01	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8.00	
1.02	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	9.00	 
1.03	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	0.00	
1.04	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	0.00	
1.05	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	11.00	

1.06	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	9.00		
1.07	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1.00		
1.08	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	1.00		
1.09	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2.00		

1.1	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1.00	
1.11	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1.00	
1.12	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	0.00	
1.13	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	0.00	

1.14	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	12.00	
1.15	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3.52	 
1.16	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	14.46	

1.17	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	2.80		
1.18	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.	UND	1.00		
1.19	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	3.83		

1.20	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	3.38		
1.21	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	9.22		
1.22	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	9.18		

1.23	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73.24		
1.24	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	19.80		
1.25	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	6.65		

1.26	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	46.77		
1.27	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	1.43		 


1.28	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	11.13	 
1.29	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1.00	
1.31	Persianas tipo black-out	m2	11.14	
	ITEMS NUEVOS			

NP-1	Desmonte de aire acondicionado en rango de 18.000 BTU a 24.000 BTU	UND	1.00		
NP-2	Instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	1.00		
NP-3	Instalacion de aire acondicionado de 24.000 BTU (Incluye materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento)	UND	2.00		

NP-4	Suministro e instalación de soporte pie de amigo	UND	1.00	
NP-5	Salida para aire acondicionado de tablero a condensadora	UND	1.00	
NP-6	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6a	ML	377.00	


NP-7	Suminstro e instalacion de punto de datos (incluye face plate sencillo, jack cat 6a y patch cord de 3 mts cat 6a)	UND	11.00	 
NP-8	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts CAT 6a	UND	11.00	

NP-10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall en vanos de luminarias 60x60 (incluye refozarmiento de estructura metalica)	UND	8.00	
NP-11	Salida de luminaria	UND	13.00	

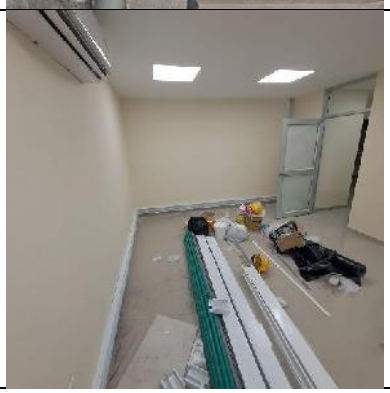NP-12	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1.00			
NP-13	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 1/2"	ML	7.40			
NP-14	Suministro e instalacion de tuberia SCH40 3/4"	ML	12.10			


NP-15	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	138.83	
NP-16	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5 con division	ML	30.91	
NP-17	Suministro e instalacion de troquel triple metalico	UND	9.00	
NP-18	Suministro e instalacion de troquel doble metalico	UND	2.00	
NP-19	Suministro e instalacion de accesorio tapa final para canaleta metalica	UND	0.00	
NP-20	Suministro e instalacion de panel led redondo de 18w	UND	4.00	

NP-21	Suministro e instalacion de porcelanato en reemplazo de piezas en mal estado (incluye demolicion y retiro de pieza existente)	UND	8.00	
4	Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK			
4.10	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	0.00	
4.11	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1.00	
4.12	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	0.00	
4.13	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1.00	
4.14	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1.00	
	ITEMS NUEVOS			

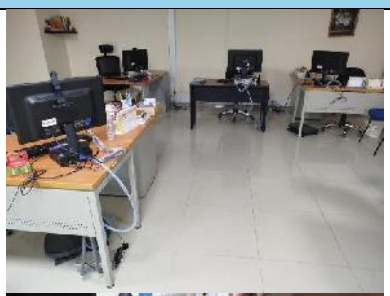NP-9	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6a	UND	1.00	
5	Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium			
5.10	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100.00	 

4.5 AVANCE DE OBRA

A continuación, se muestra la relación de porcentaje de avance vs porcentaje por ejecutar, concluyendo que el contrato de obra ejecutó al 100% las actividades establecidas dentro del contrato.

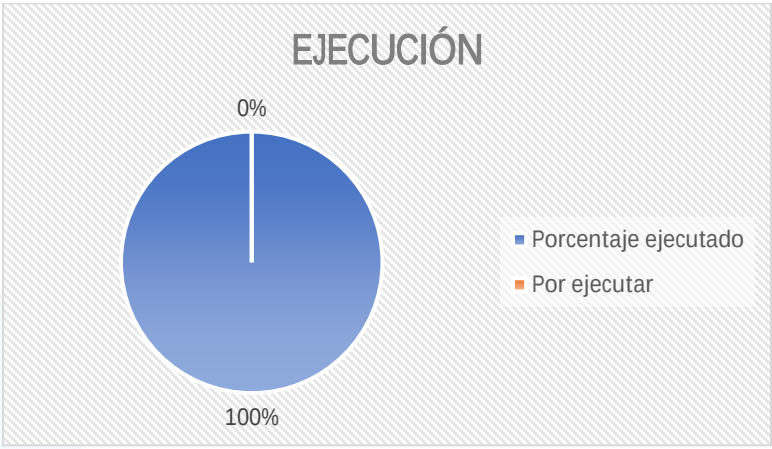

A la fecha del presente informe se registra un porcentaje de avance físico acumulado del 98.01% con respecto al valor estipulado para el contrato, sin embargo, el contrato de obra está finalizado en un 100% cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual, la variación existente es porque unas cantidades contempladas inicialmente dieron menores cantidades en la ejecución en campo.

4.6 CUMPLIMIENTO CON LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución del contrato, JEMAD INGENIERIA S.A.S ha cumplido a cabalidad con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de cada una de las personas que ha participado en el proyecto, para lo cual se adjuntan las respectivas planillas de pago (VER ANEXOS).

4.7 CUMPLIMIENTO CON LA REALIZACIÓN DE EXAMENES DE INGRESO Y ENTREGAS DE EPP

Durante la ejecución del contrato, JEMAD INGENIERIA S.A.S ha cumplido a cabalidad con la realización de los respectivos exámenes de ingreso de cada una de las personas que ha participado en el proyecto, para lo cual se adjuntan los respectivos exámenes como evidencia; de igual forma, a todo el personal se le ha entregado la dotación respectiva y Equipos de Protección Personal conforme sus actividades a desarrollar (VER ANEXOS).

4.8 CUMPLIMIENTO CON EL PAGO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES

JEMAD INGENIERIA S.A.S certifico que a la fecha me encuentro al día con los pagos correspondientes a la totalidad de empleados y proveedores que han hecho parte de nuestro equipo durante la ejecución del contrato.

5. CONCLUSIONES

- La ejecución de las actividades de dicho informe se realizaron desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 10 de febrero de 2025, periodo dentro del plazo establecido para la ejecución, debido a que a través del Clausulado Modificación N°1 se prorrogó por un mes y a través del Clausulado modificación N°2 se prorrogó diez (10) días, para un total adicionado en tiempo de un (1) mes y diez (10) días calendarios.
- El contrato no presentó suspensión, por tanto, no se realizaron actas de suspensión ni reinicios.
- El valor del contrato inicialmente fue de $76,658,982.00 M/CTE y mediante Clausulado Modificación Nº2 del 31 de enero de 2025, se realizó una adición en valor de $25,314,090.00 M/CTE, quedando el valor final del contrato de $101,973,072.00 M/CTE, en obra se ejecutaron $ 99,939,766.00 M/CTE, quedando un saldo a favor de la entidad de $ 2,033,306.00 M/CTE.
- Se acataron las observaciones impartidas por la supervisión e interventoría durante la ejecución.
- Se suministró la totalidad de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas e índices de calidad establecidos, insumos

y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos de instalación, desinstalación, transporte, obras civiles y demás.

→ Se realizó la limpieza constante durante la ejecución y la acumulación de los escombros para su retiro, manteniendo así las sedes limpias y aseadas.

→ Se constituyeron las pólizas solicitadas para el cumplimiento del contrato MC 22 de 2024.

→ Se actualizaron las pólizas conforme a las modificaciones realizadas.

6. RECOMENDACIONES

A. Mantenimiento de Infraestructura y Acabados.
   - Puertas Metálicas y de Vidrio: Limpiar con productos adecuados y lubricar bisagras cada 6 meses para evitar oxidación o rigidez.
   - Muros en Drywall y Mampostería: Inspección visual cada año para detectar fisuras o desgaste en la pintura, con retoques si es necesario.
   - Pintura y Señalización: Limpieza con paño seco y reposición de señalización desgastada cada 2 años.

B. Mantenimiento de Sistemas Eléctricos e Iluminación.
   - Luminarias LED: Limpieza mensual del polvo y verificación anual del funcionamiento para detectar cualquier posible falla prematura.
   - Tomacorrientes e Interruptores: Revisión anual para asegurar un buen ajuste y conexión sin necesidad de reemplazos.
   - Canaletas Metálicas: Mantener limpias y asegurarse de que no haya obstrucciones que afecten la ventilación de los cables.

C. Redes de Datos.

- Patch Panel y Equipos de Conectividad: Limpieza de polvo en los equipos cada 3 meses y revisión anual para garantizar óptima conexión.
- Rack de Comunicaciones: Mantener el área libre de polvo y asegurar ventilación adecuada para evitar sobrecalentamiento.

D. Climatización y Cielo Raso

- Aire Acondicionado: Limpieza de filtros cada 3 meses y mantenimiento preventivo anual por parte de personal técnico especializado.
- Cielo Raso en Drywall: Inspección anual para verificar que no haya filtraciones de agua o deformaciones.

E. Plan de Mantenimiento General

- Programa de Mantenimiento Preventivo: Implementar un cronograma semestral para revisar todos los sistemas e instalaciones.
- Registro de Intervenciones: Documentar cada mantenimiento realizado para facilitar futuras revisiones y garantizar cumplimiento de garantías.

Las adecuaciones realizadas se ejecutaron con materiales de calidad, garantizando su durabilidad y óptimo funcionamiento. Además, el contrato cuenta con pólizas de cumplimiento que respaldan la garantía de los

trabajos ejecutados, brindando un soporte adicional ante posibles imprevistos.

Sin embargo, es fundamental que la entidad implemente las recomendaciones señaladas, para preservar las obras entregadas en óptimas condiciones. El adecuado uso y cuidado de las instalaciones garantizará su funcionalidad a largo plazo, evitando desgastes prematuros y asegurando que las adecuaciones cumplan su propósito dentro del tiempo estimado.

ATENTAMENTE,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
C.C No. 1.102.876.220 de Sincelejo
REP. LEGAL - JEMAD INGENIERIA SAS

ANEXOS

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com




































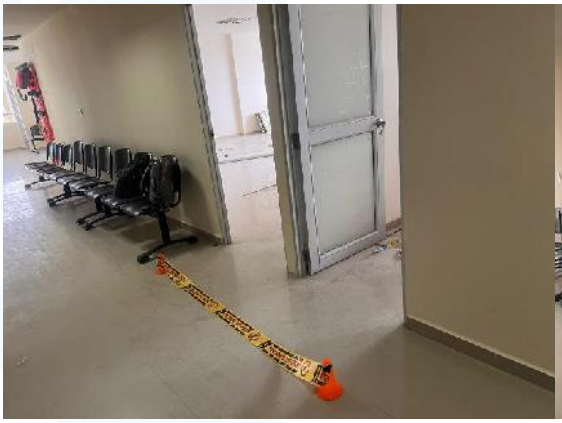

















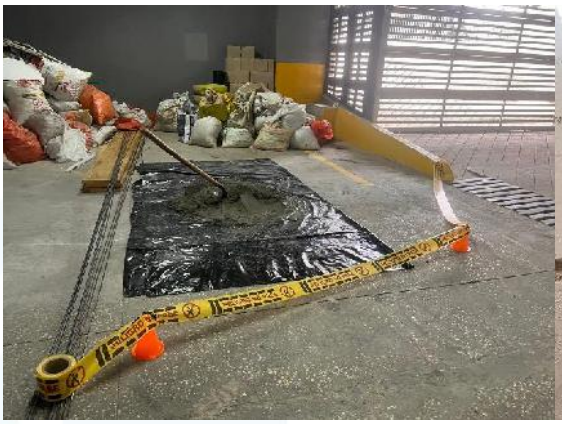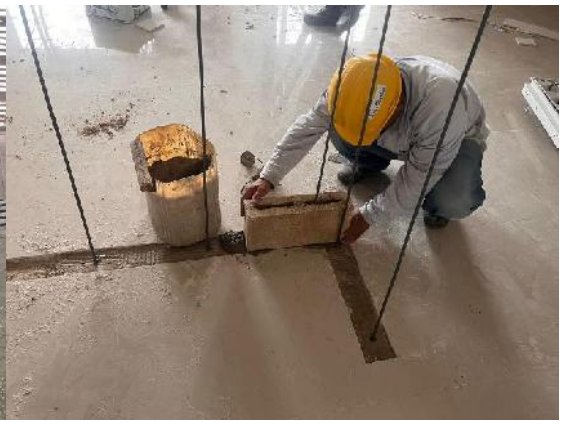













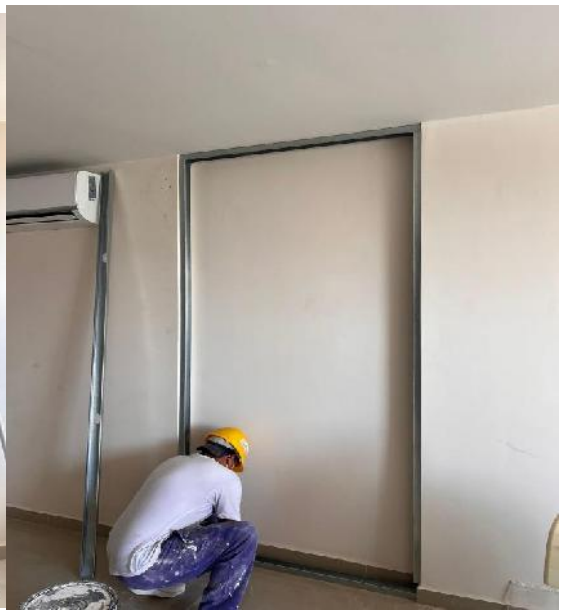

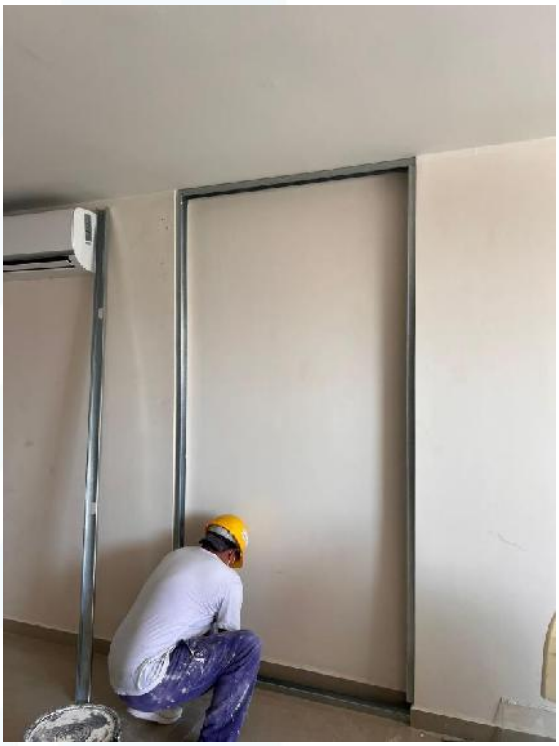






















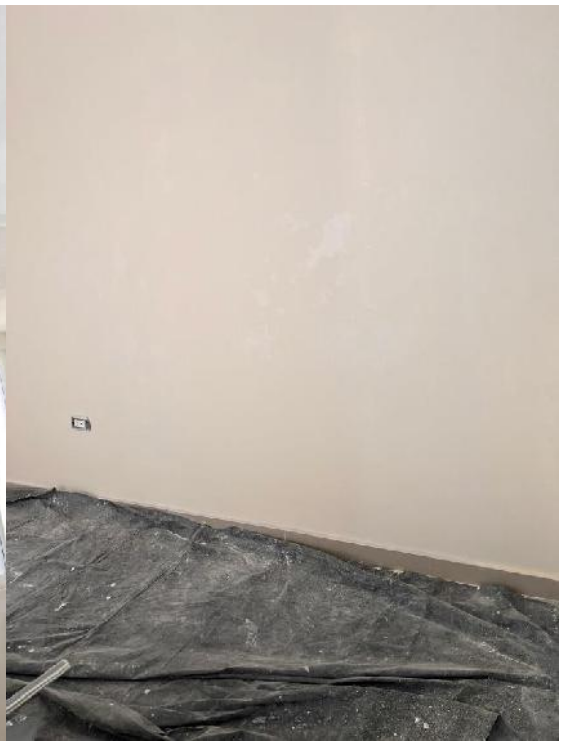








SYLVANIA

























































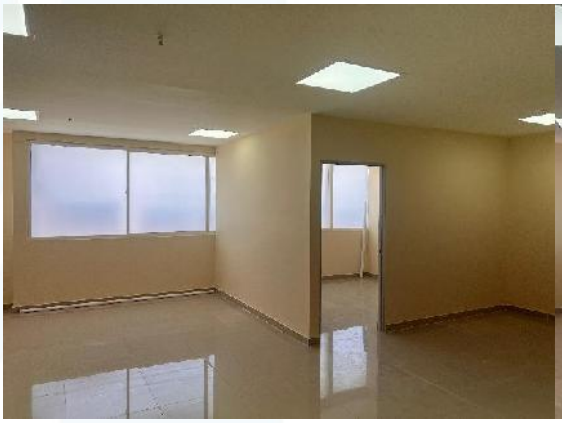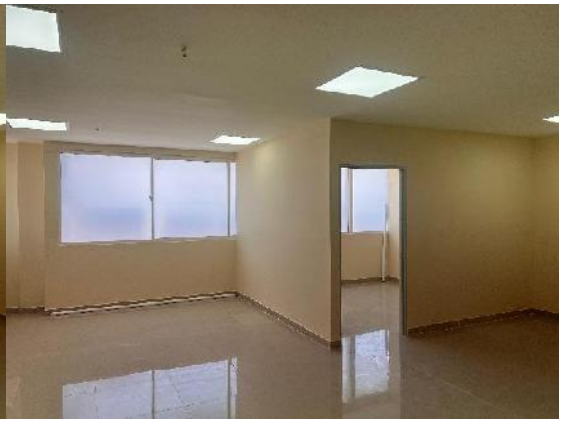


























GIROS












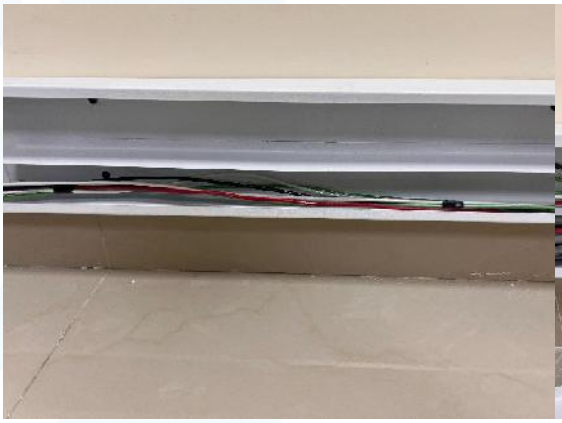


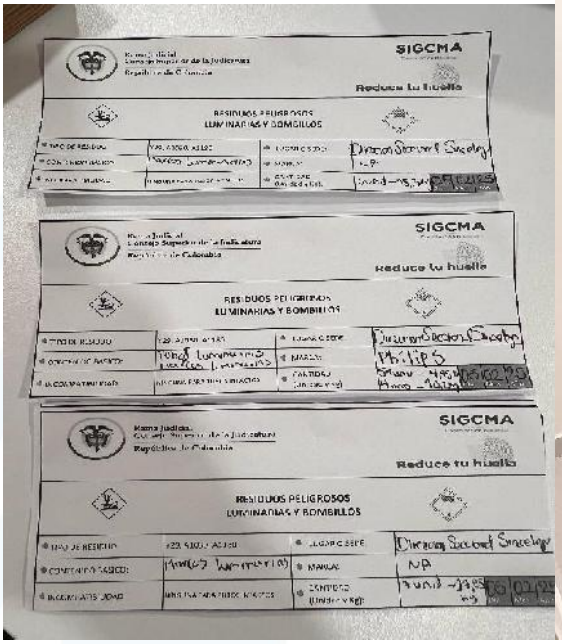


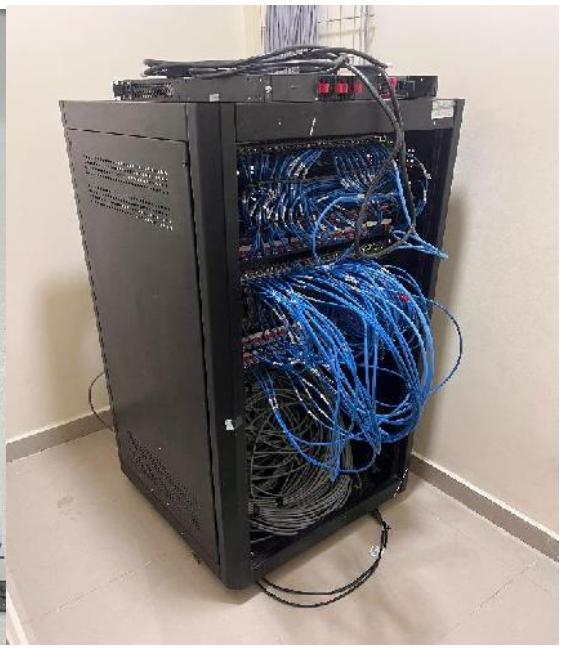SIGCMA
Reduce tu Huella
RESIDUOS PELIGROSOS
LUMINARIAS Y BOMBILLOS
SIGCMA
Reduce tu Huella
RESIDUOS PELIGROSOS
LUMINARIAS Y BOMBILLOS
SIGCMA
Reduce tu Huella
RESIDUOS PELIGROSOS
LUMINARIAS Y BOMBILLOS



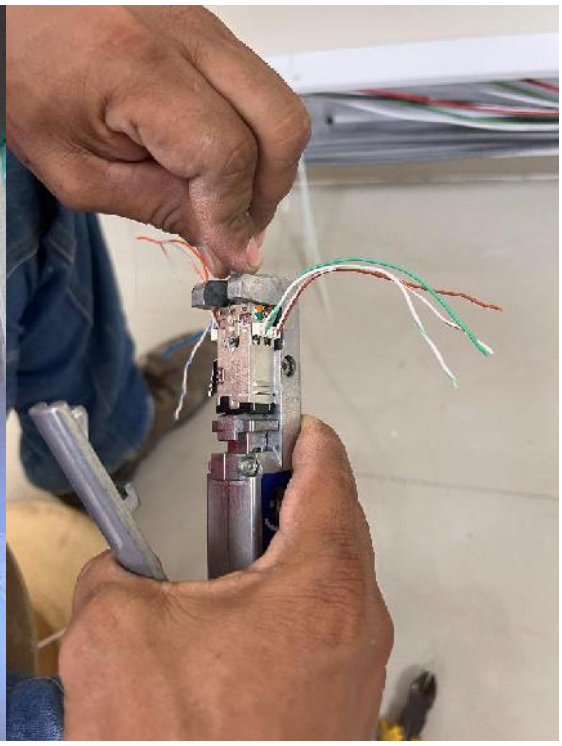

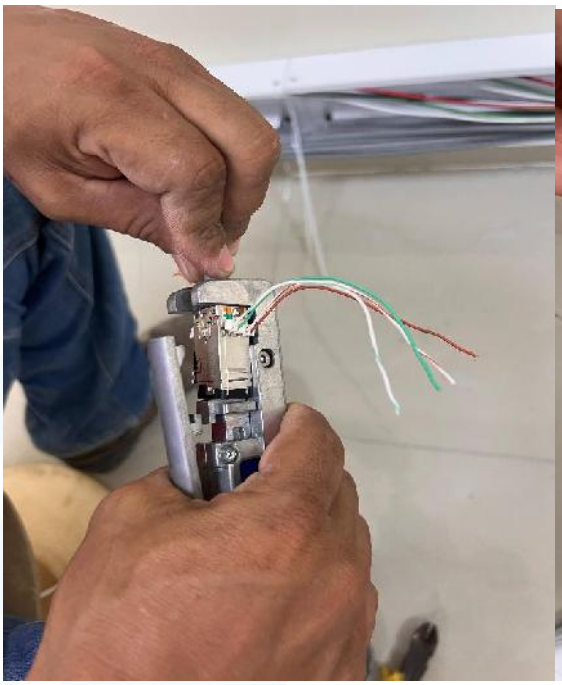

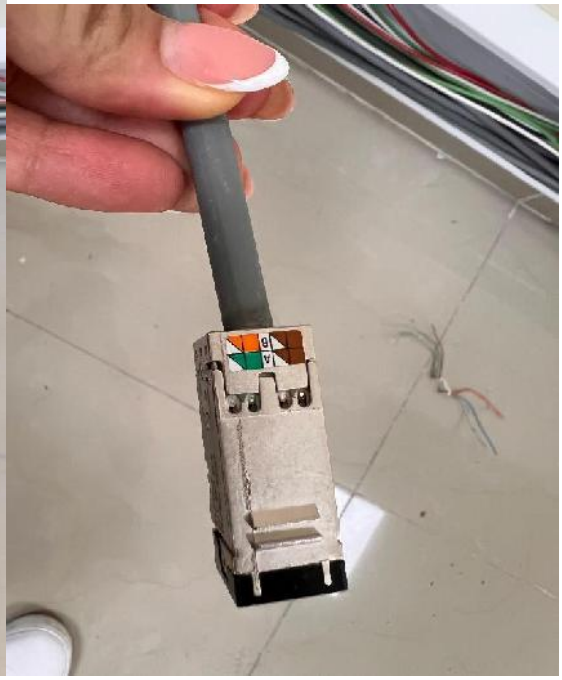





























KARLUZ


tp-link omada


KARLUZ



KARLUZ


McQuay

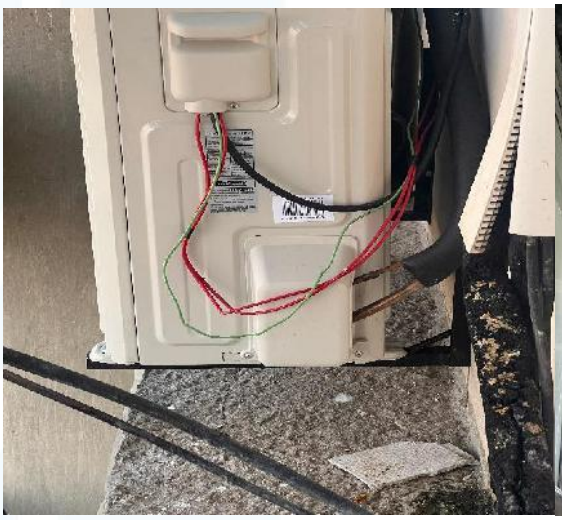



McQuay



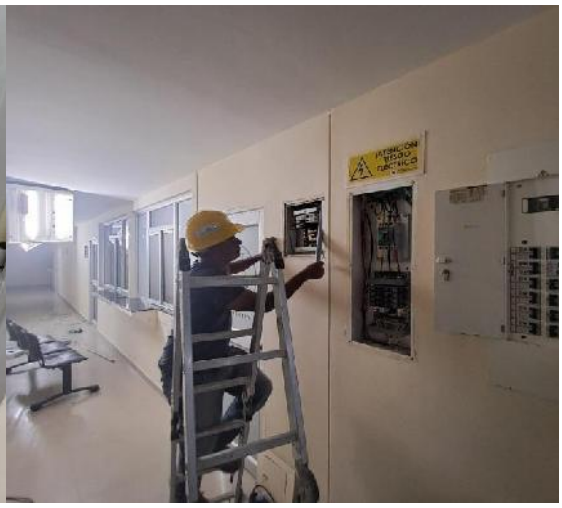



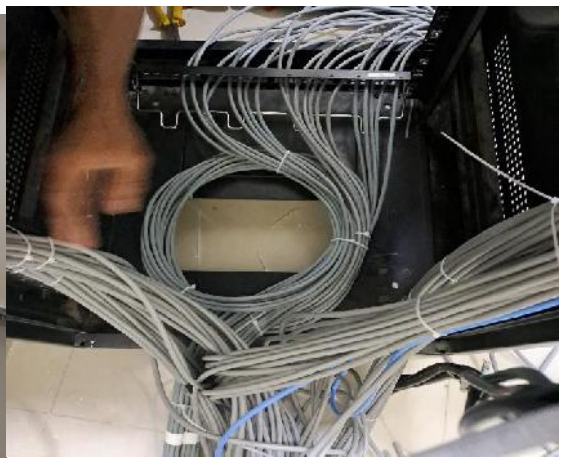




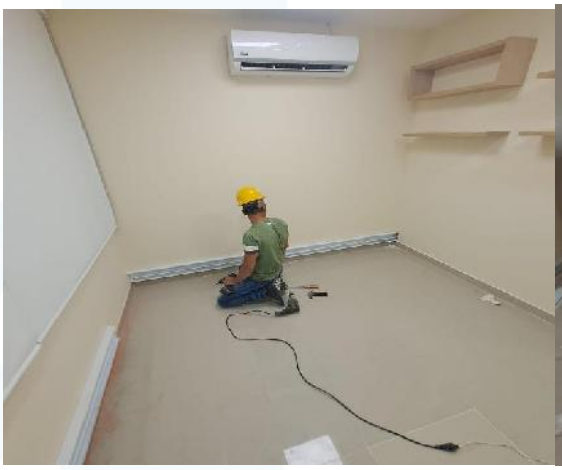




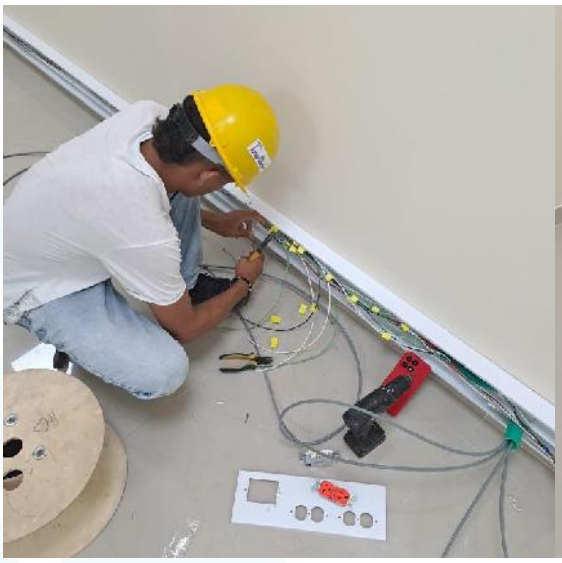







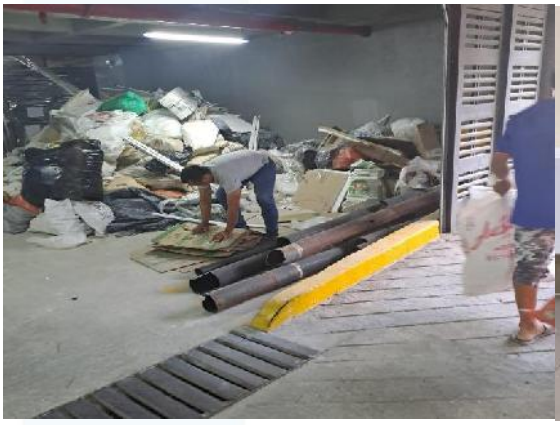











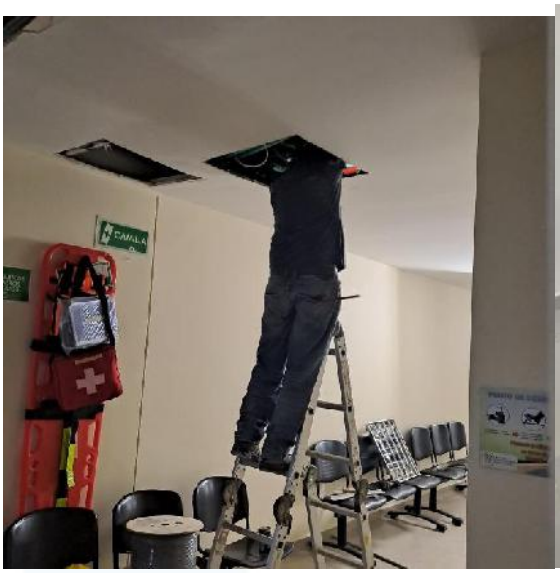







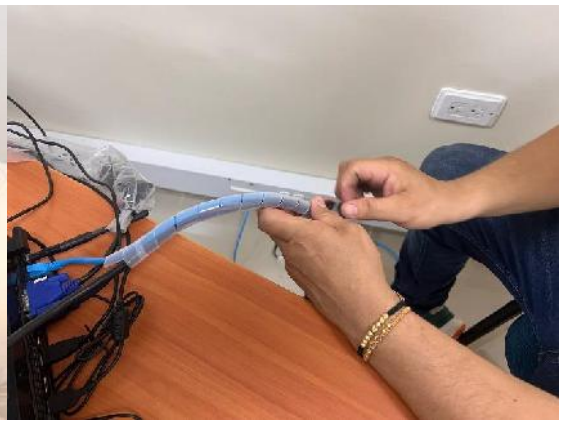

















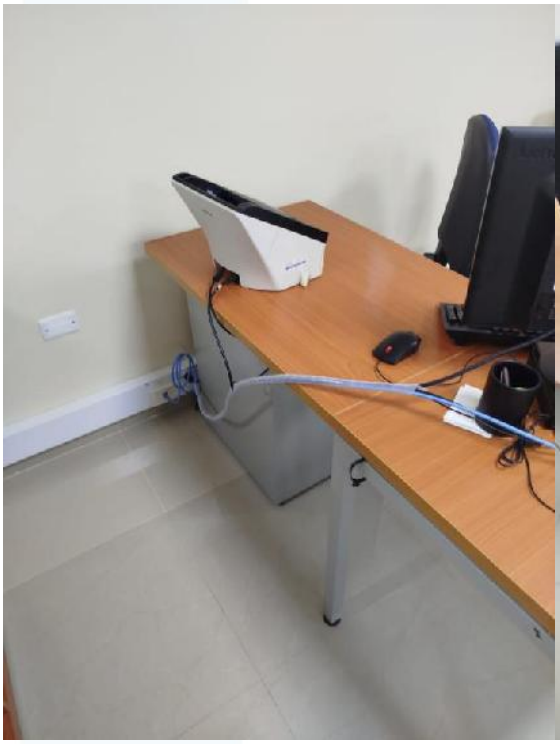





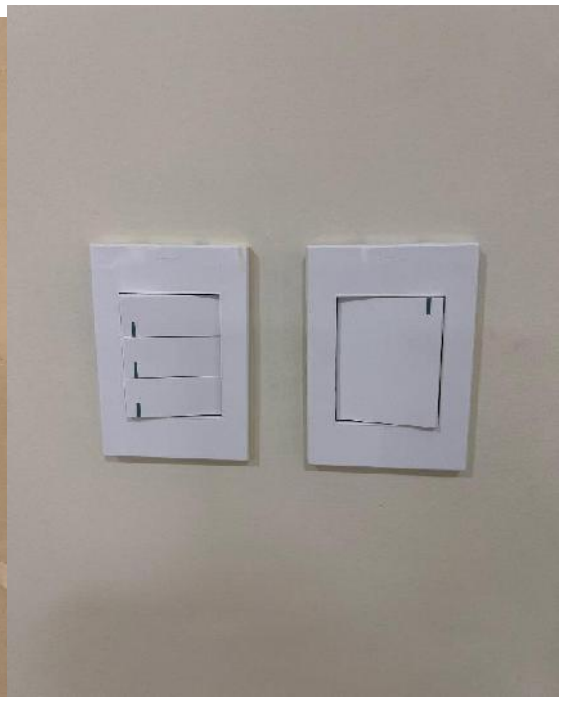





JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

ACTA DE TERMINACIÓN

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

CONTRATO No. : MC 22 DE 2024 (ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7150291)

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC 22 DE 2024

OBJETO : "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 19 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA DE OBRA : JEMAD INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA : INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

SUPERVISIÓN : FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

LIDER DE PROYECTO : Ing. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE **($76.658.982)**
VALOR ADICIÓN	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA PESOS M/CTE **($25.314.090,00)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE **($101.973.072)**

VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($99.939.766)**
FECHA DE INICIO	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA 1	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 1	UN (01) MES
FECHA DE PRORROGA 2	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
PRÓRROGA 2	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	DIEZ 10 DE FEBRERO DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

La Sra. JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA representante legal de JEMAD INGENIERIA S.A.S identificado con Nit: 901539452-9 en calidad de contratista de obra; el Sr. OSCAR LUIS HERAZO SEBA representante legal de INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con Nit: 901752114-6 en calidad de contratista de interventoría; ; y en calidad de SUPERVISOR de la entidad contratante, la ingeniera FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA identificada con cedula de ciudadanía número 1.102.868.216 de Sincelejo-sucre dejan constancia de la presente acta de terminación de plazo contractual.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 76.658.982**
VALOR ADICION	**$ 25.314.090**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 101.973.072**
VALOR EJECUTADO	**$ 99.939.766**

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	**540 47 994000033919**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	10/08/2025	15,331,796.40
PRESTACIONES SOCIALES	23/12/2024	10/02/2028	11,498,847.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	2 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		22,997,694.60
PÓLIZA No.	**540 74 994000007121**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/01/2025	10/02/2025	**260,000,000**

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

El contratista de interventoría OSCAR LUIS HERAZO SEBA representante legal de INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con Nit: 901752114-6 informa a la entidad contratante que a la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que no se encuentran actividades pendientes para cumplir el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el décimo (10) día, del mes de febrero de 2025 por los que en ella intervinieron.

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
Nit: 901539452-9
Representante legal
JEMAD INGENIERIA S.A.S
Contratista de obra

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
Nit: 901752114-6
Representante legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
C.C. 1.102.868.216
Profesional universitario
Dirección Seccional de Administración
Judicial de Sincelejo
Supervisor

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

POLIZAS CONTRACTUALES

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887566

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000033919 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	12	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	17/12/2024	30/04/2025	15,331,796.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	17/12/2024	31/12/2027	11,498,847.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	22,997,694.60

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADOCON LA ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,828,338.30	$ **********190,436	$****15,000.00	$ *******39,033	$ **********244,468

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188756

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790707FB7B59

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887582

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000007121 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
18	12	2024	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	17	12	2024	23:59		31	12	2024	23:59	14	18	12	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	17	12	2024	23:59		31	12	2024	23:59	14
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 16 72 APTO PI 3 302 C PI CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE** TELÉFONO: 6052865458

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DI NIT : 800165944

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: SINCELEJO

DIRECCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 REFERENTE A LAS ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

ASEGURADOS:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO – SUCRE NIT. 800165944-8
JEMAD INGENIERIA S.A.S NIT. 901539452-9

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENFICIARIO SON: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO – SUCRE NIT. 800165944-8 Y/O LOS TERCEROS AFECTADOS

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********50,000	$********0.00	$ *******9,500	$ **********59,500

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MBUSTOSPATRI 0

CBDC20790707FB7B57 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000007121** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

TEXTO ITEM 1

" PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

" PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

" PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

" RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

" AMPARO PATRONAL.
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
" RCE CRUZADA
" RCE MEDICA

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000007121 **ANEXO:** 0 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: JEMAD INGENIERIA SAS **IDENTIFICACION:** 901.539.452-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI	800165944-8	NO APLICA PARA ESTE RAMO	SINCELEJO	260,000,000.00	50,000	59,500

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
50,000	59,500

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

POLIZAS ACTUALIZADAS: ACTA DE INICIO

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887566

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000033919 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2024	27	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	06/05/2025	15,331,796.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/12/2024	06/01/2028	11,498,847.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	22,997,694.60

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADOCON LA ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23/12/2024
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,828,338.30	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188756

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790706FE7F5D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887582

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000007121 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
27	12	2024	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	31	12	2024	23:59		06	01	2025	23:59	6	27	12	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	31	12	2024	23:59		06	01	2025	23:59	6
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 16 72 APTO PI 3 302 C PI CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE** TELÉFONO: 6052865458

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DI NIT : 800165944

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: SINCELEJO

DIRECCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23/12/2024 ASI:
VIGENCIA 23/12/2024 HASTA 06/01/2025
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDC20790706FE7F59

CLIENTE

MBUSTOSPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000007121 **ANEXO:** 1 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 2

TOMADOR: JEMAD INGENIERIA SAS **IDENTIFICACION:** 901.539.452-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI	800165944-8	NO APLICA PARA ESTE RAMO	SINCELEJO	260,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

POLIZAS ACTUALIZADAS: MODIFICATORIO N°1

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887566

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000033919 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	01	2025	03	01	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	31/07/2025	15,331,796.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/12/2024	31/01/2028	11,498,847.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	22,997,694.60

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADOCON LA ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN CLAUSULADO DE MODIFICACION No. 1 PRORROGA No. 1
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,828,338.30	$ ***********4,043	$*****5,000.00	$ ********1,718	$ **********10,761

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188756

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790706FA7F5A

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887582

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000007121 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
03	01	2025	06	01	2025	23:59	31	01	2025	23:59	25	03	01	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
06	01	2025	23:59	31	01	2025	23:59	25

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 16 72 APTO PI 3 302 C PI CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE** TELÉFONO: 6052865458

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DI NIT : 800165944

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: SINCELEJO

DIRECCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 REFERENTE A LAS ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

ASEGURADOS:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO – SUCRE NIT. 800165944-8
JEMAD INGENIERIA S.A.S NIT. 901539452-9

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENFICIARIO SON: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO – SUCRE NIT. 800165944-8 Y/O LOS TERCEROS AFECTADOS

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********53,425	$*****5,000.00	$ *******11,101	$ **********69,525

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDC20790706FA7F59 CLIENTE MBUSTOSPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000007121** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

TEXTO ITEM 1

" PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

" PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

" PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

" RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

" AMPARO PATRONAL.
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
" RCE CRUZADA
" RCE MEDICA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN CLAUSULADO DE MODIFICACION No. 1
PRORROGA No. 1
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000007121 **ANEXO:** 2 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: JEMAD INGENIERIA SAS **IDENTIFICACION:** 901.539.452-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI	800165944-8	NO APLICA PARA ESTE RAMO	SINCELEJO	260,000,000.00	53,425	64,525

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
53,425	64,525

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

POLIZAS ACTUALIZADAS: MODIFICATORIO N°2

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887566

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000033919 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	02	2025	03	02	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	10/08/2025	15,331,796.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/12/2024	10/02/2028	11,498,847.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	22,997,694.60

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADOCON LA ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN CLAUSULADO DE MODIFICACION No. 2 PRORROGA No. 2
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,828,338.30	$ ***********1,617	$*****5,000.00	$ ********1,257	$ ***********7,874

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188756

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079060FFB7A56

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401887582

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000007121 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA					FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	DIA	MES	AÑO
03	02	2025		31	01	2025	23:59 A LAS	10	02	2025	23:59 A LAS	10 DIAS	03	02	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				
	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	31	01	2025	23:59 A LAS	10	02	2025	23:59 A LAS	10

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

DIRECCIÓN: CR 30 # 18-28 BRR DULCE NOMBRE CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3004864378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 16 72 APTO PI 3 302 C PI CIUDAD: **SINCELEJO, SUCRE** TELÉFONO: 6052865458

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DI NIT : 800165944

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: SINCELEJO

DIRECCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 800165944 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, .

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA No 22 DE 2024 REFERENTE A LAS ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES.

ASEGURADOS:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO – SUCRE NIT. 800165944-8
JEMAD INGENIERIA S.A.S NIT. 901539452-9

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENFICIARIO SON: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO – SUCRE NIT. 800165944-8 Y/O LOS TERCEROS AFECTADOS

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********21,370	$*****5,000.00	$ ********5,010	$ **********31,380

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
RL GESTION EN SEGUROS LTDA	11072	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540188758

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDC2079060FFB7B5F

CLIENTE

MBUSTOSPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000007121** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **JEMAD INGENIERIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.539.452-9**

ASEGURADO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

BENEFICIARIO: **. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.944-8**

TEXTO ITEM 1

" PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

" PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

" PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

" RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

" AMPARO PATRONAL.
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
" RCE CRUZADA
" RCE MEDICA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN CLAUSULADO DE MODIFICACION No. 2
PRORROGA No. 2
VIGENCIA 23/12/2024 HASTA 10/02/2025
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000007121 **ANEXO:** 3 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: JEMAD INGENIERIA SAS **IDENTIFICACION:** 901.539.452-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI	800165944-8	NO APLICA PARA ESTE RAMO	SINCELEJO	260,000,000.00	21,370	26,380

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
21,370	26,380

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

PRESUPUESTO

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

BALANCE DE OBRA N°1

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

BALANCE DE OBRA N°2

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

EXAMENES DE INGRESO

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-12-30

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	Documento:	CC 1100622659
Fecha de nacimiento:	1985-04-15	Lugar de nacimiento:	MORROA (Sucre)
Edad:	39 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 5A #17-49 BRR EL ROSARIO	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3215337391	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OBRERO	EPS:	Cajacopi
Responsable**:	VALENTINA CHAVEZ (HIJA)	Teléfono:	3023284288
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis Ninguna - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA con documento de identificación No. 1100622659 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
higiene postural
uso de EPP


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario Indice der
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA
Documento: 1100622659

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: kevin.fuentes
Fecha: 2024-12-30 Hora: 12:06

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-12-30

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	Documento:	CC 1100543948
Fecha de nacimiento:	1987-09-28	Lugar de nacimiento:	GALERAS (Sucre)
Edad:	37 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Casado	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 12A #8-91 BRR CENTENARIO	Municipio:	GALERAS
Teléfono:	3135219709	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OBRERO	EPS:	Regimen Subsidiado
Responsable**:	LUDIS LOPEZ (MADRE)	Teléfono:	3126296563
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ con documento de identificación No. 1100543948 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
higiene postural
uso de EPP


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ
Documento: 1100543948

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: kevin.fuentes
Fecha: 2024-12-30 Hora: 12:06

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	Documento:	CC 1102876220
Fecha de nacimiento:	1996-12-11	Lugar de nacimiento:	Sincelejo (Sucre)
Edad:	28 años	Identidad de Género:	Femenino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CRA 30 N 18-28 BRR DULCE NOMBRE	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3004864378	Escolaridad:	Universitario_completo
Ocupación:	RESIDENTE DE OBRA	EPS:	Salud Total
Responsable**:	OLGA ATENCIA (MADRE)	Teléfono:	3017670411
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - Ultima dosis: 2

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA con documento de identificación No. 1102876220 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de RESIDENTE DE OBRA del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas


CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana



Firma para identificación de usuario
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
Documento: 1102876220



Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-08 Hora: 15:05

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	OSCAR DAVID CHADID VERGARA	Documento:	CC 1007770716
Fecha de nacimiento:	2000-05-27	Lugar de nacimiento:	COROZAL (SUCRE)
Edad:	24 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CLL 40 B N 03-40 BRR BOLIVAR	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3008999872	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AUXILIAR EN REFRIGERACIÓN	EPS:	Regimen Subsidiado
Responsable**:	FIYAD CHADID (PADRE)	Teléfono:	3213173193
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



***** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.***

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a OSCAR DAVID CHADID VERGARA con documento de identificación No. 1007770716 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AUXILIAR EN REFRIGERACIÓN del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario Indice der
OSCAR DAVID CHADID VERGARA
Documento: 1007770716

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-17 Hora: 15:18

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**150594,5**	**Fecha Impresión**	**30/12/2024**
Fecha Ingreso	**30/12/2024**	**Nombre**	**PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL**
CC	**1192727333**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SISO**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**10/08/2001**	**Edad**	**24**
Dirección	**KR 24 CL 1P**	**Teléfono**	**3015704340**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**JEMAD INGENIERIA**	**Fecha de salida**	**30/12/2024**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL
CC:CC1192727333

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**150593,5**	**Fecha Impresión**	**30/12/2024**
Fecha Ingreso	**30/12/2024**	**Nombre**	**SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO**
CC	**1100522249**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**DIRECTOR DE OBRA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**18/08/1990**	**Edad**	**34**
Dirección	**Kra19D#42D-21**	**Teléfono**	**3156943182**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**JEMAD INGENIERIA**	**Fecha de salida**	**30/12/2024**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO
CC:CC1100522249

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32264059	E	2025-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	215.900	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32264059	2025-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
2	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32264059	E	2025-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	215.900	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32264059	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
693.334	693.334	693.334	693.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	111.000	0	400	0	111.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	55.500	0	200	0	55.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	200	0	55.700
EPS(Administradoras: 2)				2	27.800	0	200	0	28.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	13.900	0	100	0	14.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	13.900	0	100	0	14.000
ARP(Administradoras: 1)				2	48.400	0	200	0	48.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	48.400	0	200	0	48.600
CCF(Administradoras: 1)				2	27.800	0	100	0	27.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	27.800	0	100	0	27.900
Gran Total					215.000	0	900	0	215.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951274687**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1208420308

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 644.800	$ 5.300	$ 650.100
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 5.300**	**$ 650.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 503.800	$ 4.100	$ 0	$ 507.900
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 507.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.100	$ 21.100	$ 200	$ 0	$ 21.300
SUBTOTALES:									**$ 21.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 21.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 80.600	$ 700	$ 81.300
SUBTOTALES:			**$ 80.600**	**$ 700**	**$ 81.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1102876220	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.030.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 644.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.030.000	$ 503.800	$ 0	$ 503.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.030.000	110287622	$ 21.100	30	$ 4.030.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.260.600**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32530122	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.616.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32530122	2025-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007770716	CHADID VERGARA OSCAR DAVID	1.426.500	X	X	X														0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	569.400	91.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	569.400	22.800	SUCRE-CCF41	399.420	16.000	569.400	39.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	169.700	S	4429001
2	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER DE JESUS	1.426.500	X	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	474.500	19.000	SUCRE-CCF41	332.850	13.400	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.500	S	4429001
3	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO JOSE	1.423.500	X	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	996.450	39.900	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	423.800	S	4429001
4	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001
5	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32530122	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.616.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32530122	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.314.400	5.314.400	5.314.400	4.575.720	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	850.600	0	0	0	850.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	91.200	0	0	0	91.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	531.600	0	0	0	531.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				5	212.800	0	0	0	212.800
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	19.000	0	0	0	19.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	2	79.800	0	0	0	79.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				5	370.100	0	0	0	370.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	370.100	0	0	0	370.100
CCF(Administradoras: 1)				5	183.300	0	0	0	183.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	183.300	0	0	0	183.300
Gran Total					1.616.800	0	0	0	1.616.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7957567031**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1263345189

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 644.800	$ 3.000	$ 647.800
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 3.000**	**$ 647.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 503.800	$ 2.400	$ 0	$ 506.200
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 506.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 280.500	$ 1.400	$ 0	$ 281.900
SUBTOTALES:									**$ 280.500**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 281.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 24.200	$ 200	$ 24.400
SUBTOTALES:			**$ 24.200**	**$ 200**	**$ 24.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32587042	E	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.600	0	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32587042	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO JOSE	1.423.500	X		X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	332.150	13.300	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	141.400	S	4429001
2	CC 1192727333	PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	474.500	76.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	4429001
3	CC 1100622249	SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901539452	9	JEMAD INGENIERIA S.A.S	A	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 30 18 28 BARRIO DULCE NOMBRE		3004864378			JEMADINGENIERIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32587042	E	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.600	0	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32587042	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.281.150	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	228.000	0	0	0	228.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	76.000	0	0	0	76.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	152.000	0	0	0	152.000
EPS(Administradoras: 3)				3	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	19.000	0	0	0	19.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	19.000	0	0	0	19.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	19.000	0	0	0	19.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	99.300	0	0	0	99.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	99.300	0	0	0	99.300
CCF(Administradoras: 1)				3	51.300	0	0	0	51.300
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	51.300	0	0	0	51.300
Gran Total					435.600	0	0	0	435.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	KR 30 #18-28 BRR DULCE NOMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:				**7961746102**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1298745863

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.800	$ 0	$ 644.800
SUBTOTALES:										**$ 644.800**	**$ 0**	**$ 644.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.800	$ 0	$ 0	$ 503.800
SUBTOTALES:													**$ 503.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 503.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 280.500	$ 0	$ 0	$ 280.500
SUBTOTALES:									**$ 280.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 280.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 24.200	$ 0	$ 24.200
SUBTOTALES:			**$ 24.200**	**$ 0**	**$ 24.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1102876220	MARTINEZ ATENCIA JEILY JAILYN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.030.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 644.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.030.000	$ 503.800	$ 0	$ 503.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.030.000	110287622	$ 280.500	30	$ 4.030.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.453.300**

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

	DOCUMENTO		
	CERTIFICACION		
Fecha de emisión: 27 de Marzo de 2015	**Versión: 01**	**Proceso: Gestión Ambiental**	**Página: 1: 1**

B I O - R E S I D U O S S.A.S
NIT. 900.808.189-7

CERTIFICA QUE:

Que la entidad que lleva por razón social JEMAD INGENIERIA S.A.S con NIT No 901539452-9, realizo el día 06 de febrero de 2025 en Sincelejo (INSTALACIONES PALACIO JUSTICIA), bajo manifiesto N°36518, la entrega de los siguientes residuos:

Tipo de Residuo	Descripción	Peso Kg
RESIDUOS PELIGROSOS	LUMINARIAS	48,3

Los residuos aquí relacionados fueron enviados a BIOGER SA ESP NIT 806.006.669-8, ubicado en el corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18 – 720, Cartagena, Resolución No. 0120 de 2014, Resolución No. 0398 de 2020 y Resolución No. 1642 de 2022CARDIQUE – Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique para su tratamiento y certificación.

Nota aclaratoria: Este certificado es informativo y se expide a los días 25 de febrero del 2025 para informar que la disposición final es emitida por BIOGER SA ESP.

FEBR 33108

JABIB NEGRETE GUTIERREZ
Gerente Operativo

Carrera 3 # 21-60, Oficina 201 Teléfonos 7827275 - 7811125 Fax: 7815219.
E- mail: ventas@bio-residuos.com.co – Celulares 3045666839
Montería – Córdoba
"CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESTA EN MANOS DE TODOS"

BIOGER S.A.S. ESP.
Nit 806.006.669 – 8

CERTIFICADO No. 7285-2025

CERTIFICA QUE:

Recibió en el mes de febrero del 2025, de la empresa BIORESIDUOS SAS. identificado con Nit 900808189-7 Los siguientes residuos generados por la empresa JEMAD INGENIERIA SAS identificado con nit 901539452-9

Tipo de residuo	Residuo	Codigo Respel	Cantidad	Unidad	Servicio
Peligroso	METALES PESADOS (LUMINARIAS,BATERIAS,AMALGAMAS)	Y35	48,3	Kg	Celda de seguridad

Dichos Residuos fueron recibidos y dispuestos en nuestro Parque Ambiental Bioger, ubicado en el corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18 – 720. Nuestro Parque Ambiental BIOGER, cuenta con los Permisos y Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Ambiental competente “CARDIQUE” – Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique a través de la Resolución No. 0120 de 2014, Resolución No. 0398 de 2020 y Resolución No. 1642 de 2022

El presente certificado se expide el día 12 de marzo de 2025, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C.

Cordialmente,

NELSON GARCIA GRAU.
Gerente Parque Ambiental Bioger
BIOGER S.A.S ESP.
E-mail: directorcomercial.pab@biogersaesp.com
Elaboró: SAB

F-GCO-027 Versión 3
Elaborado: 07/02/2023

BIOGER S.A.S. ESP
Nit 806.006.669 - 8

CERTIFICADO No. PAB-6936-2024

CERTIFICA QUE:

Recibió en el mes de **agosto** del año **2024,** por el gestor **BIORESIDUOS S.A.S** identificado con **Nit. 900808189** los siguientes residuos generados por la empresa **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** identificada con NIT **1102876220-4.**

TIPO DE RESIDUO	RESIDUO	CODIGO RESPEL	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO
Peligrosos	LUMINARIAS	Y19	119,6	Kg	CELDA DE SEGURIDAD

Dichos Residuos fueron recibidos y dispuestos en nuestro Parque Ambiental Bioger, ubicado en el corregimiento de Pasacaballos Zona Rural Dolores Km. 18 – 720. Nuestro Parque Ambiental BIOGER, cuenta con los Permisos y Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Ambiental competente "CARDIQUE" – Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique a través de la Resolución No. 0120 de 2014, Resolución No. 0398 de 2020 y Resolución No. 1642 de 2022.

El presente certificado se expide el día 26 del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C.

Cordialmente,

NELSON GARCIA GRAU
Director del Parque Ambiental - BIOGER S.A.S
E.S.P.
Cel. 3142398224.
E-Mail. asistentecomercialpab@biogersaesp.com
Elaboro: SAB

F-GCO-027 Versión 1
Elaborado: 20/09/2019

INTERASEO

INTERASEO S.A.S E.S.P

CERTIFICA

Que la empresa **JEMAD INGENIERIA S.A.S** con Nit. 901.539.452-9, se le presto el servicio especial de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios del Proyecto u Obra "**MC 22 de 2024 - Adecuaciones de Salas de Audiencia Ubicadas en la Torre Gentium de Sincelejo para el Funcionamiento de Despachos Judiciales"** ubicados en el municipio de Sincelejo, como se relaciona a continuación.

FECHA	Cantidad M3
15 de Febrero de 2025	2

Los residuos recogidos por nuestra empresa son dispuestos en el Relleno Sanitario "El Oasis" de la ciudad de Sincelejo, el cual cuenta con licencia ambiental No 0444de 2001, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE.

Este certificado se expide a Solicitud del usuario.

Para constancia se firma en Sincelejo el día 19 de Febrero de 2025.

Atentamente.

ANNY GOMEZ ARAUJO
Directora Regional Mercado Regulado
INTERASEO S.A.S E.S.P

ACTA FINAL NUMERICA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

CANTIDADES

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sala de audiencias No. 1

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9


CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sala de audiencias No.2

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.



JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.





PLANOS RECORDS


Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CONVENCIONES DE INTERVENCIONES REALIZADAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 9W
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 18W
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 60 X 60 CM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL A 110V SOBRE TAPA TROQUEL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO A 120V SOBRE TAPA TROQUEL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- S1 ADECUACIÓN DE CIRCUITO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- S2 ADECUACIÓN DE CIRCUITO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE
- S3 ADECUACIÓN DE CIRCUITO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA TIPO BLACK OUT
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA



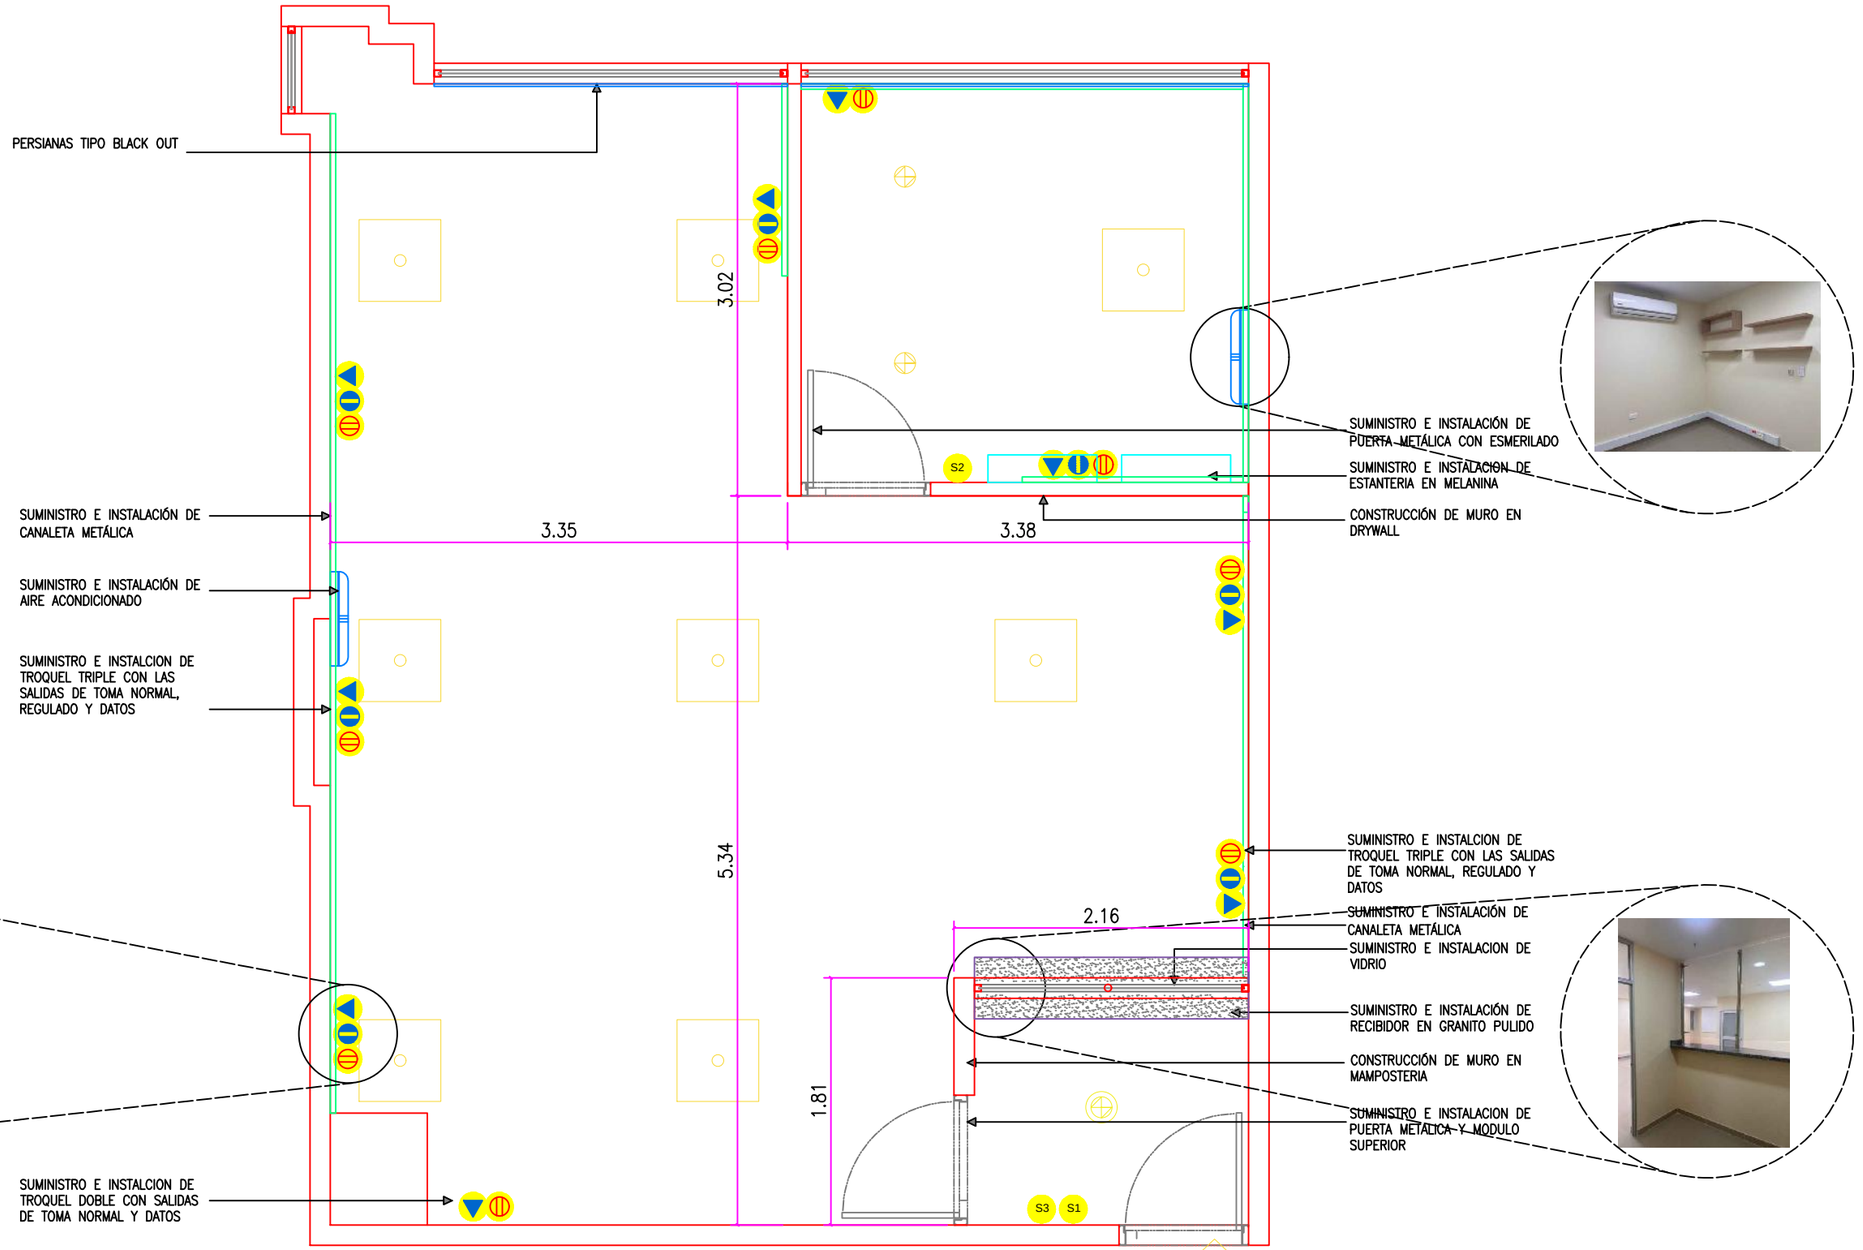

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LOCALIZACIÓN:



COLOMBIA



SUCRE



SINCELEJO

PROYECTO:
"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

CONTRATISTA:
JEMAD INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.539.452-9

DIRECCIÓN: Cl. 22 #162, Sincelejo, Sucre.
PALACIO DE JUSTICIA

CONTIENE:
PLANO DE INTERVENCIONES REALIZADAS

ESCALA:
INDICADA


FECHA:
10/02/2025

PLANO NO:

1/2

CONVENCIONES DE INTERVENCIONES REALIZADAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 9W
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 18W
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 60 X 60 CM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL A 110V SOBRE TAPA TROQUEL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO A 120V SOBRE TAPA TROQUEL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- S1 ADECUACIÓN DE CIRCUITO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- S2 ADECUACIÓN DE CIRCUITO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE
- S3 ADECUACIÓN DE CIRCUITO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA TIPO BLACK OUT
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA

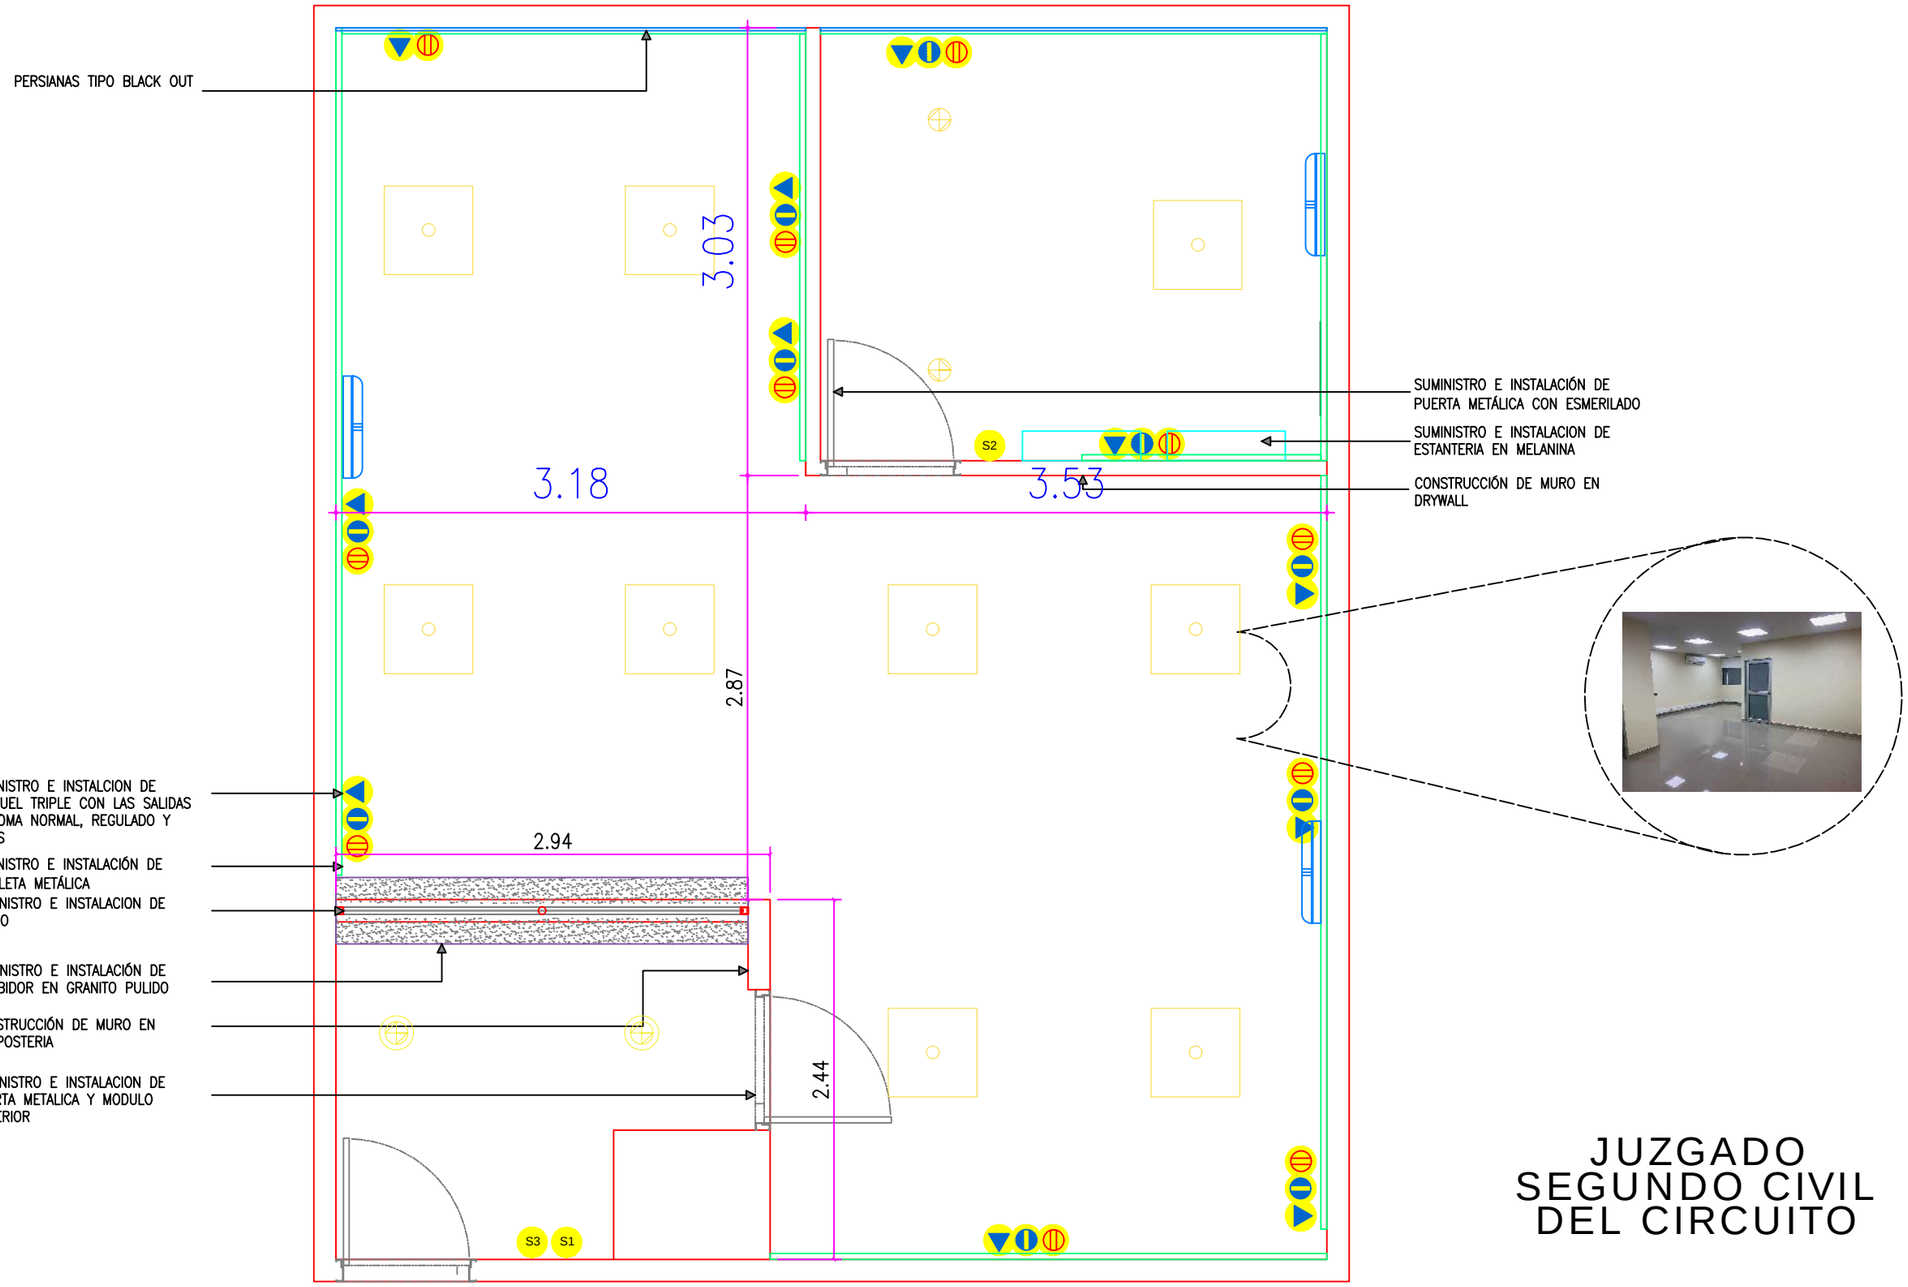

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LOCALIZACIÓN:



COLOMBIA SUCRE SINCELEJO

PROYECTO: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

CONTRATISTA: JEMAD INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.539.452-9

DIRECCIÓN: Cl. 22 #162, Sincelejo, Sucre.
PALACIO DE JUSTICIA

CONTIENE: PLANO DE INTERVENCIONES REALIZADAS

ESCALA: INDICADA

FECHA: 10/02/2025

PLANO NO:

2/2
