	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-MSBV-002-2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

INFORME MENSUAL No. CINCO (5) **MES O PERIODO:** DICIEMBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	525
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	526
1	**INTRODUCCIÓN**		529
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		530
2.1	Localización		530
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		532
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		532
2.4	Características técnicas del proyecto		533
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		536
3.1	Información general del contrato		536
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		537
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		537
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		537
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		539
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	540
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	551
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	553
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	557
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	561
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	567
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	569
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	578
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		580
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	581
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	584
	• Seguimiento Programa de Obra		585
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	598
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	600
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	602
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	606
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		950
5.1	Información general del contrato		950
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		951
5.3	Informes especialistas y profesionales		955
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1044
5.5	Informe matriz de riesgos.		1045
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1047
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		1049
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1051
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1054
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1060
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1062
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1073
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1075
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1077
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1079
7	**Conclusiones y recomendaciones**		610
8	**Anexos**		611
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		612
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		615
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		617
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		619

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LAURA ISABELLA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** dic-22

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-002-2022

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2022
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 6.048.469.960,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 6.048.469.960,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	2580
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	12

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	M	400	500
	Mejoramiento	M	400	500
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5.999.515.164,00		$ 5.999.515.164,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.928.400,00	$ 3.026.396,00	$ 18.954.796,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.045.443.564,00	$ 3.026.396,00	$ 6.048.469.960,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 391.499.146,50		$ 391.499.146,50	$ 464.366.709
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	391.499.146,50	0,00	391.499.146,50	$ 464.366.709

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.334.401.728,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 464.366.709,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 34,80%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **19**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR1+460- PR1+000-SUBBASE GRANULAR (29/12/2022)





PR1+460- PR1+000-LOSA DE PAVIMENTO MR 38 (29/12/2022)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, mediante el convenio interadministrativo No. 1896 de 2021.Es por ello que mediante el proceso de licitación pública **LP-MSBV-002,** se celebra el Contrato de Obra No. LP-MSBV-002-2022, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES", El cual fue adjudicado al CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, cuyo plazo inicial es de seis (6) meses a partir del 24 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 6.048.469.960,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de Diciembre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones, se hará en concreto rígido con obras hidráulicas en el corredor vial, cuyas zonas serán indicada por la Secretaría de Infraestructura Municipal.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Bernardo del Viento.

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento.

El territorio corresponde a un bosque seco tropical, con predominio de relieve bajo, baja altitud y alta temperatura, con un promedio de 30 °C, una humedad relativa del 80%, dos épocas de lluvias durante el año, entre abril – mayo y octubre – noviembre, en donde se precipita el 76% de la lluvia anual que es de unos 1.300 mm y una época de verano, que corresponde al resto del año. La mayor parte del territorio, al norte, sur y este, es plano,

el resto presenta alturas cercanas a los 100 msnm, posee 34,2 km de playas de los cuales algunos tramos presentan condiciones adecuadas para el turismo y ecoturismo.
En la zona rural del municipio de San Bernardo del Viento, se adelantan los proyectos de



Ilustración 3. Vía hacia el corregimiento de Tinajones.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales del contratista, se encuentra ubicada en el corregimiento de san Sebastián, municipio de santa cruz de lorica, esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 4: Ubicación fuente de materiales

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de San Bernardo del Viento, que gracias a la ejecución del contrato de obra No. LP-MSBV-002-2022, se beneficia principalmente la zona rural conformada por el corregimiento de tinajones.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente se evidencia que la infraestructura vial actual de es deficiente, dado que a pesar de que se encuentra en afirmado este se encuentra deteriorado en varios sectores, de igual forma esto genera gran cantidad de material particulado en época de sequía y en época de invierno se hace intransitable por el lodazal y charcos que se generan por el tráfico que usan la vía que comunica al corregimiento con el casco urbano. Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones.

	
Estado inicial de la vía, 1/09/2022	

	
Estado Actual de la vía, 01/09/2022	Dilatación de losas de pavimento (30/12/2022)

Ilustración 4. Estado inicial de la vía. Cto. LP-MSBV-002-2022.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de la vía que comunica al corregimiento de Tinajones con el municipio de San Bernardo del Viento, en Pavimento Rígido con un ancho de calzada de 5 metros; igualmente, la construcción doce (12) Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: dos (2) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

Contrato LP-MSBV-002-2022	
K0+00 hasta K1+500	
Sistema	Pavimento Rígido
Longitud	1500 metros
Ancho Calzada	5 metros
Losa de concreto	0,2 metros
Subbase	0,15 metros
Afirmado	0,20 metros

El alcance de proyecto está aprobado parcialmente desde la K0+00 hasta K1+500, el alcance final de la obra se encuentra en revisión de estudios y diseños.

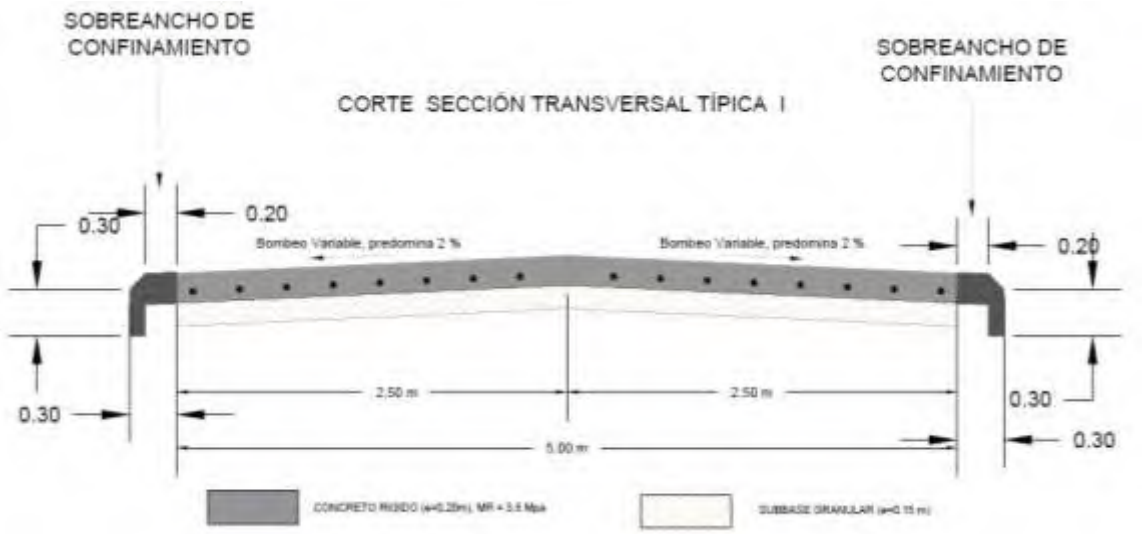


Ilustración 5. Sección típica Pavimento

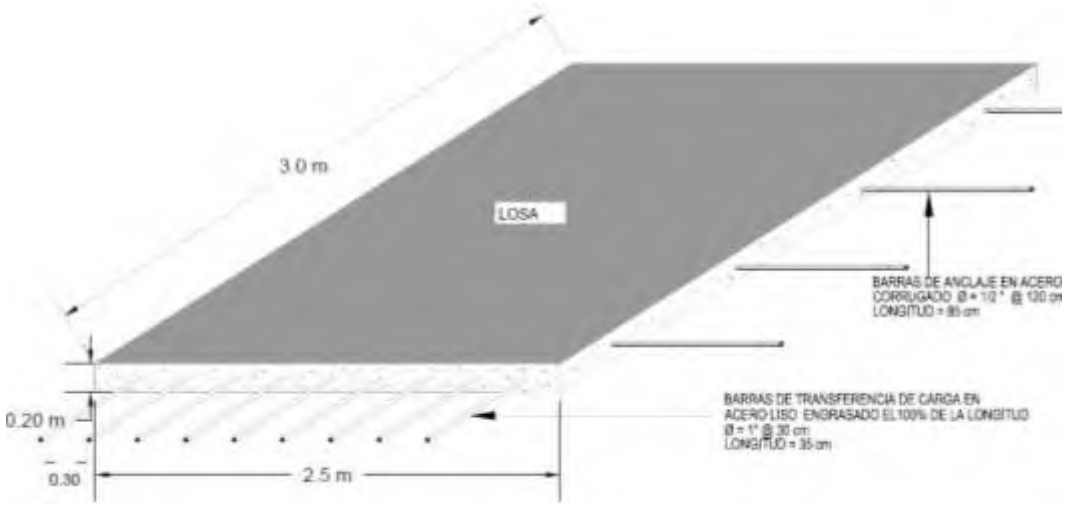


Ilustración 6. Sección losa de Diseño-

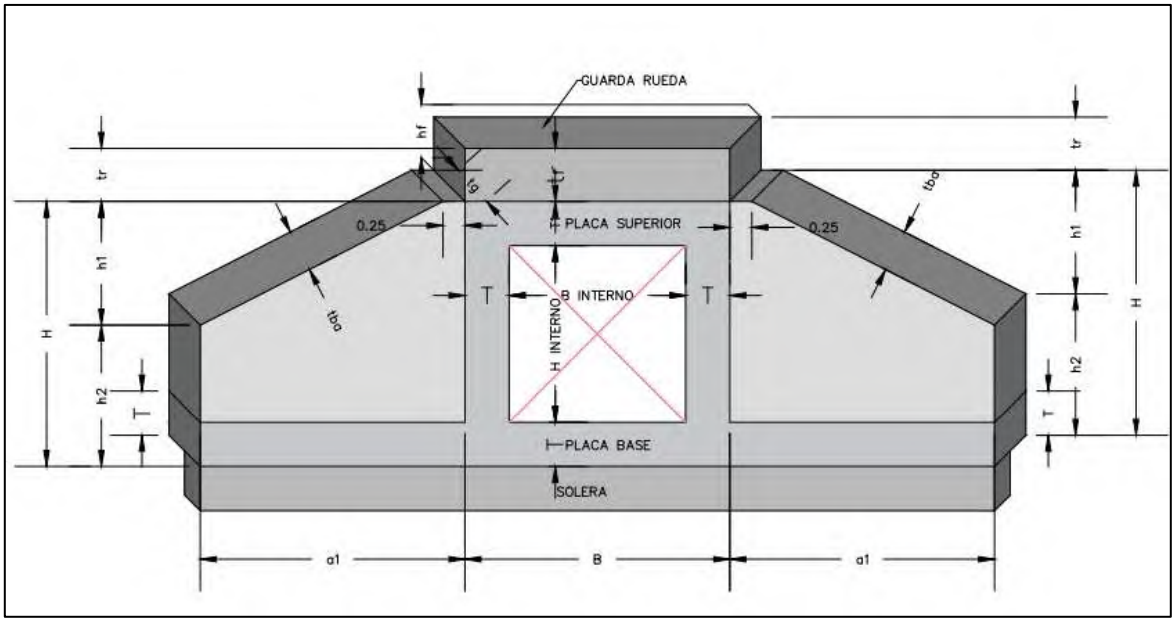


Ilustración 7. Sección transversal típica Box Coulvert.

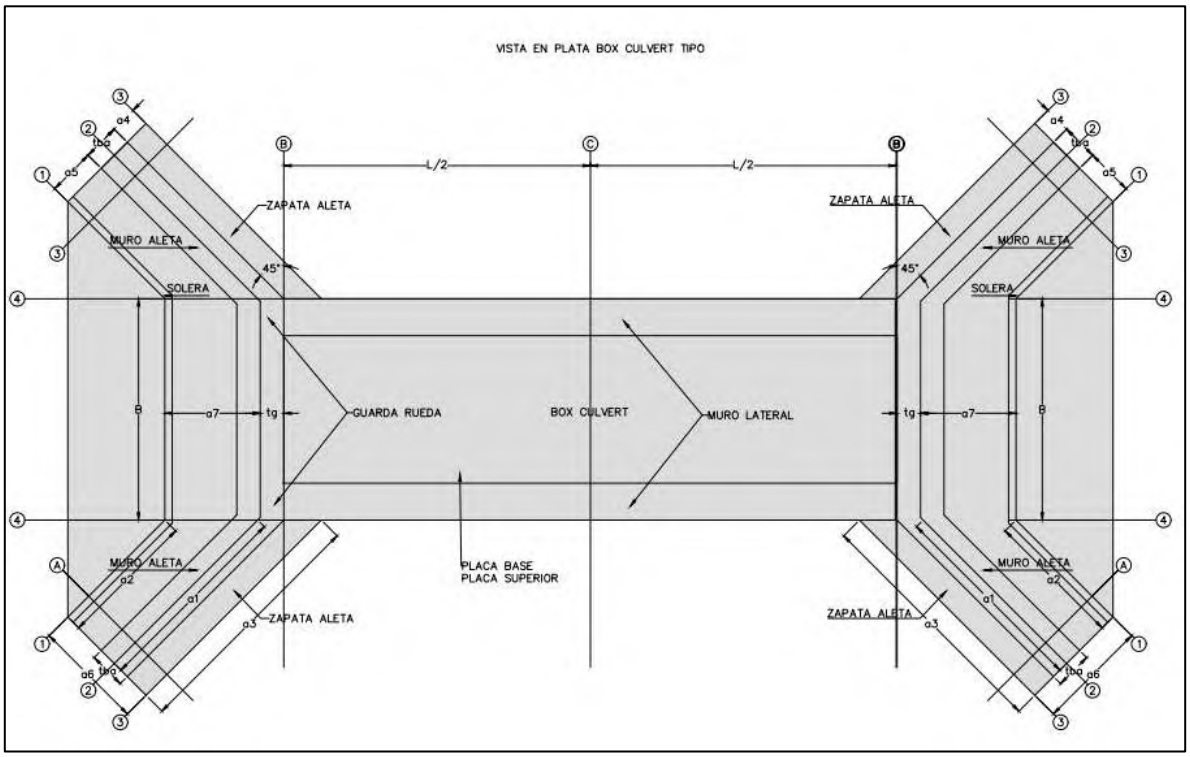


Ilustración 8. Vista en plata típica Box Coulvert.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-MSBV-002-2022
CONTRATO No.	LP-MSBV-002-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/04/2022
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022
NIT	NIT. 901587085-3
INTEGRANTES	MARIO RENE COGOLLO NIT. 78.032.108 Participación 35%
	ALFREDO ANTONIO CABARGAS Participación 65 %
DIRECCIÓN	Diagonal 50A – No 4-134, B/ Villa del Rio, Montería – Córdoba - Colombia
TELEFONO	4 – 7893068, 310 4294758
CORREO	consorcioviasdelviento2022@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.048.469.960,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA INICIO	24/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	24/02/2023
MODIFICACIONES	Modificación No. 1, del 25 de agosto de 2022.

Tabla 1. Información Cto. LP-MSBV-002-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA.

i. Se continúa con la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. A la fecha se cuenta con la aprobación parcial del diseño de pavimento, con la aprobación del estudio geotécnico y con la aprobación del estudio hidráulico e hidrológico.

ii. Se continua con la construcción de losa de pavimento 38 MR, entre el K0+00 al K1+500, de espesor 0,20m, Afirmado 0,20 y Subbase 0,15m

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD.

iii. El contratista entregó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA el cual fue revisado por la interventoría, al cual se realizaron observaciones, para la fecha de este informe se espera la respuesta a las observaciones realizadas.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista instalo el punto de atención al usuario ubicado en la Troncal de Caribe #997a 917. Municipio de San Bernardo Del Viento Córdoba.

ii. **3.2.4. GESTIÓN PREDIAL**

iv. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. A corte de la semana No. 19, se tiene una inversión de obra programada de $ 1.334.401.728,00 correspondiente al 22,24% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 464.366.709,00 correspondiente al 7,74%; lo que representa un atraso del 14,50%.

ii. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.

iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.

iv. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xiii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.
xiv. Revisar, evaluar, concertar y aprobar los ítems no previstos, producto de la revisión y/o ajustes estudios y diseños.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 15 del 25/11/2022 al 1/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYE** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía. Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones, desde el K0+000 hasta el K3+515 se hará en concreto rígido con obras hidráulicas en el corredor vial, cuyas zonas serán indicada por la Secretaría de Infraestructura Municipal.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3

INTEGRANTES:
1. MARIO RENE COGOLLO, Participación 35%
2. ALFREDO ANTONIO CABARGAS, Participación 65 %

CONTRATO No. LP-MSBV-002-2022
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/02/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/02/2023

VALOR INICIAL: $ 6.048.469.960,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 6.048.469.960,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S. NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A. NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIA 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGEN 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 6.048.469.960,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.999.515.164,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 752.746.919,67	12,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 72.867.562,50	1,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (679.879.357,17)	-11,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 752.746.919,67	12,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.867.562,50	1,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (679.879.357,17)	-11,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 95.717.705,00	1,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.867.562,50	1,21%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ - %

	SI	NO
		X

$ -

95717705

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,55%
Meta Física Ejecutada % 1,21%
Avance o Atraso Físico % -11,33%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
Estudios y diseños (%)	%	100	100		Prog				
					Ejec				
Explanación	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Afirmado	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Subbase Granular	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Pavimento Rígido	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Box Coulvert	Und	13		13	Prog				
					Ejec				
Señalización Vertical	Und	57		57	Prog				
					Ejec				
Señalización Horizontal	Km	2580		2580	Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Retro cargador frontal / Excavadora /mini cargador	1	1
vibro compactador	1	1
Volquetas	2	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lórica	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Municipio de Toluviejo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuntra en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: **Troncal de Caribe #997a 917,San Bernardo Del Viento Cordoba**

OBSERVACIONES: el dia 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. Se encuentra en revisión el documento PAGA, por parte de la interventoria


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Traslado de maquinarias al sitio de las obras
3. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
4. Excavaciónes en material común de la explanación y canales
5.Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
6. Relleno con Subbase Granular Clase C.
7. fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
3. Continuar con las Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4. Continuar con el Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Continuar con el Relleno con Subbase Granular Clase C.
6. Continuar fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

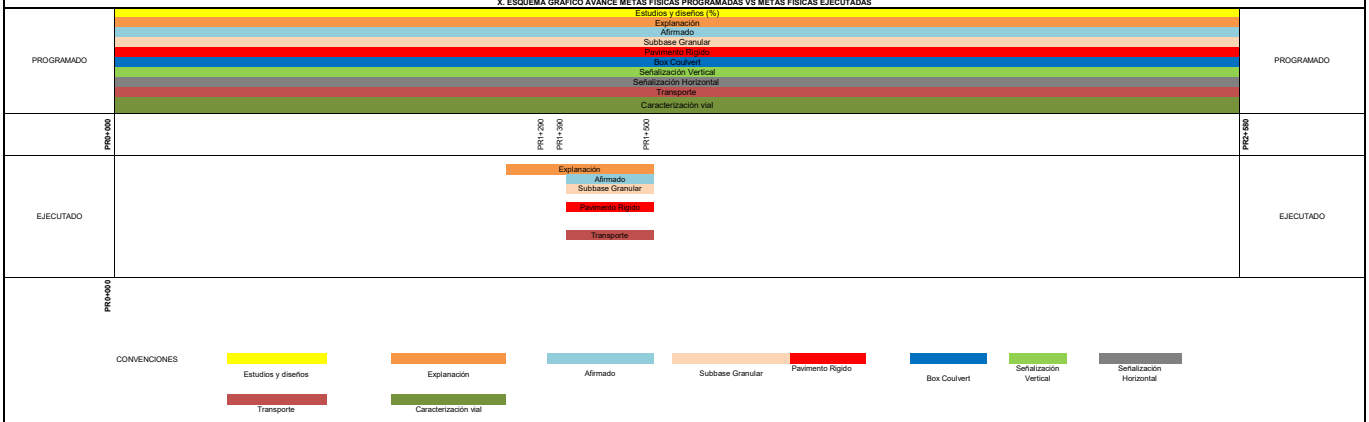

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Afirmado (Material para Mejoramiento)



Excavación en material común de la explanación y canales



Relleno y compactacion Subbase Granular Clase C.



Ensayos de Densidad de campo-Metodo del Cono de Arena-INV



Colocacion De Rieles,Alistado de Tramo a Fundir



Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la
bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MIPAMNL-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 16 del 2/12/2022 al 8/12/2022 **Último Informe Semanal SI**
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROY** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía. Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones, desde el K0+000 hasta el K3+515 se hará en concreto rígido con obras hidráulicas en el corredor vial, cuyas zonas serán indicada por la Secretaría de Infraestructura Municipal.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CCONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3

INTEGRANTES:
1. MARIO RENE COGOLLO, Participación 35%
2. ALFREDO ANTONIO CABARGAS, Participación 65 %

CONTRATO No. LP-MSBV-002-2022
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/02/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/02/2023

VALOR INICIAL: $ 6.048.469.960,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 6.048.469.960,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 6.048.469.960,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		-		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.999.515.164,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 955.224.624,67	15,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 123.735.112,50	2,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (831.489.512,17)	-13,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 955.224.624,67	15,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123.735.112,50	2,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (831.489.512,17)	-13,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 207.477.705,00	3,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 83.948.646,56	1,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
		X

752746920

657.029.215

95717705

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 15,92%
Meta Física Ejecutada %: 2,06%
Avance o Atraso Físico %: -13,86%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños (%)	%	100	100	
Explanación	m	2580	1500	1080
Afirmado	m	2580	1500	1080
Subbase Granular	m	2580	1500	1080
Pavimento Rígido	m	2580	1500	1080
Box Coulvert	Und	13		13
Señalización Vertical	Und	57		57
Señalización Horizontal	Km	2580		2580

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Retro cargador frontal / Excavadora /mini cargador	1	1
vibro compactador	1	1
Volquetas	2	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A
EMISIONES:	SI		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado, En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuntra en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: **Troncal de Caribe #997a 917,San Bernardo Del Viento Cordoba**

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ___
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ___
AVALÚOS APROBADOS: ___
PREDIOS ADQUIRIDOS: ___

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se encuentra en revisión el documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Traslado de maquinarias al sitio de las obras
3. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
4. Excavaciónes en material común de la explanación y canales
5.Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
6. Relleno con Subbase Granular Clase C.
7. fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
3. Continuar con las Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4. Continuar con el Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Continuar con el Relleno con Subbase Granular Clase C.
6. Continuar fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

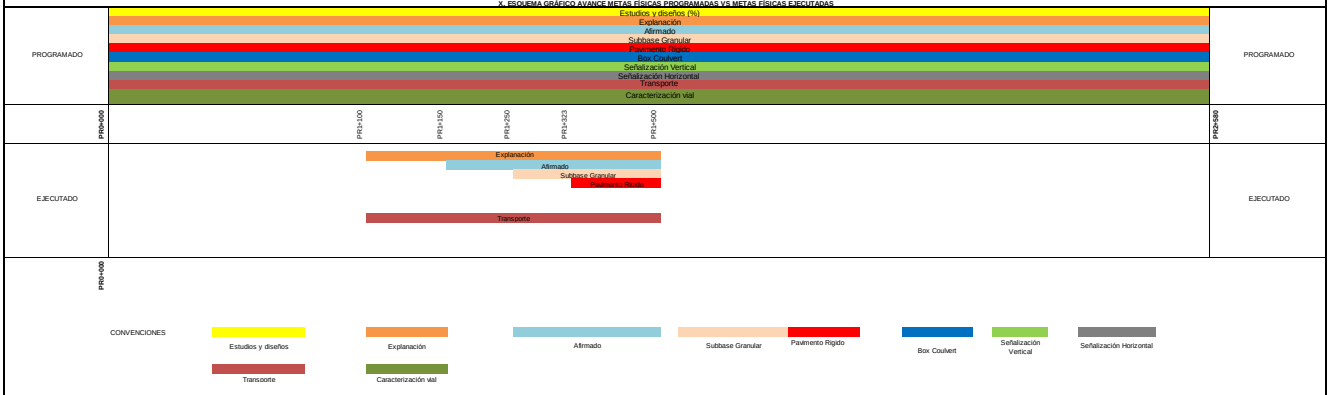

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa



Excavación en material común de la explanación y canales



Relleno y compactacion Subbase Granular Clase C.



Excavacion y relleno con piedra rajon de fallo puntual encontrado



Ensayos de Densidad de campo-Metodo del Cono de Arena-INV-161



Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CODIGO	MER-MNL-IN-15-RR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	15/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 17 del 9/12/2022 al 15/12/2022 **¿Último Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROY** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía. Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones, desde el K0+000 hasta el K3+515 se hará en concreto rígido con obras hidráulicas en el corredor vial, cuyas zonas serán indicada por la Secretaría de Infraestructura Municipal.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3
1. MARIO RENE COGOLLO, Participación 35%
2. ALFREDO ANTONIO CABARGAS, Participación 65 %
INTEGRANTES:
CONTRATO No. LP-MSRV-002-2022
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/02/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/02/2023

VALOR INICIAL: $ 6.048.469.960,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 6.048.469.960,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 6.048.469.960,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.999.515.164,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.151.916.816,00	19,20%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 161.482.025,00	2,69%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (990.434.791,00)	-16,51%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.151.916.816,00	19,20%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 161.482.025,00	2,69%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (990.434.791,00)	-16,51%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 196.680.189,33	3,28%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.827.486,56	0,63%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ - %

	SI	NO
		X

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 19,20%
Meta Física Ejecutada % 2,69%
Avance o Atraso Físico % -16,51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños (%)	%	100	100	
Explanación	m	2580	1500	1080
Afirmado	m	2580	1500	1080
Subbase Granular	m	2580	1500	1080
Pavimento Rígido	m	2580	1500	1080
Box Coulvert	Und	13		13
Señalización Vertical	Und	57		57
Señalización Horizontal	Km	2580		2580

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Retro cargador frontal / Excavadora /mini cargador	1	1
vibro compactador	1	1
Volquetas	2	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES:

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuntra en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: **Troncal de Caribe #997a 917.San Bernardo Del Viento Cordoba**

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

95717705

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ___
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ___
AVALÚOS APROBADOS: ___
PREDIOS ADQUIRIDOS: ___

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se encuentra en revisión el documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Traslado de maquinarias al sitio de las obras
3. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
4. Excavaciónes en material común de la explanación y canales
5.Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
6. Relleno con Subbase Granular Clase C.
7. fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
3. Continuar con las Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4. Continuar con el Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Continuar con el Relleno con Subbase Granular Clase C.
6. Continuar fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

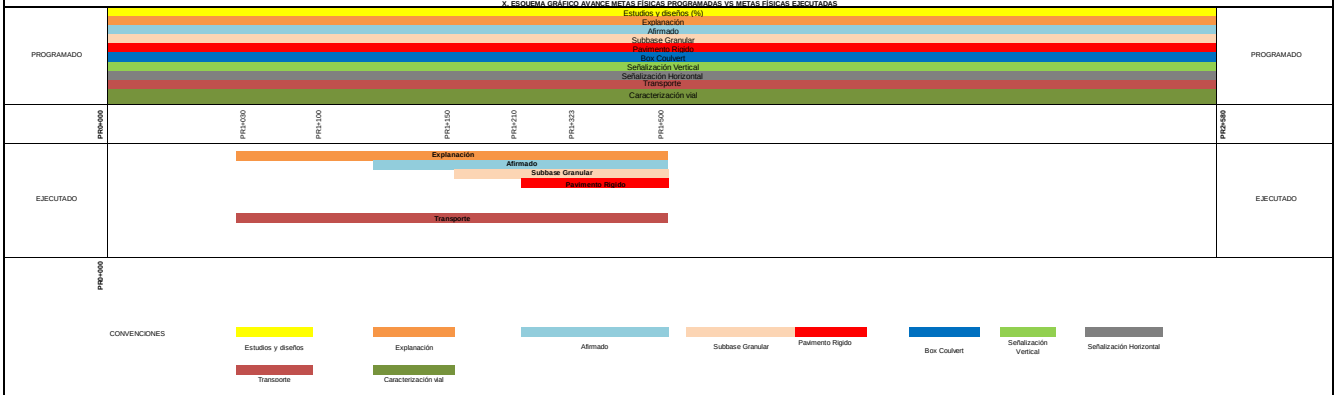

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



colocacion de Canastillas con Respectivas dovelas



Humedecimiento del material de afirmado para compactacion



Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MR



Procedimiento de calidad-colocacion de antisol



Ensayos de Densidad de campo-Metodo del Cono de Arena-INV-161



Corte losa de Pavimento de concreto hidraulico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 18 del 16/12/2022 al 22/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROY.** ALVARO DE JESUS GALVIS ABAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía. Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones, desde el K0+000 hasta el K3+515 se hará en concreto rígido con obras hidráulicas en el corredor vial, cuyas zonas serán indicada por la Secretaría de Infraestructura Municipal.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CCONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES:	1. MARIO RENE COGOLLO, Participación 35% 2. ALFREDO ANTONIO CABARGAS, Participación 65 %	INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No.	LP-MSRV-002-2022	VALOR INICIAL:	$ 6.048.469.960,00
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 6.048.469.960,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/02/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATO No.	871 de 2022
FECHA DE INICIO:	22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 6.048.469.960,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.999.515.164,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.273.573.424,00	21,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 390.728.845,63	6,51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (882.844.578,38)	-14,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.273.573.424,00	21,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 390.728.845,63	6,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (882.844.578,38)	-14,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 196.692.191,33	3,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.871.496,56	0,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 272.511.928,00	5,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.743.764,40	0,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.743.764,40	0,65%

	SI	NO
	X	

nov-22
$ 115.561.614,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 21,23% Avance o Atraso Físico %: -14,72%
Meta Física Ejecutada %: 6,51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
Estudios y diseños (%)	%	100	100		Prog				
					Ejec				
Explanación	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Afirmado	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Subbase Granular	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Pavimento Rigido	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Box Coulvert	Und	13		13	Prog				
					Ejec				
Señalización Vertical	Und	57		57	Prog				
					Ejec				
Señalización Horizontal	Km	2580		2580	Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Retro cargador frontal / Excavadora /mini cargador	1	1
vibro compactador	1	1
Volquetas	2	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuntra en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: **Troncal de Caribe #997a 917.San Bernardo Del Viento Cordoba**

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se encuentra en revisión el documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
3. Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4. Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Relleno con Subbase Granular Clase C.
6. fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
3. Continuar con las Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4. Continuar con el Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Continuar con el Relleno con Subbase Granular Clase C.
6. Continuar fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

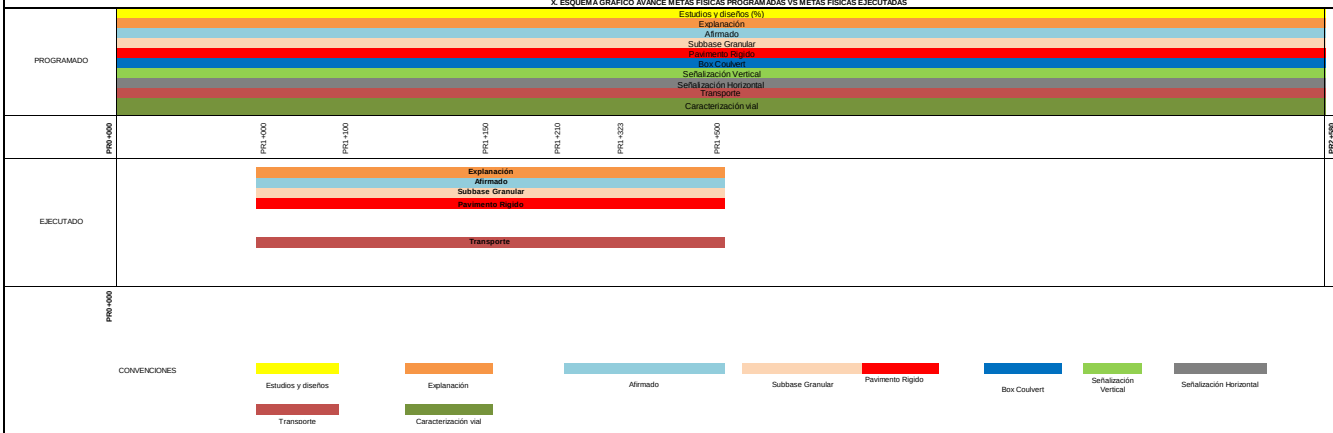

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactacion de Subbase



Enrrieldo y adecuacion de Terreno



Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MR



Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MR



Procedimiento de calidad-colocacion de antisol



Corte losa de Pavimento de concreto hidraulico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 19 del 23/12/2022 al 29/12/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROY.** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 3235 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros; la construcción trece Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1, dos (2) sección 1,5X1,5 y ocho (8) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía. Las actividades serán desarrolladas en zona Rural del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba, en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia el Corregimiento de Tinajones, desde el K0+000 hasta el K3+515 se hará en concreto rígido con obras hidráulicas en el corredor vial, cuyas zonas serán indicada por la Secretaría de Infraestructura Municipal.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CCONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES:	1. MARIO RENE COGOLLO, Participación 35% 2. ALFREDO ANTONIO CABARGAS, Participación 65 %	INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No.	LP-MSRV-002-2022	VALOR INICIAL:	$ 6,048,469,960.00
FECHA DE INICIO:	24/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 6,048,469,960.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/02/2023		$ -
			$ -
			$ -
CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4,564,284,660.00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4,564,284,660.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 6,048,469,960.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5,999,515,164.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,334,401,728.00	22.24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 464,366,709.00	7.74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (870,035,019.00)	-14.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,334,401,728.00	22.24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 464,366,709.00	7.74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (870,035,019.00)	-14.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 196,692,191.33	3.28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,871,496.56	0.63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,564,284,660.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 272,511,928.00	5.97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,743,764.40	0.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29,743,764.40	0.65%

	SI	NO
	X	

nov-22
$ 115,561,614.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 22.24%
Meta Física Ejecutada % 7.74%
Avance o Atraso Físico % -14.50%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
Estudios y diseños (%)	%	100	100		Prog				
					Ejec				
Explanación	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Afirmado	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Subbase Granular	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Pavimento Rigido	m	2580	1500	1080	Prog				
					Ejec				
Box Coulvert	Und	13		13	Prog				
					Ejec				
Señalización Vertical	Und	57		57	Prog				
					Ejec				
Señalización Horizontal	Km	2580		2580	Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	
Retro cargador frontal / Excavadora /mini cargador	1	1
vibro compactador	1	1
Volquetas	2	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lórica	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A
EMISIONES:	SI		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A

OBSERVACIONES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista realiza la entrega del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental mediante comunicado OFI-CVV-016-2022

OBSERVACIONE: Interventoría realiza la revisión del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental entregado por el contratisata y es devuelto con observacione mediante comunicado CVRIMG-418-2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: **Troncal de Caribe #997a 917.San Bernardo Del Viento Cordoba**

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se encuentra en revisión el documento PAGA, por parte de la interventoria


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
3. Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4.Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Relleno con Subbase Granular Clase C.
6. fundicion de Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
3. Continuar con las Excavaciónes en material común de la explanación y canales
4. Continuar con el Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
5. Continuar con el Relleno con Subbase Granular Clase C.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

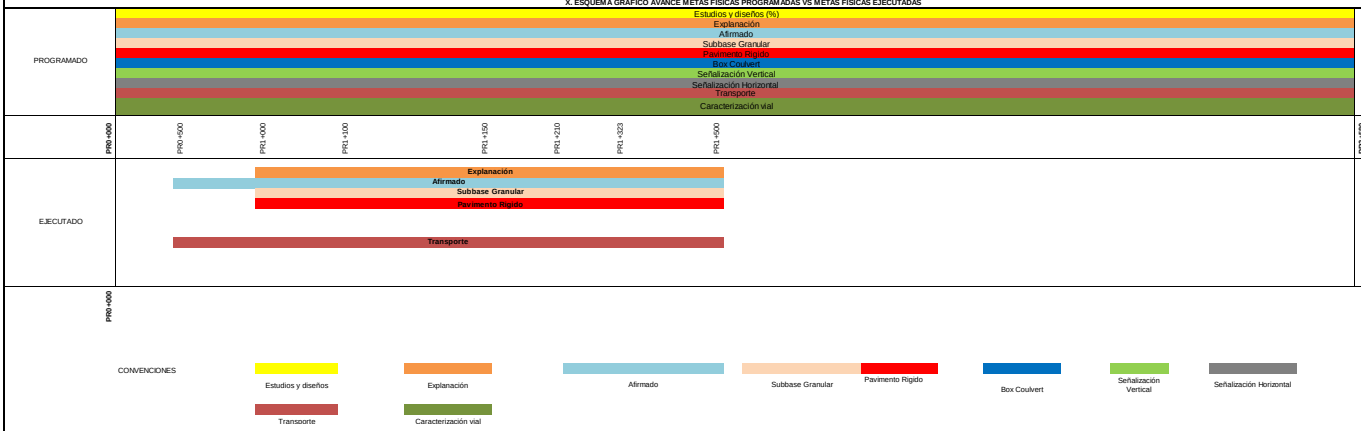

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extensión de Subbase



Humectación de subbase



Compactación de Subbase



Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 38 MR



Texturizado de concreto hidraulico



Corte losa de Pavimento de concreto hidráulico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Recutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: diciembre/2022

PROYECTO: ASFALTADO DE TRAMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO No. LP-MSBV-002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022

INTERVENTORÍA: ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETRO CARGADOR	CATERPILAR-416C	0,76 M3	K0+00 HASTA K1+500	A	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR	CASE-SR220	1 TON	K0+00 HASTA K1+500	A	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
VIBRO COMPACTADOR	CATERPILAR- CS-433B	7 TON	K0+00 HASTA K1+500	A	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA	CHEVROLET-FVZ-2013	7 M3	K0+00 HASTA K1+500	A	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA	CHEVROLET-FVZ-2013	14 M3	K0+00 HASTA K1+500	A	A	I	I	A	A	A	I	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				5	5	0	0	5	5	5	0	5	5	0	5	0	5	5	5	0	0	5	5	0	5	5	0	0	5	5	5	5	5	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	5	0	5	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	100	65%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	55	35%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: FERNANDO MARIO MARQUEZ FERNANDEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:22202330922COR

Firma
Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-201974 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARIO RENÉ COGOLLO RODRIGUEZ	78.032.108	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$1.500.000	$ 104.400	V	NUEVA EPS	60725690	$ 60.000	COLFONDOS	60725690	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
2	FERNÁNDO MARIO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ	1.067.900.319	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$1.500.000	$ 104.400	V	EPS SANITAS	60725690	$ 60.000	COLFONDOS	60725690	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
3	JOSÉ HIGINIO ROSSI MARTÍNEZ	1.067.845.891	HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$1.500.000	$ 104.400	V	NUEVA EPS	60725690	$ 60.000	COLFONDOS	60725690	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
4	MAYRA ALEJANDRA BERRIO AGAMEZ	1.067.951.382	SECRETARIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL EPS	60725690	$ 40.000	PORVENIR	60725690	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
5	JAVIER ANDRES OLIVERO PERTUZ	1.068.659.051	CONDU. MAQUINARIA PESADA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 400.000	$ 64.000	V	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	60725690	$ 16.000	PORVENIR	60725690	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
6	YERALDIN CARDOZA BURGOS	1.070.821.151	SISO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 266.667	$ 18.600	V	MUTUAL SER	60725690	$ 10.700	PROTECCION	60725690	$ 42.700	$ 10.700	$ -	$ -	
7	YAIR HERNANDEZ BLANCO	1.068.738.375	AUX. ALBAÑILERIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 233.334	$ 16.300	V	MUTUAL SER	60725690	$ 9.400	PROTECCION	60725690	$ 37.400	$ 9.400	$ -	$ -	
8	EDWIN JOSE PEREZ PEREZ	18.778.248	MAESTRO DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 400.000	$ 64.000	V	MUTUAL SER	60725690	$ 16.000	PORVENIR	60725690	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
9	JORGE ESTEBAN DORIA PEREZ	1.003.715.485	AUX.RESIDENTE DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 533.334	$ 37.200	V	MUTUAL SER	60725690	$ 21.400	COLPENSIONES	60725690	$ 85.400	$ 21.400	$ -	$ -	
10	KELLY JOHANA CABRERA CABEZA	1.063.170.859	INSPECTORA VIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 166.667	$ 11.700	V	MUTUAL SER	60725690	$ 6.700	PROTECCION	60725690	$ 26.700	$ 6.700	$ -	$ -	
11	YENIS PATRICIA RIVERA PINTO	1070 810 406	INSPECTORA VIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 166.667	$ 11.700	V	MUTUAL SER	60725690	$ 6.700	PROTECCION	60725690	$ 26.700	$ 6.700	$ -	$ -	
12	NILSON NUÑEZ CUADRADO	10.941.556	CADENERO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 400.000	$ 27.900	V	MUTUAL SER	60725690	$ 16.000	PROTECCION	60725690	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
13	LUIS ALBERTO POLO LOPEZ	1.068.659.051	CONDU. MAQUINARIA PESADA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	$ 400.000	$ 27.900	V	MUTUAL SER	60725690	$ 16.000	PROTECCION	60725690	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El formato no se encuentra diligenciado, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no ha presentado la información requerida.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-12, 04:54:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 60725690

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 12/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022		
Documento	NI901587085	**Dirección**	DG 50A #4 - 134 VILLA DEL RIO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3104294758
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA
Representante Legal	COGOLLO RODRIGUEZ MARIO RENE	**Identificación**	CC 78032108
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003715485	JORGE ESTEBAN DORIA PEREZ	01	00	X	X															0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 533.334	$ 85.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 533.334	$ 21.400	6,960	$ 533.334	$ 37.200	(CCF16) COMFACOR	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400
CC 1063170859	KELLY JOHANA CABRERA CABEZA	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 166.667	$ 26.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 166.667	$ 6.700	6,960	$ 166.667	$ 11.700	(CCF16) COMFACOR	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800
CC 1067845891	JOSE HIGINIO ROSSI MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF16) COMFACOR	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1067900319	FERNANDO MARIO MARQUEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF16) COMFACOR	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1067951382	MAYRA ALEJANDRA BERRIO AGAMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF16) COMFACOR	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1068659051	JAVIER ANDRES OLIVERO PERTUZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF16) COMFACOR	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1068738375	JAIR HERNANDEZ BLANCO	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 233.334	$ 9.400	6,960	$ 233.334	$ 16.300	(CCF16) COMFACOR	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1070810406	YENIS PATRICIA RIVERA PINTO	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 166.667	$ 6.700	6,960	$ 166.667	$ 11.700	(CCF16) COMFACOR	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800
CC 1070821151	YERALDIN JULIETH CARDOZA BURGOS	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 266.667	$ 42.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 266.667	$ 10.700	6,960	$ 266.667	$ 18.600	(CCF16) COMFACOR	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.700
CC 10941556	NILSON JOSE NUÑEZ CUADRADO	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF16) COMFACOR	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 15034141	LUIS ALBERTO POLO LOPEZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF16) COMFACOR	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 18778248	EDWIN JOSE PEREZ PEREZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF16) COMFACOR	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 78032108	MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF16) COMFACOR	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.466.669	$ 8.466.669	$ 8.466.669	$ 8.466.669	$ 1.354.900	$ 338.900	$ 589.900	$ 338.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.622.600	$ 0	$ 2.622.600

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

MES INFORME MENSUAL: diciembre-2022

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	4210210	Vias Terciarias Mejoradas	220118	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-002-2022	$ 6.048.469.960,00	$ 4.233.928.972
				TOTAL		$ 6.048.469.960,00	$ 4.233.928.972

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 6.048.469.960,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
0	ANTICIPO				$ 1.814.540.988,00	$ -	$ -	$ 1.814.540.988,00	No. 04210210 del 25 de abril de 2022	$ 4.233.928.972,00	$ 6.048.469.960,00	NA			Desembolso del anticipo del 30%
1	ACTA PARCIAL	dic-22	$ 464.366.709,00	$ -	$ 464.366.709,00	$ 139.310.012,70	$ 325.056.696,30	$ 1.675.230.975,30	No. 04210210 del 25 de abril de 2022	$ 3.908.872.275,70	$ 5.723.413.263,70	NA			
TOTALES			**$ 464.366.709,00**	**$ -**	**$ 464.366.709,00**	**$ 139.310.012,70**	**$ 325.056.696,30**	**$ 1.675.230.975,30**		**$ 3.908.872.275,70**	**$ 5.723.413.263,70**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO OBRAS	$ 464.366.709,00	$ -	**$ 464.366.709,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ -		
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		
TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		
VALOR TOTAL	$ 464.366.709,00	$ -	**$ 464.366.709,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
Nit: 800.096.804-9
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

No: 04 210210	Lunes, 25 de Abril de 2022	VALOR:	$ 6,048,469,960.00

EL Analista de Presupuesto DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 819 DE 2003, EL ARTICULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012,

C E R T I F I C A:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2022 EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD # 220118 DE FECHA 2022-02-10, QUE PERMITE CONSTITUIR COMPROMISO CON: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, CON IDENTIFICACIÓN DE CC/NIT:901587085-3, CUYO OBJETO ES: RUBROS PRESUPUESTALES ANOTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO PARA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES, POR LA SUMA DE: 6,048,469,960,00

SEIS MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.CTE

TERCERO: 901587085-3 CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

Contrato NO. LP- MSBV-002-2022

SUPERVISA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — PLAZO (días): 180

C.D.P No. 220118 DE 2022-02-10 $ 6,300,000,000.00 Solicitud No. 220118

Rubro / Sector / Fuente / Tercero	Certificado $	Liberado $
24.02.04-1 MEJORAMIENTO DE VIAS –Vías terciaria Mejoradas		
24 TRANSPORTE		
901587085-3 CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022		
1.3.1.1.07– Transferencias de capital de otras entidades del Gobierno General		6,048,469,960,00

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento
Comprometidos Contigo

Firma Autorizada Presupuesto
MARGELA MARIA HERNANDEZ ZURITA
Analista de Presupuesto

R.P

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-002-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	734
Lluvias moderadas																		2												1		3
Lluvias intensas	2																2		3													7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FERNANDO MARIO MARQUEZ FERNANDEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202330922COR

Firma
Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-201974COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc

Entidad	AreaOperativa	Departament
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion	
01/12/2022 0:00	0	50		900	
02/12/2022 0:00	0	50		900	
03/12/2022 0:00	0	50		900	
04/12/2022 0:00	0	50		900	
05/12/2022 0:00	0	50		900	
06/12/2022 0:00	0	50		900	
07/12/2022 0:00	0	50		900	
08/12/2022 0:00	0	50		900	
09/12/2022 0:00	0	50		900	
10/12/2022 0:00	0	50		900	
11/12/2022 0:00	0	50		900	
12/12/2022 0:00	0	50		900	
13/12/2022 0:00	0	50		900	
14/12/2022 0:00	0	50		900	
15/12/2022 0:00	0	50		900	
16/12/2022 0:00	0	50		900	
17/12/2022 0:00	2	50		900	
18/12/2022 0:00	0	50		900	
19/12/2022 0:00	0	50		900	
20/12/2022 0:00	0	50		900	
21/12/2022 0:00	0	50		900	
22/12/2022 0:00	0	50		900	
23/12/2022 0:00	0	50		900	
24/12/2022 0:00	0	50		900	
25/12/2022 0:00	0	50		900	
26/12/2022 0:00	0	50		900	
27/12/2022 0:00	0	50		900	
28/12/2022 0:00	0	50		900	
29/12/2022 0:00	0	50		900	
30/12/2022 0:00	0	50		900	
31/12/2022 0:00	0	50		900	

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-002-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
AFIRMADO									
	13/11/2022	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES	INV-E-218 - 219 - 2013	CANTERA-SAN JOSE	1	% MENOR A 50	35,10%	SI	
	13/11/2022	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO	INV E 220-13	CANTERA-SAN JOSE	1	12	11,13	SI	
	13/11/2022	LIMINTE LIQUIDO INDICE DE PLASTICIDAD	INV E-125 INV E-126	CANTERA-SAN JOSE	1	MAXIMO 40% MAXIMO 4-9 %	0	SI	
	13/11/2022	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS	INV E - 211 - 13	CANTERA-SAN JOSE	1	MAXIMO 2 %	0,2	SI	
	13/11/2022	ENSAYO CBR	INV E – 148 – 13	CANTERA-SAN JOSE	1	% MAYOR A 30	75,99%	SI	
SUB BASE									
	10/11/2022	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES	INV-E-218 - 219 - 2013	CANTERA-SAN JOSE	1	% MENOR A 50	27,8	SI	
	10/11/2022	DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL	INV E – 238 – 13	CANTERA-SAN JOSE	1	MAXIMO 35%	6,9	SI	
	10/11/2022	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO	INV E 220-13	CANTERA-SAN JOSE	1	12	10,7	SI	
	10/11/2022	LIMINTE LIQUIDO INDICE DE PLASTICIDAD	INV E-125 INV E-126	CANTERA-SAN JOSE	1	MAXIMO 25% MAXIMO 6 %	0	SI	
	10/11/2022	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS	INV E-133-13	CANTERA-SAN JOSE	1	MINIMO 25%	29%	SI	
	10/11/2022	PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES	I.N.V.E - 211	CANTERA-SAN JOSE	1	MAXIMO 2 %	0,15	SI	
	10/11/2022	RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO)	INV-E - 148 - 13	CANTERA-SAN JOSE	1	% MAYOR A 30	99%	SI	
1	29/11/2022	DENSIDAD DEL TERRENO-METODO DEL CONO DE ARENA	INV-161-13	SUBBASE GRANULAR	1	95%	98,60%	SI	
				AFIRMADO	1	95%	106,9	SI	
				AFIRMADO	1	95%	104	SI	
				AFIRMADO	1	95%	106,1	SI	
				AFIRMADO	1	95%	96,8	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

El contratista presento caracterizacion de los materiales para afirmado y subbase granular

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 01 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-002-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

FECHA DE INICIO: 24/08/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/02/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6.048.469.960,00

VALOR ACUMULADO: $ 6.048.469.960,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.796,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.796,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 604.846.996,00	24/8/2022	24/8/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.814.540.988,00	24/8/2022	24/8/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 604.846.996,00	24/8/2022	24/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños			24/2/2023	24/2/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 604.846.996,00	5 años	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000020425

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMLV	$ 400.000.000,00	24/10/2022	24/2/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 540-74-994000004268 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 01 (Mes) 2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 604.846.996,00	24	8	2022	24	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.814.540.988,00	24	8	2022	24	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.209.693.992,00	24	8	2022	24	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 5.686.439,00	24	2	2023	24	2	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.814.540.988,00	5 años					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000020425

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

1. Se actualiza la póliza de garantía de cumplimiento según modificación No. 1 2.El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401403257

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000004268 **ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
	07	09	2022		VIGENCIA DE LA PÓLIZA	24	10	2022	23:59		24	02	2023	23:59	123		07	09	2022
	FECHA DE EXPEDICIÓN					VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	24	10	2022	23:59		24	02	2023	23:59	123
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.587.085-3**

DIRECCIÓN: DG 50 A 4 134 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3104294758

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

DIRECCIÓN: CALLE 8 8 02 CIUDAD: **SAN BERNARDO DEL VIENTO, CORDOBA** TELÉFONO: 3184936809

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL V NIT : 800096804

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CORDOBA CIUDAD: SAN BERNARDO DEL VIENTO

DIRECCION: -

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 400,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	400,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 901587085 - CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 800096804 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion del CONTRATO Nº. LP-MSBV-002-2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***400,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	9963	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540140325

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

ISIERRA 0

CBDC20790B0AFF7D5B CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000004268** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.587.085-3**

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:
" PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
" PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
" PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
" RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
" AMPARO PATRONAL.
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

TEXTO ACLARATORIO
SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADOS SEGUNA ACTA DE INICIO 24/08/2022. VIGENCIA DESDE 24/08/2022 VIGENCIA HASTA 24/02/2023 LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401403232

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000020425 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	09	2022	07	09	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.587.085-3**

DIRECCIÓN: DG 50 A 4 134 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3104294758

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

BENEFICIARIO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	24/08/2022	24/08/2023	604,846,996.00
	ANTICIPO	24/08/2022	24/08/2023	1,814,540,988.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	24/08/2022	24/02/2026	604,846,996.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	604,846,996.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	24/02/2023	24/02/2028	0.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 78032108 - COGOLLO RODRIGUEZ, MARIO RENE - PART: 35.00%
CC 10770721 - CABARCAS BUELVAS, ALFREDO ANTONIO - PART: 65.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096804 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *3,629,081,976.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	9963	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540140323

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790B0AFF7D5F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000020425** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.587.085-3**

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

BENEFICIARIO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO Nº. LP-MSBV-002-2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA, NIT: 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS, NIT: 800215807-2.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (_5_) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

TEXTO ACLARATORIO
SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADOS SEGUNA ACTA DE INICIO 24/08/2022 LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401403232

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000020425 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	09	2022	13	09	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.587.085-3**

DIRECCIÓN: DG 50 A 4 134 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3104294758

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

BENEFICIARIO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	24/08/2022	24/08/2023	604,846,996.00
	ANTICIPO	24/08/2022	24/08/2023	1,814,540,988.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	24/08/2022	24/02/2026	1,209,693,992.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		1,814,540,988.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	24/02/2023	24/02/2028	5,686,439.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 78032108 - COGOLLO RODRIGUEZ, MARIO RENE - PART: 35.00%
CC 10770721 - CABARCAS BUELVAS, ALFREDO ANTONIO - PART: 65.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096804 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,820,227,427.00	$ *******20,008,007	$*****5,000.00	$ ****3,802,471	$ *******23,815,479

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	9963	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540140323

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790B0AF9785B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000020425** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.587.085-3**

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

BENEFICIARIO: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.804-9**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO Nº. LP-MSBV-002-2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA, NIT: 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS, NIT: 800215807-2.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (_5_) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
TEXTO ACLARATORIO
SE REALIZA AJUSTE A LAS GARANTÍAS PARA EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SE AMPLIA AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO; Y EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO. SEGÚN OTROSI No.1 DE FECHA 25/08/2022 LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/01/2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-002-2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE

FECHA DE INICIO: 24/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/02/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ	Nombre: JOSE ROSSI MARTINEZ	Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	Nombre:
Director de la Obra:	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR	Matrícula Profesional No.: 22228168073COR	Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022
NIT. 901587085-3

MUNICPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

FECHA: 21/09/2022
(Día / Mes / Año)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-002-2022,
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: .24

OBJETO DEL CONTRATO:
ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971-2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

VALOR DEL CONTRATO	$ 6.048.469.960,00
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	$ 1.814.540.988,00
IMPUESTO FONDO DE SEGURDAD (5%)	$ 90.727.049,40
ANTICIPO DESPUES DE IMPUESTO	$ 1.723.813.938,60

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Compra de Materiales de obra	$ 639.101.475,24	$ 174.280.234,46				47,2%
2	Transporte de Materiales	$ 408.758.051,61	$ 126.591.897,30				31,1%
3	Compra de Herramientas y equipos	$ 19.000.000,00	$ 86.190.696,93				6,1%
4	Costo del personal	$ 139.810.230,18	$ 130.081.352,89				15,7%
	TOTAL	$ 1.206.669.757,02	$ 517.144.181,58				100%

Firma:
Nombre: MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Firma:
Nombre: FREDDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

MEPI-MN1-IN-2-FR-2, INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN

MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1 de 1 1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3 **MES:** dic-2022 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 002 - 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 31-109360 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 10-5000013-78 Y 10-500001380 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.814.540.988,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 - 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra de materiales de obra	$ 813.381.709,70	$ -		$ -	$ 813.381.709,70
2	Transporte de materiales	$ 535.349.948,91	$ -		$ -	$ 535.349.948,91
3	Compra de herramientas y equipos	$ 105.190.696,93	$ -		$ -	$ 105.190.696,93
4	Gasto del personal	$ 269.891.583,07	$ -		$ -	$ 269.891.583,07
	TOTALES	$ 1.723.813.938,60	$ -		$ -	$ 1.723.813.938,60

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **Seguimiento al programa de obra**

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO

ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Predeces
1		**ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE**	**178 días**	**mié 24/08/22**	**vie 24/02/23**	**$6.048.469.960,00**	
2		**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**mié 24/08/22**	**mié 24/08/22**	**$0,00**	
3		**EXPLANACIONES**	**87 días**	**sáb 1/10/22**	**vie 30/12/22**	**$148.314.310,00**	
4		Excavación en material común de la explanación y canales	15 días	mar 4/10/22	mié 19/10/22	$108.393.680,00	6
5		Terraplenes	10 días	mié 21/12/22	vie 30/12/22	$9.736.560,00	4
6		demolicion de estructuras	6 días	sáb 1/10/22	vie 7/10/22	$30.184.070,00	41
7		**BOX CULVERT 1X1 (L =7m) 2und**	**31 días**	**mar 13/12/22**	**vie 13/01/23**	**$57.761.852,00**	
8		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	7 días	sáb 17/12/22	sáb 24/12/22	$4.186.800,00	9
9		Demolición de estructuras	5 días	mar 13/12/22	sáb 17/12/22	$208.166,00	28
10		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	4 días	mié 28/12/22	lun 2/01/23	$1.814.005,00	13
11		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	6 días	sáb 7/01/23	vie 13/01/23	$26.923.279,00	12;10
12		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	6 días	lun 2/01/23	sáb 7/01/23	$22.191.970,00	10
13		Relleno para Estructuras con recebo	3 días	sáb 24/12/22	mié 28/12/22	$2.437.632,00	8
14		**BOX CULVERT 1,5X1,5 (L =7m) 3und**	**21 días**	**vie 13/01/23**	**sáb 4/02/23**	**$62.680.625,00**	
15		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	2 días	vie 13/01/23	lun 16/01/23	$3.349.440,00	11
16		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	4 días	jue 19/01/23	lun 23/01/23	$2.064.213,00	19
17		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	6 días	lun 30/01/23	sáb 4/02/23	$31.385.701,00	18;16
18		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	6 días	lun 23/01/23	lun 30/01/23	$21.818.551,00	16
19		Relleno para Estructuras con recebo	3 días	lun 16/01/23	jue 19/01/23	$4.062.720,00	15

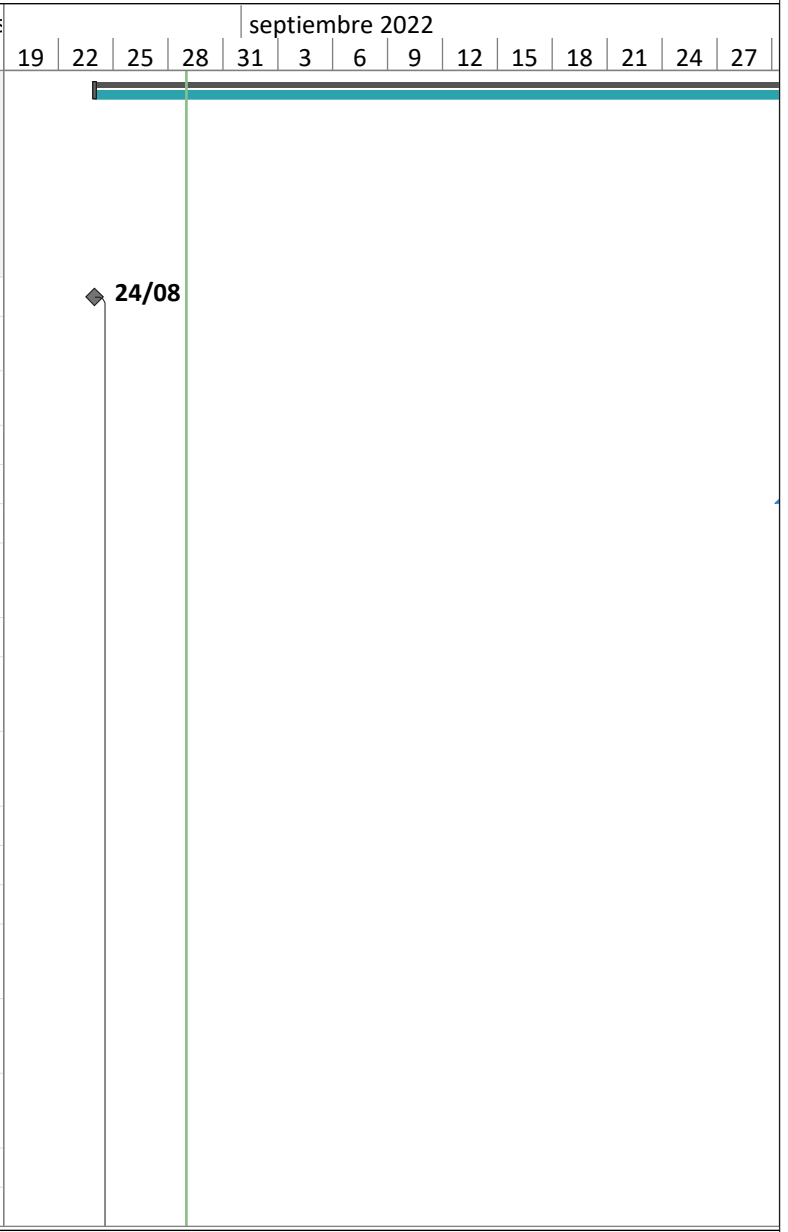


Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO

ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Predeces
20		**BOX CULVERT 2X1(L =7m) 8und**	**21 días**	**sáb 4/02/23**	**lun 27/02/23**	**$363.394.284,00**	
21		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	2 días	sáb 4/02/23	mar 7/02/23	$13.397.760,00	17
22		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	4 días	jue 9/02/23	mar 14/02/23	$12.635.484,00	25
23		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	6 días	lun 20/02/23	lun 27/02/23	$152.059.368,00	24;22
24		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	6 días	mar 14/02/23	lun 20/02/23	$172.300.968,00	22
25		Relleno para Estructuras con recebo	3 días	mar 7/02/23	jue 9/02/23	$13.000.704,00	21
26		**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 2.5 X 3 M ANCHO DE CALZADA 5 M Y LONGITUD 3235 M**	**129 días**	**mar 11/10/22**	**mié 22/02/23**	**$4.956.035.628,00**	
27		Subbase Granular Clase C	50 días	dom 20/11/22	mar 10/01/23	$533.800.000,00	28
28		Afirmado (Material para Mejoramiento	60 días	mar 11/10/22	mar 13/12/22	$409.285.000,00	6
29		Pavimento de Concreto Hidraulico Modulo de Rotura 38 Mpa	25 días	mié 25/01/23	lun 20/02/23	$3.008.550.000,00	27;31
30		Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares	30 días	lun 10/10/22	mié 9/11/22	$185.527.250,00	6
31		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	50 días	jue 10/11/22	sáb 31/12/22	$447.327.518,00	6;34
32		Concreto Clase G (Concreto Clase D Fc=21 Mpa a 60% concreto - 40% agregado ciclopeo), confinamiento	15 días	lun 6/02/23	mar 21/02/23	$371.545.860,00	29FC-10 días
33		**TRANSPORTE**	**60 días**	**vie 28/10/22**	**jue 29/12/22**	**$356.456.640,00**	
34		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 m)	60 días	vie 28/10/22	jue 29/12/22	$356.456.640,00	4;40;42
35		**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**10 días**	**mié 15/02/23**	**vie 24/02/23**	$52.407.825,00	
36		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	8 días	jue 16/02/23	vie 24/02/23	$32.104.965,00	30FC-4 días;37;39
37		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	10 días	mié 15/02/23	vie 24/02/23	$20.302.860,00	29
38		CARACTERIZACIÓN VIAL	7 días	vie 17/02/23	vie 24/02/23	$2.464.000,00	
39		Caracaterización del corredor	7 días	vie 17/02/23	vie 24/02/23	$2.464.000,00	29

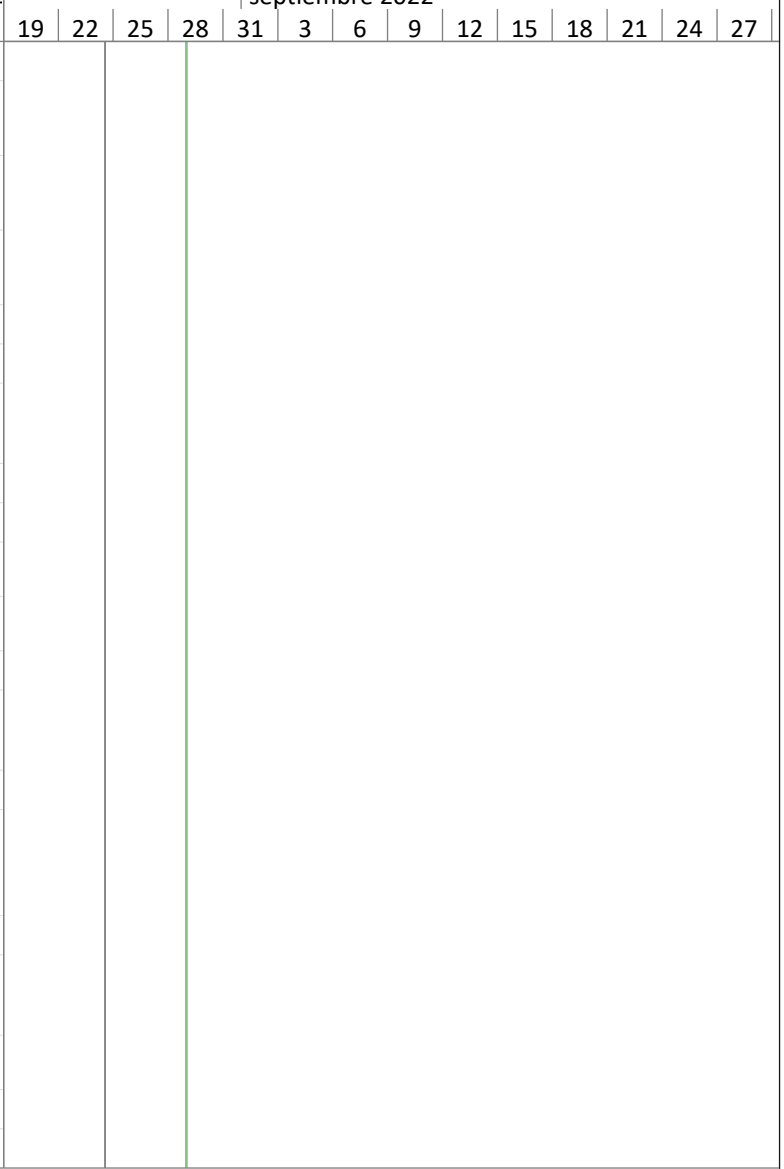


Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO

ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Predeces
40		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	14 días	jue 9/02/23	vie 24/02/23	$30.000.000,00	25
41		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mié 24/08/22	vie 23/09/22	$15.928.400,00	2
42		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	20 días	vie 2/09/22	vie 23/09/22	$3.026.396,00	41FC-20 días
43		ACTA FINAL	0 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$0,00	
44			0 días	mié 24/08/2	mié 24/08/22	$0,00	

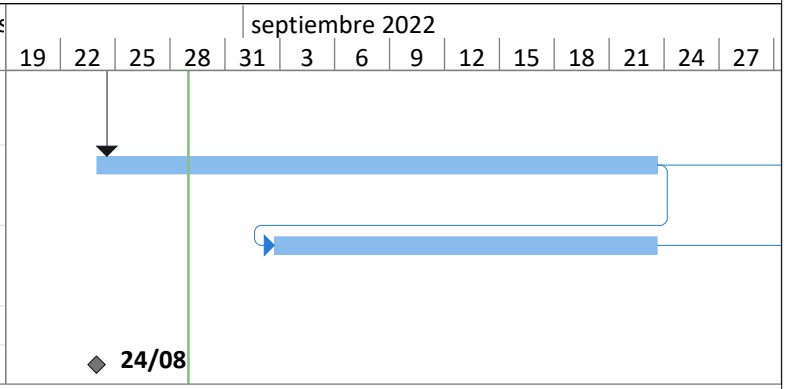

Elaboró:


ALCALDÍA DE SAN BERNARDO

ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

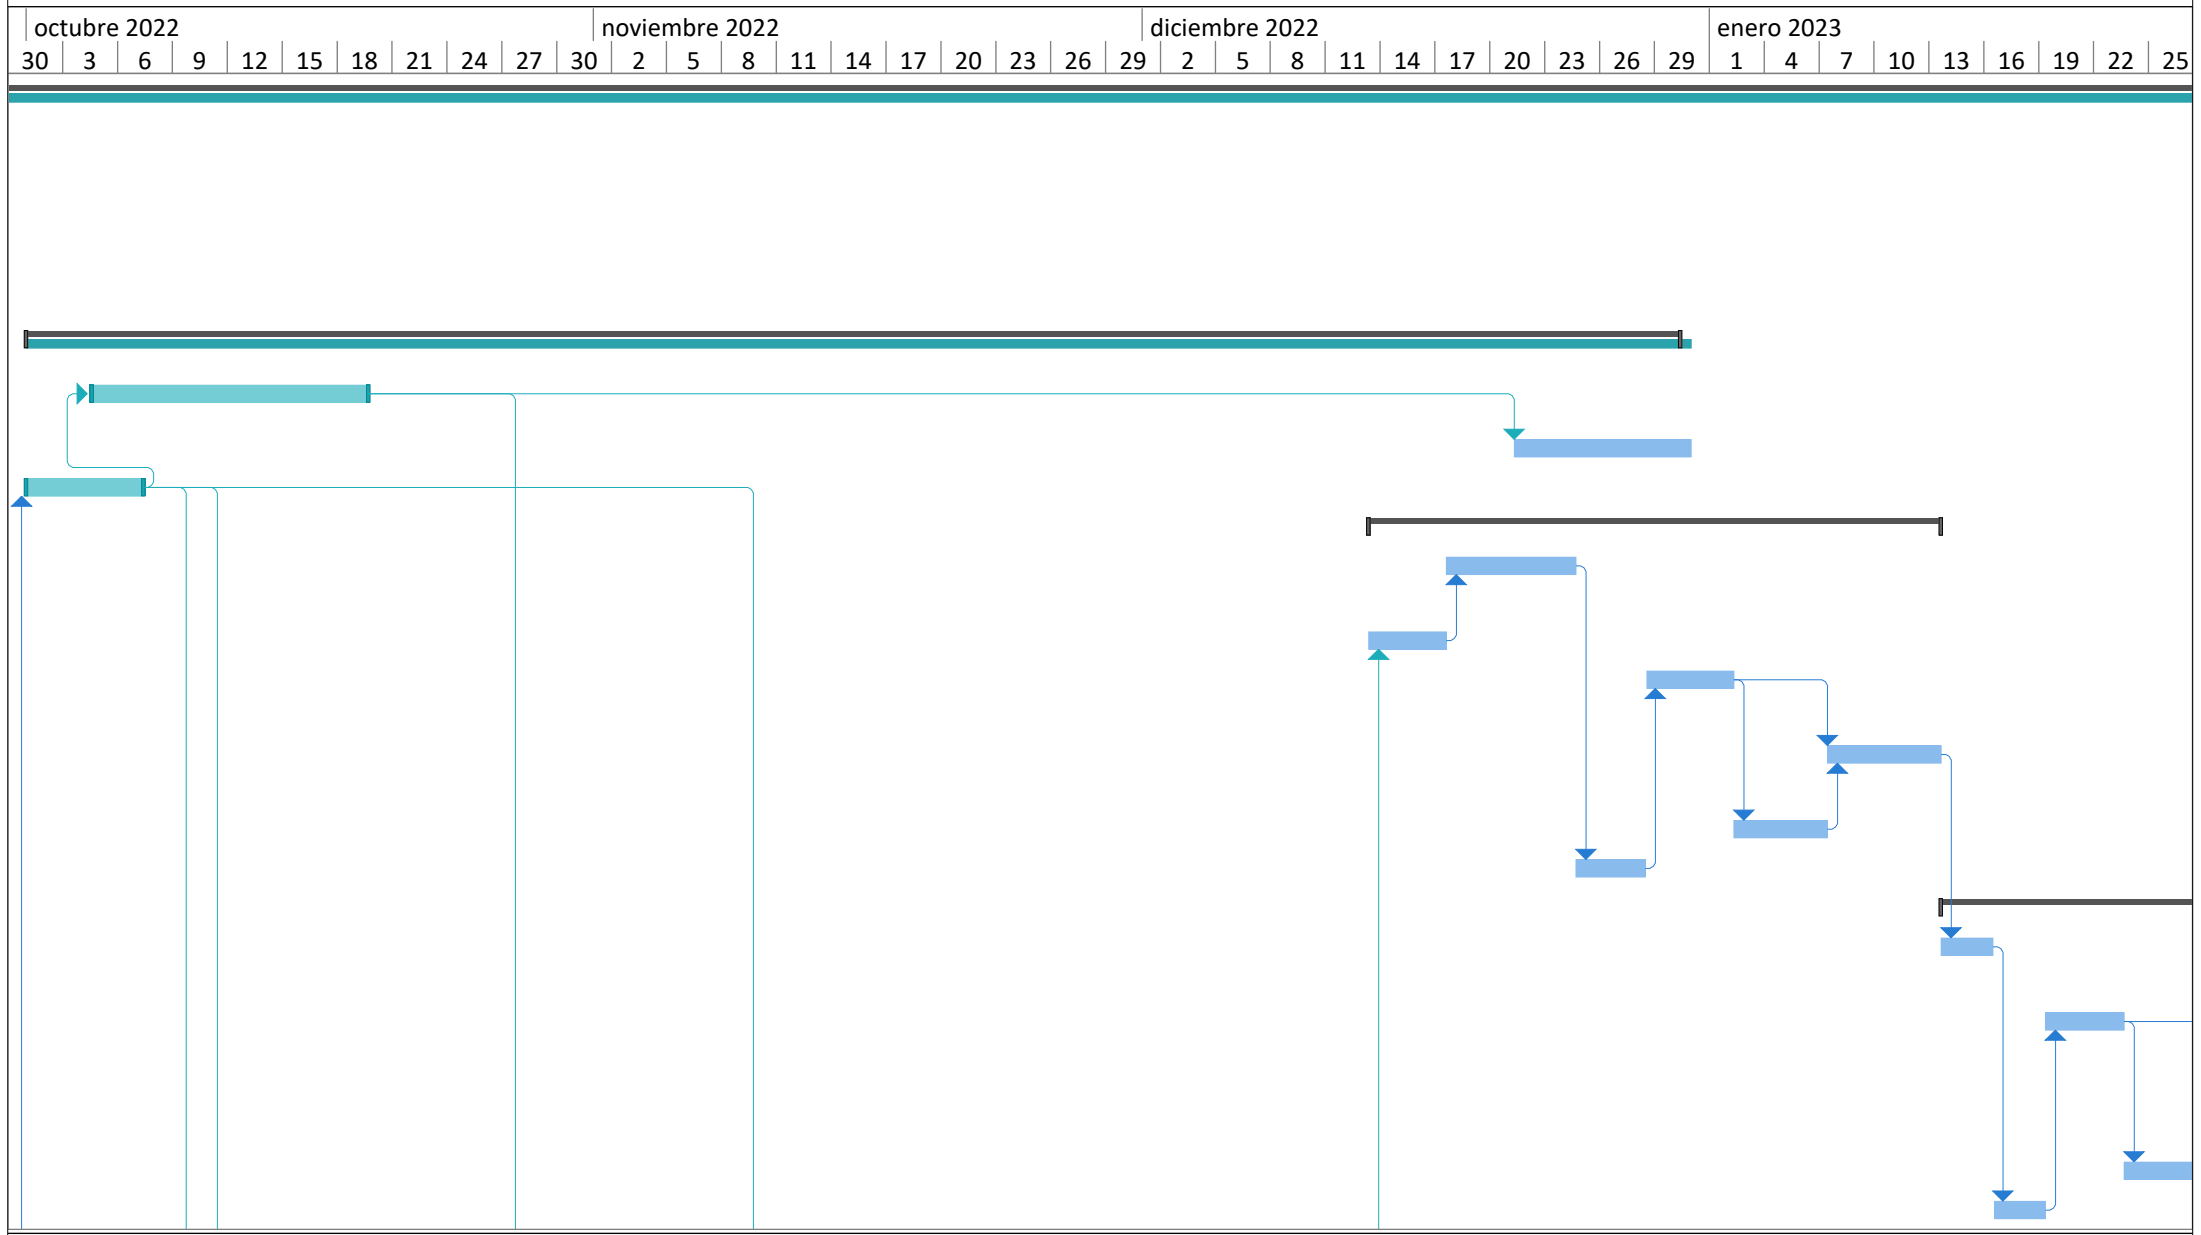

Elaboró:


ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

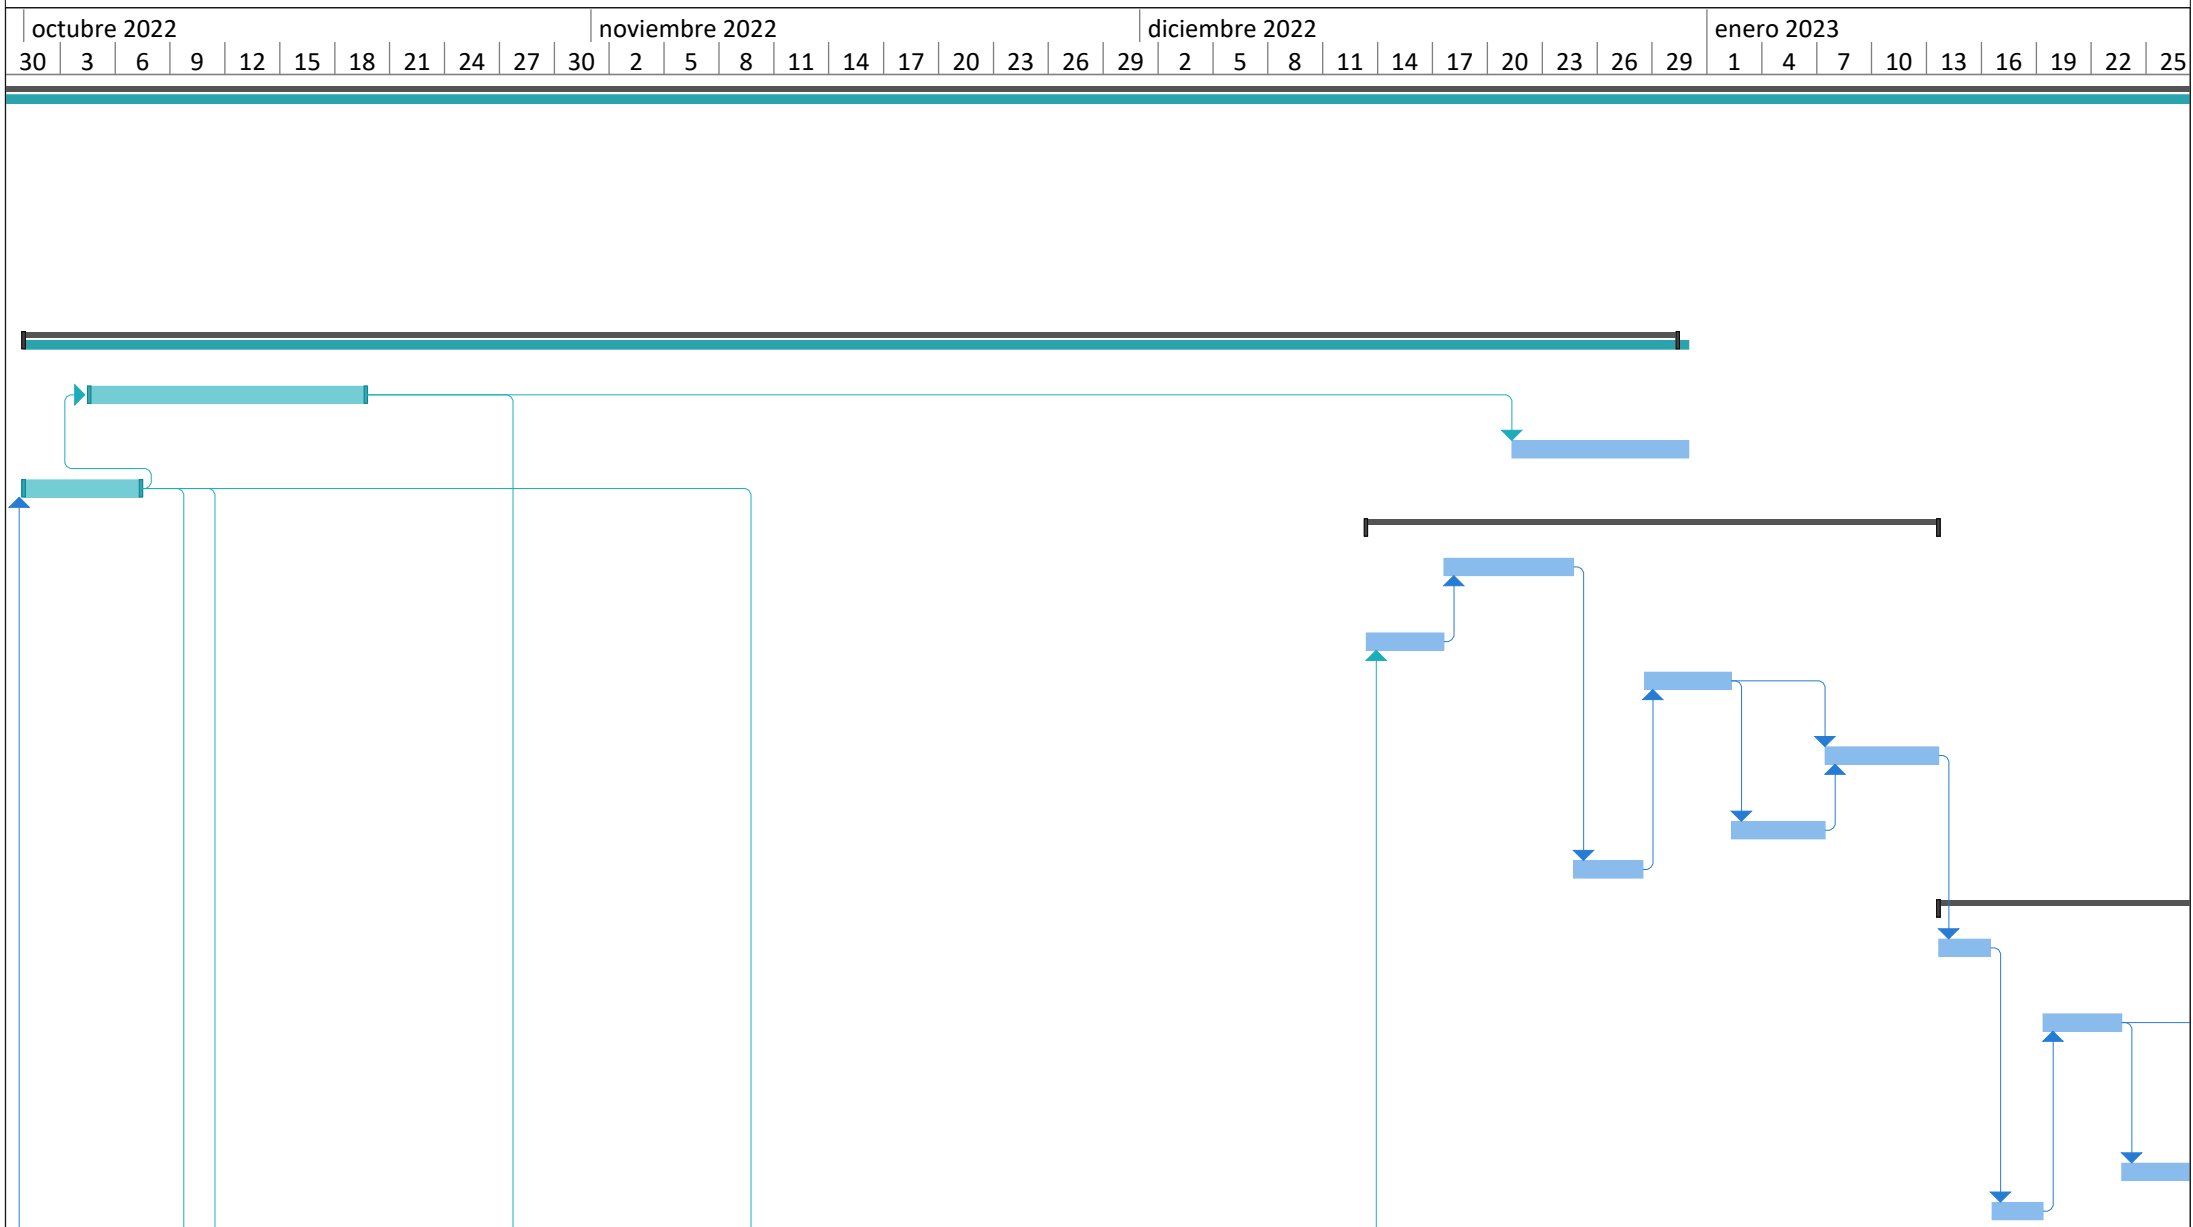

Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO


ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

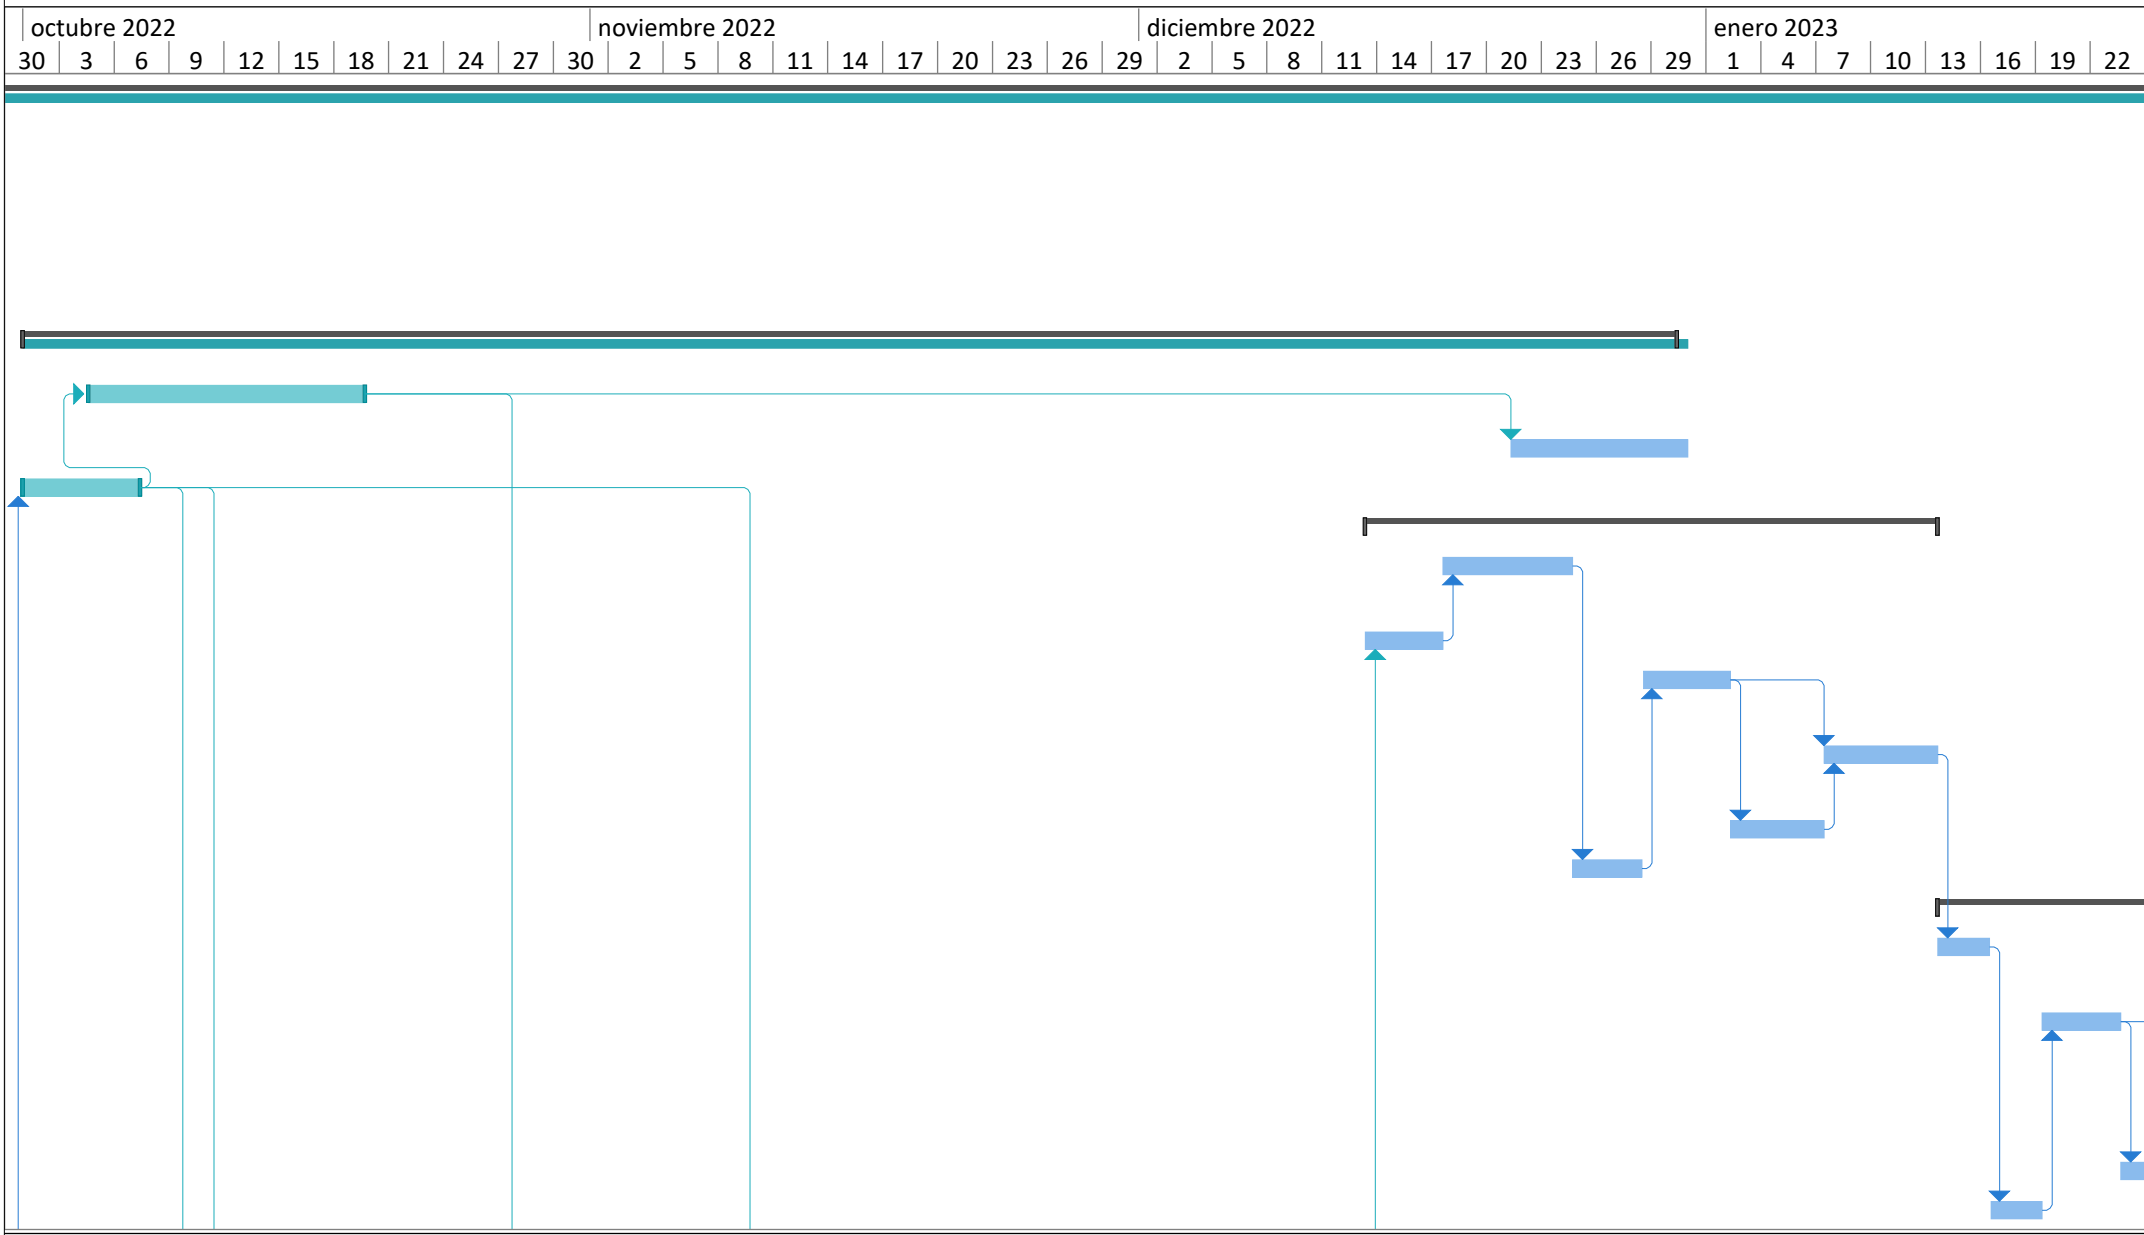

Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO


ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

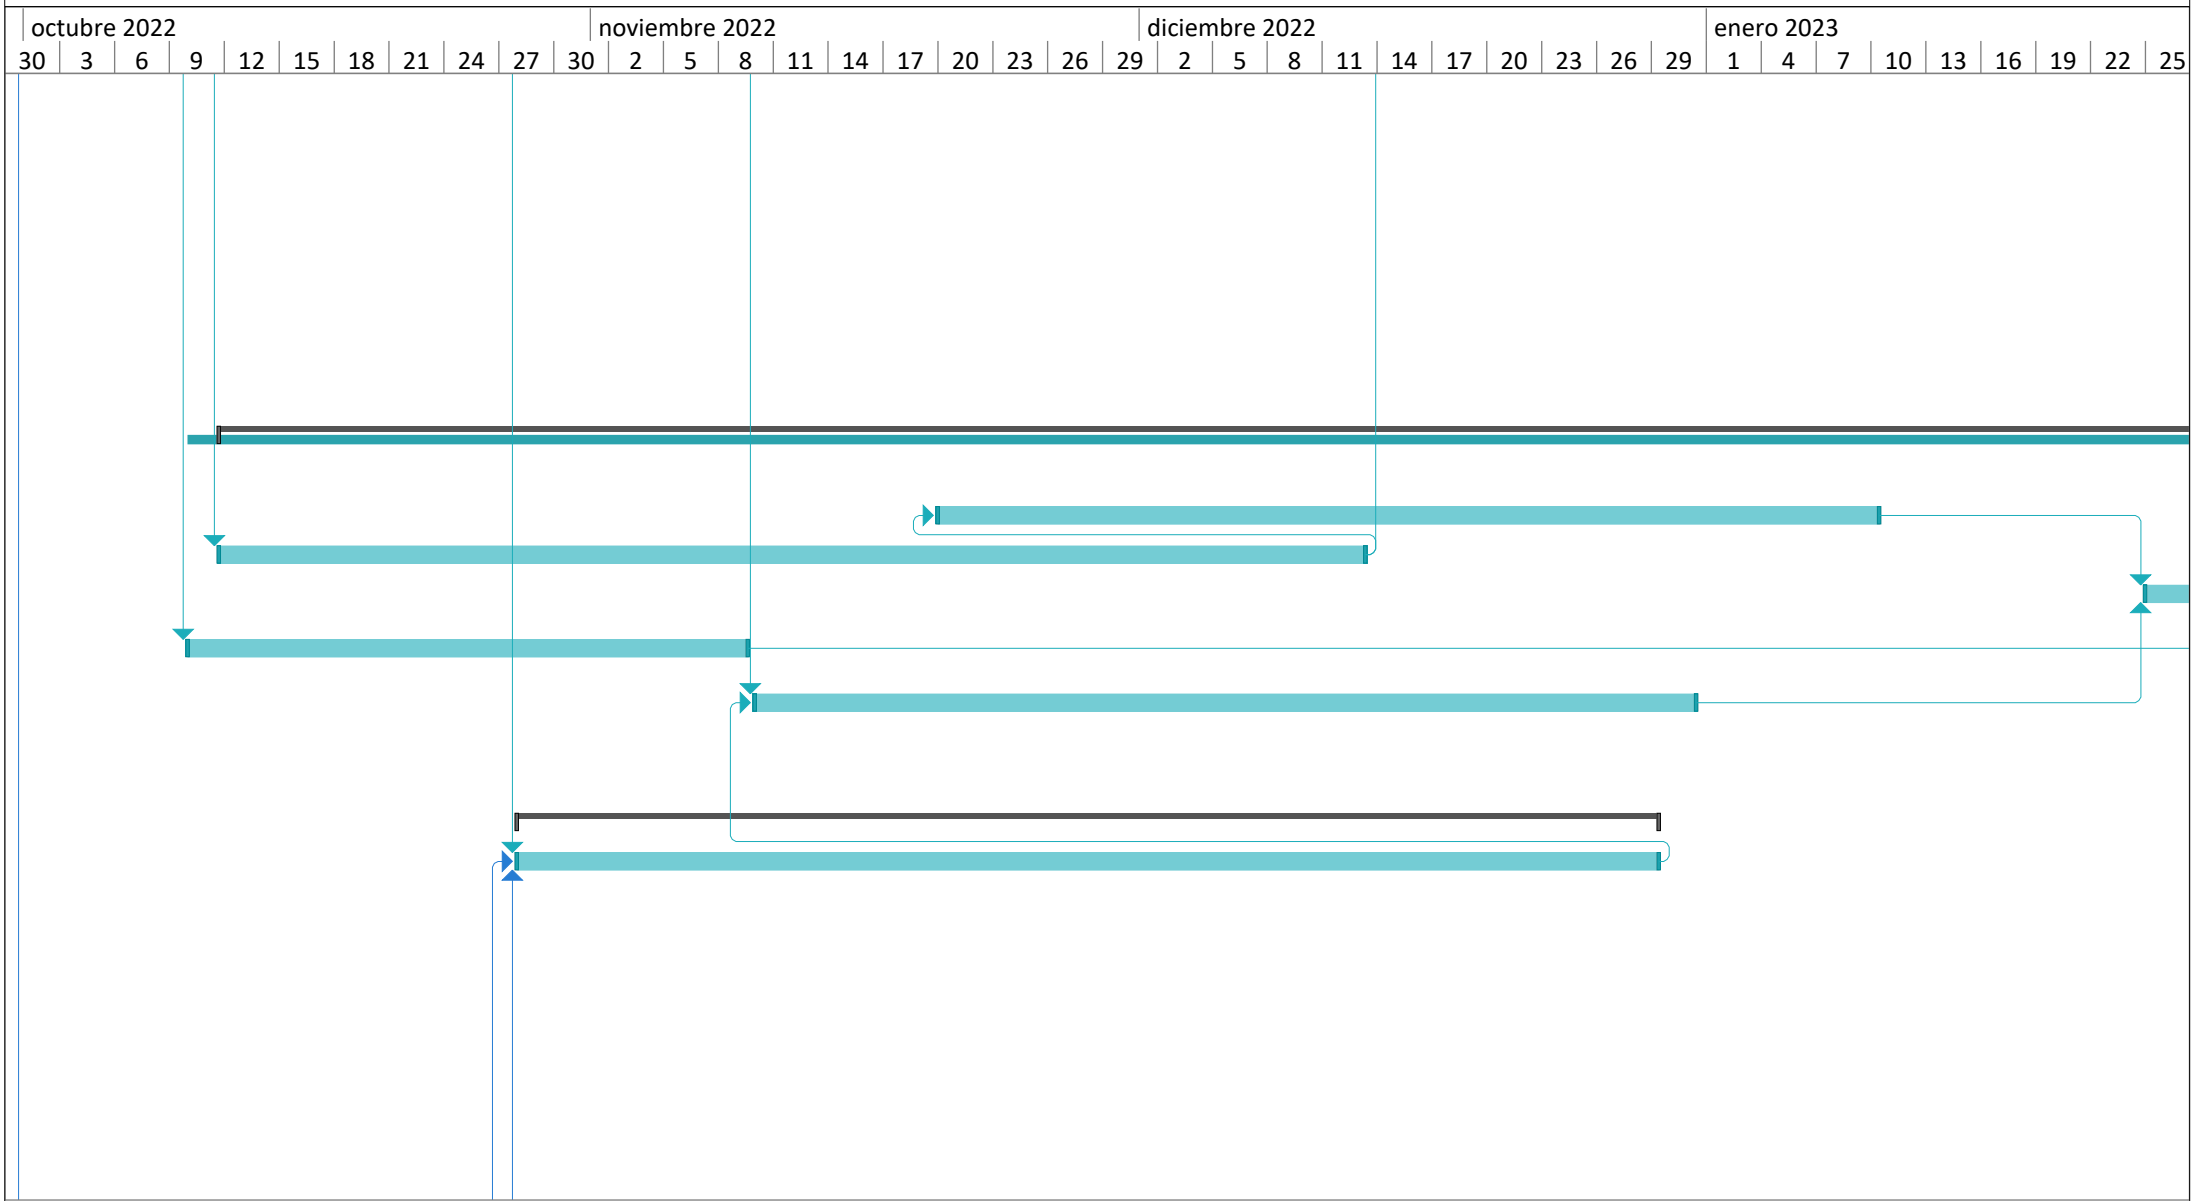

Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO


ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

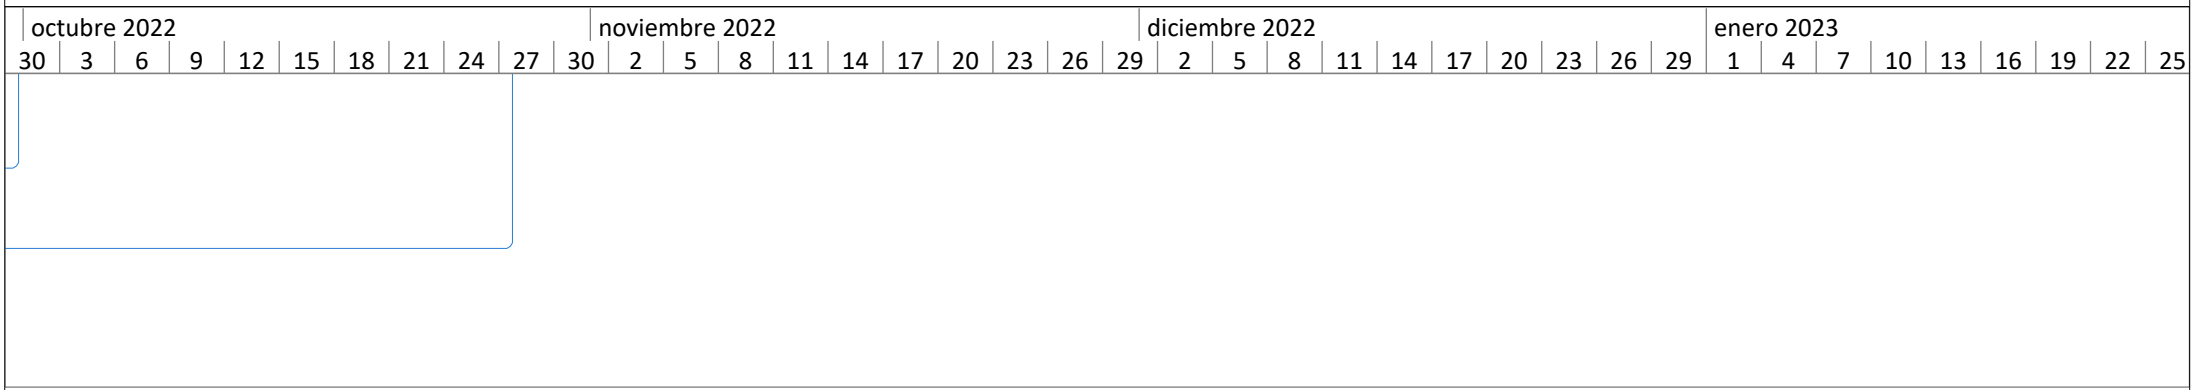

Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO


ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

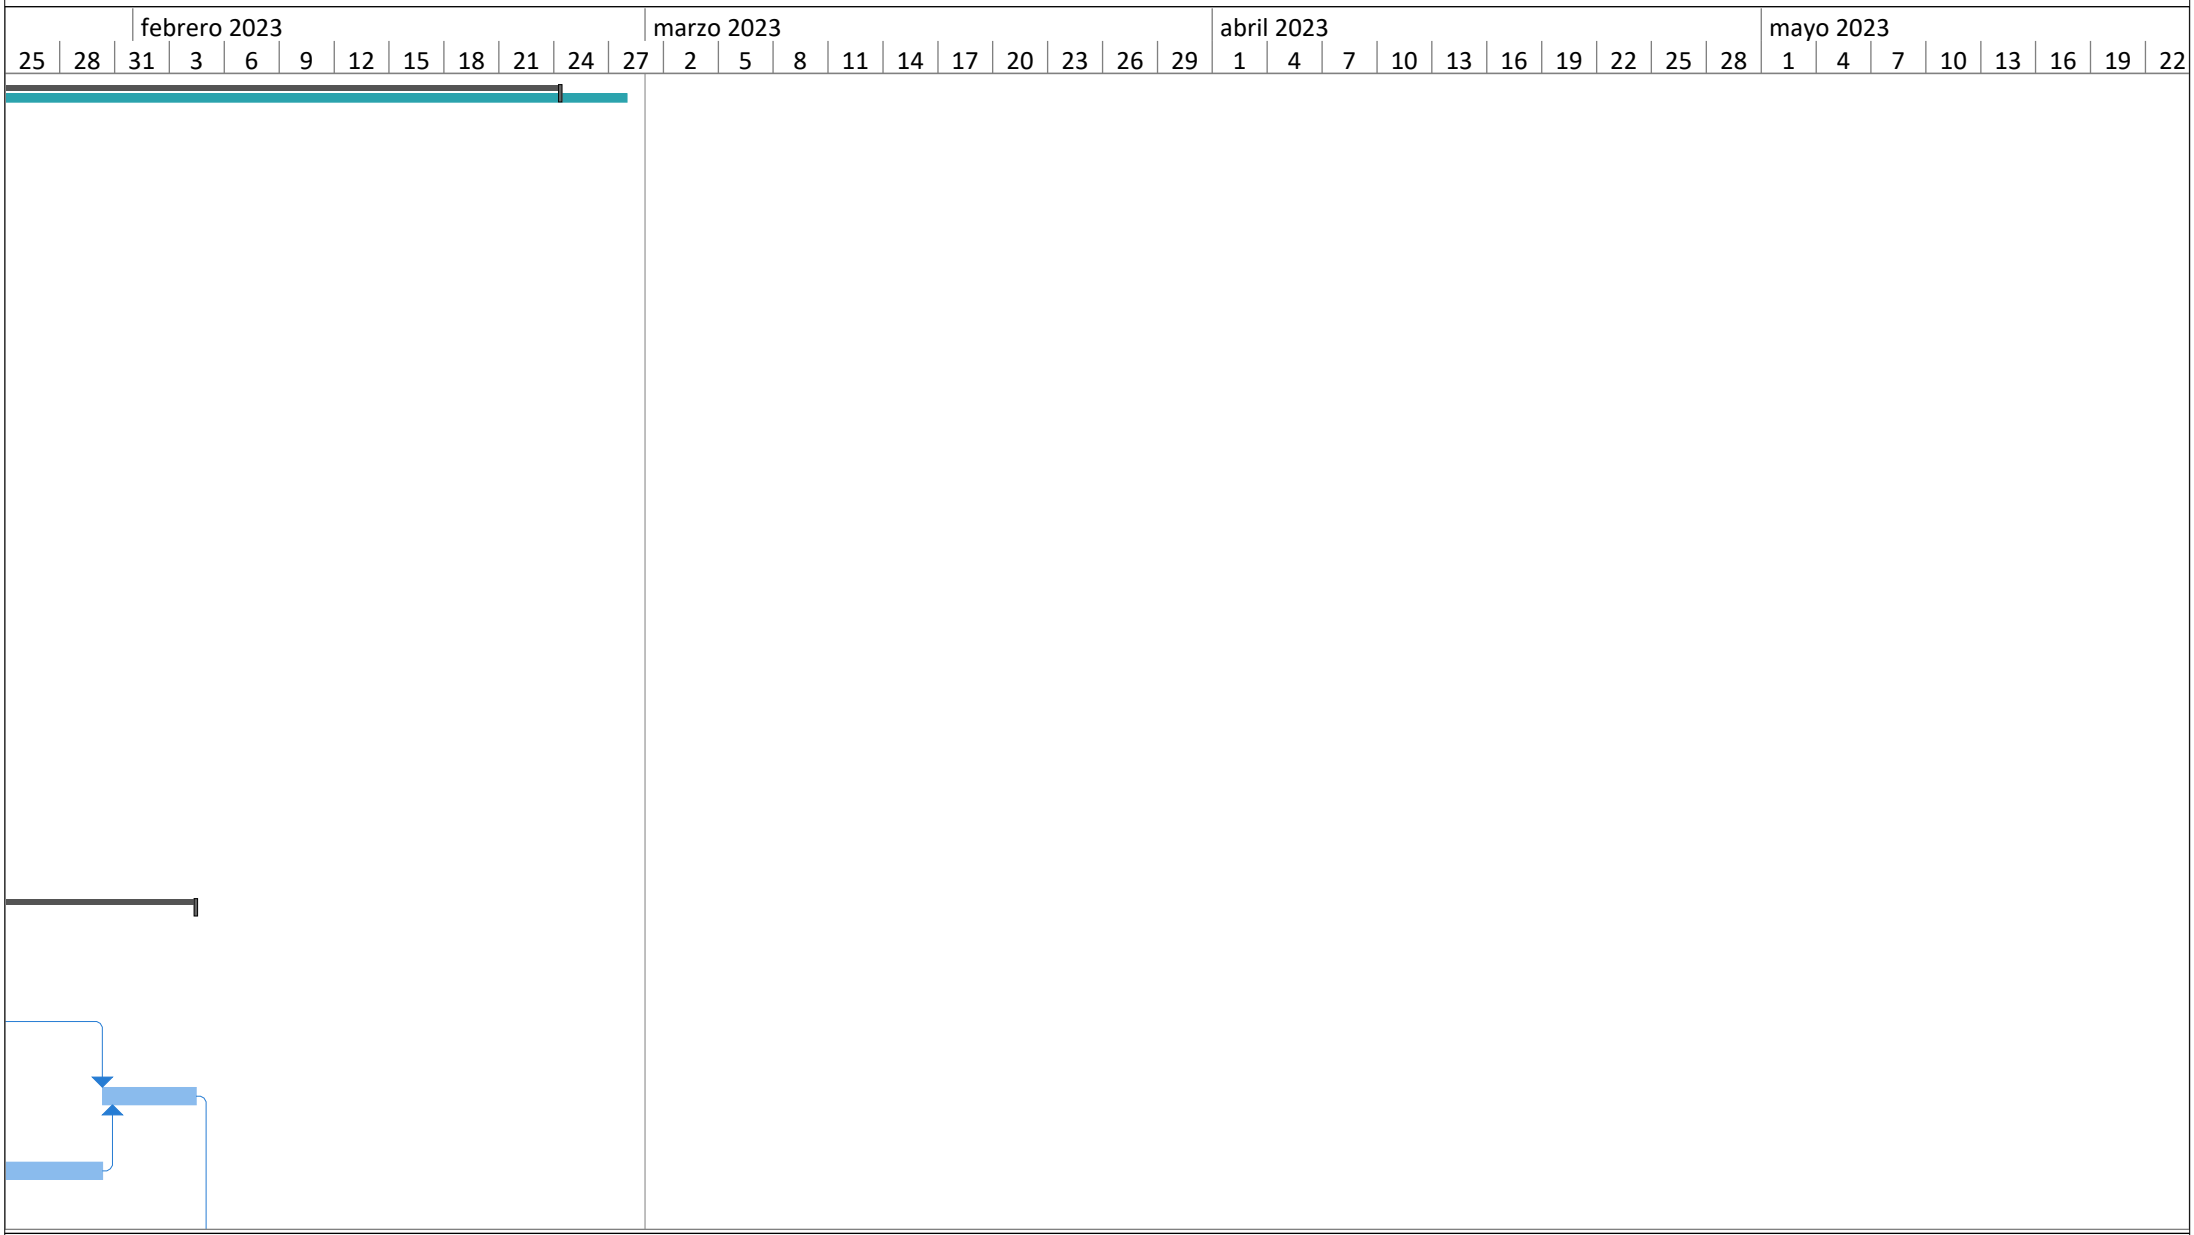

Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO


ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

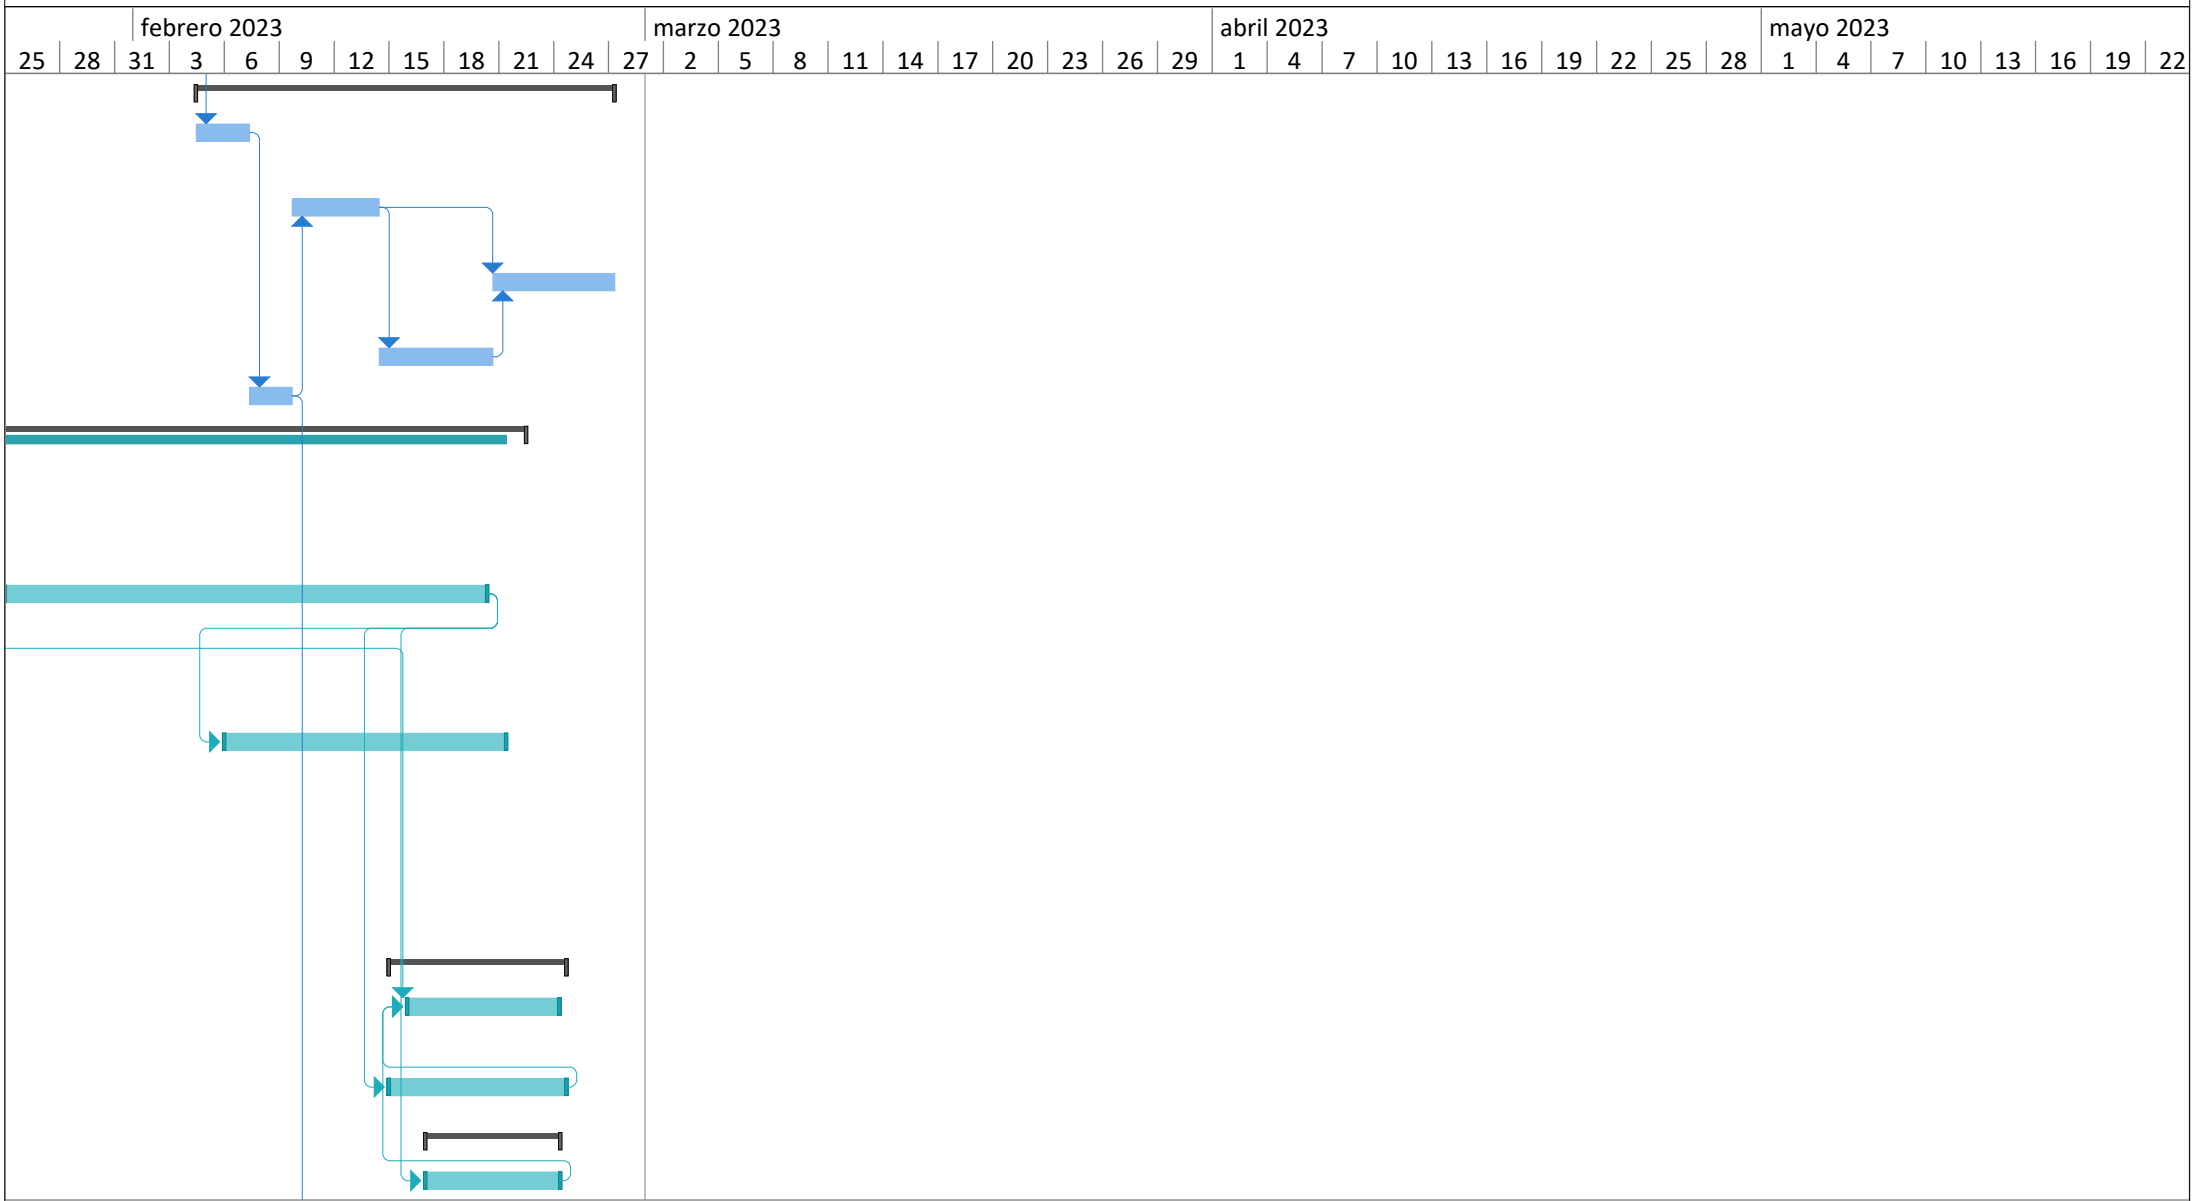

Elaboró:

ALCALDÍA DE SAN BERNARDO

ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES

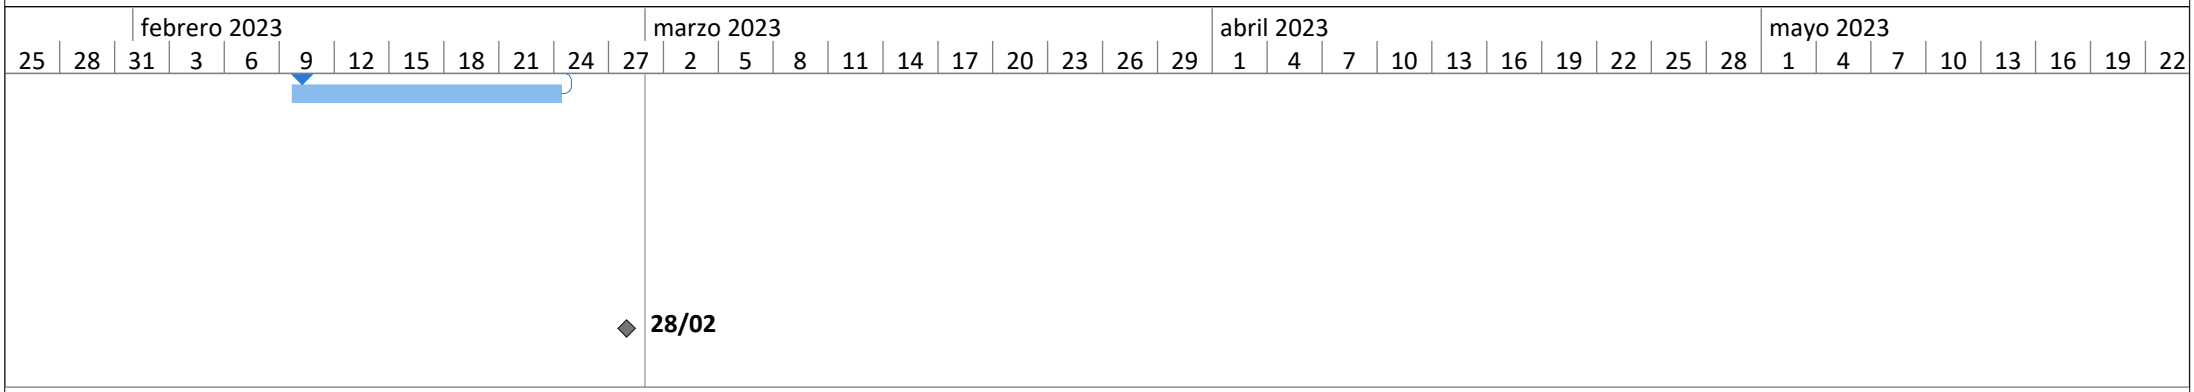

Elaboró:

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** -I

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MSRV-002-2022

OBJETO:
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMC

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 6.048.469.960,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 6.048.469.960,00

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/02/2023 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023			
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 148.314,31	2,47%	0%	% P			2,31%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%			
				$ P			$138.577,75	$0,00	$0,00	$9.736,56	$0,00			
				$ E										
				% E										
GPP2 - BOX CULVERT 1X1 (L =7m) 2und	$ 57.761,85	0,96%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,03%	0,93%	0,00%			
				$ P			$0	$0	$1.918,49	$55.843,36	0,00%			
				$ E										
				% E										
GPP3 - BOX CULVERT 1,5X1,5 (L =7m) 3und	$ 62.680,63	1,04%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,37%			
				$ P			$0	$0	$0	$40.625,13	$22.055,50			
				$ E										
				% E										
GPP4 - BOX CULVERT 2X1 (L =7m) 8und	$ 363.394,28	6,06%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,06%			
				$ P			$0	$0	$0	$0	$363.394,28			
				$ E										
				% E										
GPP5 - PAVIMENTOS ,AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	$ 4.956.035,63	82,61%	0%	% P			2,52%	5,29%	7,89%	15,98%	50,93%			
				$ P			$151.382,84	$317.233,20	$473.166,21	$958.524,46	$3.055.728,92			
				$ E										
				% E										
GPP6 - TRANSPORTE	$ 356.456,64	5,94%	0%	% P			0,00%	2,43%	2,46%	0,69%	0,00%			
				$ P			$0,00	$145.553,13	$149.316,90	$41.586,61	$0			
				$ E										
				% E										
GPP7 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 52.407,83	0,87%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%			
				$ P			$0	$0	$0	$0	$52.407,83			
				$ E										
				% E										
GPP8 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 2.464,00	0,04%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%			
				$ P			$0	$0	$0	$0	$2.464,00			
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.999.515,16**	**100%**	**0%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**4,83%**	**7,71%**	**10,74%**	**18,44%**	**58,27%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 289.960,59**	**$ 462.786,33**	**$ 644.401,60**	**$ 1.106.316,11**	**$ 3.496.050,53**			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**4,83%**	**12,55%**	**23,29%**	**41,73%**	**100,00%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 289.960,59**	**$ 752.746,92**	**$ 1.397.148,52**	**$ 2.503.464,64**	**$ 5.999.515,16**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 0,00**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 30.000.000,00 / $ -	$ -	%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.928.400,00 / $ -	$ -	%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.026.386,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 48.954.786,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 6.048.469.950,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Aprueba Firma:
Nombre: **FREDY RODRIGUEZ GIRALDO**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____, **DE** 26/12/2022 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ ____

SEGUIMIENTO No. 5
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-MSBV-002-2022

OBJETO:
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.048.469.960,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.048.469.960,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado %Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023				
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 148.314,31	2,47%	$ 14.592,39	% P			2,31%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%				
			0,24%	$ P			$138.577,73	$0,00	$0,00	$9.736,58	$0,00				
				$ E				$1.274	$13.318,74						
				% E				0,02%	0,22%						
GPP2 - BOX CULVERT 1X1 (L =7m) 2und	$ 57.761,85	0,96%	$ -	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%				
			0,00%	$ P			$0,00	$0,00	$1.918,49	$55.843,36	$0,00				
				$ E											
				% E											
GPP3 - BOX CULVERT 1,5X1,5 (L =7m) 3und	$ 62.680,63	1,04%	$ -	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	0,37%				
			0,00%	$ P			$0,00	$0,00	$0,00	$40.625,13	$22.055,50				
				$ E											
				% E											
GPP4 - BOX CULVERT 2X1 (L =7m) 8und	$ 363.394,28	6,06%	$ -	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,98%				
			0,00%	$ P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$363.394,28				
				$ E											
				% E											
GPP5 - PAVIMENTOS ,AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	$ 4.956.035,63	82,61%	$ 393.103,24	% P			2,62%	5,29%	7,89%	10,96%	10,53%				
			6,55%	$ P			$151.382,84	$317.220,20	$472.166,21	$656.524,46	$3.056.729,92				
				$ E				$71.475	$321.628,24						
				% E				1,19%	5,36%						
GPP6 - TRANSPORTE	$ 356.456,64	5,94%	$ 56.671,08	% P			0,00%	2,43%	2,43%	0,69%	0,00%				
			0,94%	$ P			$0,00	$146.502,13	$146.316,80	$41.996,61	$0,00				
				$ E				$319	$56.552,17						
				% E				0,00%	0,94%						
GPP7 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 52.407,83	0,87%	$ -	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%				
			0,00%	$ P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$52.407,83				
				$ E											
				% E											
GPP8 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 2.464,00	0,04%	$ -	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%				
			0,00%	$ P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.464,00				
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.999.515,16**	**100%**	**$ 464.366,71**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**7,74%**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	4,83%	7,71%	10,74%	18,44%	58,27%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.960,59	$ 462.786,33	$ 644.401,60	$ 1.106.316,11	$ 3.496.050,53				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	4,83%	12,55%	23,29%	41,73%	100,00%				0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.960,59	$ 752.746,92	$ 1.397.148,52	$ 2.503.464,64	$ 5.999.515,16				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	6,53%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.867,56	$ 391.499,15						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	7,74%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.867,56	$ 464.366,71						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 30.000.000,00 $ -		$ -	0%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.928.400,00 $ -		$ -	0%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.026.396,00 $ -		$ -	0%
*	$ - $ -		$ -	0%
*	$ - $ -		$ -	0%
*	$ - $ -		$ -	0%
*	$ - $ -		$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 48.954.796,00		$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 6.048.469.960,00**			
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		**$ 464.366.709,00**	**7,74%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202097114COR

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

• ACTAS DE COMITÉ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 27/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-002-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Implementación de Plan de contingencia: No Cumplido
Entregar soportes de seguridad social: cumplió
Entregar
Caracterización de los materiales de Afirmado, Cantera el San José: Cumplido
Entregar los formatos de donación del material correspondientes a la entrega a la Comunidad: El Municipio entrego certificación de sitio para la disposición final del material proveniente de excavación, construcción y demolición de obras civiles
Entregar Actas de Vecindad del Proyecto: Cumplido.
Entregar copia de acta de veedurías: Cumplido
Entregar los Rendimientos financieros: Cumplido
Entregar
Aprobacion del PMT del proyecto: Cumplido
Implementación del punto de atención: Cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1.Revision de ajustes y diseños.
2. Avance en la ejecución de la obra.
3. Prórroga del convenio
4. Valla informativa.
5. Señalización en obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1.) Revisión de ajustes y diseños: Conforme a la revisión de ajustes y diseños el contratista debe entregar los ajustes al diseño en los ítems no previstos de Piedra Rajón, pedraplén y Geotextil no tejido NT 2500 para así poder aterrizar el balance en un 100%.Además se debe realizar la actualización de los estudios y diseños en el componente hidráulico, estructural y documento paga definitivo. 2) Avance en la ejecución de la obra. El contrato de obra presenta una programación ejecutada del 6.51% versus una programación programada del 21.23% lo que representa un atraso en obra del 14.72%, ante lo anterior interventoría le recomienda al contratista que implemente un plan de contingencia que ayude a nivelar la programación mediante la mejora de los rendimientos en obra y adicionalmente entregar una reprogramación de obra. Se deja constancia por parte de la Interventoría que ya se radicó la solicitud de recomendación de apremio de multa ante el municipio por el atraso a la programación de la obra. - El secretario de planeación manifiesta que este tema lo esta analizando el equipo jurídico del municipio además recomienda al contratista realizar una reprogramación he implementar incrementar el equipo de trabajo para así ponerse al día con el atraso presentado y así no tener que dar cumplimiento con el apremio de multa solicitado por esta interventoría.
- El Director de obra Mario Cogollo Rodríguez manifiesta que se quiere aumentar el rendimiento en obra, se dispuso de más maquinaria y con la llegada de la motoniveladora a obra se iniciaron los trabajos a carril completo, para esta semana se compromete a entregar la reprogramación y un plan de contingencia. el contratista manifiesta que se suspender actividades el 31 de diciembre del 2022 y retomar el 3 de enero del 2023.
- La Ing. Laura Isabela Peña García Supervisor contrato de Interventoría por parte del INVIAS le recomienda al contratista la posibilidad de tener otra alternativa de trabajos de las fundidas de concretos con sistema de carmix para así también impactar más en el avance y recortar los atrasos que se tienen. - EL contratista manifiesta que contemplara la opción de utilizar este sistema de concretadora y se esta a la espera de una propuesta de negocion para tener en cuenta esta la utilización de este. además de entregar los ensayos de los agregados y los diseños de mezcla para un mr 38 y así la interventoría de la aprobación de estos.
- La Ing. Laura Isabela Peña García Supervisor contrato invita al contratista a aprovechar el verano para que avance mucho más y así mitigar los retrasos que presenta en obra. El contratista debe coordinar actividades en obra a pesar de las suspensiones que presentan las canteras y concreteras durante este fin de año y que esto no afecte el normal avance en sus actividades. 3.) Prórroga del convenio: La Ing. Laura Isabela Peña García Supervisor contrato manifiesta que Ya todos los convenios están aprobados en pre comité se está a la espera que el instituto (INVIAS) realice la elaboración de la minuta y apenas salga informara al municipio para continuar con el trámite de prórroga del convenio.
4.) Valla informativa. A la fecha el INVIAS no ha entregado el diseño o arte definitivo de la valla informativa, por lo que el contratista no ha podido mandarla a realizar. 5.) Señalización en obra: La interventoría solicita al contratista dar cumplimiento a la señalización en obra y señalización en campamento.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega ítems no previstos de Piedra Rajón, pedraplén y Geotextil NT 2500.	03/01/2023	Contratista
Entrega de componente hidráulico, estructural y documento paga	30/12/2022	Contratista
Entregar plan de contingencia y reprogramación de obra.	29/12/2022	Contratista
Prórroga del convenio	09/01/2023	Municipio
Mejoramiento de la señalización en los tramos intervenidos y campamento	28/12/2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 12/01/2023
(Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARIO RENÉ COGOLLO RODRIGUEZ	Representante Legal - Director de obra	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK AMID CAMARGO MORALES	Residente de Interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisor contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
JESUS SALGADO	Apoyo ala Supervisión del contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
ERICA LOPEZ	Apoyo ala Supervisión del contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ	Secretario de Infraestructura - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **ACTAS DE REUNIÓN**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-002-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, por parte de los especialista.
2. Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Verificacion a los compromisos
2.Seguimiento al avance y ejecucion del contrato
3. Fuente de materiales
4. Seguridad Social del personal vinculado al proyecto
5. Equipo minimo Requerido
6. Acabado final del Concreto
7. Valla del Proyecto.
8. Equipo de obra completo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de compromisos:
Entregar soportes de seguridad social: NO CUMPLIO
Entrega de documentación legal (licencia ambiental y título minero) de las canteras:NO CUMPLIO
Realizar mesa tecnica con los especialistas del contratista e Interventoria: Cumplio

2. Avance del contrato de obra LP-MSBV-002-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado para esta semana correspondiente al 3,37%, un ejecutado del 1,40%, lo cual representa un atraso acumulado del 13,86%.
la interventoría reitera que la ejecución del contrato de obra respecto a la programación presentada, a la fecha cuenta con un atraso del 13,86%; por consiguiente, se les informa que esta interventoría procedió a recomendar al Municipio de San Bernardo del Viento, iniciar el proceso de apremios de multas, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-MSBV-002-2022.
El contratista manifiesta que ha venido trabajando con normalidad en lo que va corrido en la semana, pero es consciente del atraso que presenta por lo que en el trascurso de los días presentara un plan de acción para alcanzar la programación del proyecto, y que le retraso acumulado en gran medida se debió al fenómeno de la niña que se presentó muy fuerte en el mes pasado.

3.fuente de materiales: El contratista no ha presentado la documentación de la cantera a utilizar, titulo minero y licencias ambientales de la cantera san José, corregimiento de san Sebastián del municipio de lorica, por lo que la interventoria solicita que se presente esta documentación para dar legalidad a la caracterización de los materiales de afirmado y subbase granular a utilizar.

4. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra del mes de noviembre que ala fecha no se han remitido la interventoría, es de recordar que el incumplimiento de esta, conlleva al que se solicite la respectiva multa.
5. Equipo mínimo Requerido: el contratista no presenta en obra el carrotanque para garantizar la humedad optima de los materiales como afirmado y subbase en el proceso de compactación, por lo que se le solicita al contratista dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y así mismo garantizar el equipo mínimo requerido por el proyecto.

6. Acabado final de las losas de Concreto: la interventoría solicita realizar un mejor acabado alas losas de concreto puesto que se evidencio que algunas presentaban una mala texturización, por lo que recomienda tomar medidas para el control del acabado final.

7. Valla del proyecto: la interventoria reitera que ala fecha no se tiene el diseño de arte definitivo por para del INVIAS, debio a las modificaciones de Cambio de gobierno, pero solicita al contratista instalar la Estructura donde se va instalar.

8. Equipo completo de obra: se le solicita tener en obra el equipo completo de instalacion de concreto como: vibrador de concreto, equipo de medida para la medir la consistencia del concreto fresco (cono de Abrams), por otra parte debe tener en obra el equipo para humectacion de los materiales de afirmado y subbase.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA 7/12/2022
(Día / Mes / Año)

Entregar soportes de seguridad social	12/12/2022	Contratista
Traer carrontanque para dar cumplimiento al equipo minimo requerido	13/12/2022	Contratista
Entregar la documentacion de la cantera san jose, titulo minero y licencia ambiental	13/12/2022	Contratista
Instalar estructura para valla del proyecto.	16/12/2022	Contratista
Tener en obra equipo completo para instalacion de concretos Vibrador de concreto tipo aguja y Cono de Abrams	12/12/2022	Contratista



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 15/12/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARIO RENÉ COGOLLO RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	
FERNÁNDO MARIO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-002-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022, NIT. 901587085-3

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, por parte de los especialista.
2. Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Verificacion a los compromisos
2.Seguimiento al avance y ejecucion del contrato
3. Fuente de materiales
4. Seguridad Social del personal vinculado al proyecto
5. Plan de contingencia
6. Insumos de materiales en acopios
7. Valla del Proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de compromisos:
Entregar soportes de seguridad social: NO CUMPLIO
Traer carrontanque para dar cumplimiento al equipo minimo requerido: CUMPLIO
Entrega de documentación legal (licencia ambiental y título minero) de las canteras:NO CUMPLIO
Instalar estructura para valla del proyecto: NO CUMPLIO
Tener en obra equipo completo para instalacion de concretos Vibrador de concreto tipo aguja y Cono de Abrams: Cumplio

2. Avance del contrato de obra LP-MSBV-002-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado para esta semana correspondiente al 19.20%, un ejecutado del 2.69%, lo cual representa un atraso acumulado del 16.51%.
la interventoría reitera que la ejecución del contrato de obra respecto a la programación presentada, a la fecha cuenta con un atraso del 16,51%; por consiguiente, se les informa que esta interventoría procedera nuevamente a recomendar al Municipio de San Bernardo del Viento, iniciar el proceso de apremios de multas, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-MSBV-002-2022.

3.fuente de materiales: Nuevamente s le reitera al contratista presentar la documentación de la cantera a utilizar, titulo minero y licencias ambientales de la cantera san José, corregimiento de san Sebastián del municipio de lorica, por lo que la interventoria solicita que se presente esta documentación para dar legalidad a la caracterización de los materiales de afirmado y subbase granular a utilizar.

4. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra del mes de noviembre que ala fecha no se han remitido la interventoría, es de recordar que el incumplimiento de esta, conlleva al que se solicite la respectiva multa.

5. Plan de Contingencia: el contratista debe presentar un plan de contingencia el cual debe imolementar de forma inmediata para empezas a mitigar el atrazo que presenta.

6. Insumos de materiales en acopios: Se reitera la solicitud por parte de la interventoría para que los contratistas de obra tengan suficientes insumos de materiales en acopios y campamentos para que no se vean paralizadas las obras en épocas decembrinas..

7. Valla del proyecto: la interventoria reitera que ala fecha no se tiene el diseño de arte definitivo por para del INVIAS, debio a las modificaciones de Cambio de gobierno, pero solicita al contratista instalar la Estructura donde se va instalar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entregar la documentacion de la cantera san jose, titulo minero y licencia ambiental	21/12/2022	Contratista
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato	22/12/2022	Contratista
Entrega de Plan de Contingencia	21/12/2022	Contratista
Iniciar con Insumos de materiales en acopios	22/12/2022	Contratista



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/12/2022 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARIO RENÉ COGOLLO RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	
FERNÁNDO MARIO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $ 1.334.401.728,00 correspondiente al 22,24% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 464.366.709,00 correspondiente al 7,74% ; lo que representa un atraso del 14,50%.

Estudios y diseños: a la fecha se encuentra aprobado el estudio geotécnico de la estructura vial y diseño de pavimentos; y se continua con la revisión y/o actualización del diseño de las obras de drenaje, el estudio hidráulico e hidrológico y el diseño geométrico

ii. Se recomienda al contratista presentar plan de continencia, que ayude a nivelar la programación mediante la mejora de los rendimientos en obra.

iii. El contratista presento documento PAGA, el cual fue revisado por la interventoría, presentado observaciones para su aprobación.

iv. Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados además de las observaciones al tema hidráulico realizadas por esta interventoría.

v. Se recomienda a la alcaldía del municipio de San Bernardo del viento, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-299-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Remisión observaciones estudio hidráulico e hidrológico	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-303-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Alcance oficio CVRIMG-153-2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-307-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Alcance oficio CVRIMG-266-2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-312-2022	3/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud licencia ambiental y titulo minero cantera san José	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-327-2022	6/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud tomar acciones correctivas sobre el material de afirmado	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-334-2022	9/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Aprobacion ordenes de giro anticipo No 7.8.9.10 y 11	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-340-2022	10/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Contingencia fiestas decembrinas	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-356-2022	13/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Seguimientos compromisos comité de obra No 3 29/11/2022	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-368-2022	14/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud respuesta revisión/actualización estudios y diseños	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-371-2022	15/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Remisión NO conformidad calidad de afirmado	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-384-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración aprobación PMT ante entidad correspondiente	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-387-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Requerimiento presencia personal profesional en obra y disponer de todo el equipo de maquinaria mínimo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-405-2022	21/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Requerimiento presencia personal profesional en obra y disponer de todo el equipo de maquinaria mínimo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-409-2022	21/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud entrega documentación área SST	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-418-2022	22/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Observaciones al PAGA	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-427-2022	23/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitud señalización centro de operaciones	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-432-2022	28/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Reiteración atraso contrato de obra	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-433-2022	28/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Requerimiento presencia personal profesional en la obra	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez
CVRIMG-440-2022	30/12/2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	Solicitudes planillas de pago seguridad social personal administrativo y operativo	Atn. Ing. Mario René Cogollo Rodríguez

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	14/12/2022	OFI-CVV-032-2022	14-dic.-22	Respuesta al oficio CVRIMG-303-2022, INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO ESTRUTURAL
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	14/12/2022	OFI-CVV-033-2022	14-dic.-22	Entrega de las observaciones a los estudios hidráulicas e hidrológicas realizadas en el oficio CVRIMG-299-2022
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	16/12/2022	NA	16-dic.-22	Entrega de Proyecto de Balance de Obras
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	27/12/2022	OFI-CVV-035-2022	27-dic.-22	Entrega de actas de vecindad, certificado de escombrera y planillas de seguridad
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	27/12/2022	OFI-CVV-036-2022	27-dic.-22	Entrega de evidencia del punto de atención al ciudadano.
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	27/12/2022	OFI-CVV-037-2022	27-dic.-22	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CANTERA SAN JOSE
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023		5-ene.-23	ORDENES DE PAGO PARA DESEMBOLSO
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023	OFI-CVV-038-2022	5-ene.-23	Solicitud de Prorroga.
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023	OFI-CVV-037-2022	5-ene.-23	Reprogramación de Obras.
CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	5/01/2023	NA	5-ene.-23	Subsanación Estudios y Diseños

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	2 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"**				



Descripción: Excavación en material común de la explanación y canales



Descripción: Colocacion de subbase



Descripción: humedecimiento del material de su base para su humedad optima



Descripción: Fundicion de losa de concreto 38 MR

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	FECHA ELABORACIÓN	2 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"**				



Colocacion de rieles y dovelas con su respectiva canastilla



Descripción: colocacion de concreto premezclado



Descripcion:Retiro de rieles



Descripción: Corte de losas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Jueves, 01 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, regla vibradora, texturizador de concreto, herramientas menores
Personal en obra:
2 de obra, 8 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 Paleteras, 8 obreros, 1 conductor de camioneta 2 operadores de maquinaria
Actividades realizadas
- Se continuaron con las actividades de relleno con material de afirmado
- Se continuaron con las excavaciones y explaneaciones de material común
- Se iniciaron co y finalizaron las actividades de colocación de rieles desde la K1+460 hasta la K1+390
- Se tomaron ensayos de densidad de campo de los materiales de afirmado y subbase

Observaciones:

Viernes, 02 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, regla vibradora, texturizador de concreto, herramientas menores
Personal en obra:
2 de obra, 8 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 1 topografo, 2 paleteras, 8 obreros, 1 conductor de camioneta, 2 operadores de maquinaria
Actividades realizadas
- Se colocó las canastillas con sus respectivas dovelas
- Se iniciaron y finalizaron con la fundición de losa de 38MR desde K1+390 hasta K1+460
- Se tomaron 3 muestras de concreto 38MR para ensayos de flexión

Observaciones:

- Se continuo con la colocación de material de subbase

Sabado, 03 de diciembre de 2022
No se laboro debido al cierre de vias en el municipio de Jorica donde se encuentra ubicada la cantera.

Domingo, 04 de diciembre de 2022
No se laboro, dia no laboral por ser domingo

Lunes, 05 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargados, 2 volquetas, 1 camioneta, herramientas menores
Personal en obra:
2 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 paleteras, 1 conductor de camioneta, 8 obreros, 2 operadores de maquinaria
Actividades realizadas
- Se realizaron actividades de excavación y retiro de material común
- Se procedio con la excavación de fallo puntual encontrado y luego se procedió a rellenar con materia de piedra rajon, luego se procedió a rellenar con material de afirmado y posteriormente se compactó

Observaciones:

Martes, 06 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, herramientas menores
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 paleteras, 1 conductor de camioneta, 8 obreros, 2 operadores de maquinaria, 2 cadeneros
Actividades realizadas
- Se continuaron con las actividades de excavacion y retiro de material entre las abscisas K1+130 hasta K1+180

Observaciones:

Miercoles, 07 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta regla vibradora, 1 texturizador de concreto, herramientas menores
Personal en obra
Director de obra, director de interventoria, 2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 paleteras, 1 conductor de camioneta, 8 obreros, 2 operadores de maquinaria, 2 cadeneros

Actividades realizadas
- Se colocaron las canastillas con sus respectivas dovelas
- Se iniciaron y finalizaron con la fundición de losa de 38 M2
- Se continuaron con las actividades de localización y replanteo del eje del Proyecto

Jueves, 08 de diciembre de 2022
No se laboro por fechas decembrinas

Viernes, 09 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, herramientas menores
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 paleteros, 1 conductor de camioneta, 8 obreros, 2 operadores de maquinaria, 2 cadeneros
Actividades realizadas
- Se continuó con el relleno, nivelación y compactación de la subbase desde la K1+250 hasta K1+230

-Se continuaron con las actividades de localización y replanteo del eje de la vía

Sabado, 10 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, regla vibradora, 1 texturizador de concreto, herramientas menores
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 cadeneros, 1 conductor de camioneta, 2 operadores de maquinaria, 2 paleteros, 8 obreros
Actividades realizadas
-Se iniciaron y finalizaron con las fundiciones de concreto M 38MR desde K1+340
-Se realizaron pruebas de densidad de campo del material de afirmado y subbase desde la abscisa K1+250 hasta K1+150
-Se tomaron muestras de vigetas de concreto MR 38 desde la abscisa K1+340
-Se continuaron las actividades de localización y replanteo del eje de la vía

Domingo, 11 de diciembre de 2022
No se laboro, dia no laboral por ser domingo

Lunes, 12 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, herramientas menores
Personal en obra:
1 de obra, director de interventoria, 1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 1 conductor de camioneta, 2 operadores de maquinaria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 8 obreros, maestro de obra
Actividades realizadas
-Se realizaron actividades de excavación y retiro de material común
-Se realizaron actividades de colocación de rieles
-Se realizaron actividades de cortes de losas de concreto

Observaciones

Martes, 13 de diciembre de 2022
No se laboro, suspensión de actividades por el día de santa lucia, día por tradición festivo para el personal de la zona

Miercoles, 14 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: soleado
Tarde: soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas, regla vibradora, 1 texturizador de concreto, herramientas menores, carrotanque
Personal en obra
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 1 conductor de camioneta, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 2 operadores de maquinaria, 8 obreros
Actividades realizadas
- se continuo y finalizó la fundición de material común desde K1+261 hasta K1+317
- se realizaron actividades de riego de los materiales de afirmado y subbase para la optima humedad del material y asi lograr la compactación ideal
- se tomaron muestras de concreto para realizar los ensayos de flexión

Jueves, 15 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, herramientas menores, cortadora de pavimento
Personal en obra
1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, maestro de obra, 1 conductor de camioneta, 2 operadores de maquinaria, 8 obreros
Actividades realizadas
-Se realizaron actividades de excavación y retiro de material común
-Se realizaron cortes de losa de concreto desde la abscisa K1+261 hasta K1+317
-Se realizaron retiros de rieles de las losas de concreto
-Se continuaron con las actividades de localización y replanteo del eje de la via

observaciones:

Viernes, 16 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas, herramientas menores

Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 1 conductor de camioneta, 2 operadores de maquinaria, 4 obreros

Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de relleno del material de afirmado
- Se continuaron con las actividades de localizacion y replanteo del eje de la via

Observaciones:

Sabado, 17 de diciembre 2022
No se registraron actividades por cierres de vias al municipio de San Bernardo

Domingo, 18 de diciembre de 2022
No se laboro, día no laboral por ser domingo

Lunes, 19 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas, herramientas menores
Personal en obra:
1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 fobratas, 2 cadeneros, 2 paleteras, 2 operadores de maquinaria, conductor de camioneta, 4 obreros
Actividades realizadas
- Se realizaron actividades de excavación y retiro de material común
- Se continuaron actividades de compactación de relleno de afirmado y subbase
- Se continuaron con las actividades de localización y replanteo del eje de la via

Observaciones:

Martes, 20 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y Maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas, herramientas menores
Personal en Obra
1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria


maestro de obra, conductor de camioneta, 2 oferadores de maquinaria, 2 tolografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 4 obreros

Actividades realizadas

- Se realizaron actividades de excavacion y retiro de material comun
- Se continuaron actividades de trazado y replanteo del eje de la via

Observaciones:





Miercoles, 21 de diciembre de 2022

No se realizaron actividades debido a que no se les habia pagado a los trabajadores



Jueves, 22 de diciembre de 2022

Estado del tiempo

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Equipos y Maquinarias:

1 vibrocompactador, 1 minicargadores, 2 volquetas, 1 camoneta, herramientas menores

Personal en obra:

1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 1 conductor de camioneta, maestro de obra, 2 oferadores de maquinaria, 2 tolografos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 4 obreros

Actividades realizadas
- Se realizaron actividades de excavación y retiro de material común
- Se continuaron actividades de colocación, extención, y conformación de subbase
- Se continuaron actividades de trazado y replanteo del eje de la via

Observaciones:

Viernes, 23 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, regla vibradora, texturizador de concreto, 1 camioneta, 2 volquetas 1 carrotanque, herramientas menores
Personal en obra
Director de obra, director de interventoria, 2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, 1 chofer, 2 operadores de maquinaria, maestro de obra, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 8 obreros
Actividades realizadas
- Se iniciaron y finalizaron actividades de fundida de concreto
- Se continuaron actividades de colocación, extención y confirmación de subbase
- Se realizaron actividades de riego de los materiales de afirmado y subbase para la optima humedad

del material y así lograr la compactación ideal
-se continuaron las actividades de localización y replanteo del eje de la vía

Observaciones:

Sabado, 24 de diciembre de 2022
No se laboro debido a fechas decembrinas, nocheviejo, navidad

Domingo, 25 de diembre de 2022
No se laboro, dia no laboral por ser domingo

Junes, 26 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: soleado
Tarde: soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas, 1 carrotanque, herramientas menores
Personal en obra
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, 1 chofer, maestro de obra, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 2 operadores de maquinaria, 4 obreros
Actividades realizadas
-Se continuaron actividades de colocación, extención,

y conformación de subbase
- Se realizaron actividades de humectación de afirmado y subbase para obtener la humedad ideal del material y así tener una correcta compactación
- Se realizaron actividades de trazado y replanteo del eje de la vía
- Se realizaron actividades de enrrielado de carriles

Observaciones:

Martes, 27 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 texturizador de concreta, regla vibratoria, 1 camioneta, 2 volquetas 1 carrotanque, herramientas menores
Personal en obra
Director de obra, director de interventoria, 1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 1 conductor, 8 obreros
Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de colocación, extención y conformación de afirmado
- Se iniciaron y finalizaron actividades de fundida de concreto MR38
- Se realizaron actividades de riego de los materiales de afirmado y subbase para la optima humedad

del material y asi lograr la compactacion ideal
- se continuaron actividades de trazado y replanteo del eje de la via

observaciones:

Miercoles, 28 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas, herramientas menores, 1 carrotanque
Personal en obra:
2 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografor, 2 cadeneros, 1 chofer, 2 paleteros, 2 operadores de maquinaria, 4 obreros
Actividades realizadas
- se realizaron actividades de cortes de losa de concreto
- se continuaron actividades de relleno con material de subbase
- se continuaron actividades de riego de los materiales de afirmado y subbase para la optima humedad del material y asi lograr la compactacion ideal

Observaciones:

Jueves, 29 de diciembre de 2022
Estado de tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y Maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, regla vibradora, texturizador de concreto
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 1 conductor, 2 cadeneros, 2 topografos, 2 operadores de maquinaria, 8 obreros
Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de colocación, extención y conformación de afirmado y subbase
- Se realizaron actividades de riego de los materiales de afirmado y subbase para la optima humedad del material para su compactación ideal
- Se iniciaron y finalizaron actividades de fundida de concreto HR38
- Por recomendación del ultimo comité se realizo acopio de materiales para mitigar el cierre de la cantera a fin de año

Observaciones:

Viernes, 30 de diciembre de 2022
Estado de tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 camioneta, 2 volquetas
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, maestro de obra, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 operadores de maquinaria, 1 conductor, 4 obreros
Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de colocación, extención y humectación, conformación y compactación de afirmado
- Se realizaron cortes de losa de concreto MR38
- Se realizaron actividades de desencofrado de rieles
- Se continuaron actividades de trazado y replanteo del eje de la via

Observaciones:

Sabado, 31 de diciembre de 2022
No se realizaron actividades por festividades de fin de año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

INFORME MENSUAL No. CINCO (5) **MES O PERIODO:** DICIEMBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	637
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	639
1	**INTRODUCCION**		641
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		642
2.1	Localización		642
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		643
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		644
2.4	Características técnicas del proyecto		645
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		646
3.1	Información general del contrato		646
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		646
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		647
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		647
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		649
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	650
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	661
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	663
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	669
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	674
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	680
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	683
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	691
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		693
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	696
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	698
	• Seguimiento Programa de Obra		707
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	724
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	726
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	728
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	776
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		950
5.1	Información general del contrato		950
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		951
5.3	Informes especialistas y profesionales		955
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1044
5.5	Informe matriz de riesgos.		1045
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1047
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		1049
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1051
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1054
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1060
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1062
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1073
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1075
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1077
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1079
7	**Conclusiones y recomendaciones**		737
8	**Anexos**		738
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		738
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		741
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		744
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		746

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** dic-22

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2022
PLAZO ACUMULADO: 8 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.121.889.999,40
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.121.889.999,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	5000
	Mejoramiento		
	Subbase		
Explaneaciones	Excavación en material	-	
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Subbase			
Explaneaciones	Excavación en ma	-		
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 8.016.404.815,00		$ 8.016.404.815,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 41.265.012,10	$ 7.840.352,30	$ 49.105.364,40
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.105.047.827,10	$ 16.842.172,30	$ 8.121.889.999,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 360.761.256,56		360.761.256,56	$ 360.761.256,56
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	360.761.256,56		360.761.256,56	360.761.256,56

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2022 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 8.016.404.815,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 360.761.256,56
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	4,50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extensión y conformación de afirmado 28/12/2022



Compactación de afirmado 29/12/2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Mediante comunicado CVRIMG-287-2022, se recomienda al municipio de San Bernado del Viento la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra. El contratista presento plan de continencia y reprogramación de obra, la interventoría manifiesta que se encuentra en revisión; sin embargo, se le solicito al contratista entregar el flujo de fondos de la programación presentada

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Bernardo del Viento, mediante el convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello que mediante el proceso de licitación pública **LP-MSBV-006-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO", El cual fue adjudicado al CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, cuyo plazo inicial es de ocho (8) meses a partir del 23 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 8.121.889.999,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se localiza en la vía que conduce desde la intersección que lleva San Bernardo del Viento - Moñitos hasta el Corregimiento del El Castillo y consiste en el mejoramiento de la vía con la construcción de una placa huella.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Bernardo del Viento.

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento. El territorio corresponde a un bosque seco tropical, con predominio de relieve bajo, baja altitud y alta temperatura, con un promedio de 30 °C, una humedad relativa del 80%, dos épocas de lluvias durante el año, entre abril – mayo y octubre – noviembre, en donde se precipita el 76% de la lluvia anual que es de unos 1.300 mm y una época de verano, que corresponde al resto del año. La mayor parte del territorio, al norte, sur y este, es plano, el resto presenta alturas cercanas a los 100 msnm, posee 34,2 km de playas de los cuales algunos tramos presentan condiciones adecuadas para el turismo y ecoturismo.



Ilustración 3. Vía al corregimiento el Castillo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales presentada por el contratista, se encuentra ubicada en la vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba. Esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 4. Ubicación de la fuente de materiales.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se benefician principalmente la zona rural del municipio de San Bernardo del viendo, principalmente la población que habita en el corregimiento de El Castillo.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de la vía; es por ello que se realiza el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio.



Estado inicial de la Vía, 24/08/2022



Estado de la la via Actual 22/12/202



Estado de la la via Actual 23/12/2022



Estado de la la via Actual 20/12/202

Ilustración 5. Estado inicial de la Vía. Cto. LP-MSBV-006-2022

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La construcción de 5000 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5 con una longitud de 7 metros.

Contrato LP-MSBV-006-2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	5000 metros
Ancho Calzada	5,3 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase	0,15 metros
Afirmado (mejoramiento)	0,20 metros

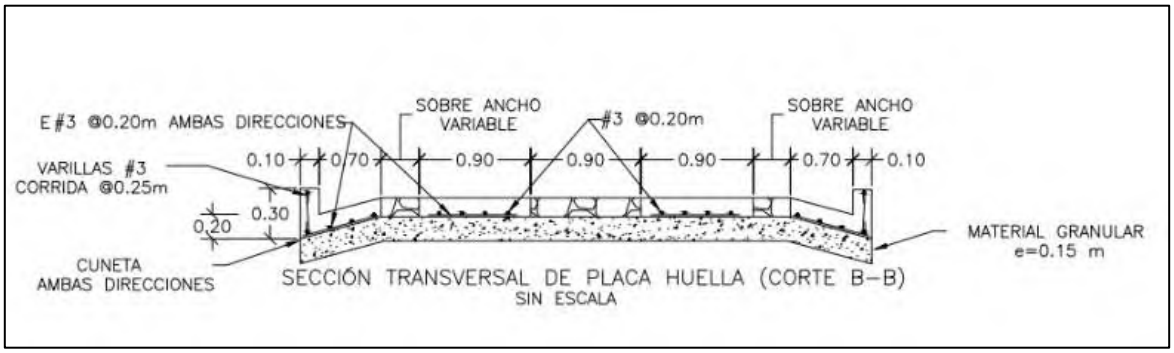


Ilustración 6. Sección típica placa huella

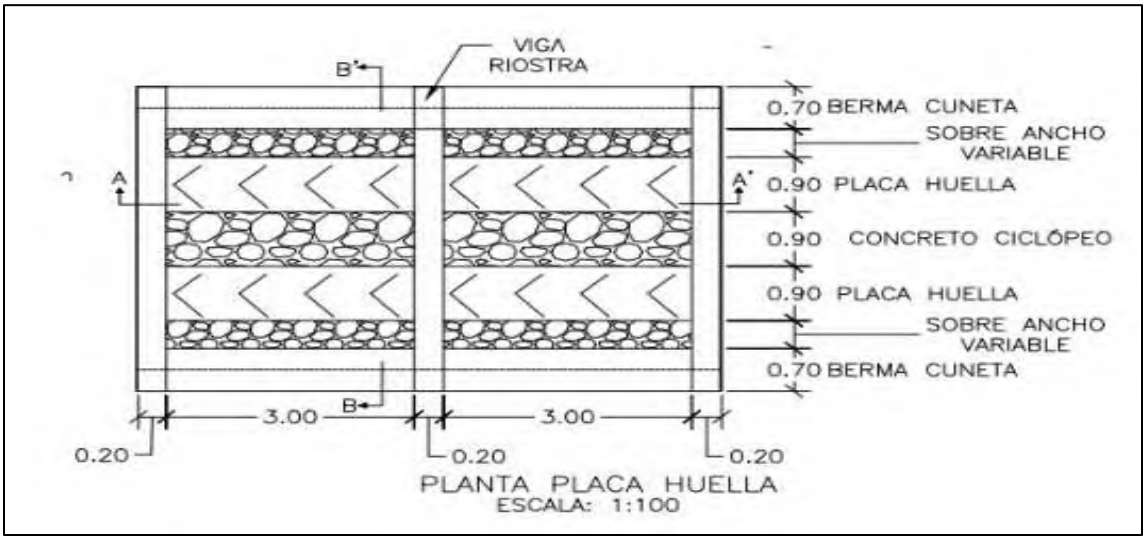


Ilustración 7. Sección típica en planta de la placa huella.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-MSBV-006-2022
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022/07/13
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
NIT	901611859-1
INTEGRANTES	• ALEXANDER THEVENING GARCÉS • C.C. 721.485.658 • Participación: 90%
	• CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S. • NIT. 900.506.559-2 • Participación: 10%
DIRECCIÓN	Cra 11 N 10-31 Pueblo Nuevo – Córdoba
TELEFONO	3107193787
CORREO	consorciovial.sanbernardo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.121.889.999,00
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA INICIO	23/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	23/04/2023

Tabla 1. Información Cto. LP-MSBV-006-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continúa con la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. A la fecha se cuenta con la aprobación del diseño de pavimento y con la aprobación del estudio geotécnico.
ii. Replanteo topográfico en conjunto entre la interventoría y contratista
iii. Se continua con las Excavaciones de material común y canales
iv. Se continua con el Relleno con material de afirmado

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista entregó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y está en revisión por parte de esta interventoría.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista instalo el punto de atención al usuario ubicado en el Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

i. A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. A la fecha, semana N°19, se tiene una inversión de obra programada de $ 2.960.735.148,42 correspondiente al 36.93% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 360.761.256,56 correspondiente al 4,50%; lo que representa un atraso del 32,43%.
ii. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iv. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.

xii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.

xiii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.

xiv. Revisar, evaluar, concertar y aprobar los ítems no previstos, producto de la revisión y/o ajustes estudios y diseños.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 15 del 25/11/2022 al 1/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.283.755.049,16	16,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 220.451.132,41	2,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.063.303.916,74)	-13,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.283.755.049,16	16,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 220.451.132,41	2,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.063.303.916,74)	-13,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 401.931.080,31	5,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 220.451.132,41	2,75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16,01% Avance o Atraso Físico %: -13,26%
Meta Física Ejecutada %: 2,75%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2022__	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:		NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:		NO X	N/A
EMISIONES:		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)		NO X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

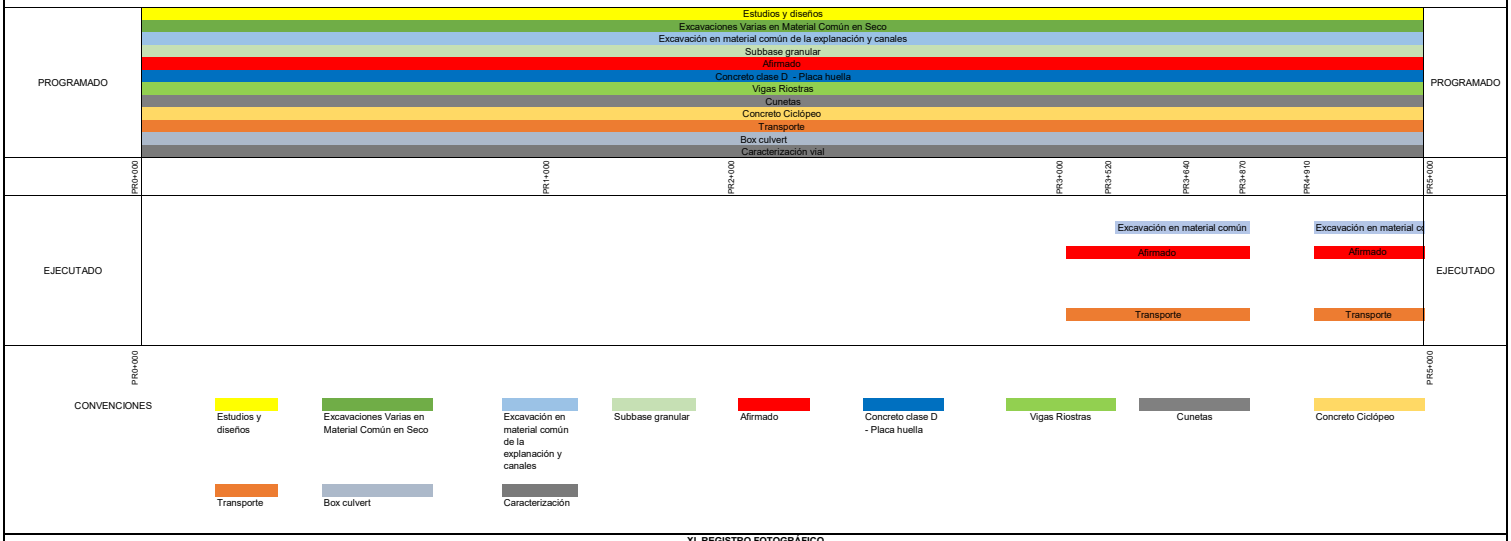

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavaciones de material comun y perfilado de la via




Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Suspensiones de actividades- vias de acceso mal estado de por Lluvias



Adecuación de tramos en mal estado por Lluvias



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 16 del 2/12/2022 al 8/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%	INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	CONTRATO No.	971 de 2022
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	FECHA DE INICIO:	22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.791.219.813,90	22,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 243.674.956,00	3,04%
AVANCE O ATRASO EN LA OBRA:	$ (1.547.544.857,90)	-19,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.791.219.813,90	22,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 243.674.956,00	3,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.547.544.857,90)	-19,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 507.464.764,74	6,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 85.359.753,00	1,06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 22,34% Avance o Atraso Físico %: -19,30%
Meta Física Ejecutada %: 3,04%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	1
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: **Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar**

OBSERVACIONES: el dia 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Inte rventoría e Instituto Nacional de Vias-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ----------
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ----------
AVALÚOS APROBADOS: ----------
PREDIOS ADQUIRIDOS: ----------

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos
5. Iniciar con la ejecucion de relleno Subbase Granular Clase C.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

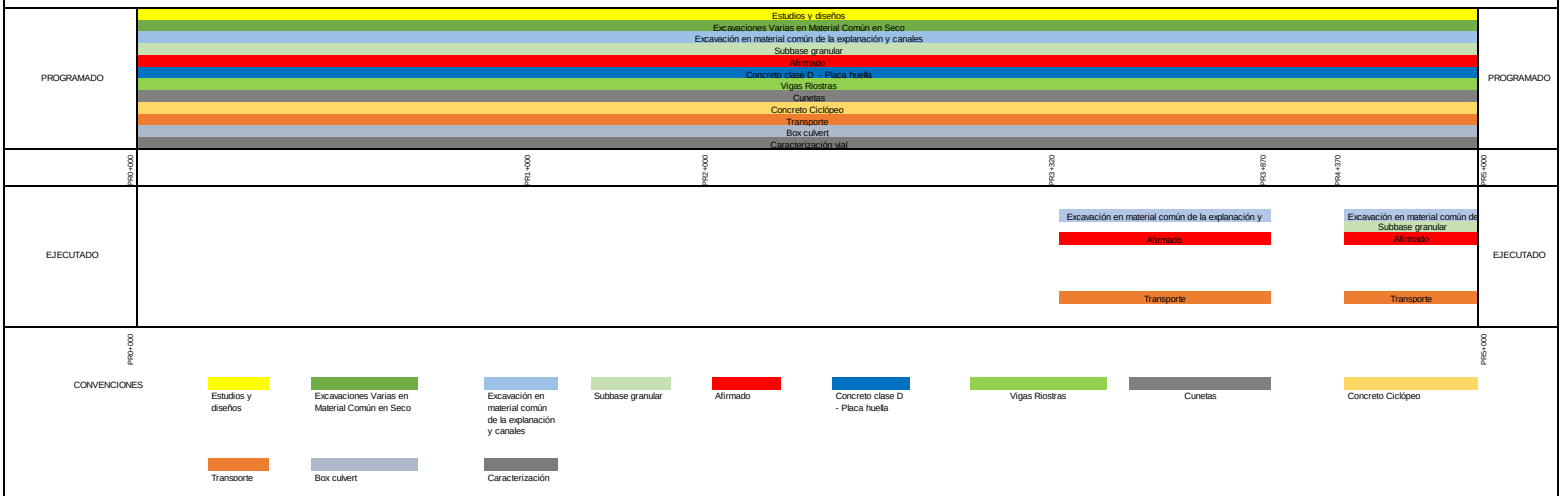

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Retiro de material de Excavaciones



Instalacion de Punto de Atencion Al Usuario



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Controladores de Trafico-PMT

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MIPI-M01-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	15/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 17 del 9/12/2022 al 15/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** X

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/04/2023

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.298.684.578,64	28,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 278.970.867,56	3,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -2.019.713.691,08	-25,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.298.684.578,64	28,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 278.970.867,56	3,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -2.019.713.691,08	-25,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 507.464.764,74	6,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.295.571,56	0,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 28,67%
Meta Física Ejecutada %: 3,48%
Avance o Atraso Físico %: -25,19%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Compresor	1	
Equipo de cacorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	1
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACION:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES: el dia 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALUOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos
5. Iniciar con la ejecucion de relleno Subbase Granular Clase C.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

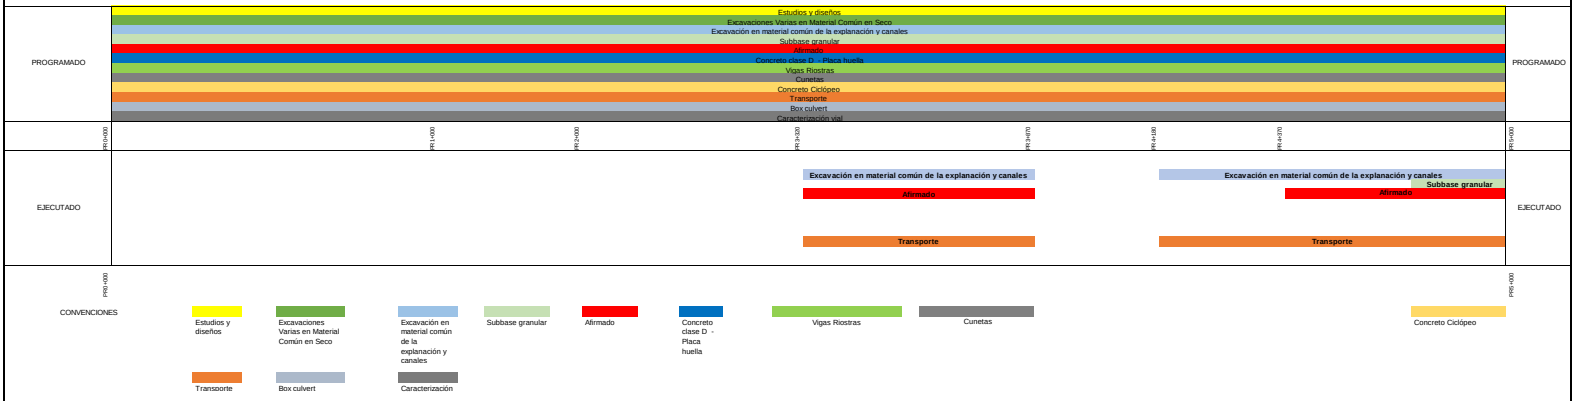

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Retiro de material de Excavaciones



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Controladores de Trafico-PMT



Control Topografico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEP-MN-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 18 del 16/12/2022 al 22/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** X

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/04/2023

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 8.016.404.815,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 2.671.487.885,05 33,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 336.605.340,56 4,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -2.334.882.544,49 -29,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 2.671.487.885,05 33,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 336.605.340,56 4,20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -2.334.882.544,49 -29,13%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 372.803.306,41 4,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 57.634.453,06 0,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.564.284.660,00 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 272.511.928,00 5,97%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA: $ 29.743.764,40 0,65%
$ 29.743.764,40 0,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO nov-22
VALOR FACTURA: $ 115.561.614,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33,33%
Meta Física Ejecutada %: 4,20%
Avance o Atraso Físico %: -29,13%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	1
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACION:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES: el dia 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vias-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALUOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos
5. Iniciar con la ejecucion de relleno Subbase Granular Clase C.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

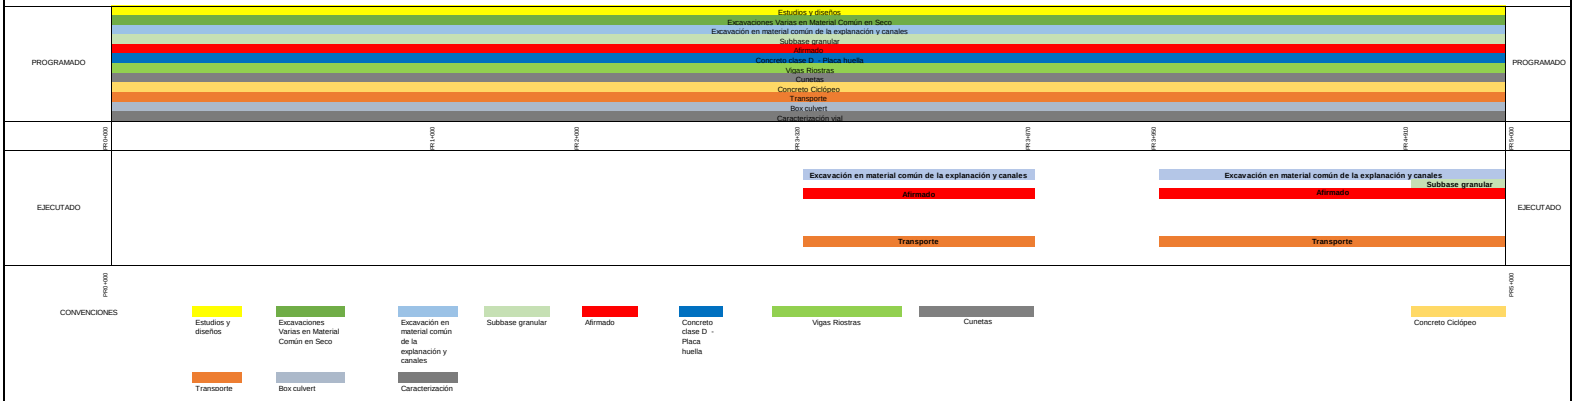

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Compactacion de material afirmado.



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Controladores de Trafico-PMT



Relleno con material afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MIPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 19 del 23/12/2022 al 29/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/04/2023

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 8.016.404.815,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 2.960.735.148,43 36,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 360.761.256,56 4,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -2.599.973.891,86 -32,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 2.960.735.148,43 36,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 360.761.256,56 4,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -2.599.973.891,86 -32,43%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 269.247.263,37 3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 24.155.916,08 0,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.564.284.660,00 100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 272.511.928,00 5,97%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN $ 29.743.764,40 0,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA $ 29.743.764,40 0,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO nov-22
VALOR FACTURA: $ 115.561.614,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 36,93%
Meta Física Ejecutada %: 4,50%
Avance o Atraso Físico %: -32,43%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1730			1730	34,6%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1730			1730	34,6%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	90			90	1,8%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	1
Compactador manual	1	
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	1
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACION:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO X	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A
EMISIONES:	SI		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES: el dia 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vias-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALUOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos
5. Iniciar con la ejecucion de relleno Subbase Granular Clase C.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

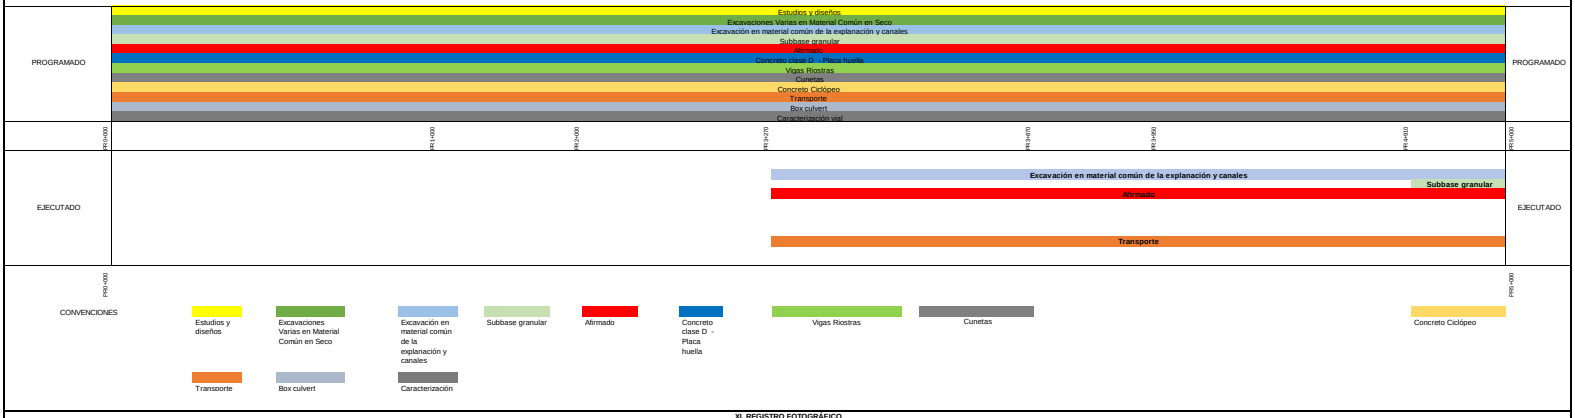

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Compactacion de material afirmado.





Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Controladores de Trafico-PMT





Relleno con material afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVADORA			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
MINICARGADOR	Caterpila Cp-433C / 2022		San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
MOTONIVELADORA			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
VIBROCOMPACTADOR			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
PAJARITA			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
VOLQUETA TQC-428			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A		A		A	I	A	A	A		I	I
VOLQUETA OVE-047			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
VOLQUETA SRO-030			San Bernadro del Viento	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA 228			San Bernadro del Viento									A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A		A	A		I	A	A	A	A	I	I
VOLQUETA ZSA-124			San Bernadro del Viento									A	A	I	A	A	I	I	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	9	9	10	10	10	10	9	10	10
TOTAL ACTIVO				8	8	8	8	8	8	7	0	9	8	0	8	9	6	7	8	9	0	8	9	7	10	9	9	0	9	9	9	8	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	1	8	1	2	10	2	1	4	3	2	1	10	2	1	1	0	0	0	10	1	1	1	1	10	10

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	206	71%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	83	29%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma
Nombre: ERICK DAVID CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202201974COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Porvenir, Protección, Colpensiones.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO	84.094.056	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9444233327	$ 80.000	COLPENSIONES	9444233327	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
2	ANDRÉS FABIÁN VILLALBA BARRIOS	10.772.157	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ANDRÉS FABIÁN VILLALBA BARRIOS	$ 2.400.000	$ 167.100	V	SALUD TOTAL	9444233327	$ 96.000	COLPENSIONES	9444233327	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
3	DAYANA MARCELA GONZALEZ FUENTES	1.003.459.220	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	DAYANA MARCELA GONZALEZ FUENTES	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	9444233327	$ 40.000	PORVENIR	9444233327	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
4	JOSE CAMILO ALTAMIRANDA ALVAREZ	1.067.842.072	TOPÓGRAFO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JOSE CAMILO ALTAMIRANDA ALVAREZ	$ 1.800.000	$ 125.300	V	CAJACOPI	9444233327	$ 72.000	PORVENIR	9444233327	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
5	LUIS MANUEL AVILA RAMOS	1.070.821.962	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	LUIS MANUEL AVILA RAMOS	$ 1.000.000	$ 69.600	V	MUTUALSER	9444233327	$ 40.000	PORVENIR	9444233327	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
6	JORGE ALEXANDER DURANGO OVIEDO	1.067.971.701	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JORGE ALEXANDER DURANGO OVIEDO	$ 1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	9444233327	$ 40.000	PROTECCIÓN	9444233327	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
7	MEILYN BALANTA APONTE	1.118.844.042	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X	MEILYN BALANTA APONTE	$ 2.000.000	$ 78.900	V	CAJACOPI	9444233327	$ 45.400	PORVENIR	9444233327	$ 181.400	$ 45.400	$ -	$ -	RETIRO
8	MANUEL CERVANTES MACHACÓN	73.595.024	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X	MANUEL CERVANTES MACHACÓN	$ 1.000.000	$ 27.900	V	NUEVA EPS	9444233327	$ 16.000	PORVENIR	9444233327	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
9	ERIS HUMBERTO DE LA HOZ PACHECO	85.463.491	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ERIS HUMBERTO DE LA HOZ PACHECO	$ 1.000.000	$ 69.600	V	CAJACOPI	9444233327	$ 40.000	PORVENIR	9444233327	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
10	ALCIDES RAFAEL DE LA HOZ VILLAR	1.123.405.092	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ALCIDES RAFAEL DE LA HOZ VILLAR	$ 1.000.000	$ 69.600	V	CAJACOPI	9444233327	$ 40.000	PROTECCIÓN	9444233327	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
11	FREDY MIGUEL FERNANDEZ UPARELA	1.069.501.949	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.000.000	X X X X X X X	FREDY MIGUEL FERNANDEZ UPARELA	$ 1.000.000	$ 18.600	V	NUEVA EPS	9444233327	$ 10.700	PORVENIR	9444233327	$ 42.700	$ 10.700	$ -	$ -	
12	MILENA ISABEL GOMEZ ARTEAGA	50.972.082	PALETERA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MILENA ISABEL GOMEZ ARTEAGA	$ 1.000.000	$ 37.200	V	MUTUALSER	9444233327	$ 21.400	PORVENIR	9444233327	$ 85.400	$ 21.400	$ -	$ -	
13	EMERITA GONZALEZ MADERA	1.070.811.981	PALETERA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMERITA GONZALEZ MADERA	$ 1.000.000	$ 37.200	V	MUTUALSER	9444233327	$ 21.400	PORVENIR	9444233327	$ 85.400	$ 21.400	$ -	$ -	
14	AMAURY DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ	73.091.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	AMAURY DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ	$ 1.000.000	$ 23.300	V	MUTUALSER	9444233327	$ 13.400	PORVENIR	9444233327	$ 53.400	$ 13.400	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866509326	9445503931	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	$5,273,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1067842072	ALTAMIRANDA ALVAREZ JOSE CAMILO	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1070821962	AVILA RAMOS LUIS MANUEL	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	73595024	CERVANTES MACHACON MANUEL	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	85463491	DE LA HOZ PACHECO ERIS HURBANO	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1123405092	DE LA HOZ VILLAR ALCIDES RAFAEL	Dependiente	0	No	No																												
6	CC	1067971701	DURANGO OVIEDO JORGE ALEXANDER	Dependiente	0	No	No																												
7	CC	1069501949	FERNANDEZ UPARELA FREDY MIGUEL	Dependiente	0	No	No																												
8	CC	50972082	GOMEZ ARTEAGA MILENA ISABEL	Dependiente	0	No	No																												
9	CC	1003459220	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	Dependiente	0	No	No																												
10	CC	1070811981	GONZALEZ MADERA EMERITA	Dependiente	0	No	No																												
11	CC	1027946761	HERNANDEZ USUGA JADER ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2022/12/05	X	2022/12/13																							
12	CC	73091534	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	Dependiente	0	No	No																												
13	CC	84094056	MEJIA TURIZO LUIS ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
14	CC	1070817648	MENDOZA BALLESTA PABLO	Dependiente	0	No	No		X	2022/12/12	X	2022/12/15																							
15	CC	1070818861	PADILLA QUINTANA JORGE LUIS	Dependiente	0	No	No		X	2022/12/02	X	2022/12/13																							
16	CC	10772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	Dependiente	0	No	No																												

Total **Afiliados(16)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.800.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.800.000	16%	SIN RIESGO	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		MUTUAL SER	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		CAJACOPI	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		CAJACOPI	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		MUTUAL SER	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		COOSALUD MOVILIDAD	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		MUTUAL SER	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 300.000	16%	SIN RIESGO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9	$ 300.000	4%	$ 12.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		MUTUAL SER	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		SANITAS	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	4	$ 133.334	16%	SIN RIESGO	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400		MUTUAL SER	4	$ 133.334	4%	$ 5.400	$
							$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 400.000	16%	SIN RIESGO	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000		MUTUAL SER	12	$ 400.000	4%	$ 16.000	$
							$ 2.400.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	16%	SIN RIESGO	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000		SALUD TOTAL	30	$ 2.400.000	4%	$ 96.000	$
																					$ 2.725.400						$ 681.400	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 72.000		COMFACOR	30	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	ARL SURA	30	$ 1.800.000	6,96%	5	$ 125.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 12.000		COMFACOR	9	$ 300.000	4%	$ 12.000	ARL SURA	9	$ 300.000	6,96%	5	$ 20.900	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 40.000		COMFACOR	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	ARL SURA	30	$ 1.000.000	6,96%	5	$ 69.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 80.000		COMFACOR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	ARL SURA	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 5.400		COMFACOR	4	$ 133.334	4%	$ 5.400	ARL SURA	4	$ 133.334	6,96%	5	$ 9.300	4	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 16.000		COMFACOR	12	$ 400.000	4%	$ 16.000	ARL SURA	12	$ 400.000	6,96%	5	$ 27.900	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 96.000		COMFACOR	30	$ 2.400.000	4%	$ 96.000	ARL SURA	30	$ 2.400.000	6,96%	5	$ 167.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 681.400						$ 681.400						$ 1.185.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866509326	9445503931	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	$5,273,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,725,400	$0	$0	$2,725,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$704,000	$0	$0	$704,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,680,000	$0	$0	$1,680,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$341,400	$0	$0	$341,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,185,700	$0	$0	$1,185,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,185,700	$0	$0	$1,185,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$681,400	$0	$0	$681,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$681,400	$0	$0	$681,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				16	$681,400	$0	$0	$681,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$12,000	$0	$0	$12,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$181,400	$0	$0	$181,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$208,000	$0	$0	$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**16**	**$5,273,900**	**$0**	**$0**	**$5,273,900**

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES INFORME MENSUAL: dic-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	210343	Vias Terciarias Mejoradas	220117	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 1.350.000.000,00	
2023	210344	Vias Terciarias Mejoradas	220119	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 6.771.889.999,00	
TOTAL						$ 8.121.889.999,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.121.889.999,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nit: 800.096.804-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Usuario: Margela03
Estado: Guardado

Número: 210343 | Fecha: 2022-07-13 | Valor Compromiso: $1,350,000,000.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.L.

C.D.P No. 220117 | de Fecha: 2022-02-10 | Solicitud No: 220117

Contrato de Obra Publica | LP-MSBV-006-2022 | Supervisa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 819 DE 2003, EL ARTICULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012,

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD # 220117 DE FECHA 2022-02-10 , QUE PERMITE CONSTITUIR COMPROMISO CON: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, IDENTIFICADO CON CC/NIT: **901611859-1** CUYO OBJETO ES **COMPROMISO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO** POR LA SUMA DE: **1,350,000,000.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.L.)**

Conceptos	Certificado $
2.3.2.02.02.005.09.03 Transporte - Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitacion Vias Fuente: 1.3.1.1.07.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL - VIGENCIA ACTUAL Sector: 24.02.041 TRANSPORTE - Infraestructura red vial regional - Vía terciaria mejorada Tercero: 901611859 CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	1,350,000,000.00

Firma Autorizada
MARGELA MARIA HERNANDEZ ZURITA
Analista de Presupuesto

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nit: 800.096.804-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Usuario: Margela03
Estado: Guardado

Número: 210344 | Fecha: 2022-07-13 | Valor Compromiso: $6,771,889,999.00

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.L.

C.D.P No. 220119 | de Fecha: 2022-02-10 | Solicitud No: 220119

Contrato de Obra Publica | LP-MSBV-006-2022 | Supervisa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 819 DE 2003, EL ARTICULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012,

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD # 220119 DE FECHA 2022-02-10 , QUE PERMITE CONSTITUIR COMPROMISO CON: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, IDENTIFICADO CON CC/NIT: **901611859-1** CUYO OBJETO ES **COMPROMISO MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO, DERIVADO DEL CONVENIO INTERARDMINISTRATIVO NO.1893 DE 2021, SUSCRITO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** POR LA SUMA DE: **6,771,889,999.00 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.L.)**

Conceptos	Certificado_$
2.3.2.02.02.005.09.03 Transporte - Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitacion Vias Fuente: 1.3.1.1.07.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL - VIGENCIA FUTURA Sector: 24.02.041 TRANSPORTE - Infraestructura red vial regional - Vía terciaria mejorada Tercero: 901611859 CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	6,771,889,999.00

Firma Autorizada
MARGELA MARIA HERNANDEZ ZURITA
Analista de Presupuesto

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	22	21	22	20,5	21,5	21,5	21,5	24	24	22,5	22	21	24	21	22	24	22	22	24	24	24	24	22	24	24	22	1	22	23		656,5
Lluvias moderadas	0	2	3	2	0	0	0	2,5	0	0	1,5	2	3	0	3	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0		26
Lluvias intensas	0	0	0	0	3,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1		14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,5	23,5	24	24	24	24	24	24	24	24	4	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202154872CND

Firma
Nombre: [illegible] DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520218157BC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc
13085030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Orc

Entidad	AreaOperativa	Departament
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Bernardo	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion	
01/12/2022 0:00	0	50		900	
02/12/2022 0:00	0	50		900	
03/12/2022 0:00	0	50		900	
04/12/2022 0:00	0	50		900	
05/12/2022 0:00	0	50		900	
06/12/2022 0:00	0	50		900	
07/12/2022 0:00	0	50		900	
08/12/2022 0:00	0	50		900	
09/12/2022 0:00	0	50		900	
10/12/2022 0:00	0	50		900	
11/12/2022 0:00	0	50		900	
12/12/2022 0:00	0	50		900	
13/12/2022 0:00	0	50		900	
14/12/2022 0:00	0	50		900	
15/12/2022 0:00	0	50		900	
16/12/2022 0:00	0	50		900	
17/12/2022 0:00	2	50		900	
18/12/2022 0:00	0	50		900	
19/12/2022 0:00	0	50		900	
20/12/2022 0:00	0	50		900	
21/12/2022 0:00	0	50		900	
22/12/2022 0:00	0	50		900	
23/12/2022 0:00	0	50		900	
24/12/2022 0:00	0	50		900	
25/12/2022 0:00	0	50		900	
26/12/2022 0:00	0	50		900	
27/12/2022 0:00	0	50		900	
28/12/2022 0:00	0	50		900	
29/12/2022 0:00	0	50		900	
30/12/2022 0:00	0	50		900	
31/12/2022 0:00	0	50		900	

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL diciembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	20/12/2022	GRANULOMETRÍA	INV-E-123-13	Acopio en obra	1	FRANJA A38	La curva entra dentro de los limites	SI	Cumple como material art 311 Invias "Afirmado " en lo referente a la granulometria, cumple limites de consistencia, cumple con Indice de pasticidad.
2	20/12/2022	LÍMITE LÍQUIDO	INV-E-125-13	Acopio en obra	1	40 (MAX)	23	SI	
3	20/12/2022	LÍMITE PLÁSTICO	INV-E-126-13	Acopio en obra	1	Entre 4 y 9	7	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INCICONSULTA LTDA

ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CLASIFICACIÓN DE SUELOS

GRANULOMETRÍA: INV-E-123-13	LÍMITE LÍQUIDO: INV-E-125-13	LÍMITE PLÁSTICO: INV-E-126-13

PROYECTO:	MEJORAMIENTO PLACA HUIELLA CORREGIMIENTO EL CASTILLO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	**FECHA:**	DICIEMBRE 20 DE 2022
PETICIONARIO:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG		
MUESTRA :	Material granular tipo afirmado color grisaseo. Cantera El Esfuerzo, tomado en obra		
LOCALIZACION:	EL CASTILLO		
SONDEO No.:		**PROFUND.:**	

OBSERVACIONES: Cumple como material art 311 Invias "Afirmado " en lo referente a la granulometria, cumple limites de consistencia, cumple con Indice de pasticidad.

GRANULOMETRÍA - I.N.V.-E- 123-13

PI=	4.200,00		
TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETEN.	% QUE PASA
3"	0	0,00	100,00
2"	0	0,00	100,00
1 1/2"	0	0,00	100,00
1"	0	0,00	100,00
3/4"	350	8,33	91,67
3/8"	1000	23,81	67,86
No.4	850	20,24	47,62
No.10	540	12,86	34,76
No.40	376	8,95	25,81
No.200	425	10,12	15,69
FONDO	659	15,69	

LÍMITE LÍQUIDO - I.N.V. -E-125-13

NO. DE GOLPES	15	26	35	
RECIPIENTE No.	060	105	14	
PESO RECIP.+MAT. HUMEDO (gr)	26,30	23,05	21,10	
PESO RECIP.+MAT. SECO (gr)	21,90	19,50	18,05	
PESO DEL AGUA (gr)	4,40	3,55	3,05	
PESO DEL RECIPIENTE (gr)	3,80	3,94	3,85	
PESO DEL MATERIAL SECO (gr)	18,10	15,56	14,20	
CONTENIDO DE HUMEDAD(%)	24,31	22,81	21,48	

LÍMITE PLÁSTICO - I.N.V.-E- 126-13


RECIPIENTE No.	054	048		
PESO RECIP.+MAT. HUMEDO (gr)	14,05	14,35		
PESO RECIP.+MAT. SECO (gr)	12,65	12,85		
PESO DEL AGUA (gr)	1,40	1,50		
PESO DEL RECIPIENTE (gr)	3,85	3,86		
PESO DEL MATERIAL SECO (gr)	8,80	8,99		
CONTENIDO DE HUMEDAD(%)	15,91	16,69		

GRADACIÓN		ÍNDICES	
% GRAVAS	52,38	Cu=	
% ARENAS	31,93	Cc=	
% FINOS	15,69	Liquidez	


HUMEDAD NATURAL	5,62
LÍMITE LÍQUIDO	23
LÍMITE PLÁSTICO	16
ÍNDICE DE PLASTICIDAD	7

CLASIFICACIÓN	
A.A.S.H.T.O.	A-2-4
ÍNDICE DE GRUPO (IG)	0
U.S.C.S.	GM-GC

CURVA GRANULOMÉTRICA) FRANJA A38

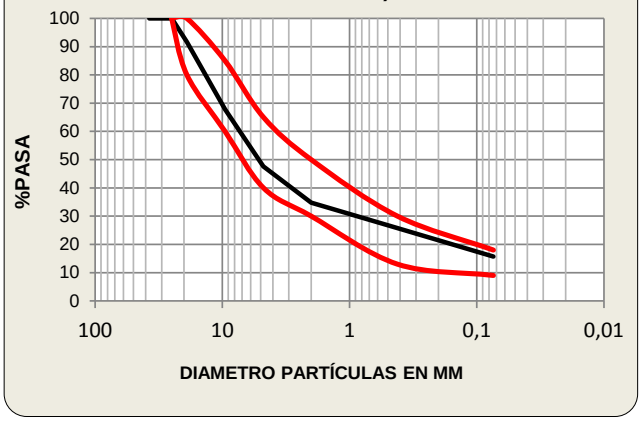

GRÁFICA PARA LÍMITE LÍQUIDO

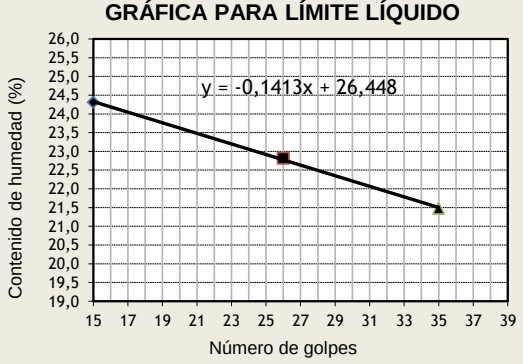

JUAN P. FLOREZ REVOLLO
Ing. Civil - Esp. en Geotecnia

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 01 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	23	8	2022	23	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	23	8	2022	23	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	23	8	2022	23	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	4	2023	23	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	4	2023	23	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100217190

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 500.000.000,00	23	8	2022	23	4	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100049452 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	01 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.09.08 16:48:44 -05:00

Código de Seguridad: 1rQy5BD8ejN1H/0ZLqNrXg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS20000000859-D001

No. PÓLIZA	NB-100217190	**No. ANEXO**	2	**No. CERTIFICADO**	71357226	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	08/09/2022	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	**TELÉFONO**	3114061089
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	**TELÉFONO**	7758011
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	**TELÉFONO**	7758011

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. LP-MSBV-006-2022. , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

ACLARAMOS BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/08/2022	24:00 Horas Del 23/08/2023	812.188.999,90	1.624.378,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 23/08/2022	24:00 Horas Del 23/08/2023	2.436.566.999,70	4.873.134,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/08/2022	24:00 Horas Del 23/04/2026	1.624.377.999,80	11.918.039,13
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/04/2023	24:00 Horas Del 23/04/2028	16.913.946,80	169.324,82
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 23/04/2023	24:00 Horas Del 23/04/2028	2.436.566.999,70	24.392.372,10
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.326.614.945,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	42.977.248,05
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	42.977.248,05
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.166.627,13
TOTAL A PAGAR	$	51.148.875,18

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA - AMP
Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71357226	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NIT. NO. 800.215.807-2

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ACLARAMOS QUE EL AMPARD DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72148565 PARTICIPACION 90%

GILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217190** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2 / MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2** , expedida por la Compañía en **08/09/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **08** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Scanned with CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.09.08 16:49:12 -05:00

Código de Seguridad: 4SysevY277o989KIqiySXg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSA0000000827-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71357231	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114861089
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114861089
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. LP-MSBV-006- 2022. MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72148565 PARTICIPACION 90%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	250,000,000.00	500,000,000.00	500.000.000,00	665.753,42
PATRONAL	150,000,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	150,000,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	150,000,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 500.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	665.753,42
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	665.753,42
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	127.443,15
TOTAL A PAGAR	$	798.196,57

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71357231	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

GILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
DOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF
Scanned with CamScanner

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/01/2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

FECHA DE INICIO: 24/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	.....	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	.....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	.....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	.....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS	Nombre:	Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO
Vial San Bernardo

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

DPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento

PÁGINA	1

DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	7	9	2022

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LP-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL:X** **PLAN No.1** **MODIFICACIÓN:**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANBERNARDO

REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

REP.LEGAL FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO

VR. CONTRATO:	8.121.889.999		PORCENTAJE DE ANTICIPO :	30,0%
VR. ANTICIPO:	1.350.000.000	1.350.000.000	% IMP. MUNICIPALES	0,0%
VR. IMPUESTOS:	0			
VR. ANTICIPO RECIBIDO:	0			

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Mano de Obra	100.000.000,00	7,41%	150.000.000,00	11,11%	49.200.000,00	3,64%	299.200.000,00	22,16%
2	Transporte de Materiales	340.800.000,00	25,24%	100.000.000,00	7,41%		0,00%	440.800.000,00	32,65%
3	Suministro de Materiales	300.000.000,00	22,22%	150.000.000,00	11,11%		0,00%	450.000.000,00	33,33%
4	Alquiler de equipos y herramientas	100.000.000,00	7,41%	60.000.000,00	4,44%		0,00%	160.000.000,00	11,85%
TOTAL		840.800.000,00	62,28%	460.000.000,00	34,07%	49.200.000,00	3,64%	1.350.000.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO
Representante Legal
Consorcio Vial San Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Interventor

Scanned with CamScanner

MEPI-MN1-IN-2-FR-2, INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN

MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3 **MES:** diciembre-2022 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15593 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 687-000021-91 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.350.000.000,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	AVANZAR CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	Mano de obra
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	INTEGRA2 SAS	$ 340.800.000,00	2	Transporte de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	356	6-oct-22	JANNE MIQUEL ROQUEME RAFAEL	$ 300.000.000,00	3	Suministro de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.	$ 100.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS	$ 199.200.000,00	1	Mano de obra
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	NTEGRA2 SAS	$ 100.000.000,00	2	Transporte de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS	$ 60.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	4	5-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 147.648.570,00	3	Suministro de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	5	19-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 2.351.000,00	3	Suministro de materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoria).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Mano de Obra	$ 299.200.000,00	$ 299.200.000,00	$ -	$ 299.200.000,00	$ -
2	Transporte de Materiales	$ 440.800.000,00	$ 440.800.000,00	$ -	$ 440.800.000,00	$ -
3	Suministro de Materiales	$ 450.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 149.999.570,00	$ 449.999.570,00	$ 430,00
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	$ -
	TOTALES	$ 1.350.000.000,00	$ 1.200.000.000,00	$ 149.999.570,00	$ 1.349.999.570,00	**$ 430,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (octubre) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 06-OCT-22 **Hasta:** 06-OCT-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1037647440
Fecha: 08-NOV-2022
Página: 1 de 1

Producto: 15593 P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 68700002217 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505510953

Tipo de Egreso: GZT GIRO A TERCEROS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
06-OCT-22	356	1	ROQUE RAFAEL JANNE MIGUEL		1538995. 2. GIRO A TERCEROS JMT	300,000,000.00	.00	Pagado		1538995

Total Tipo de Egreso:	300,000,000.00	.00
Total por Cuenta:	300,000,000.00	.00
Total por Moneda:	300,000,000.00	.00

Powered by CamScanner

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 06-OCT-22 **Hasta:** 06-OCT-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1037647440
Fecha: 08-NOV-2022
Página: 1 de 1

Producto: 15593 P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 68700002217 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505510953

Tipo de Egreso: GZT GIRO A TERCEROS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
06-OCT-22	670	2	INTEGRA2 SAS		1538998 YCAR OP 1 GIRO A TERCEROS	340,800,000.00	.00	Pagado		1538998
06-OCT-22	670	3	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS		1538998 YCAR OP 1 GIRO A TERCEROS	100,000,000.00	.00	Pagado		1538998
06-OCT-22	670	4	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS		1538998 YCAR OP 1 GIRO A TERCEROS	100,000,000.00	.00	Pagado		1538998
					Total Tipo de Egreso:	540,800,000.00	.00			
					Total por Cuenta:	540,800,000.00	.00			
					Total por Moneda:	540,800,000.00	.00			

Powered by CamScanner

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE	INTEGRA2 SAS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$147.648.570,00
IDENTIFICACIÓN	900773889		

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago
05/12/2022	4	*******2217	AHO	BANCOLOMBIA S.A	52600002619	AHO	BANCOLOMBIA S.A	$147.648.570,00	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$60.000.000,00
IDENTIFICACIÓN	901082056		

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago
29/11/2022	3	*******2217	AHO	BANCOLOMBIA	52600002511	AHO	BANCOLOMBIA	$60.000.000,00	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	INTEGRA2 SAS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$2.351.000,00
IDENTIFICACIÓN	900773889	**PAGADOR**	15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
19/12/2022	5	*******2217	AHO	BANCOLOMBIA S.A	52600002619	AHO	BANCOLOMBIA S.A	$2.351.000,00	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$199.200.000,00
IDENTIFICACIÓN	900707549		

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago
29/11/2022	3	*******2217	AHO	BANCOLOMBIA	16621863367	AHO	BANCOLOMBIA	$199.200.000,00	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE	INTEGRA2 SAS	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$100.000.000,00
IDENTIFICACIÓN	900773889		

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago
29/11/2022	3	*******2217	AHO	BANCOLOMBIA	52600002619	AHO	BANCOLOMBIA	$100.000.000,00	Transacción Exitosa**


Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

• Seguimiento Programa de Obra

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VÍA DEL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO**	**290 días**	**mar 23/08/22**	**mar 23/05/23**
2			INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 23/08/22	mar 23/08/22
3			**EXPLANACIONES**	**30 días**	**mar 20/09/22**	**mar 18/10/22**
4		600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco.	1 día	lun 17/10/22	mar 18/10/22
5		210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	29 días	mar 20/09/22	lun 17/10/22
6			**ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER DE 2.5X2.5 L=7M**	**12 días**	**vie 5/05/23**	**mar 16/05/23**
7		600.2.3	Excavaciones varias en materia común en seco a mano	1 día	sáb 6/05/23	dom 7/05/23
8			Demolición de estructuras	1 día	vie 5/05/23	sáb 6/05/23
9		201,6	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	1 día	dom 7/05/23	lun 8/05/23
10		630,6	Concreto clase C (280kg/cm2 ó 4000 PSI)	5 días	jue 11/05/23	mar 16/05/23
11		630,3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23
12		640,1	Relleno para Estructuras con material excavación	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23
13		610,1	Relleno para Estructuras con recebo	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23
14			**PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5.3M Y LONGITUD DE 5300M**	**144 días**	**mar 20/12/22**	**vie 5/05/23**
15		320.3	Subbase Granular Clase C.	35 días	lun 26/12/22	sáb 28/01/23
16		311,1	Afirmado (Material para Mejoramiento)	11 días	mar 20/12/22	sáb 31/12/22
17		630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	46 días	lun 13/02/23	mar 28/03/23

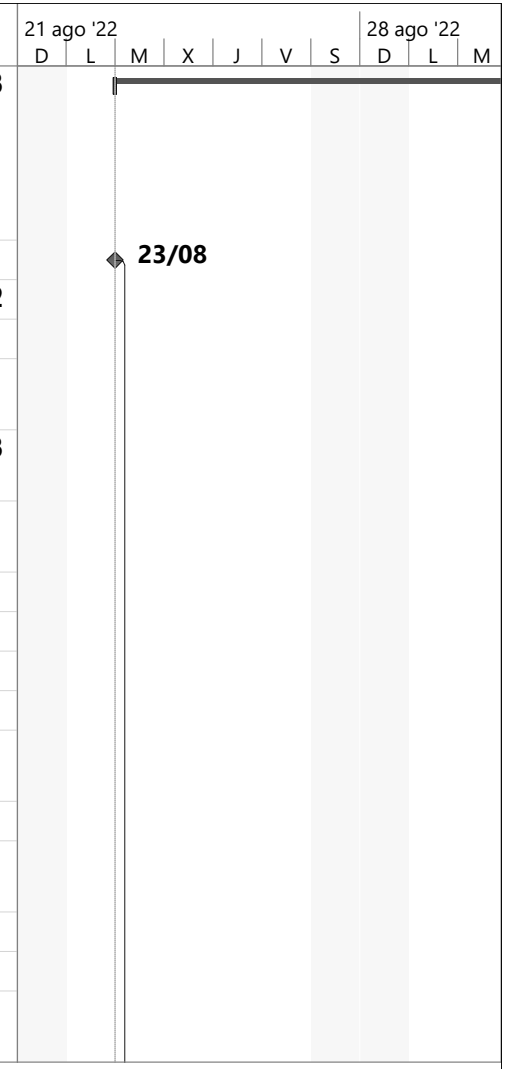


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea — Resumen — Hito externo — División crítica
División — Tarea inactiva — Fecha límite — Progreso
Hito — Tareas externas — Tareas críticas — Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18		630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	36 días	dom 29/01/23	sáb 4/03/23
19		630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	44 días	vie 24/03/23	vie 5/05/23
20		640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	46 días	mié 4/01/23	vie 17/02/23
21		630.7	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	29 días	mar 28/02/23	lun 27/03/23
22			**TRANSPORTE**	**78 días**	**lun 17/10/22**	**vie 30/12/22**
23		900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	78 días	lun 17/10/22	vie 30/12/22
24			**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**10 días**	**sáb 13/05/23**	**mar 23/05/23**
25			Caracterización del corredor	10 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23
26			**REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**290 días**	**mar 23/08/22**	**mar 23/05/23**
27			REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mar 23/08/22	mar 20/09/22
28			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	10 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23
29			FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23

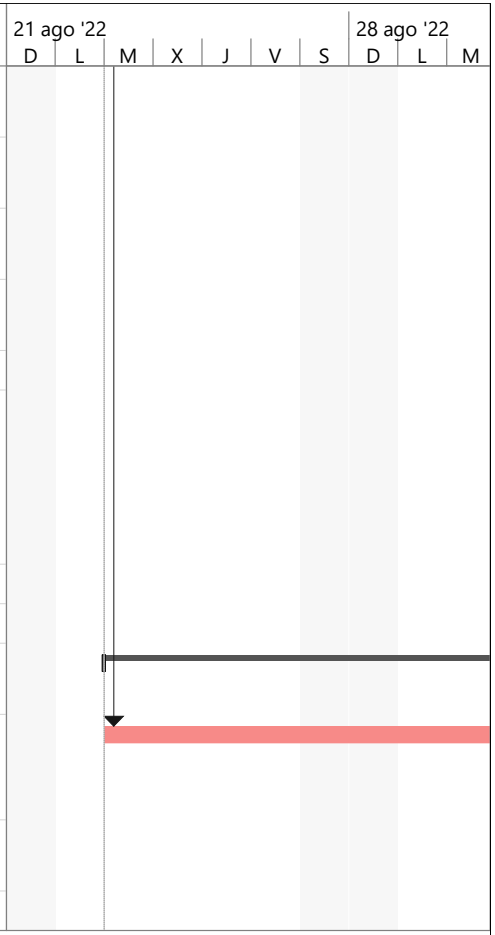


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea
División
Hito
Resumen
Tarea inactiva
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

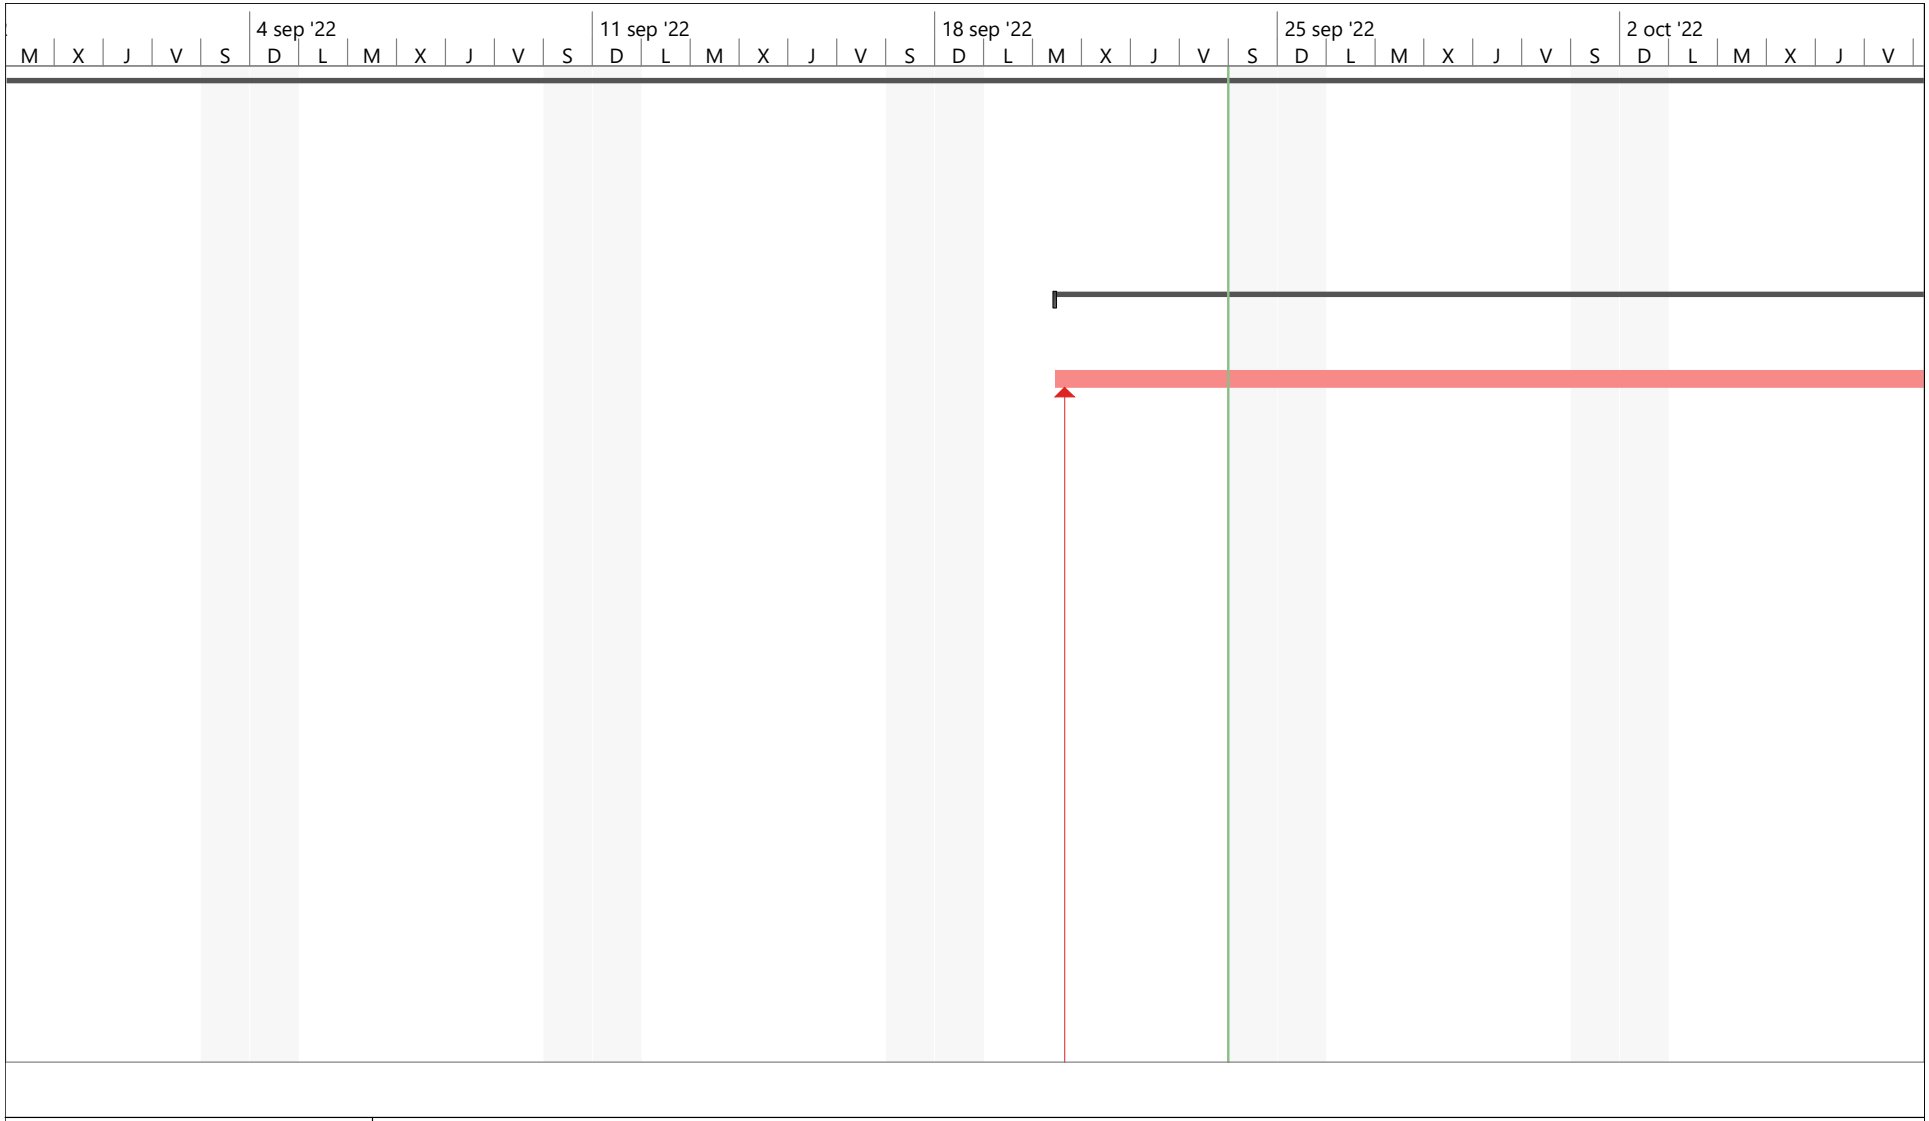


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

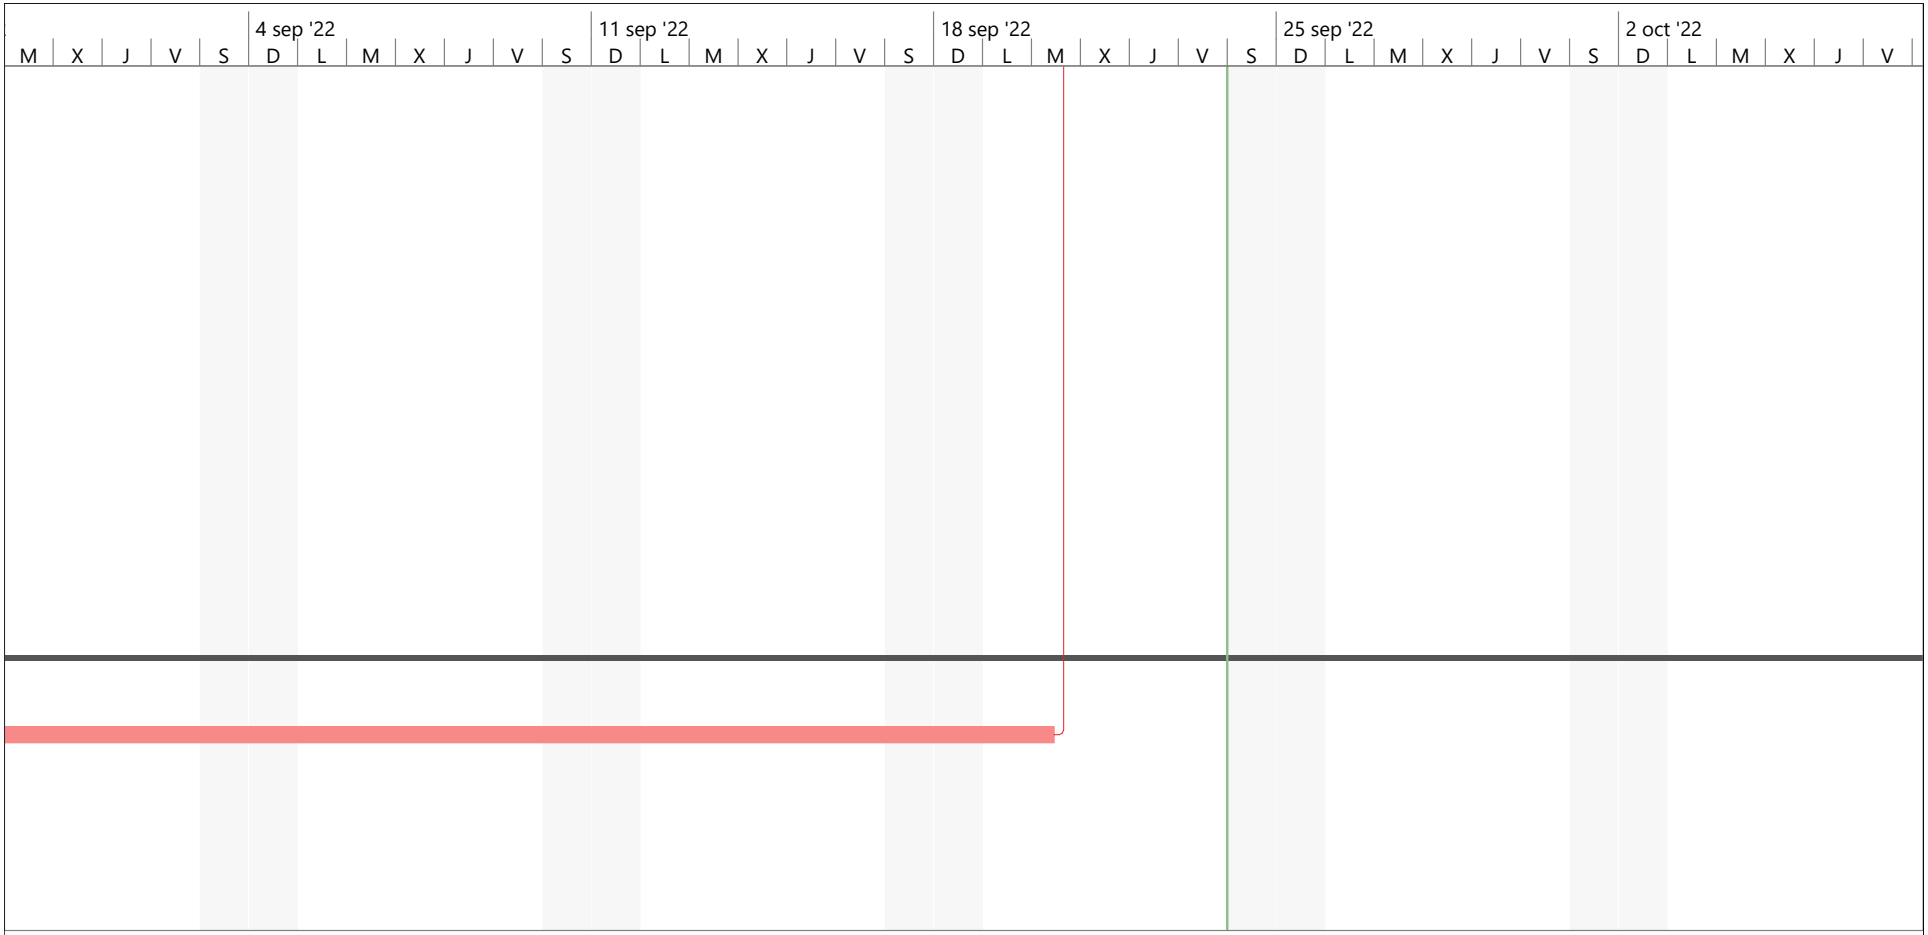


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

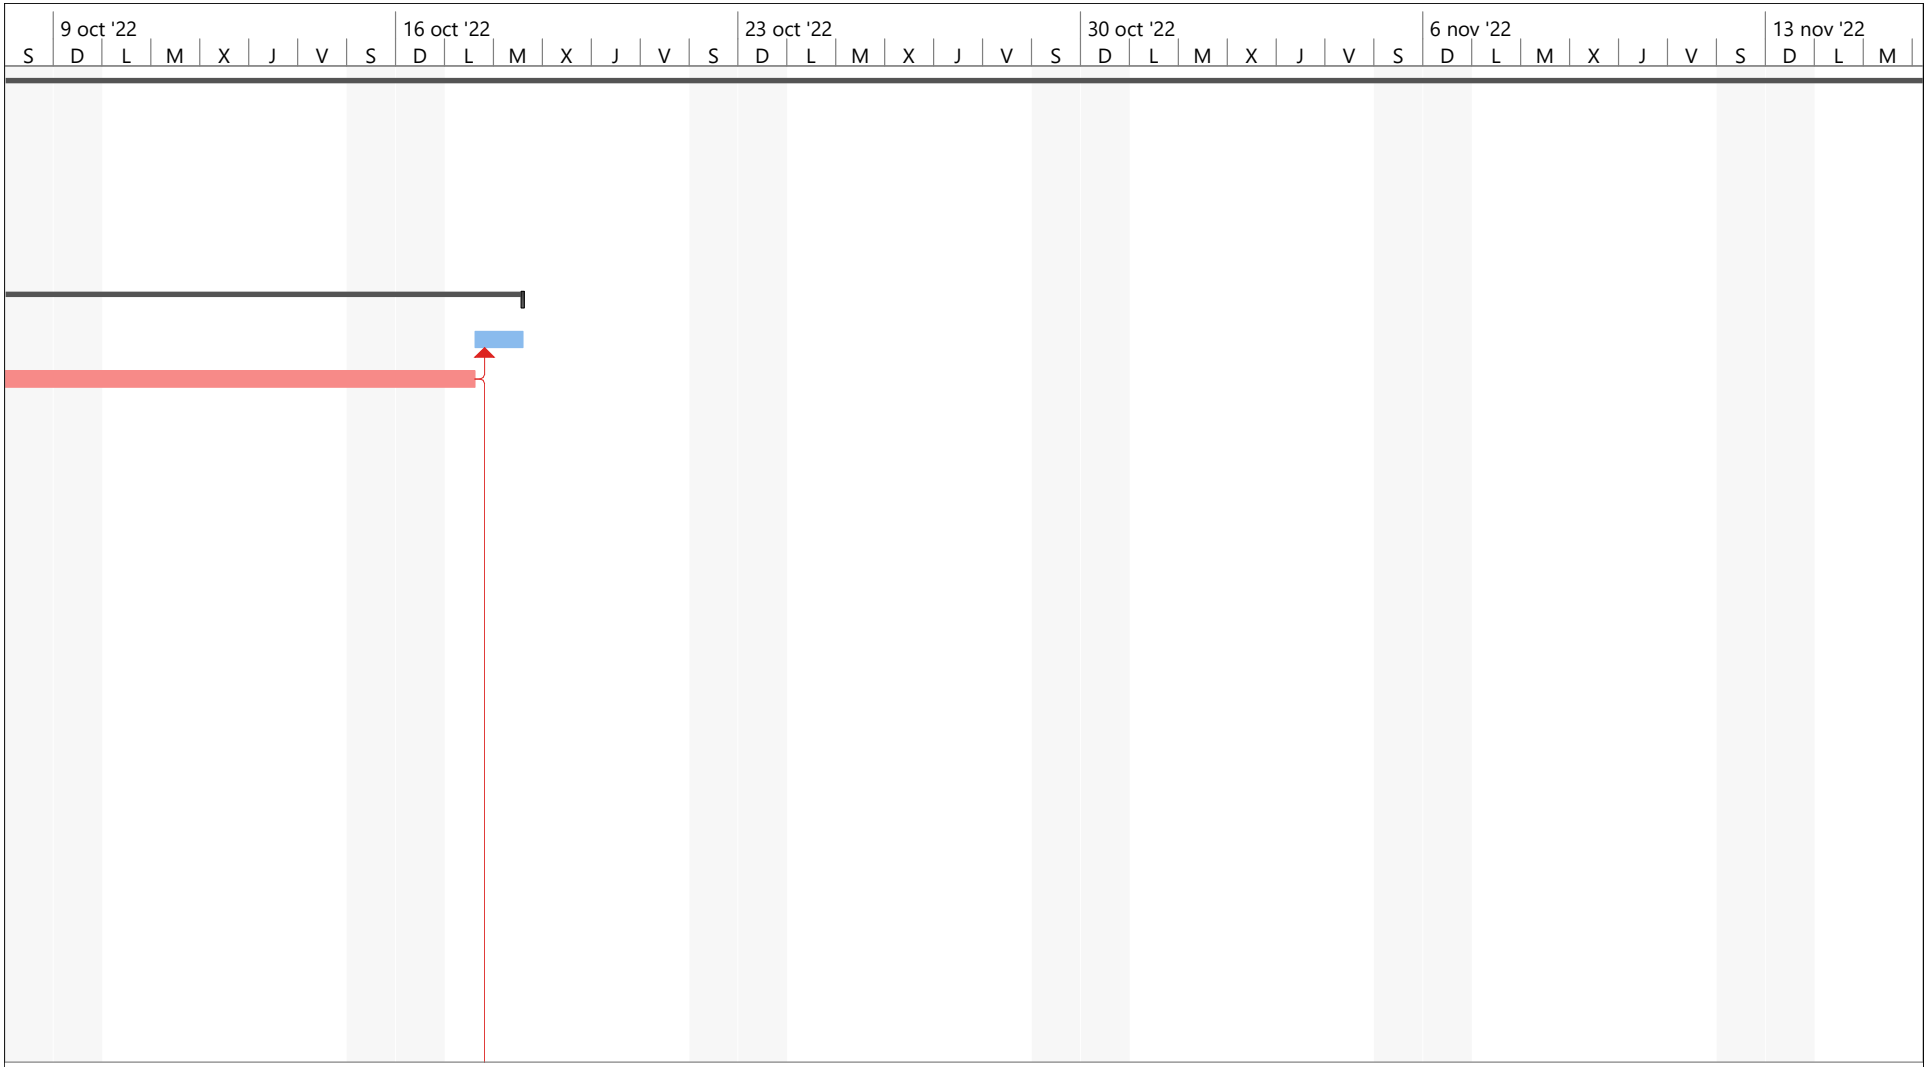

PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo




PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

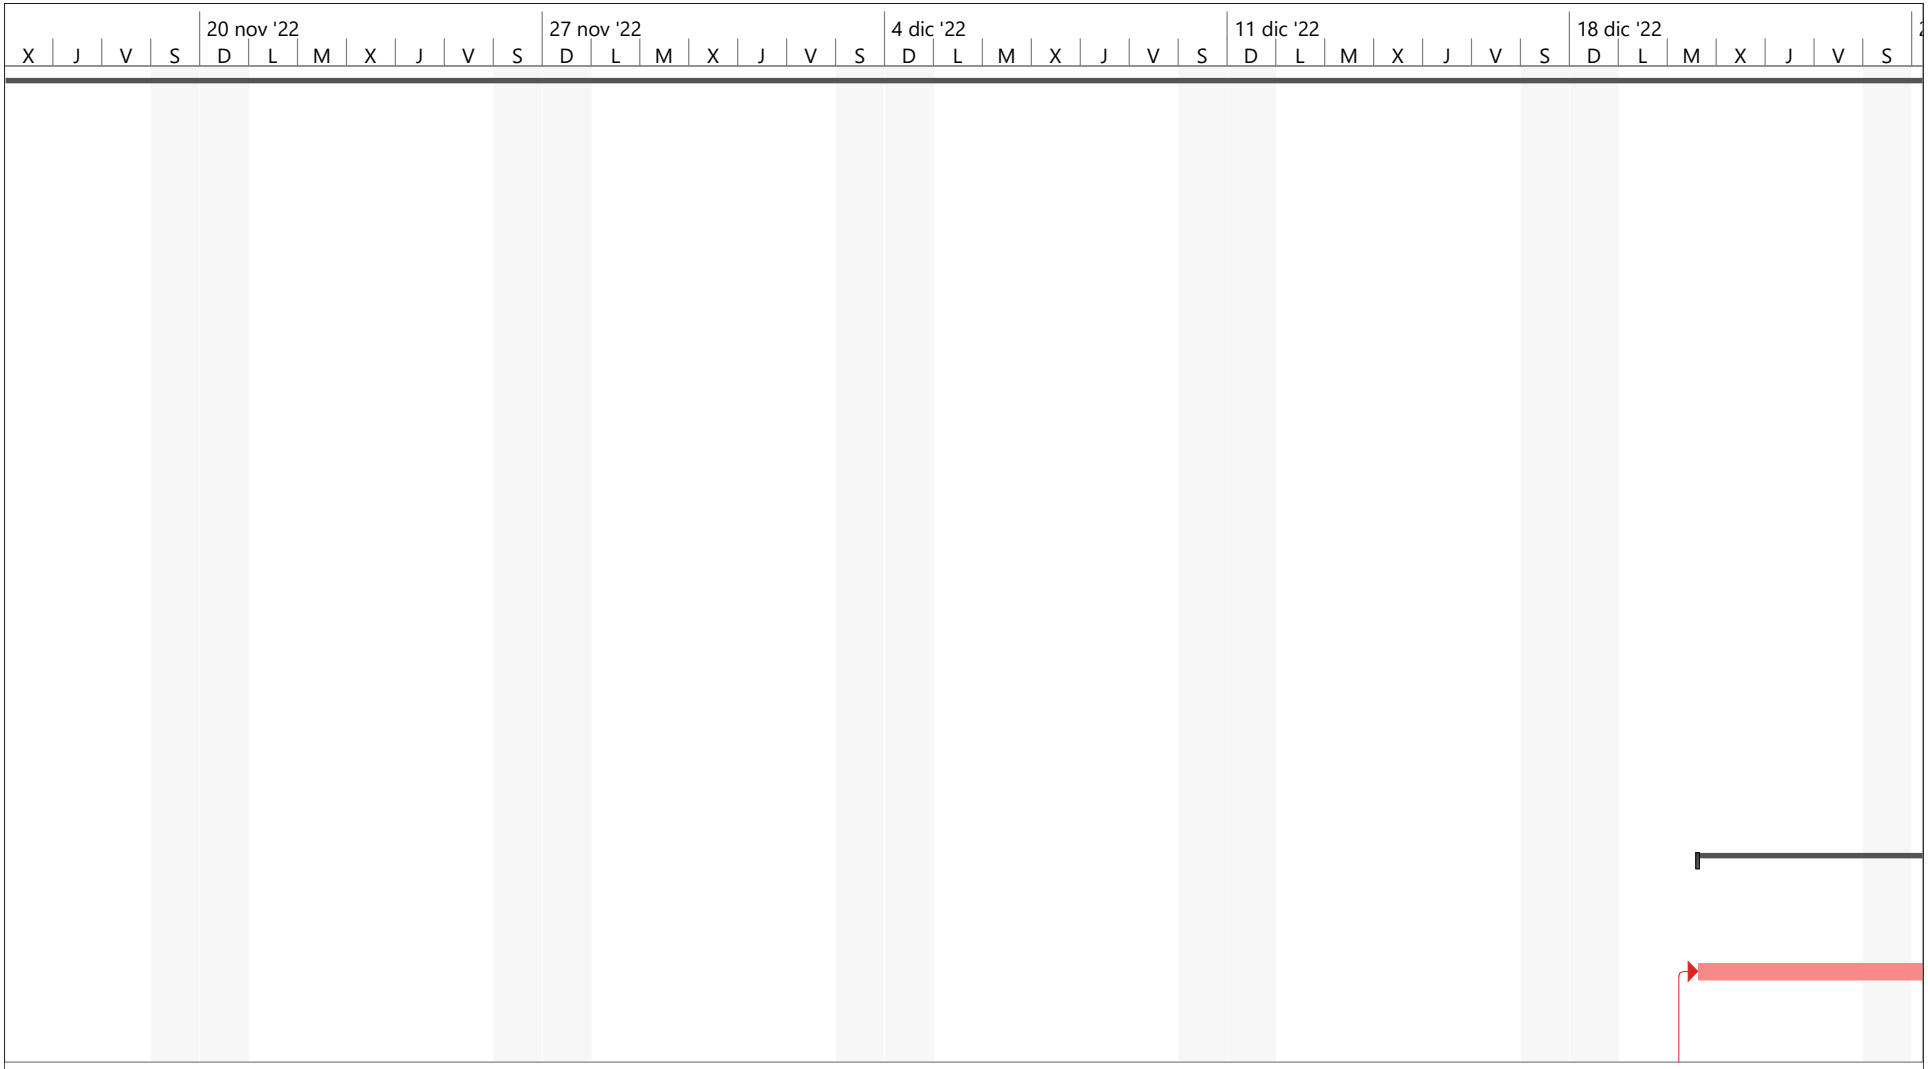


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

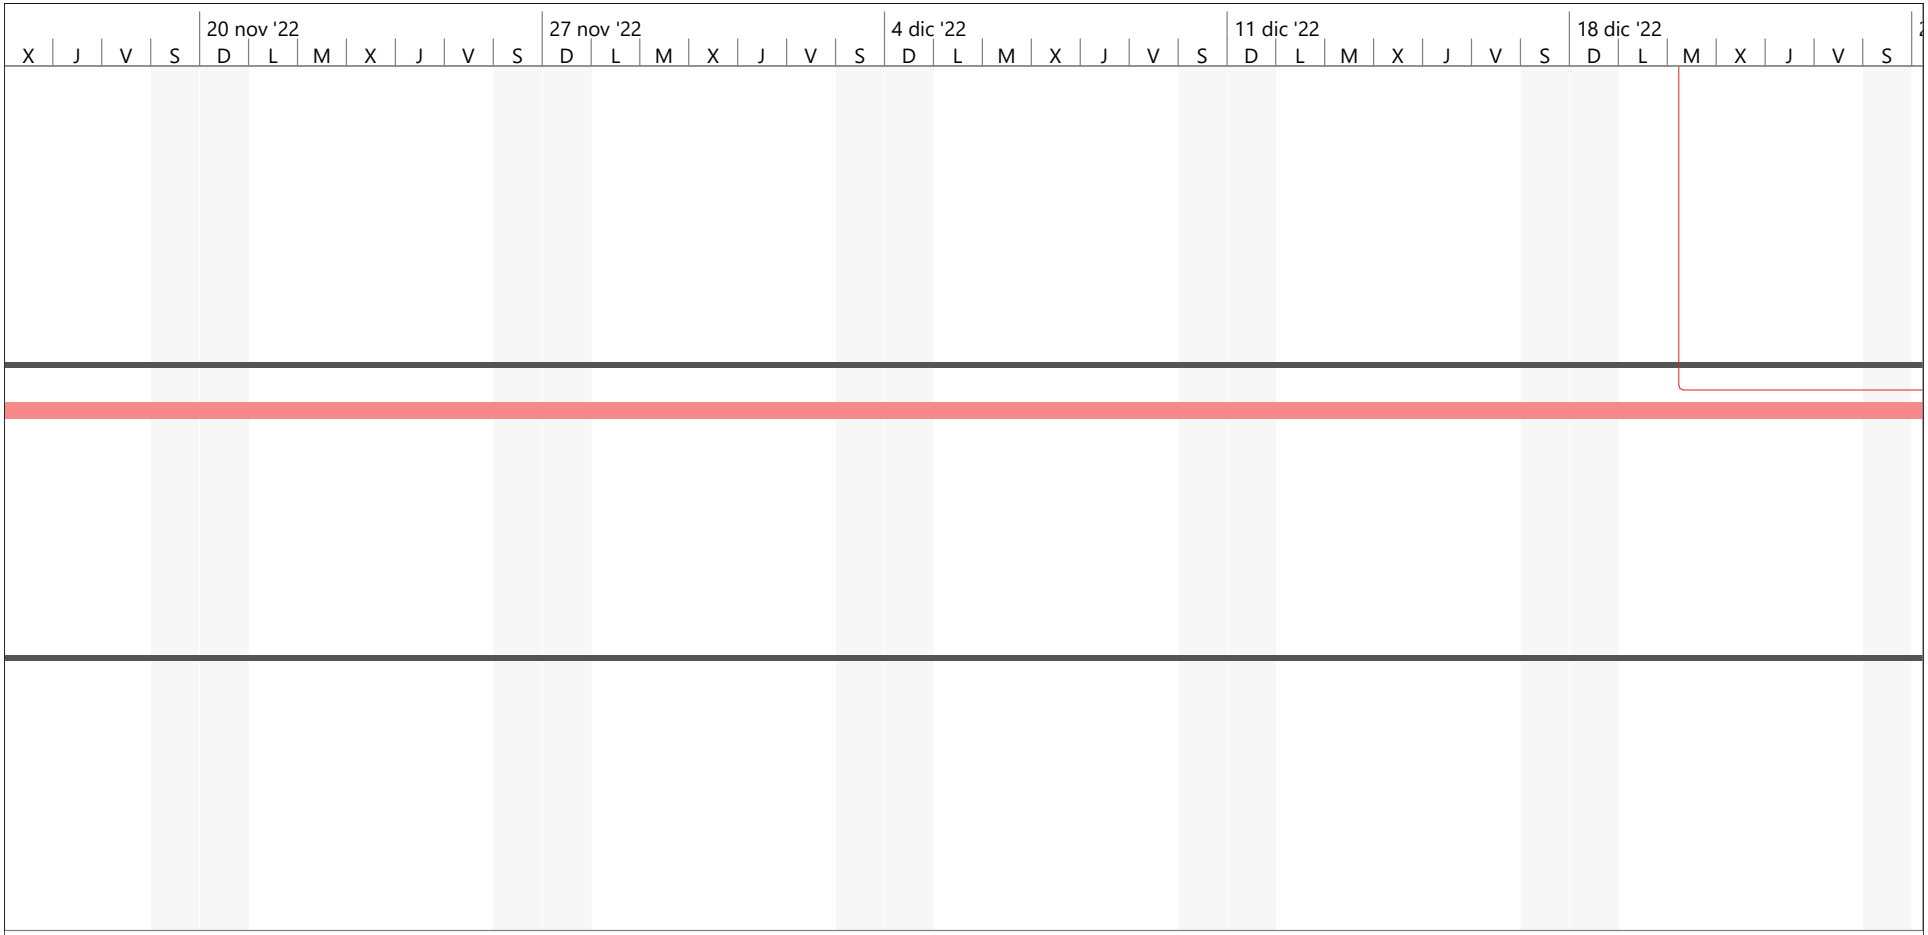


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

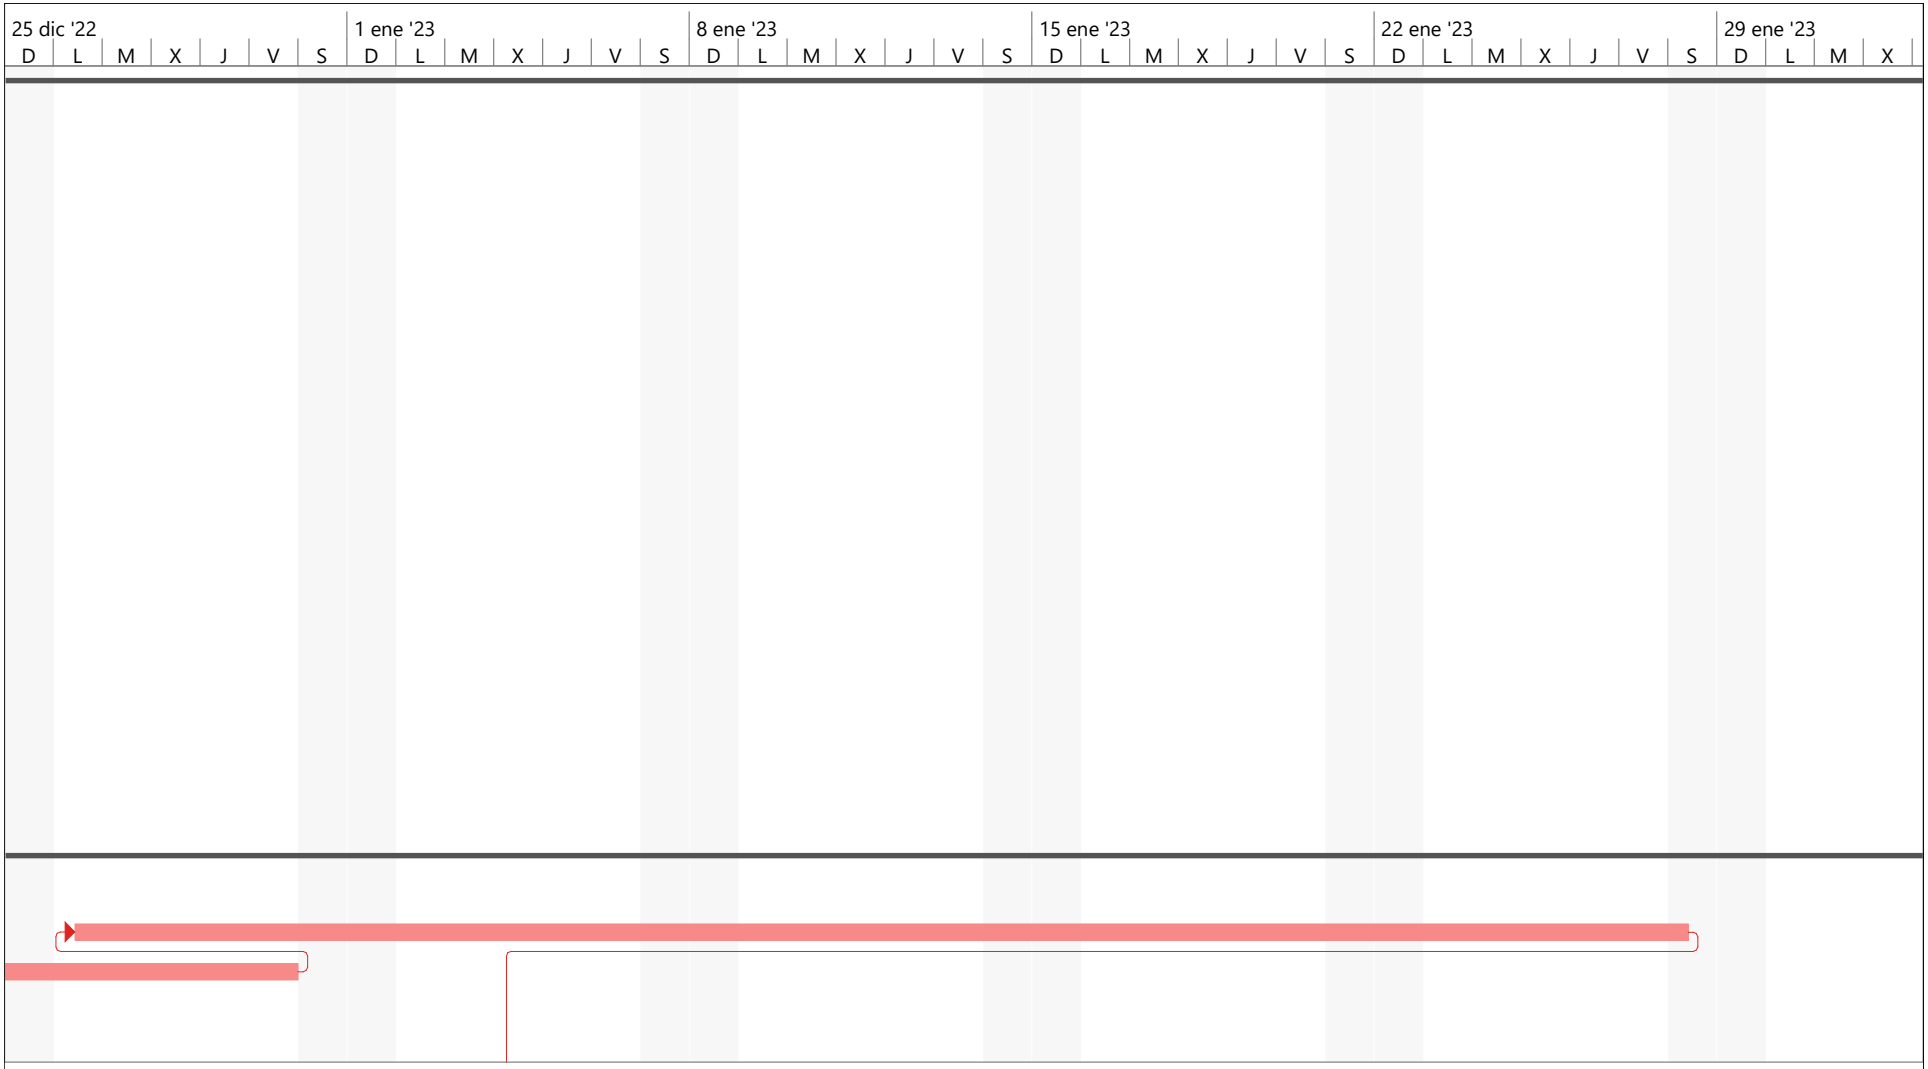

PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo



PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo




PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

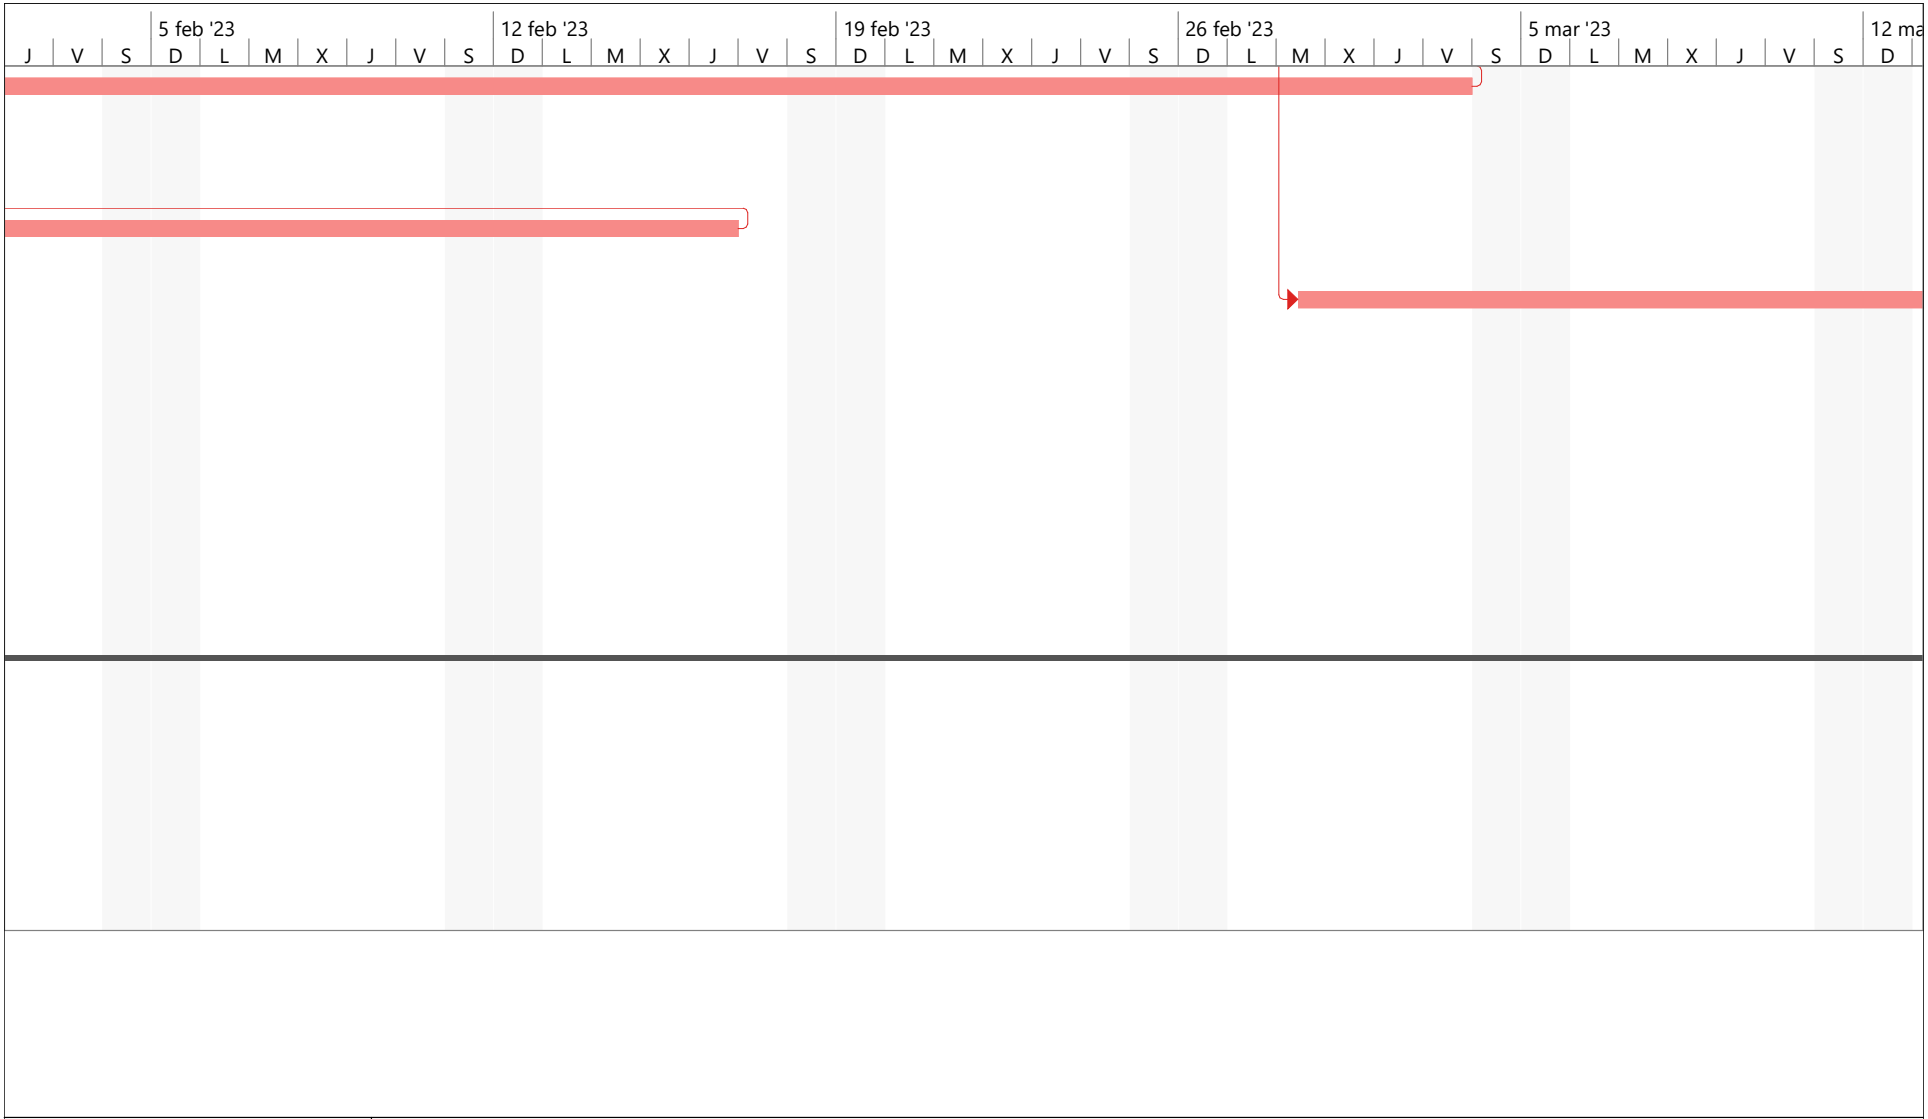


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

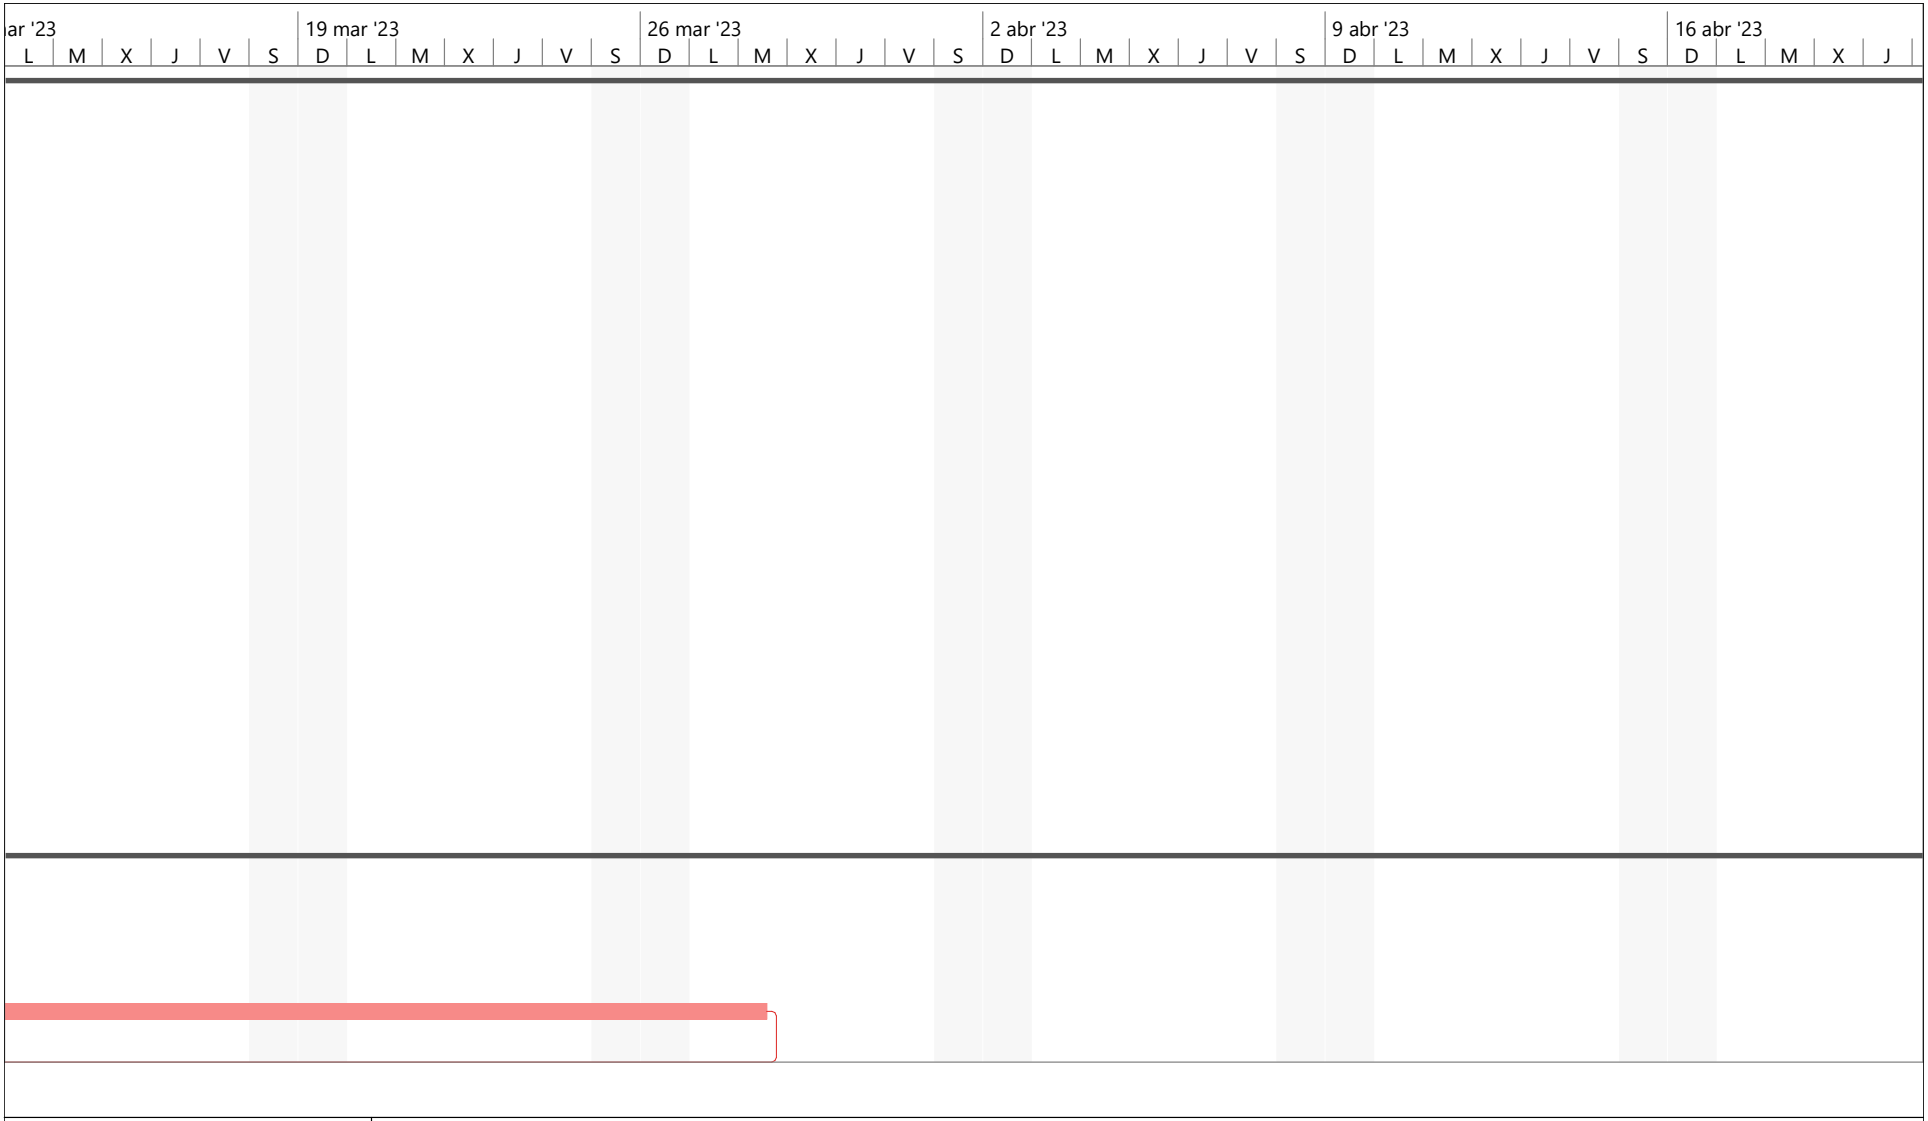


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

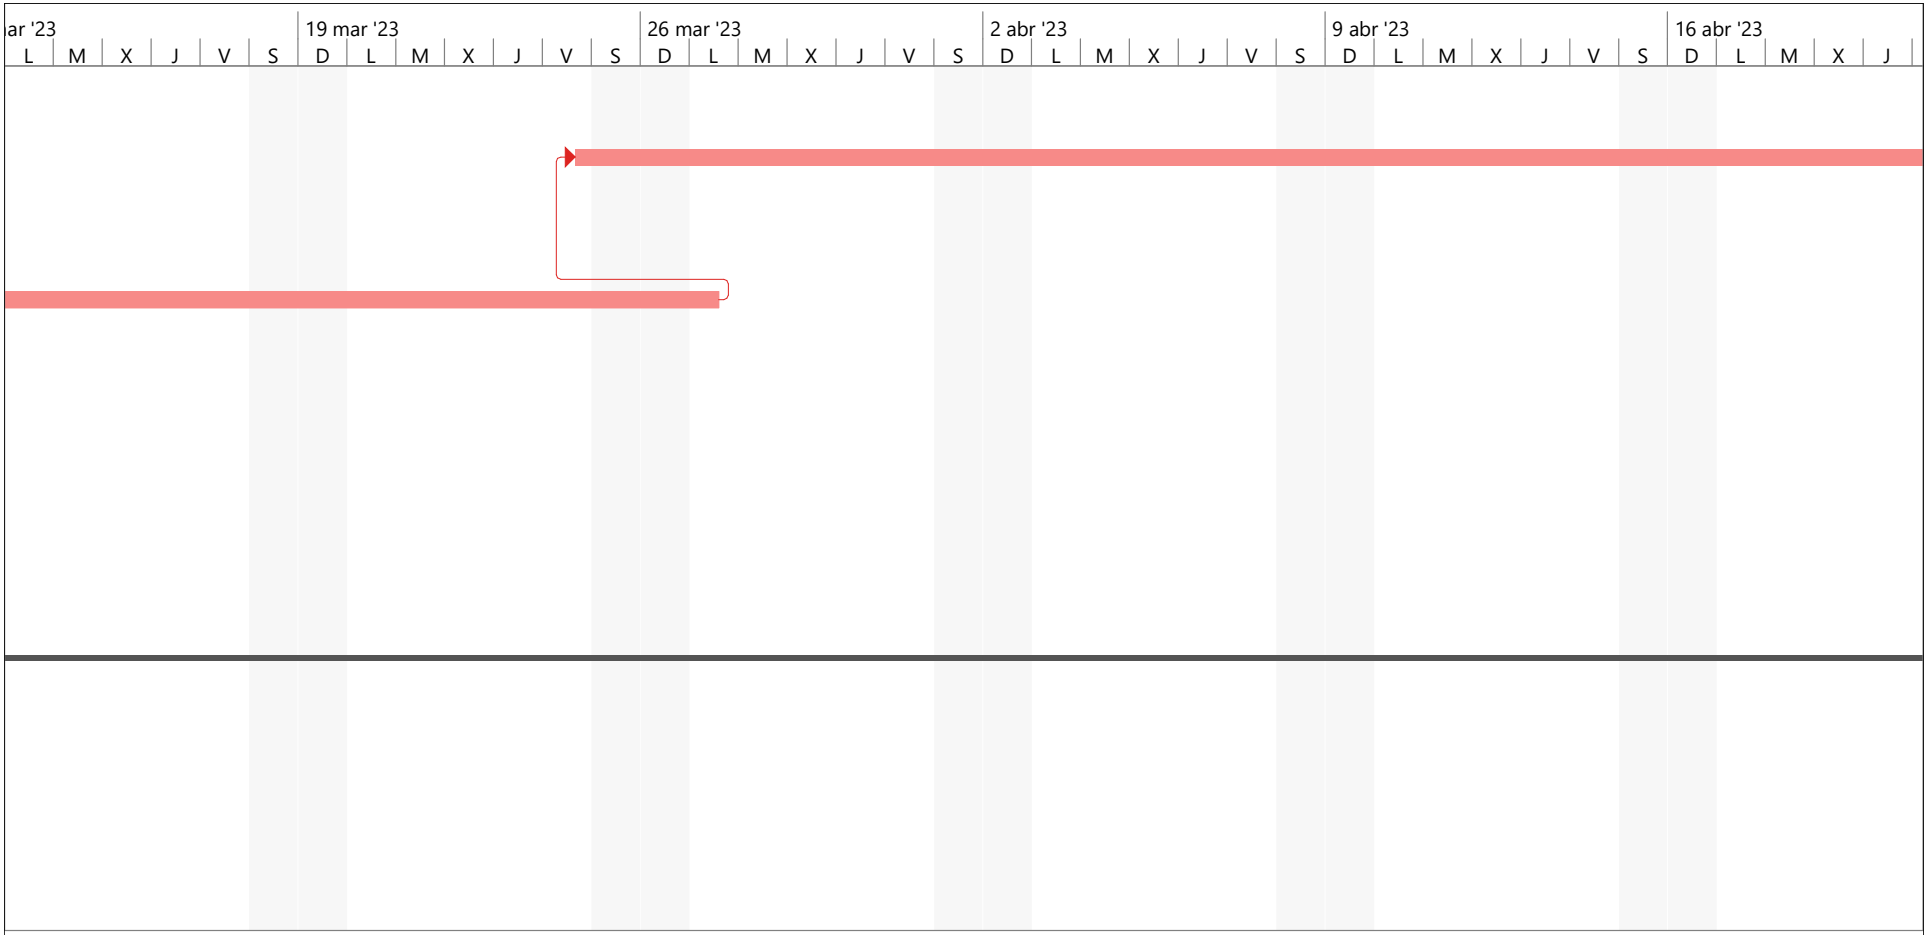


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

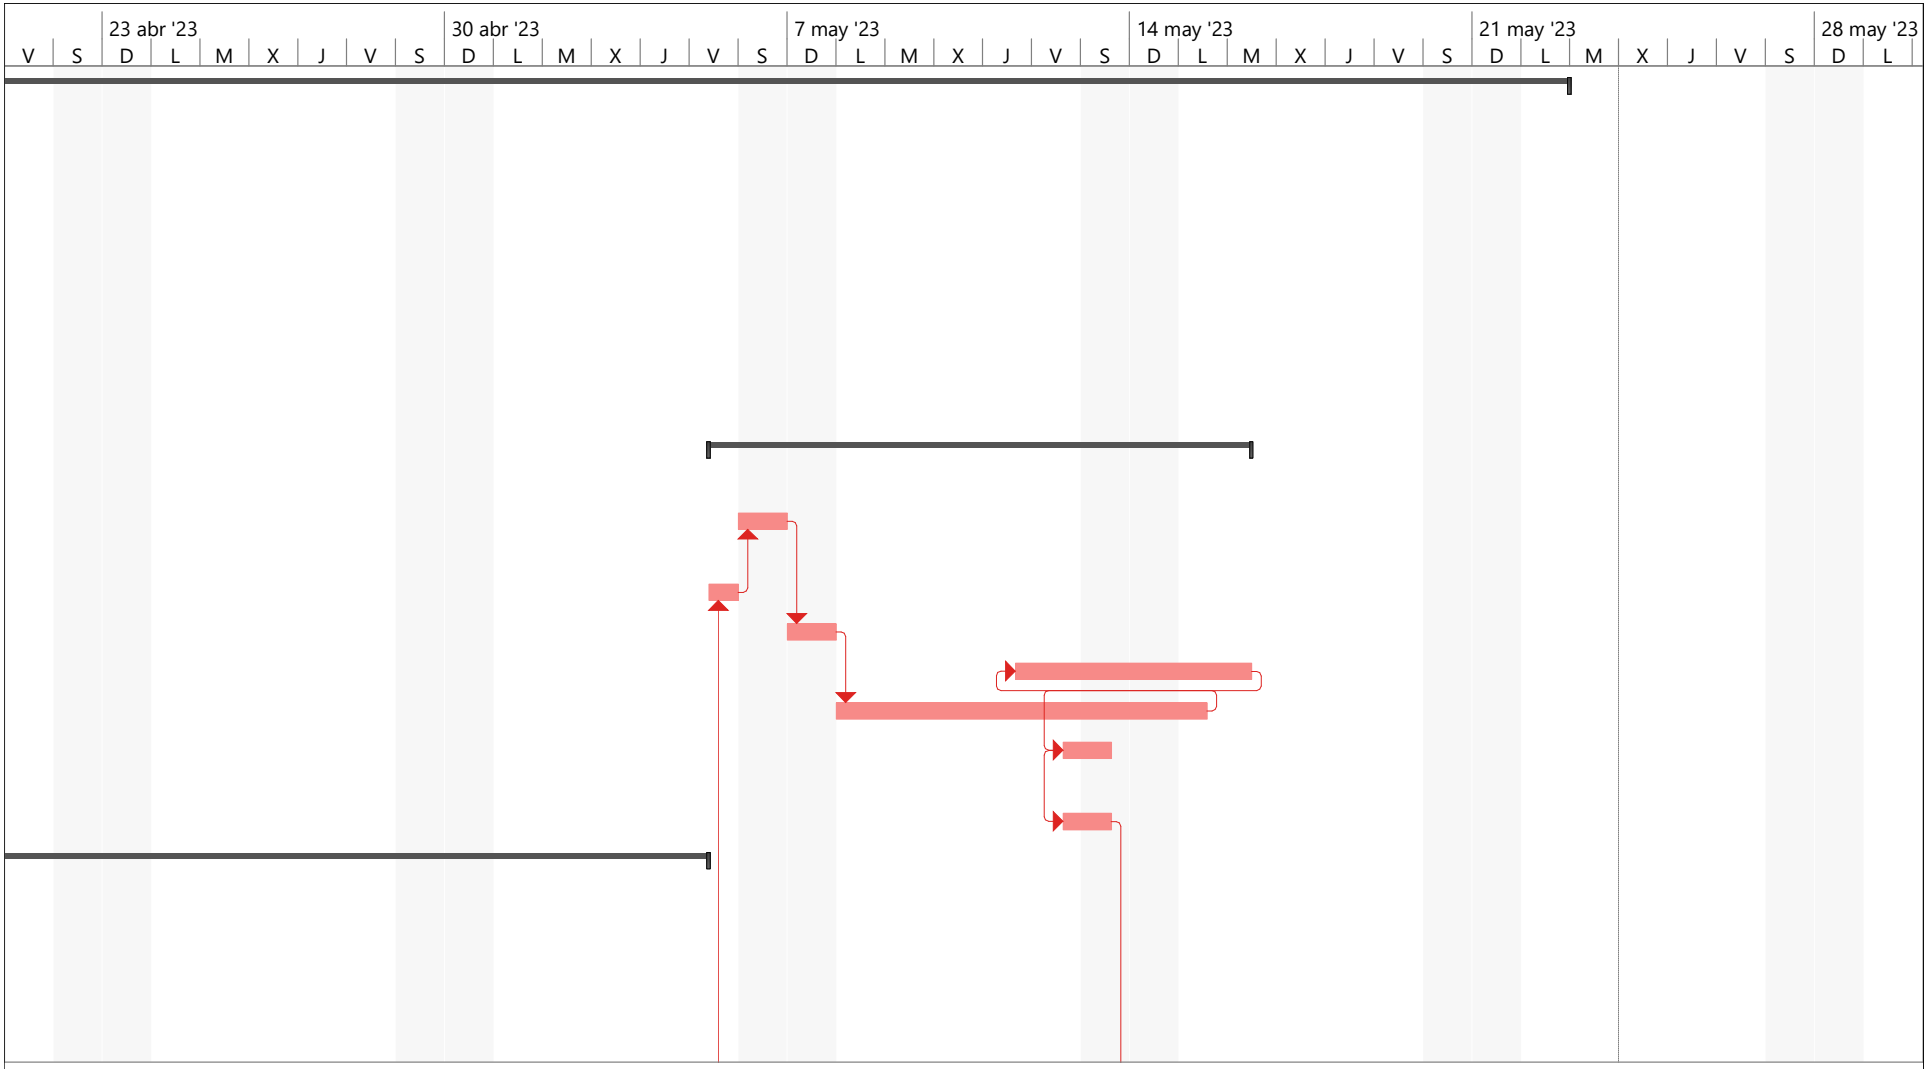


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

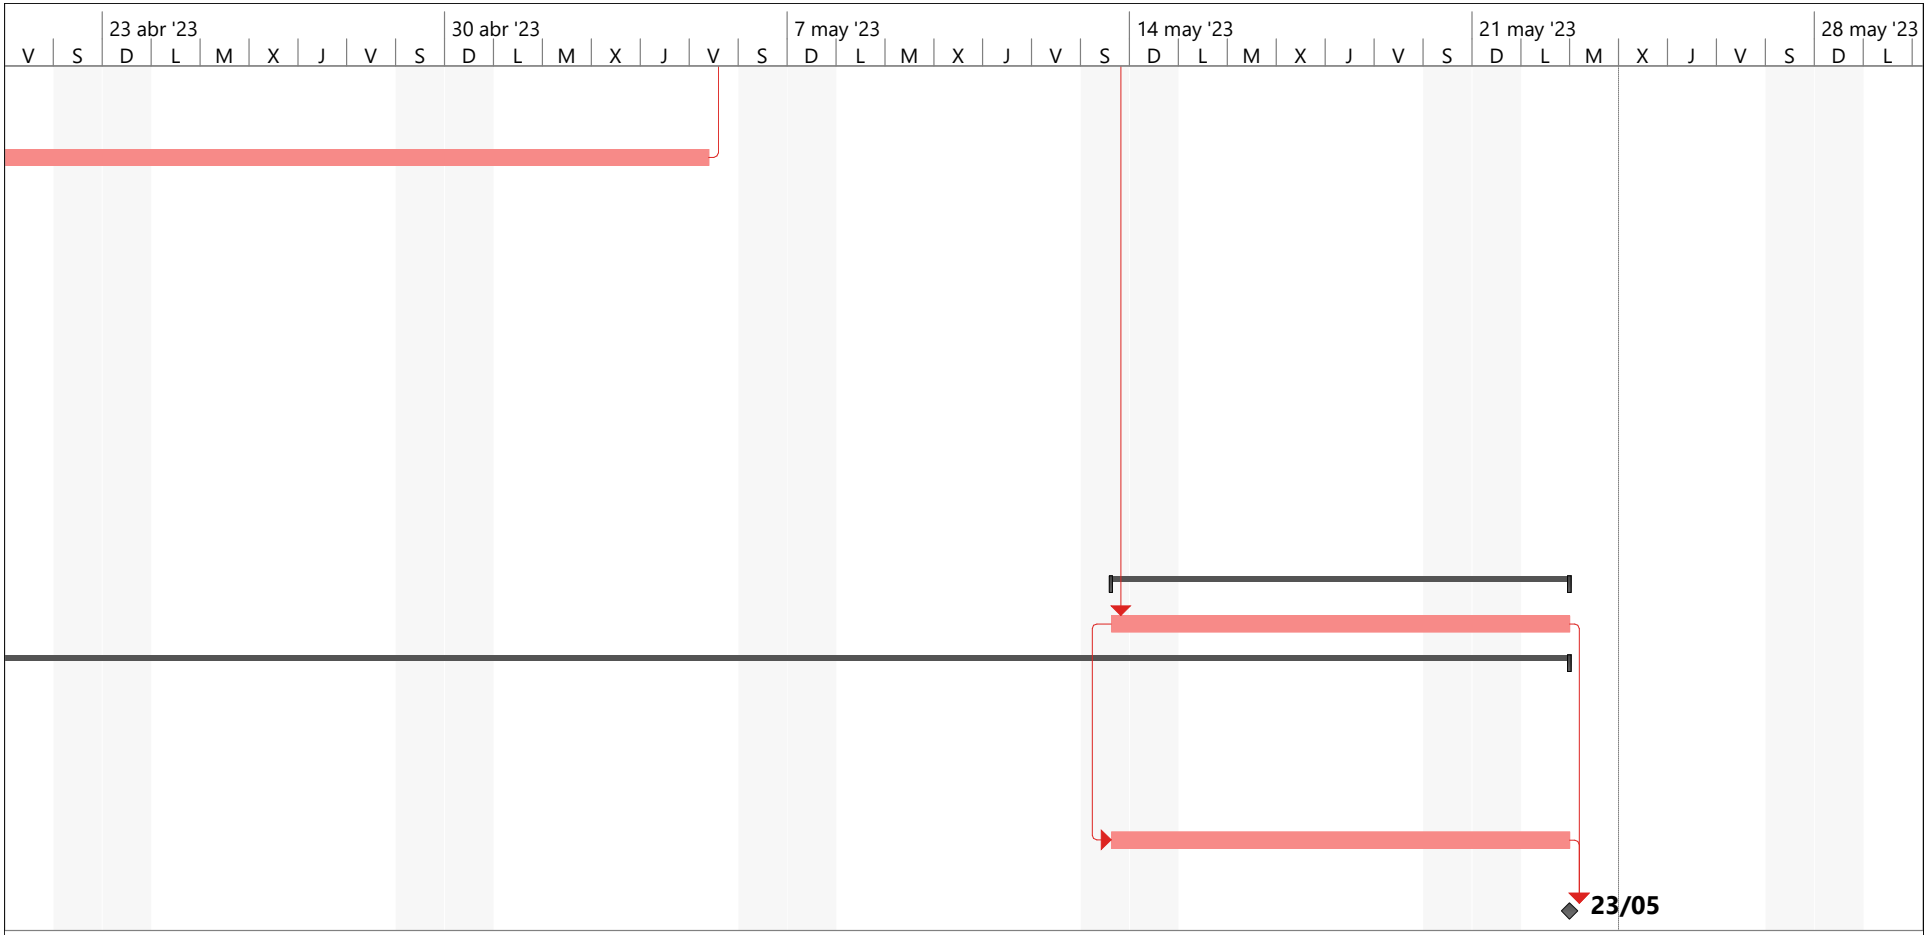

PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MSBV-006-2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023	8 marzo/2023	9 abril/2023	
EXPLANACIONES	$ 100.839,10	1,26%	0%	% P			0,13%	0,36%	0,36%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P			$ 10.804,19	$ 28.811,17	$ 28.811,17	$ 32.412,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
BOX CULVERT 2,5X2,5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$ 106.553,21	1,33%	0%	% P			0,05%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P			$ 4.198,99	$ 102.354,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,3 M Y LONGITUD DE 5300 M	$ 7.527.098,90	93,90%	0%	% P			0,00%	13,08%	19,57%	21,81%	21,68%	15,10%	2,67%	
				$ P			$ 0,00	$ 1.048.163,89	$ 1.568.682,18	$ 1.748.189,24	$ 1.737.908,16	$ 1.210.239,74	$ 213.915,67	
				$ E										
				% E										
TRANSPORTE	$ 278.203,61	3,47%	0%	% P			0,12%	0,99%	0,99%	1,24%	0,12%	0,00%	0,00%	
				$ P			$ 9.935,84	$ 79.486,75	$ 79.486,75	$ 99.358,43	$ 9.935,84	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00	0,05%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
				$ P			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.710,00	
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 8.016.404,82**	**100%**	**0%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,92%	23,45%	21,80%	15,10%	2,71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.939,03	$ 1.258.816,02	$ 1.676.980,10	$ 1.879.960,26	$ 1.747.844,00	$ 1.210.239,74	$ 217.625,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	16,01%	36,93%	60,38%	82,19%	97,29%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.939,03	$ 1.283.755,05	$ 2.960.735,15	$ 4.840.695,41	$ 6.588.539,41	$ 7.798.779,15	$ 8.016.404,82	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00 / $ -	$ -	%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00 / $ -	$ -	%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.184,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** _____

SEGUIMIENTO No. 5
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-MSBV-006-2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8.121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023	8 marzo/2023	9 abril/2023	
EXPLANACIONES	$ 100.839,10	1,26%	0,39%	% P			0,13%	0,36%	0,36%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	
			$31.071	$ P			$ 10.804,19	$ 28.811,17	$ 28.811,17	$ 32.412,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E				$24.260	$6.810,75					
				% E				0,30%	0,08%					
BOX CULVERT 2,5X2,5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$ 106.553,21	1,33%	0,00%	% P			0,05%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			$0	$ P			$ 4.198,99	$ 102.354,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,3 M Y LONGITUD DE 5300 M	$ 7.527.098,90	93,90%	3,53%	% P			0,00%	13,08%	19,57%	21,81%	21,88%	15,10%	2,67%	
			$283.276	$ P			$ 0,00	$ 1.048.163,89	$ 1.568.682,18	$ 1.748.189,26	$ 1.737.908,16	$ 1.210.239,74	$ 213.915,67	
				$ E				$194.940,85	$88.336					
				% E				2,43%	1,10%					
TRANSPORTE	$ 278.203,61	3,47%	0,58%	% P			0,12%	0,99%	1,24%	1,24%	0,12%	0,00%	0,00%	
			$46.414	$ P			$ 9.935,84	$ 79.486,75	$ 79.486,75	$ 99.358,43	$ 9.935,84	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E				$1.250	$45.163,74					
				% E				0,02%	0,56%					
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00	0,05%	0,00%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
			$0	$ P			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.710,00	
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 8.016.404,82	100%	4,50%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 360.761,26											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,92%	23,45%	21,80%	15,10%	2,71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$24.939	$1.258.816	$1.676.980	$1.879.960	$1.747.844	$1.210.240	$217.626	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	16,01%	36,93%	60,38%	82,19%	97,29%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$24.939	$1.283.755	$2.960.735	$4.840.695	$6.588.539	$7.798.779	$8.016.405	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	1,75%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$220.451,13	$140.310,12					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	4,50%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$220.451,13	$360.761,26					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00 $ -	$ -	0%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ -	0%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00	$ -	0%
	$ - $ -	$ -	0%
	$ - $ -	$ -	0%
	$ - $ -	$ -	0%
	$ - $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.184,00	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 360.761.256,00**	**4,50%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

FECHA: 27/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Implementación de Plan de contingencia: Cumplió
Entregar soportes de seguridad social: Cumplió
Entregar Caracterización de los materiales de Afirmado, Cantera el Esfuerzo: Cumplió
Entregar los formatos de donación del material correspondientes ala entrega a la Comunidad.: Cumplió
Entregar Actas de Vecindad del Proyecto: Cumplió
Entregar los Rendimientos financieros : Cumplió
Entregar Aprobacion del PMT del proyecto: Cumplió
Realizar Reunión con los Especialistas estructurales , definir el tema de las obras de arte "Alcantarillas"

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1.Seguimiento y aprobación del componente PAGA, componente hidráulico e hidrológico
2.Avance en la ejecución de la obra
3. Plan de contingencia
4. Reinicio de de actividades
5. Valla informativa

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1.Seguimiento y aprobación del componente PAGA, componente hidráulico e hidrológico: El contratista presento ala interventoría, el Documento del PAGA, La interventoría manifiesta que realizo observaciones a la paga emitida por el contratista y está a la espera que se subsanen las observaciones realizadas

2.Avance en la ejecución de la obra: Avance en la ejecución de la obra.

El contrato de obra presenta una programación ejecutada del 4,20 % versus una programación programada del 33,3% lo que representa un atraso en obra del 29,13%, ante lo anterior interventoría le solicita al contratista que implemente un plan de contingencia que ayude a nivelar la programación mediante la mejora de los rendimientos en obra. Se deja constancia por parte de la Interventoría que ya se radicó la solicitud de recomendación de apremio de multa ante el municipio por el atraso a la programación de la obra.

3.Seguimiento al Plan de contingencia

El contratista presento plan de continencia y reprogramación de obra, la interventoría manifiesta que se encuentra en revisión; sin embargo, se le solicita al contratista entregar el flujo de fondos de la programación presentada

4. Reinicio de actividades: el contratista manifiesta que ha venido acatando la recomendación que realizo la interventoría, y ha venido acopiando material, para mitigar el cierre temporal de la cantera el esfuerzo, puesto que esta suspenderá actividades del día 30 de diciembre de 2022, por lo cual se reiniciaran las obras por parte del contratista el día 4 de enero del 2023

5.Valla informativa. A la fecha el INVIAS no ha entregado el diseño o arte definitivo de la valla informativa, por lo que el contratista no ha podido mandarla a realizar.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar respuesta a las observaciones del documento P.A.G.A	29/12/2022	Contratista
Entregar respuesta a las observaciones al componente Hidráulico, hidrológico	30/12/2022	Contratista
Entregar flujo de fondos de la re programación de obra presentada por el contratista	28/12/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/12/2022
(Día / Mes / Año)





NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	Representante Legal	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisor contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ	Secretario de Infraestructura - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **ACTAS DE REUNIÓN**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Avance y ejecucion del Contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Revision de los compromisos Realizados
2.Avance y ejecucion del contrato
3. Seguimiento ala seguridad social de contrato
4.Caracterizacion del material
5. Equipo minimo Requerido
5. Valla del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de lo compromisos Realizados:
Entregar caracterización de los materiales de afirmado y Subbase: No cumplió
Entregar los soportes de seguridad social asociado al personal administrativo y técnico del contrato: NO cumplió
Entregar la localización del punto de atención al usuario para su aprobación: cumplió

2. Avance del contrato de obra LP-MSBV-006-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado correspondiente al 6,33 %, un ejecutado del 1,06 %, lo cual representa un atraso del 19,30 %, por consiguiente, se les informa que esta interventoría procedió a recomendar al Municipio de San Bernardo del Viento, iniciar el proceso de apremios de multas, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-MSBV-006-2022.

3. Actividades realizadas:
El contratista a pesar de que se iniciaron las actividades de excavación, relleno con afirmado, e instalación de subbase, por lo que no se logró alcanzar la meta propuesta en la semana, también manifiesta el compromiso de continuar con el plan de acción de aumentar las actividades el fin de semana, una vez las condiciones climáticas lo permitan.

4.fuente de materiales: la interventoría reitera al contratista dar cumplimiento de los compromisos pactados y entregar las correcciones presentadas a los materiales presentados como lo son material para afirmado y subbase granular ya que estos no cumplen y no ha sido aprobados por esta interventoría, además es de aclarar que es de responsabilidad del contratista incumpla con la calidad del material este será removido en obra, por lo que se recomienda acatar las observaciones y darle tramite lo más pronto posible

5. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra del mes de noviembre que ala fecha no se han remitido la interventoría, es de recordar que el incumplimiento de esta, conlleva al que se solicite la respectiva multa.

6. Equipo mínimo Requerido: el contratista no presenta en obra el carrotanque para garantizar la humedad optima de los materiales como afirmado y subbase en el proceso de compactación, por lo que se le solicita al contratista dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y así mismo garantizar el equipo mínimo requerido por el proyecto.

7. Valla del proyecto: la interventoría reitera que a la fecha no se tiene el diseño de arte definitivo por para del INVIAS, debió a las modificaciones de Cambio de gobierno, pero solicita al contratista instalar la Estructura donde se va instalar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7/12/2022
	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entregar caracterizacion de los materiales de afirmado y Subbase	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista
Traer carrontanque para dar cumplimiento al equipo minimo requerido	martes, 13 de diciembre de 2022	Contratista
Instalar estructura para valla del proyecto.	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 16/12/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
DAYANA GONZALEZ	AUX. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
EVER LEONARDO OLIVA RHENALS	AUX. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Avance y ejecucion del Contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Revision de los compromisos Realizados
2.Avance y ejecucion del contrato
3. Seguimiento ala seguridad social de contrato
4.Caracterizacion del material
5. Equipo minimo Requerido
5. Valla del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Revisión de lo compromisos Realizados:
Entregar caracterización de los materiales de afirmado y Subbase: cumplió
Entregar los soportes de seguridad social asociado al personal administrativo y técnico del contrato: NO cumplió
Entregar la localización del punto de atención al usuario para su aprobación: No cumplió
Traer carrontanque para dar cumplimiento al equipo minimo requerido: Cumplio
Instalar estructura para valla del proyecto: No cumpio

2. Avance del contrato de obra LP-MSBV-006-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado correspondiente al 28,67 %, un ejecutado del 3,48 %, lo cual representa un atraso del 25.19 %, por consiguiente, se les informa que esta interventoría procedió a recomendar al Municipio de San Bernardo del Viento, iniciar el proceso de apremios de multas, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-MSBV-006-2022.

3. Actividades realizadas:
El contratista a pesar de que se iniciaron las actividades de excavación, retiro de material de excavacion y relleno con afirmado, por lo que no se logró alcanzar la meta propuesta en la semana, también manifiesta el compromiso de continuar con el plan de acción de aumentar las actividades el fin de semana.

4.fuente de materiales: la interventoría reitera al contratista dar cumplimiento de los compromisos pactados y entregar las correcciones presentadas a los materiales presentados como lo son material para afirmado ya que estos no cumplen y no ha sido aprobados por esta interventoría, además es de aclarar que es de responsabilidad del contratista incumpla con la calidad del material este será removido en obra, por lo que se recomienda acatar las observaciones y darle tramite lo más pronto posible.

5. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra del mes de noviembre que ala fecha no se han remitido la interventoría, es de recordar que el incumplimiento de esta, conlleva al que se solicite la respectiva multa.

6. Valla del proyecto: la interventoría reitera que a la fecha no se tiene el diseño de arte definitivo por para del INVIAS, debió a las modificaciones de Cambio de gobierno, pero solicita al contratista instalar la Estructura donde se va instalar.

7. Se reitera la solicitud por parte de la interventoría para que los contratistas de obra tengan suficientes insumos de materiales en acopios y campamentos para que no se vean paralizadas las obras en épocas decembrinas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato	miércoles, 21 de diciembre de 2022	Contratista
Instalar estructura para valla del proyecto.	jueves, 22 de diciembre de 2022	Contratista
Iniciar acopio de materiales	jueves, 22 de diciembre de 2022	Contratista
correcciones presentadas a los materiales presentados como lo son material para afirmado	miércoles, 21 de diciembre de 2022	Contratista



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
DAYANA GONZALEZ	AUX. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES VILLALBA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
EVER LEONARDO OLIVA RHENALS	AUX. RESIDENTE DE INTERVENTC	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

8. ANEXOS

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

i. A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $ 2.960.735.148,42 correspondiente al 36.93% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 360.761.256,56 correspondiente al 4,50%; lo que representa un atraso del 32,43%.

Estudios y diseños: a la fecha se encuentra aprobado el estudio geotécnico de la estructura vial y diseño de pavimentos; y se continua con la revisión y/o actualización del diseño de estructuras y el estudio geotécnico de las obras de drenaje, el estudio hidráulico e hidrológico y el diseño geométrico.

ii. El contratista presento plan de continencia y reprogramación de obra, pero este se encuentra en revisión por esta interventoría; sin embargo, se le solicita al contratista entregar el flujo de fondos de la programación presentada para poder ajustar los avances de obra a esta reprogramación.

iii. Se recomienda al contratista agilizar la respuesta a las observaciones realizadas por esta interventoría con respecto al diseño estructural de las obras de artes.

iv. Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados además de las observaciones al tema hidráulico realizadas por esta interventoría.

v. Se recomienda a la alcaldía del municipio de San Bernardo del viento, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra.

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-308-2022	2/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Ordenes de giro anticipo No. 3 y 4	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-328-2022	6/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud tomar acciones correctivas sobre el material de afirmado	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-339-2022	10/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Contingencia fiestas decembrinas	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-357-2022	13/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Seguimientos compromisos comité de obra No 3 29/11/2022	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-370-2022	15/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión NO conformidad calidad de afirmado	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-385-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración aprobación PMT ante entidad correspondiente	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-386-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones diseño estructural del box Coulvert No 3	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-388-2022	16/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Requerimiento presencia personal profesional en obra y disponer de todo el equipo de maquinaria mínimo	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-397-2022	20/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones diseño estructural	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-398-2022	20/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Remisión observaciones PAGA	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-400-2022	20/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Alcance al comunicado CVRIMG-397-2022	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-412-2022	21/12/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud entrega documentación area SST	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	1/12/2022	NA	1-dic.-22	Envío de certificados del Sistema General de Seguridad Social a la fecha
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	2/12/2022	NA	2-dic.-22	Orden de pago No. 4.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	2/12/2022		2-dic.-22	Actas de entrega de material.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	2/12/2022	SIN OFICIO	2-dic.-22	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	5/12/2022	NA	5-dic.-22	Actas de vecindad
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	10/12/2022	NA	10-dic.-22	Análisis granulométrico para afirmado A-25

CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	12/12/2022	NA	12-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-324-2022
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	12/12/2022	SIN OFICIO	12-dic.-22	CARACTERIZACIÓN AFIRMADO Y SUBBASE
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	15/12/2022	NA	15-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-370-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	16/12/2022	NA	16-dic.-22	Orden de pago fiducia No.5
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	17/12/2022	NA	17-dic.-22	RESPUESTA 2 AL OFICIO CVRIMG-368-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	19/12/2022	NA	19-dic.-22	CARACTERIZACIÓN AFIRMADO
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	19/12/2022	NA	19-dic.-22	REITERACIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	20/12/2022	NA	20-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-357-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	21/12/2022	NA	21-dic.-22	REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE OBRA.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	28/12/2022	SIN OFICIO	28-dic.-22	ENTREGA DE DOCUEMENTOS
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	29/12/2022	NA	29-dic.-22	RESPUESTA AL OFICIO CVRIMG-398-2022 (PAGA)
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	29/12/2022	NA	29-dic.-22	ACTAS DE VECINDAD FALTANTES

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-006-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**				



Descripción: Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Descripción: Retiro de material de Excavaciones



Descripción: Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Descripción: Control Topografico

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-006-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**				



Descripción: Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Descripción: Retiro de material de Excavaciones



Descripción: Extencion de material de afirmado



Descripción: Control de trafico en obra.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día) / 12 (Mes)	2022 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-006-2022	**FICHA PREDIAL ID:**		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022			
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**					



Descripción: Retiro de material de Excavaciones



Descripción: Extencion de material de afirmado



Descripción: Extencion de material de afirmado



Descripción: Compactacion de material afirmado.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Jueves, 01 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografia
Personal en obra:
R de obra, R de interventoria, aux de interventoria, 1 topografo, 2 cadeneros, 3 operadores, chofer
Actividades realizadas
-Se continuaron con las actividades de relleno con material afirmado desde K3+620 hasta K3+570 con su respectiva compactacion
Observaciones:

Viernes, 02 de diciembre de 2022
No se realizaron actividades

Sabado, 03 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibro compactador, 1 minicargador, 2 volquetas,

1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografía.


Personal en obra:


1 de obra, 1 de interventoría, aux de interventoría, director de obra, director de interventoría, 2 topógrafos, 2 cadeneros, 3 operadores, 1 conductor

Actividades realizadas

- Se continuaron con las actividades de relleno y compactación de material de afirmado desde K3+600
- Se realizaron actividades de localización y replanteo del eje de la vía

Observaciones:





Domingo, 04 de diciembre de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Equipos y maquinarias:


1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografía


Personal en obra:

1 de obra, 1 de interventoría, aux de interventoría, 2 topógrafos, 2 cadeneros, 4 operadores, 1 conductor

Actividades realizadas

- Se realizaron actividades de extensión y compactación de afirmado





Jueves, 05 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 fotarita, equipo de topografia
Personal en obra:
8 de obra, 8 de interventoria, aux de interventoria 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 4 operadores 1 conductor
Actividades realizadas
-Se continuaron actividades de relleno y compactación del material de afirmado desde K4+900
-Se continuaron con las actividades de localización y replanteo del eje del proyecto

Observaciones:

Martes, 06 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 fotarita, equi de topografía
Personal en obra
Director de obra, director de interventoria, 8 de obra, 8 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos

2 cadeneros, 2 paleteras, 4 operadores, 1 conductor

Actividades realizadas

- Se procedio a la instalación del punto de atención al usuario en la abscisa K1+030
- Se continuaron con las actividades de retiro de material común producto de las excavaciones entre la abscisa K5+000 hasta K4+930
- Se continuaron con las excavaciones, rellenos y compactación de material de afirmado entre K5+000 hasta K4+930
- Se continuaron actividades de localización y replanteo del eje de la vía

Observaciones:

Miercoles, 07 de diciembre de 2022

Estado del tiempo

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Equipos y maquinarias:

1 vibracompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografia

Personal en obra:

2 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 4 operadores, 1 conductor

Actividades realizadas

- Se continuaron actividades de excavación y retiro de material de afirmado
- Se continuo localización y replanteo del eje de la vía

Contratista

Interventoria

Jueves, 08 de diciembre de 2022
No se laboro debido a festividades decembrinas

Contratista

Interventoria

Viernes, 09 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactora, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografia
Personal en obra:
2 de obra, 8 de interventoria, aux de interventoria
2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 4 operadores
1 conductor
Actividades realizadas
-Se continuaron con las actividades de relleno, compactacion de material de afirmado
-Se continuaron los retiros de excavaciones del retiro de material de afirmado
-recoleccion de muestras para ensayos de caracterizacion de materias de afirmado

observaciones:

Contratista

Interventoria

Sabado, 10 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactadora, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita
Personal en obra
R de obra, R de interventoria, aux de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paletero, 4 operadores, 1 conductor
Actividades realizadas
-Se continuaron actividades de retiro de material relleno y compactacion de material de afirmado
-Se continuaron los retiros de material Producto de las excavaciones
-Se continuaron actividades de localizacion y replanteo del eje del Proyecto

Observaciones:

Contratista

Interventoria

Domingo, 11 de Diciembe de 2022
No se Realizaron Actividades por ser no dia Laboral

observaciones:

Contratista

Interventoria

Lunes, 12 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
tarde: Soleado
Equipos y Maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 Minicargador, 1 Retro-excavador
1 pajarita, 2 volquetas, 1 camioneta
Personal en obra:
R. de obra, R. de Interventoria, Auxiliar de Intervento
2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 4 operadores de
Maquinaria, 1 Chofer.
Actividades Realizadas:
- Se continuaron con las labores de Localización y
Replanteo topografico del eje de la via.
- Se continuaron con las excavaciones y explanacione
de canal entre las Abcisas K4+680 y K4+590
- Se continuaron con las labores de Relleno con
material de Afirmado entre las Abcisas K4+68
K4+710

Observaciones:

Contratista.

Interventoria

Martes 13 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
tarde: Soleado
Equipos y Maquinarias:
1 minicargador, 1 pajarita, 2 volquetas, 1 camioneta
1 Retroexcavadora, Equipo de topografia
Personal en obra:
R. de obra, R. de Interventoria, Director de obra,

Director de Interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 4 operadores de Maquinaria, 1 Chofer.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se continuaron con las labores de excavacion y explanacion de canales entre las Abcisas K4+190 y K4+320
- Se continuo con la localización y Replanteo del eje de la via
- Se retiro con las labores de Retiro de Material Producto de las excavaciones, el cual fue entregado a la comunidad en compromiso adquirido en la Socialización Nº2 del proyecto.

Observaciones:

Contratista

Interventoria

Miercoles, 14 de diciembre de 2022.

Estado del tiempo

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Equipos y Maquinarias.

1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 Rojaita, 2 Volquetas, 1 camioneta, Equipo de topografia

PERSONAL EN OBRA:

R. de obra, R. de Interventoria, Aux de Interventoria, 2 paleteras, 4 operadores de maquinaria, 1 Chofer.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continuaron con las excavaciones y Explanaciones de canales entre las Abcisas K4+190 - K4+320
- Se continuo con la localización y Replanteo del Eje de la via.
- Se continuo con el Retiro de Material producto de las excavaciones, se entrego el material a la comunidad

Observaciones:

Interventoría

Contratista

Jueves 15 de Diciembre 2022

ESTADO DEL TIEMPO:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

1 Retroexcavadora, 1 Pajarita, 2 Volquetas, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Camioneta, 1 carrotanque, 1 Equipo de topografía.

PERSONAL EN OBRA:

R. de Interventoría, Aux. de Interventoría, Aux de Obra, 2 topógrafos, 2 cadeneros, 4 Operadores, 2 Paleteras, 1 Chofer, 1 Profesional SST

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se continuaron con las excavaciones y Explanacio de canales entre las Abcisas K4+190 - K4+320
- Se continuo con el retiros del Material producto de las excavaciones.
- Se continuo con el Replanteo y localización de ejes de lavia.
- Se inicio con la compactación de las excavacion para sellar la capa de Subrasante

Observaciones:

Contratista

Interventoría

Viernes, 16 de diciembre de 2022
ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
EQUIPO Y MAQUINARIA:
1 Retroexcavadora, 1 Pajarita, 2 volquetas, 1 minicar 1 vibrocompactador, 1 camioneta, 1 camotango, 1 Equipo de topografia.
PERSONAL EN OBRA:
R. de Interventoria, R. de obra, Aux de Interventoria, Aux de obra, 2 paleteros, Siso, 2 caoleneros, 4 operados 1 Chofer, 2 topografos, Director de obra.
ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se continuaron con las Excavaciones y Explanación de Canales entre las Abcisas K4+190 - K4+030
- Se continuo con el Retiro de Material de excavación y Se entrego a la comunidad del sector
- Se continuo con el Relleno con material de Afirmado entre las Abcisas. K4+370 - K4+450

OBSERVACIONES:

Contratista.

Interventoria

Sabado, 17 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografia

Personal en obra
2 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, siso, 2 cadeneros, 1 conductor, 2 paleteras, 4 operadores
Actividades realizados
- Se continuaron las actividades de relleno y compactacion de afirmado
- Se tomaron pruebas para realizar ensayo de afirmado
- Se continuaron las localizaciones y replanteo del eje del proyecto

Observaciones:

Contratista

Interventoria

Domingo, 18 de diciembre de 2022
No se laboro, día no laboral por ser domingo


Lunes, 19 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
1 vibrocompactadora, 1 minicargador, 2 volquetas 1 camion, 1 retroexcavadora, 1 fayarita, equipo de topografia
Equipo y maquinaria
Personal en obra:
2 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 1 siso, 4


operadores, 1 conductor

Actividades realizadas

- Se continuaron con las actividades de excavación de material común desde K4+140 hasta K3+950
- Se continuaron con las actividades de retiros de excavaciones desde la abscisa K4+140 hasta K3+950
- Se continuaron las localizaciones y replanteo del eje del proyecto

Observaciones:





Martes, 20 de diciembre de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Equipos y maquinarias

1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 Patarita, equipo de topografía

Personal en obra

Director de obra, director de interventoria, R de obra R de interventoria, aux de interventoria, 1 SISO, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 Boleteros, 4 operadores 1 chofer

Actividades realizadas

- Se continuaron actividades de excavación de material común desde K3+950 hasta K4+140
- Se continuaron retiro de material Producto de excavaciones K3+950 hasta K4+140
- Se continuo colocación, extensión y conformación de afirmado

-Se continuo trazado y replanteo del eje de la via

Observaciones:

Miercoles, 21 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipos de topografia
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, 1 siso, 2 topografos, 2 cadeneros, 1 chofer, 2 paleteros 4 obreros
Actividades realizadas
-Se continuaron las actividades de excavación de material común desde K4+170 hasta K3+950
-Se continuaron actividades de retiro de material producto de las excavaciones desde K4+170 hasta K3+95
-Se continuaron actividades de colocación, extension y conformación de afirmado
-Se continuo trazado y replanteo de eje de la via

Observaciones:

Jueves, 22 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipo de topografia
Personal en obra:
1 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 1 siso, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 1 chofer 4 operadores
Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de excavacion de material comun desde K4+200 hasta K4+00
- Se continuaron actividades de retiro de material de excavacion desde K4+200 hasta K4+00
- Se continuaron actividades de colocacion, extension y conformacion de afirmado
- Se continuo localizacion y replanteo del eje del Proyecto


Observaciones:


Viernes, 23 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 pajarita, equipos de topografia

Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 foleteras, 1 siso, 1 chofer, 4 operadores


Actividades realizadas
- se continuaron actividades de excavación de material desde K4+400 hasta K3+950
- se continuaron actividades de retiro de material procedente de las excavaciones
- se continuaron actividades de colocación, conformación y afirmado
- se continuo trazado y replanteo del eje de la via


Observaciones:






Sabado, 24 de diciembre de 2022
no se realizaron actividades por fechas decembrinas





Domingo, 25 de diciembre de 2022
no se laboro, dia no laboral por ser domingo





Lunes, 26 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Equipos y maquinarias
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 carrotanque, 1 retroexcavadora, 1 fotarita, equipo de topografia
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, 1 SISO, 1 chofer, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros 4 oferadores
Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de excavaciones de material común
- Se continuaron actividades de retiro de material procedente de las excavaciones
- Se continuaron actividades de colocación, extensión y conformación de afirmado
- Se realizaron actividades de humectación y compactación de afirmado
- Se continuaron trazados y replanteo del eje de la via

Observaciones:

Martes, 27 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 carrotanque, 1 retroexcavadora, 1 fotarita, equipos de topografía
Personal en obra:
2 de obra, 2 de interventoria, aux de interventoria, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 1 SISO, 1 chofer

4 operadores
Actividades realizadas:
- Se continuaron actividades de excavación de material común
- Se continuaron actividades de retiro de material procedente de excavaciones
- Se continuaron actividades de colocación, conformación y extensión de afirmado
- Se continuaron actividades de humectación y compactación de afirmado
- Se continuaron trazados y replanteo del eje de la vía

Observaciones:

Miercoles, 28 de diciembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 retroexcavadora, 1 fotaranta, equipos de topografia
Personal en obra:
2 de obra, 1 de interventoria, aux de interventoria, 1 siso, 2 topografos, 2 cadeneros, 2 paleteros, 1 chofer 4 operadores
Actividades realizadas
- Se continuaron actividades de retiro de matera procedente de excavaciones
- Se continuaron actividades de relleno y compactación de material de afirmado


- Se continuaron actividades de trazado y replanteo del eje del proyecto

Observaciones:


Jueves, 29 de diciembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Equipos y maquinarias:
1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 camioneta, 1 carrotanque, 2 topógrafos, 2 cadeneros, 2 paleteras, 1 chofer, 4 operadores
Actividades realizadas:
- Se continuaron actividades de excavación de material común
- Se continuaron actividades de retiro de material procedente de excavaciones
- Se continuaron actividades de colocación, extensión y conformación de afirmado
- Se continuaron actividades de humectación y compactación de afirmado
- Se continuaron trazados y replanteo del eje del proyecto
- Se procedio a realizar acopio de materiales por cierre de canteras

Observaciones:

Viernes, 30 de diciembre de 2022
No se realizaron actividades por fechas decembrinas



Sábado, 31 de diciembre de 2022
No se realizaron actividades por fechas decembrinas



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-003-2022 **Contratista:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

INFORME MENSUAL No. CINCO (5) **MES O PERIODO:** DICIEMBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	765
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	767
1	**INTRODUCCION**		769
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		770
2.1	Localización		770
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		772
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		772
2.4	Características técnicas del proyecto		773
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		776
3.1	Información general del contrato		776
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		776
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		777
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		777
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		779
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	780
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	791
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	793
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	801
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	805
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	811
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	813
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	823
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		825
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	827
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	827
	• Seguimiento Programa de Obra		829
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	836
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	836
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	840
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	844
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		950
5.1	Información general del contrato		950
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		951
5.3	Informes especialistas y profesionales		955
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1044
5.5	Informe matriz de riesgos.		1045
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1047
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		1049
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1051
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1054
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1060
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1062
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1073
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1075
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1077
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1079
7	**Conclusiones y recomendaciones**		853
8	**Anexos**		854
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		855
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		858
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		859
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		861

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** dic-22

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIO: 25/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/08/2022
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.670.052.179,30
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 16.670.052.179,30
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	6100
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	6

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.465.110.231,30	$ -	$ 16.465.110.231,30
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 148.562.128,00	$ -	$ 148.562.128,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.661.050.359,30	$ 9.001.820,00	$ 16.670.052.179,30

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 535.158.925,60	$ -	$ 535.158.925,60	$ 535.158.925,60
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 535.158.925,60	$ -	$ 535.158.925,60	$ 535.158.925,60

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.341.662.892,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 535.158.925,60
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 22,85%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **18**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de afirmado (27/12/2022)



Instalación de afirmado (29/12/2022)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Se recomienda al municipio de San Pelayo la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, mediante convenio interadministrativo No. 1893 de 2021. Es por ello que mediante el **Proceso LP-003-2022 del municipio de San Pelayo** se celebra el Contrato de Obra No. LP-003-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", El cual fue adjudicado al CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, cuyo plazo inicial es de siete (7) meses a partir del 25 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 16.670.052.179,30.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de Diciembre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

se realiza el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo, Córdoba.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Pelayo.

El municipio de San Pelayo se encuentra ubicado en la parte norte del Sinú Medio en el departamento de Córdoba, entre los meridianos 8°58' de latitud Norte y 75°51'de longitud Oeste de Greenwich. Limita geográficamente por el norte con el municipio de Santa Cruz de Lorica, cuya extensión limítrofe es de 55 km, y con el municipio de Cotorra en 24,5 km; al oriente con los municipios de Chimá y Ciénaga de Oro, con linderos compartidos de 15 km para el primero y 7,25 km de longitud para el segundo; por el sur con los municipios de Cereté y Montería, límites definidos en 53,5 km de longitud para el primero y 9,25 km para el segundo; y por el occidente con el municipio de Puerto Escondido, cuyo límite presenta una longitud de 16,5 km .

El territorio municipal posee un área de 45.112 ha. Extensión área urbana: el perímetro urbano tiene un área de 352 ha, representa el 0.8 % del territorio municipal, de los cuales el 25% está construida, el 5% está dedicado a vías de comunicación y el 70% restante es área libre.

Extensión área rural: la zona rural representa el 99.2%, con un área de 447,6 km² del territorio municipal.

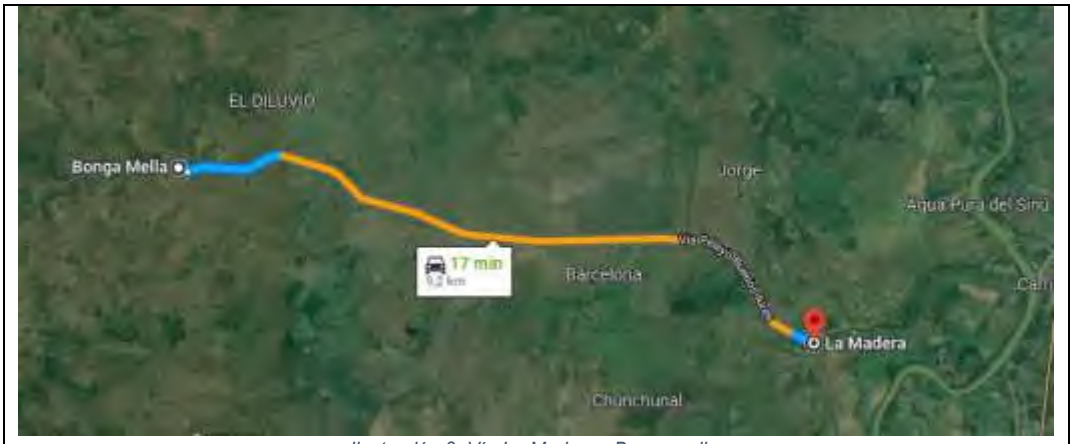


Ilustración 3. Vía La Madera - Bongamella.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales empleada por el contratista es la ubicada en el corregimiento de Berasategui, entrando a la Balsa, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. La cual cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 4. Esquema de ubicación de la fuente de materiales.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de San Pelayo, gracias a la ejecución del contrato No. LP-003-2022, se beneficia principalmente la zona rural conformada por los corregimientos de La Madera y el corregimiento de Bongamella.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, inicialmente la vía presenta dificultad en la movilidad, debido a su mal estado, el cual se ocasiona por el alto deterioro de la superficie de rodadura, el drenaje superficial que es deficiente y está construido sin consideraciones técnicas algunas.

	
Estado inicial de la Vía, 30/08/2022	Instalación de afirmado – 29/12/2022



Estado inicial de la Vía, 30/08/2022



Estado de la via – 13/12/2022

Ilustración 5. Estado inicial de la vía. Cto. LP-003-2022

En el presente periodo el contratista desarrollo actividades de explanación e instalación de capa con material de afirmado.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto, inicialmente propone el mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de pavimento hidráulico con módulo de rotura de 40 Mpa, de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento previsto. La estructura de pavimento se confinará con bordillos de piezas prefabricadas a lado y lado de la vía con las siguientes características: Bordillo prefabricado en concreto Ref. A 85 NTC 41-09 (0,2X0,35X0,8) m; la construcción dieciocho (18) Box Coulvert de 1X1 de longitud 7 metros, y uno (1) de sección 2X1 con 7 metros de longitud, un (1) puente de veinte metros de luz y la demarcación horizontal y vertical de la vía.

Contrato LP-003-2022	
Sistema	Pavimento Rígido
Longitud	6100 metros
Ancho Calzada	6,0 metros
Losa de concreto	0,2 metros
Subbase	0,15 metros
Mejoramiento	0,2 metros

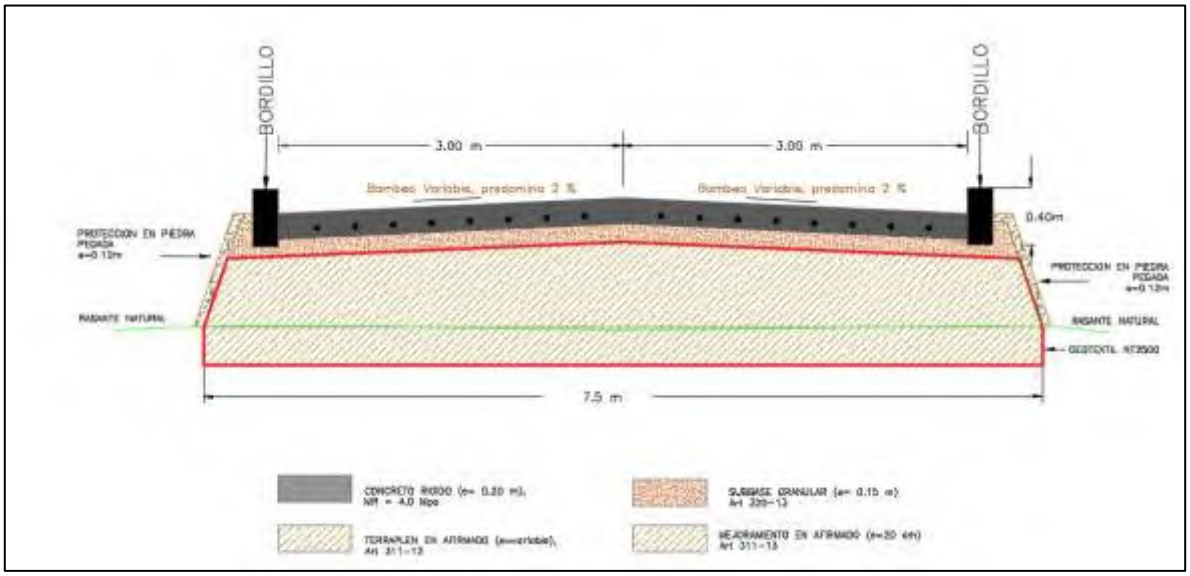


Ilustración 6. Sección pavimento rígido

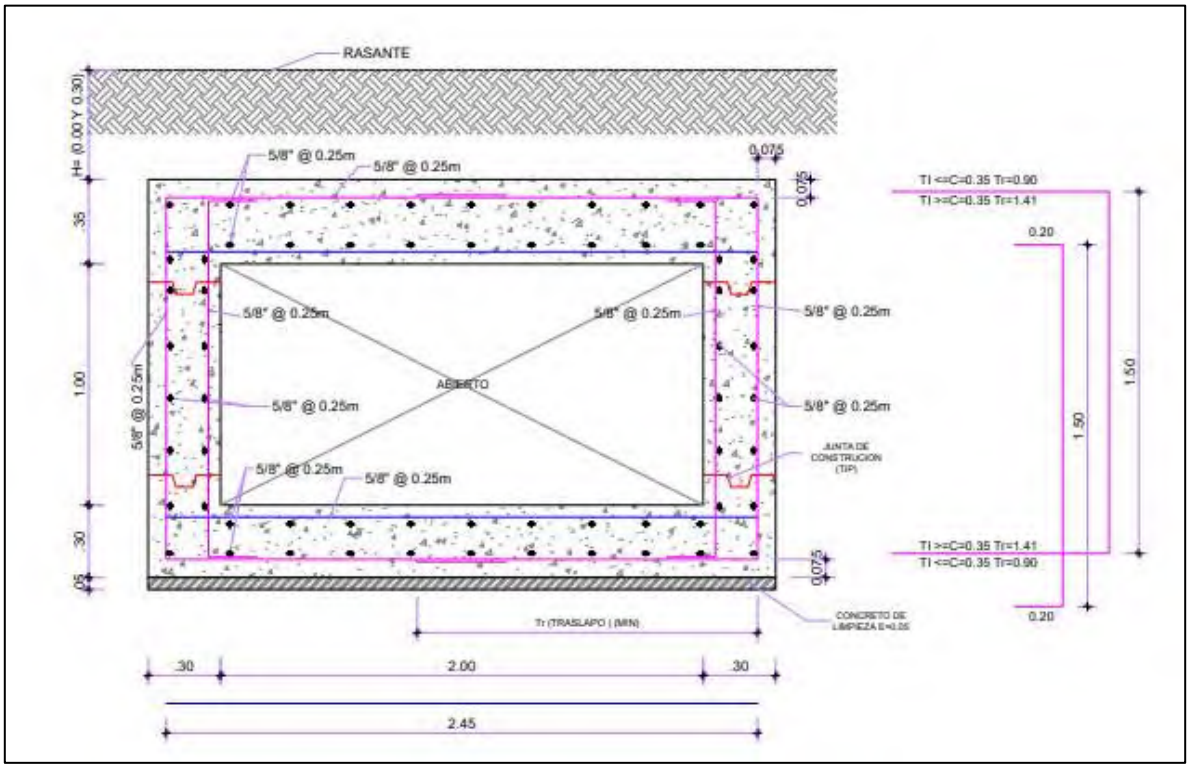


Ilustración 7. Corte transversal Box Coulvert 2x1

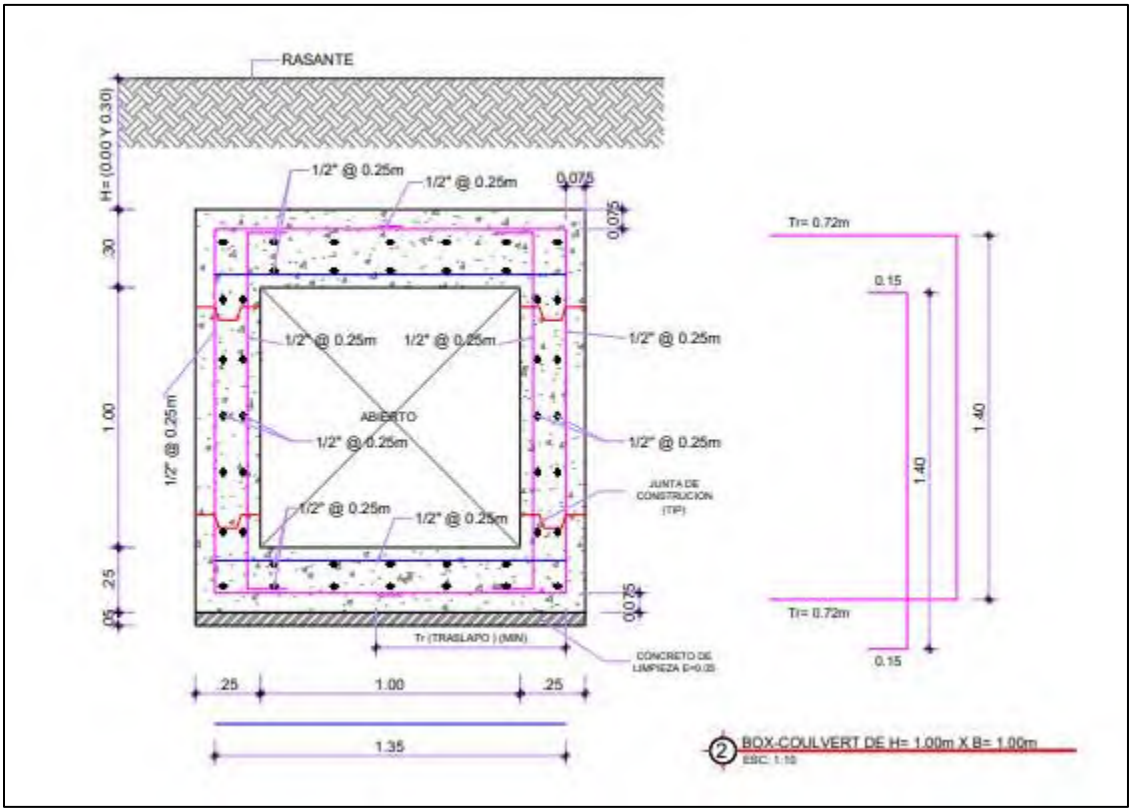


Ilustración 8. sección Box Coulvert 1X1

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-003-2022
CONTRATO No.	LP-003-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/06/2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
NIT	NIT. 9016053089
INTEGRANTES	• RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS • Participación: 50%
	• PROCOM INGENIERÍA S.A.S. • NIT. 901.359.599-1 • Participación: 50%
DIRECCIÓN	San Jerónimo – Centro Logístico – Oficina 3, Calle A, Km 3, Planeta Rica-Montería
TELEFONO	3107034001
CORREO	consorciomejoramientosp@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.670.052.179,30
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA INICIO	25/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	25/03/2023

Tabla 1. Información Cto. LP-003-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continúa con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños. A la fecha se encuentran aprobados el estudio geotécnico y el diseño de pavimentos.
ii. Se iniciaron actividades en obra desde el 01 de diciembre de 2022, se realizó explanación desde el K0+340 hasta el K5+000.
iii. Se realizó instalación de capa de material tipo afirmado para el mejoramiento de la subrasante desde el K0+340 hasta K2+300 primera capa.

iv. Se realizó compactación mecánica de la capa de material tipo afirmado para el mejoramiento de la subrasante desde el K0+340 hasta K2+300 primera capa.
v. Se realizó la verificación topográfica de los niveles de la capa de material de afirmado, por parte del contratista desde el K0+340 hasta el K2+300.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista entregó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y está en revisión por parte de esta interventoría.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista ubicó el punto de atención al usuario, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento la Madera, en la abscisa K1+600 desde la carretera con concesión ruta al mar.
El horario de atención son los días martes y jueves de 08:00 am a 12:00 m.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos para ninguno de los contratos de obra a cargo de esta interventoría.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. A fecha del 30 de noviembre de 2022, se tiene una inversión de obra programada del $ 2.341.662.892,33 correspondiente al 14.22% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $535.158.925,60 correspondiente al 3,25%; lo que representa un atraso del 10,97%

ii. El día 06/12/2022 la Interventoría mediante oficio No. CVRIMG-325-2022 radicó ante el municipio la recomendación de aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

iii. El contratista no ha implementado el plan de contingencia, se labora diariamente, pero el rendimiento en la ejecución de las actividades en obra es bajo, no logra minimizar el atraso de la obra. Esta interventoría solicita al contratista ejecutar un plan de contingencia de manera inmediata, abrir más frentes de obra, aumentar los rendimientos en las actividades realizadas.

iv. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
v. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en los comités y actas de reunión realizadas.
vi. Realizar la revisión de la documentación entregada por el contratista.
vii. Enviar oficios correspondientes a contratista y municipio.
viii. Elaborar informes semanales de avance del contrato de obra.
ix. Revisión de las afiliaciones a seguridad social y parafiscales del personal en obra.
x. Supervisión de las actividades en obra.
xi. Revisión de los ensayos de laboratorios.
xii. Diligenciamiento de la bitácora de obra.
xiii. Inspección y verificación de uso de los EPP.
xiv. Inspección de maquinaria en obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO (CÓRDOBA)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 15 del 25/11/2022 al 1/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 7100 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 6 metros; la construcción seis (6) Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1 y tres (3) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 7100 metros lineales de pavimento hidráulico con módulo de rotura de 40 Mpa, de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento previsto. La estructura de pavimento se confinará con bordillos de piezas prefabricadas a lado y lado de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

INTEGRANTES:
1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Participación: 50%
2. PROCOM INGENIERÍA S.A.S., Participación: 50%

CONTRATO No. LP-003-2022
FECHA DE INICIO: 25/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/03/2023

VALOR INICIAL: $ 16.670.052.179,30
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 16.670.052.179,30
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.670.052.179,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.465.110.231,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 958.344.084,00	5,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 153.477,00	0,001%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (958.190.607,00)	-5,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 958.344.084,00	5,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.477,00	0,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (958.190.607,00)	-5,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 94.840.380,00	0,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 153.477,00	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5,82%
Meta Física Ejecutada % 0,02%
Avance o Atraso Físico % -5,80%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Pavimento Rigido	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1mX1m	Und	19		19	Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und				Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	6100		6100	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de interventoría

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado el documento PAGA y se encuentra en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERV ACIONES: : El dia primero (1) de diciembre se dió inicio a las actividades en obra, comenzando con la etapa de explanación,

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Se comenzo con las actividades en obra, se dio inicio a la etapa de explanacion de los tramos criticos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la explanacion del los tramos criticos
2. Dar inicio a la construccion de 3 estructura de drenaje (BOX COULVERT DE 1X1) - longitud de 7 metros

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

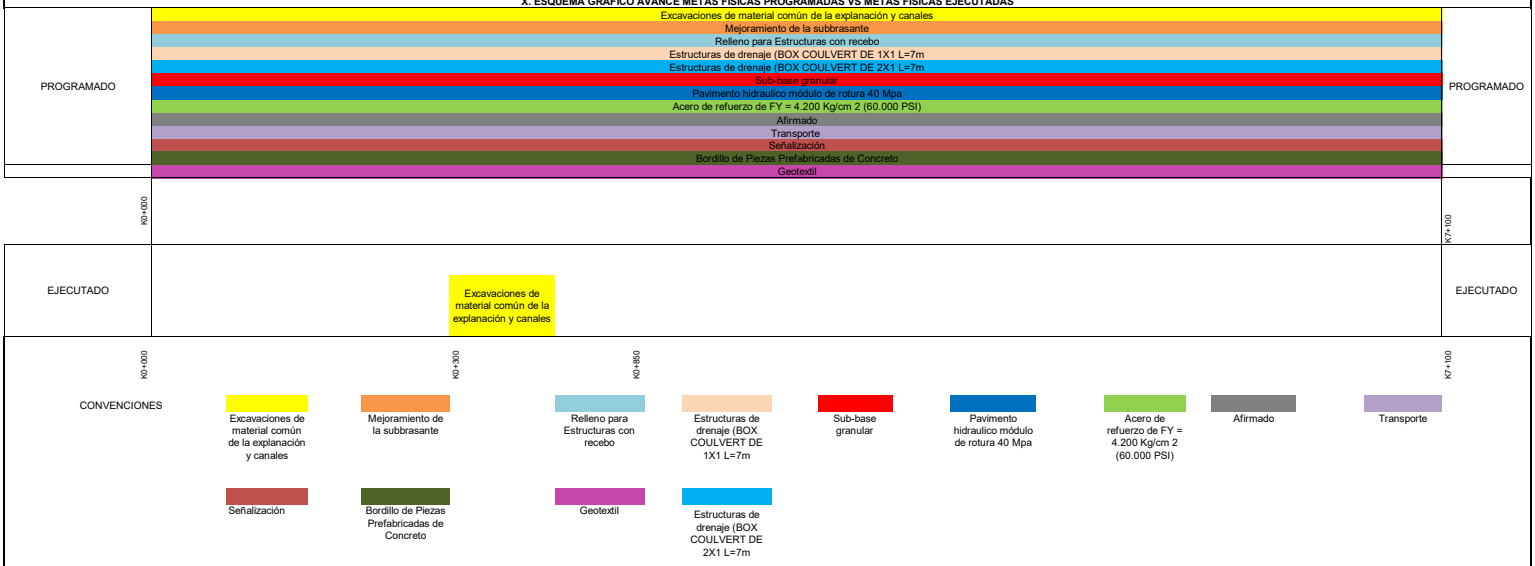

Actualmente se encuentra con aprobación parcial de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Explanación



Explanación



Explanación

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ VIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO (CÓRDOBA)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 16 del 2/12/2022 al 8/12/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 7100 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 6 metros; la construcción seis (6) Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1 y tres (3) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 7100 metros lineales de pavimento hidráulico con módulo de rotura de 40 Mpa, de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento previsto. La estructura de pavimento se confinará con bordillos de piezas prefabricadas a lado y lado de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

INTEGRANTES: 1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Participación: 50%; 2. PROCOM INGENIERÍA S.A.S., Participación: 50%

CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/03/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.670.052.179,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/03/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.670.052.179,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.465.110.231,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.290.078.831,08	7,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 39.312.000,00	0,239%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.250.766.831,08)	-7,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.290.078.831,08	7,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.312.000,00	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.250.766.831,08)	-7,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 331.734.747,08	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.158.523,00	0,238%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 7,84% Avance o Atraso Físico %: -4,79%
Meta Física Ejecutada %: 3,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	6100	3500	2600	Prog	6100			6100	100,0%
					Ejec	2800			2800	45,9%
Afirmado	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Pavimento Rigido	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1mX1m	Und	19		19	Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und				Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	6100		6100	Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de interventoría

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado el documento PAGA y se encuentra en revisión por parte dela interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: Se instala y se pone en servicio el punto de atención al ciudadano.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Se continua en la etapa de explanación de los tramos críticos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la explanacion del los tramos críticos
2. Dar inicio a la construccion de 3 estructura de drenaje (BOX COULVERT DE 1X1) - longitud de 7 metros

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

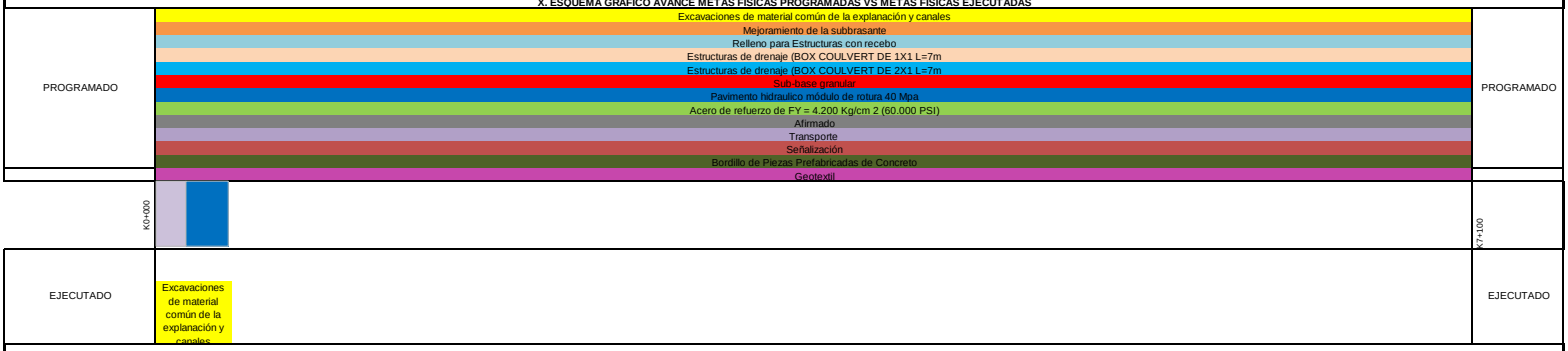

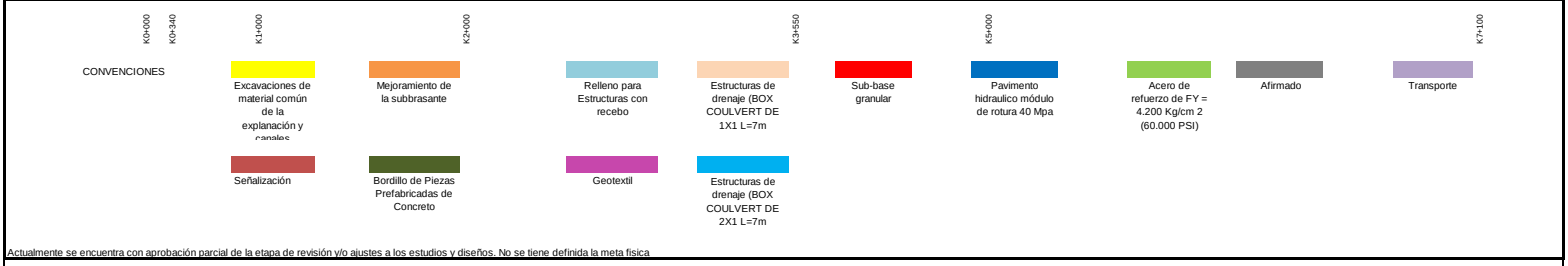

Actualmente se encuentra con aprobación parcial de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Explanación



Punto de atención al ciudadano.



Explanación

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO (CÓRDOBA)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 17 del 9/12/2022 al 15/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 7100 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 6 metros; la construcción seis (6) Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1 y tres (3) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 7100 metros lineales de pavimento hidráulico con módulo de rotura de 40 Mpa, de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento previsto. La estructura de pavimento se confinará con bordillos de piezas prefabricadas a lado y lado de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Participación: 50% 2. PROCOM INGENIERÍA S.A.S., Participación: 50%			INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/03/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.670.052.179,30	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/03/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.670.052.179,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.465.110.231,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.009.928.145,25	12,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 178.146.019,20	1,082%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.831.782.126,05)	-11,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.009.928.145,25	12,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 178.146.019,20	8,86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.831.782.126,05)	-11,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 331.734.747,08	2,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56.318.443,20	0,342%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 12,21%
Meta Física Ejecutada %: 8,86%
Avance o Atraso Físico %: -3,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	6100	3500	2600	Prog	6100			6100	100,0%
					Ejec	4100			4100	45,9%
Afirmado	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Pavimento Rigido	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1mX1m	Und	19		19	Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und				Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	6100		6100	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carro-tanque de agua	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de interventoría

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado el documento PAGA y se encuentra en revisión por parte dela interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: Se instala y se pone en servicio el punto de atención al ciudadano.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Se continua en la etapa de explanación de los tramos críticos.
3. Se intaló material de afirmado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la explanacion del los tramos en el reto de la vía.
2. Se continua con la instalación de capa de afirmado para el mejoramiento de la subrasante.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

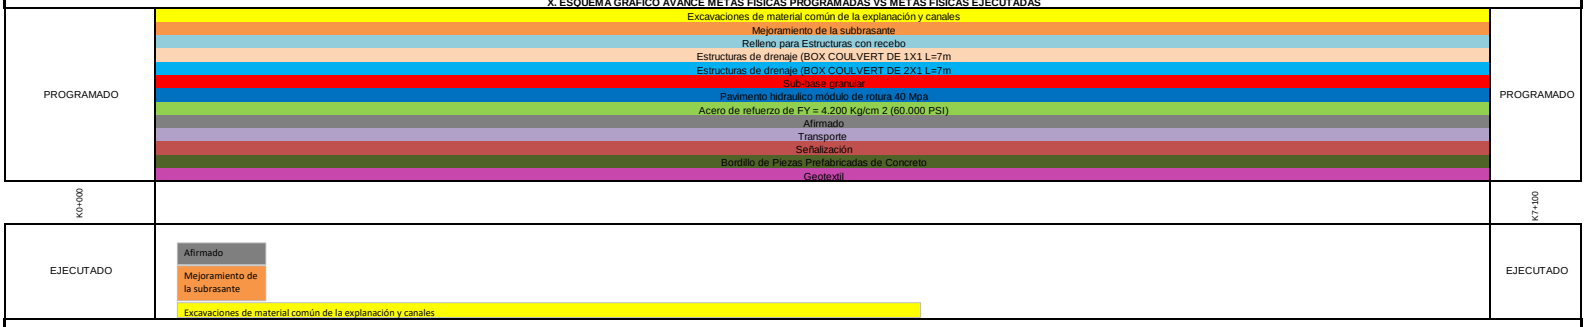

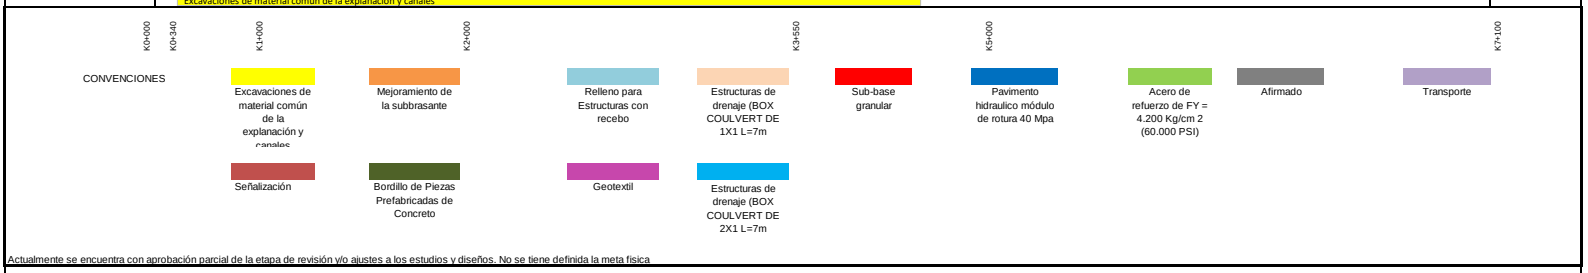

Actualmente se encuentra con aprobación parcial de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de afirmado.



Señalización en obra



Explanación



Carro-tanque del agua



Humedecimiento del material de afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO (CÓRDOBA)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 18 del 16/12/2022 al 22/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 7100 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 6 metros; la construcción seis (6) Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1 y tres (3) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 7100 metros lineales de pavimento hidráulico con módulo de rotura de 40 Mpa, de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento previsto. La estructura de pavimento se confinará con bordillos de piezas prefabricadas a lado y lado de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

INTEGRANTES: 1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Participación: 50%; 2. PROCOM INGENIERÍA S.A.S., Participación: 50%

CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/03/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.670.052.179,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/03/2023		$
			$
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.670.052.179,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.465.110.231,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.173.243.713,05	13,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 328.489.232,00	1,995%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.844.754.481,05)	-11,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.173.243.713,05	13,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 328.489.232,00	15,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.844.754.481,05)	-11,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 163.315.567,80	0,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 150.343.212,80	0,913%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 272.511.928,00	5,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.743.764,40	0,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.743.764,40	0,65%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-22
VALOR FACTURA: $ 115.561.614,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 13,20%
Meta Física Ejecutada %: 15,12%
Avance o Atraso Físico %: 1,92%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	6100	3500	2600	Prog	6100			6100	100,0%
					Ejec	4100			4100	67,2%
Afirmado	m	6100	3500	2600	Prog	6100			6100	100,0%
					Ejec	1900			1900	31,1%
Subbase Granular	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Pavimento Rigido	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1mX1m	Und	19		19	Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und				Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	6100		6100	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carro-tanque de agua	1	1
Volqueta	1	5

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de interventoría

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado el documento PAGA y se encuentra en revisión por parte dela interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: Se instala y se pone en servicio el punto de atención al ciudadano.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continúa con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Se continúa en la etapa de explanación de los tramos críticos.
3. Se instaló material de afirmado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la explanación en el resto de la vía.
2. Se continúa con la instalación de capa de afirmado para el mejoramiento de la subrasante.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





Actualmente se encuentra con aprobación parcial de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de afirmado



Instalación de afirmado y señalización.



Humedecimiento de la subrasante



Instalación de afirmado



Humedecimiento del material de afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO (CÓRDOBA)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 19 del 23/12/2022 al 29/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 7100 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 6 metros; la construcción seis (6) Box Coulvert de longitud 7 metros con las siguientes secciones: tres (3) de sección 1X1 y tres (3) de sección 2X1 y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de la Madera hasta el corregimiento de Bongamella en el Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 7100 metros lineales de pavimento hidráulico con módulo de rotura de 40 Mpa, de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento previsto. La estructura de pavimento se confinará con bordillos de piezas prefabricadas a lado y lado de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

INTEGRANTES: 1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Participación: 50%; 2. PROCOM INGENIERÍA S.A.S., Participación: 50%

CONTRATO No.	LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/03/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.670.052.179,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25/03/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.670.052.179,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.465.110.231,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.341.662.892,33	14,22%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 535.158.925,60	3,250%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.806.503.966,73)	-10,97%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.341.662.892,33	14,22%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 535.158.925,60	22,85%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.806.503.966,73)	-10,97%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 168.419.179,20	1,02%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 206.669.693,60	1,255%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 272.511.928,00	5,97%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.743.764,40	0,65%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.743.764,40	0,65%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-22
VALOR FACTURA: $ 115.561.614,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 14,22%
Meta Física Ejecutada %: 22,85%
Avance o Atraso Físico %: 8,63%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	6100	3500	2600	Prog	6100			6100	100,0%
					Ejec	5000			5000	70,4%
Afirmado	m	6100	3500	2600	Prog	6100			6100	100,0%
					Ejec	2300			2300	8,4%
Subbase Granular	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Pavimento Rigido	m	6100	3500	2600	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1mX1m	Und	19		19	Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und				Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	6100		6100	Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carro-tanque de agua	1	1
Volqueta	1	5

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de interventoría

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado el documento PAGA y se encuentra en revisión por parte dela interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: Se instala y se pone en servicio el punto de atención al ciudadano.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continúa con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Se continúa en la etapa de explanación de los tramos críticos.
3. Se continúa instalando material de afirmado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la explanación en el resto de la vía.
2. Se continúa con la instalación de capa de afirmado para el mejoramiento de la subrasante.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

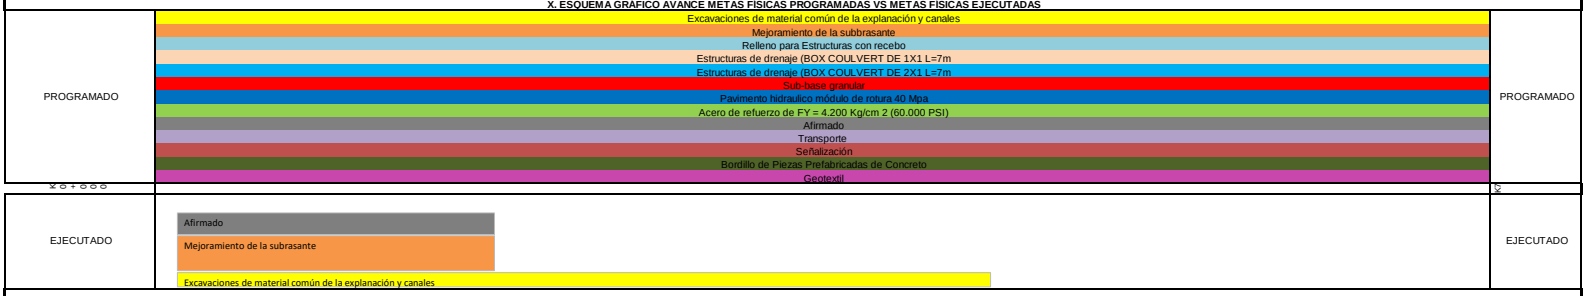



Actualmente se encuentra con aprobación parcial de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de afirmado



Compactación de afirmado



Instalación de afirmado



Instalación de afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

CONTRATO No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	Champion 710A		Vía La Madera	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Vibrocompactacdor	Ingresoll Rand		Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Carro - tanque de agua			Vía La Madera																A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		6m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
Volqueta		14m3	Vía La Madera									A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
			Vía La Madera	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
TOTAL ACTIVO				2	2	2	0	2	2	2	0	17	17	0	17	17	17	17	18	18	0	18	18	18	18	18	0	0	0	18	18	18	18	18
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18	18	18	0	0	0	0	10

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	330	78%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	103	24%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): La maquinaria se encontró inactiva los días 4, 8, 11, 18 y 25 por ser dias festivos en los que no se realizaron actividades en obra. Los dias 24 y 26 los equipos estaban inactivos por motivo de fiesta navideña no suministraron material, y el 31 de diciembre por ser día de fin de año.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El día 09 de diciembre de 2022, en contratista inició la actividad de instalación de material de afirmado sin el carro-tanque del agua, la interventoría le solicitó al contratista la implementación del carro-tanque del agua mediante bitácora, oficios y reunión semanal. El día 16/12/2022 el contratista ingresó el carro-tanque del agua al frente de obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO PERALTA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 22202157846COR

Firma
Nombre: YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202228500COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIAZ REDONDO DANIEL DAVID	10771900	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	SALUD TOTAL	9445442503	$ 40.000,00	COLFONDOS	9445442503	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
2	PERALTA GONZALEZ CARLOS AGUSTO	92538529	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	SALUD TOTAL	9445442503	$ 40.000,00	COLPENSIONES	9445442503	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
3	RAMIREZ SIMANCA OSCAR LUIS	1067860242	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA E.P.S.	9445442503	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442503	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
1	ALEAN PORTILLO ANDRES DAVID	1065015012	OBRERO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA E.P.S.	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
2	ARROYO SOTOMAYOR JOSE CARLOS	1066734724	SG-SST	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA E.P.S.	9445442622	$ 40.000,00	COLPENSIONES	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
3	CORDERO HERNANDEZ MIGUEL PATRICIO	7382685	OBRERO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA EPS MOVILIDAD	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
4	DIAZ DORIA DAIRO DAVID	7383842	OBRERO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA E.P.S.	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
5	DIAZ REDONDO DANIEL DAVID	10771900	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	SALUD TOTAL	9445442622	$ 40.000,00	COLFONDOS	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
6	GALINDO DÍAZ MILCIADES MANUEL	78031206	OBRERO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	EPS MUTUAL SER	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
7	MARTINEZ PACHECO JAIME JAVIER	1066735568	ING AMBIENTAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	SANITAS	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
8	MARTINEZ BERROCAL RICHARD EMIRO	11001681	TOPÓGRAFO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA E.P.S.	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
9	PERALTA GONZALEZ CARLOS AGUSTO	92538529	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	SALUD TOTAL	9445442622	$ 40.000,00	COLPENSIONES	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
10	RAMIREZ SIMANCA OSCAR LUIS	1067860242	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	NUEVA E.P.S.	9445442622	$ 40.000,00	PORVENIR	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
11	SOTO MARTINEZ MARIA ESTELLA	35114922	SOCIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	v	SALUD TOTAL	9445442622	$ 40.000,00	COLPENSIONES	9445442622	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A la fecha del presente informe el contratista entrega dos comprobantes de pago de la planilla aportes legales y seguridad social, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2022.

El contratista adjunta la certificación de fecha ____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR LUIS RAMIREZ SIMANCA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-269747 COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GARALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605308	9	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 N 62B-32	MONTERIA-CORDOBA	7845471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01			E	2023/01/04			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065015012	ALEAN PORTILLO ANDRES DAVID	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	7382685	CORDERO HERNANDEZ MIGUEL PATRICIO	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	7383842	DIAZ DORIA DAIRO DAVID	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	10771900	DIAZ REDONDO DANIEL DAVID																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	78031206	GALINDO DIAZ MILCIADES MANUEL	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS048	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
6	CC	92538529	PERALTA GONZALEZ CARLOS AUGUSTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1067860242	RAMIREZ SIMANCA OSCAR LUIS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(7)**																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$487,200		$0	$0		$2,167,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605308	9	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 N 62B-32	MONTERIA-CORDOBA	7845471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01			E	2023/01/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$640,000	$0	$0	$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$487,200	$0	$0	$487,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$487,200	$0	$0	$487,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$280,000	$0	$0	$280,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$120,000	$0	$0	$120,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**7**	**$2,167,200**	**$0**	**$0**	**$2,167,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605308	9	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 N 62B-32	MONTERIA-CORDOBA	7845471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	66232822	9445442503	E	2022/12/05	2023/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	42	$971,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10771900	DIAZ REDONDO DANIEL DAVID																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	92538529	PERALTA GONZALEZ CARLOS AUGUSTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	1067860242	RAMIREZ SIMANCA OSCAR LUIS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(3)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$928,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605308	9	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 N 62B-32	MONTERIA-CORDOBA	7845471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	66232822	9445442503	E	2022/12/05	2023/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	42	$971,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$480,000	$22,200	$0	$502,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$7,400	$0	$167,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$7,400	$0	$167,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$7,400	$0	$167,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$208,800	$9,700	$0	$218,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$208,800	$9,700	$0	$218,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$120,000	$5,600	$0	$125,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$120,000	$5,600	$0	$125,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$5,600	$0	$125,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$1,900	$0	$41,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$80,000	$3,700	$0	$83,700
TOTAL				**3**	**$928,800**	**$43,100**	**$0**	**$971,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605308	9	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 N 62B-32	MONTERIA-CORDOBA	7845471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	66233373	9445442622	E	2023/01/04	2023/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	12	$3,452,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065015012	ALEAN PORTILLO ANDRES DAVID	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1066734724	ARROYO SOTOMAYOR JOSE CARLOS	X																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	7382685	CORDERO HERNANDEZ MIGUEL PATRICIO	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	7383842	DIAZ DORIA DAIRO DAVID	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	10771900	DIAZ REDONDO DANIEL DAVID																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
6	CC	78031206	GALINDO DIAZ MILCIADES MANUEL	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS048	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1066735568	MARTINEZ PACHECO JAIME JAVIER	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
8	CC	11001681	MARTINEZ BERROCAL RICHARD EMIRO	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
9	CC	92538529	PERALTA GONZALEZ CARLOS AUGUSTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
10	CC	1067860242	RAMIREZ SIMANCA OSCAR LUIS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
11	CC	35114922	SOTO MARTINEZ MARIA ESTELLA	X																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(11)**																					$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$765,600		$0	$0		$3,405,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605308	9	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 N 62B-32	MONTERIA-CORDOBA	7845471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	66233373	9445442622	E	2023/01/04	2023/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	12	$3,452,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,760,000	$23,900	$0	$1,783,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$2,200	$0	$162,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$480,000	$6,500	$0	$486,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$960,000	$13,000	$0	$973,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$2,200	$0	$162,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$765,600	$10,400	$0	$776,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$765,600	$10,400	$0	$776,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$440,000	$6,000	$0	$446,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$440,000	$6,000	$0	$446,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$440,000	$6,300	$0	$446,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$40,000	$600	$0	$40,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$200,000	$2,800	$0	$202,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$600	$0	$40,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$120,000	$1,700	$0	$121,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$600	$0	$40,600
TOTAL				**11**	**$3,405,600**	**$46,600**	**$0**	**$3,452,200**

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NA

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

MES INFORME MENSUAL: diciembre-2022

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	653	Vias Terciarias Mejoradas	1130	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-003-2022	$ 16.670.052.179,30	
TOTAL						$ 16.670.052.179	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 16.670.052.179,30**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. El CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales previas a la ejecución de obra, con el contrato de obra en mencion no ha realizado

Firma
Nombre: OSCAR LUIS RAMIREZ SIMANCA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-269747 COR

Firma
Nombre: FREDY ROBERTO [illegible] GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPUPLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE SAN PELAYO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Nº. 000653

Vigencia: 2022 **Fecha de Expedición:** 3 de agosto de 2022

Tipo de Compromiso: CONTRATO

Documento Soporte/Contrato: 003 LP

Beneficiario: 9016053089 - CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

Objeto: Mejoramiento mediante la construcción de pavimento hidráulico en la via que comunica desde el corregimiento de la madera hasta el corregimiento de bonga mella, municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba"

Código	Descripción código	Rec.	Descripción recurso	Valor
.1.01.04	Mejoramiento de vías rurales en el Municipio de San Pelayo 2 Departamento de Córdoba del programa Colombia Rural-Nacional	1130	Recusos no apropiados -Convenio 1896 de -INVIAS	$ 16,670,052,179.30
			TOTAL REGISTRO	$ 16,670,052,179.30

LUIS MIGUEL MORENO DURANGO

Analista de Presupuesto

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,5	24	24	24	24	24	24	24	23,5	24	24	24	24	743
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	1
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Carlos Peralta

Nombre: CARLOS AUGUSTO PERALTA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: No. 22202157846COR

Firma Yajaira Gómez C.

Nombre: YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202228500COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion	
01/12/2022 0:00	0	50		900	
02/12/2022 0:00	0	50		900	
03/12/2022 0:00	0	50		900	
04/12/2022 0:00	0	50		900	
05/12/2022 0:00	0	50		900	
06/12/2022 0:00	0	50		900	
07/12/2022 0:00	0	50		900	
08/12/2022 0:00	0	50		900	
09/12/2022 0:00	0	50		900	
10/12/2022 0:00	0	50		900	
11/12/2022 0:00	0	50		900	
12/12/2022 0:00	0	50		900	
13/12/2022 0:00	0	50		900	
14/12/2022 0:00	0	50		900	
15/12/2022 0:00	0	50		900	
16/12/2022 0:00	0	50		900	
17/12/2022 0:00	0	50		900	
18/12/2022 0:00	0	50		900	
19/12/2022 0:00	4	50		900	
20/12/2022 0:00	0.6	50		900	
21/12/2022 0:00	0	50		900	
22/12/2022 0:00	0	50		900	
23/12/2022 0:00	0	50		900	
24/12/2022 0:00	0	50		900	
25/12/2022 0:00	0	50		900	
26/12/2022 0:00	0	50		900	
27/12/2022 0:00	0	50		900	
28/12/2022 0:00	0	50		900	
29/12/2022 0:00	0	50		900	
30/12/2022 0:00	0	50		900	
31/12/2022 0:00	0	50		900	

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

El CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales previas a la ejecución de obra, con el contrato de obra en mencion no ha realizado actividades en campo, ya que aún se continúa en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: OSCAR LUIS RAMIREZ SIMANCA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-269747 COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 01 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

FECHA DE INICIO: 25/08/2022

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.670.052.179,30

VALOR ACUMULADO: $ 16.670.052.179,30 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.667.005.217,90	25	8	2022	25	3	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 5.001.015.653,70	25	8	2022	25	3	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.334.010.435,80	25	8	2022	25	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	25	3	2023	25	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.001.015.653,70	25	3	2023	25	3	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101213992

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 833.502.608,95	25	8	2022	25	3	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 65-40-101066336 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 01 (Mes) 2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se actualizan polizas según acta de inicio.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-40-101066336**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**25**	**03**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**NIT: 901.605.308-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 62 A NO.7- 65	MONTERIA, CORDOBA	3008055838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**NIT: 901.605.308-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 62 A NO.7- 65	MONTERIA, CORDOBA	3008055838

BENEFICIARIO: 901605308 - CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.LP 003-2022MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE SAN PELAYO NIT. No. 800096805-6 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800.215.807-2 Y CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO NIT 901605308-9
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE SAN PELAYO NIT. No. 800096805-6 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800.215.807-2 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**25/03/2023**	**$833,502,608.95**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**25/03/2023**	**$250,050,782.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**25/03/2023**	**$250,050,782.69**	

ACLARACIONES

.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL CONTRATO COMENZANDO EL 25/08/2022 SEGUN ACTA DE INICIO FECHADA EL 25/08/2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,936,466.00	$ ******20,000.00	$ *****371,728.00	$ *********2,328,194.00	$ ******833,502,608.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROMOS SEGUROS LTDA	194905	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066336

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066336	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	25	08	2022	00:00	25	03	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		**NIT: 901.605.308-9**	
DIRECCIÓN: CALLE 62 A NO.7- 65	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3008055838	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		**NIT: 901.605.308-9**	
DIRECCIÓN: CALLE 62 A NO.7- 65	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3008055838	

BENEFICIARIO: 901605308 - CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	25/03/2023	$250,050,782.69	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	25/03/2023	$250,050,782.69	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	25/03/2023	$250,050,782.69	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-40-101066336

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NEDISBADILLO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-40-101066336**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**25**	**03**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**NIT: 901.605.308-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 62 A NO.7- 65	MONTERIA, CORDOBA	3008055838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**NIT: 901.605.308-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 62 A NO.7- 65	MONTERIA, CORDOBA	3008055838

BENEFICIARIO: 901605308 - CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,936,466.00	$ ******20,000.00	$ *****371,728.00	$ *********2,328,194.00	$ ******833,502,608.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROMOS SEGUROS LTDA	194905	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617382105(3900)000002328194(96)20230825

REFERENCIA PAGO:

1101261738210-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066336	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	25	08	2022	00:00	25	03	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO			**NIT: 901.605.308-9**
DIRECCIÓN: CALLE 62 A NO.7- 65	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA		**TELÉFONO:** 3008055838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO			**NIT: 901.605.308-9**
DIRECCIÓN: CALLE 62 A NO.7- 65	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA		**TELÉFONO:** 3008055838

BENEFICIARIO: 901605308 - CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO	78038056	50.00
PROCOM INGENIERIA SAS	901359599-1	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066336

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NEDISBADILLO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101213992**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**25**	**03**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**NIT: 901.605.308-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 62 A NO.7- 65	MONTERIA, CORDOBA	3008055838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT: 800.096.805-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.LP 003-2022 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDA Y CALIDAD DE LA OBRA CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL
ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2022	25/03/2023	$1,667,005,217.90	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/08/2022	25/03/2023	$5,001,015,653.70	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2022	25/03/2026	$3,334,010,435.80	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,001,015,653.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	25/03/2023	25/03/2028	$16,913,946.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL CONTRATO COMENZANDO EL 25/08/2022 SEGUN ACTA DE INICIO FECHADA EL 25/08/2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *102,344,270.00	$ ******25,000.00	$ **19,450,161.00	$ *******121,819,431.00	$ ***15,019,960,907.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROMOS SEGUROS LTDA	194905	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213992

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101213992**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**09**	**2022**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**25**	**03**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**NIT: 901.605.308-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 62 A NO.7- 65	MONTERIA, CORDOBA	3008055838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT: 800.096.805-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *102,344,270.00	$ ******25,000.00	$ **19,450,161.00	$ *******121,819,431.00	$ ***15,019,960,907.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROMOS SEGUROS LTDA	194905	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617382072(3900)000121819431(96)20230825

REFERENCIA PAGO:

1101261738207-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213992	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	25	08	2022	00:00	25	03	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO		**NIT: 901.605.308-9**
DIRECCIÓN: CALLE 62 A NO.7- 65	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3008055838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		**NIT: 800.096.805-6**
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7630309

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO	78038056	50.00
PROCOM INGENIERIA SAS	901359599-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-44-101213992

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NEDISBADILLO

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/01/2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

FECHA DE INICIO: 25/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 7 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.


OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: OSCAR LUIS RAMIREZ SIMANCA
Nombre:Director de Obra.
Matrícula Profesional No.: 22202-269747 COR

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

PLAN DE NVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
NIT. 9016053089

MUNICPIO DE SAN PELAYO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ALCALDIA DE SAN PELAYO

FECHA: 19/10/2022
(Día / Mes / Año)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971-2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

VALOR DEL CONTRATO $ 16.670.052.179,00
VALOR DEL ANTICIPO (30%) $ 5.001.015.653,00

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Compra de Materiales de obra	$ 1.200.243.756,72	$ 400.081.252,24	$ 400.081.252,24		$ 2.000.406.261,20	40,0%
2	Transporte de Materiales	$ 1.150.213.286,91	$ 450.071.095,77	$ 450.071.095,72		$ 2.050.355.478,40	41,0%
3	Compra de Herramientas y equipos	$ 150.030.469,62	$ 50.010.156,54	$ 50.010.156,54		$ 250.050.782,70	5,0%
4	Costo del personal	$ 250.000.000,00	$ 225.101.565,35	$ 225.101.565,35		$ 700.203.130,70	14,0%
5						$ -	0,0%
TOTAL		**$ 2.750.487.513,25**	**$ 1.125.264.069,90**	**$ 1.125.264.069,85**		**$ 5.001.015.653,00**	**100%**

Firma:
Nombre: DANIEL DAVID DIAZ REDONDO
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Fredy Rodriguez Giraldo
Representante legal o su Apoderado
Interventor

• Seguimiento Programa de Obra


MUNICIPIO DE SAN PELAYO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predeces
1		**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN**	**205 días**	**jue 25/08/22**	**sáb 25/03/23**	**$16.670.052.179,10**	
2		**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**jue 25/08/22**	**jue 25/08/22**	**$0,00**	
3		**EXPLANACIONES**	**87 días**	**sáb 1/10/22**	**vie 30/12/22**	**$452.528.724,00**	
6		**BOX CULVERT 1X1 (L =7m) 3und**	**29 días**	**lun 2/01/23**	**mar 31/01/23**	**$59.783.567,00**	
13		**BOX CULVERT 2X1(L =7m) 3und**	**23 días**	**mar 31/01/23**	**vie 24/02/23**	**$106.773.651,00**	
14		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23	$1.669.572,00	10
15		Mejoramiento de la subbrasante con adición de materiales (piedra rajón)	4 días	lun 6/02/23	jue 9/02/23	$8.151.951,00	19
16		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PS	6 días	jue 16/02/23	mié 22/02/23	$7.043.102,00	18;15
17		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000PSI)	8 días	jue 16/02/23	vie 24/02/23	$43.671.197,00	18
18		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	6 días	jue 9/02/23	jue 16/02/23	$43.148.429,00	15
19		Relleno para Estructuras con recebo	3 días	jue 2/02/23	lun 6/02/23	$3.089.400,00	14
20		**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 2.5 X 3 M ANCHO DE CALZADA 5 M Y LONGITUD 3235 M**	**129 días**	**mar 11/10/22**	**mié 22/02/23**	**$14.822.611.425,00**	
21		Subbase Granular Clase C.	50 días	mar 17/01/23	jue 9/03/23	$3.116.786.400,00	22
22		Afrimado (Material para Mejoramiento	59 días	jue 1/12/22	mar 31/01/23	$1.739.222.745,00	
23		Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 40 MPa	30 días	mar 21/02/23	jue 23/03/23	$7.974.072.480,00	21;25
24		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	30 días	vie 20/01/23	lun 20/02/23	$860.406.400,00	21
25		Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	15 días	sáb 25/02/23	lun 13/03/23	$1.132.123.400,00	21
26		**TRANSPORTE**	**60 días**	**vie 28/10/22**	**jue 29/12/22**	**$948.403.800,00**	




Elaboró:



MUNICIPIO DE SAN PELAYO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Predeces
27		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100	60 días	vie 28/10/22	jue 29/12/22	$948.403.800,00	5;33;35
28		**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**37 días**	**mié 15/02/23**	**vie 24/03/23**	$68.714.734,00	
31		**CARACTERIZACIÓN VIAL**	7 días	vie 17/02/23	vie 24/02/23	$6.294.330,00	
32		Caracaterización del corredor	7 días	vie 17/02/23	vie 24/02/23	$6.294.330,00	23
33		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	14 días	vie 10/03/23	vie 24/03/23	$148.562.128,10	19
34		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	jue 25/08/22	sáb 24/09/22	$47.378.000,00	2
35		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	20 días	sáb 3/09/22	sáb 24/09/22	$9.001.820,00	34FC-20 días
36		ACTA FINAL	0 días	sáb 25/03/23	sáb 25/03/23	$0,00	
37			0 días	jue 25/08/22	jue 25/08/22	$0,00	

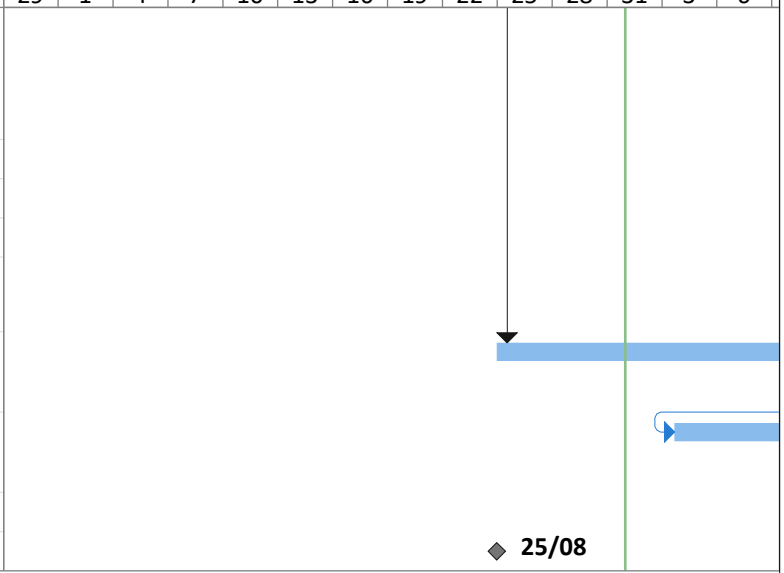

Elaboró:

MUNICIPIO DE SAN PELAYO


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

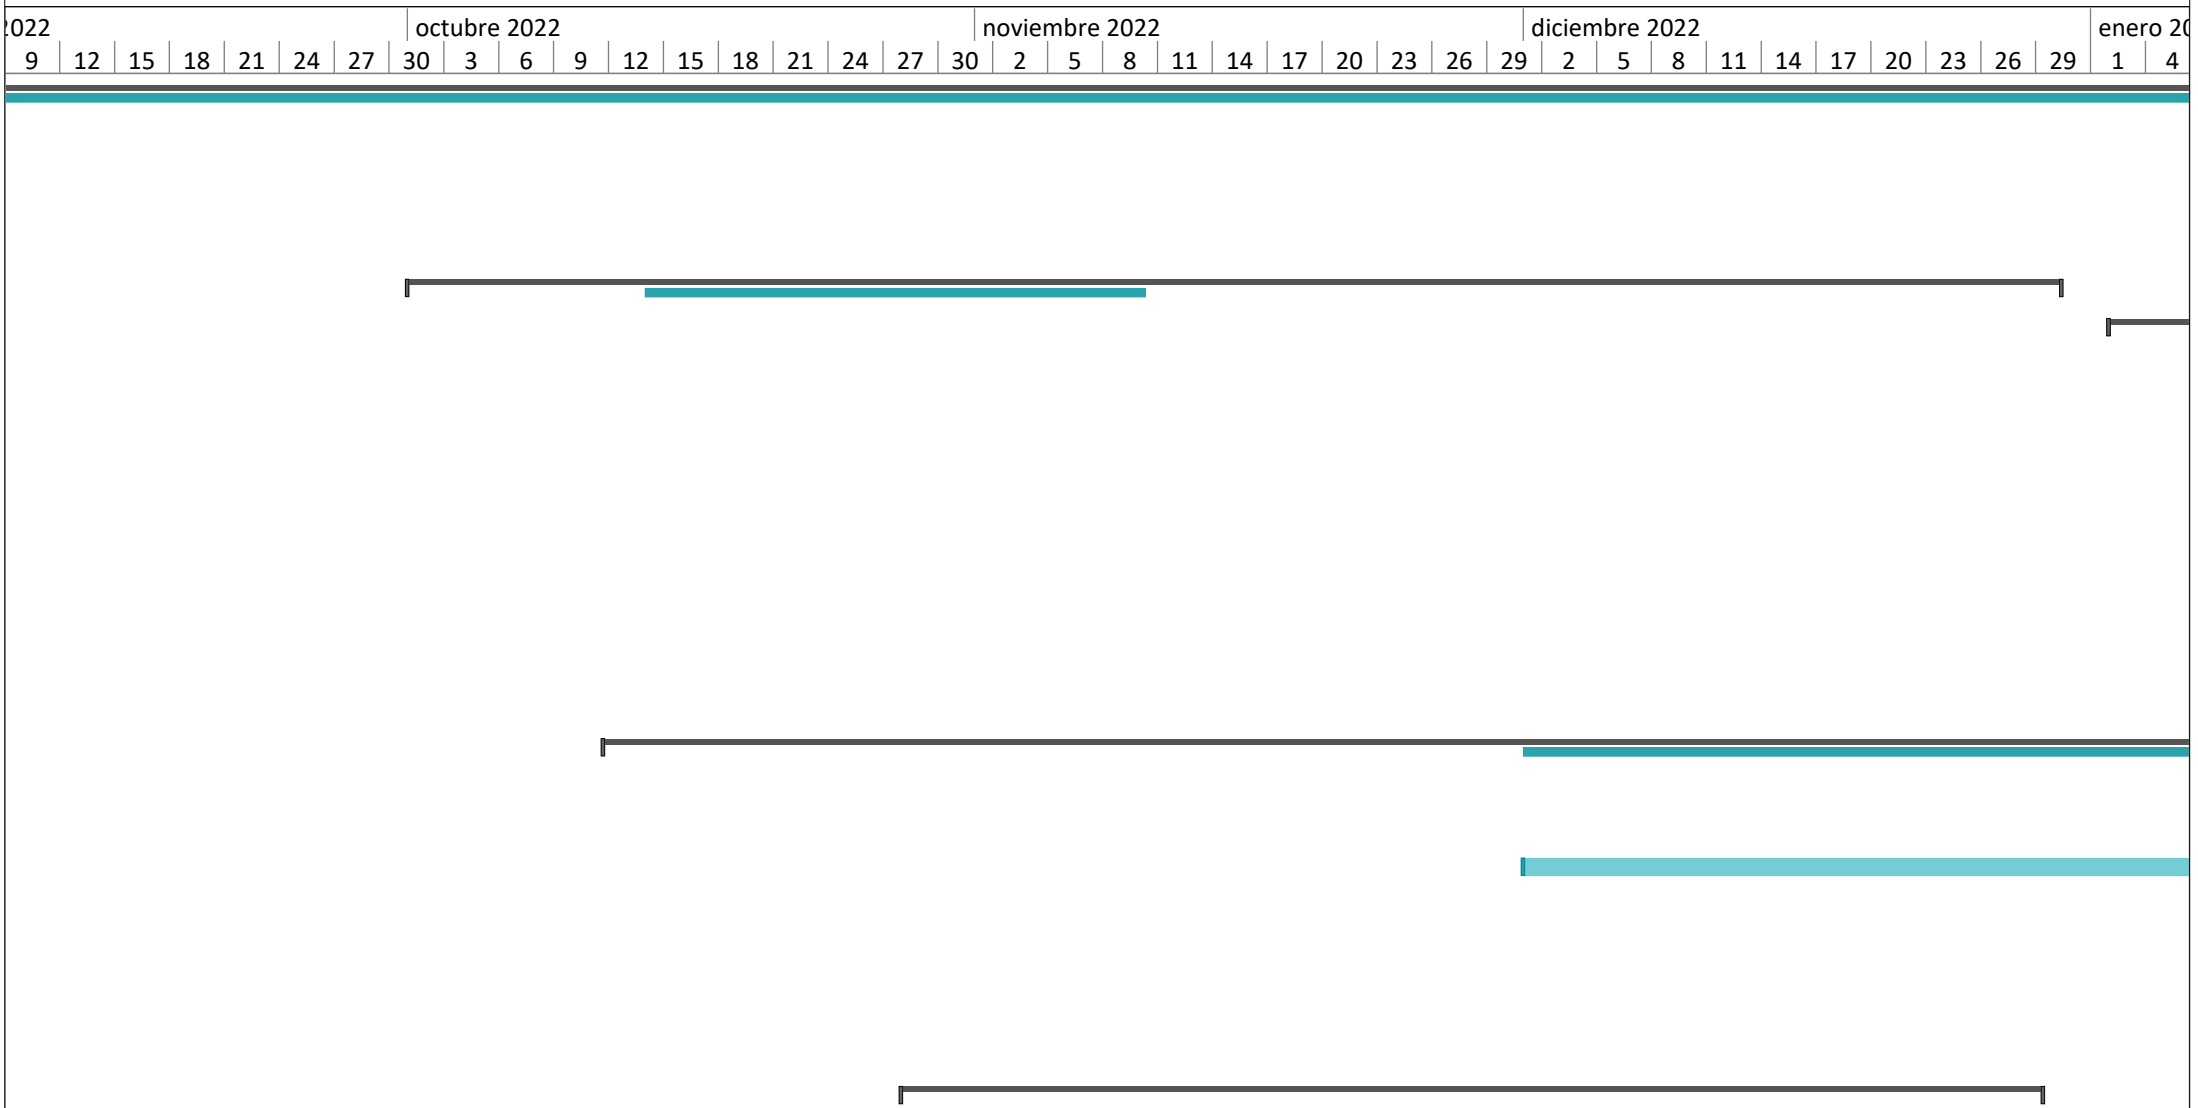

Elaboró:

MUNICIPIO DE SAN PELAYO


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

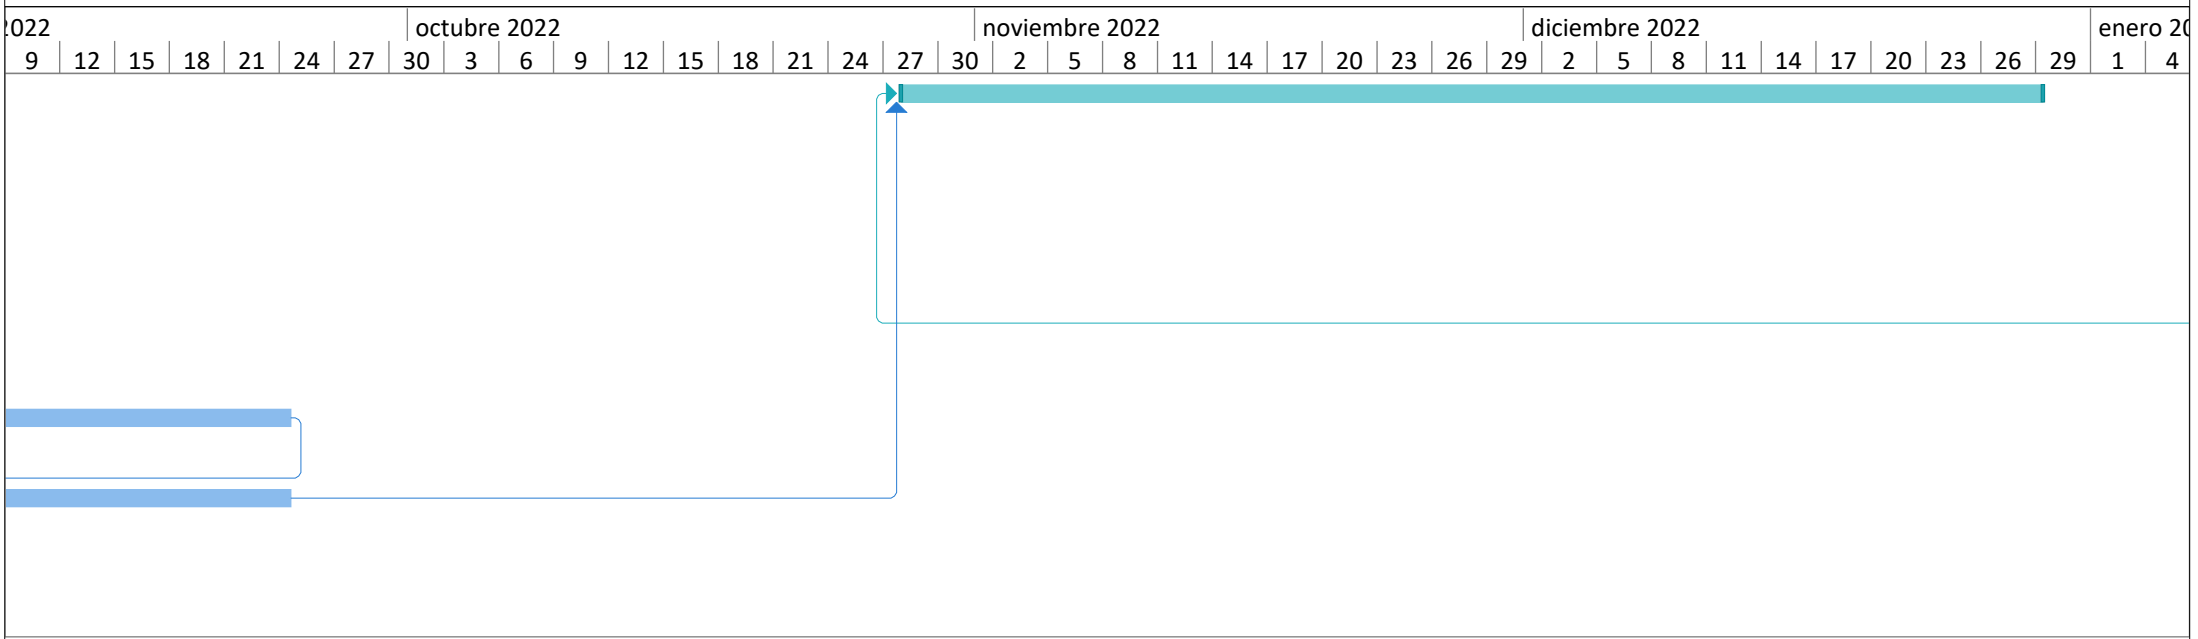

Elaboró:

MUNICIPIO DE SAN PELAYO


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

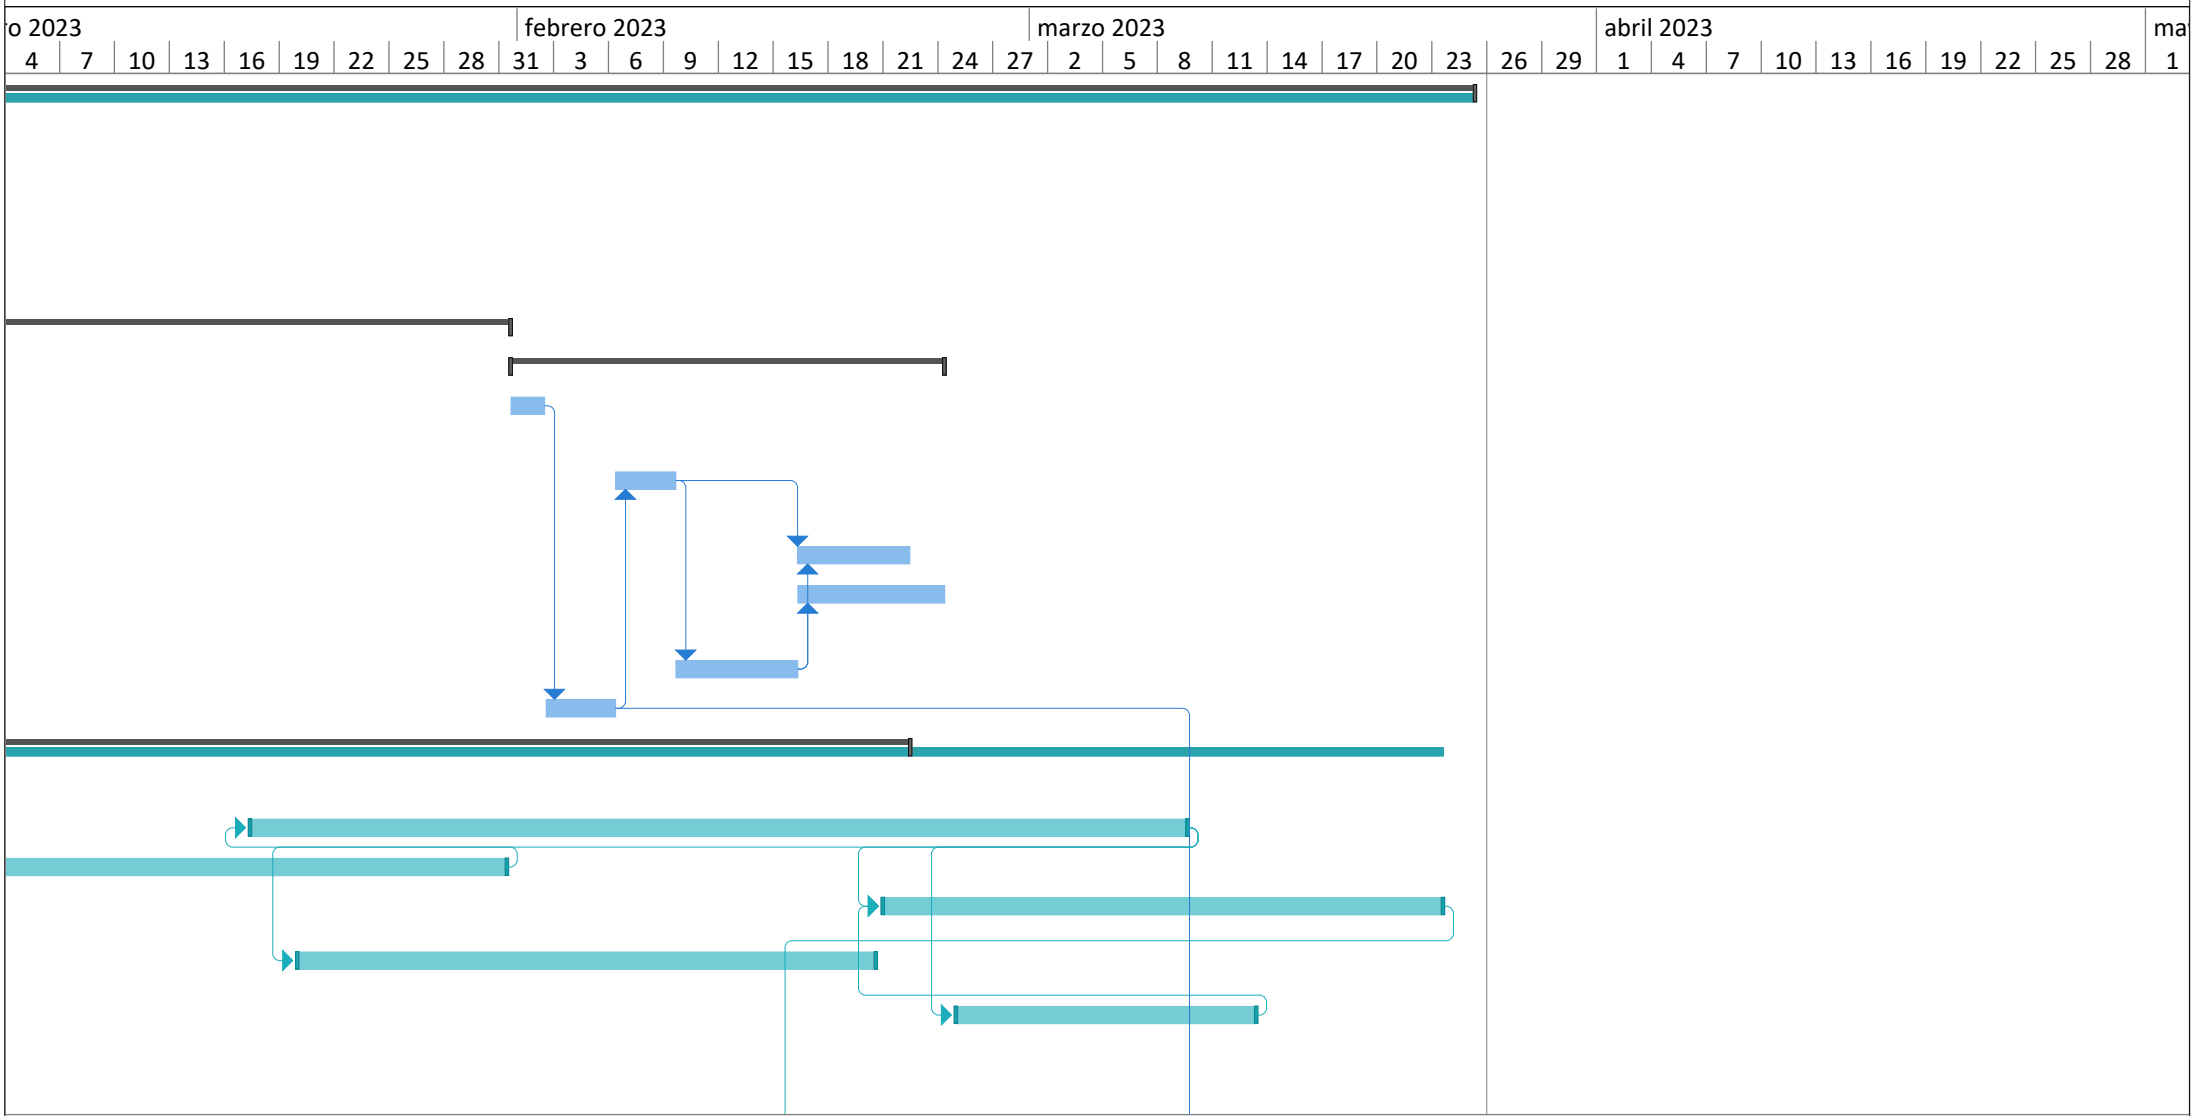

Elaboró:

MUNICIPIO DE SAN PELAYO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

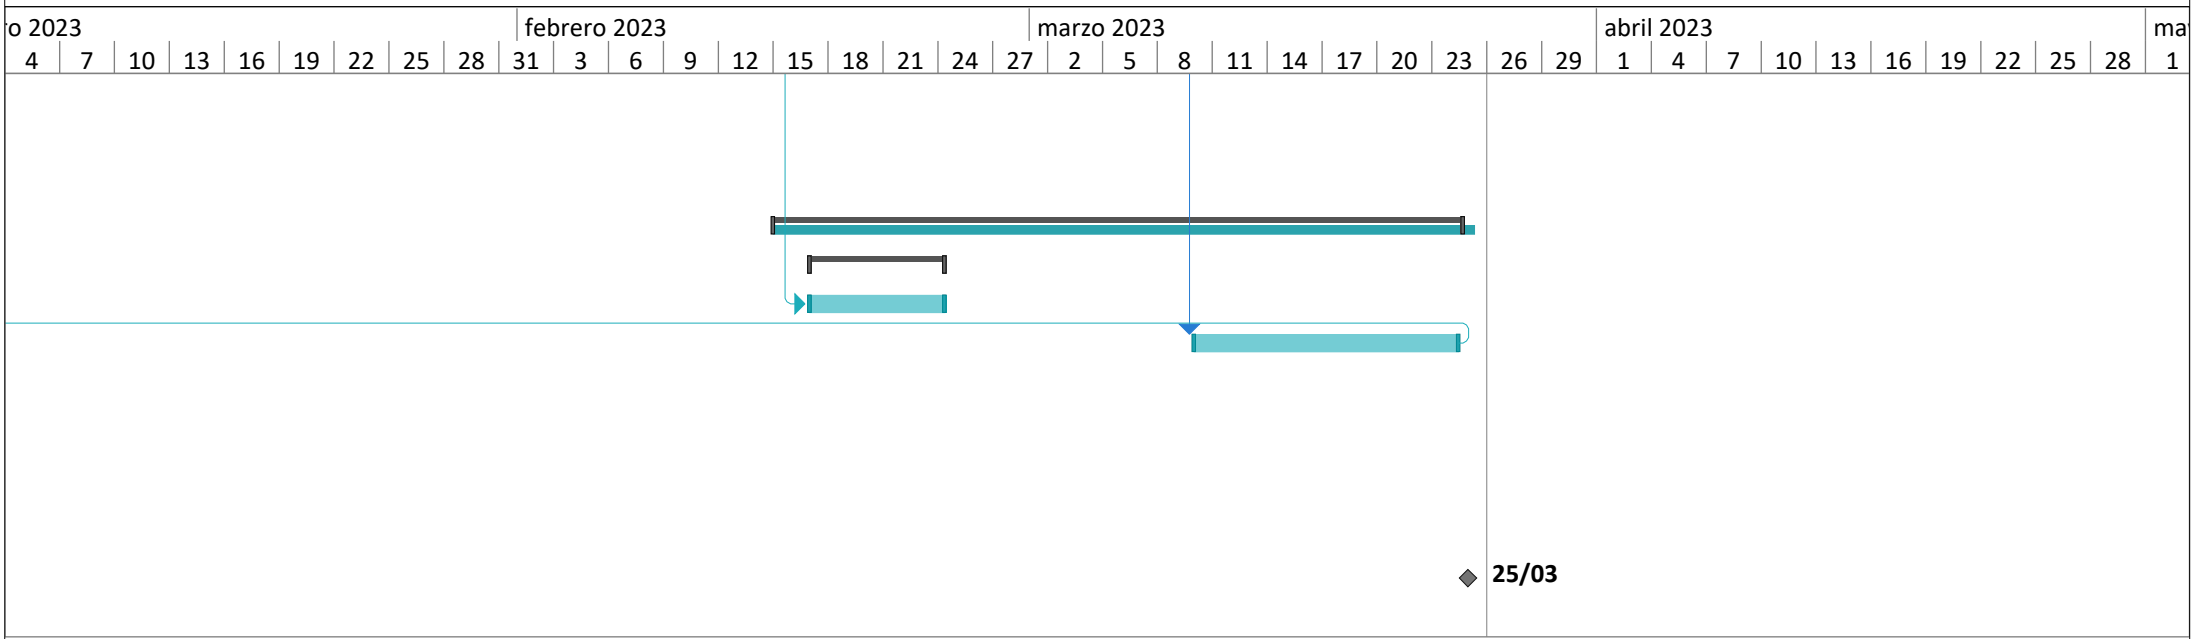

Elaboró:

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-003/2022


OBJETO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL:	7 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25/08/2022 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	25/03/2023 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 16.670.052.179,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 16.670.052.179,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 AGOSTO DE 2022	2 SEPTIEMBRE DE 2022	3 OCTUBRE DE 2022	4 NOVIEMBRE DE 2022	5 DICIEMBRE DE 2022	6 ENERO DE 2023	7 FEBRERO DE 2023	8 MARZO DE 2023		
GPP1 -EXPLANACIONES	$ 452.528,72	2,75%		% P	0,00%	0,00%	2,64%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P			$434.747,78	$17.780,94						
				$ E										
				% E										
GPP2-CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE (BOX COULVERT DE 1X1) - LONGITUD 7 METROS	$ 59.783,57	0,36%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%		
				$ P						$59.783,57				
				$ E										
				% E										
GPP3. CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE (BOX COULVERT DE 2X1) - LONGITUD 7 METROS	$ 106.773,65	0,65%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%		
				$ P							$106.773,65			
				$ E										
				% E										
GPP4 - CONSTRUCCIÓN DE 7100 METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO, ANCHO DE CALZADA 6,0m (PLACAS 3,0X3,5)	$ 14.822.611,43	90,02%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	11,19%	27,06%	46,50%		
				$ P					$884.350,55	$1.827.367,34	$4.453.242,81	$7.653.030,73		
				$ E										
				% E										
GPP5 - TRANSPORTE	$ 948.403,80	5,76%		% P	0,00%	0,00%	0,19%	2,88%	2,69%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P			$31.613,46	$474.201,00	$442.588,44					
				$ E										
				% E										
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 68.714,73	0,42%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,15%		
				$ P							$44.517,00	$24.197,73		
				$ E										
				% E										
GPP7 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 6.294,33	0,04%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%		
				$ P							$6.294,33			
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 16.465.190,23	100%	0%											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

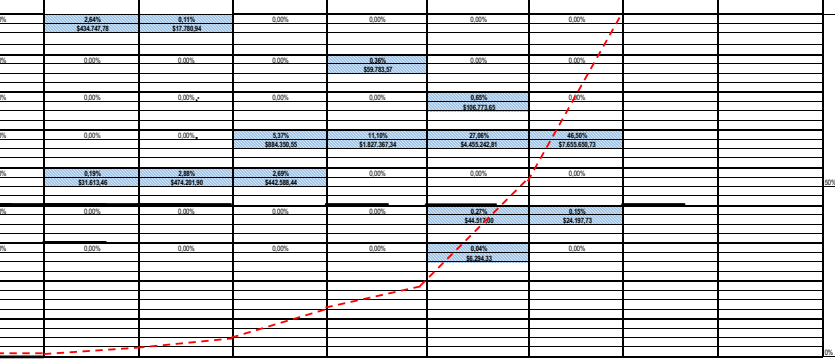

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	2,83%	2,99%	8,06%	11,46%	28,02%	46,64%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 466.361,24	$ 491.982,84	$ 1.326.938,99	$ 1.887.150,91	$ 4.612.827,79	$ 7.679.848,47	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	2,83%	5,82%	13,88%	25,34%	53,36%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 466.361,24	$ 958.344,08	$ 2.285.283,07	$ 4.172.433,98	$ 8.785.261,76	$ 16.465.110,23	
ÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 148.562.128,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 204.941.948,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.670.052.179,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:DANIEL DAVID DIAZ REDONDO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2220215391 3 COR

Aprueba Firma:
Nombre: FRANK [illegible]
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520215487 2 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-003-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16.670.052.179,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16.670.052.179,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/03/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 AGOSTO DE 2022	2 SEPTIEMBRE DE 2022	3 OCTUBRE DE 2022	4 NOVIEMBRE DE 2022	5 DICIEMBRE DE 2022	6 ENERO DE 2023	7 FEBRERO DE 2023	8 MARZO DE 2023
GPP1 -EXPLANACIONES	$452.529	2,75%	0,61%	% P	0,00%	0,00%	2,64%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			$99.846,98	$ P			$434.747,78	$17.780,94				
				$ E					$99.847			
				% E					0,61%			
E 3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE (BOX COULVERT DE 1)	$59.784	0,36%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%
			$0,00	$ P						$59.783,57		
				$ E								
				% E								
E 3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE (BOX COULVERT DE 2	$106.774	0,65%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%
			$0,00	$ P							$106.773,65	
				$ E								
				% E								
0 METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO, ANCHO DE C	$14.822.611	90,02%	2,64%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	11,10%	27,06%	46,50%
			$435.311,93	$ P					$894.159,55	$1.827.367,34	$4.455.242,81	$7.655.650,73
				$ E					$435.312			
				% E					2,64%			
GPP5 - TRANSPORTE	$948.404	5,76%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,19%	2,88%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%
			$0,00	$ P			$31.013,46	$474.291,90	$442.588,44			
				$ E								
				% E								
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$68.715	0,42%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,15%
			$0,00	$ P							$44.517,00	$24.197,73
				$ E								
				% E								
GPP7 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$6.294	0,04%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
			$0,00	$ P							$6.294,33	
				$ E								
				% E								
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$16.465.110	100%	3,25%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 535.158,91									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	2,83%	2,99%	8,06%	11,46%	28,02%	46,64%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$466.361,24	$491.982,84	$1.326.938,99	$1.887.150,91	$4.612.827,79	$7.679.848,47
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	2,83%	5,82%	13,88%	25,34%	53,36%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$466.361,24	$958.344,08	$2.285.283,07	$4.172.433,98	$8.785.261,76	$16.465.110,23
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$535.158,91			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$535.158,91			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual .
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	0%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	0%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	0%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00 / $ -	$ -	0%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00 / $ -	$ -	0%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	0%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 148.562.128,00 / $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 204.941.948,00	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.670.052.179,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 535.158.910,00**	**3,25%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:DANIEL DAVID DIAZ REDONDO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202153913 COR

Aprueba Firma:
Nombre: FERNANDO RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 26/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega documentación del Profesional SG-SST, fecha de compromiso 02/12/2022. Se cumplió.
Inicio de actividades en campo, fecha de compromiso 01/12/2022. Se cumplió.
Caracterización del material, fecha de compromiso 07/12/2022. Se cumplió.
Presentar actas de vecindad, fecha de compromiso 09/12/2022. Se cumplió. Se entregaron en magnético el día 13/12/2022.
Acta de socialización y conformación de veedurías, fecha de compromiso 02/12/2022. No se cumplió.
Establecer el punto de atención al usuario fecha de compromiso 02/12/2022. Se cumplió.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Actas de vecindad
2. Acta de conformación de veeduría ciudadana.
3. Personal en obra
4. Avance de ejecución de la obra
5. Sitio de disposición de materiales
6. Valla informativa
7. Plan de manejo de tránsito
8. Rendimientos financieros
9. Anticipo
10. Diseño del puente
11. Estudios y diseños

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Actas de vecindad: La interventoría solicita al contratista presentar acta de vecindad en físico, para firmarlas, el contratista se compromete a entregar las actas de vecindad en físico el día 30/12/2022.

2. Acta de conformación de veeduría ciudadana: La interventoría manifiesta que no ha recibido el acta de conformación de la veeduría, que los postulados como veedor declinaron su aspiración y por eso no se ha conformado la veeduría. El secretario de Planeación e infraestructura, manifiesta el día de la socialización se postularon 5 personas para la veedurías, tres de un corregimiento y dos del otro corregimiento que hacen parte de este corredor vial, y que al momento de llegar a la personería para obtener la personería jurídica, que es la representación de ellos, no se han puesto de acuerdo porque una parte de ellos manifiesta que quieren conformar una veeduría por cada corregimiento, y que existe una falta de voluntad de las personas que se postularon para conformar la veeduría; se considera hablar con la junta comunal para que ellos postulen a los veedores.

La interventoría manifiesta preocupación por no haber se conformado la veeduría y exponer la solicitud a la personera para conformar la veeduría. La interventoría se compromete para el día de mañana llegar a personería y solicitar la convocatoria para conformar la veeduría. La supervisora del INVIAS solicita agilizar el trámite de la conformación de la veeduría y establecer fecha de compromiso para realizar su debido seguimiento.

3. Personal en obra: La interventoría requiere en obra el personal del contrato de obra, del Ing. residente de obra, Ing. ambiental, profesional social y profesional SG-SST.

4. Avance de ejecución de la obra: Al corte de 22/12/2022 el avance de la programación está en 13.2% y el ejecutado es del 2.0% lo que corresponde a un atraso del 11.2%. Se había establecido que el contratista presentara una reprogramación muy bien sustentada, sin variar el plazo contractual. La interventoría solicita al contratista presentar un plan de contingencia y ejecutar de forma inmediata, abrir varios frentes de obra y trabajar simultáneamente.

Cabe recordar que el día 06/12/2022 la Interventoría mediante oficio No. CVRIMG-325-2022 radicó ante el municipio la recomendación de aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, recomendó al municipio se realice el proceso de apremio de multa por atraso de obra, realizar el debido proceso y citarlos a descargo.

El secretario de planeación e infraestructura manifiesta que pasara el caso a la oficina jurídica de municipio para abrir el proceso o citar en este caso al contratista.

5. Sitio de disposición de materiales: La interventoría solicita al contratista presentar el permiso firmado por el propietario para el uso del predio como sitio de disposición y/o acopio de materiales. El contratista manifiesta que ha realizado conversaciones con el dueño del predio, quien no se encuentra en la zona, una vez llegue se le solicitará acercarse a la alcaldía municipal para realizar firma de permiso del Sitio de disposición de materiales. Fecha de compromiso el 30/12/2022.

6. Valla informativa: Se está a la espera del pronunciamiento por parte de la oficina de comunicaciones del instituto INVIAS, una vez se tenga el arte definido se le hará llegar al contratista para instalar la valla.

7. Plan de manejo de tránsito: La interventoría manifiesta que el PMT no ha sido aprobado por el municipio. El secretario de planeación manifiesta que mañana revisará la información y se dará respuesta. Fecha de compromiso 30/12/2022.

8. Rendimientos financieros: Se solicita al municipio el traslado de los rendimientos financieros al tesoro nacional. El municipio se compromete realizar el trámite el 03/01/2023.

9. Anticipo: La interventoría manifiesta que se le dio visto bueno al giro del anticipo, y en esta semana se hará efectivo en la fiducia, y a los proveedores que soportaron ese giro.

10. Diseño del puente: La interventoría recuerda que está programado realizar unos apiques en el lugar donde se hará el puente K1+200, para realizar el estudio de suelo, esta actividad se realizará 05/01/2023.

11. Estudios y diseños: La interventoría solicita dar respuesta a las observaciones que se le hicieron a los estudios y diseños hidráulico, geométrico y estructural. Ya que se cuenta con una aprobación parcial, pero hay que tener unos estudios y diseños definitivos. El contratista manifiesta que dará respuesta el día 30/12/2022.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar actas de vecindad en físico	30/12/2022	Contratista
Acta de conformación de veeduría	03/01/2023	Contratista
Presencia del residente de obra, Ing. ambiental, profesional social y profesional SG-SST en la obra.	03/01/2023	Contratista
Presentar plan de contingencia y ejecutarlo	30/12/2022	Contratista
Abrir proceso de apremio de multa	05/01/2023	Secretario de Planeación e infraestructura
Presentar permiso firmado por propietario de predio para ser utilizado como sitio de disposición de materiales de excavación y demolición.	30/12/2022	Contratista
Aprobación del PMT	30/12/2022	Secretario de Planeación e infraestructura
Traslado de Rendimientos financieros al tesoro nacional	03/01/2023	Contratista
Realizar apiques para estudio de suelo en el K1+200, ubicación del puente.	05/01/2023	Contratista
Respuesta a observaciones de los estudios y diseños hidráulico, geométrico y estructural.	30/12/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 24/01/2023
(Dia / Mes / Año)





NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DANIEL DAVID DIAZ REDONDO	Representante Legal	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisora del contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
JOSE ALONSO ANDRADE RODRIGUEZ	Secretario de Planeación e Infraestructura	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	
OSCAR LUIS RAMIREZ SIMANCA	Director de obra	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	
YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS	Residente de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **ACTAS DE REUNIÓN**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Exponer el avance de la programación del proyecto del contrato de obra LP-003-2022, asimismo determinar los compromisos y hacer el debido seguimiento de estos.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra.
2. Seguridad social.
3. Señalización en obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	9/12/2022

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra. Al corte de hoy 09/12/2022 el avance de la programación está en 7,84% y el ejecutado en 0.239% lo que corresponde a un atraso de 7,60%, amparándose en el manual de interventoría el cual indica que la interventoría alertará al municipio cuando los contratos presentan un atraso de más del 5%. El día 06/12/2022 la Interventoría mediante oficio No. CVRIMG-325-2022 radicó ante el municipio la recomendación de aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra. El contratista se encuentra realizando la instalación de afrimado (Material para Mejoramiento), el contratista manifiesta que implementará el plan de contingecia para disminuir el atraso en la ejecución de las actividades en obra, y se estaran realizando jornadas de trabajo continuas de lunes a domingo.
-Se hace la observación que en obra no se cuenta con el corro-tanque, la interventoría solicita al contratista la implementación del carro-tanque de forma inmediata, dado que la actividad de la explaneación e instalación de afirmado, se debe realizar la humectación de la superficie de la sub rasante y el material de la capa de afirmado que se encuentran instalando, no se garantiza la aderencia de la capa de afirmado a la subrasante , ni la compactación ideal de la capa de afirmado dado que no cuenta con la humetación optima. La interventoría no recibira la actividad de afirmado si el material no cumple con la compactación.

2. Seguridad social. La interventoría solicita al contratista cumplir con las obligaciones contractuales, como lo indica el "PARÁGRAFO PRIMERO - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual". La interventoría solicita al contratista presentar la afiliación al sistema de seguridad social y parafiscales del personal (paleteros y obreros) que se encuentran en obra, de igual forma se solicita al contratista presentar el contrato entre el contratista y la empresa que suministra la maquinaria en obra para legalizar la afiliación de los operadores de la maquinaria.

También la interventoría solicita al contratista cumplir con la obligación contractual establecida en la "CLÁUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA inciso No. 13 . Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en la zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)". En el día de hoy se evidencia el suministro y la implementación de los elementos de protección del personal de obra.

3. Señalización en obra: La interventoría solicita al contratista mejorar la señalización en los tramos intervenidos. El contratista en el día de hoy instaló señalización en un frente de trabajo, y manifiesta que el día de mañana se instalará el resto de señalización que hace falta.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/12/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega aportes de afiliación y pagos al Sistema General	12/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Mejorar la señalización en obra.	10/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Implementación del plan de contingencia	10/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 16/12/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR LUIS RAMIREZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	
YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORI/	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ZULLY GUEVARA ARROYO	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Exponer el avance de la programación del proyecto del contrato de obra LP-003-2022, asimismo determinar los compromisos y hacer el debido seguimiento de estos.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra.
2. Equipos de trabajo.
3. Respuesta de revisión y/o actualización de diseños
4. Seguridad social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	15/12/2022

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra. Al corte de hoy 15/12/2022 el avance de la programación está en 9,22% y el ejecutado en 0.83% lo que corresponde a un atraso de 8,39%, amparándose en el manual de interventoría el cual indica que la interventoría alertará al municipio cuando los contratos presentan un atraso de más del 5%. El día 06/12/2022 la Interventoría mediante oficio No. CVRIMG-325-2022 radicó ante el municipio la recomendación de aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra. El contratista se encuentra realizando excavación en material común de la explanación en el K4+000 y la instalación de afirmado (Material para Mejoramiento) en el K0+700. En el acta de reunión anterior el contratista manifestó que ejecutaría un plan de contingencia a partir del día 10 de diciembre de 2022, hasta la fecha el contratista no ha cumplido su compromiso, se sigue presentando atrasos en la ejecución de las actividades en obra, no existe compromiso por parte del contratista para minimizar el atraso en la ejecución de las actividades.
El contratista manifiesta que implementará el plan de contingencia el día 20 de diciembre de 2022 abriendo otro frente de obra, para disminuir el atraso en la ejecución de las actividades en obra.

2. Equipo de trabajo. El contratista está incumpliendo con la CLÁUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 20 "cumplir con las especificaciones técnicas de INVIAS", La interventoría ha solicitado en reiteradas ocasiones la utilización del carro-tanque en la instalación de la capa de afirmado, solicitud que no ha sido acatada por el contratista, incumpliendo con las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS, dado que se debe humedecer la subrasante antes de instalar la siguiente capa, con el fin de que exista adherencia entre las mismas, está Interventoría no recibirá los trabajos realizados del ítem de afirmado, ya que no cumple con las especificaciones técnicas, ni con el equipo obligatorio de trabajo establecido en los anexos técnicos de contrato de obra y en el APU´s, por tal razón se abstendrá de autorizar pago por dicho trabajo y se solicita al contratista suspender la actividad de instalación de afirmado hasta que se cuente con el carro-tanque en obra. El contratista manifiesta que el día de mañana 16 de diciembre de 2022 está en obra el carro- tanque y se continuará realizando la instalación de capa de afirmado.

3. Respuesta de revisión y/o actualización de diseños. Esta Interventoría reitera solicitud al contratista de dar respuesta a las observaciones realizadas por los especialistas a los estudios y diseño:
-Estudio de trazado y diseño geométrico: De este tomo se encuentra pendiente dar respuesta a las observaciones realizadas mediante comunicado CVRIMG-359-2022 de 12 de diciembre de 2022.
-Estudio de Hidrología, hidráulico y socavación: De este tomo se encuentra pendiente dar respuesta a las observaciones realizadas mediante comunicado CVRIMG-230-2022 de 16 de noviembre de 2022.
- Estudio y diseño de estructura: De este tomo se encuentra pendiente dar respuesta a las observaciones realizadas mediante comunicado CVRIMG-306-2022 de 02 de diciembre de 2022.
-Presupuesto estudio y diseño del puente ubicado en el K1+210: Se encuentra pendiente dar respuesta a comunicado CVRIMG-223-2022 de 15 de noviembre de 2022.
El contratista manifiesta que se encuentra revisando y realizando los ajustes a las observaciones que realizó la interventoría. El día martes 20 de diciembre de 2022 se dará respuesta a dichas observaciones.

4. Seguridad social: El contratista presentó a la interventoría la afiliación de la ARL de los trabajadores (obreros y paleteros), se está a la espera de que presenten la afiliación al sistema de salud y pensión. El contratista presentará la información el día de mañana 16 de diciembre.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Implementación del plan de contingencia	20/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Implementación de carro tanque	16/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Respuestas a observaciones de los estudios y diseños	20/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Afiliación al sistema de salud y pensión de trabajadores (paleteros y obreros)	16/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
OSCAR LUIS RAMIREZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	
YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORI/	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ZULLY GUEVARA ARROYO	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO, NIT. 9016053089

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Exponer el avance de la programación del proyecto del contrato de obra LP-003-2022, asimismo determinar los compromisos y hacer el debido seguimiento de estos.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra.
2. Personal en obra
3. Respuesta de revisión y/o actualización de diseños
4. Seguridad social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	22/12/2022

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra. Al corte de hoy 22/12/2022 el avance de la programación está en 13.19% y el ejecutado en 1.88% lo que corresponde a un atraso de 11.31%, amparándose en el manual de interventoría el cual indica que la interventoría alertará al municipio cuando los contratos presentan un atraso de más del 5%. El día 06/12/2022 la Interventoría mediante oficio No. CVRIMG-325-2022 radicó ante el municipio la recomendación de aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra. El contratista se encuentra realizando la instalación de afirmado (Material para Mejoramiento).
El contratista no ha implementado el plan de contingencia, se labora diariamente, pero el rendimiento en la ejecución de las actividades en obra es bajo, no logra minimizar el atraso de la obra. Esta interventoría solicita al contratista ejecutar un plan de contingencia de manera inmediata, abrir más frentes de obra, aumentar los rendimientos en las actividades realizadas. El contratista manifiesta que implementará el plan de contingencia el día 27 de diciembre de 2022.

2. Personal en obra: La interventoría reitera solicitud al contratista de la presencia en obra del personal establecido en el anexo técnico del contrato de obra, el cual fue aprobado por la interventoría, se requiere la presencia del residente de obra, Ing. ambiental, trabajador social, profesional SG-SST. El Contratista manifiesta que el personal hará presencia en obra el día martes 27 de diciembre de 2022.

3. Respuesta de revisión y/o actualización de diseños. Esta Interventoría reitera solicitud al contratista de dar respuesta a las observaciones realizadas por los especialistas a los estudios y diseño:
-Estudio de trazado y diseño geométrico: De este tomo se encuentra pendiente dar respuesta a las observaciones realizadas mediante comunicado CVRIMG-359-2022 de 12 de diciembre de 2022.
-Estudio de Hidrología, hidráulico y socavación: De este tomo se encuentra pendiente dar respuesta a las observaciones realizadas mediante comunicado CVRIMG-230-2022 de 16 de noviembre de 2022.
- Estudio y diseño de estructura: De este tomo se encuentra pendiente dar respuesta a las observaciones realizadas mediante comunicado CVRIMG-306-2022 de 02 de diciembre de 2022.
-Presupuesto estudio y diseño del puente ubicado en el K1+210: Se encuentra pendiente dar respuesta a comunicado CVRIMG-223-2022 de 15 de noviembre de 2022.
El contratista manifiesta que se encuentra revisando y realizando los ajustes a las observaciones que realizó la interventoría.

4. Seguridad social: El contratista presentó a la interventoría la afiliación de la ARL de los trabajadores (obreros y paleteros), se está a la espera de que presenten la afiliación al sistema de salud y pensión. El contratista presentó planilla donde se encuentran afiliados al sistema de seguridad salud y pensión del personal de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Implementación del plan de contingencia	27/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Personal solicitado en obra	27/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO
Respuestas a observaciones de los estudios y diseños	27/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR LUIS RAMIREZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	
YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A fecha del 31 de diciembre de 2022, se tiene una inversión de obra programada del $ 2.341.662.892,33 correspondiente al 14,22% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $535.158.925,60 correspondiente al 3,25%; lo que representa un atraso del 10,97%

Estudios y diseños: a la fecha se encuentra aprobado el estudio geotécnico de la estructura vial y el diseño de pavimentos; y se continua con la revisión y/o actualización del diseño estructura de las obras de drenaje, el estudio hidráulico e hidrológico y el diseño geométrico.

Se le recomienda al contratista presentar y ejecutar un Plan de contingencia que permita minimizar el atraso de la ejecución de la obra, abrir varios frentes de obras y con diferentes actividades ejecutadas de manera simultaneas.

Esta interventoría recomendó al Municipio de San Pelayo, iniciar proceso de trámites de incumplimientos, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-003-2022 y en los pliegos de condiciones definitivos.

Se le recomienda al contratista atender los oficios enviados por interventoría donde se le requiere subsanar las observaciones a los estudios y diseños.

Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por interventoría mediante oficios, dado que estos no han obtenido la respuesta oportuna necesaria.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-306-2022	2/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Alcance oficio CVRIMG-232-2022	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-311-2022	3/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Aceptación caracterización materiales	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-317-2022	6/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Ausencia residente/director en la obra-Trabajadores sin EPP	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-321-2022	6/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Respuesta oficio OFI-CMPS-020	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-343-2022	10/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Contingencia fiestas decembrinas	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-344-2022	12/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Respuesta oficio OFI-CMSP-030	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-346-2022	12/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones diseño geométrico	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-359-2022	13/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud respuesta revisión/actualización estudios y diseños	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-361-2022	13/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observaciones proceso constructivo en obra	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-375-2022	16/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud personal obligatorio del contrato de obra	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-383-2022	16/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Reiteración aprobación PMT ante entidad correspondiente	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-392-2022	17/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Caracterización para verificación material de afirmado	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-410-2022	21/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud entrega documentación área SST	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-421-2022	22/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud personal obligatorio del contrato de obra	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo
CVRIMG-426-2022	23/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Aprobacion desembolso No 1	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

CVRIMG-438-2022	30/12/2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitudes planillas de pago seguridad social personal administrativo y operativo	Atn. Ing. Daniel Díaz Redondo

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	7/12/2022	OFI-CMSP-030-2022	7-dic.-22	Respuesta comunicada CVRIMG-325-2022 de fecha 06 de diciembre de 2022.
CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	12/12/2022	OFI-CMSP-031	12-dic.-22	punto de atención al usuario, ubicación y evidencia

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	**CONTRATO N°**	LP-003-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**				



Descripción: Capa de material de afirmado y señalización en obra.



Descripción: Extendido de material de afirmado.



Descripción: Humedecimiento del material de afirmado.



Descripción: Compactación de la capa de materal de afirmado.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Martes 29 de Noviembre del 2022
Actividades Realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los diseños
2. Gestión administrativa.
Clima. Nublado - Soleado tarde - Lluvia Noche - Nublado

Miercoles 30 de Noviembre del 2022
Actividades Realizadas.
1. Gestión administrativa
2. Revisión y/o ajustes a los diseños.
Clima - Nublado - Soleado tarde - Nublado Noche - nublado

Jueves 01 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas.
1. Gestión administrativa.
2. Explanación del Primer tramo crítico del proyecto.
Clima - Nublado - Soleado tarde - Soleado Noche - Despejado.

Viernes 02 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas.
1. Explanación en el Segundo tramo crítico del proyecto.
Clima: Nublado - Soleado tarde - Soleado Noche - Despejado.
Nota: Ausencia del Residente Carlos Peralta Gonzales y/o personal técnico

Powered by CamScanner

Sabado 03 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas.
1 Explanación, Nivel y corte del terreno
Clima: Mañana: Soleado tarde. Soleado Noche. Despejado.
Nota: Ausencia del Residente de obra y/o personal tecnico

Domingo 04 de Diciembre del 2022
Dia No laboral.
Clima: Mañana. Soleado tarde. Soleado. Noche. Despejado.

Lunes 05 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas.
1 Explanación. Nivel y Corte del terreno.
Clima. Mañana. Soleado. tarde. Soleado. Noche. Despejado.
Nota: Ausencia del Residente de obra y/o Personal tecnico.

Martes 06 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas
1 Explanación Nivel y Corte de terreno.
Nota: Se le informo al personal del Contratista. Sobre los riesgos del trabajo sin los elementos de protección Personal, ya que estos No cuentan con dichos elementos, incumpliendo asi la clausula Novena, Numerales 4to y decimo tercero del contrato de referencia. Se solicito el retiro inmediato de la obra de los trabajadores (Dairo David Diaz David, Miguel Cordero Hernandez, Wualberto Villa de Avila, Milciades Bolivar Diaz, Andres David Alean Ortiz).
Clima: Mañana. Soleado. tarde Soleado Noche. Despejado.

Miercoles 07 de Diciembre del 2022
Actividades realizadas
1. Explanación, Nivel y Corte de terreno
Clima: Mañana. Soleado - Tarde-Soleado - Noche - Despejado.

Yajaira Gómez C.

Jueves: 08 de Diciembre del 2022
Actividades realizadas
Dia No laboral - feriado
Clima: Mañana - Soleado. Tarde - Soleado. Noche - Despejado.

Yajaira Gómez C.

Viernes 09 de Diciembre del 2022
Actividades realizadas
- inicio de la instalación del afirmado
Personal en campo: 4 obreros. 2 ayudantes de topografia
1 ingeniero Director de obra.
Maquinaria - Motoniveladora, Vibrocompactador
Clima: Mañana: Soleado. Tarde-Soleado, Noche-Despejado.

Yajaira Gómez C.

Sabado 10 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas
instalación de afirmado
Personal en campo: 2 obreros. 2 paleteros, 2 ayudante de topogra
1 ingeniero Director de obra
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador
Clima: Mañana Soleado. Tarde-Soleado, Noche - Despejado.

Yajaira Gómez C.

Domingo 11 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas → Dia No laboral.
Clima: Mañana - Soleado, Tarde - Soleado, Noche - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Lunes 12 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas
Instalación de afirmado
Personal en campo: 2 obreros, 2 paleteros, 2 ayudantes topografia
1 ingeniero Director de obra
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador.
Clima. Mañana. Soleado - Tarde - Soleado - Noche - Despejado.
Nota: Se le hace la solicitud al contratista sobre el riego el material.
(tanque de agua).

Yajaira Gómez C.

Martes 13 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas
Instalacion de afirmado
Explanación, nivel y Corte de terreno.
Personal en campo: 2 obreros, 2 paleteros, 2 ayudantes de Topografia
1 ingeniero Director de obra
Maquinaria en obra: Motoniveladora. Vibrocompactador
Clima. Mañana - Soleado - Tarde Soleado - Noche - Soleado.
Nota: Se le hace la solicitud al contratista del camotanque para el riego del material.

Yajaira Gómez C.

Miercoles 14 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas.
-Instalacion de afirmado
Personal en campo: 2 obreros. 2 Paletero, 2 ayudante de topografia
1 ingeniero. director de obra
Maquinaria en obra: Motoniveladora. Vibrocompactador
Clima: Mañana - Nublado - Tarde - Soleado Noche - Despejado
Nota: Se le hace la solicitud al contratista del camotanque para el riego del material.

Powered by CamScanner

Yajaira Gómez C.

Jueves 15 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas
explanacion, corte y nivelacion del terreno
Personal en campo: 2 obreros, 2 paleteros, 2 cadenero de topografia
1 ingeniero director de obra
Maquinaria en obra: Motoniveladora, vibrocompactador
Clima: Mañana, Nublado - Tarde, Soleado - Noche, Despejado.
Nota, interventoria suspende las labores de instalacion de afirmado ya que el contratista no a cumplido con el suministro del carrotanque, para el respectivo riego e instalacion del afirmado.

Yajaira Gómez C

Viernes 16 de Diciembre del 2022
Actividad Realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo. 2 obreros, 2 paleteros, topógrafo
cadenero, 1 Ing. director de obra.
Maquinaria en obra: Motoniveladora, vibrocompactador
carro - tanque de agua, volquetas
clima: Mañana - Nublado, Tarde - Soleado, Noche - Despejado

Yajaira Gómez C.

Sábado 17 de Diciembre del 2022
Actividad realizada
Instalación de afirmado
explanacion corte y nivelacion del terreno
Personal en campo: Ing. Director de obra, 2 paleteros,
2 obreros, Auxiliar SISO, topógrafo
cadenero, 2 operadores de maquinaria
conductores de volquetas
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Volquetas, vibrocom

pactador,
Clima: Mañana - soleado, tarde - Soleado, Noche - despejado
Nota: En el día de hoy no se encuentra en campo el carro - tanque del agua. La interventoría solicitó al contratista suspender la actividad de instalación de afirmado por no implementar el carro - tanque de agua la Interventoría no recibirá la capa de afirmado si no cumple con la compactación óptima y las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS, Artículo 311.

Yajaira Gómez C.

Domingo 18 de Diciembre del 2022
Actividades Realizadas: Día no laborado
Clima: Mañana - Soleado, Tarde - Soleado, Noche - despejado

Yajaira Gómez C.

Lunes 19 de Diciembre del 2022
Actividad Realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director de obra, topógrafo, cadenero, 2 operadores de maquinaria, 2 paleteros, 2 obreros, Auxiliar SISO, conductores de volquetas y carro-tanque.
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador carro - tanque de agua, volquetas
Equipos de topografía y herramientas menores
Clima: Mañana - Soleada, tarde: se presentaron lluvias desde las 3:00 p.m hasta las 3:30 p.m. Noche - despejada
Nota: La interventoría solicita al contratista la

presencia del residente de obra, trabajadora social Ing ambiental y Profesional SG-SST.

Yajaira Gomez C.

Martes 20 de Diciembre de 2022
Actividad realizada:
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director de obra, topógrafo, cadenero 2 paleteros, 2 obreros, Auxilar SISO, 2 operadores, conductores.
Maquinaria en Obra: Motoniveladora, vibrocompactador, carro-tanque de agua, volquetas
Equipos de topografía y herramientas menores.
Clima: Mañana - nublada tarde - soleada Noche - despej

Yajaira Gomez C.

Miercoles 21 de Diciembre de 2022
Actividad realizada.
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director de obra, topógrafo, cadenero, 2 paleteros, conductores 2 operadores
Maquinaria y/o equipos en obra: Motoniveladora, vibrocompactador, carro-tanque de agua, volquetas, equipos de topografía y herramientas menores.
Clima: Mañana - soleada, tarde - soleada Noche - seca.

Yajaira Gomez C.

Jueves 22 de Diciembre de 2022
Actividad realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director de obra, topógrafo, cadenero 2 paleteros, conductores, 2 operadores.
Maquinaria y/o equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, carro - tanque de agua, volquetas, equipos de topografía y herramientas menores.
clima: Mañana - soleada tarde - soleada Noche - seca

Yajaira Gómez C.

Viernes 23 de Diciembre de 2022
Actividad realizada
Explanación, nivelación y corte del terreno.
Personal en campo: Director, topógrafo, cadenero, 2 paleteros 2 obreros, 2 operadores.
Maquinaria y equipos en obra: Motoniveladora, vibrocompactador, equipos de topografía y herramientas menores.
Clima: Mañana - soleada tarde - soleada Noche - despejada

Yajaira Gómez C.

Sábado 24 de Diciembre de 2022
Día no laborado por festividades de navidad.
Clima: Seco

Yajaira Gómez C.

Domingo 25 de Diciembre de 2022
Día no laborado por festividades de navidad.
Clima: Seco.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

Lunes 26 de Diciembre de 2022
- No se realizaron actividades en obra, no hubo suministro de material de afirmado.
- Se realizó comité de obra, en el que participaron: Supervisor del INVIAS, Supervisor de Alcaldía, Interventoría y contratista.
- Se establecieron compromisos por parte del contratista y del supervisor de Alcaldía.

Clima: Mañana - Soleada tarde - Soleada Noche - despejada

Yajaira Gómez C.

Martes 27 de Diciembre de 2022
Actividad realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director, topógrafo, cadenero, 2 paleteros conductores, 2 operadores.
Maquinaria y/o equipos en obra: Motoniveladora, vibrocompactador, carro-tanque, volquetas, equipos de topografía y herramientas menores.
Clima: Mañana - Soleada tarde: se presentaron lluvias desde las 3:30 p.m hasta las 4:00 p.m.
Noche - despejada.

Yajaira Gómez C.

Miércoles 28 de Diciembre de 2022
Actividad realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director, topógrafo, cadenero, 2 paleteros, conductores, 2 operadores.
Maquinaria y/o equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, volquetas, carro-tanque, equipos de topografía y herramientas menores.

Powered by CamScanner

clima: Mañana - Soleada tarde: Soleada Noche = despejada

Yajaira Gómez C.

Jueves 29 de Diciembre de 2022
Actividad realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director, topógrafo, cadenero, 2 paleteros, conductores, 2 operadores.
Maquinaria y/o equipos en obra: Motoniveladora, vibrocompactador, volquetas, carro-tanque del agua, equipos de topografía, herramientas menores.
Clima: Mañana - soleada Tarde - Soleada Noche: despejada

Yajaira Gómez C.

Viernes 30 de Diciembre de 2022
Actividad realizada
Instalación de afirmado
Personal en campo: Director, topógrafo, Cadenero, 2 paleteros conductores, 2 operadores.
Maquinaria y/o equipos en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador, carro-tanque, volquetas, equipos de topografía y herramientas menores.
Clima: Mañana - Soleada Tarde - Soleada Noche - despejada

Yajaira Gómez C.

Sábado 31 de Diciembre de 2022
Día no laborado por festividades de fin de año
Clima: Mañana: Soleada tarde: soleada Noche - despejada.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-008-2022 **Contratista:** CONSORCIO CRISTO REY

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

INFORME MENSUAL No. UNO (1) **MES O PERIODO:** DICIEMBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	871
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	873
1	**INTRODUCCION**		875
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		876
2.1	Localización		876
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		878
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		878
2.4	Características técnicas del proyecto		879
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		881
3.1	Información general del contrato		881
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		881
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		882
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		882
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		883
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	884
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	891
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	893
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	895
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	898
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	904
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	906
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	922
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		924
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		926
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	928
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	930
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	932
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	935
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		950
5.1	Información general del contrato		950
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		951
5.3	Informes especialistas y profesionales		955
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1044
5.5	Informe matriz de riesgos.		1045
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1047
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		1049
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1051
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1054
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1060
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1062
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1073
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1075
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1077
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1079
7	**Conclusiones y recomendaciones**		936
8	**Anexos**		937
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		938
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		940
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		941
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		943

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** dic-22

CONTRATO DE OBRA No.: LP-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 13/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/05/2023
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.170.496.742,96
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.170.496.742,96
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	2125
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes	Und	1
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.101.202.141,31	$ -	$ 4.101.202.141,31
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 33.316.757,69	$ 6.330.183,96	$ 39.646.941,65
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24.914.000,00	$ 4.733.660,00	$ 29.647.660,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.159.432.899,00	$ 11.063.843,96	$ 4.170.496.742,96

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestra para ensayo de CBR (27/12/2022)



Actas de vencidad (29/12/2022)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, mediante convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello que mediante el **Proceso LP-008-2022 del municipio de San Pelayo** se celebra el Contrato de Obra No. LP-003-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.", El cual fue adjudicado al CONSORCIO CRISTO REY, cuyo plazo inicial es de cinco (5) meses a partir del 13 de diciembre de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 4.170.496.742,96.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 13 al 31 de Diciembre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

se realiza el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sabana Nueva en el Municipio de San Pelayo.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Pelayo.

El municipio de San Pelayo se encuentra ubicado en la parte norte del Sinú Medio en el departamento de Córdoba, entre los meridianos 8°58' de latitud Norte y 75°51'de longitud Oeste de Greenwich. Limita geográficamente por el norte con el municipio de Santa Cruz de Lorica, cuya extensión limítrofe es de 55 km, y con el municipio de Cotorra en 24,5 km; al oriente con los municipios de Chimá y Ciénaga de Oro, con linderos compartidos de 15 km para el primero y 7,25 km de longitud para el segundo; por el sur con los municipios de Cereté y Montería, límites definidos en 53,5 km de longitud para el primero y 9,25 km para el segundo; y por el occidente con el municipio de Puerto Escondido, cuyo límite presenta una longitud de 16,5 km .

El territorio municipal posee un área de 45.112 ha. Extensión área urbana: el perímetro urbano tiene un área de 352 ha, representa el 0.8 % del territorio municipal, de los cuales el 25% está construida, el 5% está dedicado a vías de comunicación y el 70% restante es área libre.

Extensión área rural: la zona rural representa el 99.2%, con un área de 447,6 km² del territorio municipal.



Ilustración 3. Vía Sabana Nueva - Municipio de San Pelayo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

El contratista aún no ha definido la cantera que utilizará para el proyecto de obra, aún se encuentra en la etapa 1 Revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Sin embargo, la fuente más cercana en donde se ubican las canteras es en el Municipio de Ciénega de Oro, Córdoba las cuales cuentan con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 4. Esquema de ubicación de la fuente de materiales.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de San Pelayo, gracias a la ejecución del contrato No. LP-008-2022, se beneficia principalmente la zona rural conformada por el corregimiento de Sabana Nueva.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 2.125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho; ya que inicialmente la vía presenta dificultad en la movilidad, debido a su mal estado, el cual se ocasiona por el alto deterioro de la superficie de rodadura, el drenaje superficial que es deficiente y está construido sin consideraciones técnicas algunas.

	
Estado inicial de la Vía, 30/08/2022	Estado inicial de la vía, 16/12/2022

	
Estado inicial de la Vía, 30/08/2022	Estado inicial de la vía, 16/12/2022

Ilustración 5. Estado inicial de la vía. Cto. LP-008-2022

A la fecha aun no se inicia con las actividades en obra; el acta de inicio fue firmada el 13 de diciembre de 2022, por lo tanto, se encuentra en la etapa 1 de Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (placa huella, pavimento y estructuras de drenaje).

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto, inicialmente propone el mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo Box Coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.

Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado. Cabe aclarar que el proyecto tiene una etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños; al concluir con dicha etapa, el alcance del proyecto está sujeto a variaciones.

Contrato LP-008-2022	
Sistema	Placa huella
Longitud	2.125 metros
Ancho Calzada	6.80 metros

A continuación, se presenta la estructura general de la placa huella



Ilustración 6. Sección típica de placa huella.

A continuación, se presenta la estructura de un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado el cual se encuentra en revisión.

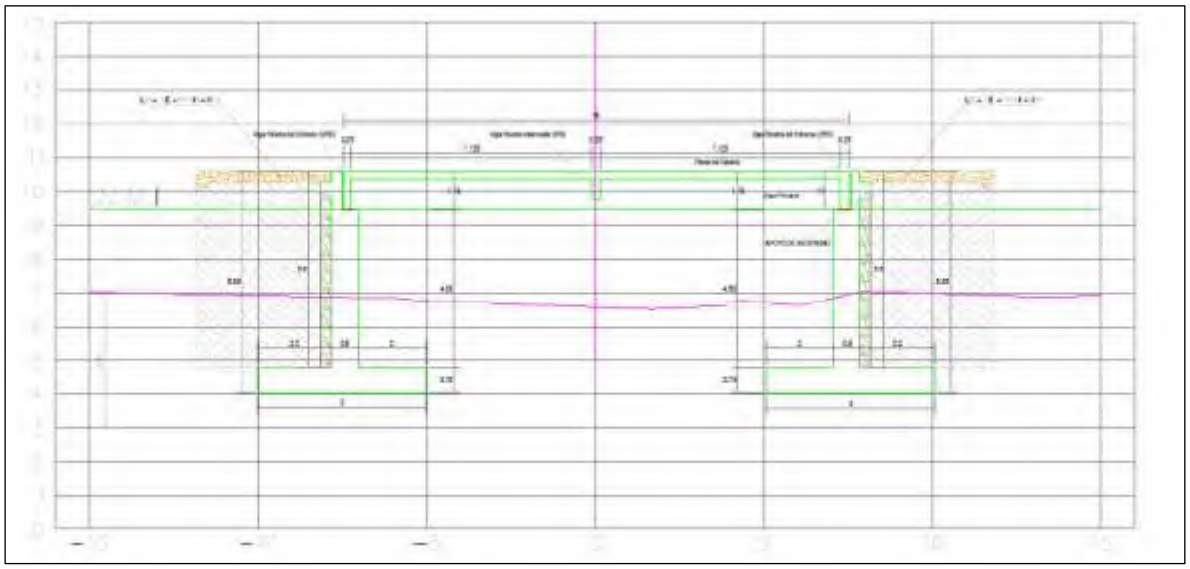


Ilustración 7. Esquema general del puente a construir.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-008-2022
CONTRATO No.	LP-008-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/10/2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
CONTRATISTA	CONSORCIO CRISTO REY
NIT	NIT. 901.642.986-1
INTEGRANTES	• CONSORCIO CRISTO REY • Participación: 100%
DIRECCIÓN	Calle 14 N°6-74 OF.101 Chinú, Córdoba
TELEFONO	3014540438
CORREO	ingerqcol@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.170.496.742,96
PLAZO INICIAL	5 MESES
FECHA INICIO	13/12/2022
FECHA TERMINACIÓN	13/05/2023

Tabla 1. Información Cto. LP-008-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continúa con la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
ii. Se realizó visita técnica de reconocimiento de la vía el día 13/12/2022, asistieron: supervisor del INVIAS, supervisor del municipio, contratista interventoría y alcalde.
iii. Se realizaron apiques en la vía, para tomar muestra para ensayo de CBR.
iv. Se realizaron ensayos de penetración estándar (SPT) en donde se construirá el puente.
v. Se realizaron actas de vecindad a las viviendas que se encuentran en la zona de influencia directa del proyecto de obra.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista no ha presentado el Plan de manejo Ambiental.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o o ajustes a los estudios y diseños, una vez se aprueben los estudios y diseños se procederá a realizar un balance del presupuesto del contrato y seguidamente se socializará el proyecto con la comunidad.
.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos para ninguno de los contratos de obra a cargo de esta interventoría.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A fecha del 31 de diciembre de 2022, el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o o ajustes a los estudios y diseños, se tiene una inversión de obra programada 0,00% y una inversión de obra ejecutada acumulada del 0,00%.

El contratista presentó la información inicial del proyecto de obra: hoja de vida, programa de reintegración y reincorporación, información de los equipos de trabajo, APU´s, programación de obra, programa de inversiones, flujo de caja, generación de empleo, documentos de calibración de los equipos de laboratorio, plan de calidad, Plan de manejo de tránsito y protocolo de bioseguridad.

Esta información fue revisada por la interventoría, y se realizaron unas observaciones mediante oficio CVRIMG-422-2022 de fecha 22 de diciembre de 2022, las cuales se está a la espera de que el contratista las subsane.

Se realizaron toma de muestra para realizar ensayos de CBR y ensayos de penetración estándar (SPT) en donde se construirá el puente.

El contratista en compañía con la interventoría realizó actas de vecindad de las viviendas que se encuentran en la zona de influencia del proyecto de obra.

La interventoría mediante oficio CVRIMG-425-2022 de fecha 22 de diciembre de 2022, le solicita al contratista presentar la revisión y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 1 del 13/11/2022 al 15/11/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.
Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.
Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1
INTEGRANTES: 1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%
CONTRATO No. I.P-008-2022 VALOR INICIAL: $ 4.170.496.742,96
FECHA DE INICIO: 13/12/2022 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13/05/2023 VALOR ACUMULADO: $ 4.170.496.742,96
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/05/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No. 971 de 2022 **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO: 22/08/2022 **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 4.170.600.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 4.170.496.742,96
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - #¡DIV/0!
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.564.284.660,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % #¡DIV/0!
Avance o Atraso Físico % #¡DIV/0!

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023
Estudios y diseños	%	100	100	
Explanación	m	2125	2125	
Afirmado	m	2125	2125	
Subbase Granular	m	2125	2125	
Placa huella en concreto	m	2125	2125	
Box Coulvert 1.5mX1m	Und	1	1	
Puentes	Und	1	1	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A
EMISIONES:	SI	NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERV ACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se hace visita técnica al corredor vial corregimiento Sabana Nueva, Municipio San Pelayo, con la presencia de supervisor del INVIAS, Alcalde, Secretario de Planeación e Infraestructura, Interventoría y representante legal del contratista.
2. Se firmó Acta de inicio del contrato de obra LP-008-2022 el día 13 de Diciembre de 2022.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. El Contratista realizará la entrega de documentación inicial para la respectiva revisión y posterior aprobación por parte de la Interventoría.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

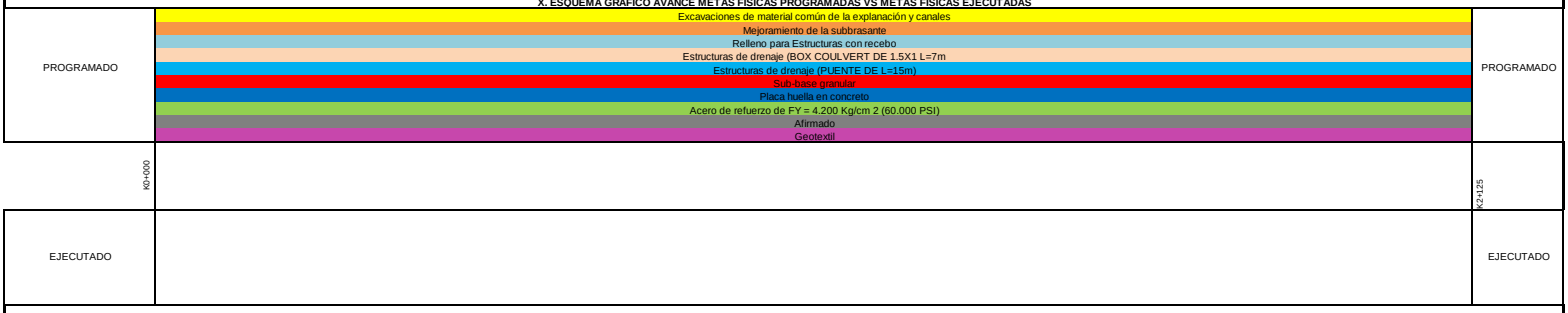



Actualmente se encuentra en la etapa de presentación de información contractual por parte del contratista, revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita técnica de la vía



Verificación de ancho de placa huella existente



Visita técnica de la vía



Visita técnica de la vía, ubicación del puente de 15 m



Visita técnica de la vía, ubicación del puente de 15 m

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 2 del 16/11/2022 al 22/11/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.
Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.
Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1
1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%
INTEGRANTES:
CONTRATO No. I.P-008-2022 VALOR INICIAL: $ 4.170.496.742,96
FECHA DE INICIO: 13/12/2022 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13/05/2023 VALOR ACUMULADO: $ 4.170.496.742,96
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/05/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

INTEGRANTES:
CONTRATO No. 971 de 2022 **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO: 22/08/2022 **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 4.170.600.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 4.170.496.742,96
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - #¡DIV/0!
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.564.284.660,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % #¡DIV/0!
Meta Física Ejecutada % #¡DIV/0!

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Placa huella en concreto	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1.5mX1m	Und	1	1		Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1	1		Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERV ACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. El contratista emite respuesta a oficio CVRIMG-330-2022, en la cual se anexa la siguiente información:
- Hoja de vida del personal profesional.
-Programa de reintegración y reincorporación (si aplica).
-Relación de equipo mínimo obligatorio.
-Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio magnético).
-Programa de obra (en físico y magnético)
- Programa de inversiones (en medio físico y magnético).
-Flujo de caja.
-Programa de generación de empleo.
- Instalaciones provisionales.
-Laboratorio toma de control de calidad.
-Plan de calidad (en medio físico y magnético).
- Plan de manejo de transito-PMT (en físico y en magnético).
-Protocolo de bioseguridad.


La interventoría realizo la revisión de los documentos y emitió oficio con las observaciones correspondientes

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. El Contratista realizará la entrega de documentación inicial para la respectiva revisión y posterior aprobación por parte de la Interventoría.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

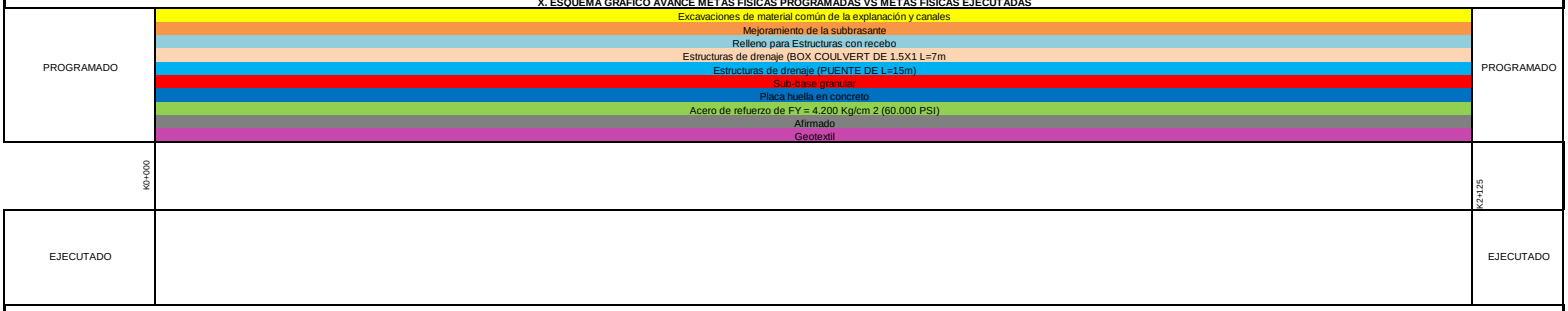

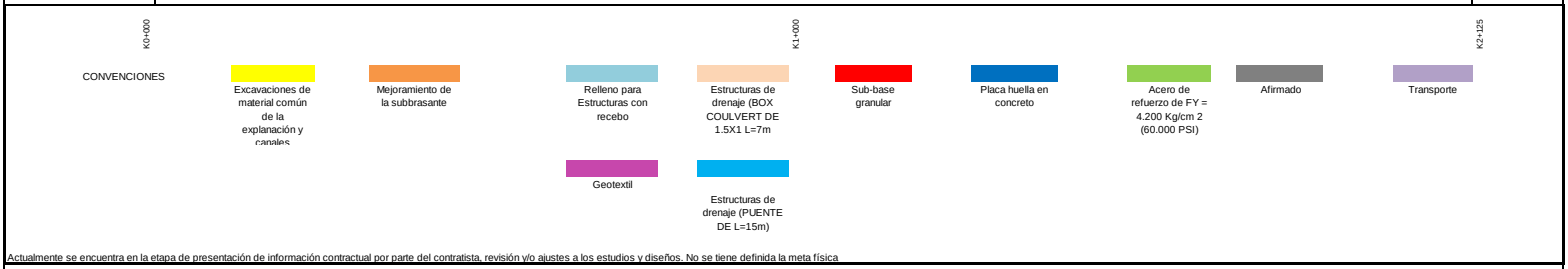

Actualmente se encuentra en la etapa de presentación de información contractual por parte del contratista, revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado inicial de la vía, K0+000.



Estado inicial de la vía, K0+100.



Estado inicial de la vía, K0+200.



Estado inicial de la vía, K0+300.



Estado inicial de la vía, K0+400.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 3 del 23/12/2022 al 29/12/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.
Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box coulvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros.
Se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1
1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%
INTEGRANTES:
CONTRATO No. I.P-008-2022 VALOR INICIAL: $ 4.170.496.742,96
FECHA DE INICIO: 13/12/2022 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13/05/2023 VALOR ACUMULADO: $ 4.170.496.742,96
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/05/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

INTEGRANTES:
CONTRATO No. 971 de 2022 **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO: 22/08/2022 **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 4.170.600.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 4.170.496.742,96
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.564.284.660,00 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 272.511.928,00 5,97%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 29.743.764,40 0,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 29.743.764,40 0,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: nov-22
VALOR FACTURA: $ 115.561.614,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Placa huella en concreto	m	2125	2125		Prog					
					Ejec					
Box Coulvert 1.5mX1m	Und	1	1		Prog					
					Ejec					
Puentes	Und	1	1		Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A
EMISIONES:	SI		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERV ACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se realizaron apiques en la vía para realizar ensayo de CBR en la subrasante.
2. Se realizaron actas de vecindad.
3. Se realizaron ensayos de penetración estándar (SPT) en donde se construirá el puente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. El Contratista realizará la entrega de documentación inicial para la respectiva revisión y posterior aprobación por parte de la Interventoría.
2. Se continúa realizando actas de vecindad.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

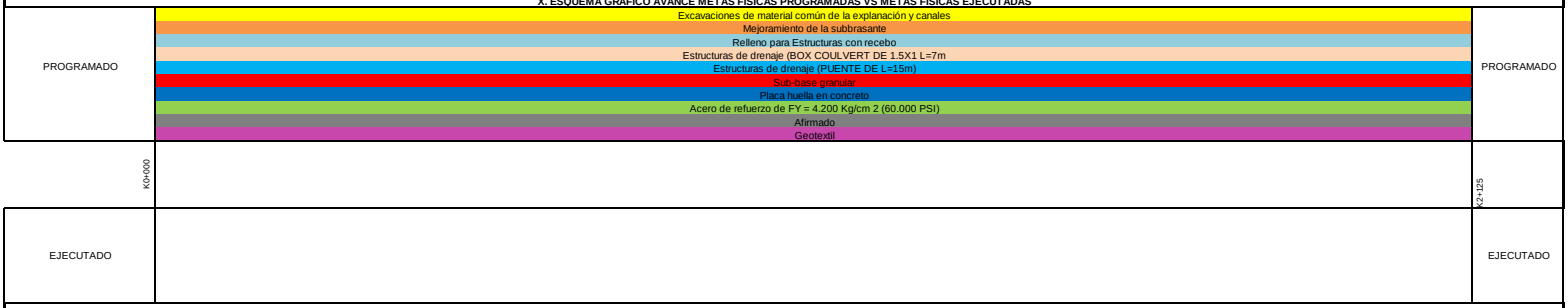



Actualmente se encuentra en la etapa de presentación de información contractual por parte del contratista, revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. No se tiene definida la meta física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestra para ensayo de CBR



Muestra de material para ensayo de CBR



Acta de vecindad



Ensayo de penetración estándar (SPT)



Muestra de material de ensayo de penetración estándar (SPT)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: diciembre-2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO No. LP-008-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022

INTERVENTORÍA: ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El formato no se encuentra diligenciado dado que el contratista no iniciado la ejecución de actividades en obra, ya que aún se está en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños; por consiguiente, la maquinaria no ha sido trasladada a campo.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-170303

Firma
Nombre: YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202228500COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/01/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

A la fecha del presente informe el contratista no realiza la entrega de las planillas aportes legales y seguridad social, aún no se ha cumplido el mes de ejecución del proyecto.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 22202-259564COR

Firma
Nombre: FREDY [illegible] GIRALDO
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NA

CONTRATO DE OBRA No: LP-008-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES INFORME MENSUAL: diciembre-2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	523	Vias Terciarias Mejoradas	1131	Recursos no apropiados-Combenio 1876 de INVIAS	LP-008-2022	$ 4.170.496.742,96	
TOTAL						$ 4.170.496.743	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.170.496.742,96**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. EL CONSORCIO CRISTO REY, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales previas a la ejecución de obra, con el contrato de obra en mencion no ha realizado actividades en ca

Firma
Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-259564COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco													24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,5	24	24	24	24	455,5
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																											0,5					0,5
Total horas													24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El contratista firma acta de inicio el día 13 de diciembre de 2022.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-170303

Firma
Nombre: YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202228500COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica
13080010	SAN ANTONIO [13080010]	8.935861111	-75.95333333	50	PluviomÃ©trica

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
San Pelayo	15/09/1965 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion	
01/12/2022 0:00	0	50		900	
02/12/2022 0:00	0	50		900	
03/12/2022 0:00	0	50		900	
04/12/2022 0:00	0	50		900	
05/12/2022 0:00	0	50		900	
06/12/2022 0:00	0	50		900	
07/12/2022 0:00	0	50		900	
08/12/2022 0:00	0	50		900	
09/12/2022 0:00	0	50		900	
10/12/2022 0:00	0	50		900	
11/12/2022 0:00	0	50		900	
12/12/2022 0:00	0	50		900	
13/12/2022 0:00	0	50		900	
14/12/2022 0:00	0	50		900	
15/12/2022 0:00	0	50		900	
16/12/2022 0:00	0	50		900	
17/12/2022 0:00	0	50		900	
18/12/2022 0:00	0	50		900	
19/12/2022 0:00	4	50		900	
20/12/2022 0:00	0.6	50		900	
21/12/2022 0:00	0	50		900	
22/12/2022 0:00	0	50		900	
23/12/2022 0:00	0	50		900	
24/12/2022 0:00	0	50		900	
25/12/2022 0:00	0	50		900	
26/12/2022 0:00	0	50		900	
27/12/2022 0:00	0	50		900	
28/12/2022 0:00	0	50		900	
29/12/2022 0:00	0	50		900	
30/12/2022 0:00	0	50		900	
31/12/2022 0:00	0	50		900	

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-259564COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 1 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

FECHA DE INICIO: 13/12/2022

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/05/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.170.496.742,96

VALOR ACUMULADO: $ 4.170.496.742,96 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 29.647.660,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 29.647.660,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 417.049.674,30	13	12	2022	14	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.251.149.022,89	13	12	2022	14	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 834.099.348,59	13	12	2022	15	5	2026
Calidad de Estudios y Diseños	100%	$ 1.251.149.022,89	13	5	2023	13	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.251.149.022,89	13	5	2023	13	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101125121

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 400.000.000,00	13	12	2022	15	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101046581 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se actualizan polizas según acta de inicio.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	26	10	2022	00:00	26	03	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP-008-2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2022 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (51,165,711.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(9,726,235.00)	$ ******(60,916,946.00)	$ **(5,004,596,091.56)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	26	10	2022	00:00	26	03	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		NIT: 901.642.986-1
DIRECCIÓN:	CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CIUDAD: CHINU, CORDOBA	TELÉFONO: 3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		NIT: 800.096.805-6
DIRECCIÓN:	ALCALDIA DE SAN PELAYO	CIUDAD: SAN PELAYO, CORDOBA	TELÉFONO 7630309

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (51,165,711.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(9,726,235.00)	$ ******(60,916,946.00)	$ **(5,004,596,091.56)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	26	10	2022	00:00	26	03	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		**NIT: 901.642.986-1**
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	**CIUDAD:** CHINU, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		**NIT: 800.096.805-6**
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7630309

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CABARCAS BUELVAS ALFREDO ANTONIO	10770721	10.00
ISABELLA DAVID INGENIERIA SAS	900588551-5	5.00
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA INGE	901346516-2	85.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	13	05	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP-008-2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2022	14/09/2023	$417,049,674.30	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/12/2022	14/09/2023	$1,251,149,022.89	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,251,149,022.89	
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2023	13/05/2028	$1,251,149,022.89	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2022	15/05/2026	$834,099,348.59	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2022 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **51,165,711.00	$ ******25,000.00	$ ***9,726,235.00	$ ********60,916,946.00	$ ****5,004,596,091.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	13	05	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		NIT: 901.642.986-1
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CIUDAD: CHINU, CORDOBA	TELÉFONO:	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		NIT: 800.096.805-6
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	CIUDAD: SAN PELAYO, CORDOBA	TELÉFONO	7630309

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **51,165,711.00	$ ******25,000.00	$ ***9,726,235.00	$ ********60,916,946.00	$ ****5,004,596,091.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013105932036(3900)000060916946(96)20231213

REFERENCIA PAGO:

1101310593203-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	13	05	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		**NIT: 901.642.986-1**
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	**CIUDAD:** CHINU, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		**NIT: 800.096.805-6**
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7630309

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CABARCAS BUELVAS ALFREDO ANTONIO	10770721	10.00
ISABELLA DAVID INGENIERIA SAS	900588551-5	5.00
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA INGE	901346516-2	85.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	15	05	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

BENEFICIARIO: 800096805 - MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LP-008-2022 CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2022	15/05/2023	$400,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2022	15/05/2023	$120,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2022	15/05/2023	$120,000,000.00	

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2022 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****670,684.00	$ ******20,000.00	$ *****131,230.00	$ **********821,915.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101046581

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	15	05	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CRISTO REY	**NIT: 901.642.986-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 14 NO. 6-74 OF 101		CHINU, CORDOBA		3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT: 800.096.805-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	ALCALDIA DE SAN PELAYO		SAN PELAYO, CORDOBA		7630309

BENEFICIARIO: 800096805 - MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2022	15/05/2023	$120,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101046581

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	15	05	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · Coopdrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****670,684.00	$ ******20,000.00	$ *****131,230.00	$ **********821,915.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013105932050(3900)000000821915(96)20231213

REFERENCIA PAGO: 1101310593205-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	13	12	2022	00:00	15	05	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		**NIT: 901.642.986-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	**CIUDAD:** CHINU, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		**NIT: 800.096.805-6**
DIRECCIÓN:	ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7630309

BENEFICIARIO: 800096805 - MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CABARCAS BUELVAS ALFREDO ANTONIO	10770721	10.00
ISABELLA DAVID INGENIERIA SAS	900588551-5	5.00
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA INGE	901346516-2	85.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101046581

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	26	10	2022	00:00	28	03	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

BENEFICIARIO: 800096805 - MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. LP-008-2022 CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2022 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(670,684.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(131,230.00)	$ *********(821,915.00)	$ ****(400,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101046581

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	26	10	2022	00:00	28	03	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Efecty · Corporación

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(670,684.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(131,230.00)	$ *********(821,915.00)	$ ****(400,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101046581	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	26	10	2022	00:00	28	03	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		**NIT: 901.642.986-1**
DIRECCIÓN:	CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	**CIUDAD:** CHINU, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 800.096.805-6**
DIRECCIÓN:	ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7630309

BENEFICIARIO: 800096805 - MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CABARCAS BUELVAS ALFREDO ANTONIO	10770721	10.00
ISABELLA DAVID INGENIERIA SAS	900588551-5	5.00
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA INGE	901346516-2	85.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101046581

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

FECHA DE INICIO: 13/12/2022 **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/05/2023
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

OBSERVACIONES:
El CONSORCIO CRISTO REY, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales previas a la ejecución de obra, con el contrato de obra en mencion no ha realizado actividades en campo

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:
El CONSORCIO CRISTO REY, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales previas a la ejecución de obra, con el contrato de obra en mencion no ha realizado actividades en campo

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	_____	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	_____
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	_____	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	_____
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	_____	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	_____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC	Nombre:	Nombre: FABIAN RODRIGUEZ GIRALDO	Nombre:
Director de Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-259564COR	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND	Matrícula Profesional No.:


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

• Seguimiento Programa de Obra

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA MUNICIPIO DE SAN PELAYO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO SABANA NUEVA**	**127.5 días**	**mar 13/12/22**	**sáb 13/05/23**	
2		**DISEÑOS**	30 días	**mar 13/12/22**	**mar 17/01/23**	
3		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mar 13/12/22	mar 17/01/23	
4		**EXPLANACIONES**	**16 días**	**mar 17/01/23**	**vie 03/02/23**	
5		Excavaciones varias en material común en seco.	3 días	mié 01/02/23	vie 03/02/23	6
6		Excavación en material común de la explanación y canales	13 días	mar 17/01/23	mié 01/02/23	3
7		**CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 1,5X1(L =7m)**	**12 días**	**mar 17/01/23**	**mar 31/01/23**	
8		Excavaciones varias en material común en seco o mano.	1 día	mié 18/01/23	jue 19/01/23	9
9		Demolicion de estructuras	1 día	mar 17/01/23	mié 18/01/23	3
10		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	1 día	jue 19/01/23	vie 20/01/23	8
11		CONCRETO CLASE C (280 kg/cm2 ó 4000PSI)	4 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	12
12		Acero de Refuezo Fy 420 Mpa	4 días	vie 20/01/23	mié 25/01/23	10
13		Relleno para Estructuras con recebo	1 día	lun 30/01/23	mar 31/01/23	11
14		**CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE DE 15 M**	**96 días**	**mar 17/01/23**	**vie 12/05/23**	
15		Demolicion de estructuras	3 días	mar 17/01/23	vie 20/01/23	3
16		Excavaciones varias en material común bajo agua o maquina	2 días	vie 20/01/23	lun 23/01/23	15
17		Terraplenes	5 días	lun 24/04/23	sáb 29/04/23	19,30
18		Revestimiento en Piedra pegado para taludes	3 días	sáb 29/04/23	jue 04/05/23	17,22
19		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI). ZAPATAS, ESTRIBOS, ALETAS, TABLERO, BORDILLOS Y LOSA DE APROXIMACION	70 días	lun 30/01/23	lun 24/04/23	16,22CC+8 días
20		Material Granular drenante	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23	17
21		Geotextil Tipo No Tejido 2500	2 días	jue 04/05/23	sáb 06/05/23	18,20CC
22		Acero de Refuezo Fy 420 Mpa	65 días	vie 20/01/23	mié 05/04/23	15
23		Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	1 día	mié 10/05/23	jue 11/05/23	25,24
24		Apoyos elastomericos	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23	19CC+40 días
25		Baranda metalica para trafico vehicular	5 días	jue 04/05/23	mié 10/05/23	18
26		Conformación de la calzada existente - Accesos	1 día	sáb 29/04/23	mar 02/05/23	17
27		Subbase Granular Clase C.- Accesos	1 día	mié 03/05/23	jue 04/05/23	28
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	1 día	mar 02/05/23	mié 03/05/23	26
29		Prueba de Carga	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	23
30		Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	12 días	lun 23/01/23	lun 06/02/23	16
31		**PLACA HUELLA, ANCHO 6,8m**	**78 días**	**mié 01/02/23**	**sáb 06/05/23**	
32		Subbase Granular Clase C.	4 días	mar 07/02/23	vie 10/02/23	33
33		Afirmado (Material para Mejoramiento)	5 días	mié 01/02/23	mar 07/02/23	6
34		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	35 días	mié 08/02/23	mié 22/03/23	32FC-2 días
35		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	20 días	lun 20/02/23	mar 14/03/23	34FC-26 días
36		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	42 días	mar 14/03/23	sáb 06/05/23	35,37FC-35 días
37		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D Fc = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	45 días	mié 01/03/23	mié 26/04/23	35CC+9 días,38FC-30 días
38		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	50 días	mié 01/02/23	jue 30/03/23	6
39		**TRANSPORTE**	**36 días**	**mar 17/01/23**	**lun 27/02/23**	
40		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	36 días	mar 17/01/23	lun 27/02/23	3
41		**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**1.5 días**	**vie 12/05/23**	**sáb 13/05/23**	
42		Caracterización del corredor	1.5 días	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	36,29

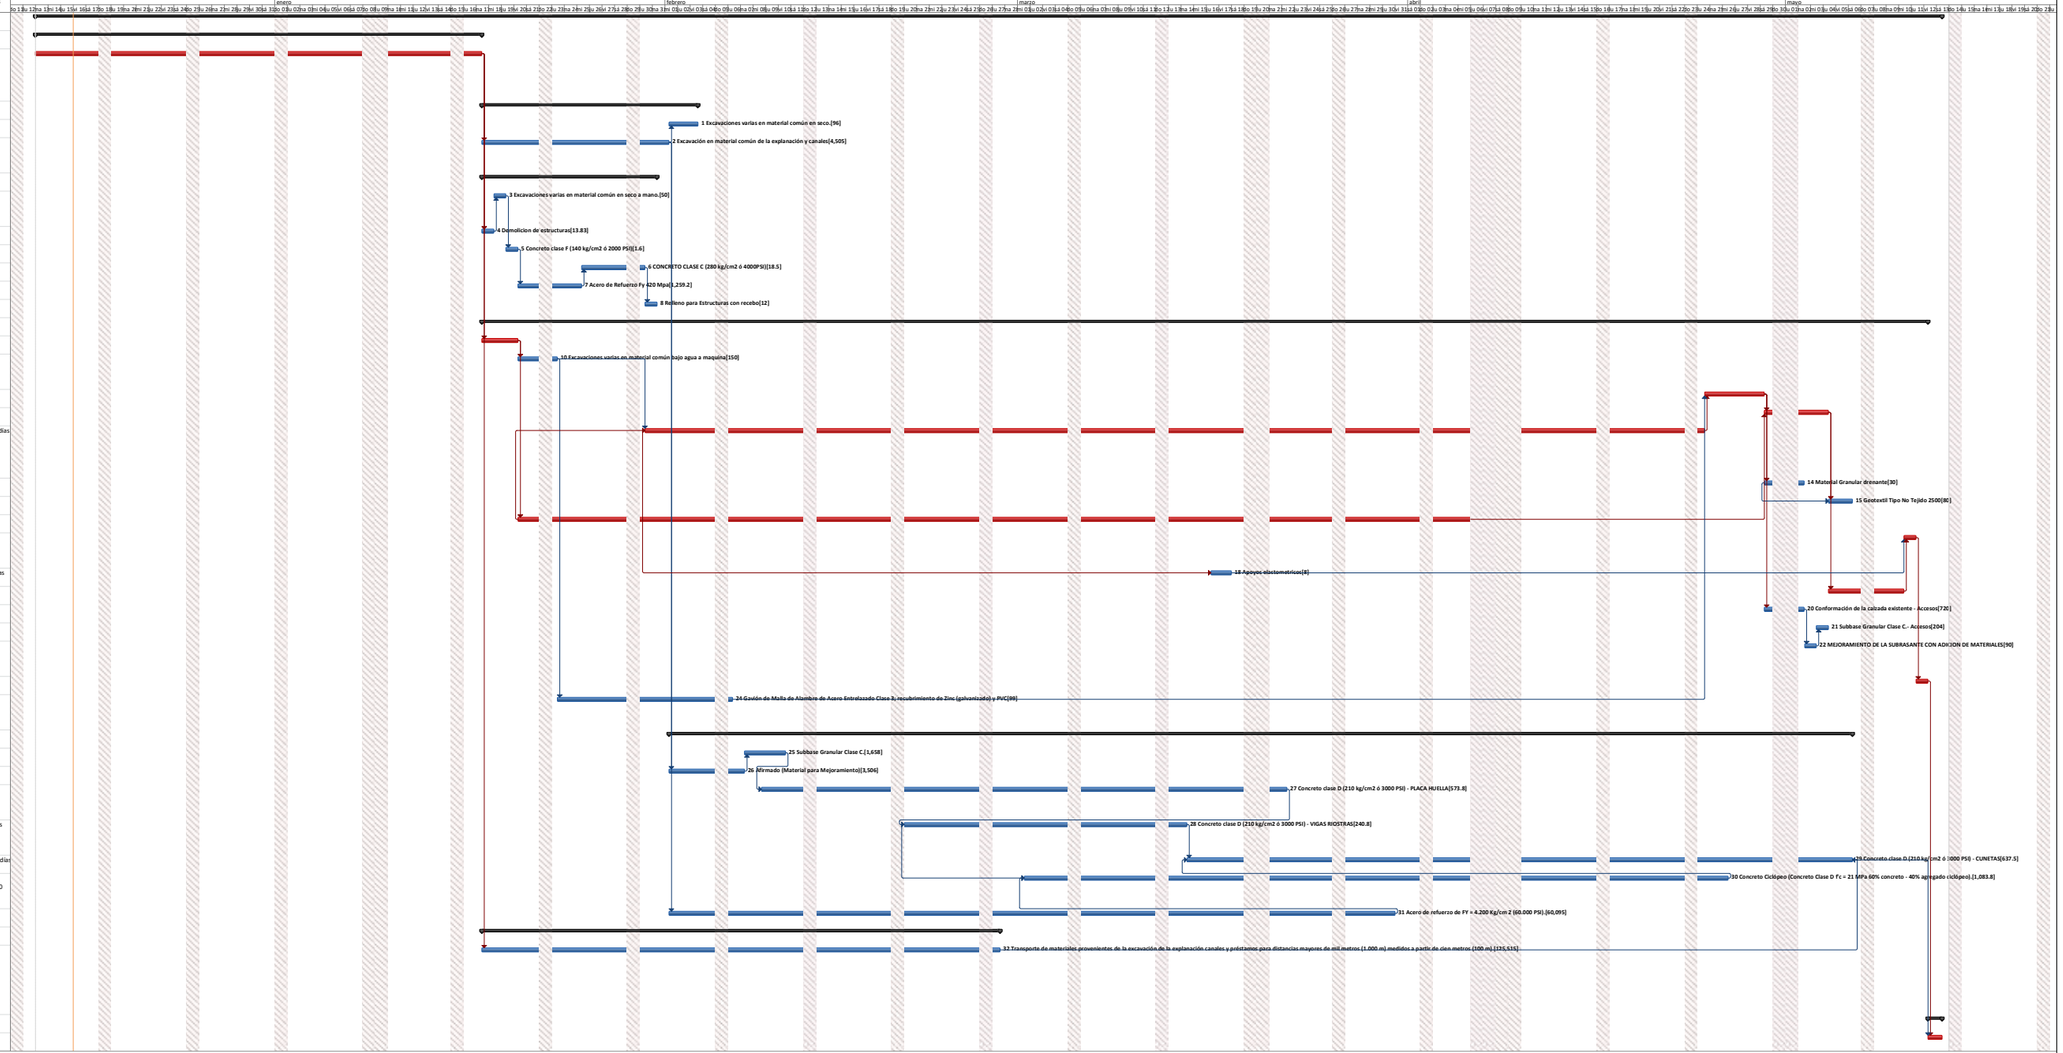

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-008-2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.170.496.742,96 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.170.496.742,96

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/05/2023 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 DICIEMBRE DE 2022	2 ENERO DE 2023	3 FEBRERO DE 2023	4 MARZO DE 2023	5 MAYO DE 2023						
				% Programado											
				$ Valor programado											
				$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado											
GPP1				% P											%
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											
				$ E											%
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - -	———

OBSERVACIONES:
El formato no se encuentra diligenciado dado que el contratista no ha iniciado la ejecución de actividades en obra, ya que aún se está en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
El contratista se encuentra en el tiempo de la presentación de documentos.

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE GREGORIO DOMINGEZ DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY [illegible] GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-008-2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL MG

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.170.496.742,96 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.170.496.742,96

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5						
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	MAYO DE 2023						
GPP1				% P											%
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											%
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%												0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
El formato no se encuentra diligenciado dado que el contratista no ha iniciado la ejecución de actividades en obra, ya que aún se está en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
El contratista se encuentra en el tiempo de la presentación de documentos.

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE GREGORIO DOMINGEZ DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

FECHA: 26/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N.A.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Subsanación de documentos iniciales.
2. Estudios y diseños.
3. Cantera
4. Plan de manejo de tránsito
5. Pólizas contractuales

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Subsanación de documentos iniciales: El contratista radicó la documentación inicial, la interventoría la revisó y realizo unas observaciones a dicha documentación y visto bueno a la que llegó completa, falta por subsanar la que tiene observaciones. El contratista manifestó que se encuentra recopilando la información y subsanarla, la presentará el día de mañana 27/12/2022.

2. Estudios y diseños: La interventoría solicita al contratista presentar revisión de los estudios y diseños. El contratista mediante oficio informó a la interventoría que el día de mañana realizará apiques para el estudio de suelo de la vía. La interventoría manifiesta que en este mes se debe tener aprobación parcial de la estructura de la placa huella de la vía, para que se pueda dar inicio de las actividades de obra.

3. El Puente. El representante legal José Domínguez quedo en realizar una visita. Se estima que el día 28/12/2022 iniciar el estudio Geológico-Geotécnico en el lugar donde se realizará el puente.

3. Cantera. La interventoría solicita al contratista ir mirando el tema de las canteras de donde se suministrará el material de afirmado y de subbase, la caracterización de los materiales.

4. Plan de manejo de tránsito: El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en el tema. La interventoría informa que el PMT debe ser entregado a la alcaldía municipal en secretaría de planeación e infraestructura para su revisión y posterior aprobación. El contratista lo presentará el día 27/12/2022, se considera cerrar la vía y establecer ruta alterna.

5. Pólizas contractuales: La interventoría solicita al contratista la actualización de las pólizas contractuales a fecha de acta de inicio. El contratista manifestó que se encuentra tramitando la actualización de las pólizas con la aseguradora y una vez se tengan actualizadas las radicaran, las presentarán el día 28/12/2022.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Subsanación de documentos iniciales	27/12/2022	Contratista
2. Realización de apiques en la vía	27/12/2022	Contratista
3. Estudio Geológico- Geotécnico del puente	28/12/2022	Contratista
4. Plan de manejo de tránsito	27/12/2022	Contratista
5. Pólizas contractuales	28/12/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 24/12/2023 (Día / Mes / Año)





NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ERNESTO JOSÉ HERNANDEZ LECLERC	Director de obra	CONSORCIO CRISTO REY	
LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS	Residente de obra	CONSORCIO CRISTO REY	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisora del contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
JOSE ALONSO ANDRADE RODRIGUEZ	Secretario de Planeación e Infraestructura	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	
ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA	Residente de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL	
YAJAIRA GÓMEZ CÁRDENAS	Residente de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL	

- **ACTAS DE REUNIÓN**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A fecha del 30 de noviembre de 2022, el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o o ajustes a los estudios y diseños, se tiene una inversión de obra programada 0,00% y una inversión de obra ejecutada acumulada del 0,00%.

Se le recomienda al contratista presentar la revisión y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños, la etapa acordada es de un mes, por lo cual se solicita de manera urgente empezar a radicar información para que los especialistas puedan conceptuar e ir adelantando el proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría. (CVRIMG-425-2022)

Se le recomienda al contratista atender oficio enviado por interventoría donde se le requiere subsanar las observaciones realizadas a la documentación inicial. (CVRIMG-422-2022)

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-330-2022	7/12/2022	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud documentos para inicio de actividades	Atn. Ing. José Gregorio Domínguez Diaz
CVRIMG-335-2022	10/12/2022	CONSORCIO CRISTO REY	Contingencia fiestas decembrinas	Atn. Ing. José Gregorio Domínguez Diaz
CVRIMG-406-2022	21/12/2022	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud entrega documentación área SST	Atn. Ing. José Gregorio Domínguez Diaz
CVRIMG-422-2022	22/12/2022	CONSORCIO CRISTO REY	Respuesta oficio 16/12/2022 - Observaciones documentación inicial	Atn. Ing. José Gregorio Domínguez Diaz
CVRIMG-425-2022	22/12/2022	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud entrega información revisión/actualización estudios y diseños	Atn. Ing. José Gregorio Domínguez Diaz

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	16/12/2022	NA	16-dic.-22	Respuesta a oficio CVRIMG-330-2022
CONSORCIO CRISTO REY	26/12/2022	NA	26-dic.-22	Realización de Apiques – Toma de muestras para estudios de placa huella y puente.
CONSORCIO CRISTO REY	27/12/2022	NA	27-dic.-22	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA SST
CONSORCIO CRISTO REY	28/12/2022	NA	28-dic.-22	SOLICITUD DE CIERRE TOTAL DE VIA DURANTE LA INTERVENCION DEL K0+000 AL K1+700
CONSORCIO CRISTO REY	28/12/2022	NA	28-dic.-22	NOTIFICACIÓN ELABORACIÓN ACTAS DE VECINDAD ÁREA DE INTERVENCIÓN.
CONSORCIO CRISTO REY	29/12/2022	NA	29-dic.-22	Realización de Sondeos – Puente.
CONSORCIO CRISTO REY	29/12/2022	NA	29-dic.-22	ENTREGA DE GARANTÍAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	1 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CRISTO REY	**CONTRATO N°**	LP-008-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**				



Descripción: Estado inicial de la vía.



Descripción: Toma de muestra de materal ensayo de CBR.



Descripción: Realización de actas de vecindad.



Descripción: Ensayo de penetración estándar (SPT) en donde se construirá el puente.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Martes 13 de Diciembre de 2022
Se realiza visita técnica al corredor vial corregimiento Sabana Nueva. Municipio de San Pelayo, con la asistencia de representante legal del contratista, interventoría, INVIAS y la alcaldia Municipal, Alcalde
Con la reunion técnica inicial se hace la apertura oficial de esta bitacora del proyecto "Mejoramiento Mediante la construccion de Placa huella en la via que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba"
El wal sera día a día con los por menores de la obra y las desiciones tomadas en campo durante la ejecución de las actividades. El libro de bitacora será firmado por el residente de obra y el residente de interventoria, previamente autorizados.

Ing Residente — Yajaira Gómez C.

Miercoles 14 de Diciembre de 2022

Sin novedad en obra.
El contratista trabaja en la entrega de todos los documentos y requerimientos previos al inicio de las obras tanto en la etapa 1 y etapa 2. para la revisión por parte de la interventoria y su eventual aprobacion.
Clima: Seco - Soleado

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

Jueves 15 de Diciembre de 2022

Sin novedad en la obra
El contratista trabaja en la entrega de todos los documentos y requisitos previos al inicio de las obras tanto en etapa 1 y etapa 2, para la revisión por parte de la interventoria y su eventual aprobación.
Clima. Seco - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Viernes 16 de Diciembre de 2022

Sin novedad en la obra
El contratista mediante correo electrónico remite a la interventoría respuesta a oficio CVRIM6-330-2022 la siguiente documentación
- Hojas de vida del personal profesional
- Programa de reintegración y reincorporación (si aplica).
- Relación de equipo mínimo obligatorio
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio magnético).
- Programa de obra (en físico y magnético).
- Programa de inversiones (en medio físico y magnético).
- Flujo de caja.
- Programa de generación de empleo.
- Instalaciones provicionales.
- Laboratorio toma de control de calidad.
- Plan de calidad. (en medio físico y magnético)
- Plan de manejo de transito - PMT (en medio físico y magnético)
- Protocolo de bioseguridad.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

Sábado 17 de Diciembre de 2022

- Se continúa preparando por parte del contratista la documentación inicial.
- La Interventoría se encuentra revisando la documentación presentada el día de ayer.

Clima: seco - soleado

Yajaira Gómez C.

Domingo 18 de Diciembre de 2022

Día no laboral.

Yajaira Gómez C.

Lunes 19 de Diciembre de 2022

- Se continúa preparando por parte del contratista la documentación inicial.
- La Interventoría se encuentra revisando la documentación presentada el día 16/12/2022.

Clima: seco - soleado

Yajaira Gómez C.

Martes 20 de Diciembre de 2022

- Se continúa preparando por parte del contratista la documentación inicial.
- La Interventoría se encuentra revisando la documentación presentada el día 16/12/2022.

Clima: seco - soleado.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

Miercoles 21 de Diciembre de 2022
- Se continua preparando por parte del contratista la documentación inicial.
- La interventoria se encuentra revisando la documentación presentada el dia 16/12/2022.
Clima: Seco - Soleado

Yajaira Gómez C.

Jueves 22 de Diciembre de 2022
- El contratista continua preparando la documentación inicial.
- La interventoria emite respuesta de la revisión de la documentación que presento el contratista el dia 16/12/22 la interventoria realizó observaciones y solicitó documentación faltante (estudios y diseños).
Clima: Seco - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Viernes 23 de Diciembre de 2022
- El contratista continúa preparando la documentación inicial
- La interventoria solicita al contratista presentar de la revisión y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños, la etapa acordada es un mes, por lo cual se solicita de manera urgente empezar a radicar información para que los especialistas puedan conceptuar e ir adelantando el proceso de la revisión y aprobación por parte de la interventoria.
Clima: seco - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

Sábado 24 de Diciembre de 2022
- El contratista sigue preparando la documentación inicial.
- La interventoría reitera solicitud de presentar la revisión y/o actualización de los estudios y diseños.

Clima: Seco soleado.

Yajaira Gómez C.

Domingo 25 de Diciembre - Festivo
Día no laboral.

Clima: Seco - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Lunes 26 de Diciembre de 2022
- Se realizó comité de obra, en el que participaron: Supervisor del INVIAS, Supervisor de Alcaldía, interventoría y contratista.
Se establecieron compromisos por parte del contratista.

Clima: Seco - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Martes 27 de Diciembre de 2022
- El contratista realizó apiques en la vía Sabana Nueva y se tomaron muestras para ensayos de CBR.

Clima: seco - soleado tarde: lluvias a las 3:30 p.m hasta las 4:00 p.m.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

Miercoles 28 de Diciembre de 2022
- Se continúa preparando documentación de la obra para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.
- Se continúan actividades para la revisión y ajustes a los diseños iniciales de la obra.

Clima: Seco - Soleado

Yajaira Gómez C.

Jueves 29 de Diciembre de 2022
- El contratista en compañía con la interventoría realizaron actas de vecindad a las viviendas de la zona directa del proyecto.
- El contratista realizó ensayo de penetración estándar (SPT) en el lugar donde se construirá el puente.

Clima: Seco - soleado

Yajaira Gómez C.

Viernes 30 de Diciembre de 2022
- El contratista en compañía con la interventoría realizaron actas de vecindad de las viviendas que se encuentran en la zona de influencia directa del proyecto.
- El contrantista continuo haciendo ensayo de penetración estándar (SPT) en el lugar donde se construirá el puente.

Yajaira Gómez Cardona

Sábado 31 de Diciembre de 2022
Día no laboral por fiesta de fin de año.

Yajaira Gómez C.

Domingo 01 de Enero de 2023
Día no laboral.

Yajaira Gómez C.

Lunes 02 de Enero de 2023
- Se continúa preparando información de la obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.
- Se continúan haciendo actividades para la revisión y ajustes a los diseños iniciales de la obra.

Clima: Seco - soleado

Yajaira Gómez C.

Martes 03 de Enero de 2023.
- El contratista en compañía con la interventoría realizaron actas de vecindad de las viviendas que se encuentran en la zona de influencia directa del proyecto.
- Se continúan haciendo actividades para la revisión y ajustes a los diseños iniciales de la obra

Clima: Seco - Soleado.

Yajaira Gómez C.

Powered by CamScanner

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ID SECOP	CO1.PCCNTR.3626320
PROCESO No.	CMA-DTE-SEP-196-2021
CONTRATO NO.	971 DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/03/2022
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.
INTERVENTOR	CONSORCIO VIAL RURAL IMG
NIT	901.579.942-7
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
INTEGRANTES	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.564.284.660,00
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FACHA INICIO	22/08/2021
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
MODIFICACIÓN NO.1	31/10/2022

Tabla 10. Información Cto de Interventoría No. 971 de 2022

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1. Contrato No. 219 de 2022

i. Se continua con el seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. Seguimiento al buen manejo del anticipo.
iii. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
iv. Se realizó verificación por parte de la comisión topográfica de interventoría de los niveles de excavación para la construcción de la estructura de placa huella.
v. Diligenciamiento de la bitácora de obra
vi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
vii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
viii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
ix. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
x. Inspección de maquinaria y equipos en obra.
xi. Se remite concepto de aprobación parcial al plan de contingencia remitido mediante comunicado UT-RLCE-044 del 24/11/2022.
xii. Se solicita dar respuesta revisión/actualización estudios y diseños en los componentes que a la fecha se encuentran pendientes.
xiii. Se revisa solicitud de suspensión del contrato de obra referido, presentada por el contratista, y ante los motivos que sustenta, esta interventoría avala dicha solicitud.

5.2.2. Contrato No. 232 de 2022

i. La interventoría continúa realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. Supervisión, seguimiento y control a las actividades de construcción de pedraplén entre el K3+000 al K5+300, para atender la emergencia producida por la ola invernal que azota la región.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iv. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Diligenciamiento de la bitácora de obra
x. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.

xi. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.

5.2.3. Contrato No. 225 de 2022

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. La interventoría realiza solicitud de caracterización de materiales y diseños de mezclas de concreto
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en los comités y actas de reunión realizadas.
iv. Realizar la revisión de la documentación entregada por el contratista.
v. Se le recomienda al municipio de Santa Cruz de Lorica, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de la obra.
vi. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
vii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
viii. Diligenciamiento de la bitácora de obra.
ix. Se revisa solicitud de suspensión del contrato de obra referido, presentada por el contratista, y ante los motivos que sustenta, esta interventoría avala dicha solicitud.

5.2.4. Contrato No. 162 de 2022

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iii. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
iv. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación total de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Se realizó verificación por parte de la comisión topográfica de interventoría de los niveles de excavación para la construcción de la estructura de placa huella.
xi. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xii. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xiii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xiv. Inspección de maquinaria y equipos en obra.

5.2.5. Contrato No. 168 de 2022

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iii. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
iv. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación total de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Se realizó verificación por parte de la comisión topográfica de interventoría de los niveles de excavación para la construcción de la estructura de placa huella.
xi. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xii. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xiii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.

5.2.6. Contrato No. LP-MSBV-002-2022

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iii. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
iv. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación total de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xiii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.

5.2.7. Contrato No. LP-MSBV-006-2022

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.

ii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iii. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
iv. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación total de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xiii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.

5.2.8. Contrato No. LP-003-2022

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. La interventoría realiza solicitud de caracterización de materiales y diseños de mezclas de concreto
iii. La interventoría realiza solicitud de replantear y materializar el eje de la vía.
iv. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en los comités y actas de reunión realizadas.
v. Realizar la revisión de la documentación entregada por el contratista.
vi. Se le recomienda al municipio de Santa Cruz de Lorica, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de la obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Diligenciamiento de la bitácora de obra.

5.2.9. Contrato No. LP-008-2022

i. Se realiza revisión de la documentación inicial entregada por el contratista.
ii. Se le recomienda al contratista atender oficio enviado por interventoría donde se le requiere subsanar las observaciones realizadas a la documentación inicial.
iii. Se realiza acompañamientos en la realización de las actas de vecindad
iv. Se le recomienda al contratista presentar la revisión y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños, la etapa acordada es de un mes, por lo cual se solicita de manera urgente empezar a radicar información para que los especialistas puedan conceptuar e ir adelantando el proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se elaboraron los siguientes informes de los especialistas del proyecto.

5.3.1. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA



"REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTA LUCIA LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA.

REVISIÓN INFORME GEOTECNICO DEL PROYECTO REV -5 "REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTA LUCIA LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA."

LORICA, 22 de diciembre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 971 de 2022

FICHA TÉCNICA

PROFESIONALES DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO VIAL RURAL IMG		
ELABORÓ		**REVISÓ**
Especialista Geotecnia Interventoría	Residente Técnico de Interventoría	Director de Interventoría
		
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
FECHA	**FECHA**	**FECHA**
Diciembre de 2022	Diciembre de 2022	Diciembre de 2022

SUPERVISOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
APROBÓ
Coordinador proyecto

FIRMA
FECHA
Diciembre de 2022

El presente informe está elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato 232 de 2022 **"REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTA LUCIA LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA."**

Está prohibida su reproducción total o parcial, la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro método, sin el permiso escrito del que aprobó el informe.

TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN **4**
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO **4**
2.1. Localización. **4**
3. OBJETIVO **5**
4. ANTECEDENTES **5**
5. DESCRIPCION **6**
6.CONCEPTO TECNICO Y RECOMENDACIONES GENERALES **6**

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de Santa Cruz de Lorica para cumplir con la función social asignada en la Constitución y la ley, desarrolló el proyecto **"REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTA LUCIA LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA".** Por medio de este contrato se busca garantizar la transitabilidad y optimizar las condiciones de bienestar de los usuarios de la vía.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización.

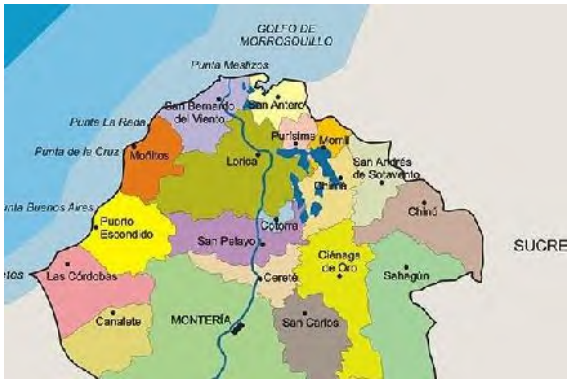



El Municipio de Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicado al norte del departamento de Córdoba, haciendo parte de la parte baja de los valles del rio Sinú, El departamento de Córdoba cuenta con 7 su-regiones entre ellas el bajo Sinú los cuales son Chimá, Cotorra, Momil, Purisima, y Santa Cruz de Lorica. La vía a mejorar es la via Santa Lucia, Las Garitas – San Juan – Los Higales, zona rural pertenecientes a este último municipio.

La población de Santa Lucia se encuentra aproximadamente a 11 km de la cabecera municipal del municipio de Santa Cruz de Lorica. El mejoramiento de la vía en cuestión contribuye al desarrollo y a la calidad de vida de los habitantes de estas poblaciones.

Se mejorará la vía (alterna) terciaria que comunica a la vereda Santa Lucia, Las Garitas – San Juan- Los Higales en concreto rígido son 4 tramos con una longitud de 10557 metros lienales.

3. OBJETIVO

El objetivo del presente informe técnico es revisar el estudio geotécnico del proyecto **REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTA LUCIA LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA**". Verificar los ensayos realizados determinar las características de la sub-rasante y observar los posibles cambios volumétricos que pueda presentar y las alternativas de solución.

4. ANTECEDENTES

La alcaldía municipal de Santa Cruz de Lorica presentó el proyecto "**REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTA LUCIA LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA**", para ello presentó estudios previos entre ellos estudio de suelos, geotécnicos y geológicos. Se construirán tramos en los sitios críticos en concreto rígido para mejorar el tránsito de vehículos de los habitantes de la zona de influencia del proyecto, empleando las especificaciones y el manual de diseño de pavimentos del Instituto Nacional de Vías. La interventoría del proyecto fue contratada por el Invías.

Tabla. Tramos a intervenir en el proyecto

TRAMO	ABSICISA
1 – SANTA LUCIA LAS GARITAS	K0+000 – K7+574
2 – SAN JUAN	K7+574 – K8+139
3 – LOS HIGALES	K10+264 – K11+820
4 – LOS HIGALES	K12+168 – K12+465

Tabla. Resumen de los apiques realizados

ZONAS	PUNTO	COORDENADAS	
		OESTE	NORTE
SANTA LUCIA LAS GARITAS	APIQUE 1	75°53'53.24"	9°16'55.43"
	APIQUE 2	75°53'54.05"	9°16'39.73"
	APIQUE 3	75°53'53.47"	9°16'23.47"
	APIQUE 4	75°53'53.88"	9°16'7.05"
	APIQUE 5	75°53'56.60"	9°15'51.01"
	APIQUE 6	75°54'3.12"	9°15'36.36"
	APIQUE 7	75°54'11.40"	9°15'22.70"
	APIQUE 8	75°54'19.66"	9°15'8.79"
	APIQUE 9	75°54'33.95"	9°15'2.78"
	APIQUE 10	75°54'46.03"	9°14'52.50"
	APIQUE 11	75°54'56.49"	9°14'40.01"
	APIQUE 12	75°55'3.96"	9°14'25.67"
	APIQUE 13	75°55'9.74"	9°14'10.43"
	APIQUE 14	75°55'15.16"	9°13'55.03"
	APIQUE 15	75°55'17.71"	9°13'39.00"
SAN JUAN	APIQUE 16	75°55'27.27"	9°13'39.08"
LOS HIGALES	APIQUE 17	75°56'42.11"	9°13'16.00"
	APIQUE 18	75°56'56.56"	9°13'7.56"
LOS HIGALES	APIQUE 19	75°57'27.65"	9°13'3.01"

Tabla 2. Coordenadas de los apiques realizados.

5. DESCRIPCION

A continuación se hace una descripción de los apiques realizados en el estudio.

- Apique No 1 Se encuentra material arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) de 0 a 0.2 m con límite líquido de 48%, índice de plasticidad de 21% y entre 1.2 a 1.5 m arcilla de baja plasticidad con presencia de arena (CL).
- Apique No 2. Se encuentra material arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) de 0 a 0.2 m con límite líquido de 48%, índice de plasticidad de 23% y entre 1.2 a 1.5 m arcilla de baja plasticidad con presencia de arena (CL, con CBR sumergido a 4 días de 2.96.
- Apique No 3 Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.18 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 36%, índice de plasticidad de 14
- Apique No 4. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.15 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 35%, índice de plasticidad de 18%
- Apique No 5. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.2 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 49%, índice de plasticidad de 24
- Apique No 6. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.2 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 49%, índice de plasticidad de 28%, con CBR sumergido a 4 días de 3%
- Apique No 12. Se encuentra material arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) de 0 a 0.2 m con límite líquido de 31%, índice de plasticidad de 14% y entre 1.2 a 1.5 m arcilla de baja plasticidad con presencia de arena (CL) con límite líquido de 38%, índice de plasticidad de 18%, con CBR sumergido a 4 días de 1.34%.
- Apique No 13. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.15 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 36%, índice de plasticidad de 21%, con CBR de 1.94%.
- Apique No 14. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.20 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 42%, índice de plasticidad de 21%, con CBR de 2.96%.
- Apique No 15. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.15 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 46%, índice de plasticidad de 26%, con CBR de 2.03%
- Apique No 16. Se encuentra material arena limosa (SM) entre de 0 a 0.15 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla arenosa de baja plasticidad (CL) con límite líquido de 53%, índice de plasticidad de 27%.
- Apique No 17. Se encuentra material grava arcillosa (GC) entre de 0 a 0.20 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla de alta plasticidad (CH) con límite líquido de 59%, índice de plasticidad de 36%, con CBR de 2.34%

- Apique No 18. Se encuentra material grava arcillosa (GC) entre de 0 a 0.20 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla de alta plasticidad (CH) con límite líquido de 61%, índice de plasticidad de 27%, con CBR de 2.0%.
- Apique No 19. Se encuentra material grava arcillosa (GC) entre de 0 a 0.20 m sin límites, y entre 1.2 a 1.5 m, arcilla de alta plasticidad (CH) con límite líquido de 67%, índice de plasticidad de 47%.

En resumen, se puede decir que el material encontrado es suelo arenoso y arcillas de baja plasticidad, con límites líquidos entre el 0% al 61%, CBR entre 1.34% al 3.0% sumergidos 4 días. Las humedades naturales están entre 3% al 24%.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se describen algunas observaciones a la revisión al estudio geotécnico

1- Los cálculos de los espesores de rellenos para mejoramiento propuestos en el estudio geotécnico entre las abscisas K0+000 al K2+155, K2+155 AL k3+050 entre K5+370 al K8+145.4, entre K10+264 al K11+820 y entre K12+168 al K12+465 están acorde con las metodologías utilizadas. Revisando el nuevo informe donde se modifica el espesor de mejoramiento de 15 cm a 20 cm, quedan aprobados estos tramos con espesores de mejoramiento de 20 cm de material de afirmado o suelos seleccionados.
2- Aprobado el mejoramiento de la subrasante, tramo entre K3+050 al K5+370, con 40 cm de piedra rajón, Geotextil NT 2500 o similar ,15 cm de material de terraplén o afirmado.

Atentamente,



JUAN PABLO FLOREZ REVOLLO
Especialista en Geotecnia



"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA,


REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS OBRAS DE ARTE DEL PROYECTO REV 4 "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA.."

LORICA, 22 de diciembre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°

FICHA TÉCNICA

PROFESIONALES DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO VIAL RURAL IMG		
ELABORÓ		**REVISÓ**
Especialista Geotecnia Interventoría	Residente Técnico de Interventoría	Director de Interventoría
		
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
FECHA	**FECHA**	**FECHA**
Diciembre de 2022	Diciembre de 2022	Diciembre de 2022

SUPERVISOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
APROBÓ
Coordinador proyecto

FIRMA
FECHA
Diciembre de 2022

El presente informe está elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato 225 de 2022 **"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA."**

Está prohibida su reproducción total o parcial, la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro método, sin el permiso escrito del que aprobó el informe.

TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN **4**
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO **4**
2.1. Localización. **4**
3. OBJETIVO **5**
4. ANTECEDENTES **5**
5. DESCRIPCION .....
6.CONCEPTO TECNICO Y RECOMENDACIONES GENERALES **6**

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de Santa Cruz de Lorica para cumplir con la función social asignada en la Constitución y la ley, desarrolló el proyecto **"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA.".** Por medio de este contrato se busca garantizar la transitabilidad y optimizar las condiciones de bienestar de los usuarios de la vía.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización.

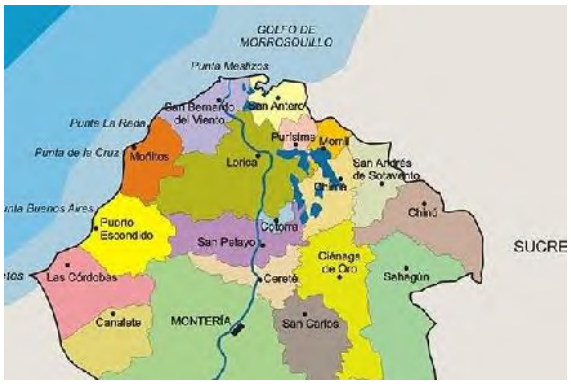



El Municipio de Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicado al norte del departamento de Córdoba, haciendo parte de la parte baja de los valles del rio Sinú, El departamento de Córdoba cuenta con 7 su-regiones entre ellas el bajo Sinú los cuales son Chimá, Cotorra, Momil, Purisima, y Santa Cruz de Lorica. La vía a mejorar es la via al Rodeo zona rural pertenecientes a este último municipio.

El corregimiento la Candelaria se encuentra ubicado aproximadamente a 20 km del casco urbano del municipio del municipio de Santa Cruz de Lorica. El mejoramiento de la vía en cuestión contribuye al desarrollo y a la calidad de vida de los habitantes de estas poblaciones.

Se mejorará la vía (alterna) terciaria que comunica al corregimiento de Candelaria, Correa, El Brillantte, El Rodeo en concreto rígido son 7 tramos con una longitud de 2170 metros lienales.

3. OBJETIVO

El objetivo del presente informe técnico es revisar el estudio geotécnico del proyecto **MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA**". Verificar los ensayos realizados determinar las características de la sub-rasante y observar los posibles cambios volumétricos que pueda presentar y las alternativas de solución.

4. ANTECEDENTES

La alcaldía municipal de Santa Cruz de Lorica presentó el proyecto "**MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA**", para ello presentó estudios previos entre ellos estudio de suelos, geotécnicos y geológicos. Se construirán tramos en los sitios críticos en concreto rígido para mejorar el tránsito de vehículos de los habitantes de la zona de influencia del proyecto, empleando las especificaciones y el manual de diseño de pavimentos del Instituto Nacional de Vías. La interventoría del proyecto fue contratada por el Invías.

Tabla. Tramos a intervenir en el proyecto

TRAMO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD [m]	CONDICIÓN
1	Sector El Brillante Loma de Rocely.	327	Pavimento concreto nuevo
2	Sector El Brillante entrada Las Palmitas	313	Pavimento concreto nuevo
3	Sector El Brillante Marzan Fredy Sasa.	227	Pavimento concreto nuevo
4	Sector Candelaria Arriba – Intersección Tienda el Monstruo.	318	Pavimento concreto nuevo
5	Sector Korea 1 – Loma Robert Dimas.	215	Pavimento concreto nuevo
6	Sector Korea 2 – Palo de Ciruela – Iglesia Cristiana.	216	Pavimento concreto nuevo
7	Sector Candelaria Abajo – Intersección Loma Puente.	557	Pavimento concreto nuevo

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se describen algunas observaciones a la revisión al estudio geotécnico recibido el día 21 de diciembre de 2022.

1- En el informe no se presenta análisis de licuación de suelos, aunque presentan características de suelo fino se debe garantizar la no afectación por los fenómenos sísmicos. Se debe realizar la verificación.
2- En el informe no se presenta la localización en abscisas, tampoco de coordenadas del sitio del punto critico donde se va a realizar la intervención.

3- Calcular las capacidades de carga de la cimentación, determinación de los asentamientos esperados, verificación de los cálculos de la capacidad empleando la norma Código Colombiano de Construcciones de Puentes CCCP-14. Determinar los factores de resistencia, carga de servicio, evento extremo. La información debe ser concordante con el cálculo estructural.
4- Se debe anexar registro fotográfico de las actividades de campo contextualizando cada imagen.
5- En el informe no se determina a que profundidad se va a cimentar la estructura. Esta información es muy importante para las recomendaciones sobre las excavaciones por la influencia del nivel freático. No esta bien determinada el ancho de la cimentación, en el cálculo de la capacidad portante es de 1.0 m y para los asentamientos se toma de 1.5 m.
6- Se debe garantizar la estabilidad global de la estructura, para ello se debe realizar su análisis y confirmar que es estable.
7- De acuerdo con las observaciones se deberá revaluar y/o justificar todas las memorias de cálculo, las conclusiones y recomendaciones del tipo de cimentación.

Atentamente,



JUAN PABLO FLOREZ REVOLLO
Especialista en Geotecnia

5.3.2. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

Bogotá D.C., 08 de diciembre de 2022

Señores
Consorcio Vial Rural IMG
Att. Ing. FREDY RODRÍGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría

Ref.: CONTRATO 162.2022. MEJORAMIETO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.

Asunto: COMUNICADO No. CRS-CE-044. SEGUNDA REVISIÓN ESTUDIO DE HIDRÁULICA V1.

Respetado Ingeniero.

De conformidad con los archivos remitidos, por medio de correo electrónico, donde se solicita la revisión de los productos hidráulicos del mejoramiento de vías rurales en el municipio de Sahagún - Córdoba, a continuación, se indican los siguientes comentarios:

Comentarios Generales:

1. En la introducción se debe hablar del contrato que atañe al proyecto, señalar el objetivo específico y los generales.
2. Es importante que adicional a hablar sobre el Municipio en general y la localización del mismo, se hable específicamente de lo que ocupa el proyecto y es la localización de la vía que se requiere intervenir.
3. Eliminar el numeral 2.6 Perímetro Sanitario y especialmente el tercer párrafo, donde se habla que el presente estudio se desarrolla para ***crear alternativas que permitan evacuar las aguas negras***, es importante aclarar que el estudio corresponde a un diseños hidrológico e hidráulico de un sector de vía localizado en el municipio de Sahagún.
4. Igualmente revisar si para el estudio aplican los numerales 2.7 a 2.10 del informe.
5. El informe debe contener un capítulo para el desarrollo del estudio de hidrología en general y otro para el desarrollo del estudio hidráulico. Así mismo, incluir un numeral con la localización del corredor y sus datos mínimos de acceso y demás que considere el diseñador.
6. Incluir fuente o referencia de las imágenes y tablas presentadas en el documento.
7. En la versión anterior, se hablaba de la estación MOCARI (13070150), en esta versión en el numeral 2.11.1 Precipitación segundo párrafo se habla de las estaciones de El Limón, Lorica, Carrizal, Callemar, Santa Rosa y San Carlos, y tanto en el informe como en los anexos se presentan los datos de la estación Sahagún, lo cual se deberá aclarar.
8. Revisar lo señalado a lo largo del numeral 3.1.1 Intensidad de lluvia, tabla 3.1 se habla que la **estación pluviométrica Sahagún** será la estación utilizada para la definición de las curvas IDF y en el párrafo dos del mismo numeral refieren estación Puerto Libertador, en el numeral 4.1.1, para el cálculo del caudal del box – culvert se emplea la estación climatológica Cristo Rey y en la tabla 4.2 nuevamente se describen las generalidades de la estación Sahagún.

9. De acuerdo con lo señalado anteriormente, es importante se aclarar la estación con la que de desarrollará el ejercicio de hidrología para el proyecto en general.
10. Presentar la localización de las estaciones analizadas resaltando la tomada para el desarrollo de los diseños hidrológicos.
11. De igual manera en el informe se habla de datos como precipitación anual, periodo de lluvias, intensidad, promedio de lluvias entre otros; es importante que presenten el análisis y procesamiento de datos de las estaciones climatológicas e hidrométricas utilizadas para el proyecto.
12. Es necesario complementar el numeral sobre precipitación con respecto al tratamiento de información hidrológica, indicando como se realizó de complementación de datos faltantes, el análisis de confiabilidad y homogenización de información y verificación de datos anómalos de las series históricas utilizadas para la determinación de caudales.
13. Presentar el plano correspondiente a la delimitación de las cuencas resultantes en el área de estudio, de acuerdo con los puntos en donde se identifican escorrentías intermitentes o fijas que cruzan el corredor. Planchas IGAC utilizadas en el análisis del proyecto.
14. De debe incluir una conclusión o cuadro resumen final con las cuencas finales que tienen interferencia directa con el corredor, indicando cuales fueron los parámetros definidos para el cálculo de caudales, como tiempo de concentración, CN, coeficiente de escorrentía, etc.
15. Describir la metodología implementada para la determinación de la intensidad para los diferentes periodos de retorno.
16. Con respecto a la definición del coeficiente de escorrentía, este se deberá evaluar según los valores en áreas rurales de acuerdo con lo señalado en el Manual de drenaje del INVIAS.
17. Con relación a las áreas de drenaje, es necesario que se presenten los planos correspondientes con formatos y escala adecuada, en donde se identifique con claridad cada una de la cuencas delimitas de acuerdo con la red de drenaje del IGAC con el fin de soportar la información.
18. La figura 3.2 Esquema de áreas de drenaje trazadas para la evaluación de las vías, no es clara. Al parecer la figura corresponde a otro proyecto. Aclara lo correspondiente.
19. Para el tiempo de concentración es importante realizar el calculo correspondiente, por lo menos con tres ecuaciones de las indicadas en el manual de drenaje, con el fin de comparar los valores y definir cuál es el más adecuado o si el promedio entre ellos arroje una mejor estimación. En el informe no se realiza ningún calculo ni se da un valor al respecto.
20. Con respecto a los cálculos hidráulicos y la metodología numeral 3.2.1, se deberá revisar lo señalado, al parecer hace referencia a un proyecto de urbanismo vial.
21. Presentar el plano planta-perfil indicando la infraestructura proyectada cunetas, box culvert, como la existente en caso que corresponda, indicando si se mantiene, rehabilita o se elimina para ser reemplazada.
22. Para el caso de las cunetas proyectadas y box culvert se debe indicar la disposición final. Así mismo, incluir el detalle del descole.
23. Incluir las secciones transversales de la vía con el fin de verificar que toda la vía se encuentra en terraplen, la no necesidad de implementación de zanjas de coronación y avalar el área aferente tomada para el diseño hidraulico de las cunetas. Asi como la implementación de algún tipo de estructura de disipación en la descarga de las obras hidruálicas propuestas.

Todos los comentarios aquí emitidos deben ser atendidos o justificados, teniendo en cuenta que todo lo que se solicita está basado en el anexo técnico del proyecto, así como reglamentación y Manual de Drenaje de Carreteras del INVIAS.

Teniendo en cuenta que aún se presentan observaciones en general, NO se emite concepto de viabilidad hidráulica al proyecto, ya que la versión entregada no cuenta con el cumplimiento total de los anexos técnicos y normatividad vigente.

La revisión realizada se circunscribe esencialmente a la especialidad de estudios hidráulicos, con base en la información y estudios presentados, siendo responsabilidad única del Contratista y de su Consultor los resultados obtenidos y la consideración de otras condiciones técnicas y económicas de las demás especialidades, que deban intervenir en los diseños finales para construcción, con el objeto de garantizar la efectividad y estabilidad de las obras exigidas en el Contrato suscrito.

Cordialmente,



JENNYFER ABRIL CARO
Especialista Hidráulica

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2022

IMG_SCL_02_122022


Señores
Consorcio Vial Rural IMG
Att. Ing. FREDY RODRÍGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría

Ref.: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES.

Asunto: COMUNICADO OFI-CVV-025-2022. SEGUNDA REVISIÓN DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

Respetado Ingeniero Rodríguez.

Una vez realizada la revisión de la información remitida para la revisión del Estudio Hidrológico e Hidráulico del Contrato de la referencia, de la cual se recibió la siguiente información:





A continuación, se presentan las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES

1. De acuerdo a lo señalado en el informe item 4.3 Propuesta de Diseño página 16 *"si bien la intención es conservar las estructura propuestas inicialmente, en algunos casos (K2+490) se presenta o se ve en la necesidad de modificar las dimensiones geométricas de las estructuras propuestas en el estudio inicial, con la finalidad de respetar las cotas de fondo de la estructura existente, la capacidad actual de las estructuras existentes y quedar por encima del NMA seleccionado, lo que permite que si en determinado momento se presenta nuevamente este fenómeno la estructura no se encuentre sumergida afectando el paso del agua por la obstrucción generada".* Es importante se aclare el porque cual será el manejo de las estructuras localizadas en abscisa K0+004.00, K0+010.00, K0+368.00, K0+575.00,

K0+954.00, K1+200.00, K1+460.00, K1+656.00, K3+184.00, las cuales son tanto proyectadas como existentes a conservar, las cuales se encuentran por debajo del NMA seleccionado (Cota 1.83), como se observa en las siguientes imágenes.

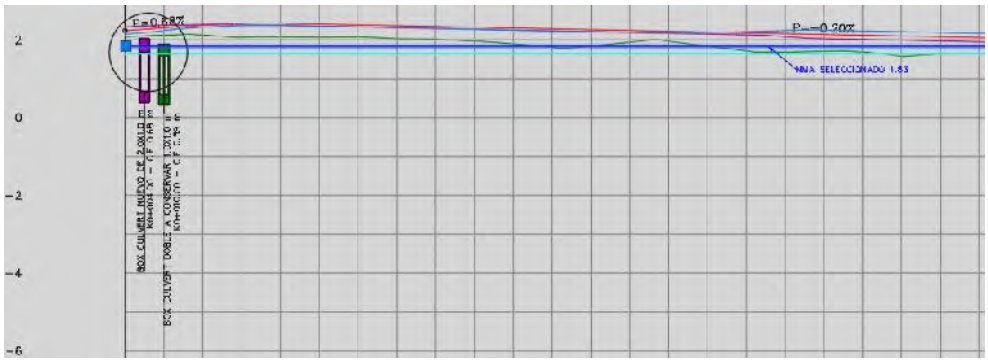

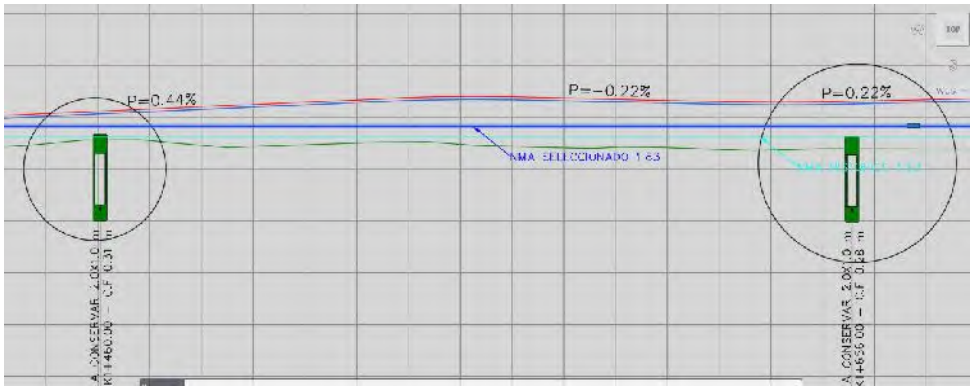

Teniendo en cuenta que las observaciones fueron atendidas, una vez se atienda, corrija y/o justifique la inquietud señalada, se dará concepto de viabilidad y proceder con la radicación de este ante la Entidad.

La revisión realizada se circunscribe esencialmente a la especialidad de redes hidráulicas, con base en la información y estudios presentados, siendo responsabilidad única del Contratista y de su Consultor los resultados obtenidos y la consideración de otras condiciones técnicas y económicas de las demás especialidades, que deban intervenir en los diseños finales para construcción, con el objeto de garantizar la efectividad y estabilidad de las obras exigidas en el Contrato suscrito.

Cordialmente,

JENNYFER ABRIL CARO
Especialista Hidráulica

5.3.3. INFORME ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

Montería – Córdoba, 22 de diciembre de 2022
AJV-041-2022

SEÑORES
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atención: Ingeniero Fredy Rodriguez
Director de interventoría
c.vialruralimg@gmail.com
Ciudad


Referencia: Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba

Asunto: REVISIÓN 3 "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SANTA CRUZ DE LORICA, SANTALUCÍA – LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"

Respetado ingeniero Fredy:

Atendiendo su solicitud, a continuación presento la Revisón 3, del proyecto del asunto, realizado por la empresa INGELABCON SAS, en donde el contratista solicita la implementación de un espesor adicional de mejoramiento, en virtud de la presencia de zonas potencialmente inundables.

Inicialmente, se tenía la siguiente estructura de pavimento aprobada para ser implementada.



Luego de varias reuniones y visitas al proyecto, se detectaron zonas con problemas probables de inundación que fueron revisadas por las diferentes disciplinas que intervienen en el proyecto, pero principalmente, la especilidad de hidrología e hidráulica concluyó, que pueden presentarse zonas inundables entre las siguientes abscisas:

Continuación AJV-035-2022-2

K0+000 al K3+050

K5+370 al K8+145.4

K10+264 al K11+820

K12+168 al K12+465

De igual manera, entre las abscisas K3+050 al K5+370 se incluyó una capa de piedra rajón para estabilizar la subrasante, acompañada de geotextil NT 2500 o similar.

En la siguientes fotografía, se ilustra el estado de algunos de los tramos de la vía en estudio y que deberán ser intervenidas con medidas adicionales para su estabilización.



De acuerdo con lo anterior y lo recomendado por las diferentes disciplinas en aras de obtener unas vías cómodas, seguras y duraderas, esta consultoría considera adecuados los tratamientos adicionales a llevar a cabo.

Bajo estos parámetros, se mantienen las condiciones y espesores aprobados para la estructura de pavimento, los cuales se presentan a continuación:

Continuación AJV-035-2022-3

Losa de comcreto: 0.20 m, MR 4.0 MPa
Subbase Granular: 0.15 m

Se deben revisar los niveles del diseño geométrico para asegurar que la vía supere los niveles de aguas máximas detectados en campo y verificados mediante análisis hidrolóigico y topográfico.

Es importante anotar que el alcance de esta revisión se limita a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y no exime al contratista y a su consultoría de las respondabilidades con la seguridad y estabilidad de las obras.

Cordialmente,

AJV INGENIEROS SAS



AZAEL JAIMES VILLAMIZAR
Especialista en pavimentos

5.3.4. INFORME ESPECIALISTA GEOMÉTRICO

MEMORANDO DG-7

PARA: **CONS. VIAL RURAL IMG-. ING. FREDY RODRIGUEZ -. Director Interventoría.**
DE: **ING. JUAN CARLOS MORALES ALBA -. Esp. Diseño Geométrico.**
ASUNTO: **INTERVENTORIA A MANTENIMIENTO VÍA TERCIARIAS COLOMBIA RURAL – CÓRDOBA LOTE 2**
Revisión – RESPUESTA OBERVACIONES LORICA
FECHA: **20 DE DICIEMBRE DE 2.022**

Un vez revisada la información de diseño geométrico del proyecto del asunto, se formulan comentarios, así:

INFORME

El documento trata los aspectos principales que describen parámetros de diseño, asignando a la vía características y parámetros de vía terciaria, con velocidad de diseño de 20 Km/h. en relación con la guía de diseño de pavimentos PLACA-HUELLA- en el documento se indica que todas las curvas del diseño, se asimilan a las curvas tipo 1 de la guía.

DISEÑO

La planimetría indica un diseño con curvas sucesivas; los elementos de curvatura indican radios que superan 150m, con lo que se cumple lo recomendado en a guía de diseño.

PLANOS

Se muestra el diseño horizontal y vertical, conforme con lo indicado en el informe y las limitantes de este tipo de proyectos.

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista de la geometría vial, los planos e informe cumplen lo requerido para solución de apvimento PLACA-HUELLA. Los anexos incluyen coordenadas del proyecto, información que acilita el replanteo.

Para el proceso de obra –propiamente dicho- es conveniente disponder de los detalles que faciliten La construcción de los elementos estructurales (Riostras) propios de este tipo de solución.

Atentamente,

JUAN CARLOS MORALES ALBA
Ingeniero Civil – Especialista en Vías

MEMORANDO DG-8


PARA: **CONS. VIAL RURAL IMG-. ING. FREDY RODRIGUEZ -. Director Interventoría.**
DE: **ING. JUAN CARLOS MORALES ALBA -. Esp. Diseño Geométrico.**
ASUNTO: **INTERVENTORIA A MANTENIMIENTO VÍA TERCIARIAS COLOMBIA RURAL – CÓRDOBA LOTE 2**
Revisión – DISEÑO GEOMÉTRICO-. EL CASTILLO
FECHA: **20 DE DICIEMBRE DE 2.022**

Un vez revisada la información de diseño geométrico del proyecto del asunto, se formulan comentarios, así:

INFORME

El documento trata los aspectos principales que describen parámetros de diseño, asignando a la vía características y parámetros de vía terciaria, con velocidad de diseño de 40 Km/h. Aplicando parámetros generales, tomados del Manual de Diseño Geométrico de carreteras INV-2.008. (Ver tabla 13 – pág.27)

Pese a esto, lo que muestra en figura 6 (pág. 28) y planos es otro tipo de solución. En el documento se debe hacer claridad sobre la implantación de solución mediante PLACA-HUELLA.

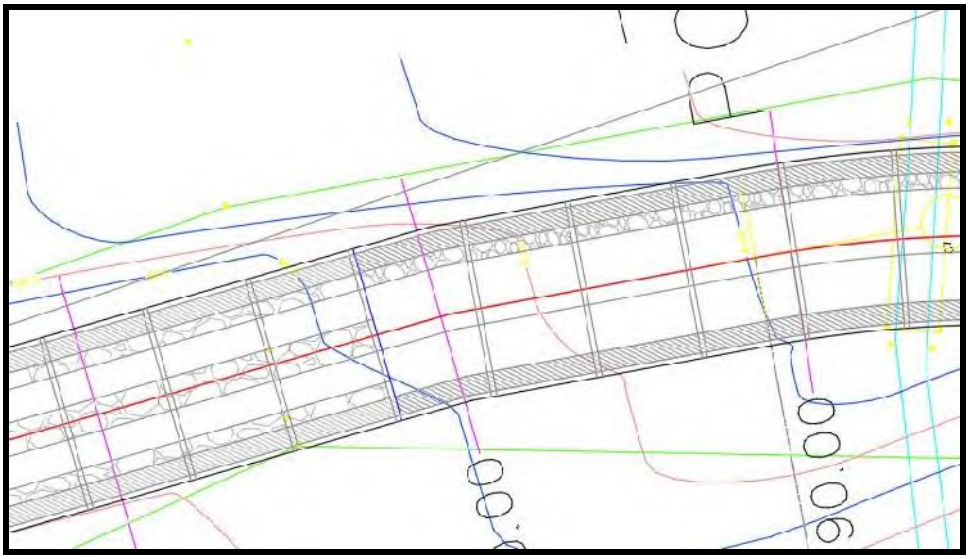

Vista de Plano Planta-perfil
Fuente: Planos de Contratista.

En consecuencia, el informe, a pesar de tratar los aspectos generales de un diseño vial, es inconsistente frente a lo ilustrado en planos. Los parámetros de Tabla 13, no aplican en el diseño presentado.

En este sentido, es necesario, una vez adoptado el tratamiento mediante PLACA-HUELLA, definir en cada curva, que tipo de solución aplica –*Según la Guía de diseño de pavimentos Placa-Huella-* de las 12 que recomienda la guía PLACA-HUELLA; con lo cual se definen los sobreanchos requeridos y demas elementos necesarios para el replanteo y construcción.

DISEÑO

Se planteo un diseño ceñido alla infraestructura existente, en sentido horizontal y vertical.

En general, los elementos asignados al eje de diseño, en sentido horizontal y vertical cumplen lo requerido. Es necesario, para el documento final, definir el tipo de curva a implantar, conforme con lo que recomienda la Guía para pavimentos PLACA-HUELLA

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista de la geometría vial, el eje de diseño cumple lo requerido para solución de pavimento PLACA-HUELLA. Los anexos incluyen coordenadas del proyecto, información que facilita el replanteo.

Para el proceso de obra –propiamente dicho- es necesario definir el tipo de curvatura a implementar y la necesidad de sobreanchos; así como todos los detalles que faciliten la construcción de los elementos estructurales (Riostras) y sobreancho propios de este tipo de solución. (Actualizar planos).

Se requiere la actualización del informe, de manera que se tenga consistencia total de los documentos que respladan el diseño a construir.

Atentamente,

JUAN CARLOS MORALES ALBA
Ingeniero Civil – Especialista en Vías

5.3.5. INFORME ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Bogotá DC, diciembre 2 de 2022

Señores:
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de interventoría

REFERENCIA: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA – COREA - EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA".

Asunto: Concepto revisión N° 2 diseños estructurales

Ciudad

Reciba un cordial saludo, por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 1 de diciembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

Adjunto recibieron los siguientes documentos:

- MEMORIA ACO5TA IC PT10 R1 (PDF)
- EST_PT_VL_10M (DWG)
- ESTUDIO DE SUELOS PUENTE CANDELARIA RODEO (PDF)

En el presente informe se realiza la verificación de cada uno de los puntos indicados en el informe del 31 de octubre de 2022, para la verificación, las respuestas que se muestran en **color** verde, indican que la observación fue atendida, aquellas que se muestran en color **rojo** indican que la observación aún está pendiente de ser subsanada y en **naranja** que la observación no fue subsanada por completo:

1. En el numeral 3 de las memorias de cálculo, se especifica que la resistencia a la compresión del concreto de la superestructura es de *28 MPa*, sin embargo, en el diseño de estos elementos y en los planos, se contempla una resistencia de *21 MPa*.

RTA: Observación atendida.

2. Se observa en las memorias que en los diseños se usó como lineamiento la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14, y en los planos se indica el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 1995.

RTA: Observación atendida.

3. No se especifica el factor de ampliación por carga dinámica empleado en diseño de la súper estructura.

RTA: Observación NO atendida. Es necesario indicar en el documento los valores empleados.

4. En los planos, se indica que el espesor de la capa de rodadura es de 0.05 m, pero en el numeral 4.2.2 están tomando un espesor de 0.08 m.

RTA: Observación atendida.

5. En el anexo A. DATOS DE ENTRADA SUPERESTRUCTURA se observa que el espesor de la capa de rodadura es 0.00 m, lo cual no concuerda con lo especificado en el numeral 4.2.2 o en los planos.



Ilustración 1. Geometría de la superestructura, memorias V1.

RTA: Observación atendida.

6. Adicionalmente, se indica que el sobre espesor inicial de volado es del 0.03 m y en el numeral 4.1.5 este valor es de 0.05 m.

RTA: Observación NO atendida. Se observa que se retira este ítem del avalúo de cargas, sin embargo, en el diseño si se está teniendo en cuenta. Adicionalmente, no se acota este valor en los planos, el cual es necesario para el proceso constructivo.



Ilustración 2. Geometría de la superestructura, memorias V2.

7. En las constantes de diseño de la superestructura, se observa una resistencia de *210 kg/cm2*, la cual no concuerda con lo especificado en el numeral 3 (*280 kg/cm2*).

CONSTANTES DE DISEÑO	
F'c del Concreto (kg/cm2)	210
Fy del Acero a Flexión (kg/cm2)	4200
Fy del Acero Flejes (kg/cm2)	4200
Ø Varilla Flejes (Octavos Pulg)	4
Número de Ramas Fleje Típico	2
Ø Mín Varilla Viga (Octav Pulg)	8
Ø Mín Varilla Losa (Octav Pulg)	4
Recubrim Centroid d' Losa (cm)	5
Recubrimiento d' Vigas (cm)	15

Ilustración 3. Constante de diseño.

RTA: Observación atendida.

8. Se observa en las memorias de cálculo, que no se tuvo en cuenta la carga por capa de rodadura para el diseño de la losa del tablero (Anexo B. CONDICIÓN 4), es necesario considerar esta carga, al igual como se hizo para el diseño de las vigas.

RTA: Observación atendida.

9. El refuerzo para momento positivo observado en los planos, es inferior al requerido por el diseño ya que se asignó *24.875 cm2* y se requiere *28.5 cm2*. Adicionalmente, se muestra en las memorias, un esquema en el que refuerzo tampoco coincide con el de los planos.

Mom Mu(-) Máximo Abs = -9.934 t-m / m		
	Valor	Simbología
Mu	9.934 t-m	Momento mayorado en la secc
K	587.813 t/m2	Mu/bd^2
m	23.529	fy/0.85f'c
Ro Calc	0.02049	Cuantía Acero de Diseño
As calc	26.64 cm2	Area Refuerzo Calculado (por m)
Ic	0.0005 m3	Mom de Inercia de Sección Bruta
fr	28.693 kg/cm2	Módulo de Ruptura : 1.98(f'c)^1/2
Mcr	1.55 t-m	Mom Agrietamiento
Asmin(Mcr)	3.25 cm2	Acero para Mom_Agrietam.
1.33Ascal	35.43 cm2	Acero Calculado x 1.33
Acero Domina	26.64 cm2	As(calc) > As Mín (Mcr)
Arm Ppal Sug.	1 # 6 @ 0.1	Armad Ppal Real Propuesta
As real Coloc	28.5 cm2	Area de Acero Real Colocado
c	7.89 cm	Alt blq compr: AsFy/.85f'cBetab
εt	0.0038	0.003(dt-c)/c
Chequeo	et<=0.005	Bajar Phi ó Aumentar Espesor
As RetracTemp	2.33 cm2/m/cara	2.33<=0.75bh /(2(b+h)Fy)<=12.7
Arm Retr Sug.	1 # 3 @ 0.25	Armad Retracc Propuesta

Ilustración 4. Diseño de la armadura para momento negativo.

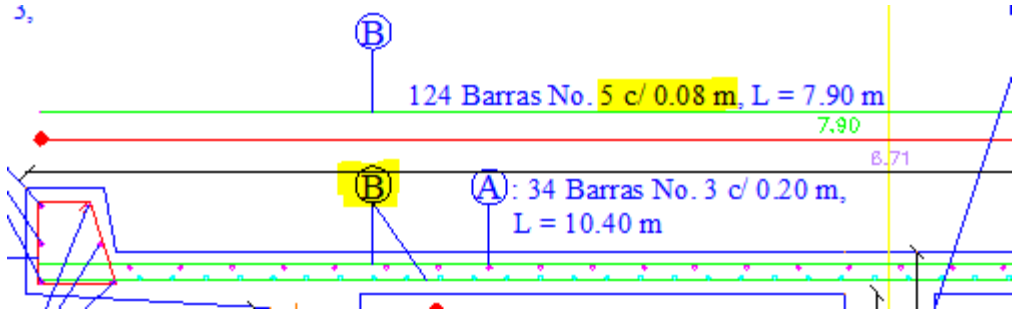


Ilustración 5. Refuerzo para momento negativo indicado en planos.

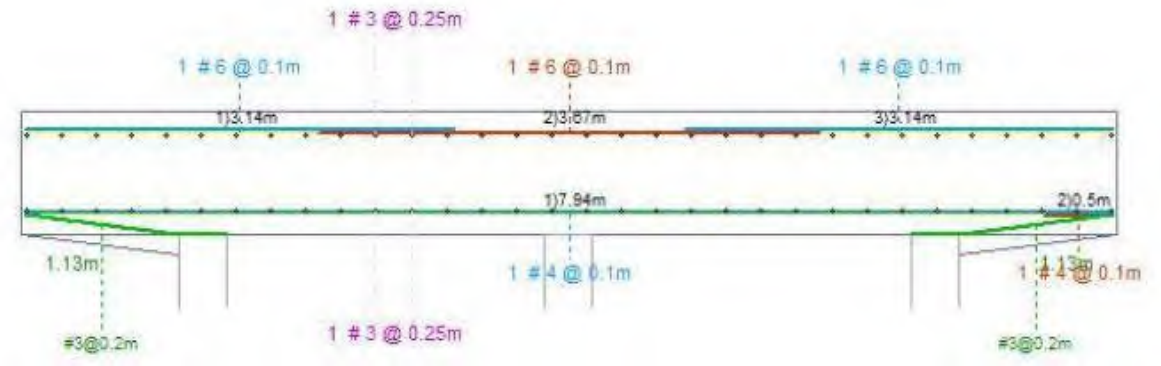


Ilustración 6. Refuerzo de la losa (memorias).

RTA: Observación atendida.

10. En la tabla *Constantes de diseño para las vigas del tablero*, se asigna una resistencia para el concreto de *210 kg/cm2*, sin embargo, en el numeral 3 esta es de *280 kg/cm2*.

Constantes de Diseño para las Vigas del Tablero	
Resistencia Mínima del Concreto F'c (kg/cm2)	210
Límite de Fluencia del Acero, Fy (kg/cm2)	4200
Usar Diámetro Varillas en milímetros o en pulgadas	pulg
Diámetro Mín a usar en Acero Longitudinal Ppal, #	8
Diámetro Mínimo a usar para Acero Flejes, #	4
Diámetro Mín. a usar para Acero Long Secundar, #	4
Sep. Máx para Flejes Zona Apoyos (Criter.Usuario) (m)	0.12
Sep.Vert. Máx Varillas Secund Long (Criter.Usuario) (m)	0.25

Ilustración 7. Constantes de diseño para las vigas del tablero.

RTA: Observación atendida.

11. En el Anexo C. se indica un peso por capa de rodadura de *0 t/m2* para el diseño e las vigas, se solicita asignar la carga indicada en el numeral 4.2.2 (*0.428 t/m*).

VIGA EXTERIOR

Carga Muerta en la Viga: Losa y Pavimento. Peso por la Viga

ÍTEM	Valor
Carga por Losa Tablero, W(DC)	0.432 t/m2
Carga por Capa Rodadura W(DW)	0 t/m2
Carga W = W(DC) + W(DW)	0.432 t/m2
Resolución de la Viga Continua	
Reacción Lineal a Viga Exterior R(DC&DW)	1.222 t/m
Peso de la Viga propiamente dicha	
Reacción Lineal a Viga Ext R(P.P.Viga)	0.445 t/m
Reacción Lineal Viga Ext R(DC incluy P.P.vig)	1.667 t/m
Reacción Lineal a Viga Ext R(DW)	0 t/m

Carga Muerta en la Viga. Bordillo o Parapeto y SobreEsp Volado

ÍTEM	Valor
Carga Puntual por Bordillo o Parap, W(C&P)	0.36 t/m
Brazo C.Punt Bord o Parap	0.175 m
Carga Punt por SobrEspesor Volado	0.042 t/m
Brazo C.Punt SobreEspesor Volado	0.77 m
Carga Punt por Baranda	0.15 t/m
Brazo C.Punt por Baranda	0 m
Resolución de la Viga Continua	
Reacción Lineal a Viga Exterior R(C&P&sobrE&Bar)	0.91 t/m


Ilustración 8. Carga muerta en la viga exterior.

VIGA INTERIOR

Cálculo de las Cargas Muertas en la Viga INTERIOR

ÍTEM	Valor
Carga Peso Viga TE, DC(t-beam)	1.599 t/m
Carga Total Peso Bordillos y Barandas	0.72 t/m
Carga por c/Viga Peso Bord y Barandas (C&P&Bar)	0.24 t/m
Reacción a Viga Int R(DCvigaTE & C&P&Bar)	1.839 t/m
Ancho Efectivo Viga TE (b')	2.67 m
Reacción a Viga Int Pavimento R(DW)	0 t/m

ANÁLISIS POR CARGA DE LOSA Y PAVIMENTO



R(DCvigaTE & C&P&Bar) = 1.839 t/m

R(DW) = 0 t/m

Ilustración 9. Cargas muertas en la viga interior.

V- M por CMuerta

SOLIC POR C MUERTA EN LA SECC CRITICA DE CORT. V EXT

X (m)	0.749
Mom C.Losa, Viga, Bord, Bar, Sobresp	5.78
Mom Carga por Diafragmas o Riostras	0.07
Mom C. DC TOT	5.85
Mom C. Pavimento o Rodadura	0
Cort C.Losa, Viga, Bord, Bar, Sobresp	7.09
Cort Carga por Diafragmas o Riostras	0.1
Cort C. DC TOT	7.18
Cort C. Pavimento o Rodadura	0

SOLIC POR C MUERTA EN LA SECC CRITICA DE CORT. V INT

X (m)	0.749
Mom C.Losa, Viga, Bord, Bar, Sobresp	6.37
Mom Carga por Diafragmas o Riostras	0.15
Mom C. DC TOT	6.52
Mom C. Pavimento o Rodadura	0
Cort C.Losa, Viga, Bord, Bar, Sobresp	7.82
Cort Carga por Diafragmas o Riostras	0.19
Cort C. DC TOT	8.01
Cort C. Pavimento o Rodadura	0

Ilustración 10. V-M por carga muerta (vigas).

RTA: Observación atendida.

12. Adicionar la carga por capa de rodadura (DW) para el diseño a flexión y cortante de las vigas, especificada en el numeral 4.2.2. *(0.428 t/m).*



13. *Ilustración 11. Diseño a flexión y cortante de las vigas.*

RTA: Observación atendida.

14. En el chequeo de deformaciones de la viga, no se está considerando la carga DW indicada en el numeral 4.2.2, adicionalmente, el valor obtenido de contraflecha, no coincide con el indicado en los planos.

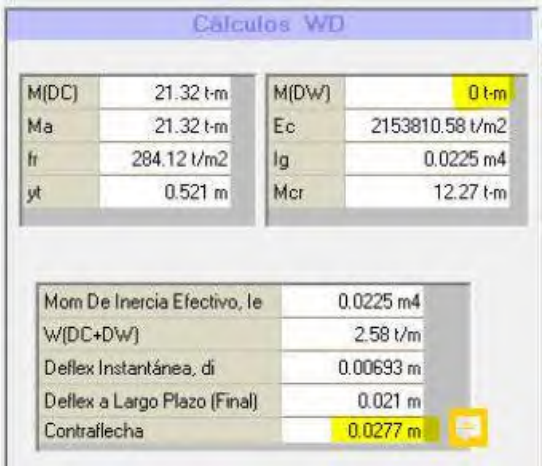


Ilustración 12. Chequeo deformaciones de la viga.

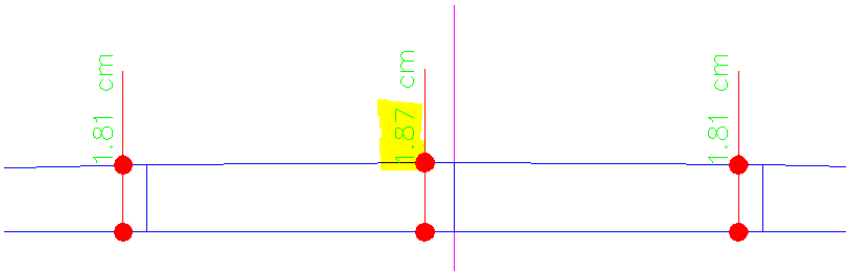


Ilustración 13. Diagrama de contraflecha, planos.

RTA: Observación atendida.

15. El refuerzo de las vigas, observado en las memorias no coincide con el dispuesto en los planos.

RTA: Observación atendida.

16. A pesar de que se realizó el diseño para una barrera de tráfico tipo New Jersey (TL-4), no se observa que esta se haya incluido en los planos.

RTA: Observación atendida.

17. Las dimensiones del estribo (Anexo E), no coinciden con las observadas en planos.

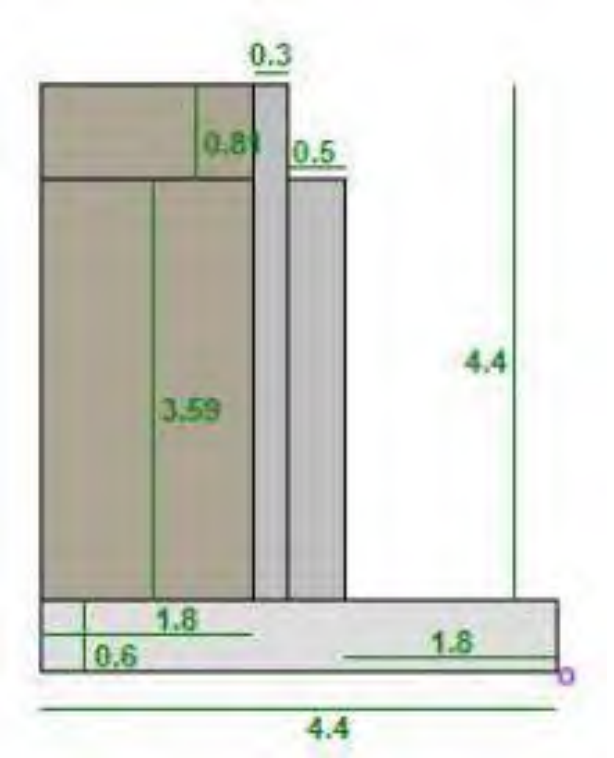


Ilustración 14. Dimensiones de los estribos (memorias).

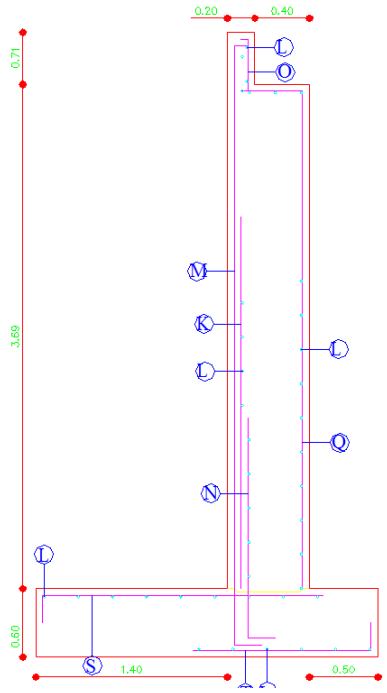


Ilustración 15. Dimensiones y refuerzo de los estribos (planos)

RTA: Observación atendida.

18. El detalle de la armadura de las memorias de cálculo, no coincide con el detalle observado en los planos. Adicionalmente, se solicita incluir refuerzo por retracción y fraguado, en la zarpa delantera.

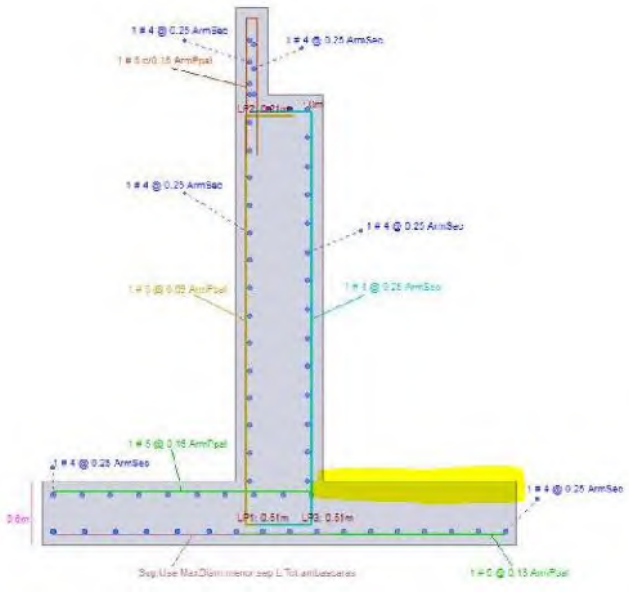


Ilustración 16. Refuerzo de los estribos (memoria).

RTA: Observación atendida.

19. En el Anexo F, se realiza el diseño para la losa de aproximación, sin embargo, no se incluyó en los planos. Adicionalmente se solicita incluir el diseño de la ménsula sobre la cual se apoyará la losa de aproximación.




Ilustración 17. Ménsula.

RTA: Observación PARCIALMENTE atendida. Aunque se incluyó la losa de aproximación en los planos, no se anexó el diseño de la ménsula en las memorias.

20. En el Anexo G, se realiza el diseño para los apoyos de neopreno, sin embargo, no se incluyó el esquema de este en los planos.

RTA: Observación atendida.

21. Corregir el esquema del apoyo de neopreno, ya que no se observa las capas exteriores de elastómero, por lo tanto, al sumar las medidas observadas en el plano, el espesor da 48 mm, no 54 mm.

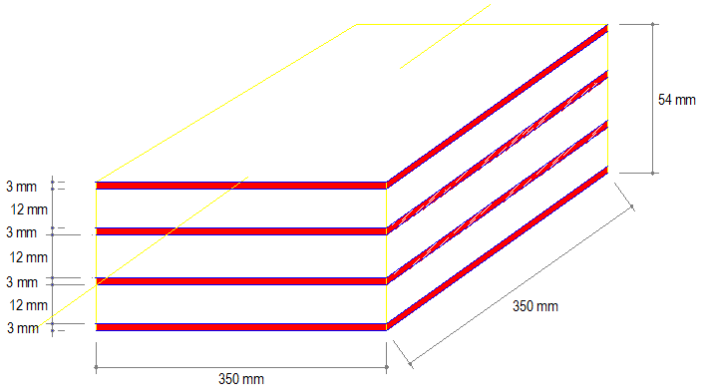


Ilustración 18. Detalle del neopreno.

22. Es necesario añadir el esquema y refuerzo de los topes sísmicos en los planos.

RTA: Observación PARCIALMENTE atendida, ya que no se observa un corte trasversal de los topes sísmicos. Adicionar para facilitar el proceso constructivo.

23. Las dos medidas señaladas en azul (largo del tope) no coinciden.

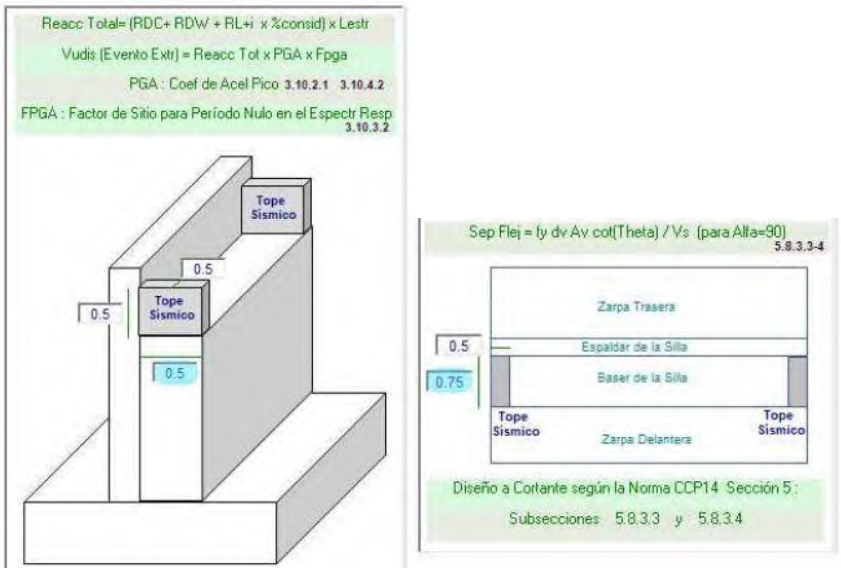


Ilustración 19. Estribos con topes sísmicos.

RTA: Observación atendida.

24. Incluir en los planos, los muros de acompañamiento y su respectivo refuerzo, ya que estos fueron diseñados en las memorias de cálculo. En los planos, estos se incluyen de manera muy esquemática y no contiene la información completa.

RTA: Observación PARCIALMENTE atendida, ya que no se observa un corte trasversal de los muros de acompañamiento. Adicionar para facilitar el proceso constructivo

25. La altura del diafragma y el refuerzo obtenido en el diseño, no coincide con el observado en los planos.




Ilustración 20. Esquema del diafragma, memorias.




Ilustración 21. Esquema del diafragma, planos.

RTA: Observación PARCIALMENTE atendida. Aunque se corrigió la coincidencia del refuerzo entre planos y memorias, la altura del diafragma indicada en las memorias, no coincide con la observada en planos.

Parte A : Cálculo de la Carga Factorada . Chequeo del Diafragma como Viga Profunda

Ítem	Descripción	Valor
C.Muerta DC: Peso del Diafragma	0.25 x 0.46 x 2.35 x 2.4 / 2	0.32 t / rueda
C.Viva: Camión de Diseño	16 / 2	8 t / rueda
C.Viva: Carril de Diseño	1.03 x 1.8 / 2	0.93 t / rueda
Carga Total Factorada Pu	1.25x0.32 + 1.75x1.33x8 + 1.75x0.93	20.65 t / rueda
Reacciones R	20.65 x 2 / 2	20.65 t
Longitud Libre del Diafragma, ln	2.35 - 0.35	2 m
Altura del Diafragma	0.71 - 0.25	0.46 m
Relación ln / h	2 / 0.46	4.35
Chequeo Viga Profunda	ln / h = 4.35 >= 4	Viga Normal

Ilustración 22. Chequeo del diafragma como viga profunda, memorias V2.

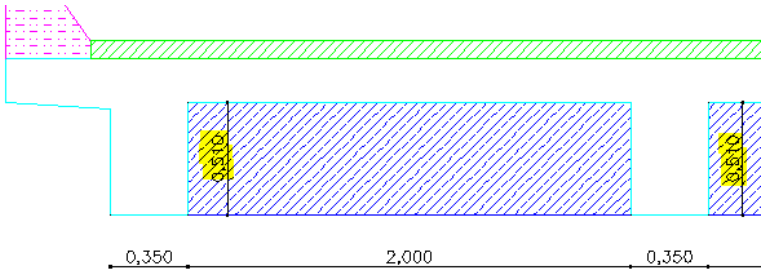


Ilustración 23. Altura del diafragma, plano P3.

26. Adjuntar el estudio de suelos, donde se puedan corroborar los parámetros empleados para el diseño.

RTA: Observación atendida.

27. En el plano P1, notas generales, se menciona que las longitudes de desarrollo y de traslapo deben ajustarse a las indicadas en las NSR-10. Se solicita corregir este enunciado, ya que al tratarse de un puente, se debe considerar el CCP-14 no la NSR-10.

28. Las capacidades portantes para EE, ELS y ELR observadas en las memorias, no se encuentran en el estudio de suelos, es necesario indicar de donde se tomaron estos valores.

Por lo tanto, tomar una capacidad portante de 188 KPa para un nivel de fundación de -2.00m

EN CIMIENTOS AISLADOS Ahora para los cimientos corridos se puede tomar como 165 KPa.

Ilustración 24. Capacidades portantes, Estudio de suelos.

29. Indicar los ganchos de las barras en medidas constructivas.

30. Mejorar la presentación de la implantación en planta, ya que las cotas del abscisado tienen un tamaño demasiado grande e impiden la correcta visibilidad.

31. El refuerzo de la losa de aproximación observado en los planos, no coincide con el obtenido en el diseño.



Ilustración 25. Despiece de la losa de aproximación, memorias V2.

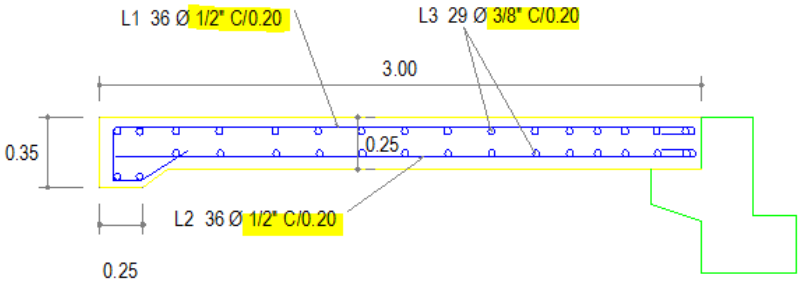


Ilustración 26. Despiece de la losa de aproximación, plano P5.

32. No se encontró cartilla de cantidades estructurales de obra. Se solicita su inclusión, esta debe contener un cuadro resumen de cantidades donde se totalice el peso de acero por barra, y el volumen total de concreto de toda la estructura. No sé tiene claridad de a que se refiere el volumen indicado en los planos ya que por ejemplo, en el caso de las vigas, no se indica el volumen y dice que no aplica.

33. Indicar las combinaciones de carga empleadas en el diseño.

34. Indicar en la implantación el sentido del flujo de agua.

35. Adjuntar el documento de soporte hidráulico, donde se especifique el Nivel Máximo de Agua (NMA).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque fueron subsanadas la mayor parte de las observaciones, se solicita al Contratista atender las observaciones faltantes con la mayor brevedad posible, donde se lleve a cabo la corrección y/o complementación a los planos y memorias a nivel de Fase III, de igual manera remitir la información faltante con el fin de realizar la revisión estructural pertinente.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

www.jrtestructurales.com

Bogotá D.C., diciembre 19 de 2022

Señores:

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra No LP-MSBV-002-*2022*, Cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO.

Asunto: Revisión OF 56-15-12-2022 Consorcio Vial San Bernardo

Reciba un cordial saludo; por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 16 de diciembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

- Se recibió la siguiente información:

- **Memorial de responsabilidad** por parte del ing. Fabio Luis Acuña (especialista estructural), donde aclara que los diseños de obras menores y estructuras del **Municipio de San Bernardo del Viento**, Córdoba, fueron adoptados de la "Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.

- **Memorial de responsabilidad** por parte del ing. Miguel García Romani (especialista en vías y transporte), donde indica que los diseños de obras menores y estructuras del **Municipio de San Bernardo del Viento**, Córdoba, fueron adoptados de la "Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.

- **Oficio de respuestas**, respondiendo a cada una de las observaciones planteadas en la reunión virtual del 2 de diciembre de 2022, Consorcio Vial San Bernardo.

- **Dos (2) planos estructurales** de alcantarilla de 36" para San Bernardo del Viento, ubicado en el departamento de Córdoba.

- <u>Observaciones</u>:

1- En el memorial del Especialista Estructural se hace referencia a la norma NSR10, la cual NO aplica para este tipo de estructuras. Se solicita corrección, aclarando que la norma aplicable es el CCP14.

2- A pesar de que el oficio de respuestas así lo indica, NO se recibió el aparte de la Cartilla Colombia Rural de las estructuras anunciadas. Se solicita su inclusión.

3- En el oficio de respuestas se indica que se presentan planos de un box culvert con su abscisado. Se solicita que se incluya, ya que no se encontró en los documentos recibidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al Contratista atender a cada una de las anteriores observaciones con la mayor brevedad posible.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

Bogotá D.C., diciembre 15 de 2022

Señores: **OFICIO-CVV-019-2022**

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra No LP-MSBV-002-2022, Cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES".

Asunto: Concepto revisión No 3 diseños estructurales

Reciba un cordial saludo; por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 14 de diciembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

- Se recibió la siguiente información:

• **Memorial de responsabilidad** por parte del ing. Fabio Luis Acuña, donde aclara que los diseños del box culvert de las estructuras del **Municipio de San Bernardo del Viento**, Córdoba, fueron adoptados de la "Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural. Dado lo anterior se **atiende la observación conforme a la reunión realizada el 2 de diciembre**.
• Oficio de respuestas, respondiendo a cada una de las observaciones planteadas en la reunión virtual del 2 de diciembre.
• **Plano estructural** del Box Culvert San Bernardo del Viento, ubicado en Cordoba (J-P113-DC-01)

- Observaciones:

• Si bien el plano estructural presenta la separación de las barras de refuerzo solicitada en la reunión y en el oficio, **no presenta el cuadro de cantidades** donde se indique el peso de cada una de las barras y el total de estas del Box Culvert, de igual modo que la cantidad de concreto efectuada. Se solicita incluir el cuadro de cantidades respectivamente, indicando el peso de cada una de las barras que conforman la estructura y el total de concreto y acero.
• Se indica en el rótulo del plano estructural la referencia del Box Culvert de la cartilla anteriormente mencionada, no obstante, **no se muestra la imagen o figura de referencia tomada directamente de la cartilla con su respectiva referencia**. Se solicita incluirla.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al Contratista atender a cada una de las anteriores observaciones con la mayor brevedad posible.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

Bogotá D.C., diciembre 16 de 2022

Señores: **OFICIO-CMS-024**

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de interventoría

REFERENCIA: Contrato de Obra No 232-2022, Cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA – LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA".

Asunto: Concepto revisión No 3 diseños estructurales

Ciudad

Reciba un cordial saludo; por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 15 de diciembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

- Se recibió la siguiente información:

• Documento Técnico Análisis Estructural por parte del ing. Fabio Luis Acuña, donde aclara que los diseños del box culvert de las estructuras del Municipio de Santa Cruz De Lorica, Córdoba, fueron adoptados de la "Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.
• Documento Técnico Valoración Estructural de Obras Menores
• CVRIMG-304-2022 -No. 232-2022 - Observaciones estudio de estructuras -
• OFICIO CMS-024- Respuesta a oficio CVRIMG-363-2022.
• Plano estructural del Box Culvert De Santa Cruz De Lorica, ubicado en Córdoba (S-P112-DC-01 01/02 y S-P112-DE-01 01/10)
• CANTIDADES DE OBRA TOTALES

Se efectuaron las siguientes observaciones, aquellas cuya respuesta se muestra en color verde han sido atendidas satisfactoriamente, mientras que aquellas que se muestran en color rojo, aún están pendientes de ser subsanadas.

• Si bien el plano estructural presenta la separación de las barras de refuerzo solicitada en la reunión y en el oficio, **no presenta el cuadro de cantidades** donde se indique el peso de cada una de las barras y el total de estas del Box Culvert, de igual modo que la cantidad de concreto efectuada. Se solicita incluir el cuadro de cantidades respectivamente, indicando el peso de cada una de las barras que conforman la estructura y el total de concreto y acero.

R: / Observación atendida

• Se indica en el rótulo del plano estructural la referencia del Box Culvert de la cartilla anteriormente mencionada, no obstante, **no se muestra la imagen o figura de referencia tomada directamente de la cartilla con su respectiva referencia**. Se solicita incluirla.

R: / Observación No atendida. No se muestra la imagen o figura de referencia tomada directamente de la cartilla con su respectiva referencia, ni memorial de responsabilidad explícito. Se solicita incluir estos documentos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al Contratista atender a cada una de las anteriores observaciones con la mayor brevedad posible.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

Bogotá D.C., diciembre 13 de 2022

Señores: **OFICIO CRS-CE 047**

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No. 162-2022, de objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL"

Asunto: Concepto revisión diseños estructurales

Ciudad

Reciba un cordial saludo; por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 9 de diciembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos:

- MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ING ESTRUCTURAL REFERENCIA A CARTILLA "COLOMBIA RURAL" (PDF)
- OFICIO CRS-CE 047 BOX (PDF)
- PLANO BOX 1-2 (PDF)
- PLANO BOX 2-2 (PDF)
- PLANO DEL BOX COULVERT CARTILLA COLOMBIA (PDF)
- SOPORTE ZAMIR BELTRAN (PDF)

Al efectuar la revisión de dichos documentos se efectuaron las siguientes observaciones:

- En la especificación de los planos se debe referenciar la cartilla Colombia rural de donde se toma la información de los box. Se solicita completar esta información.

- En las especificaciones de los planos indicar la ubicación del box mediante abscisas.

- En los planos estructurales faltan las cartillas de cantidades donde se muestre el peso de cada varilla, el peso total de acero y el volumen de concreto requerido para realizar esta estructura. Se solicita completar esta información.

- En los planos estructurales los detalles están pequeños con respecto al espacio del plano y al momento de acercar en el PDF se muestra de la siguiente manera.

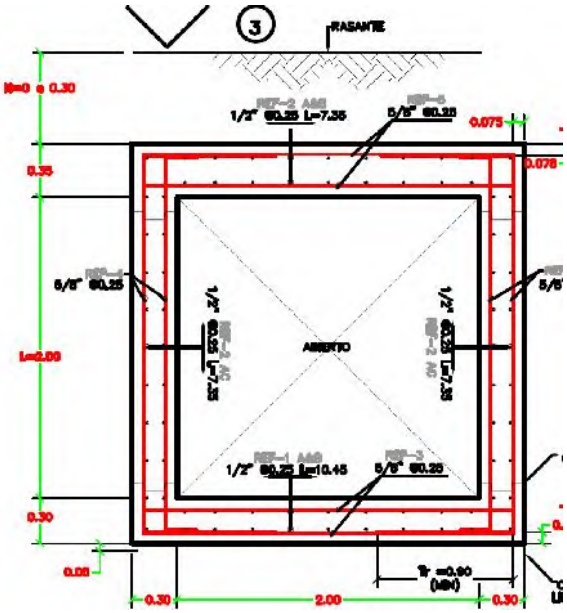


Figura 1 FUENTE: PLANO DEL BOX COULVERT CARTILLA COLOMBIA

Si bien se tomaron los planos de la cartilla estos deben ajustarse a una escala adecuada para permitir su fácil lectura a la hora de la construcción. Se solicita ajustar los planos con una mejor escala.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al Contratista atender a cada una de las anteriores observaciones con la mayor brevedad posible, donde se lleve a cabo las correcciones y/o complementaciones a nivel de Fase III, de igual manera remitir la información faltante con el fin de realizar la revisión estructural pertinente.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

Bogotá D.C., noviembre 21 de 2022

Señores:

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-MSBV-006-2022, de objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VÍA DEL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO".

Asunto: Concepto revisión diseños estructurales

Ciudad

Reciba un cordial saludo; por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 18 de noviembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos:

- OFC. 040-17-11-2022 – INT

- Plano 9.PLANOS ALCANTARILLA (DWG)

Al efectuar la revisión de dichos documentos se efectuaron las siguientes observaciones:

1. La documentación recibida no corresponde a Fase III, por lo tanto:

    - Se solicita memoria de cálculo para Fase III, que contenga:
        - Introducción detallada de la estructura a diseñar
        - Ubicación
        - Especificaciones (materiales a utilizar y parámetros geotécnicos), normatividad (CCP-14)
        - Avalúo de cargas
        - Combinaciones de carga según el CCP-14
        - Datos de entrada del modelo estructural empleado (materiales, coeficientes de reacción horizontal y vertical, cargas asignadas al modelo, numeración de los elementos que conforman el modelo)
        - Diseño de cada elemento de la alcantarilla con sus respectivos análisis y solicitaciones
        - Verificación y revisión por capacidad portante y flotación
        - Recomendaciones por parte del especialista encargado del diseño estructural para la construcción.

    - Se solicita planos estructurales para Fase III, que contenga:

- Especificaciones técnicas del material
- Implantación planta y perfil de las estructuras de drenaje donde se pueda comprobar:
  - Una armonización con el diseño geométrico y la topografía del terreno con los respectivos niveles o cotas (nivel de rasante de la vía, pendiente de la misma en el corte
  - Ubicación de la estructura de drenaje (abscisas)
  - La dirección del flujo (aguas arriba y aguas abajo).
  - Niveles de aguas máximo

- Se solicita castilla de cantidades Fase III, que contenga:
  - Despieces separados por estructura para entregar a figuradora
  - Peso de acero requerido para el proyectos
  - Volumen de concreto requerido para el proyecto

- Se solicita incluir el modelo matemático con el que se realizó el análisis y/o diseño la alcantarilla.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al Contratista atender a cada una de las anteriores observaciones con la mayor brevedad posible, donde se lleve a cabo las correcciones y/o complementaciones a nivel de Fase III, de igual manera remitir la información faltante con el fin de realizar la revisión estructural pertinente.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

www.jrtestructurales.com

Bogotá D.C., diciembre 19 de 2022

Señores:
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Atn: Ing. Fredy Rodríguez Giraldo
Director de Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra No LP-MSBV-002-*2022*, Cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO.

Asunto: Revisión OF 57-17-12-2022 Consorcio Vial San Bernardo

Reciba un cordial saludo; por medio del presente informe nos permitimos efectuar un concepto respecto de la información de tipo estructural recibida el día 17 de diciembre del presente año, mediante el oficio en referencia.

- Se recibió la siguiente información:

- **Memorial de responsabilidad** por parte del ing. Jorge Mejía (especialista estructural), donde aclara que los diseños de obras menores y estructuras del **Municipio de San Bernardo del Viento**, Córdoba, fueron adoptados de la "Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.

- **Memorial de responsabilidad** por parte del ing. Miguel García Romani (especialista en vías y transporte), donde indica que los diseños de obras menores y estructuras del **Municipio de San Bernardo del Viento**, Córdoba, fueron adoptados de la "Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.

- **Oficio de respuestas**, respondiendo a cada una de las observaciones planteadas en la reunión virtual del 2 de diciembre de 2022, Consorcio Vial San Bernardo.

- **Dos (2) planos estructurales** de alcantarilla de 36" para San Bernardo del Viento, ubicado en el departamento de Córdoba.

- **Dos (2) planos estructurales** de placa huella de 36" para San Bernardo del Viento, ubicado en el departamento de Córdoba.

- Observaciones:

1- En el memorial del Especialista Estructural se hace referencia a la norma NSR10, la cual NO aplica para este tipo de estructuras. Se solicita corrección, aclarando que la norma aplicable es el CCP14.

2- A pesar de que el oficio de respuestas así lo indica, NO se recibió el aparte de la Cartilla Colombia Rural de las estructuras anunciadas. Se solicita su inclusión.

3- En el oficio de respuestas se indica que se presentan planos de un box culvert con su abscisado. Se solicita que se incluya, ya que no se encontró en los documentos recibidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al Contratista atender a cada una de las anteriores observaciones con la mayor brevedad posible.

Atentamente,

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes
Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia
Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca

5.3.6. INFORMES ESPECIALISTAS EN SOSTENIBILIDAD

JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gestión Ambiental
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

CONCEPTO ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O SOSTENIBILIDAD INTERVENTORÍA

Fecha: Dicimebre 21 de 2022

CONTRATO No. 971 – 2022: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 2".

CONTRATO No. 168 – 2022: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL".

Asunto: Concepto revisión PAGA versión 0.

De acuerdo al documento PAGA versión 0 presentado, se tienen las siguientes consideraciones, teniendo en cuenta lo exigido en el manual de interventoría y la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero:

1. El documento presentado no corresponde al exigido en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO actualizada en julio de 2022, el cual es el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA y no el PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

2. Para este proyecto no aplica lo relacionado con el componente de sostenibilidad, teniendo en cuenta que es de complejidad media – baja.

3. Es muy importante aclarar que, durante la reunión realizada entre el INVIAS, interventoría y contratistas el 18 de noviembre de 2022, se explicó detalladamente el contenido del PAGA y la aplicación de este documento al proyecto, por lo tanto, el contratista debió inmediatamente elaborarlo y presentarlo a la interventoría para su revisión.

4. Se debe dar cumplimiento a todos los lineamientos (en contenido y estructura) de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO actualizada en julio de 2022 y del manual de interventoría para el componente ambiental.

En virtud de lo expuesto anteriormente, se debe presentar de inmediato el documento PAGA, dando cumplimiento al manual de interventoría del INVIAS y a la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO del INVIAS actualizada en el año 2022.

Adicionalmente, se deben presentar los informes mensuales de acuerdo a los requerimientos del manual de interventoría.

Cordialmente,



JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad
Tarjeta Profesional # 66238119417RIS

JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gestión Ambiental
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

CONCEPTO ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O SOSTENIBILIDAD INTERVENTORÍA

Fecha: Diciembre 22 de 2022

CONTRATO No. 971 – 2022: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 2".

LP-MSBV-002-2022, "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES"

Asunto: Concepto revisión PAGA versión 0.

De acuerdo al documento PAGA versión 0 presentado, se tienen las siguientes consideraciones, teniendo en cuenta lo exigido en el manual de interventoría y la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero:

1. Previo a la formulación del PAGA, se debe dar cumplimiento con lo exigido en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO, en lo que se refiere al nivel de sensibilidad ambiental del proyecto y el grado de complejidad en función de la tipología de proyectos y los aspectos socioambientales que están involucrados (numeral 8 volumen 2).

2. En el numeral 5.3.3 se debe complementar la información descrita. Para el agua a utilizar en el proyecto se debe verificar que el acueducto del municipio de San Bernardo pueda vender agua para uso industrial (anexar permiso). Para los residuos convencionales, se debe especificar cuál es la empresa de servicios públicos encargada de la recolección de residuos y no es claro y coherente lo descrito sobre la disposición final en los puntos de acopio (anexar solicitud a la empresa para la recolección). Para los materiales sobrantes y escombros se

debe mencionar la zodme a utilizar (anexar permiso de autoridad ambiental) y para los escombros (residuos RCD) se deben mencionar los gestores especializados para el manejo de estos residuos (anexar permisos ambientales). Para aprovechamientos de materiales pétreos se deben mencionar los posibles proveedores (anexar permisos ambientales, titulo minero y RUCOM). Adicionalmente, se debe mencionar el manejo de vertimientos en el caso del uso de baños portátiles y los proveedores (anexar permisos de vertimientos). En el caso que aplique permiso de ocupación de cauce, se debe incluir la relación de las obras en donde aplica. En general se debe cumplir con todo lo solicitado para este capítulo en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO.

3. Se debe ajustar la definición del área de influencia del proyecto teniendo en cuenta los aspectos metodológicos para la definición del área de influencia descritos en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 166). Presentar cartografía.

4. Se debe ajustar la línea base de acuerdo a los lineamientos para la formulación de la línea base socioambiental de los proyectos de acuerdo a lo exigido en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de página 177), teniendo en cuenta la información de línea base sugerida por tipo de proyecto. Presentar cartografía.

5. Se debe dar cumplimiento a lo exigido en el capítulo de medidas por tipo de proyecto de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 255). Diseñar las fichas y medidas de manejo ambiental aplicables, de acuerdo al grado de complejidad (actualizar programas y subprogramas aplicables con las medidas de manejo aterrizadas a la naturaleza del proyecto.

6. Se debe dar cumplimiento a lo exigido en el capítulo de seguimiento, control y monitoreo de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 413).

7. Se debe incluir el cronograma detallado con las actividades y medidas de manejo ambiental a implementar.

8. Se debe dar cumplimiento a lo exigido en el capítulo de lineamientos para la elaboración y presentación del documento paga de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 501). No se anexan los formatos INVIAS INVIAS MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS (con sus anexos) y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.

9. El documento debe tener el contenido y anexos exigidos en las páginas 533 y 534 de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO.

10. Se debe ajustar el plan de contingencias ambientales, donde se pueda evidenciar el cumplimiento normativo y con un contenido similar al siguiente:

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL
1.1. Objetivos específicos
2. ALCANCE
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. REFERENCIAS NORMATIVAS
5. ANÁLISIS DEL RIESGO
5.1. Objetivos específicos
5.2. Metodología
5.3. Identificación de amenazas
5.4. Estimación de probabilidades
5.5. Análisis de vulnerabilidad de elementos expuestos
5.6. Evaluación del riesgo
5.7. Priorización de escenarios
5.7.1. Amenazas antrópicas no intencionales
5.8. Temas prioritarios
6. SISTEMA DE ALERTA
7. PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES
7.1. Recursos

En virtud de lo expuesto anteriormente, se debe realizar los ajustes en un término máximo de cinco (5) días calendario, dando cumplimiento al manual de interventoría del INVIAS y a la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO del INVIAS actualizada en julio del 2022.

JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gestión Ambiental
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Cordialmente,



JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad
Tarjeta Profesional # 66238119417RIS

JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Ingeniero Ambiental
Especialista en Gestión Ambiental
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

CONCEPTO ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O SOSTENIBILIDAD INTERVENTORÍA

Fecha: Diciembre 15 de 2022

CONTRATO No. 971 – 2022: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 2".

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-006-2022. "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – VÍA DEL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO".

Asunto: Concepto revisión PAGA versión 0.

De acuerdo al documento PAGA versión 0 presentado, se tienen las siguientes consideraciones, teniendo en cuenta lo exigido en el manual de interventoría y la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero:

1. Previo a la formulación del PAGA, se debe dar cumplimiento con lo exigido en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO, en lo que se refiere al nivel de sensibilidad ambiental del proyecto y el grado de complejidad en función de la tipología de proyectos y los aspectos socioambientales que están involucrados (numeral 8 volumen 2).

Contenido del documento PAGA

En todos los casos que sea aplicable la formulación y presentación del documento PAGA, se deberá presentar un documento que presente el siguiente contenido:

1. Introducción
2. Objetivos
3. Información contractual según el pliego de condiciones y el decreto 1076 de 2015 o aquella norma que lo modifique, reemplace o sustituya
4. Localización general y específica del proyecto
5. Descripción del proyecto (de conformidad con el anexo técnico del contrato)
6. Identificación de la complejidad del proyecto según lo establecido en el volumen II
7. Definición del área de influencia (numeral 5.2.1-5.3.1 y 5.4.1 según sea el caso volumen III)
8. Cartografía del área de influencia (según lineamientos establecidos en el volumen III
9. Demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (según lineamientos establecidos en el volumen III).
10. Evaluación ambiental e identificación de impactos acumulativos potenciales (según lineamientos establecidos en el volumen III).
11. Formulación de medidas de manejo según lo establecido en el volumen V (numeral 5.2.2-5.3.2 y 5.4.2 según sea el caso).
12. Formulación de medidas de monitoreo y seguimiento (numeral 5.2.2-5.3.2 y 5.4.2 según sea el caso).

2. Se debe ajustar la definición del área de influencia del proyecto teniendo en cuenta los aspectos metodológicos para la definición del área de influencia descritos en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 166). Presentar cartografía.

3. Se debe ajustar la línea base de acuerdo a los lineamientos para la formulación de la línea base socioambiental de los proyectos de acuerdo a lo exigido en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de página 177), teniendo en cuenta la información de línea base sugerida por tipo de proyecto y el de la línea base para proyectos de complejidad media-baja. Presentar cartografía.

4. Se debe aclarar lo descrito en la página 25 donde se menciona que no se requiere permiso de ocupación de cauce, pero en la columna de observación no queda claro si es así o no. Adicionalmente, se debe mencionar las empresas y anexar los permisos ambientales con las que se realizara el manejo de residuos

sólidos, escombros, RESPEL, entre otros y los residuos líquidos de los baños portátiles.

5. En el capítulo 14 se debe corregir el nombre, el cual corresponde a las medidas de manejo ambiental y social o al plan de manejo ambiental.

6. Se debe dar cumplimiento a lo exigido en el capítulo de seguimiento, control y monitoreo de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 413).

7. En el cronograma presentado se deben especificar las actividades que se ejecutaran de los programas y subprogramas; con lo presentado no es posible hacer un seguimiento al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental.

8. Se debe dar cumplimiento a lo exigido en el capítulo de lineamientos para la elaboración y presentación del documento paga de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 501).

9. Corregir el Programa de seguimiento, control y monitoreo de acuerdo a lo exigido en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO (a partir de la página 431). Lo presentado no cumple con lo requerido.

10. El documento debe tener el contenido y anexos exigidos en las páginas 533 y 534 de la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO.

11. No se presenta diligenciado el formato INVIAS MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS y el formato INVIAS MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL, se debe registrar las actividades ambientales sujetas de reconocimiento con los recursos de la provisión ambiental durante el desarrollo del contrato de obra (ítem por ejemplo de compensación forestal por el permiso de aprovechamiento forestal). En el Plan de Inversión Ambiental (N°1), no se da aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados corresponden a proyecciones.

En virtud de lo expuesto anteriormente, se debe realizar los ajustes en un término máximo de cinco (5) días calendario, dando cumplimiento al manual de interventoría

del INVIAS y a la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO del INVIAS actualizada en el año 2022.

Cordialmente,



JULIÁN ANDRÉS OSSA MONTES
Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad
Tarjeta Profesional # 66238119417RIS

5.3.7. INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – LOTE 2.

CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

INTERVENTORIA: Consorcio Vial Rural IMG

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No. 01 SST

DICIEMBRE 2022

07 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1

INDICE

1. Realización de inducción al personal de interventoría, evaluaciones de eficacia y notificación de riesgo.
2. Diseño de matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo
3. Acta de conformación de brigada de emergencias y HV de brigadistas.
4. Diseño de buzón de sugerencias y tarjetas de observación.
5. Diligenciamiento determinación de condiciones ambientales
6. Realización de inventario de productos químicos
7. Señalización de emergencias, covid 19 y ambiental.
8. Diseño de cartelera SST.
9. Entrega de elementos de protección personal individual.
10. Seguimiento exámenes médicos de ingreso personal de interventoría
11. Lista de chequeo documentación SGI
12. Cd con información del mes de diciembre
13. Acta de comité de COPASST.
14. Diligenciamiento formato inspecciones planeadas
15. Inspección de botiquín y camilla.
16. Inspección de elementos de protección personal
17. Inspección de comportamiento
18. Diligenciamiento de preoperacional de vehículo.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

19. Registro de pausas activas.

20. Diseño de plan de emergencia acorde al proyecto

21. Ubicación de la oficina

22. Plano de evacuación

23. Gestión documental y fotográfica de contratista.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1

INFORME GESTIÓN SST MENSUAL

07 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022

1. REALIZACIÓN DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE INTERVENTORÍA, EVALUACIONES DE EFICACIA Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO.



Imagen captada en la oficina del Consorcio Vial Rural IMG

El día 12 de diciembre de 2022, se realiza inducción al personal de interventoría; socializando la misión, visión y políticas de la empresa, los riesgos y peligros a los que están expuestos en la ejecución de sus labores, con el fin de garantizar que los ingenieros se familiaricen con el entorno de la empresa e implementen condiciones de trabajo seguro en cada uno de los frentes, a través de la promoción de la salud y la identificación de controles de riesgo.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

listado del personal que realizo la inducción

Nombres y Apellidos	Número de Documento de Identidad	Cargo
FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	80.720.586	DIRECTOR
PEDRO LUIS PEREZ SUAREZ	1.103.120.855	AUX. INGENIERIA
MARIA JOSE GUERRA MERLANO	1.102.885.038	SECRETARIA
ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA	3.839.091	RESIDENTE
EVER LEONARDO OLIVA RHENALS	1.102811944	AUX. INGENIERIA
ERICK AMID CAMARGO MORALES	92.640.459	RESIDENTE
YAJAIRA GOMEZ CARDENAS	1.280.490.32	RESIDENTE
JOSE MONTENEGRO DIAZ	1.093.419.5	RESIDENTE
ZULLY ESPERANZA GUEVARA ARROYO	1.005.570.304	AUX.INGENIERIA
RONALDO NUÑEZ ANILLO	1.028.801.98	AUX. INGENIER

✓ **Inducciones y notificación de riesgos** "Se adjunta en medio magnético y físico"

Se anexan las inducciones del personal de interventoría que ingreso en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

2. DISEÑO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGO

Se realizó la matriz, de acuerdo a los peligros a los que están expuesto los trabajadores; dentro de la oficina y en cada uno de los frentes, también se evalúa la probabilidad y gravedad del riesgo durante el proceso de planificación del proyecto.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

3. ACTA DE CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIAS Y HV DE BRIGADISTAS.

- ✓ **Hojas de vida de brigadistas** "Se adjunta en medio magnético y físico"

Se realiza la conformación de brigadas de emergencia con los siguientes colaboradores:

Nombres y Apellidos	Número de Documento de Identidad	Tipo de brigada
FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	80.720.586	EVACUACION DE APOYO
PEDRO LUIS PEREZ SUAREZ	1.103.120.855	CONTRAINCENDIO
MARIA JOSE GUERRA MERLANO	1.102.885.038	EVACUACION
YIANNY PUELLO CALDERON	1.050.969.441	PRIMEROS AUXILIOS

Las hojas de vida de los brigadistas se anexaron en GoogleDrive, en la carpeta de plan de emergencia se adjuntan en medio magnético y físico.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

- ✓ **Inspección de botiquín y camilla**





- ✓ **Se realiza señalización, instalación e inspección de botiquín donde se evidencia los siguientes insumos vencidos:**

- Gasas limpias x 20und
- Esparadrapo de tela 4”
- Bajalenguas x 20 und
- Solución salina 500ml

se realiza la solicitud de requisición para el suministro de los mismos.

- ✓ **Se realiza señalización, instalación e inspección de camilla**





YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

4. DISEÑO DE BUZÓN DE SUGERENCIAS Y TARJETAS DE OBSERVACIÓN.



El día 16 de diciembre de 2022, se implementa en la oficina del Consorcio Vial Rural IMG, el buzón de sugerencias con las correspondientes tarjetas de observación, dando cumplimiento a la normativa SGI.

5. DILIGENCIAMIENTO DETERMINACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES.

Inducción que recibí por JUAN DIEGO PINZON SANCHEZ, abordando la temática:

- Determinación de condiciones ambientales
- Entrega de residuos
- Seguimiento a puntos ecológicos
- Control consumos agua y energía
- Procedimiento para la gestión de residuos V2
- Socialización de los indicadores ambientales

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG


CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

6. REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Se realizó la matriz de inventario de productos químicos y rotulación de los embaces de los mismos, según el sistema globalmente armonizado, también donde se realiza una charla de 5 minutos acuerdo al manejo de estos.

A continuación, el listado de las sustancias químicas que permanecen en la oficina del Consorcio:

- Clorox tradicional
- Limpiador de uso tradicional
- Crema lava platos
- Detergente en polvo
- Crema multiusos

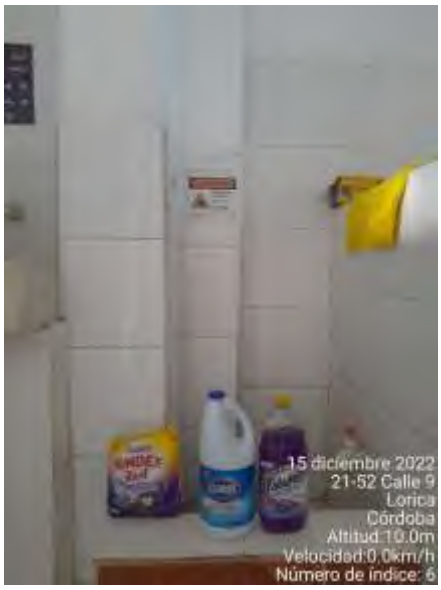



Advertencia ubicada en el lugar donde se almacenan los productos químicos

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

7. UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS, COVID 19.







Ubicación y evidencia de cumplimiento al protocolo de lavado de manos covid-19 personal interventoría.

- ✓ **Ubicación de señalización de riesgo eléctrico para la zona de la caja de circuitos eléctricos**



YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

8. DISEÑO DE CARTELERA SST.

Se diseña la cartelera SST, en la cual se publica el reglamento interno de trabajo, políticas de la empresa, misión, visión, teléfonos de emergencias, los Pons de emergencias, reglamento de higiene.





YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

9. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL.





El día 4 de enero de 2023, se realiza la entrega de Elementos de Protección Personal Individual y se diligencia el formato de entrega de elementos de protección y/o dotación para llevar el registro de esta.

10. SEGUIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Se envían las observaciones medicas ocupacionales a cada uno de los trabajadores de interventoría, para dar seguimiento al trámite correspondiente del médico ocupacional

- ✓ **Casos COVID-19**

  No se evidencia casos positivo ni sospechosos de COVID-19

- ✓ **Accidentalidad**

Durante el mes no se reporta ni se evidencia accidente por parte del personal de interventoría

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

11. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN SGI

- ✓ Se adjunta documentación correspondiente a diciembre de 2022

12. CD CON INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

- ✓ Se adjunta CD con información correspondiente

13. ACTA DE COMITÉ DE COPASST

- ✓ Documento anexado en la lista de chequeo SGI

14. DILIGENCIAMIENTO FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS

- ✓ Realizado de acuerdo a las condiciones de la empresa y oficina

15. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

En la inspección realizada el día 30 de diciembre de 2022, se evidencia que hay cuatro (4) insumos vencidos, de los cuales se da aviso a la Coordinadora SST de la empresa y se diligencia el formato para requisición de insumos; estos son:

- Veinte (20) unidades de gasas limpias
- Un (1) rollo de esparadrapo de tela 4”
- Un (1) paquete de bajalenguas por 20 unidades
- Una (1) solución salina por 500ml

16. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- ✓ Se adjunta en medio magnético y físico”

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

17. INSPECCIÓN DE COMPORTAMIENTO

- ✓ Se realiza de manera satisfactoria

18. DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO.

Director de interventoría, FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO, realiza la inspección en compañía de la Inspectora SST de manera satisfactoria

19. REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS



Tomamos breves descansos durante la jornada laboral en los cuales realizamos actividades físicas como estiramientos, tales como elevación de rodillas, ejercicios para liberar la tensión del cuello, los hombros, manos y codos y también se da un espacio para descanso mental, con el fin de recuperar energía y mejorar el desempeño laboral; se lleva adecuado control de las pausas activas dentro de la oficina y en los distintos frentes de obra.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

20. DISEÑO DE PLAN DE EMERGENCIA ACORDE AL PROYECTO

- ✓ Diseño adjunto en el Drive

21. UBICACIÓN DE LA OFICINA

La oficina del Consorcio Vial Rural IMG, esta ubicada en el territorio nacional colombiano, departamento de Córdoba, el bajo Sinú, en el municipio Santa Cruz de Lorica, barrio arenal y su nomenclatura urbana es Carrera 22 #8A – 111 Segundo piso.


- Vía de acceso No. 1: Llegada por la Carrera 25 en sentido Sur-Norte – Carrera en doble sentido con presencia alta de trasporte público. (Señalada en color verde)
- Vía de acceso No. 2: Llegada por la Carrera 22, girando por la Carrera 25 sentido Sur Carrera 22 Suroccidente – Nororiente sin flujo de transporte público. (Señalada en color rojo)



YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

22. PLANO DE EVACUACIÓN

Se diseña la ruta de evacuación del personal de interventoría, en caso de emergencias.

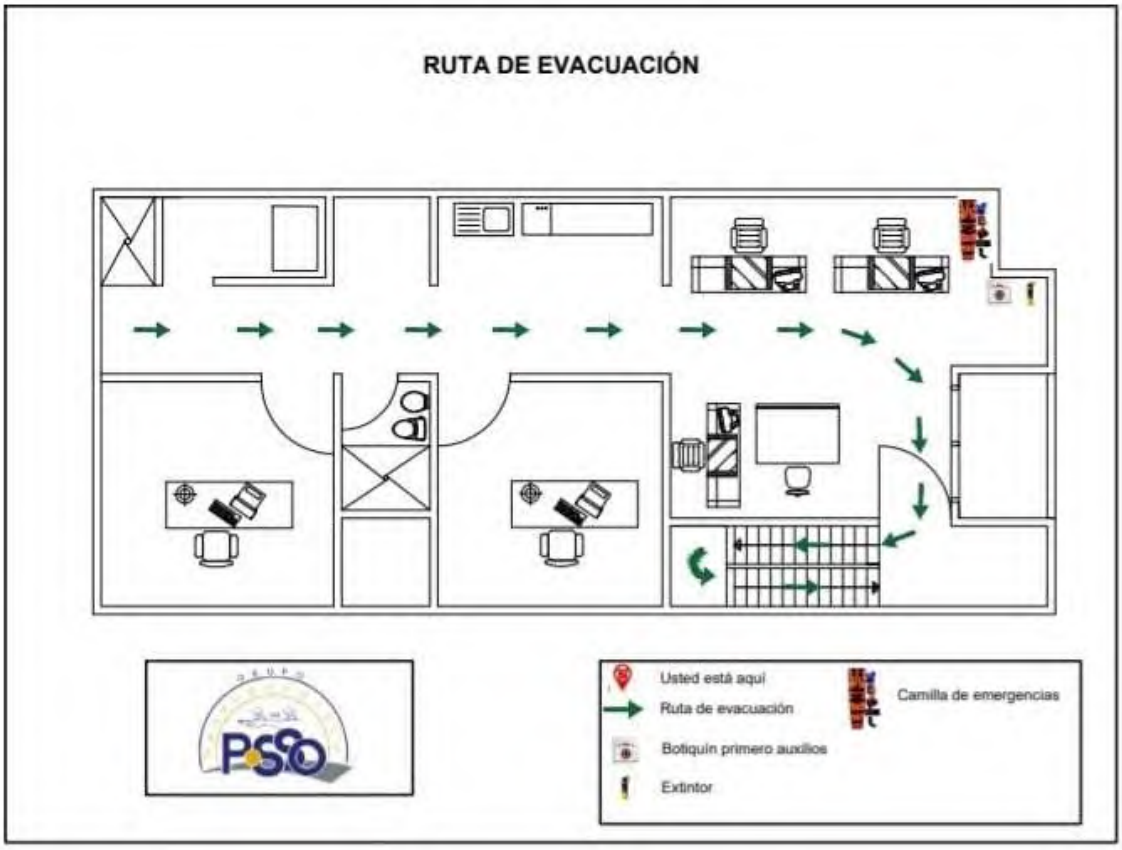

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022
INFORME SST N°1

23. GESTION DOCUMENTAL Y FOTOGRAFICA DE CONTRATISTAS.

Durante el mes de diciembre se envió un oficio a cada uno de los contratistas solicitando la documentación inicial del área sst anexando planillas de seguridad, con el fin de realizar seguimiento y control con el sistema de gestión.



SE EVIDENCIA UBICACIÓN DE CAMPAMENTO.

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1



SE REALIZARON DOS CAPACITACIONES, LA PRIMERA EN EL MANEJO EN DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA SEGUNDA EN EL USO Y MANEJO DE LOS EPP.

EXTINTOR CAMILLA Y PUNTO ECOLÓGICO







YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1

BOTIQUÍN Y PUNTO DE HIDRATACIÓN





SEÑALIZACIONES DENTRO DE LA OBRA

el proyecto de mejoramiento de vías rurales en el municipio de san bernardo del viento departamento de córdoba del programa Colombia rural – nacional – vía del corregimiento del castillo se vienen implementando las señalizaciones necesarias para el trabajo







YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1





YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1

MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS, Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE MES.





En la ejecución de las actividades de este mes se utilizaron volquetas, 1 vibro compactador, motoniveladora, minicargador.

VISITAS A OTROS FRENTES





YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1













YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971 de 2022

INFORME SST N°1

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG
Resolución No. 061

YIANNYS JULIETH PUELLO CALDERON
Inspectora SST Consorcio Vial Rural IMG

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No se presenta informe de programa anual de caja en este periodo

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

No se presenta para el periodo de diciembre de 2022.

5.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA


5.6.1. APLICATIVO CIFRA

Se realiza la actualización de la aplicativo CIFRA, con los informes semanales correspondientes al mes de noviembre de 2022.



5.6.2. ´PLATAFORMA SECOP II

A la fecha la plataforma SECOP II se encuentra actualizada con los informes mensuales y actas de costos No.1 y No.2, correspondiente a los periodos de agosto y septiembre del 2022. Cuando se cuente con la aprobación del informe mensual y el acta de costos No.3, correspondiente al periodo de octubre del 2022, se realizará la actualización en la plataforma.

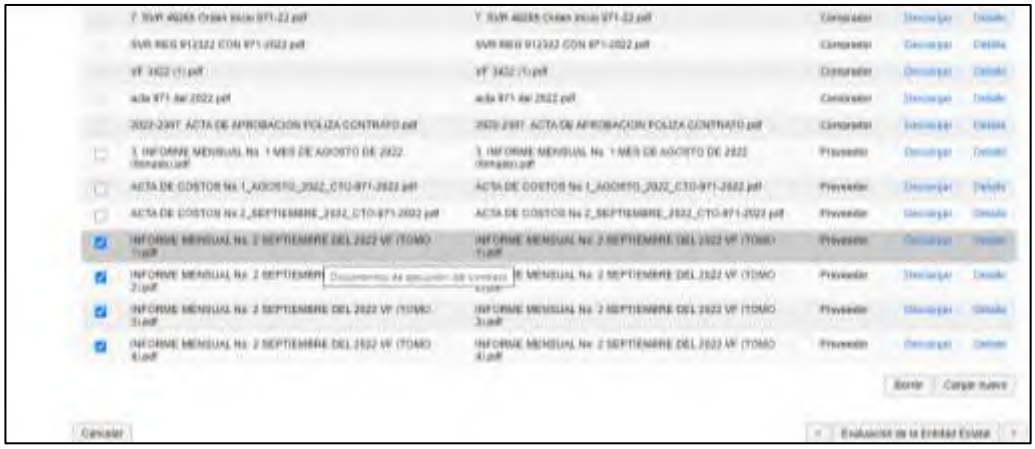

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-22

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

CONTRATO DE OBRA No.	**CONTRATISTA:**
232-2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
225-2022	MARIO POMPILLO SINISTERRA JALLER
219-2022	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
162-2022	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
168-2022	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
LP-MSBV-006- 2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
LP-MSBV-002-2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022
LP-003-2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2023
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/01/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL IMG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre/2022 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: 232-2022, 225-2022, 219-2022, 162-2022, 168-2022, LP-MSBV-006- 2022, LP-MSBV-002-2022, LP-003-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022; MARIO POMPILLO SINISTERRA JALLER; UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022; CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022; CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE; CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO; CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022; CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	FREDY RODRIGUEZ	80.720.586	Director de Interventoría	$ 7.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 7.000.000,00	$ 487.200,00	V	SALUD TOTAL	9445488267	$ 280.000,00	PROTECCION	9445488267	$1,190,000	$ 280.000,00			
2	ARMANDO ALDANA	3.839.091	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 5.000.000,00	$ 348.000,00	V	SALUD TOTAL	9445488267	$ 200.000,00	COLFONDOS	9445488267	$ 850.000,00	$ 200.000,00			
3	ERICK CAMARGO	92.640.459	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	80	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 4.000.000,00	$ 278.400,00	V	SALUD TOTAL	9445488267	$ 160.000,00	COLFONDOS	9445488267	$ 680.000,00	$ 160.000,00			Ingresa a partir del 7 de diciembre de 2022
4	YAJAIRA GOMEZ	1.128.049.032	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	80	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 4.000.000,00	$ 278.400,00	V	SANITAS	9445488267	$ 160.000,00	PORVENIR	9445488267	$ 680.000,00	$ 160.000,00			Ingresa a partir del 7 de diciembre de 2022
5	JOSE MONTENEGRO	10.934.195	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	70	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 5.000.000,00	$ 348.000,00	V	SALUD TOTAL	9445488267	$ 200.000,00	COLPENSIONES	9445488267	$ 850.000,00	$ 200.000,00			
6	PEDRO PEREZ	1.103.120.855	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 3.000.000,00	$ 208.800,00	V	MUTUAL SER	9445488267	$ 120.000,00	PROTECCION	9445488267	$ 480.000,00	$ 120.000,00			
7	EVER OLIVA	1.102.811.944	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 3.000.000,00	$ 208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	9445488267	$ 120.000,00	PORVENIR	9445488267	$ 480.000,00	$ 120.000,00			
8	ZULLY GUEVARA	1.005.570.304	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	23	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 3.000.000,00	$ 208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	9445488267	$ 120.000,00	COLFONDOS	9445488267	$ 480.000,00	$ 120.000,00			
9	RONALDO NUÑEZ	1.102.880.198	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	80	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 2.400.000,00	$ 167.100,00	V	MUTUAL SER	9445488267	$ 96.000,00	PORVENIR	9445488267	$ 384.000,00	$ 96.000,00			Ingresa a partir del 7 de diciembre de 2022
10	YIANNY PUELLO	1.050.969.441	Inspector SST	$ 1.760.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	80	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 1.760.000,00	$ 122.500,00	V	SANITAS	9445488267	$ 70.400,00	PORVENIR	9445488267	$ 281.600,00	$ 70.400,00			Ingresa a partir del 7 de diciembre de 2022
11	MARIA GUERRA	1.102.885.038	Secretaria	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 1.200.000,00	$ 6.300,00	I	NUEVA E.P.S.	9445488267	$ 48.000,00	PORVEINIR	9445488267	$ 192.000,00	$ 48.000,00			
10	JULIAN ANDRÉS OSSA	10.034.237	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 680.000,00	X X X X	10	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 680.000,00	$ 69.600,00	V	EPS SURA	9442655179	$ 125.000,00	PROTECCION	9442655179	$ 160.000,00				
11	JUAN FLOREZ	92.515.148	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 1.360.000,00	X X X X X X	20	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 1.360.000,00	$ 94.700,00	V	SANITAS	9442655179	$ 170.000,00	COLPENSIONES	9442655179	$ 353.600,00				
12	JOSE ASAEL JAMES	79.300.008	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 1.360.000,00	X X X X X X	20	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 1.360.000,00	$ 94.700,00	V	SANITAS	9442655179	$ 170.000,00	PROTECCION	9442655179	$ 217.600,00				
13	JUAN RICARDO TORRES	79.406.449	Especialista en Estructuras	$ 680.000,00	X X X	10	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 680.000,00	$ 69.600,00	V	ALIANSALUD	9442655179	$ 125.000,00	COLPENSIONES	9442655179	$ 160.000,00				
14	JENNYFER ABRIL	52.067.351	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 680.000,00	X X X	10	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 680.000,00	$ 69.600,00	V	COMPENSAR	9442655179	$ 125.000,00	COLPENSIONES	9442655179	$ 260.000,00				
15	JUAN CARLOS MORALES	19.385.799	Especialista en Diseño Geométrico	$ 680.000,00	X X X	10	CONSORIO VIAL RURAL IMG	$ 680.000,00	$ 69.600,00	V	COMPENSAR	9442655179	$ 125.000,00	COLPENSIONES	9442655179	$ 160.000,00				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 23.948.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/01/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2320215672 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579942	7	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	cra 62 # 103- 44 of 304	MONTERIA-CORDOBA	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1865804706	9445488267	E	2023/01/11	2023/01/16	BANCOLOMBIA	5	$12,429,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO VIAL RURAL IMG (11 Afiliados)						$39,360,000	$6,547,600			$39,360,000	$1,574,400			$39,360,000	$1,574,400			$39,360,000	$2,662,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	1102885038	GUERRA MARIA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF16	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (10 Afiliados)						$38,160,000	$6,355,600			$38,160,000	$1,526,400			$38,160,000	$1,526,400			$38,160,000	$2,656,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (10 Afiliados)						$38,160,000	$6,355,600			$38,160,000	$1,526,400			$38,160,000	$1,526,400			$38,160,000	$2,656,000		$0	$0
2	CC	3839091	ALDANA ARMANDO	231001	30	$5,000,000	$850,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF16	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
3	CC	92640459	CAMARGO ERICK	230301	24	$4,000,000	$680,000	EPS002	24	$4,000,000	$160,000	CCF16	24	$4,000,000	$160,000	14-11	24	$4,000,000	$278,400	24	$0	$0
4	CC	1128049032	GOMEZ YAJAIRA	230301	24	$4,000,000	$680,000	EPS005	24	$4,000,000	$160,000	CCF16	24	$4,000,000	$160,000	14-11	24	$4,000,000	$278,400	24	$0	$0
5	CC	1005570304	GUEVARA ZULLY	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS041	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	10934195	MONTENEGRO JOSE	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF16	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
7	CC	1102880198	NUÑEZ RONALDO	230301	24	$2,400,000	$384,000	ESSC07	24	$2,400,000	$96,000	CCF16	24	$2,400,000	$96,000	14-11	24	$2,400,000	$167,100	24	$0	$0
8	CC	1102811944	OLIVA EVER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS041	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
9	CC	1103120855	PEREZ PEDRO	230201	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	1050969441	PUELLO YIANNY	230301	24	$1,760,000	$281,600	EPS005	24	$1,760,000	$70,400	CCF16	24	$1,760,000	$70,400	14-11	24	$1,760,000	$122,500	24	$0	$0
11	CC	80720586	RODRIGUEZ FREDY	230201	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS002	30	$7,000,000	$280,000	CCF16	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$39,360,000	$6,547,600			$39,360,000	$1,574,400			$39,360,000	$1,574,400			$39,360,000	$2,662,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579942	7	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	cra 62 # 103- 44 of 304	MONTERIA-CORDOBA	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1865804706	9445488267	E	2023/01/11	2023/01/16	BANCOLOMBIA	5	$12,429,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$6,547,600	$37,600	$0	$6,585,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,330,000	$7,700	$0	$1,337,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$850,000	$5,000	$0	$855,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,697,600	$15,400	$0	$2,713,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,670,000	$9,500	$0	$1,679,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,662,300	$15,100	$0	$2,677,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$2,662,300	$15,100	$0	$2,677,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,574,400	$8,900	$0	$1,583,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$1,574,400	$8,900	$0	$1,583,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,574,400	$9,100	$0	$1,583,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$216,000	$1,300	$0	$217,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,000	$300	$0	$48,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$240,000	$1,400	$0	$241,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$840,000	$4,800	$0	$844,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$230,400	$1,300	$0	$231,700
TOTAL				**11**	**$12,358,700**	**$70,700**	**$0**	**$12,429,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579942	7	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	cra 62 # 103- 44 of 304	MONTERIA-CORDOBA	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1865814005	9445488504	Y	2023/01/11	2023/01/16	BANCOLOMBIA	5	$2,634,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO VIAL RURAL IMG (6 Afiliados)						$6,720,000	$1,311,200			$6,720,000	$840,000			$0	$0			$6,720,000	$467,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,360,000	$613,600			$2,360,000	$295,000			$0	$0			$2,360,000	$164,300		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$2,360,000	$613,600			$2,360,000	$295,000			$0	$0			$2,360,000	$164,300		$0	$0
1	CC	52067351	ABRIL JENNYFER	25-14	30	$1,000,000	$260,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
2	CC	92515148	FLOREZ JUAN	25-14	30	$1,360,000	$353,600	EPS005	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,360,000	$94,700	0	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)						$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$0	$0			$4,360,000	$303,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$0	$0			$4,360,000	$303,500		$0	$0
3	CC	79300008	JAIMES JOSE	25-14	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,360,000	$94,700	0	$0	$0
4	CC	19385799	MORALES JUAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
5	CC	10034237	OSSA JULIAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
6	CC	79406449	TORRES JUAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS001	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$6,720,000	$1,311,200			$6,720,000	$840,000			$0	$0			$6,720,000	$467,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579942	7	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	cra 62 # 103- 44 of 304	MONTERIA-CORDOBA	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1865814005	9445488504	Y	2023/01/11	2023/01/16	BANCOLOMBIA	5	$2,634,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,311,200	$7,500	$0	$1,318,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,151,200	$6,500	$0	$1,157,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$467,800	$2,700	$0	$470,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$467,800	$2,700	$0	$470,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$840,000	$5,100	$0	$845,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$125,000	$800	$0	$125,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$250,000	$1,500	$0	$251,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$800	$0	$125,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$340,000	$2,000	$0	$342,000
TOTAL				6	$2,619,000	$15,300	$0	$2,634,300

6.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/01/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MES INFORME MENSUAL: diciembre/2022 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No:	**CONTRATISTA:**
232-2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
225-2022	MARIO POMPILLO SINISTERRA JALLER
219-2022	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
162-2022	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
168-2022	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
LP-MSBV-006- 2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
LP-MSBV-002-2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022
LP-003-2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	912322	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	971-2022	$ 400.000.000,00	$ 127.488.072,00
2023	VIGENCIAS FUTURAS			NACION	971-2022	$ 1.770.000.000,00	$ 1.770.000.000,00
2024	VIGENCIAS FUTURAS			NACION	971-2023	$ 2.394.284.660,00	$ 2.394.284.660,00
TOTAL						$ 4.564.284.660,00	$ 4.291.772.732,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.564.284.660,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 400.000.000,00	**$ 4.564.284.660,00**		
1	**agosto-2022**	$ 5.975.200,00	$ 1.135.288,00	**$ 7.110.488,00**	**$ -**	**$ 7.110.488,00**	**$ -**	RP No. 912322 del 16 de agosto de 2022	$ 392.889.512,00	**$ 4.557.174.172,00**	129905 de 29/11/2022	PAGADA
2	**septiembre-2022**	$ 31.784.480,00	$ 6.039.051,00	**$ 37.823.531,00**	**$ -**	**$ 37.823.531,00**	**$ -**	RP No. 912322 del 16 de agosto de 2022	$ 355.065.981,00	**$ 4.519.350.641,00**	129917 de 29/11/2022	PAGADA
3	**octubre-2022**	$ 94.131.340,00	$ 17.884.955,00	**$ 112.016.295,00**	**$ -**	**$ 112.016.295,00**	**$ -**	RP No. 912322 del 16 de agosto de 2022	$ 243.049.686,00	**$ 4.407.334.346,00**		EN TRAMITE
4	**noviembre-2022**	$ 97.110.600,00	$ 18.451.014,00	**$ 115.561.614,00**	**$ -**	**$ 115.561.614,00**	**$ -**	RP No. 912322 del 16 de agosto de 2022	$ 127.488.072,00	**$ 4.291.772.732,00**		EN TRAMITE
5	**diciembre-2022**	$ 107.120.400,00	$ 20.352.876,00	**$ 127.473.276,00**	**$ -**	**$ 127.473.276,00**	**$ -**	RP No. 912322 del 16 de agosto de 2022	$ 14.796,00	**$ 4.164.299.456,00**		
TOTALES		**$ 336.122.020,00**	**$ 63.863.184,00**	**$ 399.985.204,00**	**$ -**	**$ 399.985.204,00**	**$ -**		**$ 14.796,00**	**$ 4.164.299.456,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	$ 336.122.020,00	$ 63.863.184,00	$ 399.985.204,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 336.122.020,00	$ 63.863.184,00	$ 399.985.204,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 22/08/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 456.428.466	10	5	2022	30/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 912.856.932	10	5	2022	30/06/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 912.856.932	10	5	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.369.285.398	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101186306

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/08/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/01/2023
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad del servicio				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101186306	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2022	10	05	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT: 901.579.942-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 62 NRO. 103 - 44 OF.304 ED. TORRE DEL RELOJ JMG	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6016216395

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.971 DE 2022, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-LOTE 2.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**10/05/2022**	**30/06/2025**	**$912,856,932.00**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**10/05/2022**	**30/06/2025**	**$456,428,466.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**10/05/2022**	**31/12/2027**	**$912,856,932.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2029**	**$1,369,285,398.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUROS DEL ESTADO S.A.S CONOCE Y ACEPTA ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE LAS PARTES EL 22 DE AGOSTO DE 2022.

ASI MISMO, SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL NUMERO 971 DEL 10 DE MAYO DEL 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 2.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **27,722,964.00	$ ******25,000.00	$ ***5,272,113.00	$ ********33,020,078.00	$ ****3,651,427,728.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	4112	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101186306

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101186306	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2022	10	05	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL IMG		NIT: 901.579.942-7
DIRECCIÓN: CR 62 NRO. 103 - 44 OF.304 ED. TORRE DEL RELOJ JMG	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6016216395

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · cacharrera.com

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **27,722,964.00	$ ******25,000.00	$ ***5,272,113.00	$ ********33,020,078.00	$ ****3,651,427,728.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	4112	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000622475719(3900)000033020078(96)20230510

REFERENCIA PAGO:

1100062247571-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101186306	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2022	10	05	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL IMG		**NIT: 901.579.942-7**
DIRECCIÓN: CR 62 NRO. 103 - 44 OF.304 ED. TORRE DEL RELOJ JMG	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6016216395

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

- QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO.
- LA CALIDAD DEL SERVICIO, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.
- QUE EL CONSORCIO VIAL RURAL IMG CON NIT. 901.579.942-7 ESTA INTEGRADO POR:
- GRUPO POSSO S.A.S CON NIT. 800.007.208-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 30%.
- INGENIERA MONCADA GUERRERO S.A CON NIT. 830.103.289-5 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 55%
. HUGO ALFREDO POSSO PRADO CON C.C 4.610.382 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 15%.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A	830103289-5	55.00
GRUPO POSSO S A S	800007208-9	30.00
POSSO PRADO HUGO ALFREDO	4610382	15.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101186306

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MARIAPERILLA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101186306, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de OCTUBRE de 2022



11-44-101186306

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101186306	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	11	2022	10	05	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.579.942-7
DIRECCIÓN: CR 62 NRO. 103 - 44 OF.304 ED. TORRE DEL RELOJ IMG	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6016216395

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO.971 DE 2022, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-LOTE 2.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/05/2022	30/06/2025	$912,856,932.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/05/2022	30/06/2025	$456,428,466.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/05/2022	31/12/2027	$912,856,932.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	$1,369,285,398.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., HACE CONSTAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO DE MODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2022 AL CONTRATO 971 DE 2022 Y ESTA AL TANTO DE LAS CONSIDERACIONES Y CLAUSULAS EXPUESTAS EL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0,00	$ **********0,00	$ **********0,00	$ **********0,00	$ ****3,651,427,728.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RTVRSEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	4112	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101186306

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101186308	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	11	2022	10	05	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIAL RURAL IMG		NIT: 901.579.942-7	
DIRECCIÓN: CR 62 NRO. 103 - 44 OF.304 ED. TORRE DEL RELOJ JMG	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6016216395

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

PAGOS ESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Mercy Mart · Bancolombia · éxito · Gigante · Corresponsal

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogota — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****3,651,427,728.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PROSEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	4112	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101186306	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	11	2022	10	05	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL IMG		NIT: 901.579.942-7
DIRECCIÓN: CR 62 NRO. 103 - 44 OF.304 ED. TORRE DEL RELOJ JMG	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6016216395

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7856000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A	830103289-5	55.00
GRUPO POSSO S A S	900807208-9	30.00
POSSO PRADO HUGO ALFREDO	4610382	15.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101186306

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

FIRMA TOMADOR

MARIAPERELLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101186306, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

11-44-101186306

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

6.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

FECHA DE INICIO: 22/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 232-2022; 225-2022; 219-2022; 162-2022; 168-2022; LP-MSBV-006- 2022; LP-MSBV-002-2022; LP-003-2022

CONTRATISTA: Consorcio Mejoramiento Santa Lucia 2022; Mario Pompillo Sinisterra Jaller; Union Temporal Rural Lorica CE 2022; Consorcio Rural Sahagun CE 2022; Consorcio Huellas Ceiba de Leche; Consorcio Vial San Bernardo; Consorcio Vias del Viento 2022; Consorcio Mejoramiento San Pelayo

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------ APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------ APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Nombre: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS I-1 **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL I I

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
RESOLUCIÓN No.: 3723 DE 29/07/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 510-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
510-2022 CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
519-2022 BARLOVENTO CONSTRUCCIONES SAS
519-2022 UNION TEMPORAL RURAL LOPEZ DE 2022
562-2022 UNION TEMPORAL RURAL LOPEZ DE 2022
562-2022 CONSORCIO RURAL SAHAGUN DE 2022
LP-MISN-005-2022 CONSORCIO HUELLAS CERALVE LECHE
LP-MISN-005-2022 CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
LP-MISN-003-2022 CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022
LP-MISN-003-2022 CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN CLEMENTE

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.564.284.660,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____		2022										TOTAL	
													MES 1 (AGOSTO)		MES 2 (SEPTIEMBRE)		MES 3 (OCTUBRE)		MES 4 (NOVIEMBRE)		MES 5 (DICIEMBRE)			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																						
		PERSONAL PROFESIONAL																						
		Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		30,00	$ 210.000.000					0,26	$ 1.820.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	$ 4,26	$ 29.820.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		48,00	$ 240.000.000					$ -		0,56	$ 2.800.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,80	$ 9.000.000,00	2,00	$ 10.000.000,00	$ 5,36	$ 26.800.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		30,00	$ 150.000.000					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -
		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		72,00	$ 216.000.000					$ -		$ -		$ -		0,78	$ 2.280.000,00	1,73	$ 5.190.000,00	3,00	$ 9.000.000,00	$ 5,49	$ 16.470.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)				$ 225.000.000					$ -												
		Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 6.800.000,00			$ -					$ -		$ -		$ -		0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	$ 0,60	$ 4.080.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000,00			$ -					$ -		$ -		0,22	$ 1.496.000,00	0,58	$ 3.944.000,00	0,40	$ 2.720.000,00	0,30	$ 2.040.000,00	$ 1,50	$ 10.200.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000,00			$ -					$ -		$ -		$ -		0,40	$ 2.720.000,00	0,40	$ 2.720.000,00	0,27	$ 1.836.000,00	$ 1,07	$ 7.276.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.800.000,00			$ -					$ -		$ -		$ -		0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	$ 0,60	$ 4.080.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000,00			$ -					$ -		$ -		0,15	$ 1.020.000,00	0,25	$ 1.700.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	$ 0,80	$ 5.440.000,00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000,00			$ -					$ -		$ -		$ -		0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	$ 0,60	$ 4.080.000,00
		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.700.000,00		12,00	$ 44.400.000					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -
		PERSONAL TECNICO																						
		Inspector SST	$ 2.200.000,00		15,00	$ 33.000.000,00					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																						
		Secretaria	$ 1.200.000,00		30,00	$ 36.000.000,00					$ -		0,56	$ 1.152.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	3,56	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 1.154.400.000**						**$ 1.820.000**		**$ 13.468.000**		**$ 27.924.000**		**$ 33.270.000**		**$ 36.516.000**		**$ 108.246.000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**						**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 2.724.572.800**						**$ 4.295.200**		**$ 31.784.480**		**$ 65.900.640**		**$ 78.517.200**		**$ 86.177.760**		**$ 255.460.560**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2022 MES 1 (AGOSTO)		MES 2 (SEPTIEMBRE)		MES 3 (OCTUBRE)		MES 4 (NOVIEMBRE)		MES 5 (DICIEMBRE)		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																				
		VARIOS																				
		Vallco Director y/o Especialistas	$ 230.000,00	Dia	180,00	$ 42.550.000,00						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 230.000,00	1,00	$ 230.000,00		$ -	2,00	$ 460.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																				
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye conductor paqiete y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5.600.000,00	Mes	60,00	$ 336.000.000,00					0,30	$ 1.680.000,00		$ -	2,00	$ 11.200.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	4,30	$ 24.080.000,00
		Camioneta o camper de mas de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye conductor paqiete y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5.600.000,00	Mes	12,00	$ 67.200.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2016 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 670.000,00	Mes	123,00	$ 82.410.000,00						$ -		$ -	2,32	$ 1.554.400,00	3,43	$ 2.298.100,00		$ -	5,75	$ 3.852.500,00
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	15,00	$ 97.500.000,00						$ -		$ -	2,00	$ 13.000.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	4,00	$ 26.000.000,00
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	9,00	$ 58.500.000,00						$ -		$ -		$ -	0,40	$ 2.600.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,40	$ 9.100.000,00
		Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	27,00	$ 14.850.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00
		Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	100,00	$ 55.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	30,00	$ 39.000.000,00						$ -		$ -	1,40	$ 1.820.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	3,40	$ 4.420.000,00
		OTROS COSTOS																				
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	20,00	$ 40.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 770.000,00	Según comprobante por mes	30,00	$ 23.100.000,00						$ -		$ -	0,19	$ 146.300,00	0,16	$ 123.200,00	0,11	$ 84.700,00	0,46	$ 354.200,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 700.000,00	Según comprobante por mes	30,00	$ 21.000.000,00						$ -		$ -	0,40	$ 280.000,00	0,31	$ 217.000,00	0,20	$ 140.000,00	0,91	$ 637.000,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		Vivienda Tecnica Consultoria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	25,00	$ 5.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (5) = (B)				**$ 888.710.000,00**						**$ 1.680.000,00**		**$ -**		**$ 28.230.700,00**		**$ 19.418.300,00**		**$ 20.134.700,00**		**$ 69.453.700,00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 3.613.282.800,00**						**$ 5.975.200,00**		**$ 31.784.480,00**		**$ 94.131.340,00**		**$ 97.935.500,00**		**$ 106.302.460,00**		**$ 324.914.260,00**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				**$ 222.250.539,00**																
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$ 3.835.533.328,00**						**$ 5.975.200,00**		**$ 31.784.480,00**		**$ 94.131.340,00**		**$ 97.935.500,00**		**$ 106.302.460,00**		**$ 324.914.260,00**
		IVA = 19% * (E) = (F)				**$ 728.751.332,00**						**$ 1.135.288,00**		**$ 6.039.951,00**		**$ 17.884.955,00**		**$ 18.607.745,00**		**$ 20.197.467,00**		**$ 61.733.709,00**
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 4.564.284.660,00**						**$ 7.110.488,00**		**$ 37.823.531,00**		**$ 112.016.295,00**		**$ 116.543.245,00**		**$ 126.499.927,00**		**$ 399.993.486,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a adiciones, prórrogas o suspensión, se deberá citar la cláusula del otrosí y el número de la orden, prórroga o suspensión y la fecha de suscripción)

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ SOLANO
Representante Legal o el designado Interventor
Matrícula Profesional No.: No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-328524 COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	09/01/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
RESOLUCIÓN No.: 2723 DE 29/07/2022 (Verificar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: / **CONTRATISTA:**

CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATISTA:
232-2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
216-2022	MARIO ROMERO SINISTERRA JALLER
218-2022	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
162-2022	CONSORCIO RURAL MAGANGUE CE 2022
188-2022	CONSORCIO HUELLAS CIERA DE LEONE
LP-INSRV-006-2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
LP-INSRV-003-2022	CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022
LP-003-2022	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PEDRO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/09/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.564.284.660,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.564.284.660,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha ___		2022										TOTAL	
											MES 1 (AGOSTO)		MES 2 (SEPTIEMBRE)		MES 3 (OCTUBRE)		MES 4 (NOVIEMBRE)		MES 5 (DICIEMBRE)			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																				
		PERSONAL PROFESIONAL																				
		Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		30,00	$ 210.000.000					0,26	$ 1.820.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	4,26	$ 29.820.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		48,00	$ 240.000.000						$ -	0,56	$ 2.800.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,80	$ 9.000.000,00	2,00	$ 10.000.000,00	5,36	$ 26.800.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00		30,00	$ 150.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -	1,60	$ 8.000.000,00	1,60	$ 8.000.000,00
		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		72,00	$ 216.000.000						$ -		$ -	0,76	$ 2.280.000,00	1,70	$ 5.100.000,00	3,80	$ 11.400.000,00	6,26	$ 18.780.000,00
		MONTO ADOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)				$ 225.080.000						$ -										
		Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 6.800.000,00			$ -						$ -		$ -	0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,10	$ 680.000,00	0,50	$ 3.400.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000,00			$ -						$ -	0,22	$ 1.496.000,00	0,58	$ 3.944.000,00	0,40	$ 2.720.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	1,40	$ 9.520.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000,00			$ -						$ -		$ -	0,40	$ 2.720.000,00	0,40	$ 2.720.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	1,00	$ 6.800.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.800.000,00			$ -						$ -		$ -	0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,10	$ 680.000,00	0,50	$ 3.400.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000,00			$ -						$ -	0,15	$ 1.020.000,00	0,25	$ 1.700.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,10	$ 680.000,00	0,70	$ 4.760.000,00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000,00			$ -						$ -		$ -	0,20	$ 1.360.000,00	0,20	$ 1.360.000,00	0,10	$ 680.000,00	0,50	$ 3.400.000,00
		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.700.000,00		12,00	$ 44.400.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		PERSONAL TECNICO																				
		Inspector SST	$ 2.200.000,00		15,00	$ 33.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -	0,80	$ 1.760.000,00	0,80	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																				
		Secretaria	$ 1.200.000,00		30,00	$ 36.000.000,00						$ -	0,96	$ 1.152.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	3,96	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 1.154.480.000					$	1.820.000	$	15.468.000	$	27.524.000	$	33.180.000	$	44.800.000	$	124.680.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36						2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 2.724.572.800					$	4.295.200	$	31.784.480	$	65.900.640	$	78.304.800	$	105.728.000	$	270.644.800

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2022 MES 1 (AGOSTO) H-M	VALOR	MES 2 (SEPTIEMBRE) H-M	VALOR	MES 3 (OCTUBRE) H-M	VALOR	MES 4 (NOVIEMBRE) H-M	VALOR	MES 5 (DICIEMBRE) H-M	VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																				
		VARIOS																				
		Varios Director y/o Especialistas	$ 230.000,00	Día	185,00	$ 42.550.000,00						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 230.000,00	1,00	$ 230.000,00		$ -	2,00	$ 460.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																				
		Camioneta o Campero de más de 2000 cc. (1) 4x4 (Incluye conductor paqete y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5.600.000,00	Mes	60,00	$ 336.000.000,00					0,30	$ 1.680.000,00		$ -	2,00	$ 11.200.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	3,30	$ 18.480.000,00
		Camioneta o Campero de más de 2000 cc. (1) 4x4 (Incluye conductor paqete y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015	$ 5.600.000,00	Mes	12,00	$ 67.200.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		Motocicletas 150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 670.000,00	Mes	123,00	$ 82.410.000,00						$ -		$ -	2,32	$ 1.554.400,00	3,39	$ 2.271.300,00		$ -	5,71	$ 3.825.700,00
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	15,00	$ 97.500.000,00						$ -		$ -	2,00	$ 13.000.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 19.500.000,00
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	9,00	$ 58.500.000,00						$ -		$ -		$ -	0,40	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 2.600.000,00
		Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	27,00	$ 14.850.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	100,00	$ 55.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	30,00	$ 39.000.000,00						$ -		$ -	1,40	$ 1.820.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	3,40	$ 4.420.000,00
		OTROS COSTOS																				
		Transportes acerca y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	20,00	$ 40.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		Gestión de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 770.000,00	Según comprobante por mes	30,00	$ 23.100.000,00						$ -		$ -	0,19	146.300,00	0,15	$ 115.500,00	0,12	$ 92.400,00	0,46	$ 354.200,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 700.000,00	Según comprobante por mes	30,00	$ 21.000.000,00						$ -		$ -	0,40	280.000,00	0,27	$ 189.000,00	0,00	$ -	0,67	$ 469.000,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6.600.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		Vestuario Técnico Comunitario	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	25,00	$ 5.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 888.710.000,00					$	1.680.000,00	$	-	$	28.230.700,00	$	18.805.800,00	$	1.392.400,00	$	50.108.900,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 3.613.282.800,00					$	5.975.200,00	$	31.784.480,00	$	94.131.340,00	$	97.110.600,00	$	107.120.400,00	$	320.753.700,00
		PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 222.250.528,00																
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 3.835.533.328,00					$	5.975.200,00	$	31.784.480,00	$	94.131.340,00	$	97.110.600,00	$	107.120.400,00	$	320.753.700,00
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ 728.751.332,00					$	1.135.288,00	$	6.039.051,00	$	17.884.955,00	$	18.451.014,00	$	20.352.876,00	$	60.943.203,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 4.564.284.660,00					$	7.110.488,00	$	37.823.531,00	$	112.016.295,00	$	115.561.614,00	$	127.473.276,00	$	380.965.204,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permita identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos Tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: PRESENTADO POR CONTRATO
Representante Legal o Apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-328524 COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
