ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

CARTA DE PRESENTACIÓN
ACTA PARCIAL UNO

Tibasosa, 28 de marzo de 2025

INGENIERO:
JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
ALCALDÍA DE TIBASOSA - BOYACÁ
SUPERVISOR

REFERENCIA: CONTRATO No. C-MT-SA-M-012-2024

OBJETO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ

Cordial saludo:

Por medio de la siguiente, remito a su despacho informe ACTA PARCIAL UNO para el periodo comprendido entre el 27/12/2024 hasta el 28/03/2025, dentro de este periodo se realizó adecuaciones locativas del jardín social Raquel Puentes Palacios y la construcción de la cubierta del patio centro vida municipio de Tibasosa.

Sin otro particular.

Atentamente,

IGNACIO PLAZAS PEREZ

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre del representante legal IGNACIO PLAZAS PÉREZ
C. C. 9529394 de Sogamoso
Dirección de correo cra 2 5ª 44
Correo electrónico ignacioplazas@gmail.com
Ciudad TIBASOSA

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

PERIODO DEL INFORME		SUPERVISOR	
Fecha de Iniciación	**Fecha de corte**	**Nombre**	**Cargo**
27-12-2024	28-03-2025	JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

INTRODUCCIÓN


El municipio de Tibasosa mediante el contrato de obra No: C-MT-SA-M-012-2024, cuyo objeto es CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ, busca el mejoramiento de la calidad de vida para los niños y personas de la tercera edad, que frecuentas estas dos infraestructuras respectivamente. En el presente informe parcial de actividades muestra un registro fotográfico donde se describen las diferentes actividades ejecutadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, igualmente se presenta una información básica del contrato con su respectivo control administrativo, legal, técnico y financiero.

RESUMEN ALCANCE DEL PROYECTO:

ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS	• Adecuaciones escalera de acceso parte interna y rampa externa con el fin de brindar seguridad a los niños, personal docente y administrativos. • Construcción cuarto para almacenamiento de residuos sólidos, con el fin de evitar contaminación y afectación a los niños, personal docente y administrativos. • Cambio de vidrio de ventanas que se encontraban en mal estado
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	• Construcción de cubierta en estructura metálica y policarbonato del patio central, donde la mayoría de tiempo los adultos mayores realizan diferentes actividades diarias.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ÁREA DE INFLUENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO
		URBANO	RURAL	
Boyacá	TIBASOSA	X		CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

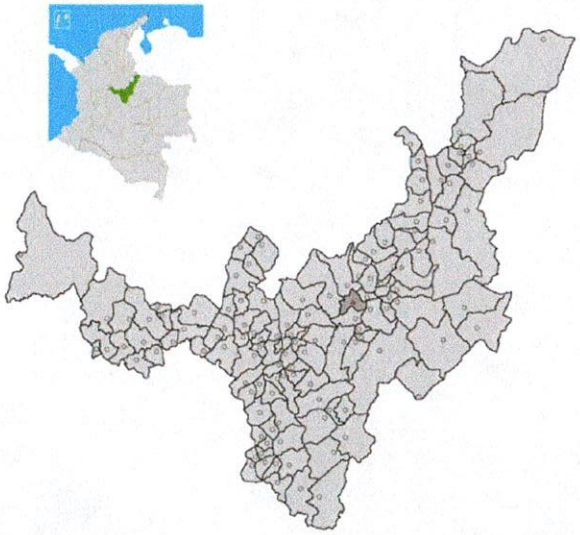



CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

OBJETO:	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ
N° DEL CONTRATO	C-MT-SA-M-012-2024
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO R/L: IGNACIO PLAZAS PÉREZ
FECHA DEL CONTRATO	20-12-2024
FECHA DE INICIO	27-12-2024
FECHA SUSPENSIÓN	30-12-2024
FECHA REINICIO	30-01-2025
PLAZO ADICIONAL	80 DIAS
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	96 DIAS
FECHA POSIBLE ENTREGA	30-04-2025
VALOR INICIAL	$186.210.014,55
VALOR ANTICIPO	$ 0,000
ADICIONAL	$ 0,000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 186.210.014,55
VALOR ACTA PARCIAL 01	$ 88.798.308,73
VALOR ACTA FINAL	$

13

CONTROL TECNICO

Se realizan charlas tecnicas diarias entre el director de obra, residente y maestro general con el fin de resolver dudas o inconvenintes duramte la ejecucion de actividades, se verifica cronograma y se realizan los respectivos ajustes, igualmente la supervison por parte de la Alcaldia Municpal de Tibasosa reliza vistas tecnicas con el fin de verdifcar la ejecucion actividdes y resolver dudas que se presetan en obra.

Por parte del ingeniero residente de obra se realiza los soguientes actividades:

- Control de calidad de los materiales utilizados, con elfin de verificar cantidades y especificaciones tecnicas del contrato con respecto a los pedidos de insumos.
- Supervisión de la construcción para asegurar el cumplimiento de planos, especificaciones y normas
- Actualizar la Planificación de la obra
- Supervisar la calidad de herramientas y equipos

CANTIDADES CONTRATADAS

CONDICIONES INICIALES					
Ítem	DESCRIPCIÓN	Und.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	JARDÍN SOCIAL				
1.1.1	DIVISIÓN PARA BATERÍA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	m2	33	$ 717.097,000	$ 23.664.201,00
1.2.1	ZÓCALO PARA BARANDA DE ESCALERA, EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 12 CM DE ALTA.	M	69,97	$ 74.019,500	$ 5.179.144,42
1.3.1	DESMONTE VIDRIO	M2	2,8	$ 3.045,400	$ 8.527,12
1.3.2	VIDRIO 4 MM	m2	2,8	$ 64.603,800	$ 180.890,64
1.4.1.1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	7,02	$ 7.184,500	$ 50.435,19
1.4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	m3	5,37	$ 51.943,500	$ 278.936,60
1.4.1.3	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000 PSI)	M2	2,46	$ 34.625,900	$ 85.179,71
1.4.2.1	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR	m3	0,62	$ 829.581,300	$ 514.340,41
1.4.2.2	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	m3	0,15	$ 1.198.077,300	$ 179.711,60
1.4.2.3	VIGA AÉREA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,34	$ 1.439.390,300	$ 489.392,70
1.4.2.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	152	$ 7.002,100	$ 1.064.319,20
1.4.2.5	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	m2	6,99	$ 285.260,800	$ 1.993.972,99
1.4.2.6	REFUERZOS MALLA ELECTRO SOLDADA H-257	KG	20,9	$ 7.936,700	$ 165.877,03
1.4.3.1	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.	m2	20,1	$ 80.547,700	$ 1.619.008,77

1.4.3.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	34,38	$ 30.780,500	$ 1.058.233,59
1.4.3.3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	39,16	$ 9.852,200	$ 385.812,15
1.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SIFÓN EN PVC 135 3``	unidad	1	$ 41.344,080	$ 41.344,08
1.4.4.2	1.06.28. SALIDA SANITARIA PVC 3''	unidad	1	$ 159.108,100	$ 159.108,10
1.4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	m	10	$ 31.098,200	$ 310.982,00
1.4.4.4	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	unidad	1	$ 308.617,300	$ 308.617,30
1.4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	unidad	1	$ 25.750,400	$ 25.750,40
1.4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	10	$ 12.850,100	$ 128.501,00
1.4.4.7	SUMINISTRO E INSTA REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	unidad	1	$ 46.565,200	$ 46.565,20
1.4.4.8	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	m	4,05	$ 2.111,500	$ 8.551,58
1.4.5.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	unidad	1	$ 172.645,300	$ 172.645,30
1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 12 W	unidad	1	$ 20.761,500	$ 20.761,50
1.4.10	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONCUIT DE 1/2" INCLUYE CABLEADO	m	10	$ 18.639,160	$ 186.391,60
1.4.10	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	m2	6,99	$ 30.232,200	$ 211.323,08
1.4.11	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	6,99	$ 64.712,800	$ 452.342,47
1.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	m2	16,38	$ 76.346,300	$ 1.250.552,39
5.3.15	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	m	17	$ 11.374,800	$ 193.371,60

1.6.3	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	9,84	$ 17.576,100	$ 172.948,82
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	m2	2	$ 211.628,100	$ 423.256,20
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	unidad	1	$ 128.653,000	$ 128.653,00
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	m2	1,67	$ 238.795,000	$ 398.787,65
4.1.4	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	unidad	1	$ 136.131,100	$ 136.131,10
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	m	4,28	$ 105.864,800	$ 453.101,34
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	m2	5,84	$ 64.891,200	$ 378.964,61
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	m2	5,98	$ 87.933,000	$ 525.839,34
5.1.2	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	m2	3,78	$ 40.826,000	$ 154.322,28
5.1.2	SUMINISTRO DE CONTENEDOR CON RUEDAS PLÁSTICA 208 LITROS	m2	3	$ 844.900,000	$ 2.534.700,00
	CUBIERTA CENTRO DE VIDA				
2.2.1	REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA	GL	1	$ 1.123.000,000	$ 1.123.000,00
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	250	$ 139.771,900	$ 34.942.975,00
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILARÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	2805	$ 17.135,300	$ 48.064.516,50
2.2.4	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	2805	$ 3.338,000	$ 9.363.090,00
2.2.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	m3	4,32	$ 51.943,500	$ 224.395,92

2.2.6	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	m3	1,44	$ 857.158,300	$ 1.234.307,95
2.2.7	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kg	120	$ 7.002,100	$ 840.252,00
2.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ml	10	$ 47.314,300	$ 473.143,00
2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ml	15	$ 61.512,000	$ 922.680,00
2.2.10	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	unidad	1	$ 308.617,300	$ 308.617,30
			COSTO DIRECTO		$ 143.238.472,73
			ADMINISTRACIÓN (22%)		$ 31.512.464,00
			UTILIDAD(5%)		$ 7.161.923,64
			IMPREVISTOS (3%)		$ 4.297.154,18
			COSTO TOTAL		**$ 186.210.014,55**

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ACTIVIDADES EJECUTAS ACTA PARCIAL UNO

		CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES			ACTUALIZACION	
Ítem	DESCRIPCIÓN	Und.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	(+)	(-)	Cantidad	cantidad	Valor
	JARDIN SOCIAL									
1.1.1	DIVISIÓN PARA BATERÍA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	m2	33	$ 717.097,000	$ 23.664.201,00					$ -
1.2.1	ZÓCALO PARA BARANDA DE ESCALERA, EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 12 CM DE ALTA.	M	69,97	$ 74.019,500	$ 5.179.144,42					$ -
1.3.1	DESMONTE VIDRIO	M2	2,8	$ 3.045,400	$ 8.527,12				2,80	$ 8.527,12
1.3.2	VIDRIO 4 MM	m2	2,8	$ 64.603,800	$ 180.890,64				2,80	$ 180.890,64
1.4.1.1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	7,02	$ 7.184,500	$ 50.435,19	(+)		2,63	9,65	$ 69.330,43
1.4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	m3	5,37	$ 51.943,500	$ 278.936,60		(-)	- 1,32	4,05	$ 210.371,18
1.4.1.3	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000 PSI)	M2	2,46	$ 34.625,900	$ 85.179,71	(+)		0,94	3,40	$ 117.728,06
1.4.2.1	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR	m3	0,62	$ 829.581,300	$ 514.340,41		(-)	- 0,02	0,60	$ 497.748,78
1.4.2.2	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	m3	0,15	$ 1.198.077,300	$ 179.711,60	(+)		0,24	0,39	$ 467.250,15
1.4.2.3	VIGA AÉREA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,34	$ 1.439.390,300	$ 489.392,70		(-)	- 0,10	0,24	$ 345.453,67
1.4.2.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	152	$ 7.002,100	$ 1.064.319,20	(+)		71,06	223,06	$ 1.561.897,76
1.4.2.5	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	m2	6,99	$ 285.260,800	$ 1.993.972,99	(+)		2,66	9,65	$ 2.752.766,72
1.4.2.6	REFUERZOS MALLA ELECTRO SOLDADA H-257	KG	20,9	$ 7.936,700	$ 165.877,03		(-)	- 8,07	12,83	$ 101.863,58


1.4.3.1	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.	m2	20,1	$	80.547,700	$ 1.619.008,77		(-)	- 6,03	14,07	$ 1.133.354,47
1.4.3.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	34,38	$	30.780,500	$ 1.058.233,59		(-)	- 10,71	23,67	$ 728.611,37
1.4.3.3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	39,16	$	9.852,200	$ 385.812,15		(-)	- 23,32	15,84	$ 156.058,85
1.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SIFÓN EN PVC 135 3``	unidad	1	$	41.344,080	$ 41.344,08					$ -
1.4.4.2	1.06.28. SALIDA SANITARIA PVC 3"	unidad	1	$	159.108,100	$ 159.108,10					$ -
1.4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	m	10	$	31.098,200	$ 310.982,00					$ -
1.4.4.4	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	unidad	1	$	308.617,300	$ 308.617,30					$ -
1.4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	unidad	1	$	25.750,400	$ 25.750,40					$ -
1.4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	10	$	12.850,100	$ 128.501,00					$ -
1.4.4.7	SUMINISTRO E INSTA REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	unidad	1	$	46.565,200	$ 46.565,20					$ -
1.4.4.8	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	m	4,05	$	2.111,500	$ 8.551,58					$ -
1.4.5.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	unidad	1	$	172.645,300	$ 172.645,30					$ -
1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 12 W	unidad	1	$	20.761,500	$ 20.761,50					$ -
1.4.10	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONCUIT DE 1/2" INCLUYE CABLEADO	m	10	$	18.639,160	$ 186.391,60					$ -
1.4.10	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	m2	6,99	$	30.232,200	$ 211.323,08		(-)	- 3,59	3,40	$ 102.789,48
1.4.11	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	6,99	$	64.712,800	$ 452.342,47					$ -

1.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	m2	16,38	$	76.346,300	$ 1.250.552,39					$ -
5.3.15	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	m	17	$	11.374,800	$ 193.371,60					$ -
1.6.3	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	9,84	$	17.576,100	$ 172.948,82					$ -
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	m2	2	$	211.628,100	$ 423.256,20	(+)		0,04	2,04	$ 431.086,44
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	unidad	1	$	128.653,000	$ 128.653,00			-	1,00	$ 128.653,00
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	m2	1,67	$	238.795,000	$ 398.787,65		(-)	- 1,18	0,49	$ 116.149,89
4.1.4	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	unidad	1	$	136.131,100	$ 136.131,10			-	1,00	$ 136.131,10
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	m	4,28	$	105.864,800	$ 453.101,34	(+)		3,37	7,65	$ 809.865,72
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	m2	5,84	$	64.891,200	$ 378.964,61	(+)		0,65	6,49	$ 421.306,12
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	m2	5,98	$	87.933,000	$ 525.839,34					$ -
5.1.2	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	m2	3,78	$	40.826,000	$ 154.322,28					$ -
5.1.2	SUMINISTRO DE CONTENEDOR CON RUEDAS PLÁSTICA 208 LITROS	m2	3	$	844.900,000	$ 2.534.700,00					$ -
	CUBIERTA CENTRO DE VIDA										
2.2.1	REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA	GL	1	$	1.123.000,000	$ 1.123.000,00					$ -
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	250	$	139.771,900	$ 34.942.975,00					$ -
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILARÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	2805	$	17.135,300	$ 48.064.516,50		(-)	- 148,77	2.656,23	$ 45.515.279,76

2.2.4	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	2805	$	3.338,000	$ 9.363.090,00		(-)	- 148,77	2.656,23	$ 8.866.492,20
2.2.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	m3	4,32	$	51.943,500	$ 224.395,92	(+)		0,29	4,61	$ 239.355,65
2.2.6	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	m3	1,44	$	857.158,300	$ 1.234.307,95	(+)		0,58	2,02	$ 1.728.031,13
2.2.7	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kg	120	$	7.002,100	$ 840.252,00	(+)		91,28	211,28	$ 1.479.398,09
2.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ml	10	$	47.314,300	$ 473.143,00					$ -
2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ml	15	$	61.512,000	$ 922.680,00					$ -
2.2.10	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	unidad	1	$	308.617,300	$ 308.617,30					$ -
			COSTO DIRECTO			$ 143.238.472,73					$ 68.306.391,33
			ADMINISTRACIÓN (22%)			$ 31.512.464,00					$ 15.027.406,09
			UTILIDAD(5%)			$ 7.161.923,64					$ 3.415.319,57
			IMPREVISTOS (3%)			$ 4.297.154,18					$ 2.049.191,74
			COSTO TOTAL			**$ 186.210.014,55**					**$ 88.798.308,73**

13

AVNACE FINANCIERO ACTA PARCIAL UNO

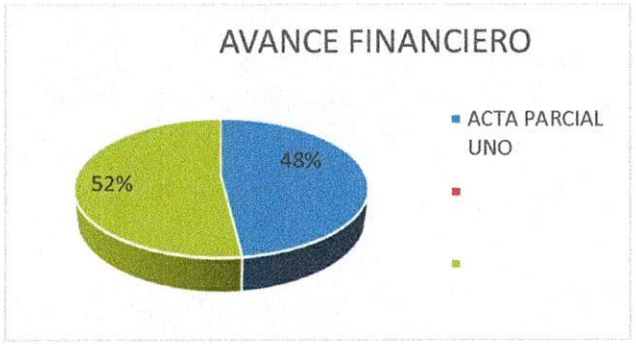



VALOR CONTRTO: $ 186.210.014,55
COLOR AZUL: ACTA PARCIAL UNO $ 88.798.308,73



TIEMPO TOTAL: 96 DIAS
COLOR AZUL: TIEMPO EJECUTADO
COLOR ROJO: TIEMPO RESTANTE


CENTRO VIDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.3.1	DESMONTE VIDRIO	 **DESCRIPCIÓN:** • Se consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para desmontar, almacenar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, los vidrios previamente indicadas, en las especificaciones particulares o definidas por la entidad. Dependiendo del estado y de la naturaleza de los elementos a desmontar se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y localización de los mismos; así como la metodología de la entrega **EJECUCIÓN**: En el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta el desmonte de vidrios, teniendo especial cuidado de no dañar las áreas aledañas (muros y pisos). El desmonte se hará con el mayor cuidado utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor. Los elementos servibles serán inventariados y entregados al funcionario de la entidad, en el sitio o bodega que ellos determinen; El contratista será responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su custodia, los elementos inservibles o que a juicio de la Entidad no se requieran serán retirados por el contratista y trasladados a un sitio apropiado y permitido.

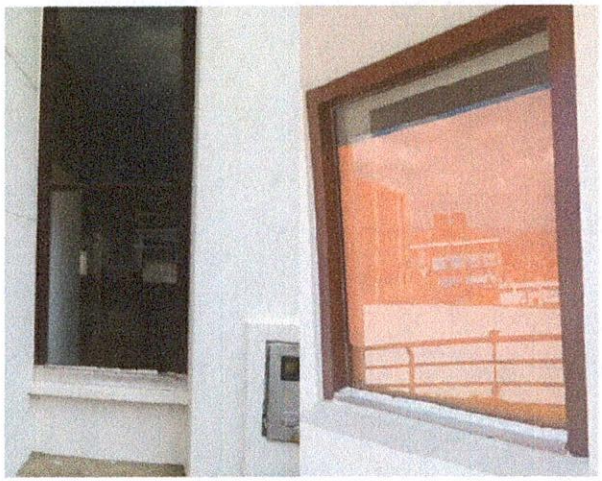ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.3.2	VIDRIO 4 MM	

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se hará la instalación del vidrio.
- Rectificar medidas para cortar el vidrio según las dimensiones del vano. del vano).
- Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte.
- Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta vidrios a las medidas necesarias.
- Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocará el vidrio, la superficie donde se pegará el vidrio deberá estar libre de polvo y grasa.
- Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicación limpia.
- Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegará el vidrio.
- Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera.
- Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espátula para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio.
- Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona.

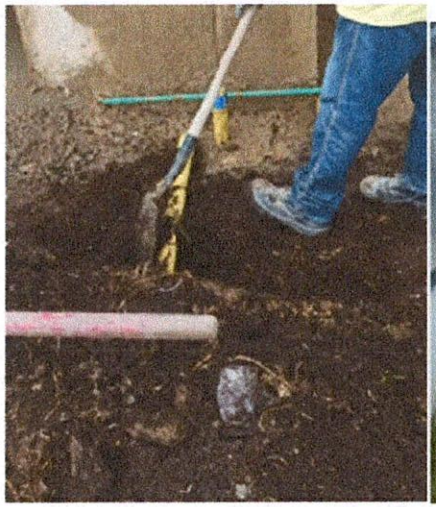ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.1.1	**DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM**	 

DESCRIPCIÓN

Se entiende por descapote, la remoción de la capa superficial del terreno natural, (incluyendo hierbas y arbustos pequeños), en un espesor suficiente para eliminar tierra vegetal, turba, cieno, material orgánico y demás materiales indeseables para la construcción que se han depositado en el suelo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear.
- Determinar el espesor del descapote.
- Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de sembradíos).
- Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.
- Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	 

DESCRIPCIÓN

Comprende este ítem la excavación manual de la cimentación que incluye vigas de cimentación incluyendo el retiro de sobrantes

Comprende las actividades necesarias para la ejecución de las excavaciones manuales y su clasificación, llenos, botada de tierra, control de aguas y otras actividades que usualmente se presentan en la construcción

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.
- La profundidad de las excavaciones estará regida por las especificaciones del diseño, si existen dudas sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor profundidad, de acuerdo con la supervisión.
- Teniendo en cuenta la topografía del sitio de estudio y el nivel de cimentación, los cortes pueden hacerse verticales.
- Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.
- Verificar niveles finales de cimentación

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.1.3	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000 PSI)	

DESCRIPCIÓN

Concreto pobre de limpieza de f'c=2000 psi que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Limpiar fondo de la excavación.
- Retirar materias orgánicas.
- Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
- Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
- Nivelar superficie.
- Verificar cotas inferiores de cimentación.

15

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.2.1	**CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR**	 

DESCRIPCIÓN

Ejecución vigas en concreto reforzado de amarre en concreto de 21 Mpa, para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro de los Planos Estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
- Colocar y revisar refuerzo de acero.
- Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
- Verificar refuerzos y recubrimientos.
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
- Vaciar concreto progresivamente.
- Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
- Curar concreto.
- Verificar niveles finales para aceptación.

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.2.2	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**	

DESCRIPCIÓN

Ejecución de columnas rectangulares en concreto reforzado f'c=3.000 psi (21 Mpa), con acabado de formaleta de madera, según localización y dimensiones expresadas en los Planos

Se deben cumplir todas las especificaciones del concreto

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Colocar refuerzos de acero.
- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
- Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
- Levantar y acodalar formaletas.
- Verificar plomos y dimensiones.
- Vaciar y vibrar el concreto.
- Desencofrar columnas.
- Curar concreto.
- Verificar plomos y niveles para aceptación.
- Verificar niveles finales para aceptación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.2.3	VIGA AÉREA 21 MPa - (3000 PSI)	

DESCRIPCIÓN

Ejecución de vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 psi, según localización y dimensiones expresadas en los Planos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Colocar refuerzos de acero.
- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
- Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
- Levantar y acodalar formaletas.
- Verificar plomos y dimensiones.
- Vaciar y vibrar el concreto.
- Apuntalamiento.
- Curar concreto.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.2.4	**SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA**	

DESCRIPCIÓN

Suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero PDR-60 f'y=4.200 kg/cm2 (420 MPa) para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
- Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
- Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
- Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
- Las distancias especificadas entre varilla o entre varillas y formaletas, se mantendrán por medio de tirantes, bloque se mortero pre moldeado, tensores, u otros dispositivos previamente aprobados por la supervisión.
- El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre entre la cara exterior de la varilla y la superficie de la formaleta
-

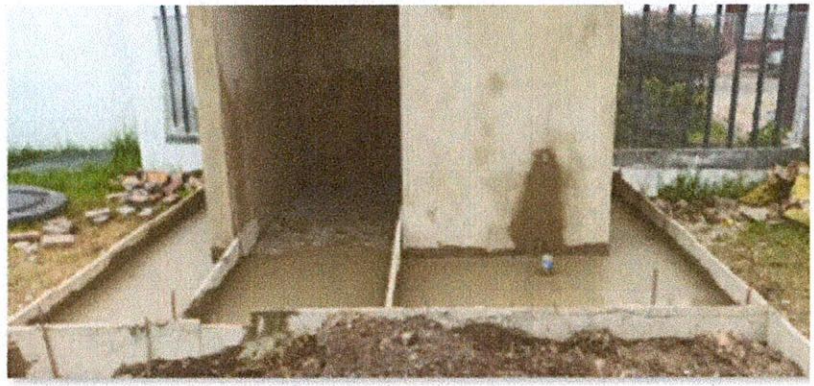ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.2.5	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	 **DESCRIPCIÓN** Ejecución de placa maciza en concreto reforzado, según indicaciones de los Planos. **PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN** • Colocar refuerzo, generalmente malla electro soldada. • Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. • Colocar testeros de borde. • Colocar refuerzo de acero. • Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. • Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. La formaleta debe quedar debidamente nivelada, acodada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto. • Vaciar concreto de torta y verificar espesor. • Vibrar el concreto a medida que se procede con el vaciado. • Propinar golpes con martillo de caucho a diferentes distancias. • Curar de manera constante durante los siete primeros días de vida del concreto. • Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.2.6	REFUERZOS MALLA ELECTRO SOLDADA H-257	


DESCRIPCIÓN

Suministro, corte, figuración, colocación y amarre de las mallas fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia f'y = 5.000 kg/cm2 (500 MPa), electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones que contienen los Planos. Deben cumplir con la norma NSR 10

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
- Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
- Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
- El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre entre la cara exterior de la varilla y la superficie del solado

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

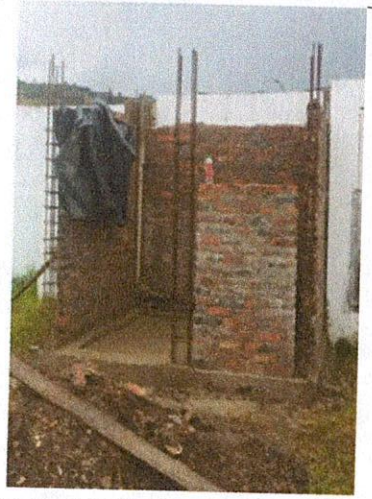ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.3.1	**MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.**	


DESCRIPCIÓN

Ejecución de muros en ladrillo tolete recocido 0.12 M con mortero de pega m.1:3, de las dimensiones estándar

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Sentar los bloques con traba en soga a media pieza.
- Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.
- Limpiar bases, losas y verificar niveles.
- Replantear muros.
- Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
- Instalar boquilleras y guías.
- Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
- Esparcir morteros en áreas de pega.
- Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado.
- Instalar anclajes, chazos, etc.
- Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
- Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

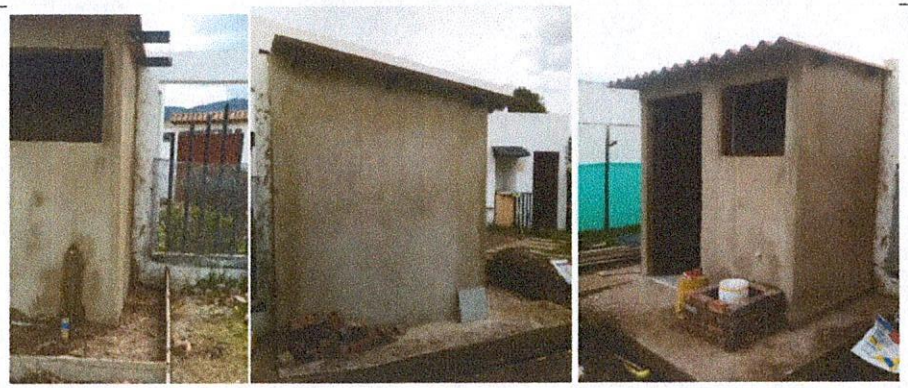
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.3.2	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3**	

DESCRIPCIÓN

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Definir la totalidad de la mampostería de las caras a pañetar
- Eliminar falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, con pañetes de espesor promedio no mayor de 1.5 cm.
- Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar
- Elaborar líneas maestras cada 3 m máximo
- Preparar el pañete en proporciones indicadas –
- Mortero 1:3 con arena de peña
- Instalar boquilleras y guías.
- Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos
- Retapar y alisar el pañete con llana de madera
- Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
- Verificar niveles, plomos y alineamientos.
- Limpiar superficies de muros.
- Proteger muros contra la intemperie.

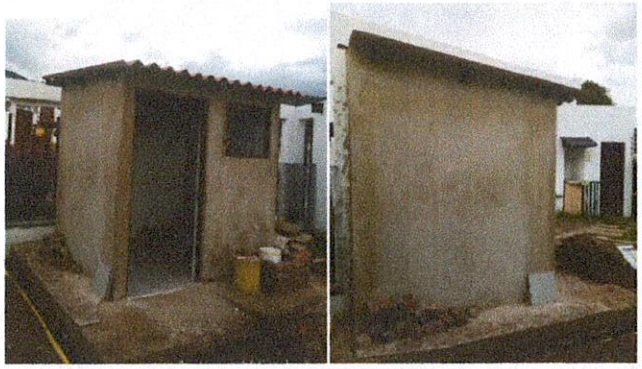
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.3.3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	

DESCRIPCIÓN

Esta especificación comprende el suministro de materiales y mano de obra para la ejecución de filos y dilataciones, localizados en las áreas de pañete del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Los filos se deben ejecutar al tiempo con la construcción del pañete y con el mismo espesor; en caso de que se ejecute posteriormente se debe usar mortero de calidad igual a la del pañete, previo humedecimiento con agua de las áreas colindantes a la de la construcción de los filos. Todos los filos se deben ejecutar a escuadra, exceptuando los lugares que se indiquen en los planos de construcción.
- Todas las uniones entre mampostería con placas, vigas aéreas, columnas de concreto y demás elementos estructurales deben ir dilatadas; éstas deben ser de un centímetro de ancho por un centímetro de profundidad. Las dilataciones verticales deberán estar debidamente plomadas e hiladas y las horizontales debidamente hiladas y niveladas.
- Las dilataciones deben ir en el pañete de los muros en ladrillo y no en el de las placas o de otras estructuras en concreto.
- La mezcla de mortero que se vaya a utilizar para los filos y dilataciones debe colocarse sobre una superficie de concreto endurecido o en un recipiente impermeable y limpio, para evitar la pérdida de la lechada de cemento.

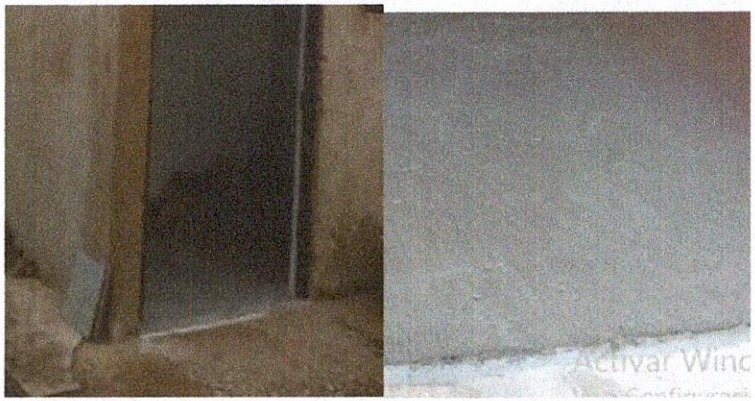ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.10	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	 **DESCRIPCIÓN** Este ítem se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos. **PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN** • Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto • Humedecerse completamente la superficie de concreto. • Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso • Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. • Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la mezcla. • Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. • Moldear los filos si la interventoría lo requiere. • Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

TEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.1.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**	 **DESCRIPCIÓN** Fabricación, Suministro e instalación de puertas metálicas persiana en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos **PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN** • Ubicar la localización donde debe ir la puerta. • Verificar que el marco este ubicado e instalado correctamente en el vano. • Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente vertical. • Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. • Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto en la parte de la bisagra del marco. • Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere.

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	

DESCRIPCIÓN

Fabricación, Suministro e instalación de marco metálico en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar la localización donde debe ir el marco
- Verificar que el marco este ubicado e instalado correctamente en el vano.
- Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente vertical.

13

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.4.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.**	

DESCRIPCIÓN

Fabricación, Suministro e instalación de ventana metálicas en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar la localización donde debe ir la ventana.
- Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede perfectamente vertical.
- Verificar que la hoja de la ventana quede perfectamente instalada sobre el marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
4.1.4	**CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO**	 

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de cerradura doble cilindro esta instalación se hará de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos arquitectónicos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar la puerta donde debe ir la cerradura.
- Verificar que la hoja de la puerta tenga el orificio para la cerradura, de no ser así con un taladro y una broca especial abrir dicho hueco a la altura indicada.
- Colocar a presión la carcasa de la cerradura dentro del chasis cilíndrico con poma exterior, de manera que la abertura de la carcasa quede de lado contrario a los resortes que se encuentran al interior de la caja del mecanismo del chasis de la cerradura.
- Colocar el chasis cilíndrico con manija exterior del lado que la abertura de la carcasa colocada dentro de la caja de mecanismo embolo con las patas del picaporte, atornillar los tornillos del soporte de roseta interior.
  - Introducir a presión la roseta interior por encima del soporte de roseta interior a manera que embolen los seguros de roseta interior con las entradas del soporte interior.

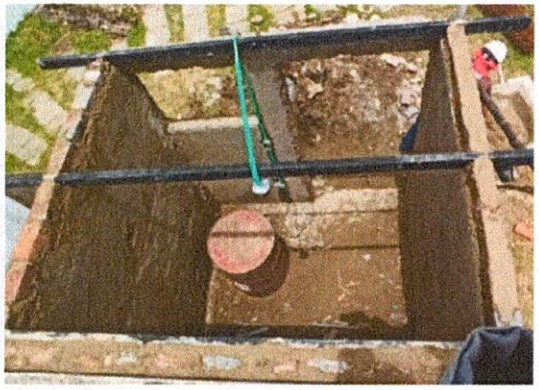ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	 

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de la estructura metálica para cubierta con perfiles de acero, que soportara las fuerzas ejercida por la cubierta y las producidas por vientos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, etc.).
- Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.

  Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera.

  Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja a instalar.

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1.1.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10**	


DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 4, según detalles incluidos en los diseños y los planos del Proyecto

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas de fibrocemento número
- Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser instalada la teja.
- Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado.
- Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).
- Revisar la inclinación de la cubierta.
- La estructura para este tipo de tejas debe estar impermeabilizada para evitar la filtración de agua, en caso de no estarlo se debe impermeabilizar con emulsión asfáltica y tela si es posible.
- La colocación de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma, con hileras intercaladas es decir una hilera de teja canal y luego una hilera de teja roblón y así sucesivamente hasta alcanzar la cumbrera.

CUBIERTA CENTRO DE VIDA

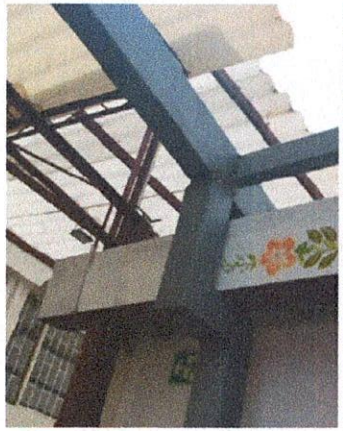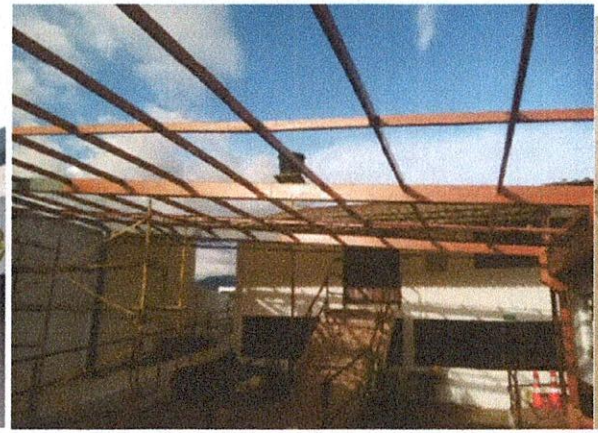ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
2.2.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILARÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**	   **DESCRIPCIÓN** Este ítem se refiere a la construcción de la estructura metálica para cubierta con perfiles de acero, que soportara las fuerzas ejercida por la cubierta, las producidas por vientos y carga de granizo. **PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN** • Recepción de los planos son la parte clave de cualquier diseño, y sin ellos no sería posible empezar ninguna estructura sin un riesgo de accidentes alto. • Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño de láminas policarbonato a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, etc.). • Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos. Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera. Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja a instalar.

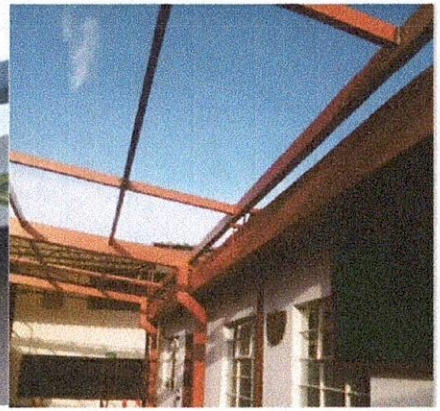ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
2.2.4	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	 




DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura esmalte y anticorrosivo sobre estructura metálica, para dar una mejor terminación y apariencia.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar que la superficie de la estructura se encuentra limpia y lisa teniendo en cuenta el estilo arquitectónico con el cual fue diseñada.
- Limpiar el polvo, residuos o grasa que puede tener el marco.
- Lijar las superficies del marco para retirar cualquier material ajeno a este.
- Preparar la pintura esmalte con thinner para disolverla.
- Aplicar la primera mano de pintura esmalte con rodillo, brocha o pistola de compresor de arriba hacia abajo a lo largo de la estructura.
- Dejar secar la primera mano de esmalte para luego aplicar la segunda mano de pintura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
2.2.5	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)**	 **DESCRIPCIÓN** Comprende este ítem la excavación manual de la cimentación que incluye vigas de cimentación incluyendo el retiro de sobrantes Comprende las actividades necesarias para la ejecución de las excavaciones manuales y su clasificación, llenos, botada de tierra, control de aguas y otras actividades que usualmente se presentan en la construcción **PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN** • Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. • La profundidad de las excavaciones estará regida por las especificaciones del diseño, si existen dudas sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor profundidad, de acuerdo con la supervisión. • Teniendo en cuenta la topografía del sitio de estudio y el nivel de cimentación, los cortes pueden hacerse verticales. • Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. • Verificar niveles finales de cimentación

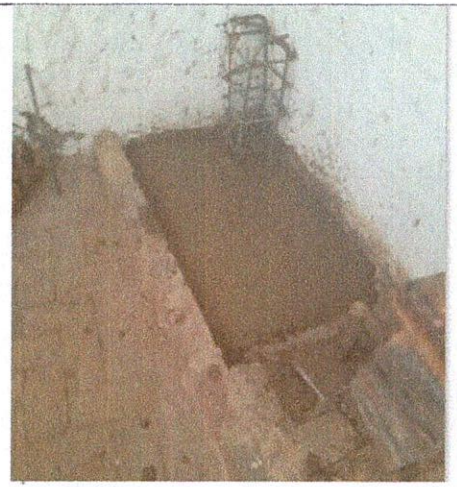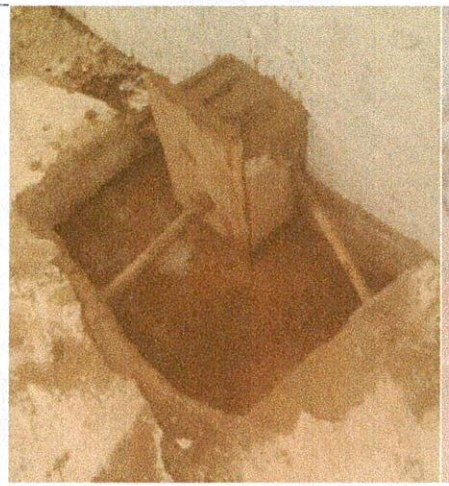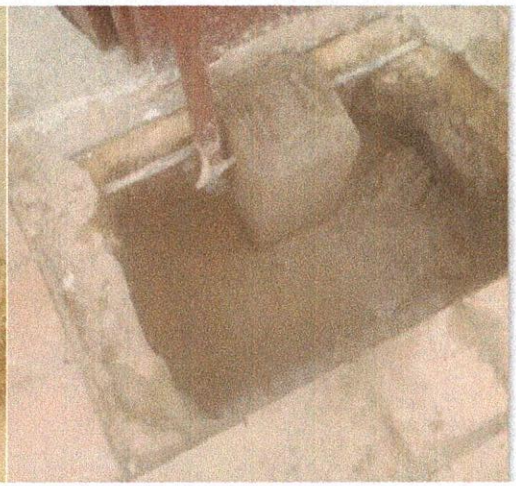ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
2.2.6	**CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)**	  



DESCRIPCIÓN

Ejecución de Zapatas en Concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
- Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
- Colocar y revisar refuerzo de acero.
- Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
- Verificar refuerzos y recubrimientos.
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
- Vaciar concreto progresivamente.
- Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
- Curar concreto.
- Verificar niveles finales para aceptación.

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA		
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ	PROCESO: Contratación Publica	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL UNO		

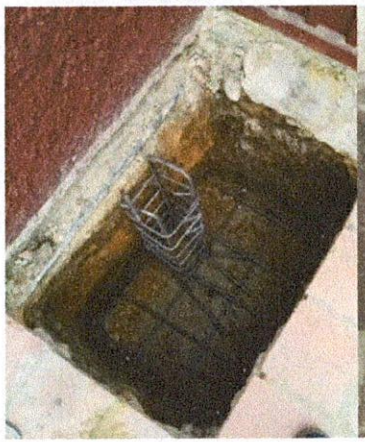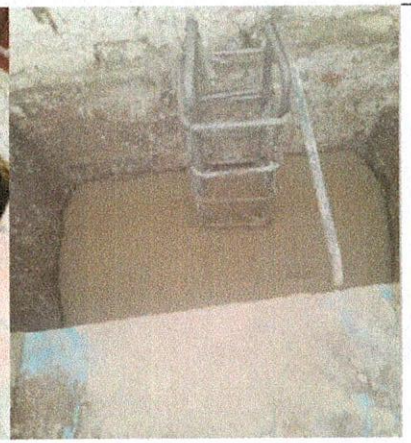ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
2.2.7	**SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**	   **DESCRIPCIÓN** Ejecución zapatas en concreto reforzado de amarre en concreto de 21 Mpa, para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro de los Planos Estructurales. **PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN** • Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. • Verificar nivel superior del concreto de limpieza. • Colocar y revisar refuerzo de acero. • Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. • Verificar refuerzos y recubrimientos. • Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. • Vaciar concreto progresivamente. • Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. • Curar concreto. • Verificar niveles finales para aceptación.

Atentamente;



IGNACIO PLAZAS PEREZ

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre del representante legal IGNACIO PLAZAS PÉREZ
C. C. 9529394 de Sogamoso
Dirección de correo cra 2 5ª 44
Correo electrónico ignacioplazas@gmail.com
Ciudad TIBASOSA


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.3	VENTANAS
ÍTEM	1.3.1	DESMONTE VIDRIO
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

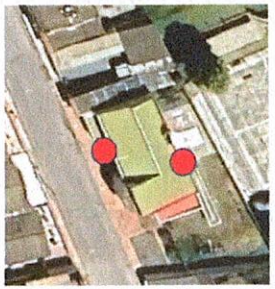

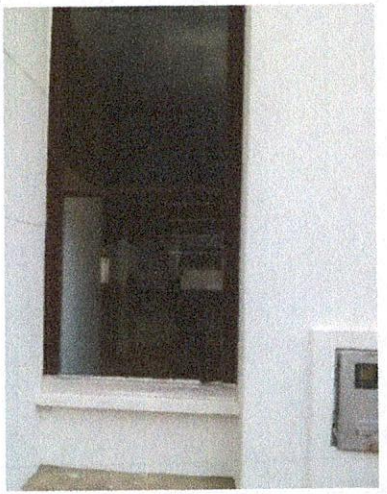

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m^2)	TOTAL
1	VENTANA FACHADA	1,00		1,37	1,00	1,37	1,37
2	VENTANA POSTERIOR SEGUNDO PISO	1,10		1,30	1,00	1,43	1,43
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	2,80
						TOTAL	2,80

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.3	VENTANAS
ITEM	1.3.2	VIDRIO 4 MM
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

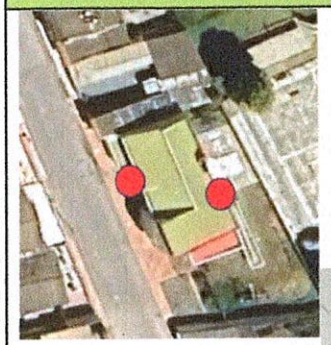

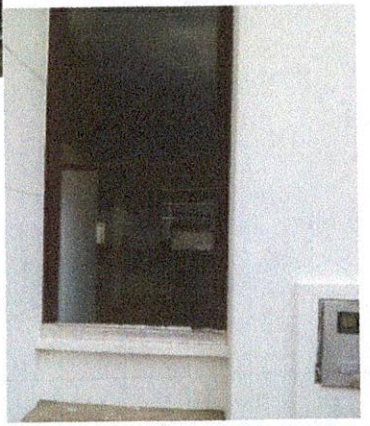

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m^2)	TOTAL
1	VENTANA FACHADA	1,00		1,37	1,00	1,37	1,37
2	VENTANA POSTERIOR SEGUNDO PISO	1,10		1,30	1,00	1,43	1,43
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	2,80
						TOTAL	2,80

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1,48	PRELIMINARES
ÍTEM	1.4.1.1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

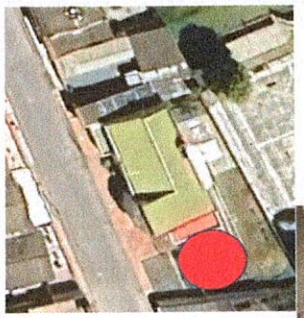

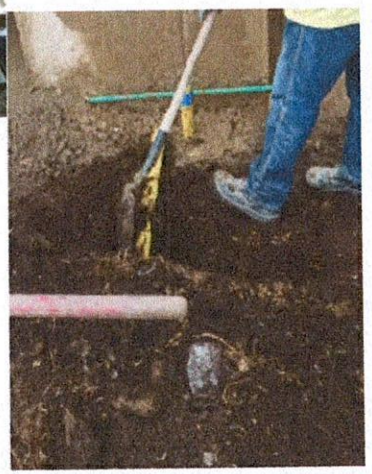

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m^2)	TOTAL
1	CUARTO DE BASURAS	2,40	3,21		1,00	7,70	7,70
2	CUARTO DE BASURAS	0,61	3,21		1,00	1,95	1,95
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	9,65
						TOTAL	9,65

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESDC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1,40	PRELIMINARES
ÍTEM	1.4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CÚBICO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1	CUARTO DE BASURAS	2,40	3,21	0,20	1,00	1,54	1,54
2	CUARTO DE BASURAS	0,61	3,21	0,20	1,00	0,39	0,39
3	EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	0,40	3,00	0,70	1,00	0,84	0,84
4	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	0,40	8,00	0,40	1,00	1,28	1,28
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	4,05
						TOTAL	4,05

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1,40	PRELIMINARES
ÍTEM	1.4.1.3	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000 PSI)
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

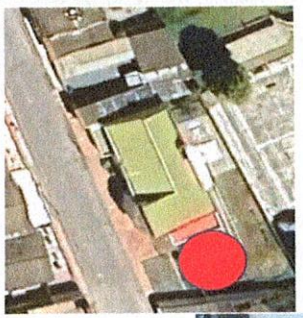



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m2)	TOTAL
1	SOLADO CUARTO DE BASURAS	2,00	1,70		1,00	3,40	3,40
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	3,40
						TOTAL	3,40

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÀ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1,4,2	ESTRUCTURA
ÍTEM	1.4.2.1	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CÚBICO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

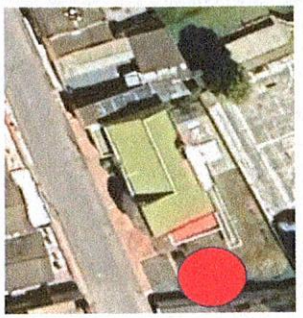

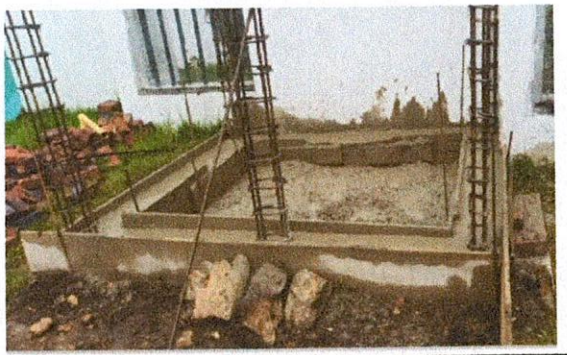

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1	VIGA CIMENTACIÓN CUARTO DE BASURAS	0,25	8,00	0,30	1,00	0,60	0,60
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	0,60
						TOTAL	0,60

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.2	ESTRUCTURA
ÍTEM	1.4.2.2	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CÚBICO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

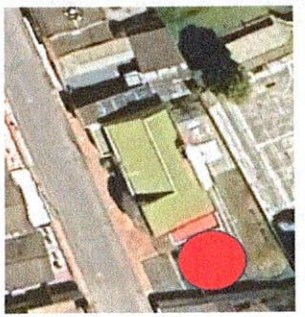

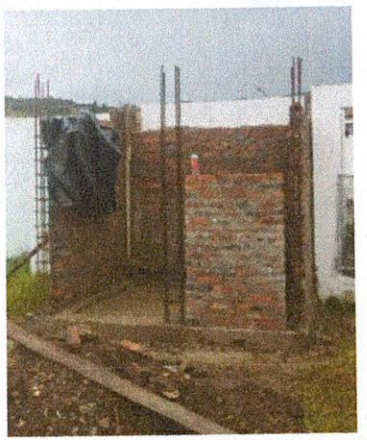

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1	COLUMNETAS CUARTO DE BASURAS	0,25	0,15	2,15	5,00	0,39	0,39
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	0,39
						TOTAL	0,39

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.2	ESTRUCTURA
ÍTEM	1.4.2.3	VIGA AÉREA 21 MPa - (3000 PSI)
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CÚBICO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

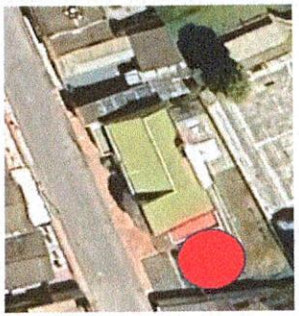



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1	VIGA AÉREA CUARTO DE BASURAS	0,15	8,00	0,20	1,00	0,24	0,24
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	0,24
						TOTAL	0,24

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	1,4,2	ESTRUCTURA
ÍTEM	1.4.2.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO


ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO











#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	PESO (Kg/ML)	TOTAL
1	**VIGA CIMENTACIÓN**						
	SE COLOCA FLEJE No 3 CADA 12 CM, EN UNA VIGA TOTAL DE 8 M	0,12	0,88	0,22	67	0,56	32,85
2	4 VARILLA No 4 EN UNA LONGITUD DE 8 M		8,00		4,00	0,99	31,68
3	**COLUMNETAS**						
4	SE COLOca 4 VARILLA No 4 POR COLUMNETA, DESDE LA PARTE INFERIOR DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN, HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA AÉREA		3,00		20,00	0,99	71,28
5	SE COLOCA FLEJE No 3 CADA 10 CM, EN UNA LONGITUD DE 2,10 M, PARA 5 COLUMNAS	0,19	0,76	0,09	105,00	0,56	44,69
6							
7							
8							
9	**VIGA AÉREA**						
10	SE COLOCA FLEJE No 3 CADA 12 CM, EN UNA VIGA TOTAL DE 8 M	0,14	0,66	0,09	67	0,56	24,64
11	4 VARILLA No 3 EN UNA LONGITUD DE 8 M		8,00		4,00	0,56	17,92
12							
						SUBTOTAL	**223,06**
						TOTAL	**223,06**

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1,4,2	ESTRUCTURA
ÍTEM	1.4.2.5	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

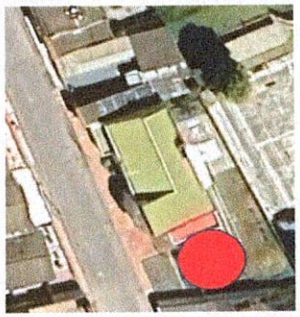

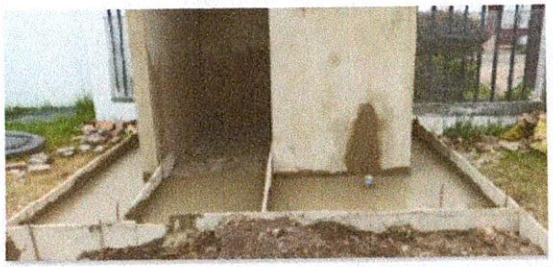

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m2)	TOTAL
1	PLACA MACIZA CUARTO DE BASURAS	2,40	3,21	0,10	1,00	7,70	7,70
2	PLACA MACIZA CUARTO DE BASURAS	0,61	3,21	0,10	1,00	1,95	1,95
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	9,65
						TOTAL	9,65

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1,4,2	ESTRUCTURA
ÍTEM	1.4.2.6	REFUERZOS MALLA ELECTRO SOLDADA H-257
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

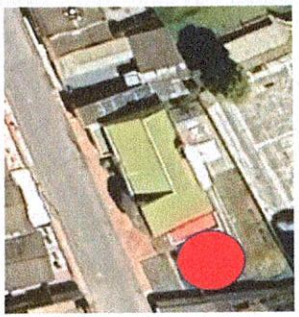



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	ÁREA (M2)	PESO (Kg/M2)	TOTAL
1	MALLA DE REFUERZO 4MM DE 15x15	2,40	3,21		7,70	1,33	10,25
2	MALLA DE REFUERZO 4MM DE 15x15	0,61	3,21		1,95	1,33	2,59
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	12,83
						TOTAL	12,83

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.3	MAMPOSTERÍA
ÍTEM	1.4.3.1	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

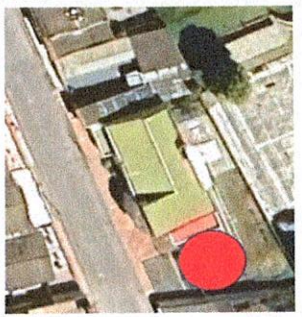



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	ÁREA (M2)	UNIDAD	TOTAL
1	MAMPOSTERÍA	2,00	1,70	2,10	15,54	1,00	15,54
2	CULATA CASETA	2,00	1,70	0,20	0,54	1,00	0,54
3	POCETA LAVADO	0,40	0,70	0,30	0,45	1,00	0,45
4	PUERTA	0,97		2,10	-2,04	1,00	-2,04
5	VENTANA	0,64		0,66	-0,42	1,00	-0,42
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	14,07
						TOTAL	14,07

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.3	MAMPOSTERÍA
ÍTEM	1.4.3.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

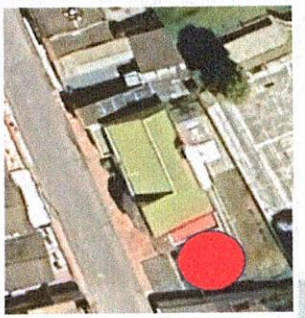

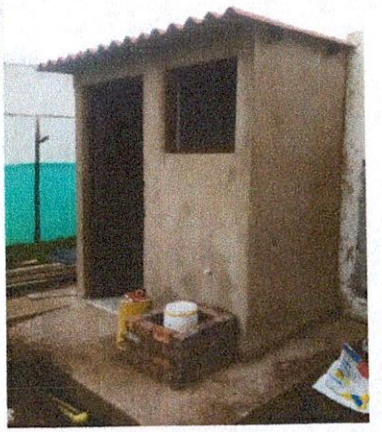

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	ÁREA (M2)	UNIDAD	TOTAL
1	PAÑETE EXTERNO	2,20	1,90	2,10	12,60	1,00	12,60
2	PAÑETE INTERNO	2,00	1,70	2,10	15,54	1,00	15,54
3	POCETA LAVADO	0,40	0,70	0,30	0,45	1,00	0,45
4	PUERTA	0,97		2,10	-2,04	2,00	-4,07
5	VENTANA	0,64		0,66	-0,42	2,00	-0,84
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	23,67
						TOTAL	23,67

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.3	MAMPOSTERÍA
ÍTEM	1.4.3.3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
UNIDAD DE MEDIDA		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

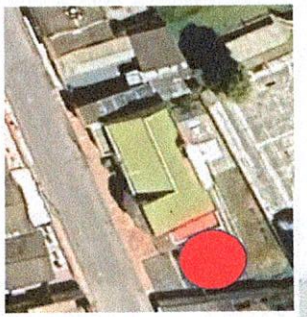

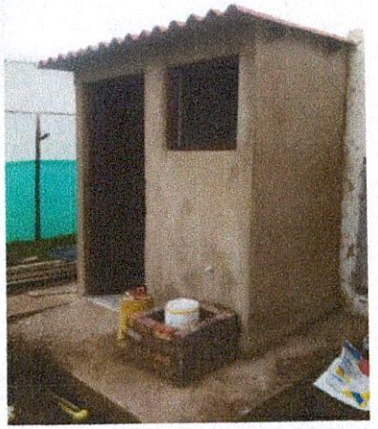

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (M)	UNIDAD	TOTAL
1	PARTE EXTERNA				2,20	2,00	2,20
2	PUERTA LATERALES				2,10	3,00	6,30
3	PUERTA VIGA				0,97	2,00	1,94
4	VENTANA				2,70	2,00	5,40
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	15,84
						TOTAL	15,84

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.7	ACABADOS
ÍTEM	1.4.10	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

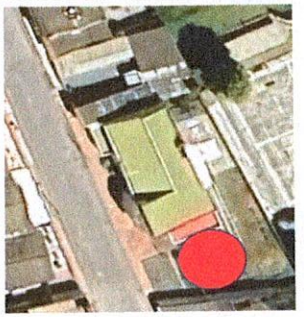



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m2)	TOTAL
1	ALISTADO PISO CUARTO DE BASURAS	2,00	1,70		1,00	3,40	3,40
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	3,40
						TOTAL	3,40

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.8	CARPINTERÍA
ÍTEM	1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

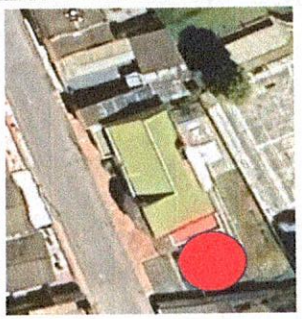

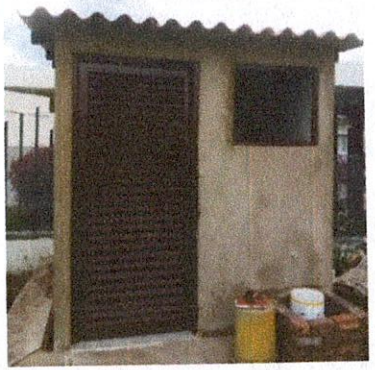

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (m2)	TOTAL
1	PUERTA EN LAMINA CAL 18	0,97		2,10	1,00	2,04	2,04
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	2,04
						TOTAL	2,04

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.8	CARPINTERÍA
ITEM	1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



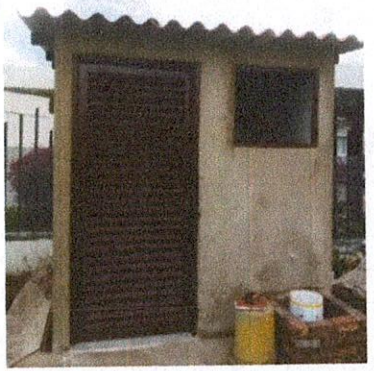

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)		TOTAL
1	MARCO EN LAMINA CAL 18	0,97		2,10	1,00		1,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	1,00
						TOTAL	1,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.8	CARPINTERÍA
ÍTEM	1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



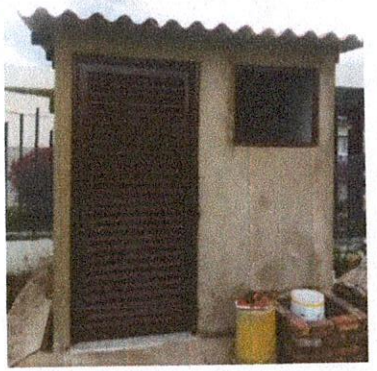

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (M2)	TOTAL
1	VENTANA EN LAMINA CAL 18	0,64		0,76	1,00	0,49	0,49
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	0,49
						TOTAL	0,49

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.8	CARPINTERÍA
ÍTEM	4.1.4	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO
UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

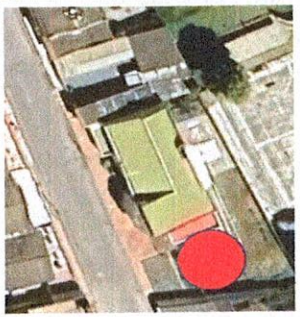



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)		TOTAL
1	CERRADURA DOBLE CILINDRO PUERTA METÁLICA				1,00		1,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	1,00
						TOTAL	1,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.8	CUBIERTA
ÍTEM	1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO
UNIDAD DE MEDIDA		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)		TOTAL
1	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA		2,55		3,00		7,65
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	7,65
						TOTAL	7,65

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÌN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	1.4.8	CUBIERTA
ÍTEM	1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

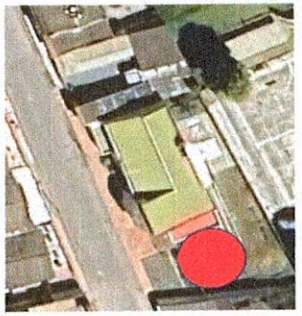

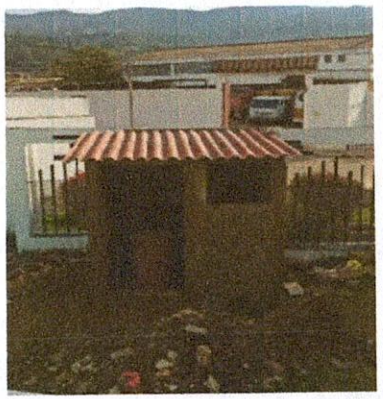

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	ÁREA (M2)	TOTAL
1	CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	2,45	2,65			6,49	6,49
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						SUBTOTAL	6,49
						TOTAL	6,49

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILARÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO


ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



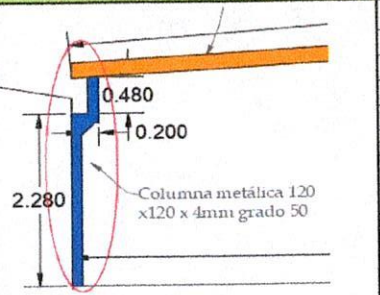







#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	PESO (Kg/ML)	TOTAL
EJE	**COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM**						
1A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,12		1	14,81	46,21
2A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,16		1	14,81	46,80
3A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,18		1	14,81	47,10
4A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,10		1	14,81	45,91
5A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,14		1	14,81	46,50
6A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,11		1	14,81	46,06
1B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,35		1	14,81	49,61
2B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,37		1	14,81	49,91
3B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
4B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
5B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
6B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
		SUMA	**37,53**				
3	**VIGA 120X60X3MM**						
A	VIGA 120X60X3MM		24,77		1	8,28	246,11
B	VIGA 120X60X3MM		26,32		1	8,28	261,52
		SUMA	**51,09**				
	VIGA 200X100X3MM						
1	VIGA 200X100X3MM		10,09		1	14,05	141,76
2	VIGA 200X100X3MM		9,62		1	14,05	135,16
3	VIGA 200X100X3MM		9,09		1	14,05	127,71
4	VIGA 200X100X3MM		8,57		1	14,05	120,41
5	VIGA 200X100X3MM		8,05		1	14,05	113,10
6	VIGA 200X100X3MM		7,60		1	14,05	106,78
		SUMA	**53,02**				
						SUBTOTAL	1808,38
						PASAN	1808,38

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	VER PLANO ANEXO

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÒN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILARÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÀFICO

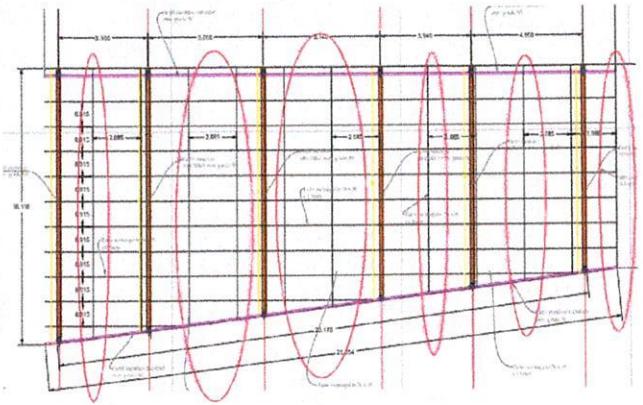

#	DESCRIPCIÒN - UBICACIÒN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	PESO (Kg/ML)	TOTAL
EJE	**PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM**						
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		25,00		8	2,66	532,00
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		15,63		1	2,66	41,58
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,90		1	2,66	23,67
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,82		1	2,66	26,12
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,57		1	2,66	25,46
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,31		1	2,66	24,76
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,00		1	2,66	23,94
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,85		1	2,66	23,54
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,62		1	2,66	22,93
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,36		1	2,66	22,24
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,12		1	2,66	21,60
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		7,90		1	2,66	21,01
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		7,62		1	2,66	20,27
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		7,04		1	2,66	18,73
		SUMA	143,74				
						SUBTOTAL	847,85
						ANTERIOR	1808,38
						TOTAL	2656,23

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	VER PLANO ANEXO

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ


ADESOC ONG Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	2.2.4	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO


ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



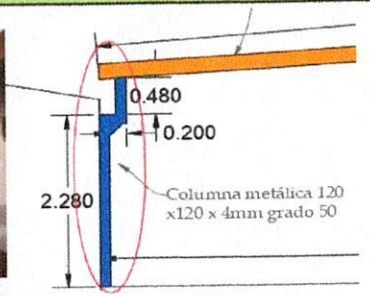







#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	PESO (Kg/ML)	TOTAL
EJE	**COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM**						
1A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,12		1	14,81	46,21
2A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,16		1	14,81	46,80
3A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,18		1	14,81	47,10
4A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,10		1	14,81	45,91
5A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,14		1	14,81	46,50
6A	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,11		1	14,81	46,06
1B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,35		1	14,81	49,61
2B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,37		1	14,81	49,91
3B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
4B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
5B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
6B	COLUMNA METÁLICA 120X120X4MM		3,00		1	14,81	44,43
		SUMA	**37,53**				
3	**VIGA 120X60X3MM**						
A	VIGA 120X60X3MM		24,77		1	8,28	246,11
B	VIGA 120X60X3MM		26,32		1	8,28	261,52
		SUMA	**51,09**				
	VIGA 200X100X3MM						
1	VIGA 200X100X3MM		10,09		1	14,05	141,76
2	VIGA 200X100X3MM		9,62		1	14,05	135,16
3	VIGA 200X100X3MM		9,09		1	14,05	127,71
4	VIGA 200X100X3MM		8,57		1	14,05	120,41
5	VIGA 200X100X3MM		8,05		1	14,05	113,10
6	VIGA 200X100X3MM		7,60		1	14,05	106,78
		SUMA	**53,02**				
						SUBTOTAL	1808,38
						PASAN	1808,38

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	VER PLANO ANEXO

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	2.2.4	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

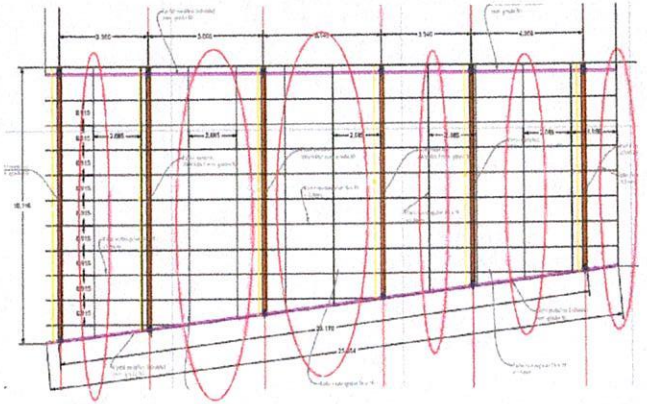

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	PESO (Kg/ML)	TOTAL
EJE	**PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM**						
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		25,00		8	2,66	532,00
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		15,63		1	2,66	41,58
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,90		1	2,66	23,67
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM				1	2,66	0,00
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,82		1	2,66	26,12
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,57		1	2,66	25,46
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,31		1	2,66	24,76
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		9,00		1	2,66	23,94
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,85		1	2,66	23,54
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,62		1	2,66	22,93
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,36		1	2,66	22,24
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		8,12		1	2,66	21,60
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		7,90		1	2,66	21,01
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		7,62		1	2,66	20,27
	PERFIL RECTANGULAR 3 X 1 1/2X 1,5 MM		7,04		1	2,66	18,73
		SUMA	**143,74**				
						SUBTOTAL	847,85
						ANTERIOR	1808,38
						TOTAL	2656,23

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	VER PLANO ANEXO

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

jp


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	2.2.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CÚBICO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

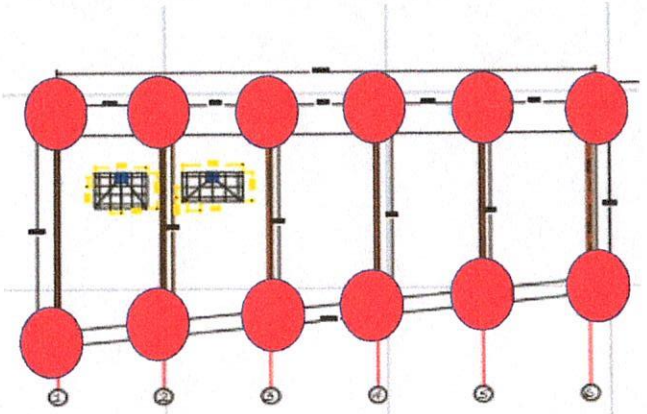

EJE	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1A	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
2A	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
3A	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
4A	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
5A	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
6A	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
1B	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
2B	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
3B	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
4B	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
5B	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
6B	EXCAVACIÓN ZAPATA	0,60	0,80	0,80	1,00	0,38	0,38
						SUBTOTAL	4,61
						TOTAL	4,61

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

IGNACIO PLAZAS PEREZ

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa -	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)
UNIDAD DE MEDIDA		METRO CÚBICO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

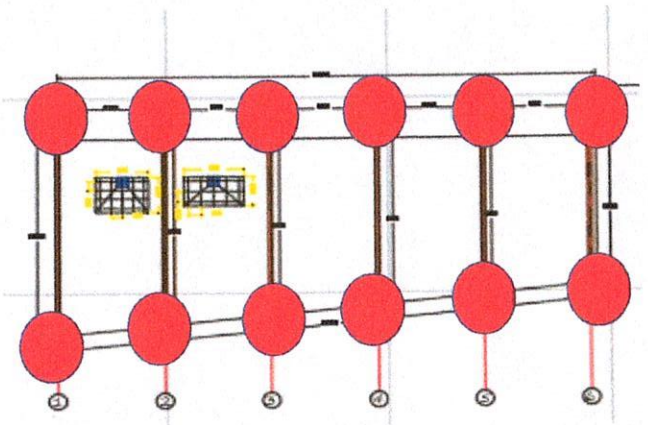

EJE	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1A	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
2A	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
3A	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
4A	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
5A	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
6A	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
1B	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
2B	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
3B	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
4B	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
5B	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
6B	CONCRETO ZAPATA	0,60	0,80	0,35	1,00	0,17	0,17
						SUBTOTAL	2,02
						TOTAL	2,02

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

IGNACIO PLAZAS PEREZ

13


CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ

ADESOC ONG
Nit: 826.003.061-1


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.2.	ESTRUCTURA
ÍTEM	2.2.7	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
UNIDAD DE MEDIDA		KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO







EJE	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	PESO (Kg/M)	TOTAL
	ACERO ZAPATA LADO A		1,10		4,00	0,99	4,36
	ACERO ZAPATA LADO B		0,90		5,00	0,99	4,46
						SUMA	8,81
	NUMERO DE ZAPATAS				12,00		105,73
	4 VARILLAS No4 PEDESTAL ALTURA 75 CM , GANCHO DE 40 CM PARTE BAJA Y 20 CM PARTE ALTA L= 1,35		1,35		48,00	0,99	64,15
	FLEJE No 3 CADA 10 CM L= 0,88	0,17	0,88	0,17	84,00	0,56	41,40
						SUBTOTAL	211,28
						TOTAL	211,28

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

IGNACIO PLAZAS PEREZ

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONVENCIONES Y NOTAS:

13

INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DE CONTRATO

CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) permite desarrollar un proceso lógico, basado en la mejora continua, con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es una herramienta simple que permite desarrollar de manera organizada, las fases de PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR (ciclo PHVA), de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores de ADESOC.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se establece dentro del marco del cumplimiento de la normatividad legal vigente, que básicamente se articula alrededor del Decreto 1072 del 2015.

ALCANCE

Este informe de actividades en seguridad y salud en el trabajo corresponde a las actividades realizadas en las siguientes áreas:

- JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS
- CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

1. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Se realizó proceso de inducción con cada uno de los trabajadores en las diferentes áreas de trabajo, dando a conocer las normas, reglamentos y medidas a implementar con el fin de disminuir el nivel de los riesgos identificados y evitar al máximo la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajos, se enfatizo en el uso adecuado de los EPP y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se capacito sobre riesgo biomecánico haciendo énfasis en Posiciones adecuadas, levantamiento correcto de cargas y movimientos repetitivos.

Se capacito en Incidentes y Accidentes de Trabajo dando a conocer su diferencia, que hacer en caso de que un evento no deseado ocurra y a donde asistir en caso de accidente de trabajo.

2. INSPECCIONES

Se realizaron inspecciones a las áreas de trabajo verificando el estado de las

máquinas y herramientas usadas.

Se sensibilizo al personal sobre actos y condiciones inseguras buscando que reduzca el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se entregó elementos de protección personal a los trabajadores, se capacito sobre su uso adecuado y se realizaron inspecciones para verificar su correcto uso.

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se realizó una identificación de los riesgos presentes en cada puesto de trabajo, de igual manera se actualizo el panorama de riesgos y se tomaron medidas que redujeran dicho nivel de riesgo.

5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Se verifico el estado de cada una de las maquinas usadas y las herramientas manuales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Entrega de EEP, para la proteccion del equipo de trabajo



Verificacion de estado de la herramineta y equipo a utilizar, que las cobles y protecciones esten en buen estado y aptos para la ejecucion de actividades.



Verificacion de estado de la herramineta y equipo a utilizar, que los cables y protecciones esten en buen estado y aptos para la ejecucion de actividades. 13



Capacitación e inducción a personal

Atentamente;

IGNACIO PLAZAS PEREZ

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre del representante legal IGNACIO PLAZAS PÉREZ
C. C. 9529394 de Sogamoso
Dirección de correo cra 2 5ª 44
Correo electrónico ignacioplazas@gmail.com
Ciudad TIBASOSA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Nit: 826.003.061-1		
	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-P-11-01
		Versión: 1.0
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha:.20/09/2023

FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ

FECHA: 28 - 12 - 2023
CIUDAD TIBASOJA

CADA ITEM DEL PRESENTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE DA ORIGEN A LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL.	
	Inducción por ingreso del personal nuevo.
	Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado.
	Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro de la empresa/ centro: funciones o responsabilidades, procedimientos, indicadores, riesgos, formatos y registros relacionados con sus nuevas funciones, nuevos factores de riesgo, si los hay.
	Reinducción

I. INDUCCIÓN GENERAL

		Observación:	Aceptación. Inducción general:
	Visión y Misión		
	Normatividad interna (reglamento)		
	Estructura organizacional		
	Principios y Valores		
	Sistemas de evaluación del personal		
	Concepto y Clasificación de faltas (Control disciplinario).		
	Sanciones y causales de exclusión de responsabilidad.		
	Otros, Indique:		
			Firma del Empleado:
			Nombre: Carlos Cardenas
			C.C. 1.055.315069

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA

2. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

		Observación:	Aceptación. Inducción Especifica
	Manual de Funciones		
	Manuales Operativos		
	Riesgos asociados a la actividad laboral		
	Horario laboral		
	Presentación de Compañeros		
	Otras (indique):		
			Firma del Empleado:
			Nombre: Carlos Cardenas
			C.C. 1.055.315.069

13

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Nit: 826.003.061-1		
	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-P-11-01
		Versión: 1.0
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha: 20/09/2023

III. MODELO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL – ENTRENAMIENTO		
Procesos y procedimientos	**Observación:**	**Aceptación. Planeación y seguimiento**
Funciones del cargo		
Otras (indique):		
Planes decreto 612 de 2018		
		Firma del Empleado:
		Nombre: Carlos Cárdenas
		C.C. 1.055.315.069

V. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (SALUD OCUPACIONAL)		
Políticas de salud y seguridad en el trabajo	**Observación:**	**Aceptación. Inducción general**
Programa de Salud Ocupacional		
Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias		
Accidente de trabajo / Incidente de trabajo / enfermedad profesional		
Matriz de riesgos, fuentes y medios de control para los accidentes de trabajo		Firma del Empleado:
Otras (indique):		Nombre: Carlos Cardenas
		C.C. 1.055.315.069

Atentamente;

IGNACIO PLAZAS PEREZ

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre del representante legal IGNACIO PLAZAS PEREZ
C. C. 9529394 de Sogamoso
Dirección de correo cra 2 5ª 44
Correo electrónico ignacioplazas@gmail.com
Ciudad TIBASOSA

13

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Nit: 826.003.061-1		
	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-P-11-01
		Versión: 1.0
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha:.20/09/2023

FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ

FECHA: 28-12-2024
CIUDAD TIBASOSA

CADA ITEM DEL PRESENTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE DA ORIGEN A LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL.	
	Inducción por ingreso del personal nuevo.
	Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado.
	Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro de la empresa/ centro: funciones o responsabilidades, procedimientos, indicadores, riesgos, formatos y registros relacionados con sus nuevas funciones, nuevos factores de riesgo, si los hay.
	Reinducción

I. INDUCCIÓN GENERAL

		Observación:	Aceptación. Inducción general:
	Visión y Misión		
	Normatividad interna (reglamento)		
	Estructura organizacional		
	Principios y Valores		
	Sistemas de evaluación del personal		
	Concepto y Clasificación de faltas (Control disciplinario).		
	Sanciones y causales de exclusión de responsabilidad.		
	Otros, Indique:		
			Firma del Empleado:
			Nombre: Marco Acevedo
			C.C. 7.224.618

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA

2. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

		Observación:	Aceptación. Inducción Especifica
	Manual de Funciones		
	Manuales Operativos		
	Riesgos asociados a la actividad laboral		
	Horario laboral		
	Presentación de Compañeros		
	Otras (indique):		
			Firma del Empleado:
			Nombre: Marco Acevedo
			C.C. 7.224.618

13

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Nit: 826.003.061-1		
ADESOC ONG	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-P-11-01
		Versión: 1.0
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha:.20/09/2023

III. MODELO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL – ENTRENAMIENTO		
Procesos y procedimientos	**Observación:**	**Aceptación. Planeación y seguimiento**
Funciones del cargo		
Otras (indique):		
Planes decreto 612 de 2018		
		Firma ~~del Empleado~~:
		Nombre: Marco Acosta
		C.C. 7.224.618

V. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (SALUD OCUPACIONAL)		
Políticas de salud y seguridad en el trabajo	**Observación:**	**Aceptación. Inducción general**
Programa de Salud Ocupacional		
Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias		
Accidente de trabajo / Incidente de trabajo / enfermedad profesional		
Matriz de riesgos, fuentes y medios de control para los accidentes de trabajo		Firma ~~del Empleado~~:
Otras (indique):		Nombre: Marco Acosta
		C.C. 7.224.618

Atentamente;

IGNACIO PLAZAS PEREZ

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre del representante legal IGNACIO PLAZAS PEREZ
C. C. 9529394 de Sogamoso
Dirección de correo cra 2 5ª 44
Correo electrónico ignacioplazas@gmail.com
Ciudad TIBASOSA

13

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Nit: 826.003.061-1		
	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-P-11-01
		Versión: 1.0
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha:.20/09/2023

FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE VIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ

FECHA: 28-12-2024
CIUDAD Sogamoso.

CADA ITEM DEL PRESENTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO, DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE DA ORIGEN A LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL.	
	Inducción por ingreso del personal nuevo.
	Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado.
	Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro de la empresa/ centro: funciones o responsabilidades, procedimientos, indicadores, riesgos, formatos y registros relacionados con sus nuevas funciones, nuevos factores de riesgo, si los hay.
	Reinducción

I. INDUCCIÓN GENERAL

		Observación:	Aceptación. Inducción general:
	Visión y Misión		
	Normatividad interna (reglamento)		
	Estructura organizacional		
	Principios y Valores		
	Sistemas de evaluación del personal		
	Concepto y Clasificación de faltas (Control disciplinario).		
	Sanciones y causales de exclusión de responsabilidad.		
	Otros, Indique:		
			Firma del Empleado:
			Nombre: Mario Alfonso
			C.C. 7.226.187

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA

2. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

		Observación:	Aceptación. Inducción Especifica
	Manual de Funciones		
	Manuales Operativos		
	Riesgos asociados a la actividad laboral		
	Horario laboral		
	Presentación de Compañeros		
	Otras (indique):		
			Firma del Empleado:
			Nombre: Mario. Alfonso
			C.C. 7.226.187

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Nit: 826.003.061-1		
	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-P-11-01
		Versión: 1.0
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha:.20/09/2023

III. MODELO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL – ENTRENAMIENTO		
Procesos y procedimientos	**Observación:**	**Aceptación. Planeación y seguimiento**
Funciones del cargo		
Otras (indique):		
Planes decreto 612 de 2018		
		Firma del Empleado:
		Nombre: Mario Alfonso
		C.C. 7.226.187

V. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (SALUD OCUPACIONAL)		
Políticas de salud y seguridad en el trabajo	**Observación:**	**Aceptación. Inducción general**
Programa de Salud Ocupacional		
Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias		
Accidente de trabajo / Incidente de trabajo / enfermedad profesional		
Matriz de riesgos, fuentes y medios de control para los accidentes de trabajo		Firma del Empleado:
Otras (indique):		Nombre: Mario Alfonso
		C.C. 7.226.187

Atentamente;

IGNACIO PLAZAS PEREZ

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre del representante legal IGNACIO PLAZAS PEREZ
C. C. 9529394 de Sogamoso
Dirección de correo cra 2 5ª 44
Correo electrónico ignacioplazas@gmail.com
Ciudad TIBASOSA

13
