Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del mes de agosto del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Oficio radicado No. 2024S-VCES-042032 (27-6-2024)

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 45CS09 CUATROVIENTOS – CODAZZI, 4313 SAN JOSE – YE DE ARJONA, 43CS02 YE DE ARJONA – EL PASO – CUATROVIENTOS, 7806 EL BANCO – TAMALAMEQUE – EL BURRO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 194,73 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1963 DE 2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:	1963 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACION DEL PASO "COOTRAESPA"	NIT:	800.214.830-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0+0000 - PR64+0011- LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	24/06/2026

VALOR INICIAL:	$ 1.678.547.874,00
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$ 1.678.547.874,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	29 meses o hasta el 31/07/2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 544.022.450	**$**121.498.348	$422.524.102
TOTAL				$ 544.022.450	**$**121.498.348	$422.524.102

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Mtto Rutinario 01	$12.478.323	$ 215.535	$ 0	12.693.858
Acta de Mtto Rutinario 02	$53.478.525	$923.720	$0	$54.402.245
Acta de Mtto Rutinario 03	$53.478.525	$923.720	$0	$54.402.245
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Administración Vial No. 03 de fecha 5/08/2024, para el periodo del 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO	$1.678.547874	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$**121.498348	7.24
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$**121.498348	7.24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$**121.498348	7.24

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 7.24%
Meta física ejecutada %: 7.24%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL. SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$167.854.787,40	47-44-101027661 ANEXO 3	24/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$335.709.574,80	47-44-101027661 ANEXO 3	24/06/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL. SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad del servicio	$503.564.362,20	47-44-101027661 ANEXO 3	12/08/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	47-40-101008522 ANEXO 3	24/06/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1966 DE 2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	1966 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL "COOTRAMAVI"	NIT:	824.002.227-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 4313 SAN JOSÉ-YE DE ARJONA, PR21+0000 - PR73+0840- LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 1.546.350.434,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.546.350.434,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29 mes o hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO			REGISTRO	UTILIZADO	REGISTRO
551024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$501.177.557	$111.929.655	$389.247.902
TOTAL				$501.177.557	$111.929.655	$389.247.902

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Mtto Rutinario 01	$11.495.583	$198.560		$11.694.143
Acta de Mtto Rutinario 02	$49.266.784	$850.972		$50.117.756
Acta de Mtto Rutinario 03	$49.266.784	$850.972		$50.117.756
Acta de Ajuste No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05/09/2024, para el periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO	$1.546.350434	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$111.929655	7,24
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$111.929655	7,24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$111.929655	7,24

2.4.02 ANTICIPO

Otorgado	$

Amortizado	$
Saldo	$

2.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 7,24%
Meta física ejecutada %: 7,24%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$154.635.043,40	47-44-101027629 ANEXO 2	24/06/2024	12/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 309.270.086,80	47-44-101027629 ANEXO 2	24/06/2024	12/08/2029
Calidad del servicio	$463.905.130,20	47-44-101027629 ANEXO 2	12/08/2026	12/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000	47-40-101008517 ANEXO 3	24/06/2024	12/08/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1961 DE 2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO No.	1961 DE 2024		
CONTRATISTA:	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA SAS	NIT:	901.050.357-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 7806 EL BANCO -TAMALAMEQUE – EL BURRO, PR0+0000 – PR45+0000” LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	24/06/2024
VALOR INICIAL:	$1.576.477.953,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.576.477.953,00		
ANTICIPO	N/A		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	29 meses o hasta el 31/07/2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
551224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$510.941.661	$114.110.304	$396.831.357
TOTAL				$510.941.661	$114.110.304	$396.831.357

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Mtto Rutinario 01	$10.018.464	$1.903.508	$0	$11.921.972
Acta de Mtto Rutinario 02	$42.936.274	$8.157.892	$0	$51.094.166
Acta de Mtto Rutinario 03	$42.936.274	$8.157.892	$0	$51.094.166
Acta de Ajuste No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05/09/2024, para el periodo del mes de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO SERVICIO MTTO RUTINARIO	$1.576.477953	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$114.110304	7,24
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$114.110304	7,24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$114.110304	7,24

3.4.02 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 7,24%
Meta física ejecutada %: 7,24%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 157.647.795,30	47-44-101027640 ANEXO 3	24/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 315.295.590,60	47-44-101027640 ANEXO 3	24/06/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad del servicio	$ 472.943.385,90	47-44-101027640 ANEXO 3	13/08/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	47-40-101008519 ANEXO 3	24/06/2024	31/07/2027

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 1971 DE 2024

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	1971 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL "COOTRAMAVI"	NIT:	824.002.227-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 43CS02 YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS, PR0+0000 - PR31+0860". LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	24/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 932.394.207,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 932.394.207,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29 meses o hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
551624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$302.191.769	**$**67.489.495	$234.702.274
TOTAL				$302.191.769	**$**67.489.495	$234.702.274

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Mtto Rutinario No. 01	$6.931.417	$119.724		$7.051.141

Acta de Mtto Rutinario No. 02	$29.706.072	$513.105		$30.219.177
Acta de Mtto Rutinario No. 03	$29.706.072	$513.105		$30.219.177
Acta de Ajuste No.				

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Administración Vial No. 3 de fecha 05/09/2024, para el periodo del mes de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$932.394207	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 67.489495	7,24
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 67.489495	7,24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 67.489495	7,24

4.4.02 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 7,24
Meta física ejecutada %: 7,24

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD

ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$93.239.420,70	47-44-101027630 ANEXO 2	24/06/2024	12/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$186.478.841,40	47-44-101027630 ANEXO 2	24/06/2024	12708/2029
Estabilidad y/o Calidad de la Obra	$279.718.262,10	47-44-101027630 ANEXO 2	12/08/2026	12/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$260.000.000	47-40-101008518 ANEXO 3	24/06/2024	12/08/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE CONSULTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1984 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADM GI	NIT:	901.836.902-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO ADM GI con NIT. 901.836.902-5 (conformado por INVELER CONSULTORIA SAS, con NIT. 901.310.959-6 con una participación del 50% y por la sociedad GNG PROYECTO SAS, con NIT 901.477.828-7, con una participación del 50%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	27/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	27/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN No.:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	29 meses o hasta el 31/07/2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
565124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.729.802.802	$283.538.051	$1.446.264.751

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1	$11.425.622,00	$2.170.868	$ 0	$13.596.490,00
Acta Mensual de Costos No.2	$89.340.778,00	$16.974.748	$ 0	$106.315.526,00
Acta Mensual de Costos No.3	$137.500.870,00	$26.125.165		$163,626.035,00

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Administración Vial No. 3 de fecha 6/09/2024 para el período 27 de junio a 31 de agosto de 2024 el contrato reporta un avance de 5.68% y:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 283.538.051 (5.68%)
Total, inversión ejecutada: $ 283.538.051 (5.68%)

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$499.058.439,60	65-44-101230929 ANEXO 1	27/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879,20	65-44-101230929 ANEXO 1	27/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 1.497.175.318.80	65-44-101230929 ANEXO 1	27/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO CONTRATO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCES-056348	2024-08-15	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-065297
2024S-VCES-056351	2024-08-15	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-064541
2024S-VCES-057201	4-08-20	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-069531
2024S-VCES-057264	2024-08-20	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-073387
2024S-VBOG-059687	2024-08-28	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-053245 Remisión Balance estado Social de los Contratos. 3353, 3356, 3357 y 3365 de 2023 administración vial Departamento de Cesar.
2024S-VCES-060811	2024-08-30	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-072963

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado de acuerdo a lo programado por la Administración Vial.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se han presentado novedades.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el Administrador Vial, en el seguimiento a las labores como supervisión en los contratos de mantenimiento rutinario.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda seguir ejecutando las actividades de la manera en que se ha venido trabajando de manera que se cumpla a cabalidad el sin ninguna novedad.

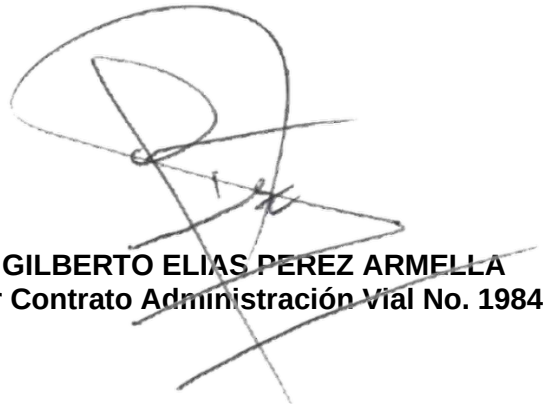

GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Supervisor Contrato Administración Vial No. 1984 de 2024
