AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030007014 Id: 1640802
Folios: 2 Fecha: 2025-03-28 12:33:21
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO MANTENIMIENTO Y OPERACION A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO ESTAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

Bogotá, D.C., marzo 28 de 2025

PARA: **DOCTORA: DOREIDYS LIMA LOPEZ**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA CONTRATO DE OBRA**

NIT-901.827.374-, CONSORCIO GP FLANDES, FACTURA NO. SETG-980000012, CONTRATO DE OBRA *NO. 23001258 H4* DE 2023, FLANDES, ACTA NO. 4, ($2.976.112.401.00), PERIODO 26 ENERO A 25 FEBRERO DE 2025.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **SETG-980000012 de** 04/03/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 4 (6) folios
- Certificación Cumplido Para Pago De Contratos Diferentes A Prestación De Servicios (1) folio
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (4) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio

- Certificación de la fiducia devolución rendimientos financieros (4) folios
- Informe mensual (71) folios
- Oficio Remisorio No. *CIAF-1322H32023-257 de marzo 21 de 2025* (1) folio

Cordialmente,

JUANITA VILLAMIZAR DURAN
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 12 Folios (161)
Copias a: Dirección Administrativa, folios (62) informe memorias

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Juanita Villamizar Duran, Supervisora de Interventoría, DIAA

CIAF-1322H32023-257

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

Señores:
AERONÁUTICA CIVIL
Atención: **Ingeniera Juanita Villamizar Durán**
Supervisor Contrato 23001322 H3 2023
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria
Bogotá

Referencia: **Contrato No. 23001322 H3 DE 2023 Realizar Interventoría Integral para realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).**

Asunto: **Acta de cobro No. 4 – Contrato de obra 23001258 H4 2023.**

Estimados Señores:

Nos permitimos hacer envío de la documentación correspondiente al cobro No. 04 del contrato 23001258 H4 2023, la cual se encuentra revisada y avalada por esta Interventoría, con el fin de solicitar el tramité respectivo para el mencionado pago. A continuación, se presenta lista de documentos para actas parciales de cobro que se envían en un solo PDF y en su mismo orden:

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACIÓN CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			
Acta Resumen Parcial	X			
Liquidación Iva	X			
Acta Excel Presupuesto de Costos	X			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	X			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	No aplica para obra
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría	X			

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría	X			
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			X	No aplica para obra
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	X			
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	X			
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	X			
Certificación Bancaria	X			
Certificación Rut Dian	X			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	X			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	X			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta		X		
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato	X			
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION	X			
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Sin otro particular,

Atentamente,

ALFREDO PEREZ SANTOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES

Anexo: Acta de cobro No. 4 Contrato 23001258 H4 2023
Copia: JCSR, Apoyo Supervisión contrato de Interventoría, Aerocivil
Proyectó: CEAF
Revisó: APF

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ddfd32e102728262b219ae1ac497a24806ea3d7ac0986d0458b84b0bce758ae8729ebca8f6f9c17698037871b629ae58

Número de Factura: SETG-980000012
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 11/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO GP FLANDES
Nombre Comercial: CONSORCIO GP FLANDES
Nit del Emisor: 901827374
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 43 A 19 17 P 5 BLOCK CENTRO EMPRESARIAL
Teléfono / Móvil: 6044441188
Correo: procopal@procopal.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA CALLE 26 NUMERO 103 15
Teléfono / Móvil: 6012962233 EXT 000
Correo: jhon.velez@procopal.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	C03	ACTA No 4 OBRA	NIU	1,00	$ 3.065.654.339,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.065.654.339,00
2	C04	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 643.787.411,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 643.787.411,00
3	C05	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 61.313.087,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.313.087,00
4	C02	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 91.969.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.474.229,70	19.00			$ 91.969.630,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ANTICIPO	23,41	$ 904.086.296,00

Notas Finales

SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES. POR FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUA R DICHA RETENCIÓN
CORTE AL 25 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE OBRA NUMERO 4
CORREO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS AUDIOVISUALES AEROPUERTO DE FLANDES (VF)
#$24-12-00-000;23001258 H4 DE 2023;juanita.villamizar@aerocivil.gov.co#$
AMORTIZACION DE ANTICIPO POR VALOR DE $904.086.296 CORRESPONDIENTE AL 23.3% DEL VALOR TOTAL FACTURADO
CONTACTO EN LA EMPRESA DEL CLIENTE: JUANITA VILLAMIZAR
Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 DE 2023

Sin valor fiscal

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2025 14:33:39
Documento validado por la DIAN:
12/03/2025 14:33:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.862.724.467,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.862.724.467,00
IVA	17.474.229,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.474.229,70
Total neto factura (=)	3.880.198.696,70
Descuento Global (-)	904.086.296,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP** $ **$**	2.976.112.400,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2030-01-19
18760000001	980000000	985000000	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023** **OBJETO: Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)** **AEROPUERTO: SANTIAGO VILA DE FLANDES** **PLAZO INICIAL: 19 MESES** **FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE MAYO DE 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025** **PLAZO FINAL:**	**VALOR INICIAL:** **$ 48.620.604.781,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 48.620.604.781,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04** **CONTRATISTA:** CONSORCIO GP FLANDES **INTERVENTOR:** CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES **SUPERVISOR:** ING. JUANITA VILLAMIZAR

El día 25 de febrero de 2025 en Flandes - Tolima, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes de la Ciudad de Flandes, se reunieron: El Ingeniero Ricardo Alberto Muñoz en representación del contratista consorcio GP Flandes y el Ingeniero Alfredo Perez en representación de la Interventoría consorcio Aerovías de Flandes, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendida entre del 26 de enero y el 25 de febrero de 2025, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		$ 48.620.604.781
2.Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 48.620.604.781
4. Valor pagado del anticipo %	23,3%	$ 11.302.256.916
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 37.318.347.865
6. Valor presente acta		$ 3.880.198.697
7. Valor amortizado en la presente acta	23,3%	$ 904.086.296
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 2.976.112.401
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 7.051.652.410
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 2.142.157.773
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 21.330.021.727
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 27.290.583.054
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 8.256.012.847
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**26,89%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	Mantenimiento	$ -
2- C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	Obra	$ 2.976.112.401
3-	Adquisición equipos	$ -
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	$ -
TOTAL		$ 2.976.112.401

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	Obra	904.086.296

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
CONSORCIO GP FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4**		
Principio de Procedencia: **6200,**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE OBRA No 4.**	
CONTRATO No.	**23001258 H4 DEL 2023**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GP FLANDES**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES**	
SUPERVISOR:	**JUANITA VILLAMIZAR**	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 3.862.724.467
Porcentaje estimado para el A.I.U.		26,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.		$ 3.065.654.339
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)		$ 91.969.630
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 17.474.230
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -
TOTAL IVA		**$ 17.474.230**

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
CONSORCIO GP FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 4	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
	Corte al 25 de febrero del 2025	25 de febrero de 2025

CONTRATO:	No. 23001258 H4 DE 2023	**OBJETO:**	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	**R/L:**	JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	**R/L:**	ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH	28 DE MAYO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2025

	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No 4	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 48.620.604.781,00	**$ 48.620.604.781,00**	**$ 9.193.810.183,00**	**$ 3.880.198.697,00**	**$ 13.074.008.880,00**	**$ 35.546.595.901,00**	**73%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 4		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1- GENERALES																
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	M2	432.352,0	$ 2.200	$ 951.174.400	432.352,0	$ 951.174.400	178.181,3	$ 391.998.860	76.276,8	$ 167.808.960	254458,1	$ 559.807.820	177.893,9	$ 391.366.580	41%
2- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA																
2.1	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	12.342,4	$ 65.700	$ 810.893.709	12.342,4	$ 810.893.709	1.444,8	$ 94.923.360,00	-	$ -	1444,8	$ 94.923.360	10.897,6	$ 715.970.349	88%
2.2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	6.272,0	$ 51.127	$ 320.668.544	6.272,0	$ 320.668.544	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	6.272,0	$ 320.668.544	
2.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	7.110,5	$ 164.000	$ 1.166.118.720	7.110,5	$ 1.166.118.720	855,8	$ 140.351.200,00	-	$ -	855,8	$ 140.351.200	6.254,7	$ 1.025.767.520	88%
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	4.278,1	$ 195.000	$ 834.233.400	4.278,1	$ 834.233.400	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4.278,1	$ 834.233.400	100%
2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)	M3	11.917,9	$ 210.070	$ 2.503.601.656	11.917,9	$ 2.503.601.656	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	11.917,9	$ 2.503.601.656	100%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10	M3	6.403,4	$ 1.100.000	$ 7.043.707.000	6.403,4	$ 7.043.707.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	6.403,4	$ 7.043.707.000	
2.7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	60.645,2	$ 2.397	$ 145.366.640	60.645,2	$ 145.366.640	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	60.645,2	$ 145.366.640	
2.8	SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.	M2	60.645,2	$ 3.081	$ 186.847.984	60.645,2	$ 186.847.984	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	60.645,2	$ 186.847.984	100%
3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA											$ -		$ -			
3.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	220.843,3	$ 37.905	$ 8.371.063.770	220.843,3	$ 8.371.063.770	158.952,6	$ 6.025.098.303,50	56.815,8	$ 2.153.602.899	215768,4	$ 8.178.701.202	5.074,9	$ 192.362.568	2%
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	66.253,0	$ 65.700	$ 4.352.820.655	66.253,0	$ 4.352.820.655	4.133,4	$ 271.564.380,00	1.243,7	$ 81.711.090	5377,1	$ 353.275.470	60.875,9	$ 3.999.545.185	92%
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	66.253,0	$ 144.000	$ 9.540.428.832	66.253,0	$ 9.540.428.832	6.908,1	$ 994.766.400,00	2.784,0	$ 400.896.000	9692,1	$ 1.395.662.400	56.560,9	$ 8.144.766.432	85%
3.4	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	110.421,6	$ 15.119	$ 1.669.464.624	110.421,6	$ 1.669.464.624	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	110.421,6	$ 1.669.464.624	
4- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA											$ -		$ -			
4.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	473,1	$ 51.127	$ 24.186.397	473,1	$ 24.186.397	0,0	$ -	284,2	$ 14.530.293	284,2	$ 14.530.294	188,9	$ 9.656.103	40%
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	683,6	$ 210.070	$ 143.599.651	683,6	$ 143.599.651	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	683,6	$ 143.599.651	100%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10	M3	323,7	$ 1.100.000	$ 356.037.000	323,7	$ 356.037.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	323,7	$ 356.037.000	
4.4	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.153,8	$ 2.397	$ 7.559.579	3.153,8	$ 7.559.579	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.153,8	$ 7.559.579	
4.5	SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.153,8	$ 3.081	$ 9.716.756	3.153,8	$ 9.716.756	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.153,8	$ 9.716.756	100%
5- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO											$ -		$ -			
5.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	315,2	$ 51.127	$ 16.113.753	315,2	$ 16.113.753	0,0	$ -	240,2	$ 12.280.705	240,2	$ 12.280.705	75,0	$ 3.833.047	24%
5.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	2.946,8	$ 65.700	$ 193.605.417	2.946,8	$ 193.605.417	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2.946,8	$ 193.605.417	100%
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	1.294,0	$ 164.000	$ 212.212.720	1.294,0	$ 212.212.720	0,0	$ -	355,0	$ 58.220.000	355,0	$ 58.220.000	939,0	$ 153.992.720	73%
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	582,5	$ 195.000	$ 113.593.350	582,5	$ 113.593.350	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	582,5	$ 113.593.350	100%
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	485,2	$ 210.070	$ 101.932.266	485,2	$ 101.932.266	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	485,2	$ 101.932.266	100%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10	M3	323,5	$ 1.100.000	$ 355.872.000	323,5	$ 355.872.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	323,5	$ 355.872.000	100%
5.7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.151,7	$ 2.397	$ 7.554.651	3.151,7	$ 7.554.651	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.151,7	$ 7.554.651	100%
5.8	SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.151,7	$ 3.081	$ 9.710.422	3.151,7	$ 9.710.422	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.151,7	$ 9.710.422	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 4		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL											$ -		$ -			
6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y PISTA.	M2	6.386,3	$ 52.286	$ 333.915.049	6.386,3	$ 333.915.049	1.554,8	$ 81.294.273,00		$ -	1554,8	$ 81.294.273	4.831,5	$ 252.620.776	76%
6.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INLCUYE MICROESFERAS.	M	7.240,9	$ 38.833	$ 281.184.076	7.240,9	$ 281.184.076	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	7.240,9	$ 281.184.076	100%
7- SISTEMA DE DRENAJE											$ -		$ -			
7.1	DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO	UND	1,0	$ 333.239,0	$ 333.239	1,0	$ 333.239	1,0	$ 333.239,00		$ -	1,0	$ 333.239	-	$ -	0%
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.408,2	$ 65.700,0	$ 92.521.348	1.408,2	$ 92.521.348	11.660,0	$ 766.062.000,00	4.622,2	$ 303.678.540	16282,2	$ 1.069.740.540	- 14.874,0	$ (977.219.192)	-1056%
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	215,7	$ 1.001.929,0	$ 216.157.926	215,7	$ 216.157.926	87,1	$ 87.268.015,90	221,3	$ 221.726.888	308,4	$ 308.994.904	- 92,7	$ (92.836.978)	-43%
7.4	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 2.00, H =1.00, Z = 0.75	M3	64,8	$ 1.031.630,0	$ 66.862.004	64,8	$ 66.862.004	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	64,8	$ 66.862.004	100%
7.5	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.50, H =1.50, Z = 0.60	M3	337,6	$ 1.001.554,0	$ 338.103.798	337,6	$ 338.103.798	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	337,6	$ 338.103.798	100%
7.6	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL B TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.50, H =1.00, Z = 0.55	M3	393,2	$ 976.388,0	$ 383.954.036	393,2	$ 383.954.036	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	393,2	$ 383.954.036	100%
7.7	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL C TRAPEZOIDAL SECCION B = 0.70, H =0.30, Z = 3.00	M3	42,5	$ 921.000,0	$ 39.116.102	42,5	$ 39.116.102	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	42,5	$ 39.116.102	100%
7.8	TUBERIA 12" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN).SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321	M	35,7	$ 543.500,0	$ 19.424.690	35,7	$ 19.424.690	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	35,7	$ 19.424.690	100%
7.9	TUBERIA 16" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN).SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321	M	65,6	$ 872.000,0	$ 57.238.080	65,6	$ 57.238.080	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	65,6	$ 57.238.080	100%
7.10	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA 8,8X2,00X1,00 M - INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.	UND	1,0	$ 10.719.048,0	$ 10.719.048	1,0	$ 10.719.048	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 10.719.048	100%
7.11	SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA 1.40X1.40X0.60 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.	UND	1,0	$ 2.575.455,0	$ 2.575.455	1,0	$ 2.575.455	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 2.575.455	100%
7.12	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO D=1200 MM	M	142,5	$ 614.000,0	$ 87.507.280	142,5	$ 87.507.280	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	142,5	$ 87.507.280	100%
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	13.700,0	$ 10.055,0	$ 137.753.153	13.700,0	$ 137.753.153	1.141,5	$ 11.477.782,50	2.167,5	$ 21.794.213	3309,0	$ 33.271.995	10.391,0	$ 104.481.158	76%
8- BOX COULVERT											$ -		$ -			
8.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	39,3	$ 65.700	$ 2.581.353	39,3	$ 2.581.353	198,3	$ 13.028.310,00	2.594,3	$ 170.445.510	2792,6	$ 183.473.820	- 2.753,3	$ (180.892.467)	-7008%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	4.203,3	$ 10.055	$ 42.264.584	4.203,3	$ 42.264.584	1.602,2	$ 16.110.121,00	12.740,9	$ 128.109.750	14343,1	$ 144.219.871	- 10.139,8	$ (101.955.287)	-241%
8.3	RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT	M3	11,5	$ 123.500	$ 1.420.250	11,5	$ 1.420.250	6,4	$ 790.400,00	103,7	$ 12.806.950	110,1	$ 13.597.350	- 98,6	$ (12.177.100)	-857%
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	41,5	$ 1.658.684	$ 68.752.452	41,5	$ 68.752.452	19,4	$ 32.178.469,60	69,4	$ 115.112.670	88,8	$ 147.291.139	- 47,4	$ (78.538.687)	-114%
9- AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE ILUMINACIÓN)											$ -		$ -			
9.1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACION DE BORDE DE											$ -		$ -			
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862 , CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6A, COLOR BLANCO/AMARILLO.	UND	38,0	$ 4.796.159	$ 182.254.042	38,0	$ 182.254.042	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	38,0	$ 182.254.042	100%
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA (12"/8") ESPECIFICACIÓN FAA L-850C(L), CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/AMARILLO	UND	2,0	$ 13.774.863	$ 27.549.726	2,0	$ 27.549.726	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 27.549.726	100%
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO ELEVADO ESPECIFICACIÓN FAAL-862 , CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/BLANCO	UND	11,0	$ 4.796.159	$ 52.757.749	11,0	$ 52.757.749	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	11,0	$ 52.757.749	100%
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA 12"/8" ESPECIFICACIÓN FAA L-850C(L), CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/BLANCO	UND	1,0	$ 13.774.863	$ 13.774.863	1,0	$ 13.774.863	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 13.774.863	100%
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS POCO PROFUNDAS DE 12"/8" CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA NORMA FAA L 824 , MANUFACTURADO POR EL FABRICANTE DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	3,0	$ 2.566.915	$ 7.700.745	3,0	$ 7.700.745	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3,0	$ 7.700.745	100%
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAAL-830, 6,6/6,6 AMPERIOS, DE PARA LAMPARA DE BORDE DE PISTA, CON POTENCIA MÍNIMA DE 25/35W Y CONFORME A LA POTENCIA DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	58,0	$ 1.612.888	$ 93.547.504	58,0	$ 93.547.504	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	58,0	$ 93.547.504	100%
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (HEMBRA - MACHO) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	58,0	$ 345.981	$ 20.066.898	58,0	$ 20.066.898	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	58,0	$ 20.066.898	100%
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (HEMBRA - MACHO) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	58,0	$ 326.089	$ 18.913.162	58,0	$ 18.913.162	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	58,0	$ 18.913.162	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 4		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA. 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TIRISTOR).	UND	2,0	$ 117.502.620	$ 235.005.240	2,0	$ 235.005.240	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 235.005.240	100%
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE EN CONCRETO CILINDRICA 2500 PSI, PARA INSTALACION LAMPARA ELEVADA DE PISTA, DE 28 CM DE DIAMETRO, 40 CM DE PROUNDIDAD, INCLUYE CURVA DE 2" Y CONECTOR ROSCADO EN ALUMINIO DE ACUERDO A PLANO.	UND	51,0	$ 262.016	$ 13.362.816	51,0	$ 13.362.816	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	51,0	$ 13.362.816	100%
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, PARA ZONA DE CLEARWAY CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6,6 A, COLOR ROJO/AZUL	UND	2,0	$ 4.796.159	$ 9.592.318	2,0	$ 9.592.318	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 9.592.318	100%
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, PARA ZONA DE CLEARWAY CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6,6 A, COLOR ROJO/BLANCO	UND	4,0	$ 4.692.990	$ 18.771.960	4,0	$ 18.771.960	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4,0	$ 18.771.960	100%
9.2- SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLE DE RODAJE CON BALIZAS TIPO											$ -		$ -			
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, ELEVADA CUMPLIMIENTO NORMATIVO: ESPECIFICACIÓN FAAL-861 T , CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 10/20W COLOR AZUL.	UND	47,0	$ 2.794.443	$ 131.338.821	47,0	$ 131.338.821	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 131.338.821	100%
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAAL-830, 6,6/6,6 AMPERIOS, DE PARA LAMPARA DE BORDE DE PISTA, CON POTENCIA MÍNIMA DE 25/35W Y CONFORME A LA POTENCIA DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	47,0	$ 1.612.888	$ 75.805.736	47,0	$ 75.805.736	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 75.805.736	100%
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	47,0	$ 345.981	$ 16.261.107	47,0	$ 16.261.107	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 16.261.107	100%
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	47,0	$ 326.089	$ 15.326.183	47,0	$ 15.326.183	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 15.326.183	100%
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA. 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TIRISTOR).	UND	1,0	$ 117.502.620	$ 117.502.620	1,0	$ 117.502.620	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 117.502.620	100%
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE EN CONCRETO CILINDRICA 2500 PSI, PARA INSTALACION LAMPARA ELEVADA DE PISTA, DE 28 CM DE DIAMETRO, 40 CM DE PROUNDIDAD, INCLUYE CURVA DE 2" Y CONECTOR ROSCADO EN ALUMINIO DE ACUERDO A PLANO.	UND	47,0	$ 262.016	$ 12.314.752	47,0	$ 12.314.752	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 12.314.752	100%
9.3- SISTEMA DE ILUMINACION DE UMBRAL DE PISTA											$ -		$ -			
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, EMPOTRADA CUMPLIMIENTO NORMATIVO: ESPECIFICACIÓN FAA L-850 D (L), DE POTENCIA 30/40 W, 6,6 AMPERIOS, CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED COLOR ROJO - VERDE . - DIVERGENCIA DERECHA Y DIVERGENCIA IZQUIERDA.	UND	16,0	$ 13.771.064	$ 220.337.024	16,0	$ 220.337.024	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 220.337.024	100%
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO FAAL-830, 6,6/6,6 AMPERIOS, PARA LAMPARA DE UMBRAL DE PISTA, POTENCIA MÍNIMO DE 45 W O CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA..	UND	16,0	$ 1.609.089	$ 25.745.424	16,0	$ 25.745.424	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 25.745.424	100%
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASES METÁLICAS POCO PROFUNDAS DE 12"/8" CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA NORMA FAA L 824, MANUFACTURADO POR EL FABRICANTE DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	16,0	$ 2.566.915	$ 41.070.640	16,0	$ 41.070.640	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 41.070.640	100%
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (JUEGO(HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	16,0	$ 345.981	$ 5.535.696	16,0	$ 5.535.696	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 5.535.696	100%
9.3.5	SUMISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	16,0	$ 326.089	$ 5.217.424	16,0	$ 5.217.424	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 5.217.424	100%
9.4 SISTEMA DE LUCES DE PENDIENTE DE APROXIMACION (PAPI)											$ -		$ -			
9.4.1	TRASLADO DEL SISTEMA PAPI FAA L-880, EXISTENTE,INCUYE TRASLADO DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y SUMINISTRO DE NUEVOS CONECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	1,0	$ 19.680.473	$ 19.680.473	1,0	$ 19.680.473	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 19.680.473	100%
9.4.2	INTERCONEXÍON SISTEMA DE TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIÓN - PARA EL SISTEMA PAPI, CONECTADO DESDE EL SISTEMA EXISTENTE DE PISTA.	UND	2,0	$ 2.470.958	$ 4.941.916	2,0	$ 4.941.916	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 4.941.916	100%
9.4.3	CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI PARA SISTEMA PAPI DE ACUERDO AL PLANO DE ESPECIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN (5 X 30 X 0.25 M). INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,0	$ 25.976.915	$ 51.953.830	2,0	$ 51.953.830	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 51.953.830	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 4		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9.4.4	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO DE ACUERDO AL PLANO PARA INSTALACIÓN DE LAS BALIZAS PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONFORME AL PLANO DE CONSTRUCCIÓN.	UND	8,0	$ 1.825.929	$ 14.607.432	8,0	$ 14.607.432	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	8,0	$ 14.607.432	100%
9.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA. 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TIRISTOR).	UND	2,0	$ 117.502.620	$ 235.005.240	2,0	$ 235.005.240	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 235.005.240	100%
9.4.6	SUMINISTRO E INTSALACION SISTEMA PAPI FAA L-880, AC NO. 150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED. INCLUYE CLINÓMETRO ENTREGADO POR EL FABRICANTE, TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. CABECERA 20).	UND	1,0	$ 274.408.667	$ 274.408.667	1,0	$ 274.408.667	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 274.408.667	100%
9.5- EQUIPOS COMPLEMENTARIOS											$ -		$ -			
9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO NO. 8 AWG AISLAMIENTO XLP, DE 5000 VOLTIOS, CIRCUITO PRIMARIO. 1 CONDUCTOR.	M	16.000,0	$ 29.412	$ 470.592.000	16.000,0	$ 470.592.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16.000,0	$ 470.592.000	100%
9.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO.6 AWG, PARA EL COMTRAPESO A LO LARGO DE LA CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE PISTA Y TAXEO INTERVENIDOS.	M	6.000,0	$ 19.710	$ 118.260.000	6.000,0	$ 118.260.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	6.000,0	$ 118.260.000	100%
9.5.3	CONTRAPESOS SPT CONSISITENTE EN VARILLAS COBRE-COBRE DE 2,40M* 5/8" INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA O CONECTOR DE COMPRESIÓN, BARRENO PARA INSTALACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUELO.	UND	54,0	$ 807.912	$ 43.627.248	54,0	$ 43.627.248	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	54,0	$ 43.627.248	100%
9.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN DE BALIZAS, LADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 2 X 12 AWG AISLAMIENTO THHN/THWN.	M	700,0	$ 16.931	$ 11.851.700	700,0	$ 11.851.700	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	700,0	$ 11.851.700	100%
9.5.5	TABLERO GENERAL DE DISTIBUCION UPS PARA LOS REGULADORES INSTALADOS.	UND	1,0	$ 22.679.907	$ 22.679.907	1,0	$ 22.679.907	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 22.679.907	100%
9.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA UPS CON CAPACIDAD PARA 30 kVA. INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMIA DE 20 MINUTOS A FULL CARGA Y TABLERO DE BYPASS DE MANTENIMIENTO.	UND	1,0	$ 67.165.554	$ 67.165.554	1,0	$ 67.165.554	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 67.165.554	100%
10- OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS											$ -		$ -			
10.1	CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA	UND	100,0	$ 1.775.994	$ 177.599.400	100,0	$ 177.599.400	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	100,0	$ 177.599.400	100%
10.2	CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA	UND	12,0	$ 3.410.930	$ 40.931.160	12,0	$ 40.931.160	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	12,0	$ 40.931.160	100%
10.3	CANALIZACIÓN DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP . INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	5.000,0	$ 262.178	$ 1.310.890.000	5.000,0	$ 1.310.890.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	5.000,0	$ 1.310.890.000	100%
10.4	CANALIZACIÓN DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	700,0	$ 170.193	$ 119.135.100	700,0	$ 119.135.100	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	700,0	$ 119.135.100	100%
10.5	CANALIZACIÓN DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	2.500,0	$ 395.406	$ 988.515.000	2.500,0	$ 988.515.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2.500,0	$ 988.515.000	100%
10.6	CANALIZACION DIRIGIDA POR DEBAJO DE CALLE DE RODAJE EN CUATRO DUCTOS DE CUATRO PULGADAS, TIPO POLIETILENO INCLUYE GUIA LASER Y TOPO Y DEMAS ACCESORIOS PARA INSTALACION, EN UNA DISTANCIA DE 30 METROS LINEALES	M	60,0	$ 3.018.634	$ 181.118.040	60,0	$ 181.118.040	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	60,0	$ 181.118.040	100%
10.7	LETRERO OACI DE INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	4,0	$ 54.213.553	$ 216.854.212	4,0	$ 216.854.212	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4,0	$ 216.854.212	100%
10.8	LETRERO OACI DE INFORMACION RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS	UND	4,0	$ 54.213.553	$ 216.854.212	4,0	$ 216.854.212	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4,0	$ 216.854.212	100%
10.9	LETRERO OACI DE INFORMACION RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	2,0	$ 54.213.553	$ 108.427.106	2,0	$ 108.427.106	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 108.427.106	100%
10.10	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO DE ACUERDO AL PLANO PARA INSTALACIÓN DE LAS BALIZAS PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONFORME AL PLANO DE CONSTRUCCIÓN.	UND	10,0	$ 1.825.929	$ 18.259.290	10,0	$ 18.259.290	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	10,0	$ 18.259.290	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 4		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
10.11	CONSTRUCCIÓN DE CORONA DISTINTIVA DE LA UBICACIÓN DEL INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO Y BASE ESTABILIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CABECERA 02 Y 20.	UND	2,0	$ 12.094.705	$ 24.189.410	2,0	$ 24.189.410	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 24.189.410	100%
10.12	INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO, ILUMINACIÓN TIPO LED FAA L-806 AC 150/5345-27, FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO (SOLAR).INCLUYE DEMARCACIÓN DE BASE, DE ACUERDO AL RAC PARTE DÉCIMO CUARTA Y LO CONSIGNADO EN EL ANEXO NO. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	2,0	$ 50.860.180	$ 101.720.360	2,0	$ 101.720.360	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 101.720.360	100%
10.13	RANURADO DE PISTA, SOBRE PAVIMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNO A CUATRO SECUNDARIOS	M	100,0	$ 322.128	$ 32.212.800	100,0	$ 32.212.800	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	100,0	$ 32.212.800	100%
11- GESTIÓN FORESTAL													$ -			
11.1	TALA DE ARBOLES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	155,0	$ 176.705	$ 27.389.275	155,0	$ 27.389.275	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	155,0	$ 27.389.275	100%
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU					**$ 47.889.089.601**		**$ 47.889.089.601**		**$ 8.927.245.115**		**$ 3.862.724.467**		**$ 12.789.969.582**		**$ 35.099.120.020**	
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 7.981.514.933		$ 7.981.514.934		$ 1.487.874.187		$ 643.787.411		$ 2.131.661.597		$ 5.849.853.337	
IMPREVISTOS				2%	$ 760.144.279		$ 760.144.279		$ 141.702.304		$ 61.313.087		$ 203.015.390		$ 557.128.889	
UTILIDAD				3%	$ 1.140.216.419		$ 1.140.216.419		$ 212.553.455		$ 91.969.630		$ 304.523.085		$ 835.693.334	
VALOR TOTAL AIU				26%	$ 9.881.875.632		$ 9.881.875.632		$ 1.842.129.945		$ 797.070.128		$ 2.639.200.072		$ 7.242.675.560	
IVA					$ 216.641.120		$ 216.641.120		$ 40.385.157		$ 17.474.230		$ 57.859.387		$ 158.781.733	
A. TOTAL OBRAS					**$ 48.105.730.721**		**$ 48.105.730.721**		**$ 8.967.630.272**		**$ 3.880.198.697**		**$ 12.847.828.969**		**$ 35.257.901.753**	73,29%
12- APROPIACION BOLSA DE MONTO AGOTABLE																
12.1	APROPIACION DE DISEÑOS	GLB	1,00	$ 190.067.152	$ 190.067.152	1,0	$ 190.067.152	1,0	$ 190.067.152		$ -	1,0	$ 190.067.152	-	$ -	0%
12.2	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	155,00	$ 16.775	$ 2.600.125	155,0	$ 2.600.125		$ -		$ -	0,0	$ -	155,00	$ 2.600.125	100,0%
12.3	BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR	GLB	1,00	$ 240.000.000	$ 240.000.000	1,0	$ 240.000.000		$ -		$ -	0,0	$ -	1,00	$ 240.000.000	100,0%
SUBTOTAL APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR					**$ 432.667.277**		**$ 432.667.277**		**$ 190.067.152**		**$ -**		**$ 190.067.152**		**$ 242.600.125**	
IVA				19%	$ 82.206.783	19%	$ 82.206.783	19%	$ 36.112.759	19%	$ -	19%	$ 36.112.759	19%	$ 46.094.024	56,1%
B. TOTAL APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR					**$ 514.874.060**		**$ 514.874.060**		**$ 226.179.911**		**$ -**		**$ 226.179.911**		**$ 288.694.149**	
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 48.620.604.781**		**$ 48.620.604.781**		**$ 9.193.810.183**		**$ 3.880.198.697**		**$ 13.074.008.880**		**$ 35.546.595.901**	73,11%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 48.620.604.781
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 48.620.604.781
VALOR DE ANTICIPO		$ 11.302.256.916
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		$ 9.193.810.183
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 2.142.157.773
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 3.880.198.697
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		$ 904.086.296
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 2.976.112.401
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 13.074.008.880
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 3.046.244.069
SALDO POR EJECUTAR		$ 35.546.595.901
SALDO POR AMORTIZAR		$ 8.256.012.847

VALOR TOTAL EN LETRAS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RICARDO ALBERTO MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

ALFREDO PÉREZ SANTOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO GP FLANDES


FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	1- GENERALES	ITEM	1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





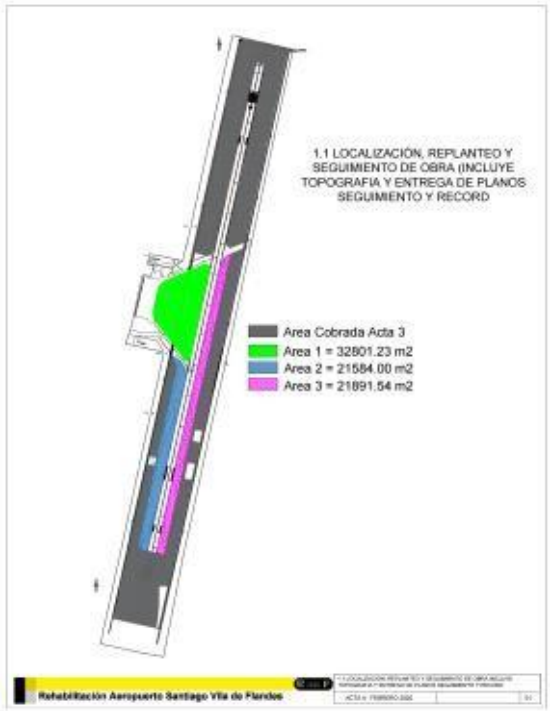





Descripción		Ubicación ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO	No. ELEM	Medida total
AREA		K0+720	K1+020	IZQUIERDO	1	32.801,2
AREA		K0+085	K0+710	IZQUIERDO	1	21.584,0
AREA		K0+085	K1+050	DERECHO	1	21.891,5
					SUMATORIA	76.276,8

AREAS MEDIDAS EN CAMPO POR TOPOGRAFIA

Descripción		ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	BSERVACIONES
AREA				32.801,23	
AREA				21.584,00	
AREA				21.891,54	
Sumatoria de areas				76.276,8	

Sub-Total	76.276,8
TOTAL	76.276,8

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: Ing. José Daniel Villegas Buitrago

Director de Obra: Ing. Ricardo Alberto Muñoz

Residente de interventoría: Ing. Germán Alonso Rivera Reyes

Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES


FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001256 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	ITEM	3.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	UNID.	m2	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





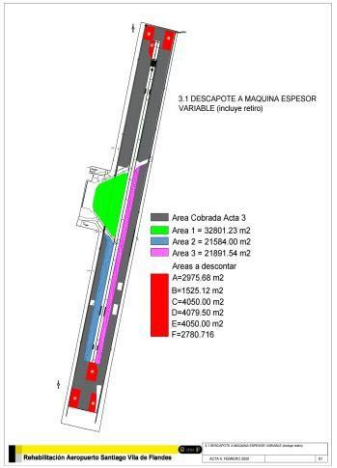



Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
AREA 1	K0+720	K1+020	IZQUIERDO	1	32.801,2
AREA 2	K0+085	K0+710	IZQUIERDO	1	21.584,0
AREA 3	K0+085	K1+050	DERECHO	1	21.891,5
AREA 4	N/A	N/A	IZQUIERDO	1	- 2.975,7
AREA 5	N/A	N/A	IZQUIERDO	1	- 1.525,1
AREA 6	N/A	N/A	DERECHO	1	- 4.050,0
AREA 7	N/A	N/A	IZQUIERDO - DERECHO	1	- 4.079,5
AREA 8	N/A	N/A	IZQUIERDO	1	- 4.050,0
AREA 9	N/A	N/A	DERECHO	1	- 2.780,7
				SUMATORIA =	56.815,8

AREAS MEDIDAS EN CAMPO POR TOPOGRAFIA

Descripción	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	OBSERVACIONES
AREA 1			32.801,23	
AREA 2			21.584,00	
AREA 3			21.891,54	
AREA 4			2.975,68	AL LADO IZQUIERDO RESA NORTE (ZONA DE NIVELACION)
AREA 5			1.525,12	ZONA DE AMPLIACION NORTE
AREA 6			4.050,00	AL LADO DERECHO RESA NORTE (ZONA DE NIVELACION)
AREA 7			4.079,50	ZONA DE AMPLIACION SUR
AREA 8			4.050,00	AL LADO IZQUIERDO RESA SUR (ZONA DE NIVELACION)
AREA 9			2.780,71	AL LADO DERECHO RESA SUR (ZONA DE NIVELACION)
Sub-Total				56.815,8
TOTAL				56.815,8

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Buitrago	Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz
Residente de Interventoría: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Director de Interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O.C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O.C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N° 23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O.C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N° 23001322 H3 DE 2023
ESPACIO				

CAPÍTULO	3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	ITEM	3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.



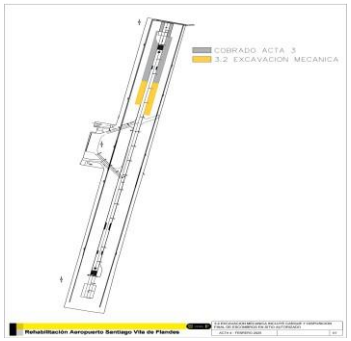







Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	ABS. FINAL	COSTADO	No. ELEM	Medida total
EXCAVACION ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO	K1+180	K1+340	IZQUIERDO	1	793,0
EXCAVACION ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO	K1+120	K1+340	DERECHO	1	450,7
				SUMATORIA =	1.243,7

CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADAS EN CAMPO

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
EXCAVACION ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO				793,01	
EXCAVACION ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO				450,73	

Sub-Total	1.243,7
TOTAL	1.243,7

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing. José Daniel Villegas Buitrago	Director de Obra: Ing. Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing. Germán Alonso Rivera Reyes	Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059- 3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	ITEM	3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.



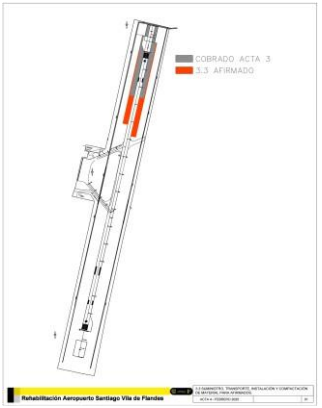







Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	ABS. FINAL	COSTADO	No. ELEM	Medida total
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO	K 1+180	K 1+360	IZQUIERDO	1	1.008,0
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO	K 1+360	K 1+600	IZQUIERDO	1	192,0
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO	K 1+120	K 1+360	DERECHO	1	1.344,0
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO	K 1+360	K 1+660	DERECHO	1	240,0
				SUMATORIA	2.784,0

VOLUMENES MEDIDOS EN CAMPO POR TOPOGRAFIA

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO				1.008,00	PRIMERA CAPA
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO				192,00	SEGUNDA CAPA
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO				1.344,00	PRIMERA CAPA
AFIRMADO ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO				240,00	SEGUNDA CAPA
				Sub-Total	2.784,0
				TOTAL	2.784,0

ELABORÓ | APROBÓ

Residente de Obra:	Director de Obra:	Residente de interventoría:	Director de interventoría:
Ing . José Daniel Villegas Buitrago	Ing . Ricardo Alberto Muñoz	Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	4- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA	ITEM	4.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
FRESADO CALLE DE RODAJE ALPHA	K0+000	K0+203	IZQUIERDO	1	284,2
					-
					-
					-
				SUMATORIA =	284,2

VOLUMENES MEDIDOS EN CAMPO POR TOPOGRAFIA

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
FRESADO CALLE DE RODAJE ALPHA	0,10	14,00	203,00	284,20	
				Sub-Total	284,2
				TOTAL	284,2

ELABORÓ	APROBÓ

Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Buitrago

Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz

Residente de interventoría: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes

Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO Nº	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO Nº	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	5- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO	ITEM	5.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.



Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
FRESADO CALLE DE RODAJE BRAVO	K0+012	K0+180	IZQUIERDO	1	240,2
				1	-
				1	-
				1	-
				SUMATORIA =	240,2

VOLUMENES MEDIDOS ENCAMPO POR TOPOGRAFIA

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
FRESADO CALLE DE RODAJE ALPHA	0,10	14,30	168,00	240,24	
Sub-Total					240,2
TOTAL					240,2

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Quitrago	Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	5- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO	ITEM	5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.

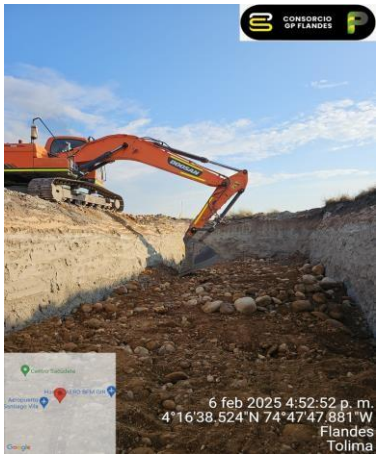



Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
MEJORAMIENTO CON RAJON PARA BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO					167,0
MEJORAMIENTO CON RAJON PARA BOX COULVERT 1 CALLE DE RODAJE ALPHA					178,5
MEJORAMIENTO CON RAJON PARA BOX COULVERT 4 EXTERIOR AL AEROPUERTO					9,5
				SUMATORIA =	355,0

CALCULO DE MEDIDAS DETERMINADAS EN CAMPO

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO CON RAJON PARA BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO	0,50	5,10	65,49	167,00	
MEJORAMIENTO CON RAJON PARA BOX COULVERT 1 CALLE DE RODAJE ALPHA	0,50	5,10	70,01	178,53	
MEJORAMIENTO CON RAJON PARA BOX COULVERT 4 EXTERIOR AL AEROPUERTO	0,30	6,90	4,60	9,52	

Sub-Total	355,0
TOTAL	355,0

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Buitrago	Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	7- SISTEMA DE DRENAJE	ITEM	7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.



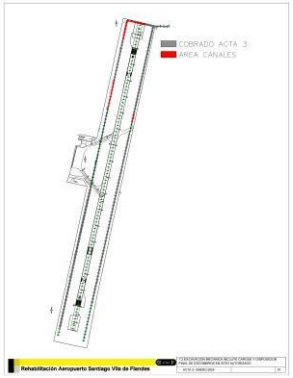



Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS. FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
EXCAVACION CANAL COSTADO IZQUIERDO AL NORTE	K1+420,00	K1+590,00	IZQUIERDO	1	1.778,5
EXCAVACION CANAL COSTADO IZQUIERDO AL NORTE	K1+840,00	K1+954,87	IZQUIERDO	1	1.702,0
EXCAVACION CANAL DERECHO AL SUR	K1+361,39	K1+410,00	DERECHO	1	370,6
EXCAVACION CANAL DE SALIDA NORTE	K0+002,18	K0+110,00	NORTE	1	771,1
					-
					-
					-
				SUMATORIA =	4.622,2

CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADOS EN CAMPO

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
EXCAVACION CANAL COSTADO IZQUIERDO AL NORTE				1.778,48	
EXCAVACION CANAL COSTADO IZQUIERDO AL NORTE				1.701,95	
EXCAVACION CANAL DERECHO AL SUR				370,62	
EXCAVACION CANAL DE SALIDA NORTE				771,13	
Sub-Total					4.622,2
TOTAL					4.622,20

ELABORÓ	APROBÓ
Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Buitrago	Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE Nº	4	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO Nº	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO Nº	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	7- SISTEMA DE DRENAJE	ITEM	7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00 Z = 0.56.	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





Descripción	Ubicación ABS.INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
CONCRETO CANAL DERECHO	K1+361,80	K1+749,00	DERECHO	1	176,6
CONCRETO CANAL NORTE	K0+083,85	K0+150,00	NORTE	1	44,7
				SUMATORIA =	221,3

CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADAS EN CAMPO

Descripción	ALTO (m)	PERIMETRO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
CONCRETO CANAL DERECHO	0,10	4,56	387,20	176,56	
CONCRETO CANAL NORTE	0,10	6,76	66,15	44,72	

Sub-Total	221,3
TOTAL	221,3

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Buitrago
Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes
Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	7- SISTEMA DE DRENAJE	ITEM	7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	UNID.	Kg	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	COSTADO	No. ELEM	Medida total
MALLA ELECTROSOLDADA CANAL DERECHO	K1+361,80	K1+749,00	DERECHO	1	1.726,9
MALLA ELECTROSOLDADA CANAL NORTE	K0+083,85	K0+150,00	NORTE	1	440,6
				SUMATORIA =	2.167,5

CALCULO DE CANTIDADES DETERMINADAS EN CAMPO

Descripción	PESO UNITARIO (Kg/m2)	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	PESO (Kg)	OBSERVACIONES
MALLA ELECTROSOLDADA CANAL DERECHO	1,34	4,46	387,20	1.726,91	2.314,06	
MALLA ELECTROSOLDADA CANAL NORTE	1,34	6,66	66,15	440,56	590,35	
Sub-Total						2.167,5
TOTAL						2.167,5

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: _____ Ing . José Daniel Villegas Buitrago	Director de Obra: _____ Ing .Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: _____ Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Director de interventoría: _____ Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE Nº	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO Nº	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO Nº	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	8- BOX COULVERT	ITEM	8.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADAS EN CAMPO

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO				1.037,93	
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO				233,80	PARA MEJORAMIENTO
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO				1.072,62	
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO				249,94	PARA MEJORAMIENTO
Sub-Total					2.594,3
TOTAL					2.594,3

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: Ing. José Daniel Villegas Quitrago
Director de Obra: Ing. Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing. Germán Alonso Rivera Reyes
Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	27	MM	2	AA	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N° 2350132 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N° 2350132 DE 2024
ESPACIO				

CAPÍTULO	8- BOX COULVERT	ITEM	8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000psi)	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.














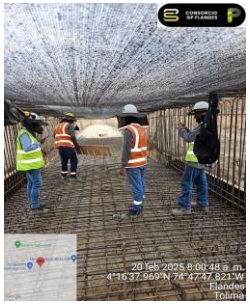

CALCULO DE PESOS DETERMINADAS IN CAMPO

IDENTIFICACION	BARRA No.	PESO UNITARIO (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD	PESO TOTAL [Kg]	OBSERVACIONES
01-02	5	1.552	350	4,48	2.422,67	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV (PARCIAL)
03	5	1.552	495	3,96	3.066,81	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV (PARCIAL)
04	5	1.552	499	2,46	1.905,14	ACERO BUX TIPO II (PARCIAL)
05	5	1.552	250	3,96	1.536,48	ACERO BUX TIPO II (PARCIAL)
06	3	0.560	1.396	0,32	250,16	ACERO BUX TIPO II (PARCIAL)
07	4	0.994	23	66,50	1.520,32	ACERO BUX TIPO II (PARCIAL)
07	4	0.994	12	66,50	793,21	ACERO BUX TIPO II (PARCIAL)
01	3	0.560	96	3,26	175,25	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
01	3	0.560	48	3,26	87,63	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
02	4	0.994	40	4,21	167,39	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,16	10,26	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,19	10,32	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,22	10,38	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,26	10,46	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,29	10,52	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,32	10,58	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,36	10,66	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,39	10,72	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,42	10,77	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
03	4	0.994	2	5,45	10,83	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,54	7,04	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,55	7,06	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,57	7,10	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,59	7,14	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,60	7,16	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,62	7,20	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,64	7,24	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,65	7,26	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,67	7,30	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,69	7,34	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,70	7,36	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,72	7,40	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,74	7,44	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,75	7,46	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,77	7,49	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,79	7,53	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,80	7,55	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,82	7,59	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,84	7,63	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
04	4	0.994	2	3,85	7,65	ACERO ALETAS BOX COULVERT IV
05	3	0.560	48	3,46	93,00	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV
01	3	0.560	68	1,46	55,80	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV
02	3	0.560	8	3,75	16,80	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV
06	4	0.994	32	3,20	101,79	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV
07	4	0.994	118	2,04	239,28	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV
08	4	0.994	16	3,58	56,94	ACERO REFUERZO BOX COULVERT IV
				TOTAL		12.740,9

ELABORO

APROBO

Residente de Obra
Ing . José Daniel Villegas Buitrago

Director de Obra
Ing . Ricardo Alarcón Millán

Residente de Interventoría
Ing . Germán Alonso Rivera Reyes

Director de Interventoría
Ing. Alfredo Ruiz Suárez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	8- BOX COULVERT	ITEM	8.3	RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADASEN CAMPO

Descripción	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
SUB BASE PARA BOX COULVERT 2 CALLE DE RODAJE BRAVO	65,49	0,15	5,10	50,10	
SUB BASE PARA BOX COULVERT 1 CALLE DE RODAJE ALPHA	70,0	0,2	5,1	53,56	
Sub-Total					103,7
TOTAL					103,7

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: Ing. José Daniel Villegas Buitrago
Director de Obra: Ing. Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoría: Ing. Germán Alonso Rivera Reyes
Director de interventoría: Ing. Alfredo Pérez Santos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	2	A	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	14

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	8- BOX COULVERT	ITEM	8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.





CALCULO DE VOLUMENES DETERMINADAS EN CAMPO

DESCRIPCION	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL	OBSERVACIONES
CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO V EXTERIOR ALAEROPUERTO	0,30	3,00	3,44	2,00	6,19	SOLERAS
CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO V EXTERIOR ALAEROPUERTO	0,10	3,00	0,75	4,00	0,90	CAÑUELAS
CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO V EXTERIOR ALAEROPUERTO	0,50	0,28	8,67	2,00	2,43	ZARPAS
CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO V EXTERIOR ALAEROPUERTO	0,30	2,90	3,00	4,00	10,44	ALETA TIPO I
CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO V EXTERIOR ALAEROPUERTO	0,30	1,50	1,10	- 1,00	- 0,50	DESCUENTO AREA VENTANA ALETA
CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO V EXTERIOR ALAEROPUERTO	0,2	0,2	3,600	2,0	0,29	BORDILLO
CONCRETO BOX COULVETTIPO II EN CALLE RODAJE BRAVO	0,2	0,9	20,000	2,0	7,00	CAÑUELAS
CONCRETO BOX COULVETTIPO II EN CALLE RODAJE BRAVO	0,3	4,1	20,000	1,0	24,60	LOSA INFERIOR
CONCRETO BOX COULVETTIPO II EN CALLE RODAJE BRAVO	1,5	0,3	20,000	2,0	18,00	MURO
				Sub-Total		69,4
				TOTAL		69,4

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . José David Villegas Bustrago

Director de Obra: _____
Ing . Ricardo Alberto Muño

Residente de interventoría: _____
Ing . Germán Alonso Rivera Reyes

Director de interventoría: _____
Ing. Alfredo Pérez Santos

LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato cuyo objeto es "Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)", suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, certifico que el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 correspondiente al mes de febrero por un valor de $ 3.880.198.697 IVA incluido (Tres mil Ochocientos ochenta millones ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos M/Cte.) y amortización del anticipo de $ 904.086.296 (Novecientos cuatro millones ochenta y seis mil doscientos noventa y seis pesos M/Cte.) para un total a pagar de $ 2.976.112.401 (Dos mil novecientos setenta y seis millones ciento doce mil cuatrocientos un pesos M/Cte.), está de conformidad con lo establecido en la Forma de Pago del Contrato.

Para constancia de lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

ALFREDO PEREZ SANTOS
Director de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes

LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato cuyo objeto es "Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto Santiago Vila De Flandes (VF)", suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, identificado con NIT 901827374-8, acorde con la documentación presentada y verificada, certifica que el CONSORCIO GP FLANDES ha hecho uso adecuado del anticipo otorgado para la ejecución del contrato, correspondiente al proyecto de mejoramiento de pista y plataformas en el Aeropuerto Santiago Vila De Flandes.

Tabla 1 Valores del anticipo para el presente corte

VALOR DEL ANTICIPO	$ 11.302.256.916
VALOR AMORTIZADO	$ 3.045.244.069
VALOR UTILIZADO	$ 2.117.839.836
SALDO RESTANTE	$ 8.256.012.847

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025

Para constancia de lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

ALFREDO PEREZ SANTOS
Representante Legal de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento — DD: **25** / MM: **Febrero** / AAAA: **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **Consorcio GP Flandes**
NIT/CC No.: **901.827.374**

Información Contractual

Contrato No.: 23001258 H4 DE 2023

Objeto del contrato: Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)

Fecha de suscripción: 28 / may / 2024 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 31 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 48.620.604.781,00	$ -	$ 9.193.810.183,00	$ 39.426.794.598,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura electrónica		

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 11.302.256.916,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 2.142.157.773,00
Amortización presente pago	$ 904.086.296,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 8.256.012.847,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 24500017192
Nombre entidad bancaria: Bancolombia S.A.

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	133724
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	$ 2.976.112.401,00
Total a pagar:	**$ 2.976.112.401,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma: Roselly Pájaro Fortich
Nombre: ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH
Cargo: Representante Legal - Interventoría
Dependencia: No Aplica

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato cuyo objeto es “Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)”, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, acorde con la documentación presentada y certificada por sus representantes legales, contador y revisor fiscal respectivamente, certifica que el CONSORCIO GP FLANDES, cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales, correspondientes al Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04.

Para constancia de lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

ALFREDO PEREZ SANTOS
Director de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes

Medellín, 17 de febrero de 2025

Señores
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES
Tolima

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Contrato número 23001258 H4 de 2023, "Realizar mejoramiento de pista, plataforma, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto Santiago Vila de Flandes".

Respetados Señores:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2003, bajo la gravedad del juramento:

Nosotros JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ Y MARIA EUGENIA SANTANA TORRES, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Contadora, respectivamente de la firma GP Flandes.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de enero de 2025, la firma GP Flandes, identificada con Nit 899.999.059-3; ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados y trabajadores del contrato de la referencia, en cuanto a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales. Referente al mes de enero de 2025.

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA G.
CC Nro.3.353.097
Representante Legal

MARÍA EUGENIA SANTANA TORRES
CC Nro.32.240.099
Contadora
T.P. 126022-T

Medellín, febrero 04 de 2025

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Respetados Señores

El suscrito Revisor Fiscal de **GISAICO S.A.S**, identificado con **NIT 890.917.464-1**, certifica que la empresa, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **ARL** (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), a las Cajas de Compensación Familiar y **FIC**.

De conformidad con lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURIDICA**	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje **SENA** de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (X)	No ( )

La empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 13222-T

Medellín, 17 de febrero de 2025

Señores
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES
Tolima

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Contrato número 23001258 H4 de 2023, "Realizar mejoramiento de pista, plataforma, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto Santiago Vila de Flandes".

Respetados Señores:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2003, bajo la gravedad del juramento:

Nosotros JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABORDA VALENCIA, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Revisor Fiscal, respectivamente de la firma PROCOPAL S.A.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de diciembre 2024, la firma PROCOPAL S.A, identificada con Nit 890.906.388-0; ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados y trabajadores del contrato de la referencia, en cuanto a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales. Referente al mes de diciembre de 2024.

Debe tenerse en cuenta que el pago por los conceptos precitados se realiza mes vencido.

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA G.
CC Nro.3.353.097
Representante Legal

SANTIAGO TABORDA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 317446-T
En Representación de AIGR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B275764 65B136E2C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANTIAGO TABORDA VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037628103 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 317446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8AC24E9D72794 9A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA SANTANA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32240099 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 126022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF237FF286E8F144

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70091459 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 13222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1982**

ANZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

17-NOV-2000 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0112100-18110311-F-0032240099-20030523 **04608** 03142B 01 135219873

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

32240099
NUMERO

SANTANA TORRES
APELLIDOS

MARIA EUGENIA
NOMBRES



Maria E Santana T
FIRMA

FIRMA DEL TITULAR 47465

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126022-T

MARIA EUGENIA
SANTANA TORRES
C.C. 32240099
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136140

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



13222-T

JORGE HUMBERTO
AGUILAR OSPINA
C.C. 70.091.459
RESOLUCION INSCRIPCION 1793-T FECHA 19-IX-85
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

00020648

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.091.459**

AGUILAR OSPINA
APELLIDOS

JORGE HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1956**

YOLOMBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-SEP-1976 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0115100-00120102-M-0070091459-20081102 0005175603A 1 2240019646



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317446-T

SANTIAGO
TABORDA VALENCIA
C.C. 1037628103
RES. INSCRIPCION 456 DEL 25/10/2023
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

367289 372072



230303/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Registradora de Libros de Comercio Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Valido únicamente para realizar procesos asociados al Consorcio GP Flandes de la compañía PROCOPAL S.A. identificada con NIT: 890.906.388-0



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.628.103
TABORDA VALENCIA

APELLIDOS
SANTIAGO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1993
MEDELLIN
ANTIOQUIA
LUGAR DE NACIMIENTO

1.8 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-AGO-2011 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0112100-00332937-M-1037628103-20110910 0028007630A 1 37474918

Valido únicamente para realizar procesos asociados al Consorcio GP Flandes de la compañía PROCOPAL S.A. identificada con NIT: 890.906.388-0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1258752091	9481575776	E	2025/02/18	2025/02/11	BANCOLOMBIA	0	$23,251,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO GP FLANCES (52 Afiliados)																								$75,729,173	$12,110,000			$75,729,173	$3,022,200			$75,944,903	$3,000,000			$75,729,173		$5,119,600		$0	$0		$23,251,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (51 Afiliados)																								$74,305,673	$11,882,200			$74,305,673	$2,965,200			$74,426,503	$2,943,000			$74,305,673		$5,112,600		$0	$0		$22,903,000
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (50 Afiliados)																								$69,565,999	$11,123,800			$69,565,999	$2,775,600			$69,686,829	$2,753,400			$69,565,999		$4,782,700		$0	$0		$21,435,500
1	CC	11223340	ARIAS ARIEL	X																		23020 1	4	$400,000	$64,000	EPS017	4	$400,000	$16,000	CCF50	4	$400,000	$16,000	14-7	4	$400,000	6.960%	$27,900	4	$0	$0	Si	$123,900
2	CC	1108453993	ARROYO HOLMAN							X		X										23030 1	30	$1,705,879	$273,000	EPS002	30	$1,705,879	$68,300	CCF50	30	$1,705,879	$68,300	14-7	30	$1,705,879	6.960%	$118,800	30	$0	$0	Si	$528,400
3	CC	11320592	BAEZ OMAR	X																		23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
4	CC	1193132611	BALLESTEROS JUAN	X																		23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF50	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
5	CC	11228206	BARRETO EDWIN	X																		23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
6	CC	1070615596	BERMUDEZ DIEGO	X								X										23030 1	10	$633,334	$101,400	EPS002	10	$633,334	$25,400	CCF50	10	$633,334	$25,400	14-7	10	$633,334	6.960%	$44,100	10	$0	$0	Si	$196,300
7	CC	1070622247	BETANCOURT JUAN									X										23020 1	30	$2,083,695	$333,400	EPS042	30	$2,083,695	$83,400	CCF50	30	$2,083,695	$83,400	14-7	30	$2,083,695	6.960%	$145,100	30	$0	$0	Si	$645,300
8	CC	1005774470	BOCANEGRA JHONATHAN	X																		23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
9	CC	11222922	BOHORQUEZ JOHN									X										23030 1	30	$2,271,739	$363,500	EPS002	30	$2,271,739	$90,900	CCF50	30	$2,271,739	$90,900	14-7	30	$2,271,739	6.960%	$158,200	30	$0	$0	Si	$703,500
10	CC	93133082	CARDOSO JOHN							X		X										23030 1	30	$1,705,879	$273,000	EPS037	30	$1,705,879	$68,300	CCF50	30	$1,705,879	$68,300	14-7	30	$1,705,879	6.960%	$118,800	30	$0	$0	Si	$528,400
11	CC	88261192	CARDOZO LUIS										X									25-14	1	$100,001	$16,100	EPS037	1	$100,001	$4,100	CCF50	1	$100,001	$0	14-7	1	$100,001	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,200
12	CC	88261192	CARDOZO LUIS									X										25-14	29	$3,421,740	$547,500	EPS037	29	$3,421,740	$136,900	CCF50	29	$3,421,740	$136,900	14-7	29	$3,421,740	6.960%	$238,200	29	$0	$0	Si	$1,059,500
13	CC	11309460	CASTRO HELI									X										23020 1	30	$3,226,087	$516,200	EPS017	30	$3,226,087	$129,100	CCF50	30	$3,226,087	$129,100	14-7	30	$3,226,087	6.960%	$224,600	30	$0	$0	Si	$999,000
14	CC	14250879	CASTRO JULIO	X								X										25-14	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF50	2	$126,666	$5,100	14-7	2	$126,667	6.960%	$8,900	2	$0	$0	Si	$39,400
15	CC	1108455979	CIFUENTES LUIS											X								23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
16	CC	1108455979	CIFUENTES LUIS											X								23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
17	CC	1108455979	CIFUENTES LUIS							X		X										23030 1	28	$1,659,719	$265,600	EPS002	28	$1,659,719	$66,400	CCF50	28	$1,659,719	$66,400	14-7	28	$1,659,719	6.960%	$115,600	28	$0	$0	Si	$514,000
18	CC	38362441	DAZA KELLY	X																		25-14	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF50	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
19	CC	93123846	GAMBOA YAMIR		X							X										25-14	1	$205,617	$32,900	EPS002	1	$205,617	$8,300	CCF50	1	$326,450	$13,100	14-7	1	$205,617	6.960%	$14,400	1	$0	$0	Si	$68,700
20	CC	1108455294	GAÑAN CRISTIAN																X			23030 1	3	$190,001	$30,500	EPS002	3	$190,001	$7,700	CCF50	3	$190,001	$0	14-7	3	$190,001	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$38,200
21	CC	1108455294	GAÑAN CRISTIAN									X										23030 1	27	$2,138,532	$342,200	EPS002	27	$2,138,532	$85,600	CCF50	27	$2,138,532	$85,600	14-7	27	$2,138,532	6.960%	$148,900	27	$0	$0	Si	$662,300
22	CC	1108453530	GARCIA WALTER	X																		23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF50	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
23	CC	11206673	GONZALEZ VICTOR										X									23030 1	2	$94,900	$11,400	EPS002	2	$94,900	$0	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$11,400
24	CC	11206673	GONZALEZ VICTOR	X																		23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
25	CC	1108455661	HERNANDEZ JHON											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
26	CC	1108455661	HERNANDEZ JHON							X		X										23030 1	28	$1,599,374	$255,900	EPS002	28	$1,599,374	$64,000	CCF50	28	$1,599,374	$64,000	14-7	28	$1,599,374	6.960%	$111,400	28	$0	$0	Si	$495,300
27	CC	1015474454	HURTADO JORGE							X		X										23030 1	30	$1,667,197	$266,800	EPS005	30	$1,667,197	$66,700	CCF50	30	$1,667,197	$66,700	14-7	30	$1,667,197	6.960%	$116,100	30	$0	$0	Si	$516,300
28	CC	80493203	JARA ALIRIO	X								X										23020 1	10	$633,334	$101,400	EPS002	10	$633,334	$25,400	CCF50	10	$633,334	$25,400	14-7	10	$633,334	6.960%	$44,100	10	$0	$0	Si	$196,300
29	CC	93434622	JUYAR JOSE							X		X										23020 1	30	$1,847,456	$295,600	EPS002	30	$1,847,456	$73,900	CCF50	30	$1,847,456	$73,900	14-7	30	$1,847,456	6.960%	$128,600	30	$0	$0	Si	$572,000

Planilla Resumen

30	CC	1069178394	LAGUNA RAUL	X								X									230301	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$2,600	CCF50	1	$63,333	$2,600	14-7	1	$63,334	6.960%	$4,500	1	$0	$0	Si	$19,900
31	CC	1069178394	LAGUNA RAUL										X								230301	2	$126,674	$15,300	EPS002	2	$126,674	$0	CCF50	2	$126,674	$0	14-7	2	$126,674	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,300
32	CC	1193044089	MARTINEZ CRISTIAN	X																	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
33	CC	1110262488	MENDOZA MANUEL	X																	230201	23	$1,150,000	$184,000	EPS037	23	$1,150,000	$46,000	CCF50	23	$1,150,000	$46,000	14-7	23	$1,150,000	6.960%	$80,100	23	$0	$0	Si	$356,100
34	CC	1006122610	MONROY JUAN	X								X									230301	10	$733,334	$117,400	EPS002	10	$733,334	$29,400	CCF50	10	$733,334	$29,400	14-7	10	$733,334	6.960%	$51,100	10	$0	$0	Si	$227,300
35	CC	80101636	MORENO MARCO									X									230301	30	$2,054,348	$328,700	EPS002	30	$2,054,348	$82,200	CCF50	30	$2,054,348	$82,200	14-7	30	$2,054,348	6.960%	$143,000	30	$0	$0	Si	$636,100
36	CC	11309485	NEIRA AVELINO							X		X									231001	30	$1,647,856	$263,700	EPS002	30	$1,647,856	$66,000	CCF50	30	$1,647,856	$66,000	14-7	30	$1,647,856	6.960%	$114,700	30	$0	$0	Si	$510,400
37	CC	1018402983	ORTIZ DIANA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF50	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
38	CC	11227555	PACHON ALEX									X									230301	30	$3,526,630	$564,300	EPS005	30	$3,526,630	$141,100	CCF50	30	$3,526,630	$141,100	14-7	30	$3,526,630	6.960%	$245,500	30	$0	$0	Si	$1,092,000
39	CC	1007846773	PERDOMO LUISA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF50	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
40	CC	1003555018	RAMIREZ CRISTIAN							X		X									230301	30	$1,740,693	$278,600	ESSC24	30	$1,740,693	$69,700	CCF50	30	$1,740,693	$69,700	14-7	30	$1,740,693	6.960%	$121,200	30	$0	$0	Si	$539,200
41	CC	1234645741	RODRIGUEZ DAVID									X									230301	30	$2,546,739	$407,500	EPS017	30	$2,546,739	$101,900	CCF50	30	$2,546,739	$101,900	14-7	30	$2,546,739	6.960%	$177,300	30	$0	$0	Si	$788,600
42	CC	1069179411	RUBIANO GUSTAVO									X									230301	30	$3,022,826	$483,700	EPS002	30	$3,022,826	$121,000	CCF50	30	$3,022,826	$121,000	14-7	30	$3,022,826	6.960%	$210,400	30	$0	$0	Si	$936,100
43	CC	1108452279	SAENZ LUIS							X		X									230301	30	$1,717,484	$274,800	EPS041	30	$1,717,484	$68,700	CCF50	30	$1,717,484	$68,700	14-7	30	$1,717,484	6.960%	$119,600	30	$0	$0	Si	$531,800
44	CC	1083924311	SALINAS JOHAN	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
45	CC	1070602996	SANCHEZ CAMILO	X								X									230201	22	$1,515,182	$242,500	EPS002	22	$1,515,182	$60,700	CCF50	22	$1,515,182	$60,700	14-7	22	$1,515,182	6.960%	$105,500	22	$0	$0	Si	$469,400
46	CC	11314713	SANCHEZ JOSE	X								X									230301	8	$506,667	$81,100	EPS002	8	$506,667	$20,300	CCF50	8	$506,666	$20,300	14-7	8	$506,667	6.960%	$35,300	8	$0	$0	Si	$157,000
47	CC	1072098350	SANCHEZ KEVIN							X		X									230301	30	$1,702,011	$272,400	EPS002	30	$1,702,011	$68,100	CCF50	30	$1,702,011	$68,100	14-7	30	$1,702,011	6.960%	$118,500	30	$0	$0	Si	$527,100
48	CC	11220613	SERRANO JAIME											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
49	CC	11220613	SERRANO JAIME							X		X									230301	28	$1,607,111	$257,200	EPS002	28	$1,607,111	$64,300	CCF50	28	$1,607,111	$64,300	14-7	28	$1,607,111	6.960%	$111,900	28	$0	$0	Si	$497,700
50	CC	1069753283	SUAREZ SERGIO	X								X									230201	10	$933,334	$149,400	EPS005	10	$933,334	$37,400	CCF50	10	$933,334	$37,400	14-7	10	$933,334	6.960%	$65,000	10	$0	$0	Si	$289,200
51	CC	79650237	SUAREZ WALTER	X																	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF50	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
52	CC	1010083749	TAFUR STEPHANIE																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
53	CC	1092358453	TORRES PABLO																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF50	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
54	CC	1108454543	VELEZ MARY																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
55	CC	1110552227	VERA JUAN	X																	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
56	CC	11223283	VERA RONAL											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
57	CC	11223283	VERA RONAL							X		X									230301	28	$1,675,191	$268,100	EPS002	28	$1,675,191	$67,100	CCF50	28	$1,675,191	$67,100	14-7	28	$1,675,191	6.960%	$116,600	28	$0	$0	Si	$518,900
58	CC	1007464348	YATE PABLO	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
59	CC	1070617535	YUSTES JASON	X								X									230301	10	$633,334	$101,400	EPS002	10	$633,334	$25,400	CCF50	10	$633,334	$25,400	14-7	10	$633,334	6.960%	$44,100	10	$0	$0	Si	$196,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$4,739,674**	**$758,400**			**$4,739,674**	**$189,600**			**$4,739,674**	**$189,600**			**$4,739,674**		**$329,900**		**$0**	**$0**		**$1,467,500**
60	CC	7562641	ALZATE ALVARO									X									25-14	30	$4,739,674	$758,400	EPS010	30	$4,739,674	$189,600	CCF04	30	$4,739,674	$189,600	14-7	30	$4,739,674	6.960%	$329,900	30	$0	$0	Si	$1,467,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,518,400**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,000**		**$0**	**$0**		**$348,800**
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,518,400**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,000**		**$0**	**$0**		**$348,800**
61	CC	1105611368	HINESTROZA HASSBLEIDY											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
62	CC	1105611368	HINESTROZA HASSBLEIDY							X											230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF50	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,328,600	0.522%	$7,000	28	$0	$0	Si	$329,800
Total	**Afiliados(52)**																						$75,729,173	$12,110,000			$75,729,173	$3,022,200			$75,944,903	$3,000,000			$75,729,173		$5,119,600		$0	$0		$23,251,800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1258752091	9481575776	E	2025/02/18	2025/02/11	BANCOLOMBIA	0	$23,251,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$12,110,000	$0	$0	$12,110,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$263,700	$0	$0	$263,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,712,000	$0	$0	$2,712,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$7,004,800	$0	$0	$7,004,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,129,500	$0	$0	$2,129,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$5,119,600	$0	$0	$5,119,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	52	$5,119,600	$0	$0	$5,119,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				52	$3,000,000	$0	$0	$3,000,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$189,600	$0	$0	$189,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	51	$2,810,400	$0	$0	$2,810,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				52	$3,022,200	$0	$0	$3,022,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$83,400	$0	$0	$83,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$69,700	$0	$0	$69,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$189,600	$0	$0	$189,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$292,600	$0	$0	$292,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$362,900	$0	$0	$362,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$68,700	$0	$0	$68,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$1,311,300	$0	$0	$1,311,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$644,000	$0	$0	$644,000
TOTAL				52	$23,251,800	$0	$0	$23,251,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1258738214	9481068342	Y	2025/02/18	2025/02/11	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO GP FLANCES (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1036600579	ARANGO JOHN								X									230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1258738214	9481068342	Y	2025/02/18	2025/02/11	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado DEVIA VERA DIEGO ARMANDO, con CC 11205344, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GRACIANO USUGA CARLOS MARIO, con CC 98614371, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CALLE CASTRO NIXON ARTURO, con CC 71601871, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ARANGO MORALES GUSTAVO ENRIQUE, con CC 15404771, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado OSORIO LOPEZ ONEDIS ENRIQUE, con CC 8328334, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MUÑOZ RICARDO ALBERTO, con CC 76312109, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORREA GALEANO JESUS MARIA, con CC 98497121, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MATOMA RINCON ALEXIS , con CC 1005308779, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890700148	CCF50	COMFENALCO TOLIMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GUERRERO GIL JESUS ENRIQUE, con CC 77140142, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N892399989	CCF15	COMFACESAR

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado HERRERA JAIMES CARMEN ROCIO, con CC 1065815261, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ARROYAVE DAVID JUAN VIANEY, con CC 1044504488, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MIRANDA USUGA LEONARDO , con CC 1020416659, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RODRIGUEZ PRECIADO JUAN SEBASTIAN, con CC 1106895020, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890700148	CCF50	COMFENALCO TOLIMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORAL MESIAS LUIS FABIAN, con CC 98380560, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N892399989	CCF15	COMFACESAR

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINEDA BEDOYA ORLEY DE JESUS, con CC 71643474, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SALCEDO OVIEDO JOSE SERAFIN, con CC 93453874, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890700148	CCF50	COMFENALCO TOLIMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RESTREPO ARREDONDO JORGE WILSON, con CC 98524053, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RODRIGUEZ JIMENEZ JORGE LUIS, con CC 1001968814, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-02-19, 12:25:14 PM **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 76200994

Periodo Cotización: 202501 **Periodo Servicio:** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-02-17

Se certifica que en la fecha 17/02/2025, la empresa GISAICO SAS, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PRADA SABOGAL JOHN JAIRO, con CC 11220679, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N890700148	CCF50	COMFENALCO TOLIMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890906388	0	PROCOPAL S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43A 19 17 PISO 5	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1280113302	9481807294	E	2025/02/21	2025/02/20	BANCOLOMBIA	0	$288,382,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (282 Afiliados)																							**$932,586,362**	**$152,447,300**			**$961,238,614**	**$54,367,700**			**$923,945,483**	**$36,642,700**			**$961,238,614**		**$35,603,600**		**$186,411,108**	**$9,321,500**		**$288,382,800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (199 Afiliados)																							**$582,192,072**	**$94,574,000**			**$585,614,656**	**$29,103,400**			**$554,075,151**	**$21,964,400**			**$585,614,656**		**$30,640,200**		**$66,428,040**	**$3,321,700**		**$179,603,700**
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							**$9,822,133**	**$1,571,800**			**$11,525,280**	**$461,400**			**$10,978,681**	**$439,600**			**$11,525,280**		**$671,700**		**$0**	**$0**		**$3,144,500**
1	CC	98643200	CORDOBA GONZALO									X									25-14	30	$2,233,488	$357,400	EPS010	30	$2,233,488	$89,400	CCF04	30	$2,233,488	$89,400	14-7	30	$2,233,488	6.960%	$155,500	30	$0	$0	Si	$691,700
2	CC	15513087	GOMEZ JAIME									X									25-14	30	$1,871,087	$299,400	EPS010	30	$1,871,087	$74,900	CCF04	30	$1,871,087	$74,900	14-7	30	$1,871,087	6.960%	$130,300	30	$0	$0	Si	$579,500
3	CC	8429813	MURILLO JUSTO													X					230301	6	$600,830	$96,200	EPS010	6	$600,830	$24,100	CCF04	6	$491,380	$19,700	14-7	6	$600,830	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$140,000
4	CC	8429813	MURILLO JUSTO									X									230301	24	$2,350,079	$376,100	EPS010	24	$2,350,079	$94,100	CCF04	24	$2,350,079	$94,100	14-7	24	$2,350,079	6.960%	$163,600	24	$0	$0	Si	$727,900
5	CC	98577310	SANCHEZ WILSON													X					25-14	12	$1,277,349	$204,400	EPS037	12	$1,277,349	$51,100	CCF04	12	$840,200	$33,700	14-7	12	$1,277,349	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$289,200
6	CC	98577310	SANCHEZ WILSON									X									25-14	18	$1,489,300	$238,300	EPS037	18	$1,489,300	$59,600	CCF04	18	$1,489,300	$59,600	14-7	18	$1,489,300	6.960%	$103,700	18	$0	$0	Si	$461,200
7	CC	71648279	ZAPATA JAIME									X										0	$0	$0	EPS002	30	$1,703,147	$68,200	CCF04	30	$1,703,147	$68,200	14-7	30	$1,703,147	6.960%	$118,600	30	$0	$0	Si	$255,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$16,829,300**	**$2,861,100**			**$16,829,300**	**$2,103,700**			**$16,829,300**	**$673,200**			**$16,829,300**		**$1,171,400**		**$16,829,300**	**$841,500**		**$7,650,900**
8	CC	79263159	VALLEJO RICARDO																		25-14	30	$16,829,300	$2,861,100	EPS002	30	$16,829,300	$2,103,700	CCF24	30	$16,829,300	$673,200	14-7	30	$16,829,300	6.960%	$1,171,400	30	$16,829,300	$841,500	No	$7,650,900
Ciudad: CALDAS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,464,728**	**$394,400**			**$2,464,728**	**$98,600**			**$1,904,767**	**$76,200**			**$2,464,728**		**$82,200**		**$0**	**$0**		**$651,400**
9	CC	98632895	ECHEVERRI JORGE									X									25-14	18	$1,179,967	$188,800	EPS010	18	$1,179,967	$47,200	CCF04	18	$1,179,967	$47,200	14-7	18	$1,179,967	6.960%	$82,200	18	$0	$0	Si	$365,400
10	CC	98632895	ECHEVERRI JORGE													X					25-14	12	$1,284,761	$205,600	EPS010	12	$1,284,761	$51,400	CCF04	12	$724,800	$29,000	14-7	12	$1,284,761	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$286,000
Ciudad: CAUCASIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,081,661**	**$333,100**			**$2,081,661**	**$83,300**			**$2,081,661**	**$83,300**			**$2,081,661**		**$144,900**		**$0**	**$0**		**$644,600**
11	CC	8046640	SOTO JULIO									X									25-14	30	$2,081,661	$333,100	EPS010	30	$2,081,661	$83,300	CCF04	30	$2,081,661	$83,300	14-7	30	$2,081,661	6.960%	$144,900	30	$0	$0	Si	$644,600
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							**$30,472,885**	**$4,978,900**			**$30,472,885**	**$1,219,700**			**$27,959,613**	**$1,110,400**			**$30,472,885**		**$1,448,000**		**$0**	**$0**		**$8,757,000**
12	CC	71774195	CASTAÑEDA DIDER													X					25-14	6	$775,294	$124,100	EPS010	6	$775,294	$31,100	CCF04	6	$485,460	$19,500	14-7	6	$775,294	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$174,700
13	CC	71774195	CASTAÑEDA DIDER									X									25-14	24	$2,113,334	$338,200	EPS010	24	$2,113,334	$84,600	CCF04	24	$2,113,334	$84,600	14-7	24	$2,113,334	6.960%	$147,100	24	$0	$0	Si	$654,500
14	CC	15506681	CATAÑO JORGE													X					25-14	12	$621,967	$99,600	EPS010	12	$621,967	$24,900	CCF04	12	$594,400	$23,800	14-7	12	$621,967	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$148,300
15	CC	15506681	CATAÑO JORGE													X					25-14	18	$891,600	$142,700	EPS010	18	$891,600	$35,700	CCF04	18	$891,600	$35,700	14-7	18	$891,600	6.960%	$62,100	18	$0	$0	Si	$276,200
16	CC	1128478406	ECHEVERRI ANDRES													X					25-14	6	$468,862	$75,100	EPS010	6	$468,862	$18,800	CCF04	6	$361,380	$14,500	14-7	6	$468,862	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$108,400
17	CC	1128478406	ECHEVERRI ANDRES									X									25-14	24	$2,164,351	$346,300	EPS010	24	$2,164,351	$86,600	CCF04	24	$2,164,351	$86,600	14-7	24	$2,164,351	6.960%	$150,700	24	$0	$0	Si	$670,200
18	CC	16161367	GOMEZ JOHN									X									25-14	30	$2,155,070	$344,900	EPS010	30	$2,155,070	$86,300	CCF04	30	$2,155,070	$86,300	14-7	30	$2,155,070	6.960%	$150,000	30	$0	$0	Si	$667,500
19	CC	15505019	LOPERA CARLOS													X					25-14	12	$4,744,009	$806,700	EPS010	12	$4,744,009	$189,800	CCF04	12	$3,627,320	$145,100	14-7	12	$4,744,009	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$1,141,600
20	CC	15505019	LOPERA CARLOS																		25-14	18	$5,440,980	$925,200	EPS010	18	$5,440,980	$217,700	CCF04	18	$5,440,980	$217,700	14-7	18	$5,440,980	6.960%	$378,700	18	$0	$0	Si	$1,739,300
21	CC	5294596	MINAYO FABIAN													X					25-14	6	$867,734	$138,900	EPS010	6	$867,734	$34,800	CCF04	6	$586,360	$23,500	14-7	6	$867,734	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$197,200
22	CC	5294596	MINAYO FABIAN									X									25-14	24	$3,011,468	$481,900	EPS010	24	$3,011,468	$120,500	CCF04	24	$3,011,468	$120,500	14-7	24	$3,011,468	6.960%	$209,600	24	$0	$0	Si	$932,500
23	CC	15515935	RAMIREZ DIEGO											X							230301	2	$120,801	$19,400	EPS010	2	$120,801	$4,900	CCF04	2	$120,801	$0	14-7	2	$120,801	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,300
24	CC	15515935	RAMIREZ DIEGO									X									230301	28	$2,027,011	$324,400	EPS010	28	$2,027,011	$81,100	CCF04	28	$2,027,011	$81,100	14-7	28	$2,027,011	6.960%	$141,100	28	$0	$0	Si	$627,700
25	CC	98570084	RAMIREZ JUAN											X							231001	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
26	CC	98570084	RAMIREZ JUAN													X					231001	7	$467,383	$74,800	EPS002	7	$467,383	$18,700	CCF04	7	$373,543	$15,000	14-7	7	$467,383	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$108,500
27	CC	98570084	RAMIREZ JUAN									X									231001	21	$1,296,903	$207,600	EPS002	21	$1,296,903	$51,900	CCF04	21	$1,296,903	$51,900	14-7	21	$1,296,903	6.960%	$90,300	21	$0	$0	Si	$401,700
28	CC	15509829	VASQUEZ ADOLFO													X					25-14	12	$1,511,406	$241,900	EPS010	12	$1,511,406	$60,500	CCF04	12	$914,920	$36,600	14-7	12	$1,511,406	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$339,000
29	CC	15509829	VASQUEZ ADOLFO									X									25-14	18	$1,699,812	$272,000	EPS010	18	$1,699,812	$68,000	CCF04	18	$1,699,812	$68,000	14-7	18	$1,699,812	6.960%	$118,400	18	$0	$0	Si	$526,400

Planilla Resumen

Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							$13,493,857	$2,159,500			$13,493,857	$540,400			$12,644,347	$506,400			$13,493,857		$664,300		$0	$0		$3,870,600
30	CC	98550721	BLANDON WILFER													X					25-14	12	$1,485,966	$237,800	EPS010	12	$1,485,966	$59,500	CCF04	12	$959,080	$38,400	14-7	12	$1,485,966	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$335,700
31	CC	98550721	BLANDON WILFER									X									25-14	18	$1,621,054	$259,400	EPS010	18	$1,621,054	$64,900	CCF04	18	$1,621,054	$64,900	14-7	18	$1,621,054	6.960%	$112,900	18	$0	$0	Si	$502,100
32	CC	70561634	CORREA JUAN													X					25-14	6	$630,378	$100,900	EPS010	6	$630,378	$25,300	CCF04	6	$500,460	$20,100	14-7	6	$630,378	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$146,300
33	CC	70561634	CORREA JUAN									X									25-14	24	$2,650,535	$424,100	EPS010	24	$2,650,535	$106,100	CCF04	24	$2,650,535	$106,100	14-7	24	$2,650,535	6.960%	$184,500	24	$0	$0	Si	$820,800
34	CC	71312050	HIGUITA ADRIAN													X					25-14	5	$370,696	$59,400	EPS010	5	$370,696	$14,900	CCF04	5	$336,000	$13,500	14-7	5	$370,696	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$87,800
35	CC	71312050	HIGUITA ADRIAN									X									25-14	25	$1,855,304	$296,900	EPS010	25	$1,855,304	$74,300	CCF04	25	$1,855,304	$74,300	14-7	25	$1,855,304	6.960%	$129,200	25	$0	$0	Si	$574,700
36	CC	6695982	RODRIGUEZ GILBERTO													X					25-14	7	$679,043	$108,700	EPS010	7	$679,043	$27,200	CCF04	7	$521,033	$20,900	14-7	7	$679,043	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$156,800
37	CC	6695982	RODRIGUEZ GILBERTO									X									25-14	23	$2,231,381	$357,100	EPS010	23	$2,231,381	$89,300	CCF04	23	$2,231,381	$89,300	14-7	23	$2,231,381	6.960%	$155,400	23	$0	$0	Si	$691,100
38	CC	70322696	RODRIGUEZ LEONEL													X					25-14	12	$787,800	$126,100	EPS037	12	$787,800	$31,600	CCF04	12	$787,800	$31,600	14-7	12	$787,800	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$189,300
39	CC	70322696	RODRIGUEZ LEONEL																		25-14	18	$1,181,700	$189,100	EPS037	18	$1,181,700	$47,300	CCF04	18	$1,181,700	$47,300	14-7	18	$1,181,700	6.960%	$82,300	18	$0	$0	Si	$366,000
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																							$17,081,076	$2,733,600			$17,081,076	$683,800			$15,591,865	$624,200			$17,081,076		$812,600		$0	$0		$4,854,200
40	CC	70327714	CADAVID ELKIN																		230301	30	$2,502,300	$400,400	EPS010	30	$2,502,300	$100,100	CCF04	30	$2,502,300	$100,100	14-7	30	$2,502,300	6.960%	$174,200	30	$0	$0	Si	$774,800
41	CC	70322738	CASTRILLON JOSE							X		X									25-14	30	$1,445,473	$231,300	EPS037	30	$1,445,473	$57,900	CCF04	30	$1,445,473	$57,900	14-7	30	$1,445,473	6.960%	$100,700	30	$0	$0	Si	$447,800
42	CC	70323439	GIL PEDRO													X					25-14	12	$676,546	$108,300	EPS037	12	$676,546	$27,100	CCF04	12	$646,560	$25,900	14-7	12	$676,546	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$161,300
43	CC	70323439	GIL PEDRO																		25-14	18	$969,840	$155,200	EPS037	18	$969,840	$38,800	CCF04	18	$969,840	$38,800	14-7	18	$969,840	6.960%	$67,600	18	$0	$0	Si	$300,400
44	CC	98488507	GONZALEZ HECTOR													X					25-14	6	$601,982	$96,400	EPS010	6	$601,982	$24,100	CCF04	6	$389,880	$15,600	14-7	6	$601,982	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$136,100
45	CC	98488507	GONZALEZ HECTOR									X									25-14	24	$1,601,898	$256,400	EPS010	24	$1,601,898	$64,100	CCF04	24	$1,601,898	$64,100	14-7	24	$1,601,898	6.960%	$111,500	24	$0	$0	Si	$496,100
46	CC	98483065	MORALES JOHN													X					25-14	7	$435,439	$69,700	EPS010	7	$435,439	$17,500	CCF04	7	$422,800	$17,000	14-7	7	$435,439	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$104,200
47	CC	98483065	MORALES JOHN																		25-14	23	$1,389,200	$222,300	EPS010	23	$1,389,200	$55,600	CCF04	23	$1,389,200	$55,600	14-7	23	$1,389,200	6.960%	$96,700	23	$0	$0	Si	$430,200
48	CC	70324759	PINZON JOSE													X					25-14	12	$1,523,564	$243,800	EPS010	12	$1,523,564	$61,000	CCF04	12	$779,760	$31,200	14-7	12	$1,523,564	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$336,000
49	CC	70324759	PINZON JOSE									X									25-14	18	$1,586,854	$253,900	EPS010	18	$1,586,854	$63,500	CCF04	18	$1,586,854	$63,500	14-7	18	$1,586,854	6.960%	$110,500	18	$0	$0	Si	$491,400
50	CC	70325014	SALAS LUIS													X					230201	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF04	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$170,900
51	CC	70325014	SALAS LUIS							X		X									230201	15	$718,250	$115,000	EPS010	15	$718,250	$28,800	CCF04	15	$718,250	$28,800	14-7	15	$718,250	6.960%	$50,000	15	$0	$0	Si	$222,600
52	CC	8049017	SUAREZ ONOFRE																		25-14	18	$1,456,380	$233,100	EPS010	18	$1,456,380	$58,300	CCF04	18	$1,456,380	$58,300	14-7	18	$1,456,380	6.960%	$101,400	18	$0	$0	Si	$451,100
53	CC	8049017	SUAREZ ONOFRE													X					25-14	12	$1,461,600	$233,900	EPS010	12	$1,461,600	$58,500	CCF04	12	$970,920	$38,900	14-7	12	$1,461,600	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$331,300
Ciudad: GUARNE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,880,444	$461,000			$2,880,444	$115,300			$2,427,300	$97,200			$2,880,444		$101,400		$0	$0		$774,900
54	CC	3481863	ARANGO JHON													X					230201	12	$1,424,064	$227,900	EPS010	12	$1,424,064	$57,000	CCF04	12	$970,920	$38,900	14-7	12	$1,424,064	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$323,800
55	CC	3481863	ARANGO JHON																		230201	18	$1,456,380	$233,100	EPS010	18	$1,456,380	$58,300	CCF04	18	$1,456,380	$58,300	14-7	18	$1,456,380	6.960%	$101,400	18	$0	$0	Si	$451,100
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,397,700	$383,700			$2,397,700	$96,000			$2,397,700	$96,000			$2,397,700		$166,900		$0	$0		$742,600
56	CC	3497347	QUINTERO EDGAR																		25-14	30	$2,397,700	$383,700	EPS037	30	$2,397,700	$96,000	CCF04	30	$2,397,700	$96,000	14-7	30	$2,397,700	6.960%	$166,900	30	$0	$0	Si	$742,600
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							$11,898,426	$1,990,200			$13,617,863	$545,000			$12,887,426	$479,700			$13,617,863		$617,100		$0	$0		$3,632,000
57	CC	15257574	BEDOYA ARIEL											X								0	$0	$0	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$3,800
58	CC	15257574	BEDOYA ARIEL									X										0	$0	$0	EPS010	4	$297,414	$11,900	CCF04	4	$297,414	$11,900	14-7	4	$297,414	6.960%	$20,800	4	$0	$0	Si	$44,600
59	CC	15257574	BEDOYA ARIEL											X								0	$0	$0	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF04	8	$379,600	$0	14-7	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$15,200
60	CC	15257574	BEDOYA ARIEL											X								0	$0	$0	EPS010	9	$427,050	$17,100	CCF04	9	$427,050	$0	14-7	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$17,100
61	CC	15257574	BEDOYA ARIEL													X						0	$0	$0	EPS010	7	$520,473	$20,900	CCF04	7	$520,473	$20,900	14-7	7	$520,473	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$41,800
62	CC	1036629241	BEDOYA CARLOS													X					230201	6	$1,765,654	$300,400	EPS010	6	$1,765,654	$70,700	CCF04	6	$1,708,697	$68,400	14-7	6	$1,765,654	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$439,500
63	CC	1036629241	BEDOYA CARLOS									X									230201	24	$6,834,789	$1,162,000	EPS010	24	$6,834,789	$273,400	CCF04	24	$6,834,789	$273,400	14-7	24	$6,834,789	6.960%	$475,800	24	$0	$0	Si	$2,184,600
64	CC	10195262	MARIN UBER													X					25-14	12	$1,566,680	$250,700	EPS010	12	$1,566,680	$62,700	CCF04	12	$893,200	$35,800	14-7	12	$1,566,680	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$349,200
65	CC	10195262	MARIN UBER									X									25-14	18	$1,731,303	$277,100	EPS010	18	$1,731,303	$69,300	CCF04	18	$1,731,303	$69,300	14-7	18	$1,731,303	6.960%	$120,500	18	$0	$0	Si	$536,200
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,430,000	$228,900			$1,430,000	$57,300			$1,430,000	$57,300			$1,430,000		$79,800		$0	$0		$423,300
66	CC	70909457	GOMEZ MANUEL													X					230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$68,400
67	CC	70909457	GOMEZ MANUEL							X		X									230301	24	$1,145,300	$183,300	EPS037	24	$1,145,300	$45,900	CCF04	24	$1,145,300	$45,900	14-7	24	$1,145,300	6.960%	$79,800	24	$0	$0	Si	$354,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (162 Afiliados)																							$467,607,925	$75,880,600			$467,607,925	$22,949,500			$443,344,663	$17,576,900			$467,607,925		$24,470,300		$49,598,740	$2,480,200		$143,357,500
68	CC	71217978	ACEVEDO JUAN													X					25-14	12	$1,392,223	$222,800	EPS010	12	$1,392,223	$55,700	CCF04	12	$1,160,000	$46,400	14-7	12	$1,392,223	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$324,900
69	CC	71217978	ACEVEDO JUAN									X									25-14	18	$1,838,978	$294,300	EPS010	18	$1,838,978	$73,600	CCF04	18	$1,838,978	$73,600	14-7	18	$1,838,978	6.960%	$128,000	18	$0	$0	Si	$569,500
70	CC	71141264	AGUDELO ALBEIRO									X									25-14	30	$1,607,141	$257,200	EPS010	30	$1,607,141	$64,300	CCF04	30	$1,607,141	$64,300	14-7	30	$1,607,141	6.960%	$111,900	30	$0	$0	Si	$497,700
71	CC	71673847	AGUDELO JAIR									X									25-14	18	$1,323,846	$211,900	EPS010	18	$1,323,846	$53,000	CCF04	18	$1,323,846	$53,000	14-7	18	$1,323,846	6.960%	$92,200	18	$0	$0	Si	$410,100

Planilla Resumen

72	CC	71673847	AGUDELO JAIR													X					25-14	12	$1,425,256	$228,100	EPS010	12	$1,425,256	$57,100	CCF04	12	$787,800	$31,600	14-7	12	$1,425,256	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$316,800
73	CC	98712131	AGUDELO JOHN													X					230201	6	$2,710,289	$460,900	EPS037	6	$2,710,289	$108,500	CCF04	6	$2,622,860	$105,000	14-7	6	$2,710,289	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$674,400
74	CC	98712131	AGUDELO JOHN																		230201	24	$10,491,440	$1,783,700	EPS037	24	$10,491,440	$419,700	CCF04	24	$10,491,440	$419,700	14-7	24	$10,491,440	6.960%	$730,300	24	$0	$0	Si	$3,353,400
75	CC	71053330	AGUIRRE HERNANDO													X					25-14	12	$866,459	$138,700	EPS010	12	$866,459	$34,700	CCF04	12	$789,120	$31,600	14-7	12	$866,459	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$205,000
76	CC	71053330	AGUIRRE HERNANDO									X									25-14	18	$1,280,176	$204,900	EPS010	18	$1,280,176	$51,300	CCF04	18	$1,280,176	$51,300	14-7	18	$1,280,176	6.960%	$89,200	18	$0	$0	Si	$396,700
77	CC	1128471190	ALVAREZ ANDRES									X									230301	18	$1,141,814	$182,700	EPS002	18	$1,141,814	$45,700	CCF04	18	$1,141,814	$45,700	14-7	18	$1,141,814	6.960%	$79,500	18	$0	$0	Si	$353,600
78	CC	1128471190	ALVAREZ ANDRES													X					230301	12	$1,165,920	$186,600	EPS002	12	$1,165,920	$46,700	CCF04	12	$649,440	$26,000	14-7	12	$1,165,920	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$259,300
79	CC	71364005	ALZATE LUIS													X					230201	12	$995,526	$159,300	EPS010	12	$995,526	$39,900	CCF04	12	$814,920	$32,600	14-7	12	$995,526	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$231,800
80	CC	71364005	ALZATE LUIS																		230201	18	$1,222,380	$195,600	EPS010	18	$1,222,380	$48,900	CCF04	18	$1,222,380	$48,900	14-7	18	$1,222,380	6.960%	$85,100	18	$0	$0	Si	$378,500
81	CC	71330851	AMAYA WILSON													X					230301	5	$289,618	$46,400	EPS010	5	$289,618	$11,600	CCF04	5	$238,333	$9,600	14-7	5	$289,618	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$67,600
82	CC	71330851	AMAYA WILSON							X		X									230301	25	$1,354,767	$216,800	EPS010	25	$1,354,767	$54,200	CCF04	25	$1,354,767	$54,200	14-7	25	$1,354,767	6.960%	$94,300	25	$0	$0	Si	$419,500
83	CC	16596905	ANGULO LUIS																		25-14	30	$7,699,600	$1,309,000	EPS010	30	$7,699,600	$308,000	CCF04	30	$7,699,600	$308,000	14-7	30	$7,699,600	6.960%	$535,900	30	$0	$0	Si	$2,460,900
84	CC	70662571	ARANGO ELKIN													X					25-14	6	$704,360	$112,700	EPS037	6	$704,360	$28,200	CCF04	6	$479,540	$19,200	14-7	6	$704,360	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$160,100
85	CC	70662571	ARANGO ELKIN									X									25-14	24	$2,159,233	$345,500	EPS037	24	$2,159,233	$86,400	CCF04	24	$2,159,233	$86,400	14-7	24	$2,159,233	6.960%	$150,300	24	$0	$0	Si	$668,600
86	CC	71020317	ARIAS ANGEL													X					231001	12	$865,727	$138,600	EPS002	12	$865,727	$34,700	CCF04	12	$837,800	$33,600	14-7	12	$865,727	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$206,900
87	CC	71020317	ARIAS ANGEL																		231001	18	$1,256,700	$201,100	EPS002	18	$1,256,700	$50,300	CCF04	18	$1,256,700	$50,300	14-7	18	$1,256,700	6.960%	$87,500	18	$0	$0	Si	$389,200
88	CC	17903868	ARIAS ANNSON													X					230201	12	$902,893	$144,500	EPS002	12	$902,893	$36,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$902,893	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$203,500
89	CC	17903868	ARIAS ANNSON							X		X									230201	18	$915,002	$146,500	EPS002	18	$915,002	$36,700	CCF04	18	$915,002	$36,700	14-7	18	$915,002	6.960%	$63,700	18	$0	$0	Si	$283,600
90	CC	70725497	ARIAS JOHN									X									25-14	30	$2,038,500	$326,200	EPS010	30	$2,038,500	$81,600	CCF04	30	$2,038,500	$81,600	14-7	30	$2,038,500	6.960%	$141,900	30	$0	$0	Si	$631,300
91	CC	98516921	ARIAS URIEL													X					25-14	7	$679,514	$108,800	EPS010	7	$679,514	$27,200	CCF04	7	$422,800	$17,000	14-7	7	$679,514	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$153,000
92	CC	98516921	ARIAS URIEL									X									25-14	23	$1,800,840	$288,200	EPS010	23	$1,800,840	$72,100	CCF04	23	$1,800,840	$72,100	14-7	23	$1,800,840	6.960%	$125,400	23	$0	$0	Si	$557,800
93	CC	71749036	ARROYAVE CARLOS													X					25-14	6	$542,027	$86,800	EPS010	6	$542,027	$21,700	CCF04	6	$355,740	$14,300	14-7	6	$542,027	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$122,800
94	CC	71749036	ARROYAVE CARLOS									X									25-14	24	$1,816,401	$290,700	EPS010	24	$1,816,401	$72,700	CCF04	24	$1,816,401	$72,700	14-7	24	$1,816,401	6.960%	$126,500	24	$0	$0	Si	$562,600
95	CC	79816114	AVELLANEDA SALOMON													X					25-14	5	$659,900	$105,600	EPS010	5	$659,900	$26,400	CCF04	5	$416,667	$16,700	14-7	5	$659,900	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$148,700
96	CC	79816114	AVELLANEDA SALOMON											X							25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS010	25	$1,186,250	$47,500	CCF04	25	$1,233,700	$0	14-7	25	$1,186,250	0.000%	$0	25	$0	$0	Si	$237,300
97	CC	8686253	AVILA CARMELO											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
98	CC	8686253	AVILA CARMELO													X					25-14	6	$498,026	$79,700	EPS010	6	$498,026	$20,000	CCF04	6	$481,960	$19,300	14-7	6	$498,026	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$119,000
99	CC	8686253	AVILA CARMELO									X									25-14	22	$1,767,187	$282,800	EPS010	22	$1,767,187	$70,700	CCF04	22	$1,767,187	$70,700	14-7	22	$1,767,187	6.960%	$123,000	22	$0	$0	Si	$547,200
100	CC	98467315	AYALA EVELIO													X					230301	12	$751,670	$120,300	EPS037	12	$751,670	$30,100	CCF04	12	$652,680	$26,200	14-7	12	$751,670	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$176,600
101	CC	98467315	AYALA EVELIO									X									230301	18	$1,058,831	$169,500	EPS037	18	$1,058,831	$42,400	CCF04	18	$1,058,831	$42,400	14-7	18	$1,058,831	6.960%	$73,700	18	$0	$0	Si	$328,000
102	CC	1101460881	BELLO ROMAN													X					230201	12	$717,483	$114,800	EPS037	12	$717,483	$28,700	CCF04	12	$694,920	$27,800	14-7	12	$717,483	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$171,300
103	CC	1101460881	BELLO ROMAN																		230201	18	$1,042,380	$166,800	EPS037	18	$1,042,380	$41,700	CCF04	18	$1,042,380	$41,700	14-7	18	$1,042,380	6.960%	$72,600	18	$0	$0	Si	$322,800
104	CC	1193156390	BENITEZ CRISTIAN									X									230201	30	$2,016,758	$322,700	EPS010	30	$2,016,758	$80,700	CCF04	30	$2,016,758	$80,700	14-7	30	$2,016,758	6.960%	$140,400	30	$0	$0	Si	$624,500
105	CC	44006112	BERRIO MAIDA												X						231001	30	$3,719,006	$595,100	EPS037	30	$3,719,006	$148,800	CCF04	30	$3,719,006	$148,800	14-7	30	$3,719,006	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$892,700
106	CC	71384581	BOTERO EDWIN													X					230301	6	$573,232	$91,800	EPS010	6	$573,232	$23,000	CCF04	6	$324,820	$13,000	14-7	6	$573,232	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$127,800
107	CC	71384581	BOTERO EDWIN									X									230301	24	$1,372,364	$219,600	EPS010	24	$1,372,364	$54,900	CCF04	24	$1,372,364	$54,900	14-7	24	$1,372,364	6.960%	$95,600	24	$0	$0	Si	$425,000
108	CC	1075209761	BUSTAMANTE NELSON									X									230301	30	$3,062,593	$490,100	EPS017	30	$3,062,593	$122,600	CCF04	30	$3,062,593	$122,600	14-7	30	$3,062,593	6.960%	$213,200	30	$0	$0	Si	$948,500
109	CC	71988959	CACERES HARLEY											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
110	CC	71988959	CACERES HARLEY													X					230301	12	$687,948	$110,100	EPS002	12	$687,948	$27,600	CCF04	12	$622,120	$24,900	14-7	12	$687,948	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$162,600
111	CC	71988959	CACERES HARLEY									X									230301	16	$829,494	$132,800	EPS002	16	$829,494	$33,200	CCF04	16	$829,494	$33,200	14-7	16	$829,494	6.960%	$57,800	16	$0	$0	Si	$257,000
112	CC	1002126984	CAICEDO FERNEY													X					230201	12	$923,067	$147,700	EPS037	12	$923,067	$37,000	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$923,067	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$207,500
113	CC	1002126984	CAICEDO FERNEY							X		X									230201	18	$1,004,399	$160,800	EPS037	18	$1,004,399	$40,200	CCF04	18	$1,004,399	$40,200	14-7	18	$1,004,399	6.960%	$70,000	18	$0	$0	Si	$311,200

Planilla Resumen

114	CC	1000914671	CALLE DANIEL		X					X											230301	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
115	CC	1000914671	CALLE DANIEL													X					230301	6	$309,428	$49,600	EPS040	6	$309,428	$12,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$309,428	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$73,400
116	CC	98495973	CALLEJAS ARNOLDO									X									25-14	30	$2,614,175	$418,300	EPS010	30	$2,614,175	$104,600	CCF04	30	$2,614,175	$104,600	14-7	30	$2,614,175	6.960%	$182,000	30	$0	$0	Si	$809,500
117	CC	1047996571	CANO JUAN													X					230201	12	$1,016,113	$162,600	EPS010	12	$1,016,113	$40,700	CCF04	12	$724,800	$29,000	14-7	12	$1,016,113	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$232,300
118	CC	1047996571	CANO JUAN									X									230201	18	$1,225,070	$196,100	EPS010	18	$1,225,070	$49,100	CCF04	18	$1,225,070	$49,100	14-7	18	$1,225,070	6.960%	$85,300	18	$0	$0	Si	$379,600
119	CC	98654257	CARDONA CARLOS									X									230201	30	$1,817,726	$290,900	EPS010	30	$1,817,726	$72,800	CCF04	30	$1,817,726	$72,800	14-7	30	$1,817,726	6.960%	$126,600	30	$0	$0	Si	$563,100
120	CC	8038715	CARO ORLEY									X									25-14	30	$3,369,998	$539,200	EPS010	30	$3,369,998	$134,800	CCF04	30	$3,369,998	$134,800	14-7	30	$3,369,998	6.960%	$234,600	30	$0	$0	Si	$1,043,400
121	CC	71631851	CHANCI GABRIEL									X									25-14	30	$3,287,414	$526,000	EPS010	30	$3,287,414	$131,500	CCF04	30	$3,287,414	$131,500	14-7	30	$3,287,414	6.960%	$228,900	30	$0	$0	Si	$1,017,900
122	CC	1035859628	CIRO YEISON													X					230301	6	$580,041	$92,900	EPS010	6	$580,041	$23,300	CCF04	6	$355,740	$14,300	14-7	6	$580,041	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$130,500
123	CC	1035859628	CIRO YEISON									X									230301	24	$1,718,765	$275,100	EPS010	24	$1,718,765	$68,800	CCF04	24	$1,718,765	$68,800	14-7	24	$1,718,765	6.960%	$119,700	24	$0	$0	Si	$532,400
124	CC	1235252530	CLEMENTE EMILO		X					X		X									231001	24	$1,458,755	$233,500	EPS002	24	$1,458,755	$58,400	CCF04	24	$1,458,755	$58,400	14-7	24	$1,458,755	6.960%	$101,600	24	$0	$0	Si	$451,900
125	CC	70322701	CORDOBA EDGAR									X									25-14	18	$1,253,597	$200,600	EPS010	18	$1,253,597	$50,200	CCF04	18	$1,253,597	$50,200	14-7	18	$1,253,597	6.960%	$87,300	18	$0	$0	Si	$388,300
126	CC	70322701	CORDOBA EDGAR													X					25-14	12	$1,279,618	$204,800	EPS010	12	$1,279,618	$51,200	CCF04	12	$711,480	$28,500	14-7	12	$1,279,618	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$284,500
127	CC	15510276	CORREA EDGAR									X									25-14	30	$1,902,182	$304,400	EPS010	30	$1,902,182	$76,100	CCF04	30	$1,902,182	$76,100	14-7	30	$1,902,182	6.960%	$132,400	30	$0	$0	Si	$589,000
128	CC	1037264998	CORREA HENRY									X									231001	30	$2,502,300	$400,400	EPS037	30	$2,502,300	$100,100	CCF04	30	$2,502,300	$100,100	14-7	30	$2,502,300	6.960%	$174,200	30	$0	$0	Si	$774,800
129	CC	1037776242	CORREA YEISON													X					230301	7	$367,245	$58,800	EPS040	7	$367,245	$14,700	CCF04	7	$332,150	$13,300	14-7	7	$367,245	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$86,800
130	CC	1037776242	CORREA YEISON		X					X		X									230301	9	$585,846	$93,800	EPS040	9	$585,846	$23,500	CCF04	9	$633,513	$25,400	14-7	9	$585,846	6.960%	$40,800	9	$0	$0	Si	$183,500
131	CC	15286180	DAVID JESUS													X					25-14	12	$712,109	$114,000	EPS010	12	$712,109	$28,500	CCF04	12	$649,440	$26,000	14-7	12	$712,109	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$168,500
132	CC	15286180	DAVID JESUS									X									25-14	18	$1,053,575	$168,600	EPS010	18	$1,053,575	$42,200	CCF04	18	$1,053,575	$42,200	14-7	18	$1,053,575	6.960%	$73,400	18	$0	$0	Si	$326,400
133	CC	15814933	DELGADO DAMIR													X					25-14	6	$411,826	$65,900	EPS002	6	$411,826	$16,500	CCF04	6	$361,380	$14,500	14-7	6	$411,826	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$96,900
134	CC	15814933	DELGADO DAMIR																		25-14	24	$1,445,520	$231,300	EPS002	24	$1,445,520	$57,900	CCF04	24	$1,445,520	$57,900	14-7	24	$1,445,520	6.960%	$100,700	24	$0	$0	Si	$447,800
135	CC	1100548247	DIAZ BREYNER													X					230201	6	$335,980	$53,800	EPS010	6	$335,980	$13,500	CCF04	6	$311,541	$12,500	14-7	6	$335,980	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$79,800
136	CC	1100548247	DIAZ BREYNER									X									230201	24	$1,246,165	$199,400	EPS010	24	$1,246,165	$49,900	CCF04	24	$1,246,165	$49,900	14-7	24	$1,246,165	6.960%	$86,800	24	$0	$0	Si	$386,000
137	CC	1038338392	DUARTE CRISTIAN									X									230301	30	$3,153,632	$504,600	EPS010	30	$3,153,632	$126,200	CCF04	30	$3,153,632	$126,200	14-7	30	$3,153,632	6.960%	$219,500	30	$0	$0	Si	$976,500
138	CC	3551580	DUQUE NORLEY													X					230301	5	$418,174	$67,000	EPS010	5	$418,174	$16,800	CCF04	5	$336,000	$13,500	14-7	5	$418,174	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$97,300
139	CC	3551580	DUQUE NORLEY									X									230301	25	$1,855,304	$296,900	EPS010	25	$1,855,304	$74,300	CCF04	25	$1,855,304	$74,300	14-7	25	$1,855,304	6.960%	$129,200	25	$0	$0	Si	$574,700
140	CC	71363586	DURANGO NEVARDO													X					25-14	12	$916,608	$146,700	EPS010	12	$916,608	$36,700	CCF04	12	$887,040	$35,500	14-7	12	$916,608	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$218,900
141	CC	71363586	DURANGO NEVARDO																		25-14	18	$1,330,560	$212,900	EPS010	18	$1,330,560	$53,300	CCF04	18	$1,330,560	$53,300	14-7	18	$1,330,560	6.960%	$92,700	18	$0	$0	Si	$412,200
142	CC	98575077	ECHAVARRIA LUIS									X									25-14	30	$2,229,789	$356,800	EPS010	30	$2,229,789	$89,200	CCF04	30	$2,229,789	$89,200	14-7	30	$2,229,789	6.960%	$155,200	30	$0	$0	Si	$690,400
143	CC	71225651	ECHEVERRI RUBEN													X					230201	12	$1,160,259	$185,700	EPS010	12	$1,160,259	$46,500	CCF04	12	$711,480	$28,500	14-7	12	$1,160,259	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$260,700
144	CC	71225651	ECHEVERRI RUBEN									X									230201	18	$1,248,764	$199,900	EPS010	18	$1,248,764	$50,000	CCF04	18	$1,248,764	$50,000	14-7	18	$1,248,764	6.960%	$87,000	18	$0	$0	Si	$386,900
145	CC	8064546	ESTRADA DIEGO													X					230201	6	$436,228	$69,800	EPS037	6	$436,228	$17,500	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$436,228	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$98,700
146	CC	8064546	ESTRADA DIEGO							X		X									230201	24	$1,560,804	$249,800	EPS037	24	$1,560,804	$62,500	CCF04	24	$1,560,804	$62,500	14-7	24	$1,560,804	6.960%	$108,700	24	$0	$0	Si	$483,500
147	CC	1046932863	FLOREZ JUAN	X																	25-14	15	$715,000	$114,400	EPS037	15	$715,000	$28,600	CCF04	15	$715,000	$28,600	14-7	15	$715,000	6.960%	$49,800	15	$0	$0	Si	$221,400
148	CC	1036948674	FORONDA SEBASTIAN													X					230201	6	$547,460	$87,600	EPS037	6	$547,460	$21,900	CCF04	6	$355,740	$14,300	14-7	6	$547,460	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$123,800
149	CC	1036948674	FORONDA SEBASTIAN									X									230201	24	$1,551,336	$248,300	EPS037	24	$1,551,336	$62,100	CCF04	24	$1,551,336	$62,100	14-7	24	$1,551,336	6.960%	$108,000	24	$0	$0	Si	$480,500
150	CC	71221980	FRANCO CESAR									X									230201	30	$3,876,284	$620,300	EPS010	30	$3,876,284	$155,100	CCF04	30	$3,876,284	$155,100	14-7	30	$3,876,284	6.960%	$269,800	30	$0	$0	Si	$1,200,300
151	CC	1036668275	FRANCO WILSON													X					230301	12	$784,868	$125,600	EPS010	12	$784,868	$31,400	CCF04	12	$711,480	$28,500	14-7	12	$784,868	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$185,500
152	CC	1036668275	FRANCO WILSON									X									230301	18	$1,212,802	$194,100	EPS010	18	$1,212,802	$48,600	CCF04	18	$1,212,802	$48,600	14-7	18	$1,212,802	6.960%	$84,500	18	$0	$0	Si	$375,800
153	CC	9923360	GAÑAN JOSE													X					231001	12	$649,503	$104,000	EPS002	12	$649,503	$26,000	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$649,503	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$152,800
154	CC	9923360	GAÑAN JOSE							X		X									231001	18	$961,633	$153,900	EPS002	18	$961,633	$38,500	CCF04	18	$961,633	$38,500	14-7	18	$961,633	6.960%	$67,000	18	$0	$0	Si	$297,900
155	CC	98481409	GARCIA ARMANDO													X					25-14	12	$1,067,108	$170,800	EPS010	12	$1,067,108	$42,700	CCF04	12	$594,400	$23,800	14-7	12	$1,067,108	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$237,300

156	CC	98481409	GARCIA ARMANDO									X									25-14	18	$1,214,643	$194,400	EPS010	18	$1,214,643	$48,600	CCF04	18	$1,214,643	$48,600	14-7	18	$1,214,643	6.960%	$84,600	18	$0	$0	Si	$376,200
157	CC	32295460	GARZON MERLLY													X					230201	3	$1,398,050	$237,700	EPS010	3	$1,398,050	$56,000	CCF04	3	$1,398,050	$56,000	14-7	3	$1,398,050	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$349,700
158	CC	32295460	GARZON MERLLY																		230201	27	$12,582,450	$2,139,200	EPS010	27	$12,582,450	$503,300	CCF04	27	$12,582,450	$503,300	14-7	27	$12,582,450	6.960%	$875,800	27	$0	$0	Si	$4,021,600
159	CC	1007311472	GIRALDO ALEJANDRA													X					25-14	12	$701,559	$112,300	EPS037	12	$701,559	$28,100	CCF04	12	$672,000	$26,900	14-7	12	$701,559	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$167,300
160	CC	1007311472	GIRALDO ALEJANDRA							X											25-14	18	$1,418,000	$226,900	EPS037	18	$1,418,000	$56,800	CCF04	18	$1,418,000	$56,800	14-7	18	$1,418,000	6.960%	$98,700	18	$0	$0	Si	$439,200
161	CC	15513485	GIRALDO EDWIN									X									25-14	30	$2,236,601	$357,900	EPS010	30	$2,236,601	$89,500	CCF04	30	$2,236,601	$89,500	14-7	30	$2,236,601	6.960%	$155,700	30	$0	$0	Si	$692,600
162	CC	1035880204	GOMEZ CARLOS									X									230201	18	$1,217,033	$194,800	EPS010	18	$1,217,033	$48,700	CCF04	18	$1,217,033	$48,700	14-7	18	$1,217,033	6.960%	$84,800	18	$0	$0	Si	$377,000
163	CC	1035880204	GOMEZ CARLOS													X					230201	12	$1,254,220	$200,700	EPS010	12	$1,254,220	$50,200	CCF04	12	$640,360	$25,700	14-7	12	$1,254,220	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$276,600
164	CC	71644328	GOMEZ CONRADO		P											X					25-14	6	$1,256,290	$201,100	EPS010	6	$1,256,290	$50,300	CCF04	6	$602,720	$24,200	14-7	6	$1,256,290	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$275,600
165	CC	71644328	GOMEZ CONRADO		P							X									25-14	24	$3,426,332	$548,300	EPS010	24	$3,426,332	$137,100	CCF04	24	$3,426,332	$137,100	14-7	24	$3,426,332	6.960%	$238,500	24	$0	$0	Si	$1,061,000
166	CC	15508993	GOMEZ JOSE																X		25-14	30	$1,521,074	$243,400	EPS037	30	$1,521,074	$60,900	CCF04	30	$1,521,074	$0	14-7	30	$1,521,074	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$304,300
167	CC	71781256	GUERRA ANDERSON									X									25-14	30	$3,994,666	$639,200	EPS010	30	$3,994,666	$159,800	CCF04	30	$3,994,666	$159,800	14-7	30	$3,994,666	6.960%	$278,100	30	$0	$0	Si	$1,236,900
168	CC	73102718	GUERRERO MARIO									X									230301	30	$2,251,565	$360,300	EPS010	30	$2,251,565	$90,100	CCF04	30	$2,251,565	$90,100	14-7	30	$2,251,565	6.960%	$156,800	30	$0	$0	Si	$697,300
169	CC	1036638725	HERNANDEZ FREDY													X					25-14	6	$797,176	$127,600	EPS005	6	$797,176	$31,900	CCF04	6	$771,460	$30,900	14-7	6	$797,176	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$190,400
170	CC	1036638725	HERNANDEZ FREDY																		25-14	24	$3,085,840	$493,800	EPS005	24	$3,085,840	$123,500	CCF04	24	$3,085,840	$123,500	14-7	24	$3,085,840	6.960%	$214,800	24	$0	$0	Si	$955,600
171	CC	71391269	HERNANDEZ JUAN									X									25-14	30	$2,233,488	$357,400	EPS010	30	$2,233,488	$89,400	CCF04	30	$2,233,488	$89,400	14-7	30	$2,233,488	6.960%	$155,500	30	$0	$0	Si	$691,700
172	CC	1033367768	HERRERA ANDRES													X					25-14	5	$290,805	$46,600	EPS010	5	$290,805	$11,700	CCF04	5	$238,333	$9,600	14-7	5	$290,805	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$67,900
173	CC	1033367768	HERRERA ANDRES							X		X									25-14	25	$1,393,520	$223,000	EPS010	25	$1,393,520	$55,800	CCF04	25	$1,393,520	$55,800	14-7	25	$1,393,520	6.960%	$97,000	25	$0	$0	Si	$431,600
174	CC	70301388	HINCAPIE JOSE									X									231001	30	$1,724,967	$276,000	EPS010	30	$1,724,967	$69,000	CCF04	30	$1,724,967	$69,000	14-7	30	$1,724,967	6.960%	$120,100	30	$0	$0	Si	$534,100
175	CC	1032098333	HOYOS CRISTIAN													X					230301	12	$614,138	$98,300	EPS037	12	$614,138	$24,600	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$614,138	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$145,700
176	CC	1032098333	HOYOS CRISTIAN							X		X									230301	18	$930,546	$148,900	EPS037	18	$930,546	$37,300	CCF04	18	$930,546	$37,300	14-7	18	$930,546	6.960%	$64,800	18	$0	$0	Si	$288,300
177	CC	1148191777	HURTADO DARWIN													X					230201	12	$569,400	$91,200	EPS010	12	$569,400	$22,800	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$136,800
178	CC	1148191777	HURTADO DARWIN							X		X									230201	18	$860,600	$137,700	EPS010	18	$860,600	$34,500	CCF04	18	$860,600	$34,500	14-7	18	$860,600	6.960%	$59,900	18	$0	$0	Si	$266,600
179	CC	71173106	ISAZA ERIEN									X									25-14	30	$2,105,844	$337,000	EPS010	30	$2,105,844	$84,300	CCF04	30	$2,105,844	$84,300	14-7	30	$2,105,844	6.960%	$146,600	30	$0	$0	Si	$652,200
180	CC	71212769	ISAZA MANUEL													X					25-14	12	$1,066,809	$170,700	EPS010	12	$1,066,809	$42,700	CCF04	12	$892,240	$35,700	14-7	12	$1,066,809	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$249,100
181	CC	71212769	ISAZA MANUEL									X									25-14	18	$1,495,957	$239,400	EPS010	18	$1,495,957	$59,900	CCF04	18	$1,495,957	$59,900	14-7	18	$1,495,957	6.960%	$104,200	18	$0	$0	Si	$463,400
182	CC	1066726272	JARABA DEVYS		X							X									25-14	4	$413,156	$66,200	EPS010	4	$413,156	$16,600	CCF04	4	$413,156	$16,600	14-7	4	$413,156	6.960%	$28,800	4	$0	$0	Si	$128,200
183	CC	1066726272	JARABA DEVYS													X					25-14	12	$1,021,673	$163,500	EPS010	12	$1,021,673	$40,900	CCF04	12	$762,240	$30,500	14-7	12	$1,021,673	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$234,900
184	CC	70570092	JARAMILLO ARTURO													X					25-14	6	$544,183	$87,100	EPS010	6	$544,183	$21,800	CCF04	6	$479,540	$19,200	14-7	6	$544,183	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$128,100
185	CC	70570092	JARAMILLO ARTURO									X									25-14	24	$2,025,796	$324,200	EPS010	24	$2,025,796	$81,100	CCF04	24	$2,025,796	$81,100	14-7	24	$2,025,796	6.960%	$141,000	24	$0	$0	Si	$627,400
186	CC	98714304	JARAMILLO JHONATANN													X					230201	12	$604,504	$96,800	EPS002	12	$604,504	$24,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$604,504	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$143,800
187	CC	98714304	JARAMILLO JHONATANN							X		X									230201	18	$860,600	$137,700	EPS002	18	$860,600	$34,500	CCF04	18	$860,600	$34,500	14-7	18	$860,600	6.960%	$59,900	18	$0	$0	Si	$266,600
188	CC	1017168947	JIMENEZ JUAN													X					25-14	12	$1,314,712	$210,400	EPS002	12	$1,314,712	$52,600	CCF04	12	$732,320	$29,300	14-7	12	$1,314,712	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$292,300
189	CC	1017168947	JIMENEZ JUAN									X									25-14	18	$1,327,330	$212,400	EPS002	18	$1,327,330	$53,100	CCF04	18	$1,327,330	$53,100	14-7	18	$1,327,330	6.960%	$92,400	18	$0	$0	Si	$411,000
190	CC	70322706	LONDOÑO GUILLERMO													X					25-14	12	$1,440,461	$230,500	EPS010	12	$1,440,461	$57,700	CCF04	12	$763,520	$30,600	14-7	12	$1,440,461	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$318,800
191	CC	70322706	LONDOÑO GUILLERMO									X									25-14	18	$1,522,890	$243,700	EPS010	18	$1,522,890	$61,000	CCF04	18	$1,522,890	$61,000	14-7	18	$1,522,890	6.960%	$106,000	18	$0	$0	Si	$471,700
192	CC	98467856	LONDOÑO JAVIER													X					25-14	6	$934,064	$149,500	EPS010	6	$934,064	$37,400	CCF04	6	$500,460	$20,100	14-7	6	$934,064	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$207,000
193	CC	98467856	LONDOÑO JAVIER									X									25-14	24	$2,590,152	$414,500	EPS010	24	$2,590,152	$103,700	CCF04	24	$2,590,152	$103,700	14-7	24	$2,590,152	6.960%	$180,300	24	$0	$0	Si	$802,200
194	CC	3483416	LONDOÑO JUAN									X									25-14	18	$1,814,167	$290,300	EPS010	18	$1,814,167	$72,600	CCF04	18	$1,814,167	$72,600	14-7	18	$1,814,167	6.960%	$126,300	18	$0	$0	Si	$561,800
195	CC	3483416	LONDOÑO JUAN													X					25-14	12	$1,855,126	$296,900	EPS010	12	$1,855,126	$74,300	CCF04	12	$1,000,920	$40,100	14-7	12	$1,855,126	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$411,300
196	CC	17973409	LOPEZ JAVIER											X							25-14	3	$387,536	$62,100	EPS010	3	$387,536	$15,600	CCF04	3	$387,536	$0	14-7	3	$387,536	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$77,700
197	CC	17973409	LOPEZ JAVIER											X							25-14	5	$645,893	$103,400	EPS010	5	$645,893	$25,900	CCF04	5	$645,893	$0	14-7	5	$645,893	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$129,300
198	CC	17973409	LOPEZ JAVIER									X									25-14	22	$3,048,342	$487,800	EPS010	22	$3,048,342	$122,000	CCF04	22	$3,048,342	$122,000	14-7	22	$3,048,342	6.960%	$212,200	22	$0	$0	Si	$944,000
199	CC	1037655247	LOPEZ DE MESA CAROLINA													X					25-14	6	$706,594	$113,100	EPS010	6	$706,594	$28,300	CCF04	6	$683,800	$27,400	14-7	6	$706,594	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$168,800
200	CC	1037655247	LOPEZ DE MESA CAROLINA																		25-14	24	$2,735,200	$437,700	EPS010	24	$2,735,200	$109,500	CCF04	24	$2,735,200	$109,500	14-7	24	$2,735,200	6.960%	$190,400	24	$0	$0	Si	$847,100
201	CC	15443732	LUCAS SILFREDO													X					25-14	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$136,800

202	CC	15443732	LUCAS SILFREDO							X		X									25-14	18	$860,600	$137,700	EPS037	18	$860,600	$34,500	CCF04	18	$860,600	$34,500	14-7	18	$860,600	6.960%	$59,900	18	$0	$0	Si	$266,600
203	CC	71388046	LUJAN ANDRES							X		X									230201	30	$1,632,065	$261,200	EPS010	30	$1,632,065	$65,300	CCF04	30	$1,632,065	$65,300	14-7	30	$1,632,065	6.960%	$113,600	30	$0	$0	Si	$505,400
204	CC	70325823	MADRID GABRIEL							X		X									25-14	30	$1,518,969	$243,100	EPS010	30	$1,518,969	$60,800	CCF04	30	$1,518,969	$60,800	14-7	30	$1,518,969	6.960%	$105,800	30	$0	$0	Si	$470,500
205	CC	71226406	MARIN GONZALO													X					230201	12	$927,891	$148,500	EPS010	12	$927,891	$37,200	CCF04	12	$724,800	$29,000	14-7	12	$927,891	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$214,700
206	CC	71226406	MARIN GONZALO									X									230201	18	$1,290,263	$206,500	EPS010	18	$1,290,263	$51,700	CCF04	18	$1,290,263	$51,700	14-7	18	$1,290,263	6.960%	$89,900	18	$0	$0	Si	$399,800
207	CC	15505038	MARIN LUIS													X					25-14	12	$1,368,787	$219,100	EPS037	12	$1,368,787	$54,800	CCF04	12	$1,205,440	$48,300	14-7	12	$1,368,787	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$322,200
208	CC	15505038	MARIN LUIS									X									25-14	18	$2,191,084	$350,600	EPS037	18	$2,191,084	$87,700	CCF04	18	$2,191,084	$87,700	14-7	18	$2,191,084	6.960%	$152,500	18	$0	$0	Si	$678,500
209	CC	1193552848	MARTINEZ ARMANDO													X					230301	12	$941,009	$150,600	ESSC24	12	$941,009	$37,700	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$941,009	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$211,100
210	CC	1193552848	MARTINEZ ARMANDO							X		X									230301	18	$1,038,785	$166,300	ESSC24	18	$1,038,785	$41,600	CCF04	18	$1,038,785	$41,600	14-7	18	$1,038,785	6.960%	$72,300	18	$0	$0	Si	$321,800
211	CC	1037671058	MARTINEZ CAMILA																		230201	30	$3,139,300	$502,300	EPS010	30	$3,139,300	$125,600	CCF04	30	$3,139,300	$125,600	14-7	30	$3,139,300	6.960%	$218,500	30	$0	$0	Si	$972,000
212	CC	1002298022	MARTINEZ JORGE													X					25-14	12	$1,680,611	$268,900	EPS010	12	$1,680,611	$67,300	CCF04	12	$1,232,800	$49,400	14-7	12	$1,680,611	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$385,600
213	CC	1002298022	MARTINEZ JORGE									X									25-14	18	$1,863,270	$298,200	EPS010	18	$1,863,270	$74,600	CCF04	18	$1,863,270	$74,600	14-7	18	$1,863,270	6.960%	$129,700	18	$0	$0	Si	$577,100
214	CC	1039596895	MARTINEZ JUAN													X					25-14	12	$1,249,926	$200,000	EPS037	12	$1,249,926	$50,000	CCF04	12	$940,280	$37,700	14-7	12	$1,249,926	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$287,700
215	CC	1039596895	MARTINEZ JUAN									X									25-14	18	$1,589,277	$254,300	EPS037	18	$1,589,277	$63,600	CCF04	18	$1,589,277	$63,600	14-7	18	$1,589,277	6.960%	$110,700	18	$0	$0	Si	$492,200
216	CC	1038417204	MEDINA LUISA													X					230301	5	$861,112	$137,800	EPS010	5	$861,112	$34,500	CCF04	5	$833,333	$33,400	14-7	5	$861,112	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$205,700
217	CC	1038417204	MEDINA LUISA									X									230301	10	$1,666,667	$266,700	EPS010	10	$1,666,667	$66,700	CCF04	10	$1,666,667	$66,700	14-7	10	$1,666,667	6.960%	$116,100	10	$0	$0	Si	$516,200
218	CC	1038417204	MEDINA LUISA													X					230301	15	$2,583,334	$413,400	EPS010	15	$2,583,334	$103,400	CCF04	15	$2,500,000	$100,000	14-7	15	$2,583,334	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$616,800
219	CC	98669418	MEDINA RUBEN																		230201	30	$18,375,000	$3,123,800	EPS010	30	$18,375,000	$2,296,900	CCF04	30	$18,375,000	$735,000	14-7	30	$18,375,000	6.960%	$1,278,900	30	$18,375,000	$918,800	No	$8,353,400
220	CC	15683929	MEJIA JAIRO									X									230301	30	$2,089,500	$334,400	EPS002	30	$2,089,500	$83,600	CCF04	30	$2,089,500	$83,600	14-7	30	$2,089,500	6.960%	$145,500	30	$0	$0	Si	$647,100
221	CC	71684248	MEJIA NELSON											X							25-14	4	$189,800	$30,400	EPS010	4	$189,800	$7,600	CCF04	4	$189,800	$0	14-7	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$38,000
222	CC	71684248	MEJIA NELSON																		25-14	26	$1,351,220	$216,200	EPS010	26	$1,351,220	$54,100	CCF04	26	$1,351,220	$54,100	14-7	26	$1,351,220	6.960%	$94,100	26	$0	$0	Si	$418,500
223	CC	15507260	MESA BAYRON									X									25-14	18	$1,214,156	$194,300	EPS037	18	$1,214,156	$48,600	CCF04	18	$1,214,156	$48,600	14-7	18	$1,214,156	6.960%	$84,600	18	$0	$0	Si	$376,100
224	CC	15507260	MESA BAYRON													X					25-14	12	$1,249,588	$200,000	EPS037	12	$1,249,588	$50,000	CCF04	12	$711,480	$28,500	14-7	12	$1,249,588	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$278,500
225	CC	1020415994	MESA EDUARD									X									230201	18	$1,588,298	$254,200	EPS010	18	$1,588,298	$63,600	CCF04	18	$1,588,298	$63,600	14-7	18	$1,588,298	6.960%	$110,600	18	$0	$0	Si	$492,000
226	CC	1020415994	MESA EDUARD													X					230201	12	$1,719,275	$275,100	EPS010	12	$1,719,275	$68,800	CCF04	12	$970,920	$38,900	14-7	12	$1,719,275	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$382,800
227	CC	98715720	MESA JONATHAN													X					230201	12	$1,107,920	$177,300	EPS010	12	$1,107,920	$44,400	CCF04	12	$711,480	$28,500	14-7	12	$1,107,920	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$250,200
228	CC	98715720	MESA JONATHAN									X									230201	18	$1,347,945	$215,700	EPS010	18	$1,347,945	$54,000	CCF04	18	$1,347,945	$54,000	14-7	18	$1,347,945	6.960%	$93,900	18	$0	$0	Si	$417,600
229	CC	71536325	MESA JUAN									X									230301	30	$2,018,824	$323,100	EPS037	30	$2,018,824	$80,800	CCF04	30	$2,018,824	$80,800	14-7	30	$2,018,824	6.960%	$140,600	30	$0	$0	Si	$625,300
230	CC	72347599	MESSINO ENEXIMO													X					231001	12	$831,676	$133,100	EPS002	12	$831,676	$33,300	CCF04	12	$741,160	$29,700	14-7	12	$831,676	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$196,100
231	CC	72347599	MESSINO ENEXIMO									X									231001	18	$1,111,740	$177,900	EPS002	18	$1,111,740	$44,500	CCF04	18	$1,111,740	$44,500	14-7	18	$1,111,740	6.960%	$77,400	18	$0	$0	Si	$344,300
232	CC	1045523675	MESTRA DUVAN													X					230301	6	$730,209	$116,900	EPS010	6	$730,209	$29,300	CCF04	6	$460,000	$18,400	14-7	6	$730,209	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$164,600
233	CC	1045523675	MESTRA DUVAN									X									230301	24	$2,158,500	$345,400	EPS010	24	$2,158,500	$86,400	CCF04	24	$2,158,500	$86,400	14-7	24	$2,158,500	6.960%	$150,300	24	$0	$0	Si	$668,500
234	CC	71397397	MOLINA JORGE											X							230201	1	$60,251	$9,700	EPS010	1	$60,251	$2,500	CCF04	1	$60,251	$0	14-7	1	$60,251	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,200
235	CC	71397397	MOLINA JORGE									X									230201	29	$1,829,177	$292,700	EPS010	29	$1,829,177	$73,200	CCF04	29	$1,829,177	$73,200	14-7	29	$1,829,177	6.960%	$127,400	29	$0	$0	Si	$566,500
236	CC	70421026	MONSALVE LUIS													X					231001	12	$941,009	$150,600	EPS010	12	$941,009	$37,700	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$941,009	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$211,100
237	CC	70421026	MONSALVE LUIS							X		X									231001	18	$1,038,785	$166,300	EPS010	18	$1,038,785	$41,600	CCF04	18	$1,038,785	$41,600	14-7	18	$1,038,785	6.960%	$72,300	18	$0	$0	Si	$321,800
238	CC	1214718905	MONSALVE NORALDO													X					230301	5	$256,383	$41,100	EPS002	5	$256,383	$10,300	CCF04	5	$238,333	$9,600	14-7	5	$256,383	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$61,000
239	CC	1214718905	MONSALVE NORALDO							X		X									230301	25	$1,385,713	$221,800	EPS002	25	$1,385,713	$55,500	CCF04	25	$1,385,713	$55,500	14-7	25	$1,385,713	6.960%	$96,500	25	$0	$0	Si	$429,300
240	CC	15483978	MONTOYA ALBEIRO													X					25-14	6	$780,990	$125,000	EPS010	6	$780,990	$31,300	CCF04	6	$401,480	$16,100	14-7	6	$780,990	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$172,400
241	CC	15483978	MONTOYA ALBEIRO									X									25-14	24	$2,407,789	$385,300	EPS010	24	$2,407,789	$96,400	CCF04	24	$2,407,789	$96,400	14-7	24	$2,407,789	6.960%	$167,600	24	$0	$0	Si	$745,700
242	CC	11686122	MOSQUERA WILTON									X									230301	30	$1,623,293	$259,800	EPS002	30	$1,623,293	$65,000	CCF04	30	$1,623,293	$65,000	14-7	30	$1,623,293	6.960%	$113,000	30	$0	$0	Si	$502,800
243	CC	70164488	NARANJO EUCARIO									X									25-14	30	$1,685,332	$269,700	EPS037	30	$1,685,332	$67,500	CCF04	30	$1,685,332	$67,500	14-7	30	$1,685,332	6.960%	$117,300	30	$0	$0	Si	$522,000
244	CC	1040490102	NOVOA YULIS													X					230201	1	$102,740	$16,500	EPS010	1	$102,740	$4,200	CCF04	1	$100,000	$4,000	14-7	1	$102,740	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,700

245	CC	1040490102	NOVOA YULIS													X					230201	13	$1,335,609	$213,700	EPS010	13	$1,335,609	$53,500	CCF04	13	$1,300,000	$52,000	14-7	13	$1,335,609	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$319,200
246	CC	1040490102	NOVOA YULIS																		230201	16	$1,600,000	$256,000	EPS010	16	$1,600,000	$64,000	CCF04	16	$1,600,000	$64,000	14-7	16	$1,600,000	6.960%	$111,400	16	$0	$0	Si	$495,400
247	CC	78760318	ORTEGA MARIO									X									25-14	30	$2,439,652	$390,400	EPS010	30	$2,439,652	$97,600	CCF04	30	$2,439,652	$97,600	14-7	30	$2,439,652	6.960%	$169,800	30	$0	$0	Si	$755,400
248	CC	1021805022	ORTIZ CARLOS													X					230301	6	$409,705	$65,600	EPS040	6	$409,705	$16,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$409,705	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$93,400
249	CC	1021805022	ORTIZ CARLOS							X		X									230301	24	$1,425,105	$228,100	EPS040	24	$1,425,105	$57,100	CCF04	24	$1,425,105	$57,100	14-7	24	$1,425,105	6.960%	$99,200	24	$0	$0	Si	$441,500
250	CC	71450801	OSORIO GUILLERMO													X					25-14	6	$605,301	$96,900	EPS010	6	$605,301	$24,300	CCF04	6	$455,740	$18,300	14-7	6	$605,301	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$139,500
251	CC	71450801	OSORIO GUILLERMO									X									25-14	24	$2,002,531	$320,500	EPS010	24	$2,002,531	$80,200	CCF04	24	$2,002,531	$80,200	14-7	24	$2,002,531	6.960%	$139,400	24	$0	$0	Si	$620,300
252	CC	71384086	OSORIO JHON													X					231001	6	$868,001	$138,900	EPS010	6	$868,001	$34,800	CCF04	6	$840,000	$33,600	14-7	6	$868,001	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$207,300
253	CC	71384086	OSORIO JHON																		231001	24	$3,360,000	$537,600	EPS010	24	$3,360,000	$134,400	CCF04	24	$3,360,000	$134,400	14-7	24	$3,360,000	6.960%	$233,900	24	$0	$0	Si	$1,040,300
254	CC	1039400261	OSPINA SEBASTIAN									X									230201	30	$1,973,842	$315,900	EPS010	30	$1,973,842	$79,000	CCF04	30	$1,973,842	$79,000	14-7	30	$1,973,842	6.960%	$137,400	30	$0	$0	Si	$611,300
255	CC	1104420553	OVIEDO FERNEY													X					230301	12	$1,314,712	$210,400	EPS002	12	$1,314,712	$52,600	CCF04	12	$732,320	$29,300	14-7	12	$1,314,712	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$292,300
256	CC	1104420553	OVIEDO FERNEY									X									230301	18	$1,327,330	$212,400	EPS002	18	$1,327,330	$53,100	CCF04	18	$1,327,330	$53,100	14-7	18	$1,327,330	6.960%	$92,400	18	$0	$0	Si	$411,000
257	CC	98589763	PALACIO JUAN									X									25-14	30	$1,844,515	$295,200	EPS010	30	$1,844,515	$73,800	CCF04	30	$1,844,515	$73,800	14-7	30	$1,844,515	6.960%	$128,400	30	$0	$0	Si	$571,200
258	CC	82385070	PALACIOS GUSTAVO													X					230301	5	$431,833	$69,100	EPS037	5	$431,833	$17,300	CCF04	5	$336,683	$13,500	14-7	5	$431,833	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$99,900
259	CC	82385070	PALACIOS GUSTAVO													L					230301	7	$604,567	$96,800	EPS037	7	$604,567	$24,200	CCF04	7	$604,567	$24,200	14-7	7	$604,567	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$145,200
260	CC	82385070	PALACIOS GUSTAVO									X									230301	18	$1,475,552	$236,100	EPS037	18	$1,475,552	$59,100	CCF04	18	$1,475,552	$59,100	14-7	18	$1,475,552	6.960%	$102,700	18	$0	$0	Si	$457,000
261	CC	15459630	PAREJA JUAN													X					25-14	6	$512,094	$82,000	EPS037	6	$512,094	$20,500	CCF04	6	$362,400	$14,500	14-7	6	$512,094	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$117,000
262	CC	15459630	PAREJA JUAN									X									25-14	24	$1,870,103	$299,300	EPS037	24	$1,870,103	$74,900	CCF04	24	$1,870,103	$74,900	14-7	24	$1,870,103	6.960%	$130,200	24	$0	$0	Si	$579,300
263	CC	1037524090	PARRA DEYSY													X					25-14	12	$941,009	$150,600	EPS010	12	$941,009	$37,700	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$941,009	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$211,100
264	CC	1037524090	PARRA DEYSY							X		X									25-14	18	$1,038,785	$166,300	EPS010	18	$1,038,785	$41,600	CCF04	18	$1,038,785	$41,600	14-7	18	$1,038,785	6.960%	$72,300	18	$0	$0	Si	$321,800
265	CC	1073982372	PAYARES OVIER													X					230301	12	$918,481	$147,000	EPS010	12	$918,481	$36,800	CCF04	12	$832,000	$33,300	14-7	12	$918,481	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$217,100
266	CC	1073982372	PAYARES OVIER																		230301	18	$1,248,000	$199,700	EPS010	18	$1,248,000	$50,000	CCF04	18	$1,248,000	$50,000	14-7	18	$1,248,000	6.960%	$86,900	18	$0	$0	Si	$386,600
267	CC	98451056	PEREZ CARLOS													X					25-14	7	$665,941	$106,600	EPS010	7	$665,941	$26,700	CCF04	7	$460,997	$18,500	14-7	7	$665,941	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$151,800
268	CC	98451056	PEREZ CARLOS									X									25-14	23	$2,070,907	$331,400	EPS010	23	$2,070,907	$82,900	CCF04	23	$2,070,907	$82,900	14-7	23	$2,070,907	6.960%	$144,200	23	$0	$0	Si	$641,400
269	CC	15530323	PEREZ OSCAR													X					25-14	12	$1,515,234	$242,500	EPS010	12	$1,515,234	$60,700	CCF04	12	$840,200	$33,700	14-7	12	$1,515,234	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$336,900
270	CC	15530323	PEREZ OSCAR									X									25-14	18	$1,570,808	$251,400	EPS010	18	$1,570,808	$62,900	CCF04	18	$1,570,808	$62,900	14-7	18	$1,570,808	6.960%	$109,400	18	$0	$0	Si	$486,600
271	CC	1046666518	PINO JOSE	X																	230201	15	$715,000	$114,400	EPS037	15	$715,000	$28,600	CCF04	15	$715,000	$28,600	14-7	15	$715,000	6.960%	$49,800	15	$0	$0	Si	$221,400
272	CC	15286146	POSSO LUIS													X					230301	12	$815,424	$130,500	EPS010	12	$815,424	$32,700	CCF04	12	$789,120	$31,600	14-7	12	$815,424	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$194,800
273	CC	15286146	POSSO LUIS																		230301	18	$1,183,680	$189,400	EPS010	18	$1,183,680	$47,400	CCF04	18	$1,183,680	$47,400	14-7	18	$1,183,680	6.960%	$82,400	18	$0	$0	Si	$366,600
274	CC	15308624	PRECIADO EGIDIO													X					25-14	12	$1,647,269	$263,600	EPS010	12	$1,647,269	$65,900	CCF04	12	$1,554,080	$62,200	14-7	12	$1,647,269	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$391,700
275	CC	15308624	PRECIADO EGIDIO																		25-14	18	$2,331,120	$373,000	EPS010	18	$2,331,120	$93,300	CCF04	18	$2,331,120	$93,300	14-7	18	$2,331,120	6.960%	$162,300	18	$0	$0	Si	$721,900
276	CC	1007578868	QUIROZ EZEQUIEL													X					230301	12	$758,198	$121,400	EPS002	12	$758,198	$30,400	CCF04	12	$649,440	$26,000	14-7	12	$758,198	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$177,800
277	CC	1007578868	QUIROZ EZEQUIEL									X									230301	18	$1,053,575	$168,600	EPS002	18	$1,053,575	$42,200	CCF04	18	$1,053,575	$42,200	14-7	18	$1,053,575	6.960%	$73,400	18	$0	$0	Si	$326,400
278	CC	8335458	RAMIREZ ROSEMBERG		P											X					25-14	12	$642,858	$102,900	EPS010	12	$642,858	$25,800	CCF04	12	$622,120	$24,900	14-7	12	$642,858	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$153,600
279	CC	8335458	RAMIREZ ROSEMBERG		P																25-14	18	$933,180	$149,400	EPS010	18	$933,180	$37,400	CCF04	18	$933,180	$37,400	14-7	18	$933,180	6.960%	$65,000	18	$0	$0	Si	$289,200
280	CC	71395534	RESTREPO ANDRES													X					25-14	6	$595,203	$95,300	EPS037	6	$595,203	$23,900	CCF04	6	$500,460	$20,100	14-7	6	$595,203	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$139,300
281	CC	71395534	RESTREPO ANDRES									X									25-14	24	$2,029,039	$324,700	EPS037	24	$2,029,039	$81,200	CCF04	24	$2,029,039	$81,200	14-7	24	$2,029,039	6.960%	$141,300	24	$0	$0	Si	$628,400
282	CC	1028021404	RESTREPO JHON													X					230301	11	$1,105,762	$177,000	EPS010	11	$1,105,762	$44,300	CCF04	11	$1,000,296	$40,100	14-7	11	$1,105,762	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$261,400
283	CC	1028021404	RESTREPO JHON									X									230301	19	$1,867,450	$298,800	EPS010	19	$1,867,450	$74,700	CCF04	19	$1,867,450	$74,700	14-7	19	$1,867,450	6.960%	$130,000	19	$0	$0	Si	$578,200
284	CC	71793321	RESTREPO JUAN													X					230301	12	$941,009	$150,600	EPS002	12	$941,009	$37,700	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$941,009	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$211,100
285	CC	71793321	RESTREPO JUAN							X		X									230301	18	$969,157	$155,100	EPS002	18	$969,157	$38,800	CCF04	18	$969,157	$38,800	14-7	18	$969,157	6.960%	$67,500	18	$0	$0	Si	$300,200
286	CC	71391918	RESTREPO RAUL							X		X									25-14	30	$1,546,576	$247,500	EPS010	30	$1,546,576	$61,900	CCF04	30	$1,546,576	$61,900	14-7	30	$1,546,576	6.960%	$107,700	30	$0	$0	Si	$479,000
287	CC	1046666535	RODAS ELKIN													X					231001	6	$723,209	$115,800	EPS037	6	$723,209	$29,000	CCF04	6	$437,140	$17,500	14-7	6	$723,209	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$162,300

288	CC	1046666535	RODAS ELKIN									X									231001	24	$2,129,395	$340,800	EPS037	24	$2,129,395	$85,200	CCF04	24	$2,129,395	$85,200	14-7	24	$2,129,395	6.960%	$148,300	24	$0	$0	Si	$659,500
289	CC	70663629	ROJAS FREDY												X						25-14	6	$322,093	$51,600	EPS010	6	$322,093	$12,900	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$322,093	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$75,900
290	CC	70663629	ROJAS FREDY							X		X									25-14	24	$1,222,805	$195,700	EPS010	24	$1,222,805	$49,000	CCF04	24	$1,222,805	$49,000	14-7	24	$1,222,805	6.960%	$85,200	24	$0	$0	Si	$378,900
291	CC	8063331	ROJAS MAURICIO												X						230201	12	$3,315,106	$563,700	EPS010	12	$3,315,106	$132,700	CCF04	12	$3,208,166	$128,400	14-7	12	$3,315,106	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$824,800
292	CC	8063331	ROJAS MAURICIO									X									230201	18	$4,812,250	$818,200	EPS010	18	$4,812,250	$192,500	CCF04	18	$4,812,250	$192,500	14-7	18	$4,812,250	6.960%	$335,000	18	$0	$0	Si	$1,538,200
293	CC	1017160818	ROLDAN JONATAN												X						230301	6	$438,723	$70,200	EPS010	6	$438,723	$17,600	CCF04	6	$320,180	$12,900	14-7	6	$438,723	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$100,700
294	CC	1017160818	ROLDAN JONATAN									X									230301	24	$1,529,033	$244,700	EPS010	24	$1,529,033	$61,200	CCF04	24	$1,529,033	$61,200	14-7	24	$1,529,033	6.960%	$106,500	24	$0	$0	Si	$473,600
295	CC	8101765	ROMAÑA YEFFERSON												X						230301	12	$1,116,873	$178,700	EPS037	12	$1,116,873	$44,700	CCF04	12	$622,120	$24,900	14-7	12	$1,116,873	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$248,300
296	CC	8101765	ROMAÑA YEFFERSON									X									230301	18	$1,127,592	$180,500	EPS037	18	$1,127,592	$45,200	CCF04	18	$1,127,592	$45,200	14-7	18	$1,127,592	6.960%	$78,500	18	$0	$0	Si	$349,400
297	CC	1036963539	SALAZAR ALEJANDRO	X								X									25-14	10	$1,046,334	$167,500	EPS010	10	$1,046,334	$41,900	CCF04	10	$1,046,334	$41,900	14-7	10	$1,046,334	6.960%	$72,900	10	$0	$0	Si	$324,200
298	CC	1020448032	SALDARRIAGA ANA												X						230201	6	$1,195,044	$203,300	EPS002	6	$1,195,044	$47,900	CCF04	6	$1,156,493	$46,300	14-7	6	$1,195,044	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$297,500
299	CC	1020448032	SALDARRIAGA ANA									X									230201	24	$4,625,973	$786,600	EPS002	24	$4,625,973	$185,100	CCF04	24	$4,625,973	$185,100	14-7	24	$4,625,973	6.960%	$322,000	24	$0	$0	Si	$1,478,800
300	CC	1214738152	SALDARRIAGA OSCAR												X						230301	12	$829,436	$132,800	EPS005	12	$829,436	$33,200	CCF04	12	$722,760	$29,000	14-7	12	$829,436	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$195,000
301	CC	1214738152	SALDARRIAGA OSCAR									X									230301	18	$1,084,140	$173,500	EPS005	18	$1,084,140	$43,400	CCF04	18	$1,084,140	$43,400	14-7	18	$1,084,140	6.960%	$75,500	18	$0	$0	Si	$335,800
302	CC	1066511325	SAMPAYO JESUS												X						230301	12	$649,503	$104,000	EPS041	12	$649,503	$26,000	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$649,503	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$152,800
303	CC	1066511325	SAMPAYO JESUS							X		X									230301	18	$1,000,491	$160,100	EPS041	18	$1,000,491	$40,100	CCF04	18	$1,000,491	$40,100	14-7	18	$1,000,491	6.960%	$69,700	18	$0	$0	Si	$310,000
304	CC	1037670479	SANCHEZ ESTEBAN												X						230201	6	$723,600	$115,800	EPS002	6	$723,600	$29,000	CCF04	6	$627,860	$25,200	14-7	6	$723,600	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$170,000
305	CC	1037670479	SANCHEZ ESTEBAN																		230201	24	$2,511,440	$401,900	EPS002	24	$2,511,440	$100,500	CCF04	24	$2,511,440	$100,500	14-7	24	$2,511,440	6.960%	$174,800	24	$0	$0	Si	$777,700
306	CC	12797821	SANCHEZ HUMBERTO												X						231001	12	$5,868,466	$997,800	EPS010	12	$5,868,466	$733,600	CCF04	12	$5,679,160	$227,200	14-7	12	$5,868,466	0.000%	$0	12	$5,679,160	$284,000	No	$2,242,600
307	CC	12797821	SANCHEZ HUMBERTO																		231001	18	$8,518,740	$1,448,200	EPS010	18	$8,518,740	$1,064,900	CCF04	18	$8,518,740	$340,800	14-7	18	$8,518,740	6.960%	$593,000	18	$8,518,740	$426,000	No	$3,872,900
308	CC	1017235158	SANTAMARIA JESSICA												X						25-14	12	$1,376,024	$220,200	EPS010	12	$1,376,024	$55,100	CCF04	12	$1,331,635	$53,300	14-7	12	$1,376,024	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$328,600
309	CC	1017235158	SANTAMARIA JESSICA									X									25-14	18	$1,997,453	$319,600	EPS010	18	$1,997,453	$79,900	CCF04	18	$1,997,453	$79,900	14-7	18	$1,997,453	6.960%	$139,100	18	$0	$0	Si	$618,500
310	CC	98619503	SEPULVEDA JOSE												X						25-14	5	$259,944	$41,600	EPS002	5	$259,944	$10,400	CCF04	5	$238,333	$9,600	14-7	5	$259,944	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$61,600
311	CC	98619503	SEPULVEDA JOSE							X		X									25-14	25	$1,323,787	$211,900	EPS002	25	$1,323,787	$53,000	CCF04	25	$1,323,787	$53,000	14-7	25	$1,323,787	6.960%	$92,200	25	$0	$0	Si	$410,100
312	CC	80410128	SOTO JORGE																		25-14	30	$17,025,840	$2,894,600	EPS005	30	$17,025,840	$2,128,300	CCF04	30	$17,025,840	$681,100	14-7	30	$17,025,840	6.960%	$1,185,000	30	$17,025,840	$851,400	No	$7,740,400
313	CC	70663544	TABORDA HERNAN												X						25-14	6	$439,608	$70,400	EPS037	6	$439,608	$17,600	CCF04	6	$315,680	$12,700	14-7	6	$439,608	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$100,700
314	CC	70663544	TABORDA HERNAN									X									25-14	24	$2,754,227	$440,700	EPS037	24	$2,754,227	$110,200	CCF04	24	$2,754,227	$110,200	14-7	24	$2,754,227	6.960%	$191,700	24	$0	$0	Si	$852,800
315	CC	1039597455	TABORDA LUZ												X						230301	6	$331,280	$53,100	EPS040	6	$331,280	$13,300	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$331,280	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$77,800
316	CC	1039597455	TABORDA LUZ							X		X									230301	24	$1,428,580	$228,600	EPS040	24	$1,428,580	$57,200	CCF04	24	$1,428,580	$57,200	14-7	24	$1,428,580	6.960%	$99,500	24	$0	$0	Si	$442,500
317	CC	42884423	TIRADO ELIZABETH												X						230201	6	$1,204,922	$205,000	EPS010	6	$1,204,922	$48,200	CCF04	6	$1,096,980	$43,900	14-7	6	$1,204,922	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$297,100
318	CC	42884423	TIRADO ELIZABETH									X									230201	24	$5,017,180	$853,000	EPS010	24	$5,017,180	$200,700	CCF04	24	$4,387,920	$175,600	14-7	24	$5,017,180	6.960%	$349,200	24	$0	$0	Si	$1,578,500
319	CC	1020495243	URIBE BRANDON									X									230301	30	$1,685,886	$269,800	EPS010	30	$1,685,886	$67,500	CCF04	30	$1,685,886	$67,500	14-7	30	$1,685,886	6.960%	$117,400	30	$0	$0	Si	$522,200
320	CC	70326851	URIBE CARLOS												X						25-14	12	$1,319,439	$211,200	EPS010	12	$1,319,439	$52,800	CCF04	12	$1,160,160	$46,500	14-7	12	$1,319,439	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$310,500
321	CC	70326851	URIBE CARLOS									X									25-14	18	$1,819,055	$291,100	EPS010	18	$1,819,055	$72,800	CCF04	18	$1,819,055	$72,800	14-7	18	$1,819,055	6.960%	$126,700	18	$0	$0	Si	$563,400
322	CC	1001358992	USMA YEISON												X						230201	12	$1,330,582	$212,900	EPS037	12	$1,330,582	$53,300	CCF04	12	$741,160	$29,700	14-7	12	$1,330,582	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$295,900
323	CC	1001358992	USMA YEISON									X									230201	18	$1,385,647	$221,800	EPS037	18	$1,385,647	$55,500	CCF04	18	$1,385,647	$55,500	14-7	18	$1,385,647	6.960%	$96,500	18	$0	$0	Si	$429,300
324	CC	70329634	VALDERRAMA ROBERTO												X						230201	6	$380,165	$60,900	EPS010	6	$380,165	$15,300	CCF04	6	$355,740	$14,300	14-7	6	$380,165	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$90,500
325	CC	70329634	VALDERRAMA ROBERTO									X									230201	24	$1,442,294	$230,800	EPS010	24	$1,442,294	$57,700	CCF04	24	$1,442,294	$57,700	14-7	24	$1,442,294	6.960%	$100,400	24	$0	$0	Si	$446,600
326	CC	75075422	VALENCIA JUAN									X									25-14	30	$3,066,677	$490,700	EPS010	30	$3,066,677	$122,700	CCF04	30	$3,066,677	$122,700	14-7	30	$3,066,677	6.960%	$213,500	30	$0	$0	Si	$949,600
327	CC	98763887	VANEGAS EDWIN												X						230201	6	$789,582	$126,400	EPS010	6	$789,582	$31,600	CCF04	6	$764,111	$30,600	14-7	6	$789,582	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$188,600
328	CC	98763887	VANEGAS EDWIN									X									230201	24	$3,056,443	$489,100	EPS010	24	$3,056,443	$122,300	CCF04	24	$3,056,443	$122,300	14-7	24	$3,056,443	6.960%	$212,800	24	$0	$0	Si	$946,500

Planilla Resumen

329	CC	1047995487	VANEGAS HECTOR													X					230301	6	$486,720	$77,900	EPS010	6	$486,720	$19,500	CCF04	6	$355,740	$14,300	14-7	6	$486,720	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$111,700
330	CC	1047995487	VANEGAS HECTOR									X									230301	24	$1,864,735	$298,400	EPS010	24	$1,864,735	$74,600	CCF04	24	$1,864,735	$74,600	14-7	24	$1,864,735	6.960%	$129,800	24	$0	$0	Si	$577,400
331	CC	70631665	VANEGAS OBED													X					25-14	6	$485,460	$77,700	EPS010	6	$485,460	$19,500	CCF04	6	$485,460	$19,500	14-7	6	$485,460	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$116,700
332	CC	70631665	VANEGAS OBED									X									25-14	24	$1,994,607	$319,200	EPS010	24	$1,994,607	$79,800	CCF04	24	$1,994,607	$79,800	14-7	24	$1,994,607	6.960%	$138,900	24	$0	$0	Si	$617,700
333	CC	1035422151	VANEGAS ROBINSON									X									230201	18	$1,187,275	$190,000	EPS010	18	$1,187,275	$47,500	CCF04	18	$1,187,275	$47,500	14-7	18	$1,187,275	6.960%	$82,700	18	$0	$0	Si	$367,700
334	CC	1035422151	VANEGAS ROBINSON													X					230201	12	$1,222,515	$195,700	EPS010	12	$1,222,515	$49,000	CCF04	12	$640,360	$25,700	14-7	12	$1,222,515	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$270,400
335	CC	71330063	VARGAS FREDY									X									25-14	30	$1,987,117	$318,000	EPS010	30	$1,987,117	$79,500	CCF04	30	$1,987,117	$79,500	14-7	30	$1,987,117	6.960%	$138,400	30	$0	$0	Si	$615,400
336	CC	70325409	VELEZ GUSTAVO									X									25-14	30	$2,157,068	$345,200	EPS010	30	$2,157,068	$86,300	CCF04	30	$2,157,068	$86,300	14-7	30	$2,157,068	6.960%	$150,200	30	$0	$0	Si	$668,000
337	CC	1088345085	VELEZ JHON									X									230301	30	$3,601,099	$576,200	EPS010	30	$3,601,099	$144,100	CCF04	30	$3,601,099	$144,100	14-7	30	$3,601,099	6.960%	$250,700	30	$0	$0	Si	$1,115,100
338	CC	1036684826	VELEZ YONIER									X									230301	30	$2,779,891	$444,800	EPS010	30	$2,779,891	$111,200	CCF04	30	$2,779,891	$111,200	14-7	30	$2,779,891	6.960%	$193,500	30	$0	$0	Si	$860,700
339	CC	1152717494	VILLA LENNY													X					230201	6	$347,200	$55,600	EPS010	6	$347,200	$13,900	CCF04	6	$336,000	$13,500	14-7	6	$347,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$83,000
340	CC	1152717494	VILLA LENNY																		230201	24	$1,344,000	$215,100	EPS010	24	$1,344,000	$53,800	CCF04	24	$1,344,000	$53,800	14-7	24	$1,344,000	6.960%	$93,600	24	$0	$0	Si	$416,300
341	CC	1038414425	VILLEGAS JOSE									X									230201	30	$4,707,389	$753,200	EPS010	30	$4,707,389	$188,300	CCF04	30	$4,707,389	$188,300	14-7	30	$4,707,389	6.960%	$327,700	30	$0	$0	Si	$1,457,500
342	CC	1035916722	YEPES LUIS							X		X									25-14	30	$1,632,065	$261,200	EPS010	30	$1,632,065	$65,300	CCF04	30	$1,632,065	$65,300	14-7	30	$1,632,065	6.960%	$113,600	30	$0	$0	Si	$505,400
343	CC	8852636	YESMO SIXTO													X					230301	12	$1,268,324	$203,000	EPS010	12	$1,268,324	$50,800	CCF04	12	$722,760	$29,000	14-7	12	$1,268,324	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$282,800
344	CC	8852636	YESMO SIXTO									X									230301	18	$1,310,003	$209,700	EPS010	18	$1,310,003	$52,500	CCF04	18	$1,310,003	$52,500	14-7	18	$1,310,003	6.960%	$91,200	18	$0	$0	Si	$405,900
345	CC	71644113	ZAPATA CARLOS													X					25-14	7	$843,439	$135,000	EPS010	7	$843,439	$33,800	CCF04	7	$583,870	$23,400	14-7	7	$843,439	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$192,200
346	CC	71644113	ZAPATA CARLOS									X									25-14	23	$2,622,882	$419,700	EPS010	23	$2,622,882	$105,000	CCF04	23	$2,622,882	$105,000	14-7	23	$2,622,882	6.960%	$182,600	23	$0	$0	Si	$812,300
347	CC	71785000	ZAPATA FERMIN													X					25-14	5	$275,374	$44,100	EPS010	5	$275,374	$11,100	CCF04	5	$238,333	$9,600	14-7	5	$275,374	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$64,800
348	CC	71785000	ZAPATA FERMIN							X		X									25-14	25	$1,354,767	$216,800	EPS010	25	$1,354,767	$54,200	CCF04	25	$1,354,767	$54,200	14-7	25	$1,354,767	6.960%	$94,300	25	$0	$0	Si	$419,500
349	CC	8338529	ZAPATA GUILLERMO													X					25-14	12	$1,441,892	$230,800	EPS010	12	$1,441,892	$57,700	CCF04	12	$918,360	$36,800	14-7	12	$1,441,892	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$325,300
350	CC	8338529	ZAPATA GUILLERMO									X									25-14	18	$1,552,228	$248,400	EPS010	18	$1,552,228	$62,100	CCF04	18	$1,552,228	$62,100	14-7	18	$1,552,228	6.960%	$108,100	18	$0	$0	Si	$480,700
Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$3,731,937	$597,200			$3,731,937	$149,400			$3,597,828	$144,000			$3,731,937		$209,600		$0	$0		$1,100,200
351	CC	71629907	RICO JAIME													X					25-14	6	$720,469	$115,300	EPS037	6	$720,469	$28,900	CCF04	6	$586,360	$23,500	14-7	6	$720,469	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$167,700
352	CC	71629907	RICO JAIME									X									25-14	24	$3,011,468	$481,900	EPS037	24	$3,011,468	$120,500	CCF04	24	$3,011,468	$120,500	14-7	24	$3,011,468	6.960%	$209,600	24	$0	$0	Si	$932,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (38 Afiliados)																							$237,220,391	$39,761,500			$262,450,059	$20,733,600			$261,217,559	$10,424,000			$262,450,059		$1,086,400		$119,983,068	$5,999,800		$78,005,300
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$3,180,822	$509,000			$3,180,822	$127,400			$3,159,756	$126,500			$3,180,822		$13,200		$0	$0		$776,100
353	CC	43102490	ORTIZ OLGA													X					25-14	6	$653,017	$104,500	EPS010	6	$653,017	$26,200	CCF04	6	$631,951	$25,300	14-7	6	$653,017	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$156,000
354	CC	43102490	ORTIZ OLGA									X									25-14	24	$2,527,805	$404,500	EPS010	24	$2,527,805	$101,200	CCF04	24	$2,527,805	$101,200	14-7	24	$2,527,805	0.522%	$13,200	24	$0	$0	Si	$620,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$5,213,750	$834,200			$5,213,750	$208,600			$5,213,750	$208,600			$5,213,750		$27,300		$0	$0		$1,278,700
355	CC	1053787418	CASTAÑEDA JOSE																		230201	30	$5,213,750	$834,200	EPS017	30	$5,213,750	$208,600	CCF24	30	$5,213,750	$208,600	14-7	30	$5,213,750	0.522%	$27,300	30	$0	$0	Si	$1,278,700
Ciudad: CALDAS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,323,800	$371,900			$2,323,800	$93,000			$2,323,800	$65,100			$2,323,800		$8,500		$0	$0		$538,500
356	CC	43280437	ECHEVERRY MARTA											X							230201	9	$697,140	$111,600	EPS010	9	$697,140	$27,900	CCF04	9	$697,140	$0	14-7	9	$697,140	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$139,500
357	CC	43280437	ECHEVERRY MARTA																		230201	21	$1,626,660	$260,300	EPS010	21	$1,626,660	$65,100	CCF04	21	$1,626,660	$65,100	14-7	21	$1,626,660	0.522%	$8,500	21	$0	$0	Si	$399,000
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$5,350,672	$856,200			$5,350,672	$214,100			$5,350,672	$214,100			$5,350,672		$28,000		$0	$0		$1,312,400
358	CC	15431959	ARENAS LEONARDO									X									25-14	30	$5,350,672	$856,200	EPS037	30	$5,350,672	$214,100	CCF04	30	$5,350,672	$214,100	14-7	30	$5,350,672	0.522%	$28,000	30	$0	$0	Si	$1,312,400
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$22,242,990	$3,741,800			$22,242,990	$2,440,000			$22,168,700	$887,000			$22,242,990		$75,600		$18,235,800	$912,100		$8,056,500
359	CC	70561752	MAYA JORGE													X					230301	2	$270,934	$43,400	EPS010	2	$270,934	$10,900	CCF04	2	$262,193	$10,500	14-7	2	$270,934	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$64,800
360	CC	70561752	MAYA JORGE									X									230301	13	$1,704,257	$272,700	EPS010	13	$1,704,257	$68,200	CCF04	13	$1,704,257	$68,200	14-7	13	$1,704,257	0.522%	$8,900	13	$0	$0	Si	$418,000
361	CC	70561752	MAYA JORGE													X					230301	15	$2,031,999	$325,200	EPS010	15	$2,031,999	$81,300	CCF04	15	$1,966,450	$78,700	14-7	15	$2,031,999	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$485,200
362	CC	70560202	PARIS CARLOS													X					25-14	9	$5,470,740	$930,200	EPS010	9	$5,470,740	$683,900	CCF04	9	$5,470,740	$218,900	14-7	9	$5,470,740	0.000%	$0	9	$5,470,740	$273,700	No	$2,106,700
363	CC	70560202	PARIS CARLOS																		25-14	21	$12,765,060	$2,170,300	EPS010	21	$12,765,060	$1,595,700	CCF04	21	$12,765,060	$510,700	14-7	21	$12,765,060	0.522%	$66,700	21	$12,765,060	$638,400	No	$4,981,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$6,622,364	$1,059,900			$6,622,364	$265,100			$6,578,506	$263,300			$6,622,364		$27,500		$0	$0		$1,615,800
364	CC	39354425	SALDARRIAGA LEDY													X					25-14	6	$632,650	$101,300	EPS037	6	$632,650	$25,400	CCF04	6	$612,241	$24,500	14-7	6	$632,650	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$151,200
365	CC	39354425	SALDARRIAGA LEDY									X									25-14	24	$2,448,965	$391,900	EPS037	24	$2,448,965	$98,000	CCF04	24	$2,448,965	$98,000	14-7	24	$2,448,965	0.522%	$12,800	24	$0	$0	Si	$600,700
366	CC	1128390757	VASQUEZ MARTA													X					230201	6	$726,909	$116,400	EPS010	6	$726,909	$29,100	CCF04	6	$703,460	$28,200	14-7	6	$726,909	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$173,700
367	CC	1128390757	VASQUEZ MARTA																		230201	24	$2,813,840	$450,300	EPS010	24	$2,813,840	$112,600	CCF04	24	$2,813,840	$112,600	14-7	24	$2,813,840	0.522%	$14,700	24	$0	$0	Si	$690,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (30 Afiliados)																							$192,285,993	$32,388,500			$217,515,661	$17,385,400			$216,422,375	$8,659,400			$217,515,661		$906,300		$101,747,268	$5,087,700		$64,427,300
368	CC	98588934	ACEVEDO ALEXANDER													X					25-14	6	$1,382,787	$235,300	MIN002	6	$1,382,787	$55,400	CCF04	6	$1,338,180	$53,600	14-7	6	$1,382,787	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$344,300
369	CC	98588934	ACEVEDO ALEXANDER																		25-14	24	$5,352,720	$910,100	MIN002	24	$5,352,720	$214,200	CCF04	24	$5,352,720	$214,200	14-7	24	$5,352,720	0.522%	$28,000	24	$0	$0	Si	$1,366,500
370	CC	1035417379	ALVAREZ NASLY													X					25-14	7	$461,899	$74,000	EPS010	7	$461,899	$18,500	CCF04	7	$461,899	$18,500	14-7	7	$461,899	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$111,000
371	CC	1035417379	ALVAREZ NASLY																		25-14	23	$1,517,668	$242,900	EPS010	23	$1,517,668	$60,800	CCF04	23	$1,517,667	$60,800	14-7	23	$1,517,668	0.522%	$8,000	23	$0	$0	Si	$372,500
372	CC	43836787	BEDOYA ALEXANDRA													X					25-14	6	$1,373,342	$233,600	EPS010	6	$1,373,342	$55,000	CCF04	6	$1,329,040	$53,200	14-7	6	$1,373,342	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$341,800
373	CC	43836787	BEDOYA ALEXANDRA																		25-14	24	$5,316,160	$903,800	EPS010	24	$5,316,160	$212,700	CCF04	24	$5,316,160	$212,700	14-7	24	$5,316,160	0.522%	$27,800	24	$0	$0	Si	$1,357,000
374	CC	1035859763	CHAVEZ YURANY													X					230201	6	$342,628	$54,900	EPS010	6	$342,628	$13,800	CCF04	6	$331,575	$13,300	14-7	6	$342,628	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$82,000
375	CC	1035859763	CHAVEZ YURANY									X									230201	24	$1,326,301	$212,300	EPS010	24	$1,326,301	$53,100	CCF04	24	$1,326,301	$53,100	14-7	24	$1,326,301	0.522%	$7,000	24	$0	$0	Si	$325,500
376	CC	43609505	DELGADO MARIELA									X									230201	30	$1,550,371	$248,100	EPS010	30	$1,550,371	$62,100	CCF04	30	$1,550,371	$62,100	14-7	30	$1,550,371	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$380,400
377	CC	1017255094	DIAZ ANGHI													X					230301	6	$665,260	$106,500	EPS010	6	$665,260	$26,700	CCF04	6	$643,800	$25,800	14-7	6	$665,260	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$159,000
378	CC	1017255094	DIAZ ANGHI																		230301	24	$2,575,200	$412,100	EPS010	24	$2,575,200	$103,100	CCF04	24	$2,575,200	$103,100	14-7	24	$2,575,200	0.522%	$13,500	24	$0	$0	Si	$631,800
379	CC	1035438373	ECHEVERRI KELLY													X					230201	6	$446,201	$71,400	EPS010	6	$446,201	$17,900	CCF04	6	$431,807	$17,300	14-7	6	$446,201	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$106,600
380	CC	1035438373	ECHEVERRI KELLY									X									230201	24	$1,727,229	$276,400	EPS010	24	$1,727,229	$69,100	CCF04	24	$1,727,229	$69,100	14-7	24	$1,727,229	0.522%	$9,100	24	$0	$0	Si	$423,700
381	CC	7169205	GARCIA JAVIER													X					230301	6	$4,620,000	$794,700	EPS010	6	$4,620,000	$577,500	CCF04	6	$4,620,000	$184,800	14-7	6	$4,620,000	0.000%	$0	6	$4,620,000	$231,000	No	$1,788,000
382	CC	7169205	GARCIA JAVIER																		230301	24	$18,480,000	$3,178,600	EPS010	24	$18,480,000	$2,310,000	CCF04	24	$18,480,000	$739,200	14-7	24	$18,480,000	0.522%	$96,500	24	$18,480,000	$924,000	No	$7,248,300
383	CC	43274953	GAVIRIA ALEJANDRA													X					25-14	12	$850,882	$136,200	EPS010	12	$850,882	$34,100	CCF04	12	$823,434	$33,000	14-7	12	$850,882	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$203,300
384	CC	43274953	GAVIRIA ALEJANDRA																		25-14	18	$1,235,151	$197,700	EPS010	18	$1,235,151	$49,500	CCF04	18	$1,235,150	$49,500	14-7	18	$1,235,151	0.522%	$6,500	18	$0	$0	Si	$303,200
385	CC	98464374	GIRALDO FERNANDO													X					25-14	12	$2,843,734	$483,600	EPS002	12	$2,843,734	$113,800	CCF04	12	$2,752,000	$110,100	14-7	12	$2,843,734	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$707,500
386	CC	98464374	GIRALDO FERNANDO																		25-14	18	$4,128,000	$701,900	EPS002	18	$4,128,000	$165,200	CCF04	18	$4,128,000	$165,200	14-7	18	$4,128,000	0.522%	$21,600	18	$0	$0	Si	$1,053,900
387	CC	1030552024	GONZALEZ ELIANA													X					230301	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$68,400
388	CC	1030552024	GONZALEZ ELIANA							X		X									230301	24	$1,145,300	$183,300	EPS010	24	$1,145,300	$45,900	CCF04	24	$1,145,300	$45,900	14-7	24	$1,145,300	0.522%	$6,000	24	$0	$0	Si	$281,100
389	CC	1066175249	HERAZO NAYHARA													X					230201	12	$3,315,106	$563,700	EPS010	12	$3,315,106	$132,700	CCF04	12	$3,208,166	$128,400	14-7	12	$3,315,106	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$824,800
390	CC	1066175249	HERAZO NAYHARA									X									230201	18	$4,812,250	$818,200	EPS010	18	$4,812,250	$192,500	CCF04	18	$4,812,250	$192,500	14-7	18	$4,812,250	0.522%	$25,200	18	$0	$0	Si	$1,228,400
391	CC	71315227	LARA HERMEN													X					230201	6	$620,000	$99,200	MIN002	6	$620,000	$24,800	CCF04	6	$600,000	$24,000	14-7	6	$620,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$148,000
392	CC	71315227	LARA HERMEN																		230201	24	$2,400,000	$384,000	MIN002	24	$2,400,000	$96,000	CCF04	24	$2,400,000	$96,000	14-7	24	$2,400,000	0.522%	$12,600	24	$0	$0	Si	$588,600
393	CC	1017166091	LONDOÑO WBEIMAR													X					230201	6	$1,353,729	$230,200	EPS010	6	$1,353,729	$54,200	CCF04	6	$1,310,060	$52,500	14-7	6	$1,353,729	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$336,900
394	CC	1017166091	LONDOÑO WBEIMAR																		230201	24	$5,240,240	$891,100	EPS010	24	$5,240,240	$209,700	CCF04	24	$5,240,240	$209,700	14-7	24	$5,240,240	0.522%	$27,400	24	$0	$0	Si	$1,337,900
395	CC	3353097	LOPEZ JUAN																			0	$0	$0	EPS010	30	$25,229,668	$3,153,800	CCF04	30	$25,229,668	$1,009,200	14-7	30	$25,229,668	0.522%	$131,700	30	$25,229,668	$1,261,500	No	$5,556,200
396	CC	7544534	LOPEZ SILVIO													X					25-14	6	$1,520,943	$258,800	EPS010	6	$1,520,943	$60,900	CCF04	6	$1,471,880	$58,900	14-7	6	$1,520,943	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$378,600
397	CC	7544534	LOPEZ SILVIO																		25-14	24	$5,887,520	$1,001,100	EPS010	24	$5,887,520	$235,600	CCF04	24	$5,887,520	$235,600	14-7	24	$5,887,520	0.522%	$30,800	24	$0	$0	Si	$1,503,100
398	CC	98512773	MARIN FRANK													X					230201	6	$1,517,203	$258,000	EPS010	6	$1,517,203	$60,700	CCF04	6	$1,468,260	$58,800	14-7	6	$1,517,203	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$377,500
399	CC	98512773	MARIN FRANK																		230201	24	$5,873,040	$998,500	EPS010	24	$5,873,040	$235,000	CCF04	24	$5,873,040	$235,000	14-7	24	$5,873,040	0.522%	$30,700	24	$0	$0	Si	$1,499,200
400	CC	43597102	MOSQUERA DORA																		230201	30	$1,773,900	$283,900	EPS010	30	$1,773,900	$71,000	CCF04	30	$1,773,900	$71,000	14-7	30	$1,773,900	0.522%	$9,300	30	$0	$0	Si	$435,200
401	CC	98464251	MUNERA DAVID													X					25-14	6	$4,014,438	$682,600	EPS010	6	$4,014,438	$501,900	CCF04	6	$3,884,940	$155,400	14-7	6	$4,014,438	0.000%	$0	6	$3,884,940	$194,300	No	$1,534,200
402	CC	98464251	MUNERA DAVID																		25-14	24	$15,539,760	$2,641,800	EPS010	24	$15,539,760	$1,942,500	CCF04	24	$15,539,760	$621,600	14-7	24	$15,539,760	0.522%	$81,200	24	$15,539,760	$777,000	No	$6,064,100

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

403	CC	71640224	OCHOA JUAN									X									230201	12	$8,028,878	$1,365,100	EPS010	12	$8,028,878	$1,003,700	CCF04	12	$7,769,880	$310,800	14-7	12	$8,028,878	0.000%	$0	12	$7,769,880	$388,500	No	$3,068,100
404	CC	71640224	OCHOA JUAN																		230201	18	$11,654,820	$1,981,400	EPS010	18	$11,654,820	$1,456,900	CCF04	18	$11,654,820	$466,200	14-7	18	$11,654,820	0.522%	$60,900	18	$11,654,820	$582,800	No	$4,548,200
405	CC	1003005732	PACHECO NATALIA									X									230201	6	$583,727	$93,400	EPS010	6	$583,727	$23,400	CCF04	6	$564,896	$22,600	14-7	6	$583,727	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$139,400
406	CC	1003005732	PACHECO NATALIA						X												230201	24	$2,259,585	$361,600	EPS010	24	$2,259,585	$90,400	CCF04	24	$2,259,585	$90,400	14-7	24	$2,259,585	0.522%	$11,800	24	$0	$0	Si	$554,200
407	CC	1152194520	PELAEZ DANIELA																		230301	30	$6,660,640	$1,132,600	EPS010	30	$6,660,640	$266,500	CCF04	30	$6,660,640	$266,500	14-7	30	$6,660,640	0.522%	$34,800	30	$0	$0	Si	$1,700,400
408	CC	1094886438	PUERTA ANA									X									230201	4	$732,013	$117,200	EPS010	4	$732,013	$29,300	CCF04	4	$732,012	$29,300	14-7	4	$732,013	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$175,800
409	CC	1094886438	PUERTA ANA									X									230201	7	$1,281,022	$205,000	EPS010	7	$1,281,022	$51,300	CCF04	7	$1,281,021	$51,300	14-7	7	$1,281,022	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$307,600
410	CC	1094886438	PUERTA ANA																		230201	19	$3,477,059	$556,400	EPS010	19	$3,477,059	$139,100	CCF04	19	$3,477,057	$139,100	14-7	19	$3,477,059	0.522%	$18,200	19	$0	$0	Si	$852,800
411	CC	1026155891	RAIGOSA JUAN									X									230301	6	$360,081	$57,700	EPS010	6	$360,081	$14,500	CCF04	6	$348,465	$14,000	14-7	6	$360,081	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$86,200
412	CC	1026155891	RAIGOSA JUAN																		230301	24	$1,393,860	$223,100	EPS010	24	$1,393,860	$55,800	CCF04	24	$1,393,859	$55,800	14-7	24	$1,393,860	0.522%	$7,300	24	$0	$0	Si	$342,000
413	CC	32240099	SANTANA MARIA									X									25-14	6	$1,559,218	$265,100	EPS010	6	$1,559,218	$62,400	CCF04	6	$1,508,920	$60,400	14-7	6	$1,559,218	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$387,900
414	CC	32240099	SANTANA MARIA																		25-14	24	$6,035,680	$1,026,200	EPS010	24	$6,035,680	$241,500	CCF04	24	$6,035,680	$241,500	14-7	24	$6,035,680	0.522%	$31,600	24	$0	$0	Si	$1,540,800
415	CC	6662925	TARAZONA RUBEN									X									231001	3	$1,033,334	$175,800	EPS010	3	$1,033,334	$41,400	CCF04	3	$1,000,000	$40,000	14-7	3	$1,033,334	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$257,200
416	CC	6662925	TARAZONA RUBEN																		231001	27	$9,000,000	$1,530,000	EPS010	27	$9,000,000	$360,000	CCF04	27	$9,000,000	$360,000	14-7	27	$9,000,000	0.522%	$47,000	27	$0	$0	Si	$2,297,000
417	CC	71694246	VARGAS VICTOR									X									230201	6	$1,239,096	$210,700	EPS010	6	$1,239,096	$49,600	CCF04	6	$1,199,125	$48,000	14-7	6	$1,239,096	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$308,300
418	CC	71694246	VARGAS VICTOR						X												230201	24	$4,796,501	$815,500	EPS010	24	$4,796,501	$191,900	CCF04	24	$4,796,501	$191,900	14-7	24	$4,796,501	0.522%	$25,100	24	$0	$0	Si	$1,224,400
419	CC	1152199824	VELASQUEZ DAVID									X									230301	6	$630,499	$100,900	EPS010	6	$630,499	$25,300	CCF04	6	$610,159	$24,500	14-7	6	$630,499	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$150,700
420	CC	1152199824	VELASQUEZ DAVID						X												230301	24	$2,440,638	$390,600	EPS010	24	$2,440,638	$97,700	CCF04	24	$2,440,638	$97,700	14-7	24	$2,440,638	0.522%	$12,800	24	$0	$0	Si	$598,800
421	CC	43722843	VELEZ LUZ									X									25-14	6	$2,913,640	$495,400	EPS010	6	$2,913,640	$364,300	CCF04	6	$2,913,640	$116,600	14-7	6	$2,913,640	0.000%	$0	6	$2,913,640	$145,800	No	$1,122,100
422	CC	43722843	VELEZ LUZ																		25-14	24	$11,654,560	$1,981,400	EPS010	24	$11,654,560	$1,456,900	CCF04	24	$11,654,560	$466,200	14-7	24	$11,654,560	0.522%	$60,900	24	$11,654,560	$582,800	No	$4,548,200
423	CC	71699208	YEPES JESUS									X									25-14	2	$210,160	$33,700	EPS010	2	$210,160	$8,500	CCF04	2	$203,380	$8,200	14-7	2	$210,160	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$50,400
424	CC	71699208	YEPES JESUS																		25-14	28	$2,847,320	$455,600	EPS010	28	$2,847,320	$113,900	CCF04	28	$2,847,320	$113,900	14-7	28	$2,847,320	0.522%	$14,900	28	$0	$0	Si	$698,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (43 Afiliados)																							**$107,957,951**	**$17,277,000**			**$107,957,951**	**$4,321,900**			**$103,536,769**	**$4,051,400**			**$107,957,951**		**$3,698,700**		**$0**	**$0**		**$29,349,000**
Ciudad: BARBOSA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$1,944,205**	**$311,100**			**$1,944,205**	**$77,800**			**$1,944,205**	**$77,800**			**$1,944,205**		**$84,600**		**$0**	**$0**		**$551,300**
425	CC	70134003	GUTIERREZ JOSUE						X												25-14	30	$1,944,205	$311,100	EPS010	30	$1,944,205	$77,800	CCF04	30	$1,944,205	$77,800	14-7	30	$1,944,205	4.350%	$84,600	30	$0	$0	Si	$551,300
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							**$13,349,069**	**$2,136,400**			**$13,349,069**	**$534,400**			**$12,872,006**	**$489,600**			**$13,349,069**		**$433,900**		**$0**	**$0**		**$3,594,300**
426	CC	15506429	ALZATE JOSE									X									25-14	6	$607,621	$97,300	EPS010	6	$607,621	$24,400	CCF04	6	$500,460	$20,100	14-7	6	$607,621	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$141,800
427	CC	15506429	ALZATE JOSE						X												25-14	24	$2,181,353	$349,100	EPS010	24	$2,181,353	$87,300	CCF04	24	$2,181,353	$87,300	14-7	24	$2,181,353	4.350%	$94,900	24	$0	$0	Si	$618,600
428	CC	71182563	DUQUE JHOANY						X												25-14	30	$2,714,000	$434,300	EPS010	30	$2,714,000	$108,600	CCF04	30	$2,714,000	$108,600	14-7	30	$2,714,000	4.350%	$118,100	30	$0	$0	Si	$769,600
429	CC	15308219	GARCIA EIDER									X									25-14	6	$471,843	$75,500	EPS010	6	$471,843	$18,900	CCF04	6	$446,600	$17,900	14-7	6	$471,843	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$112,300
430	CC	15308219	GARCIA EIDER						X												25-14	24	$1,816,740	$290,700	EPS010	24	$1,816,740	$72,700	CCF04	24	$1,816,740	$72,700	14-7	24	$1,816,740	4.350%	$79,100	24	$0	$0	Si	$515,200
431	CC	98479851	MUÑOZ JORGE									X									230301	6	$312,356	$50,000	EPS010	6	$312,356	$12,500	CCF04	6	$302,280	$12,100	14-7	6	$312,356	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$74,600
432	CC	98479851	MUÑOZ JORGE																		230301	24	$1,209,120	$193,500	EPS010	24	$1,209,120	$48,400	CCF04	24	$1,209,120	$48,400	14-7	24	$1,209,120	4.350%	$52,600	24	$0	$0	Si	$342,900
433	CC	98493223	ROLDAN LUIS									X									231001	6	$417,476	$66,800	EPS010	6	$417,476	$16,700	CCF04	6	$342,240	$13,700	14-7	6	$417,476	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$97,200
434	CC	98493223	ROLDAN LUIS						X												231001	24	$1,457,310	$233,200	EPS010	24	$1,457,310	$58,300	CCF04	24	$1,457,310	$58,300	14-7	24	$1,457,310	4.350%	$63,400	24	$0	$0	Si	$413,200
435	CC	98567302	SEPULVEDA FREDY						X												25-14	5	$592,800	$94,900	EPS010	5	$592,800	$23,800	CCF04	5	$592,800	$23,800	14-7	5	$592,800	4.350%	$25,800	5	$0	$0	Si	$168,300
436	CC	98567302	SEPULVEDA FREDY									X									25-14	6	$666,900	$106,800	EPS010	6	$666,900	$26,700	CCF04	6	$666,900	$26,700	14-7	6	$666,900	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$160,200
437	CC	98567302	SEPULVEDA FREDY								X										25-14	19	$901,550	$144,300	EPS010	19	$901,550	$36,100	CCF04	19	$642,203	$0	14-7	19	$901,550	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$180,400

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$17,168,886	$2,747,700			$17,168,886	$687,500			$16,648,197	$608,800			$17,168,886		$560,900		$0	$0		$4,604,900
438	CC	15321948	BETANCUR LUIS													X					25-14	6	$693,609	$111,000	EPS010	6	$693,609	$27,800	CCF04	6	$362,400	$14,500	14-7	6	$693,609	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$153,300
439	CC	15321948	BETANCUR LUIS									X									25-14	24	$1,550,835	$248,200	EPS010	24	$1,550,835	$62,100	CCF04	24	$1,550,835	$62,100	14-7	24	$1,550,835	4.350%	$67,500	24	$0	$0	Si	$439,900
440	CC	15505766	CADAVID ANIBAL											X							25-14	7	$336,519	$53,900	EPS010	7	$336,519	$13,500	CCF04	7	$336,519	$0	14-7	7	$336,519	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$67,400
441	CC	15505766	CADAVID ANIBAL											X							25-14	8	$384,593	$61,600	EPS010	8	$384,593	$15,400	CCF04	8	$384,593	$0	14-7	8	$384,593	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$77,000
442	CC	15505766	CADAVID ANIBAL											X							25-14	15	$721,112	$115,400	EPS010	15	$721,112	$28,900	CCF04	15	$721,112	$0	14-7	15	$721,112	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$144,300
443	CC	1128279855	CASTAÑO EDISON													X					230201	4	$245,356	$39,300	EPS010	4	$245,356	$9,900	CCF04	4	$213,453	$8,600	14-7	4	$245,356	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,800
444	CC	1128279855	CASTAÑO EDISON									X									230201	12	$736,066	$117,800	EPS010	12	$736,066	$29,500	CCF04	12	$736,066	$29,500	14-7	12	$736,066	4.350%	$32,100	12	$0	$0	Si	$208,900
445	CC	1128279855	CASTAÑO EDISON													X					230201	14	$858,744	$137,400	EPS010	14	$858,744	$34,400	CCF04	14	$747,087	$29,900	14-7	14	$858,744	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$201,700
446	CC	15508014	MONTOYA FRANCISCO									X									25-14	30	$3,424,426	$548,000	EPS010	30	$3,424,426	$137,000	CCF04	30	$3,424,426	$137,000	14-7	30	$3,424,426	4.350%	$149,000	30	$0	$0	Si	$971,000
447	CC	15505253	RAMIREZ LUIS									X									25-14	30	$3,179,406	$508,800	EPS010	30	$3,179,406	$127,200	CCF04	30	$3,179,406	$127,200	14-7	30	$3,179,406	4.350%	$138,400	30	$0	$0	Si	$901,600
448	CC	70330492	SERNA JUAN													X					230301	6	$411,701	$65,900	EPS010	6	$411,701	$16,500	CCF04	6	$398,420	$16,000	14-7	6	$411,701	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$98,400
449	CC	70330492	SERNA JUAN																		230301	24	$1,593,680	$255,000	EPS010	24	$1,593,680	$63,800	CCF04	24	$1,593,680	$63,800	14-7	24	$1,593,680	4.350%	$69,400	24	$0	$0	Si	$452,000
450	CC	15504376	VARELA MARCO													X					230301	6	$632,679	$101,300	EPS010	6	$632,679	$25,400	CCF04	6	$600,040	$24,100	14-7	6	$632,679	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$150,800
451	CC	15504376	VARELA MARCO																		230301	24	$2,400,160	$384,100	EPS010	24	$2,400,160	$96,100	CCF04	24	$2,400,160	$96,100	14-7	24	$2,400,160	4.350%	$104,500	24	$0	$0	Si	$680,800
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$3,321,504	$531,600			$3,321,504	$133,000			$3,278,268	$131,300			$3,321,504		$114,100		$0	$0		$910,000
452	CC	15509889	ECHEVERRI URIEL													X					25-14	6	$698,889	$111,900	EPS010	6	$698,889	$28,000	CCF04	6	$655,654	$26,300	14-7	6	$698,889	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$166,200
453	CC	15509889	ECHEVERRI URIEL																		25-14	24	$2,622,615	$419,700	EPS010	24	$2,622,615	$105,000	CCF04	24	$2,622,614	$105,000	14-7	24	$2,622,615	4.350%	$114,100	24	$0	$0	Si	$743,800
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$15,643,599	$2,503,500			$15,643,599	$626,300			$14,894,835	$592,400			$15,643,599		$523,500		$0	$0		$4,245,700
454	CC	70322056	BEDOYA LUIS									X									25-14	30	$2,228,564	$356,600	EPS037	30	$2,228,564	$89,200	CCF04	30	$2,228,564	$89,200	14-7	30	$2,228,564	4.350%	$97,000	30	$0	$0	Si	$632,000
455	CC	71490859	CANO JUVEN									X									25-14	30	$2,943,695	$471,000	EPS010	30	$2,943,695	$117,800	CCF04	30	$2,943,695	$117,800	14-7	30	$2,943,695	4.350%	$128,100	30	$0	$0	Si	$834,700
456	CC	70321283	CATAÑO FIDEL											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
457	CC	70321283	CATAÑO FIDEL													X					230301	12	$647,384	$103,600	EPS010	12	$647,384	$25,900	CCF04	12	$604,560	$24,200	14-7	12	$647,384	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$153,700
458	CC	70321283	CATAÑO FIDEL																		230301	16	$806,080	$129,000	EPS010	16	$806,080	$32,300	CCF04	16	$806,080	$32,300	14-7	16	$806,080	4.350%	$35,100	16	$0	$0	Si	$228,700
459	CC	9956357	CORTES BERNARDO													X					25-14	12	$805,724	$129,000	EPS010	12	$805,724	$32,300	CCF04	12	$675,680	$27,100	14-7	12	$805,724	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$188,400
460	CC	9956357	CORTES BERNARDO																		25-14	18	$1,013,520	$162,200	EPS010	18	$1,013,520	$40,600	CCF04	18	$1,013,520	$40,600	14-7	18	$1,013,520	4.350%	$44,100	18	$0	$0	Si	$287,500
461	CC	70329015	MESA GUILLERMO													X					230301	6	$915,046	$146,500	EPS010	6	$915,046	$36,700	CCF04	6	$432,240	$17,300	14-7	6	$915,046	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$200,500
462	CC	70329015	MESA GUILLERMO									X									230301	24	$2,204,659	$352,800	EPS010	24	$2,204,659	$88,200	CCF04	24	$2,204,659	$88,200	14-7	24	$2,204,659	4.350%	$96,000	24	$0	$0	Si	$625,200
463	CC	70323852	RIOS LUIS													X					25-14	12	$627,946	$100,500	EPS010	12	$627,946	$25,200	CCF04	12	$604,560	$24,200	14-7	12	$627,946	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$149,900
464	CC	70323852	RIOS LUIS																		25-14	18	$906,840	$145,100	EPS010	18	$906,840	$36,300	CCF04	18	$906,840	$36,300	14-7	18	$906,840	4.350%	$39,500	18	$0	$0	Si	$257,200
465	CC	70323887	VALENCIA JOSE													X					25-14	6	$527,164	$84,400	EPS010	6	$527,164	$21,100	CCF04	6	$457,460	$18,300	14-7	6	$527,164	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$123,800
466	CC	70323887	VALENCIA JOSE									X									25-14	24	$1,922,077	$307,600	EPS010	24	$1,922,077	$76,900	CCF04	24	$1,922,077	$76,900	14-7	24	$1,922,077	4.350%	$83,700	24	$0	$0	Si	$545,100
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$3,552,900	$568,500			$3,552,900	$142,200			$3,552,900	$142,200			$3,552,900		$154,600		$0	$0		$1,007,500
467	CC	98518775	GOMEZ FABIO																		25-14	30	$3,552,900	$568,500	EPS010	30	$3,552,900	$142,200	CCF04	30	$3,552,900	$142,200	14-7	30	$3,552,900	4.350%	$154,600	30	$0	$0	Si	$1,007,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (20 Afiliados)																							$52,977,788	$8,478,200			$52,977,788	$2,120,700			$50,346,358	$2,009,300			$52,977,788		$1,827,100		$0	$0		$14,435,300

PLANILLA PAGADA

 2025/02/20 08:19 AM

468	CC	98578626	AGUDELO JUAN									X									230301	30	$1,841,543	$294,700	EPS010	30	$1,841,543	$73,700	CCF04	30	$1,841,543	$73,700	14-7	30	$1,841,543	4.350%	$80,200	30	$0	$0	Si	$522,300
469	CC	70351011	ARIAS WALTER													X					25-14	6	$962,024	$154,000	EPS010	6	$962,024	$38,500	CCF04	6	$741,620	$29,700	14-7	6	$962,024	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$222,200
470	CC	70351011	ARIAS WALTER									X									25-14	24	$3,369,535	$539,200	EPS010	24	$3,369,535	$134,800	CCF04	24	$3,369,535	$134,800	14-7	24	$3,369,535	4.350%	$146,600	24	$0	$0	Si	$955,400
471	CC	71674762	BUSTAMANTE DAIRO													X					231001	12	$767,806	$122,900	EPS037	12	$767,806	$30,800	CCF04	12	$724,800	$29,000	14-7	12	$767,806	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$182,700
472	CC	71674762	BUSTAMANTE DAIRO									X									231001	18	$1,092,124	$174,800	EPS037	18	$1,092,124	$43,700	CCF04	18	$1,092,124	$43,700	14-7	18	$1,092,124	4.350%	$47,600	18	$0	$0	Si	$309,800
473	CC	15509543	CADAVID WILMAR													X					25-14	6	$876,685	$140,300	EPS010	6	$876,685	$35,100	CCF04	6	$500,460	$20,100	14-7	6	$876,685	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$195,500
474	CC	15509543	CADAVID WILMAR									X									25-14	24	$2,302,388	$368,400	EPS010	24	$2,302,388	$92,100	CCF04	24	$2,302,388	$92,100	14-7	24	$2,302,388	4.350%	$100,200	24	$0	$0	Si	$652,800
475	CC	70327620	CANO CESAR													X					25-14	4	$352,378	$56,400	EPS010	4	$352,378	$14,100	CCF04	4	$333,640	$13,400	14-7	4	$352,378	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$83,900
476	CC	70327620	CANO CESAR																		25-14	11	$917,510	$146,900	EPS010	11	$917,510	$36,800	CCF04	11	$917,510	$36,800	14-7	11	$917,510	4.350%	$40,000	11	$0	$0	Si	$260,500
477	CC	70327620	CANO CESAR													X					25-14	15	$1,321,414	$211,500	EPS010	15	$1,321,414	$52,900	CCF04	15	$1,251,150	$50,100	14-7	15	$1,321,414	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$314,500
478	CC	71665678	CARDONA FRANCISCO											X							25-14	1	$60,401	$9,700	EPS010	1	$60,401	$2,500	CCF04	1	$60,401	$0	14-7	1	$60,401	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,200
479	CC	71665678	CARDONA FRANCISCO													X					25-14	9	$543,600	$87,000	EPS010	9	$543,600	$21,800	CCF04	9	$543,600	$21,800	14-7	9	$543,600	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$130,600
480	CC	71665678	CARDONA FRANCISCO									X									25-14	20	$1,217,848	$194,900	EPS010	20	$1,217,848	$48,800	CCF04	20	$1,217,848	$48,800	14-7	20	$1,217,848	4.350%	$53,000	20	$0	$0	Si	$345,500
481	CC	3592244	CASTAÑEDA VICTOR									X									230201	30	$3,872,840	$619,700	EPS010	30	$3,872,840	$155,000	CCF04	30	$3,872,840	$155,000	14-7	30	$3,872,840	4.350%	$168,500	30	$0	$0	Si	$1,098,200
482	CC	70323972	CORDOBA GERMAN									X									25-14	30	$2,142,269	$342,800	EPS037	30	$2,142,269	$85,700	CCF04	30	$2,142,269	$85,700	14-7	30	$2,142,269	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,400
483	CC	19601883	DIAZ EZEQUIEL													X					231001	6	$1,283,574	$205,400	EPS005	6	$1,283,574	$51,400	CCF04	6	$617,840	$24,800	14-7	6	$1,283,574	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$281,600
484	CC	19601883	DIAZ EZEQUIEL									X									231001	24	$3,151,320	$504,300	EPS005	24	$3,151,320	$126,100	CCF04	24	$3,151,320	$126,100	14-7	24	$3,151,320	4.350%	$137,100	24	$0	$0	Si	$893,600
485	CC	15513408	GARCIA MARCO									X									230301	30	$2,233,488	$357,400	EPS002	30	$2,233,488	$89,400	CCF04	30	$2,233,488	$89,400	14-7	30	$2,233,488	4.350%	$97,200	30	$0	$0	Si	$633,400
486	CC	1047475075	GOMEZ JOSE													X					230301	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF04	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$68,400
487	CC	1047475075	GOMEZ JOSE							X		X									230301	24	$1,145,300	$183,300	EPS010	24	$1,145,300	$45,900	CCF04	24	$1,145,300	$45,900	14-7	24	$1,145,300	4.350%	$49,900	24	$0	$0	Si	$325,000
488	CC	15403901	MENA ARIEL													X					25-14	6	$1,587,024	$254,000	EPS010	6	$1,587,024	$63,500	CCF04	6	$735,960	$29,500	14-7	6	$1,587,024	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$347,000
489	CC	15403901	MENA ARIEL									X									25-14	24	$3,753,796	$600,700	EPS010	24	$3,753,796	$150,200	CCF04	24	$3,753,796	$150,200	14-7	24	$3,753,796	4.350%	$163,300	24	$0	$0	Si	$1,064,400
490	CC	71748915	MONROY WILSON													X					25-14	6	$375,927	$60,200	EPS010	6	$375,927	$15,100	CCF04	6	$363,800	$14,600	14-7	6	$375,927	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$89,900
491	CC	71748915	MONROY WILSON																		25-14	24	$1,455,200	$232,900	EPS010	24	$1,455,200	$58,300	CCF04	24	$1,455,200	$58,300	14-7	24	$1,455,200	4.350%	$63,400	24	$0	$0	Si	$412,900
492	CC	71685854	OROZCO JUAN													X					25-14	12	$846,860	$135,500	EPS010	12	$846,860	$33,900	CCF04	12	$815,040	$32,700	14-7	12	$846,860	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$202,100
493	CC	71685854	OROZCO JUAN																		25-14	18	$1,222,560	$195,700	EPS010	18	$1,222,560	$49,000	CCF04	18	$1,222,560	$49,000	14-7	18	$1,222,560	4.350%	$53,200	18	$0	$0	Si	$346,900
494	CC	71733364	OROZCO MAURICIO																		25-14	30	$2,037,600	$326,100	EPS010	30	$2,037,600	$81,600	CCF04	30	$2,037,600	$81,600	14-7	30	$2,037,600	4.350%	$88,700	30	$0	$0	Si	$578,000
495	CC	70322418	ORTEGA FRANCISCO									X									25-14	30	$2,771,775	$443,500	EPS010	30	$2,771,775	$110,900	CCF04	30	$2,771,775	$110,900	14-7	30	$2,771,775	4.350%	$120,600	30	$0	$0	Si	$785,900
496	CC	1045426698	RAMOS CRISTIAN									X									25-14	30	$2,768,813	$443,100	EPS010	30	$2,768,813	$110,800	CCF04	30	$2,768,813	$110,800	14-7	30	$2,768,813	4.350%	$120,500	30	$0	$0	Si	$785,200
497	CC	71702955	VELASQUEZ JOHN													X					25-14	6	$624,691	$100,000	EPS010	6	$624,691	$25,000	CCF04	6	$381,760	$15,300	14-7	6	$624,691	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$140,300
498	CC	71702955	VELASQUEZ JOHN									X									25-14	24	$1,889,090	$302,300	EPS010	24	$1,889,090	$75,600	CCF04	24	$1,889,090	$75,600	14-7	24	$1,889,090	4.350%	$82,200	24	$0	$0	Si	$535,700
499	CC	71647960	VELEZ ANTONIO											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
500	CC	71647960	VELEZ ANTONIO													X					25-14	12	$1,014,037	$162,300	EPS010	12	$1,014,037	$40,600	CCF04	12	$914,920	$36,600	14-7	12	$1,014,037	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$239,500
501	CC	71647960	VELEZ ANTONIO									X									25-14	16	$1,219,894	$195,200	EPS010	16	$1,219,894	$48,800	CCF04	16	$1,219,894	$48,800	14-7	16	$1,219,894	4.350%	$53,100	16	$0	$0	Si	$345,900
502	CC	70253264	ZAPATA DARIO									X									25-14	30	$1,576,874	$252,300	EPS010	30	$1,576,874	$63,100	CCF04	30	$1,576,874	$63,100	14-7	30	$1,576,874	4.350%	$68,600	30	$0	$0	Si	$447,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)																							**$5,215,948**	**$834,800**			**$5,215,948**	**$208,800**			**$5,116,004**	**$202,900**			**$5,215,948**		**$178,300**		**$0**	**$0**		**$1,424,800**
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,500,840**	**$400,300**			**$2,500,840**	**$100,100**			**$2,400,896**	**$94,200**			**$2,500,840**		**$60,100**		**$0**	**$0**		**$654,700**
503	CC	71394583	CANO FREDY											X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
504	CC	71394583	CANO FREDY													X					25-14	12	$1,073,783	$171,900	EPS005	12	$1,073,783	$43,000	CCF04	12	$973,840	$39,000	14-7	12	$1,073,783	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$253,900
505	CC	71394583	CANO FREDY																		25-14	17	$1,379,607	$220,800	EPS005	17	$1,379,607	$55,200	CCF04	17	$1,379,606	$55,200	14-7	17	$1,379,607	4.350%	$60,100	17	$0	$0	Si	$391,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,715,108**	**$434,500**			**$2,715,108**	**$108,700**			**$2,715,108**	**$108,700**			**$2,715,108**		**$118,200**		**$0**	**$0**		**$770,100**
506	CC	70326644	LONDOÑO MIGUEL									X									25-14	30	$2,715,108	$434,500	EPS010	30	$2,715,108	$108,700	CCF04	30	$2,715,108	$108,700	14-7	30	$2,715,108	4.350%	$118,200	30	$0	$0	Si	$770,100
Total		**Afiliados(282)**																					$932,586,362	$152,447,300			$961,238,614	$54,367,700			$923,945,483	$36,642,700			$961,238,614		$35,603,600		$186,411,108	$9,321,500		$288,382,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890906388	0	PROCOPAL S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43A 19 17 PISO 5	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1280113302	9481807294	E	2025/02/21	2025/02/20	BANCOLOMBIA	0	$288,382,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				279	$152,447,300	$0	$0	$152,447,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$9,620,400	$0	$0	$9,620,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	148	$79,212,400	$0	$0	$79,212,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$24,993,200	$0	$0	$24,993,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	57	$38,621,300	$0	$0	$38,621,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				282	$35,603,600	$0	$0	$35,603,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	282	$35,603,600	$0	$0	$35,603,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				282	$36,642,700	$0	$0	$36,642,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	280	$35,760,900	$0	$0	$35,760,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$881,800	$0	$0	$881,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				282	$54,367,700	$0	$0	$54,367,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$79,300	$0	$0	$79,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	204	$42,354,400	$0	$0	$42,354,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$331,200	$0	$0	$331,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$390,400	$0	$0	$390,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$4,045,800	$0	$0	$4,045,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$66,100	$0	$0	$66,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$4,264,200	$0	$0	$4,264,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$2,637,900	$0	$0	$2,637,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$198,400	$0	$0	$198,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$5,592,900	$0	$0	$5,592,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$5,592,900	$0	$0	$5,592,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$3,728,600	$0	$0	$3,728,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$3,728,600	$0	$0	$3,728,600
TOTAL				282	$288,382,800	$0	$0	$288,382,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901417627	7	VELFRAN LOGISTICA EN TRANSPORTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 28 SUR N 2B - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112752846	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1250972340	9481480771	E	2025/02/07	2025/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,532,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (18 Afiliados)																							$30,229,539	$4,837,800			$31,663,637	$1,240,200			$30,403,591	$1,217,300			$31,663,637		$1,236,700		$0	$0		$8,532,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																							$9,483,066	$1,517,600			$9,483,066	$379,600			$9,799,550	$392,300			$9,483,066		$89,700		$0	$0		$2,379,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$9,483,066	$1,517,600			$9,483,066	$379,600			$9,799,550	$392,300			$9,483,066		$89,700		$0	$0		$2,379,200
1	CC	1003496249	PINILLA ARIAS ANGIE SOLEIME													X					23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF24	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
2	CC	1003496249	PINILLA ARIAS ANGIE SOLEIME							X											23020 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	1.044%	$13,400	27	$0	$0	Si	$321,000
3	CC	52859435	PRIETO MOSCOSO SANDRA MILENA											X							23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
4	CC	52859435	PRIETO MOSCOSO SANDRA MILENA													X					23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF24	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
5	CC	52859435	PRIETO MOSCOSO SANDRA MILENA							X											23020 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF24	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	1.044%	$12,900	26	$0	$0	Si	$309,100
6	CC	1000253110	VELEZ FRANCO BRAYAN ANDRES													X					23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$48,700
7	CC	1000253110	VELEZ FRANCO BRAYAN ANDRES							X											23020 1	26	$1,733,333	$277,400	EPS008	26	$1,733,333	$69,400	CCF24	26	$1,733,333	$69,400	14-11	26	$1,733,333	1.044%	$18,100	26	$0	$0	Si	$434,300
8	CC	79562061	VELEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO													X					25-14	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$400,000	$16,000	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,000
9	CC	79562061	VELEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO							X											25-14	26	$2,600,000	$416,000	EPS008	26	$2,600,000	$104,000	CCF24	26	$2,600,000	$104,000	14-11	26	$2,600,000	1.044%	$27,200	26	$0	$0	Si	$651,200
10	CC	1023978130	VELEZ FRANCO WILMER ALEXANDER													X					23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$48,700
11	CC	1023978130	VELEZ FRANCO WILMER ALEXANDER							X											23020 1	26	$1,733,333	$277,400	EPS008	26	$1,733,333	$69,400	CCF24	26	$1,733,333	$69,400	14-11	26	$1,733,333	1.044%	$18,100	26	$0	$0	Si	$434,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$2,746,024	$439,500			$2,746,024	$110,000			$2,366,424	$94,800			$2,746,024		$12,400		$0	$0		$656,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$2,746,024	$439,500			$2,746,024	$110,000			$2,366,424	$94,800			$2,746,024		$12,400		$0	$0		$656,700
12	CC	80113733	TAPIAS MONTENEGRO EDYSON FERNANDO	X								X									23030 1	24	$1,455,322	$232,900	MIN002	24	$1,455,322	$58,300	CCF24	24	$1,455,322	$58,300	14-11	24	$1,455,322	0.522%	$7,600	24	$0	$0	Si	$357,100
13	CC	79710388	VENEGAS ROJAS DIDIER											X							23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS008	8	$379,600	$15,200	CCF24	8	$0	$0	14-11	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$76,000
14	CC	79710388	VENEGAS ROJAS DIDIER	X	X							X									23030 1	16	$911,102	$145,800	EPS008	16	$911,102	$36,500	CCF24	16	$911,102	$36,500	14-11	16	$911,102	0.522%	$4,800	16	$0	$0	Si	$223,600

![aportes en línea]

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OBRAS (11 Afiliados)																							$18,000,449	$2,880,700			$19,434,547	$750,600			$18,237,617	$730,200			$19,434,547		$1,134,600		$0	$0		$5,496,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$18,000,449	$2,880,700			$19,434,547	$750,600			$18,237,617	$730,200			$19,434,547		$1,134,600		$0	$0		$5,496,100
15	CC	79252127	BOHORQUEZ BOHORQUEZ OTONIEL SEGUNDO										X									0	$0	$0	EPS008	1	$47,450	$0	CCF24	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$0
16	CC	79252127	BOHORQUEZ BOHORQUEZ OTONIEL SEGUNDO							X		X										0	$0	$0	EPS008	29	$1,386,648	$55,500	CCF24	29	$1,386,648	$55,500	14-11	29	$1,386,648	6.960%	$96,600	29	$0	$0	Si	$207,600
17	CC	79365613	GARZON ALGARRA PEDRO AUGUSTO							X		X									25-14	12	$717,770	$114,900	EPS005	12	$717,770	$28,800	CCF24	12	$717,770	$28,800	14-11	12	$717,770	6.960%	$50,000	12	$0	$0	Si	$222,500
18	CC	79365613	GARZON ALGARRA PEDRO AUGUSTO													X					25-14	18	$986,630	$157,900	EPS005	18	$986,630	$39,500	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$986,630	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$231,600
19	CC	1108454919	LOAIZA ROJAS BRAYAN ALEXANDER							X		X									230301	30	$1,785,946	$285,800	EPS002	30	$1,785,946	$71,500	CCF24	30	$1,785,946	$71,500	14-11	30	$1,785,946	6.960%	$124,400	30	$0	$0	Si	$553,200
20	CC	1024573789	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DAVID		X					X		X									230301	30	$1,699,044	$271,900	EPS017	30	$1,699,044	$68,000	CCF24	30	$1,699,044	$68,000	14-11	30	$1,699,044	6.960%	$118,300	30	$0	$0	Si	$526,200
21	CC	1000776362	LOPEZ PULIDO LUIS DANIEL							X		X									230301	30	$1,930,076	$308,900	EPS010	30	$1,930,076	$77,300	CCF24	30	$1,930,076	$77,300	14-11	30	$1,930,076	6.960%	$134,400	30	$0	$0	Si	$597,900
22	CC	79460240	MESA ARIZA JHON HENRY										X								230201	1	$69,333	$11,100	EPS017	1	$69,333	$0	CCF24	1	$0	$0	14-11	1	$69,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,100
23	CC	79460240	MESA ARIZA JHON HENRY										X								230201	2	$138,666	$22,200	EPS017	2	$138,666	$0	CCF24	2	$0	$0	14-11	2	$138,666	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,200
24	CC	79460240	MESA ARIZA JHON HENRY										X								230201	4	$277,332	$44,400	EPS017	4	$277,332	$0	CCF24	4	$0	$0	14-11	4	$277,332	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$44,400
25	CC	79460240	MESA ARIZA JHON HENRY							X		X									230201	7	$738,683	$118,200	EPS017	7	$738,683	$29,600	CCF24	7	$738,683	$29,600	14-11	7	$738,683	6.960%	$51,500	7	$0	$0	Si	$228,900
26	CC	79460240	MESA ARIZA JHON HENRY													X					230201	16	$1,109,327	$177,500	EPS017	16	$1,109,327	$44,400	CCF24	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$1,109,327	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$252,300
27	CC	79382972	RODRIGUEZ VELASQUEZ MANUEL ALFREDO		X					X		X									230201	30	$1,460,522	$233,700	EPS010	30	$1,460,522	$58,500	CCF24	30	$1,460,522	$58,500	14-11	30	$1,460,522	6.960%	$101,700	30	$0	$0	Si	$452,400
28	CC	1022336720	TORRES GONZALEZ RUBEN DARIO							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
29	CC	79517403	UMAÑA MERSARU							X		X									25-14	30	$2,125,359	$340,100	EPS008	30	$2,125,359	$85,100	CCF24	30	$2,125,359	$85,100	14-11	30	$2,125,359	6.960%	$148,000	30	$0	$0	Si	$658,300
30	CC	79881542	ZAPATA TABARES EDUARD ANDRES							X		X									230201	30	$1,937,141	$310,000	EPS008	30	$1,937,141	$77,500	CCF24	30	$1,937,141	$77,500	14-11	30	$1,937,141	6.960%	$134,900	30	$0	$0	Si	$599,900
31	CC	80360510	ZOTA CARDONA HUMBERTO										X								231001	3	$154,093	$24,700	EPS017	3	$154,093	$0	CCF24	3	$0	$0	14-11	3	$154,093	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$24,700
32	CC	80360510	ZOTA CARDONA HUMBERTO													X					231001	7	$359,549	$57,600	EPS017	7	$359,549	$14,400	CCF24	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$359,549	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$85,300
33	CC	80360510	ZOTA CARDONA HUMBERTO							X		X									231001	20	$1,087,478	$174,000	EPS017	20	$1,087,478	$43,500	CCF24	20	$1,087,478	$43,500	14-11	20	$1,087,478	6.960%	$75,700	20	$0	$0	Si	$336,700
Total	**Afiliados(18)**																						$30,229,539	$4,837,800			$31,663,637	$1,240,200			$30,403,591	$1,217,300			$31,663,637		$1,236,700		$0	$0		$8,532,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901417627	7	VELFRAN LOGISTICA EN TRANSPORTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 28 SUR N 2B - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112752846	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1250972340	9481480771	E	2025/02/07	2025/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,532,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,837,800	$0	$0	$4,837,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,300	$0	$0	$256,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,059,300	$0	$0	$1,059,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,533,900	$0	$0	$1,533,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,988,300	$0	$0	$1,988,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,236,700	$0	$0	$1,236,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$1,236,700	$0	$0	$1,236,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,217,300	$0	$0	$1,217,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$1,217,300	$0	$0	$1,217,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,240,200	$0	$0	$1,240,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$535,400	$0	$0	$535,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$135,800	$0	$0	$135,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$256,900	$0	$0	$256,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$58,300	$0	$0	$58,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$185,500	$0	$0	$185,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$68,300	$0	$0	$68,300
TOTAL				**18**	**$8,532,000**	**$0**	**$0**	**$8,532,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79562452	0	BERNAL RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS	cr 15 7-16	ORTEGA-TOLIMA	3102187450	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	14464138	9481341216	N	2025/02/13	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006815374	PAREDES CRISTHIAN		X						A				▫						230301	15	($711,750)	($113,900)	EPS037	15	($711,750)	($28,500)	CCF46	15	($711,750)	($28,500)	14-4	15	($711,750)	($49,600)	15	$0	$0	Si	($220,500)
2	CC	1006815374	PAREDES CRISTHIAN		X						C										230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	97446046	PAREDES EDGAR		X						A				▫						230301	15	($711,750)	($113,900)	EPS037	15	($711,750)	($28,500)	CCF46	15	($711,750)	($28,500)	14-4	15	($711,750)	($49,600)	15	$0	$0	Si	($220,500)
4	CC	97446046	PAREDES EDGAR		X						C										230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(2)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,000		$0	$0		$440,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79562452	0	BERNAL RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS	cr 15 7-16	ORTEGA-TOLIMA	3102187450	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	14464138	9481341216	N	2025/02/13	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$99,000	$0	$0	$99,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$99,000	$0	$0	$99,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	2	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$440,800	$0	$0	$440,800

Certificación
Bancaria

Fecha: 05 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CONSORCIO GP FLANDES, identificado con NIT No 901827374 denominada Consorcio GP FLANDES, a la fecha 12/05/2024, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	24500017192	06/04/2024 (M/D/A)	ACTIVA	PUERTA DEL RIO	245

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) 000014103635267 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO GP FLANDES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 43 A # 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL

42. Correo electrónico: procopal@procopal.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 4 1 1 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 4 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 04 - 30 / 16 : 04: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ DE MESA GUTIERREZ JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) **000014103635267 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 4 2 3	
81. Hasta	2 0 2 7 0 3 2 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) **000014103635267 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 3 5 3 0 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ DE MESA	GUTIERREZ	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 1 2 6 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BLAIR	LLORENS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) **000014103635267 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 0 6 3 8 8	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROCOPAL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 4 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 1 7 4 6 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GISAICO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 4 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 9 8 1 4 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ORGANIZACION EDYFICA S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 4 2 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC - 2025 - 01
Bogotá D.C., 14 de Febrero de 2025

Doctor
JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Representante Legal
CONSORCIO GP FLANDES
Carrera 43 A No. 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL
Medellin - Antioquia

ASUNTO : PATRIMONIO AUTÓNOMO 319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES

INFORME MENSUAL - ENERO DE 2025

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Enero de 2025 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FICS
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Factura(s) Comisión Fiduciaria
- Comunicación Beneficiario Final
- Lineas de Atencion Telefonicas

Así mismo, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece que todos los clientes vinculados a entidades financieras actualizaran anualmente su información, de manera atenta solicitamos la actualización de los datos e información básica, según el formato denominado "Solicitud de Vinculación y Actualización Persona Jurídica/Natural" y anexos allí requeridos.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 8 cuentas de orden o 25 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Defensor Del Consumidor Financiero

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas:
• defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co
• Lzorro@bancodeoccidente.com.co
• defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

JOAQUIN FERNANDO CANABAL RODRIGUEZ
Director Regional Monteria
jcanabal@fiduoccidente.com.co

WILFRIDO BENEDETTY PICO
Ejecutivo de Gestion de Negs
wbenedetty@fiduoccidente.com.co

Wilfrido Enrique Enrique Benedetty Pico
Joaquin Fernando Canabal Rodriguez

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES
Periodo : 2025 - Enero

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	11,302,442,200.17	4,962,319.37	-934,651,858.12	10,372,752,661.42
11	EFECTIVO	11,302,442,200.17	4,962,319.37	-934,651,858.12	10,372,752,661.42
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11,302,442,200.17	4,962,319.37	-934,651,858.12	10,372,752,661.42
111505	BANCOS NACIONALES	11,302,442,200.17	4,962,319.37	-934,651,858.12	10,372,752,661.42
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	11,302,442,200.17	4,962,319.37	-934,651,858.12	10,372,752,661.42
2	PASIVO	-185,284.17	934,744,242.77	-935,595,080.02	-1,036,121.42
25	CUENTAS POR PAGAR	-185,284.17	930,910,944.34	-931,672,918.02	-947,257.85
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	930,725,660.17	-930,725,660.17	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	930,725,660.17	-930,725,660.17	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	930,725,660.17	-930,725,660.17	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-185,284.17	185,284.17	-947,257.85	-947,257.85
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-185,284.17	185,284.17	-947,257.85	-947,257.85
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-185,284.17	185,284.17	-947,257.85	-947,257.85
29	OTROS PASIVOS	0.00	3,833,298.43	-3,922,162.00	-88,863.57
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	3,833,298.43	-3,922,162.00	-88,863.57
290795	OTROS	0.00	3,833,298.43	-3,922,162.00	-88,863.57
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	0.00	3,833,298.43	-3,922,162.00	-88,863.57
3	PATRIMONIO	-11,302,256,916.00	930,650,332.00	-109,956.00	-10,371,716,540.00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-11,302,256,916.00	930,650,332.00	-109,956.00	-10,371,716,540.00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
350505	APORTES EN DINERO	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
35050501	APORTES EN DINERO	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIC	0.00	930,650,332.00	-109,956.00	930,540,376.00
351010	PAGOS A TERCEROS	0.00	930,650,332.00	-109,956.00	930,540,376.00
35101001	PAGO CON APORTES	0.00	930,650,332.00	-109,956.00	930,540,376.00
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	92,899.52	-92,899.52	0.00
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	0.00	92,899.52	-92,899.52	0.00
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MEI	0.00	92,899.52	-92,899.52	0.00
410395	OTROS INTERESES	0.00	92,899.52	-92,899.52	0.00
41039503	OTROS	0.00	92,899.52	-92,899.52	0.00
5	GASTOS	0.00	3,723,342.43	-3,723,342.43	0.00
51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	3,723,342.43	-3,723,342.43	0.00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	3,723,342.43	-3,723,342.43	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	3,723,342.43	-3,723,342.43	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,723,342.43	-3,723,342.43	0.00

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Enero de 2025

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		**$11,302,256,916.00**
INGRESOS		$0.00
EGRESOS		$930,540,376.00
Pago con aportes	$930,540,376.00	
TOTAL FIDEICOMITIDO		**$10,372,752,661.42**
TOTAL ACTIVO		**$10,372,752,661.42**
DISPONIBLE		$10,372,752,661.42
Saldo cuentas bancarias	$10,372,752,661.42	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0.00
CUENTAS POR COBRAR		$0.00
OTROS ACTIVOS		$0.00
TOTAL PASIVO		**$1,036,121.42**
Rendimientos acreedores fiduciarios	$947,257.85	
Ing. recibidos para gastos bancarios	$88,863.57	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		**$10,371,716,540.00**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**Nro. Producto Destino**	221800287
Nro. Identificación	899999059	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	408912830	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/02/07	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/02/07	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$947,257.85	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	408A351250380025
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/02/07
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	13
Nro. Control	TBE03800HU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

15.2288.04-117

Medellín, 12 de Marzo de 2025

Señores:
CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES
Dra. ROSELLY PAJARO
Representante legal
Bogotá

Referencia: **Contrato No. 23001258 H4 2023:**
Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).

Asunto: Oficio Remisorio de Acta de obra No 4.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar corte de obra No. 4 con sus respectivos soportes y documentos requeridos para la presente entrega.

Cordialmente,




RICARDO ALBERTO MUÑOZ
Director de Obra
Consorcio GP Flandes

Anexo 1: Lista de documentos para actas parciales de cobro que se envían en un solo PDF.
Anexo 2: Certificados de Pagos de seguridad social y parafiscales con certificaciones de contador y revisores fiscales en PDF.
Anexo 3: Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios en Excel

1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	26/02/2025

LOCALIZACION

COLOR	AREA	COSTADO	ABS INICIAL	ABS FINAL	AREA (m2)
	1	IZQ	0+720	1+020	32801,23
	2	IZQ	0+085	0+710	21584
	3	DER	0+085	1+050	21891,54
			TOTAL		**76.276,77**

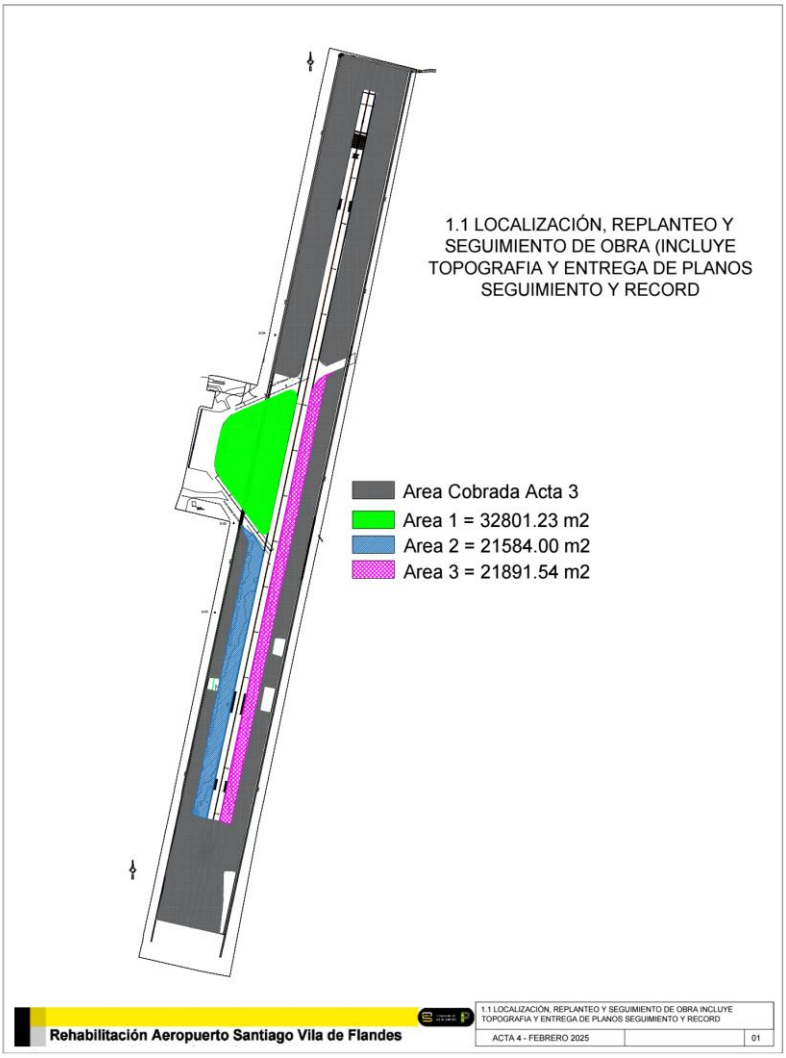


FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

3,1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	26/02/2025

GRÁFICO

COLOR	AREA	COSTADO	ABS INICIAL	ABS FINAL	AREA (m2)
	1	IZQ	0+720	1+020	32.801,23
	2	IZQ	0+085	0+710	21.584,00
	3	DER	0+085	1+050	21.891,54
	A	AL LADO IZQUIERDO RESA NORTE (ZONA DE NIVELACION)			- 2.975,68
	B	ZONA DE AMPLIACION NORTE			- 1.525,12
	C	AL LADO DERECHO RESA NORTE (ZONA DE NIVELACION)			- 4.050,00
	D	ZONA DE AMPLIACION SUR			- 4.079,50
	E	AL LADO IZQUIERDO RESA SUR (ZONA DE NIVELACION)			- 4.050,00
	F	AL LADO DERECHO RESA SUR (ZONA DE NIVELACION)			- 2.780,71
				TOTAL	**56.815,76**

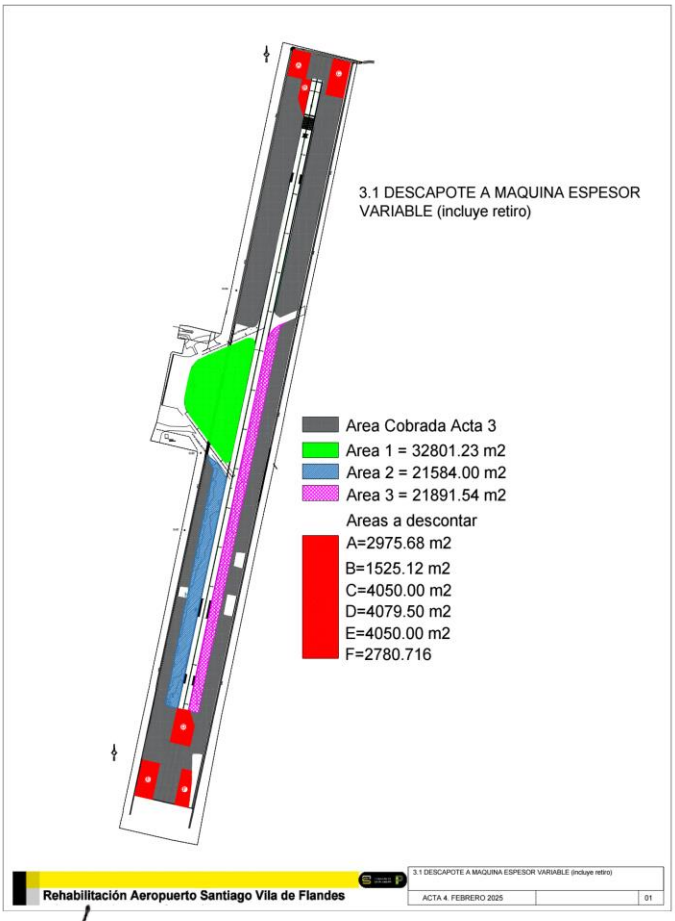


FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

3,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO 1+180 - 1+340



Figura 35. *Alternativa para intervención para franjas de seguridad y RESA*

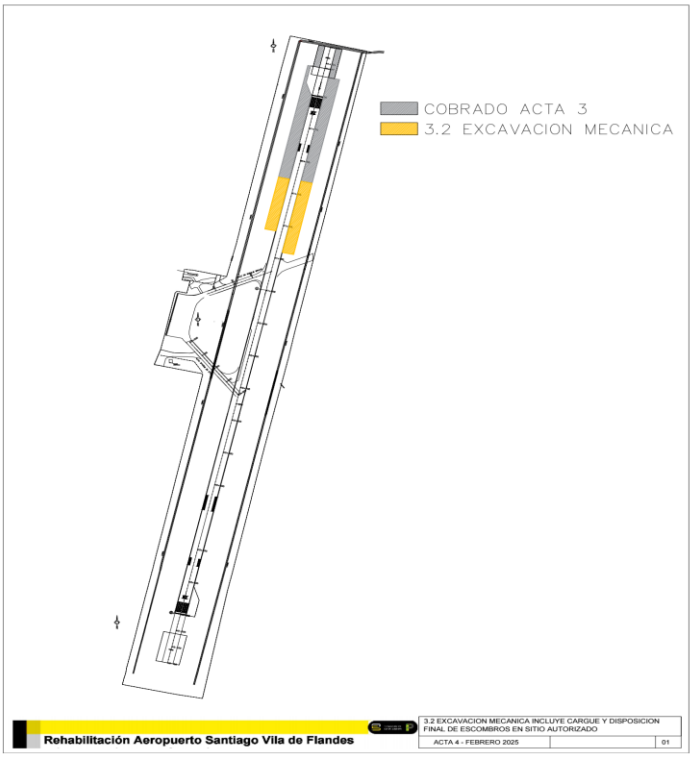

Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
1+180.00	4,86	0,00	0,00
1+190.00	4,72	47,89	47,89
1+200.00	5,43	50,76	98,65
1+210.00	5,55	54,90	153,55
1+220.00	4,36	49,54	203,09
1+230.00	3,55	39,52	242,61
1+240.00	4,45	39,99	282,59
1+250.00	2,54	35,95	317,55
1+260.00	3,31	29,24	346,79
1+270.00	4,74	40,23	387,02
1+280.00	5,81	52,72	439,74
1+290.00	4,80	53,03	492,77
1+300.00	5,26	50,27	543,03
1+310.00	5,35	53,03	596,07
1+320.00	6,51	59,29	655,36
1+330.00	7,10	68,03	723,39
1+340.00	6,83	69,63	**793,01**

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: GERMAN A RIVERA
CARGO: Topógrafo	CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G.	NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago.
CARGO: Topógrafo	CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	


3,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO 1+120 - 1+340



Figura 35. *Alternativa para intervención para franjas de seguridad y RESA*

Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
1+120.00	4,29	0	0
1+130.00	2,77	35,33	35,33
1+140.00	2,95	28,62	63,95
1+150.00	2,7	28,24	92,18
1+160.00	2,88	27,87	120,06
1+170.00	2,2	25,39	145,44
1+180.00	1,44	18,18	163,62
1+190.00	1,3	13,7	177,32
1+200.00	1,46	13,81	191,13
1+210.00	1,46	14,59	205,72
1+220.00	1,67	15,62	221,34
1+230.00	1,52	15,91	237,25
1+240.00	1,22	13,66	250,91
1+250.00	1,2	12,05	262,96
1+260.00	1,21	12,03	274,99
1+270.00	1,27	12,39	287,38
1+280.00	1,6	14,36	301,74
1+290.00	1,7	16,52	318,26
1+300.00	2,16	19,32	337,57
1+310.00	2,66	24,13	361,7
1+320.00	3,22	29,44	391,13
1+330.00	2,88	30,5	421,64
1+340.00	2,94	29,09	**450,73**

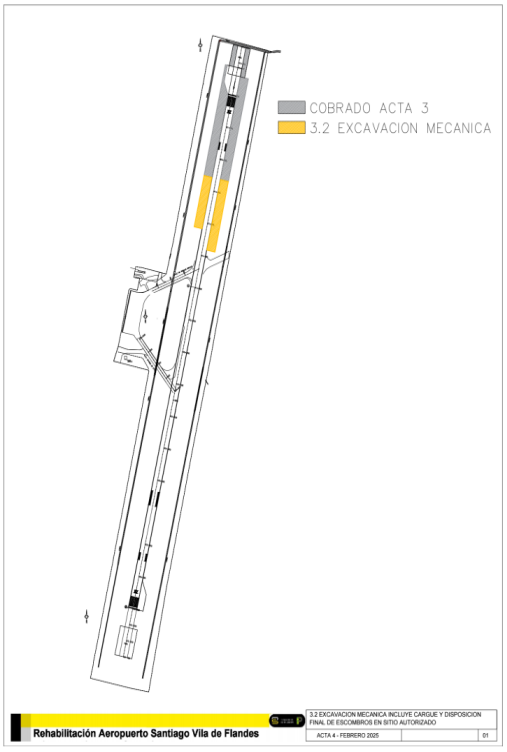

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buriago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	26/02/2025

ZONA DE SEGURIDAD COSTADO IZQUIERDO


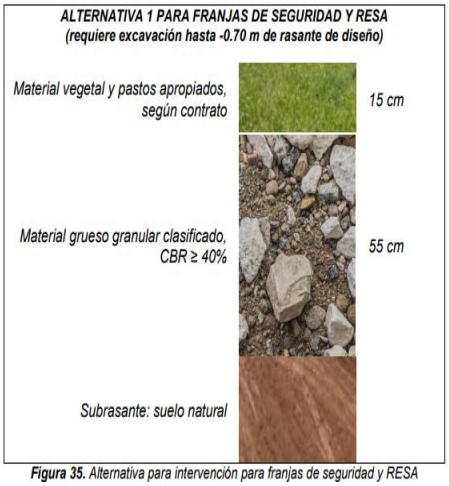


Figura 35. Alternativa para intervención para franjas de seguridad y RESA

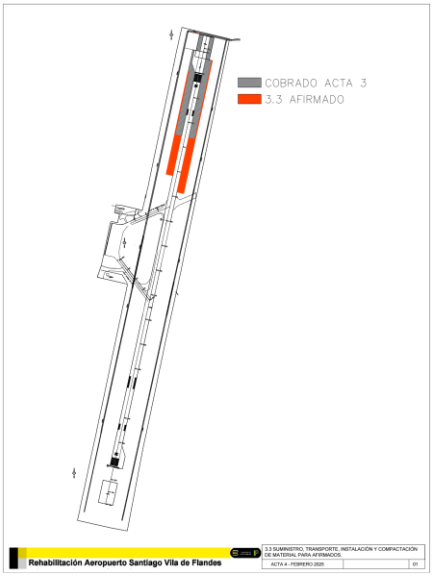


Abscisa	Ancho	Espesor	Area Lleno (m2)	Volumen Lleno (m3)	Volumen Acumulado Lleno (m3)
1180	28	0,2	5,6		
1190	28	0,2	5,6	56	56,00
1200	28	0,2	5,6	56	112,00
1210	28	0,2	5,6	56	168,00
1220	28	0,2	5,6	56	224,00
1230	28	0,2	5,6	56	280,00
1240	28	0,2	5,6	56	336,00
1250	28	0,2	5,6	56	392,00
1260	28	0,2	5,6	56	448,00
1270	28	0,2	5,6	56	504,00
1280	28	0,2	5,6	56	560,00
1290	28	0,2	5,6	56	616,00
1300	28	0,2	5,6	56	672,00
1310	28	0,2	5,6	56	728,00
1320	28	0,2	5,6	56	784,00
1330	28	0,2	5,6	56	840,00
1340	28	0,2	5,6	56	896,00
1350	28	0,2	5,6	56	952,00
1360	28	0,2	5,6	56	**1.008,00**

1360	2	0,4	0,8		
1370	2	0,4	0,8	8	8,00
1380	2	0,4	0,8	8	16,00
1390	2	0,4	0,8	8	24,00
1400	2	0,4	0,8	8	32,00
1410	2	0,4	0,8	8	40,00
1420	2	0,4	0,8	8	48,00
1430	2	0,4	0,8	8	56,00
1440	2	0,4	0,8	8	64,00
1450	2	0,4	0,8	8	72,00
1460	2	0,4	0,8	8	80,00
1470	2	0,4	0,8	8	88,00
1480	2	0,4	0,8	8	96,00
1490	2	0,4	0,8	8	104,00
1500	2	0,4	0,8	8	112,00
1510	2	0,4	0,8	8	120,00
1520	2	0,4	0,8	8	128,00
1530	2	0,4	0,8	8	136,00
1540	2	0,4	0,8	8	144,00
1550	2	0,4	0,8	8	152,00
1560	2	0,4	0,8	8	160,00
1570	2	0,4	0,8	8	168,00
1580	2	0,4	0,8	8	176,00
1590	2	0,4	0,8	8	184,00
1600	2	0,4	0,8	8	**192,00**

GAR


ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO

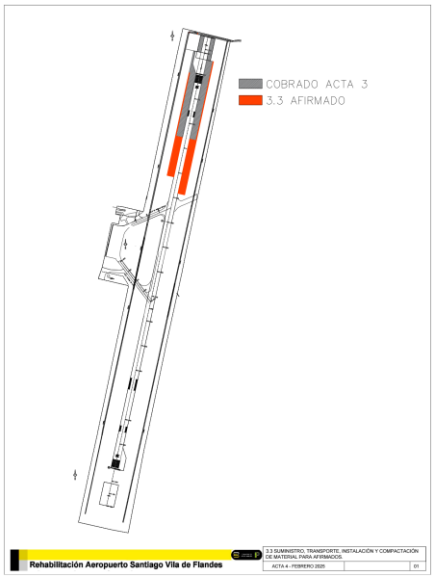

Abscisa	Ancho	Espesor	Area Lleno (m2)	Volumen Lleno (m3)	Volumen Acumulado Lleno (m3)
1120	28	0,2	5,6		
1130	28	0,2	5,6	56	56,00
1140	28	0,2	5,6	56	112,00
1150	28	0,2	5,6	56	168,00
1160	28	0,2	5,6	56	224,00
1170	28	0,2	5,6	56	280,00
1180	28	0,2	5,6	56	336,00
1190	28	0,2	5,6	56	392,00
1200	28	0,2	5,6	56	448,00
1210	28	0,2	5,6	56	504,00
1220	28	0,2	5,6	56	560,00
1230	28	0,2	5,6	56	616,00
1240	28	0,2	5,6	56	672,00
1250	28	0,2	5,6	56	728,00
1260	28	0,2	5,6	56	784,00
1270	28	0,2	5,6	56	840,00
1280	28	0,2	5,6	56	896,00
1290	28	0,2	5,6	56	952,00
1300	28	0,2	5,6	56	1.008,00
1310	28	0,2	5,6	56	1.064,00
1320	28	0,2	5,6	56	1.120,00
1330	28	0,2	5,6	56	1.176,00
1340	28	0,2	5,6	56	1.232,00
1350	28	0,2	5,6	56	1.288,00
1360	28	0,2	5,6	56	**1.344,00**

CAR

ZONA DE SEGURIDAD COSTADO DERECHO

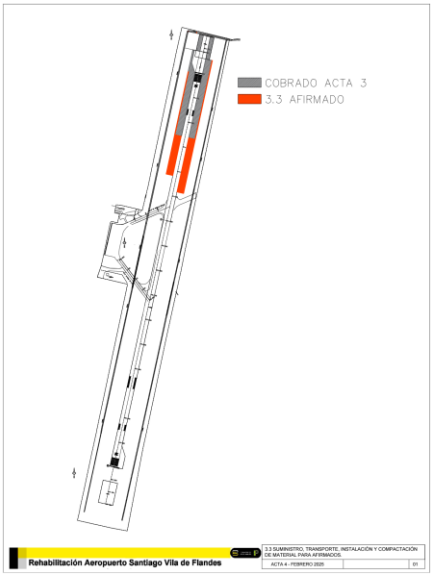


Abscisa	Ancho	Espesor	Area Lleno (m2)	Volumen Lleno (m3)	Volumen Acumulado Lleno (m3)
1360	2	0,4	0,8		
1370	2	0,4	0,8	8	8,00
1380	2	0,4	0,8	8	16,00
1390	2	0,4	0,8	8	24,00
1400	2	0,4	0,8	8	32,00
1410	2	0,4	0,8	8	40,00
1420	2	0,4	0,8	8	48,00
1430	2	0,4	0,8	8	56,00
1440	2	0,4	0,8	8	64,00
1450	2	0,4	0,8	8	72,00
1460	2	0,4	0,8	8	80,00
1470	2	0,4	0,8	8	88,00
1480	2	0,4	0,8	8	96,00
1490	2	0,4	0,8	8	104,00
1500	2	0,4	0,8	8	112,00
1510	2	0,4	0,8	8	120,00
1520	2	0,4	0,8	8	128,00
1530	2	0,4	0,8	8	136,00
1540	2	0,4	0,8	8	144,00
1550	2	0,4	0,8	8	152,00
1560	2	0,4	0,8	8	160,00
1570	2	0,4	0,8	8	168,00
1580	2	0,4	0,8	8	176,00
1590	2	0,4	0,8	8	184,00
1600	2	0,4	0,8	8	192,00
1610	2	0,4	0,8	8	200,00
1620	2	0,4	0,8	8	208,00
1630	2	0,4	0,8	8	216,00
1640	2	0,4	0,8	8	224,00
1650	2	0,4	0,8	8	232,00
1660	2	0,4	0,8	8	**240,00**

TOTAL	**2.784,00**

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVADO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes PREACTA 04

4.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

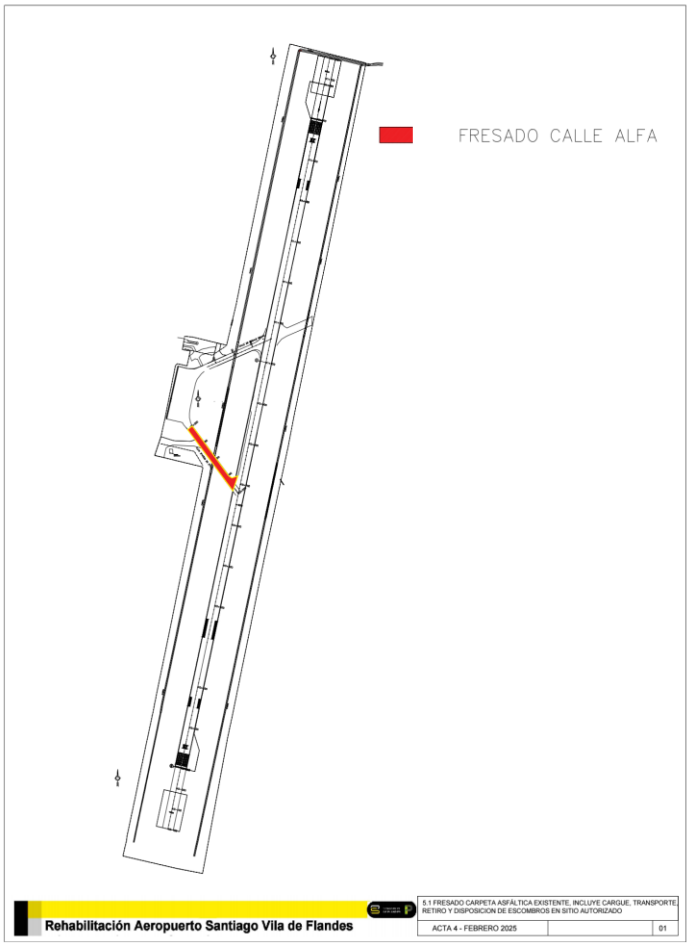


Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+020.00	0,99	0	0
0+030.00	2,2	15,98	15,98
0+040.00	1,77	19,87	35,84
0+050.00	1,53	16,5	52,34
0+060.00	1,54	15,36	67,7
0+070.00	1,56	15,52	83,23
0+080.00	1,6	15,82	99,04
0+090.00	1,68	16,43	115,48
0+100.00	1,41	15,47	130,95
0+110.00	1,6	15,05	146
0+120.00	2,09	18,47	164,47
0+130.00	1,53	18,13	182,6
0+140.00	1,61	15,74	198,34
0+150.00	1,78	16,96	215,3
0+160.00	1,57	16,74	232,03
0+170.00	1,64	16,06	248,09
0+180.00	1,13	13,88	261,97
0+190.00	1,27	12,03	274
0+200.00	0,77	10,21	~~284,2~~

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: "VB" NOMBRE: José Daniel Villegas Buritaga. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes PREACTA 04

4.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

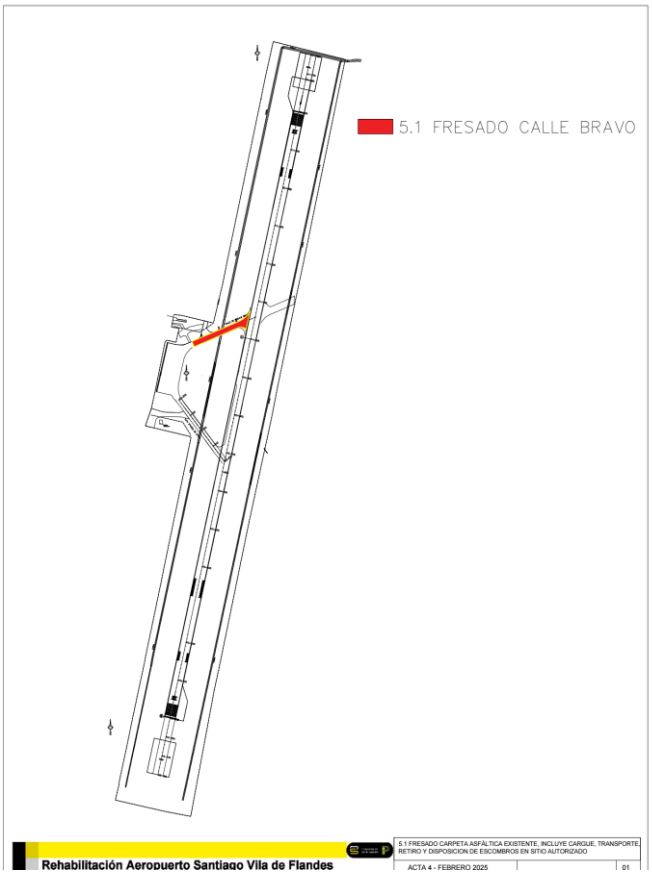

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+000.00	0	0	0
0+010.00	0,28	1,41	1,41
0+020.00	0,99	6,38	7,79
0+030.00	1,65	13,21	21
0+040.00	1,85	17,48	38,48
0+050.00	1,22	15,35	53,83
0+060.00	1,72	14,74	68,57
0+070.00	1,48	16	84,57
0+080.00	1,88	16,77	101,34
0+090.00	0,52	12	113,34
0+100.00	0,29	4,05	117,39
0+110.00	1,59	9,41	126,8
0+120.00	1,78	16,88	143,68
0+130.00	1,79	17,88	161,55
0+140.00	1,66	17,29	178,84
0+150.00	1,59	16,26	195,1
0+160.00	1,78	16,86	211,96
0+170.00	2,22	20,02	231,98
0+174.37	1,55	8,25	240,24

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: VB NOMBRE: Jose Daniel Villegas Buriticá. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes

PREACTA 04

5,3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26/02/2025

BOX 2 - CALLE RODAJE BRAVO

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
65,49	0,5	5,1	**167,00**


BOX 1 - CALLE RODAJE ALFA

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
70,01	0,5	5,1	**178,53**

BOX 4 - SALIDA

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
4,60	0,3	6,9	**9,52**


TOTAL	**355,0**

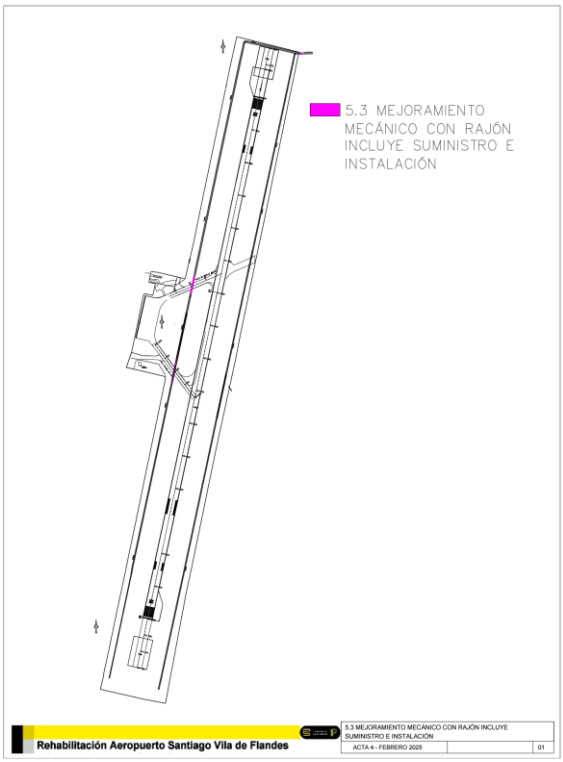


FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: GERMAN A RIVERA
CARGO: Topógrafo	CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G.	NOMBRE: José Daniel Villegas Buritaca.
CARGO: Topógrafo	CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

7,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

CANAL COSTADO IZQUIERDO AL NORTE

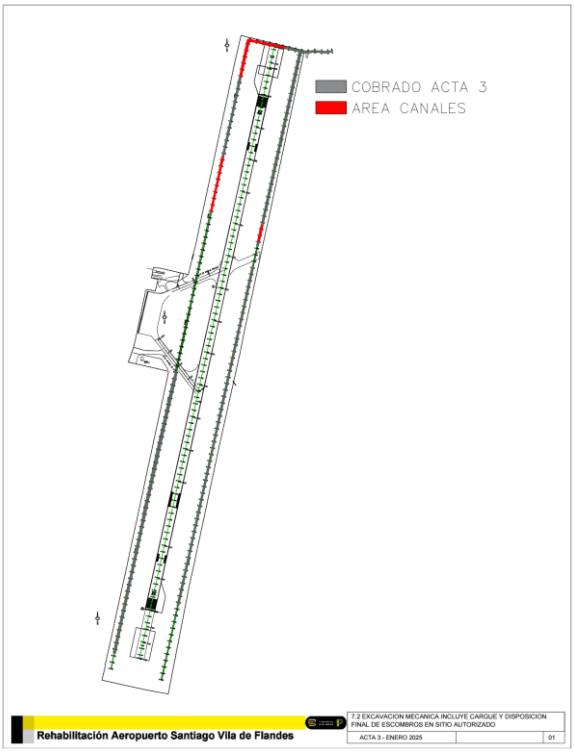

Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
1+420.00	9,31	0,00	0,00
1+430.00	9,83	95,73	95,73
1+440.00	9,27	95,53	191,26
1+450.00	9,11	91,88	283,14
1+460.00	9,47	92,89	376,03
1+470.00	10,12	97,96	473,99
1+480.00	9,76	99,39	573,38
1+490.00	9,89	98,23	671,61
1+500.00	10,38	101,34	772,95
1+510.00	10,23	103,04	876,00
1+520.00	10,74	104,84	980,84
1+530.00	10,60	106,70	1087,53
1+540.00	10,56	105,78	1193,31
1+550.00	11,61	110,86	1304,17
1+560.00	11,85	117,31	1421,48
1+570.00	11,87	118,58	1540,06
1+580.00	11,77	118,21	1658,27
1+590.00	12,27	120,21	**1778,48**

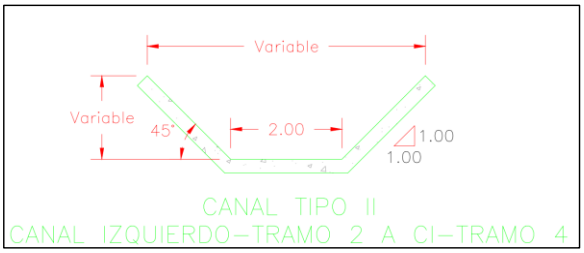


Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
1+840.00	11,83	0,00	0,00
1+850.00	12,14	119,85	119,85
1+860.00	11,95	120,48	240,33
1+870.00	12,31	121,32	361,65
1+880.00	12,66	124,82	486,47
1+890.00	13,01	128,31	614,79
1+900.00	13,65	133,28	748,07
1+910.00	15,77	147,07	895,14
1+920.00	17,81	167,87	1063,00
1+930.00	18,13	179,69	1242,69
1+940.00	18,67	183,99	1426,68
1+950.00	19,74	192,05	1618,73
1+954.87	14,95	83,22	**1701,95**

TOTAL	**3480,43**


FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buriago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

7,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

CANAL DERECHO AL SUR

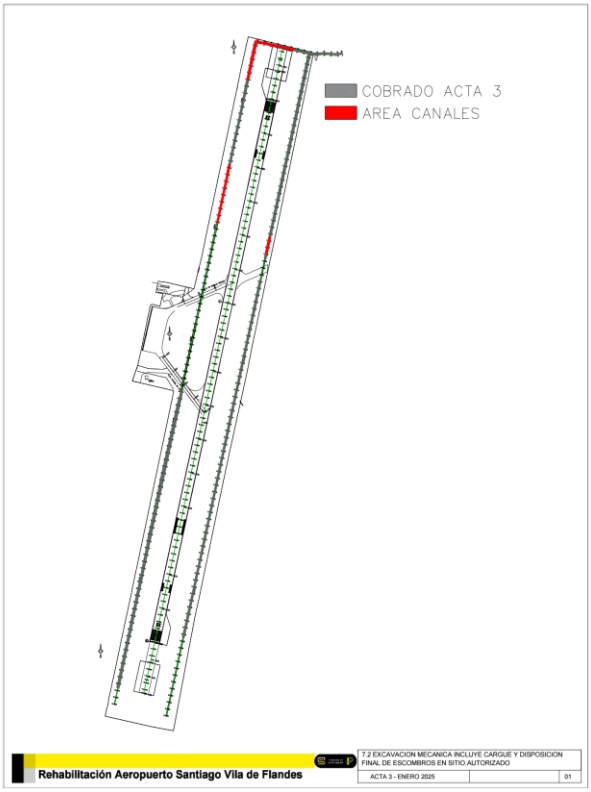

Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
1+361.39	7,69	0	0
1+370.00	7,42	65,06	65,06
1+380.00	7,48	74,5	139,56
1+390.00	7,62	75,51	215,07
1+400.00	7,82	77,2	292,27
1+410.00	7,85	78,35	**370,62**

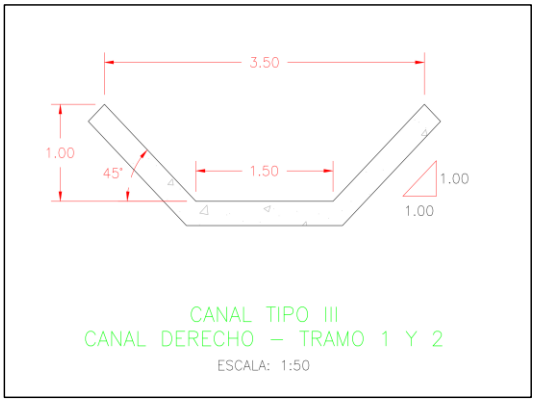


FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes PREACTA 04


7,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

CANAL DE SALIDA NORTE

VOLUMEN PARCIAL

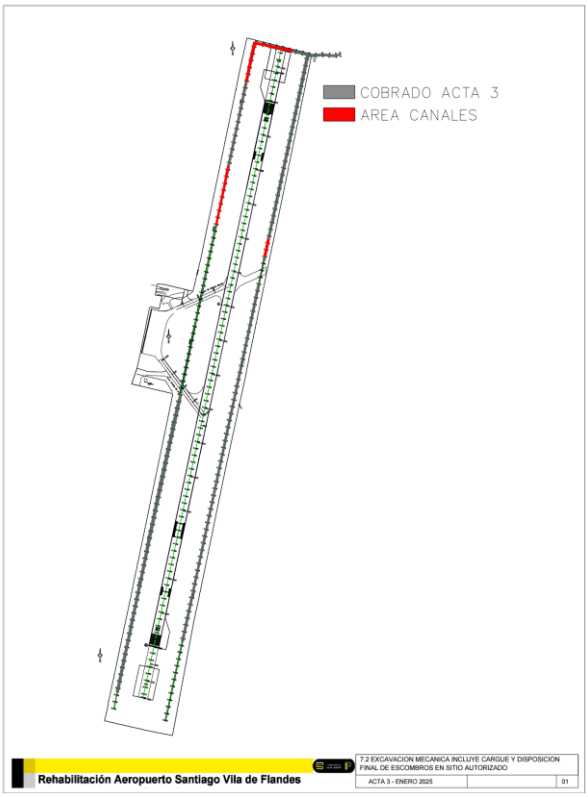

Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
0+002.18	13,76	0	0
0+010.00	13,88	108	108
0+020.00	11,41	126,43	234,43
0+030.00	5,68	85,45	319,88
0+040.00	5,87	57,77	377,65
0+050.00	6,67	62,72	440,37
0+060.00	6,59	66,34	506,71
0+070.00	5,94	62,66	569,36
0+080.00	5,11	55,26	624,62
0+090.00	6,15	56,32	680,94
0+100.00	5,94	60,47	741,41
0+110.00	0	29,73	**771,13**

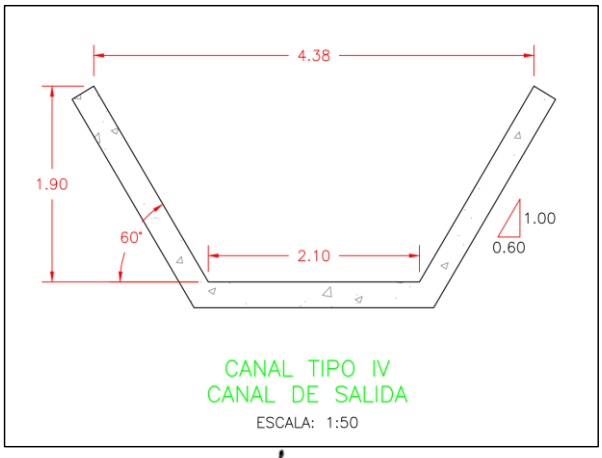

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	


Introduce


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	Consorcio Aerovias Flandes Interventoria	CONSORCIO GP FLANDES

FORMATO DE LIBERACION

TIPO INTERVENCION	Sistema de drenaje.	FECHA EJECUCIÓN	25-02-25
ACTIVIDAD	Concreto 21 MPa para canales	ITEM	7.3

ANOTACIONES Y ESQUEMAS






Descripción = Concreto canal derecho
Alto = 0,10 m
Perímetro = 4,56 m
Largo = 387,20 m
Volumen = 176,56 m^3

① Perímetro = 1,48m + 1,60m + 1,48m = 4,56 m

② Perímetro = 2,28m + 2,20m + 2,28m = 6,76 m

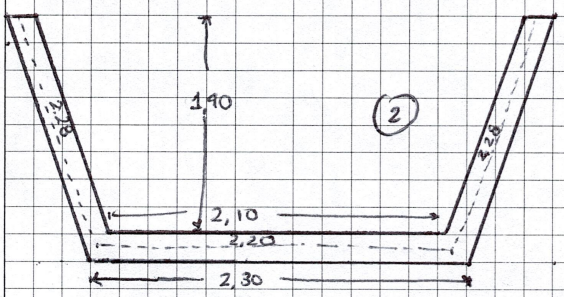

Descripción = Concreto canal Norte.
Alto = 0,10 m
Perímetro = 6,76 m
Largo = 66,15 m
Volumen = 44,72 m^3

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

FIRMA P/B	FIRMA José Daniel VB°
NOMBRE: JOPANE TOVAR	NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago / Ing. Residente
CARGO: SUBDIRECTOR INTERVENTORIA	CARGO:
INTERVENTORÍA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES

Jhon Edison Vélez.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023

Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)


Consorcio Aerovias Flandes
Interventoría

CONSORCIO GP FLANDES

FORMATO DE LIBERACION

TIPO INTERVENCION	Sistema de drenaje.	**FECHA EJECUCIÓN**	25-02-25
ACTIVIDAD	Acero de refuerzo para canales.	**ITEM**	7.13

ANOTACIONES Y ESQUEMAS

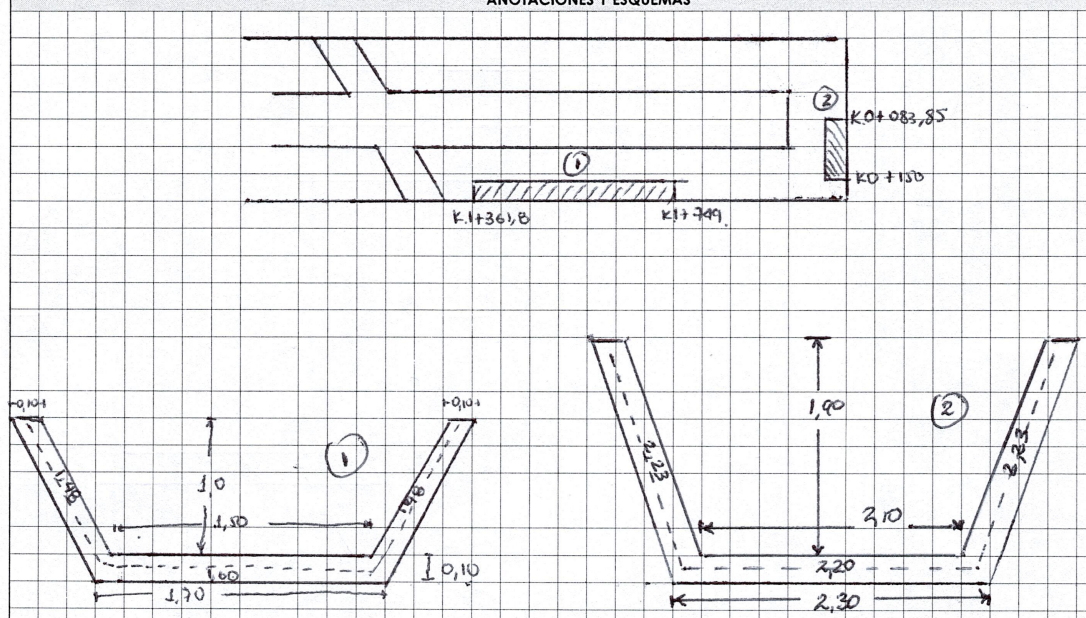

Descripción	Peso unitario kg/m²	Ancho	Largo	Area	Peso
① Malla electrosoldada canal derecho	1,34	4,46	387,20	1726,91	2314,06
② Malla electrosoldada Canal Norte.	1,34	6,66	66,15	440,56	590,35

NOVEDADES Y OBSERVACIONES


FIRMA P/P	FIRMA José Daniel VB°
NOMBRE: Jaime Tovar	NOMBRE: José Daniel Villegas Borrego / Ing. Residente
CARGO: Subdirector Interventoría	CARGO:
INTERVENTORÍA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES

Jhon Edison Vélez.

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes PREACTA 04

8,1	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	26/02/2025

BOX 2 - CALLE RODAJE BRAVO

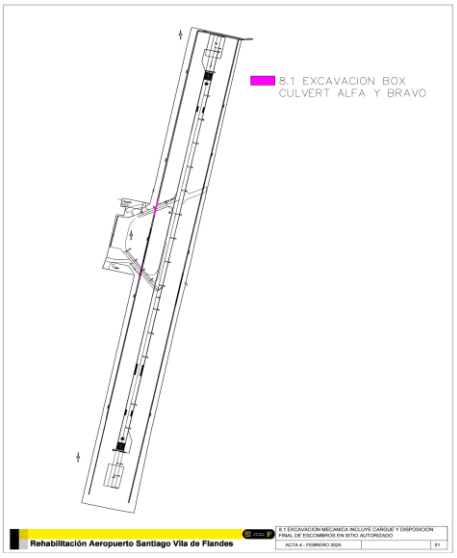


Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
1+169.05	15,25	0	0
1+170.00	15,15	14,44	14,44
1+175.00	15,2	75,89	90.33
1+180.00	14,84	75,11	165,45
1+185.00	14,41	73,14	238,59
1+190.00	15,31	74,3	312,89
1+195.00	16,48	79,47	392,36
1+200.00	18,11	86,49	478,84
1+205.00	17,9	90,03	568,88
1+210.00	16,83	86,82	655,7
1+215.00	16,3	82,82	738,51
1+220.00	16,13	81,06	819,57
1+225.00	15,65	79,45	899,02
1+230.00	14,2	74,63	973,65
1+234.54	14,12	64,28	**1037,93**

EXCAVACION MEJORAMIENTO

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
65,49	0,7	5,1	**233,80**

BOX 1 - CALLE RODAJE ALFA

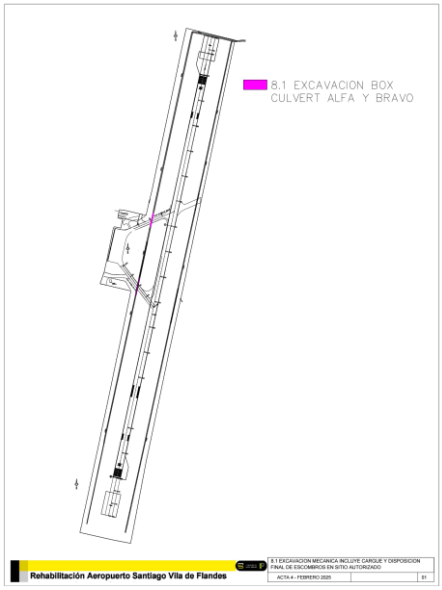

Abscisa	Area Corte (m2)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)
0+907.71	16,45	0	0
0+910.00	16,28	37,48	37,48
0+915.00	15,88	80,39	117,87
0+920.00	15,48	78,4	196,27
0+925.00	13,57	72,63	268,9
0+930.00	14,95	71,29	340,19
0+935.00	16,17	77,79	417,98
0+940.00	15,8	79,92	497,9
0+945.00	13,88	74,19	572,1
0+950.00	12,87	66,89	638,98
0+955.00	15,11	69,96	708,95
0+960.00	16,27	78,46	787,41
0+965.00	16,57	82,09	869,5
0+970.00	16,1	81,66	951,16
0+975.00	15,62	79,3	1030,45
0+977.72	15,38	42,17	**1072,62**

EXCAVACION MEJORAMIENTO

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
70,01	0,7	5,1	**249,94**

TOTAL	**2594,29**

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: GERMAN A RIVERA
CARGO: Topógrafo	CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G.	NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago.
CARGO: Topógrafo	CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023

Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)

Consorcio Aerovias Flandes
Interventoría

CONSORCIO GP FLANDES


FORMATO DE LIBERACIÓN

TIPO INTERVENCION	Box Coulvert	FECHA EJECUCIÓN	25-02-25
ACTIVIDAD	Acero refuerzo para box Coulvert	ITEM	8.2

ANOTACIONES Y ESQUEMAS


ACERO BOX TIPO II (PARCIAL)

Identificación	Barra No.	Peso Unitario [Kg/m]	Cantidad	Longitud [m]	PESO TOTAL
01-02	5	1,552	350	4,46	2422,67
03	5	1,552	499	3,96	3066,81
04	5	1,552	499	2,46	1905,14
05	5	1,552	250	3,96	1536,48
06	3	0,56	1396	0,32	250,16
07	4	0,994	23	66,5	1520,32
07	4	0,994	12	66,5	793,21
PESO TOTAL DE LOS ELEMENTOS					**11494,81**

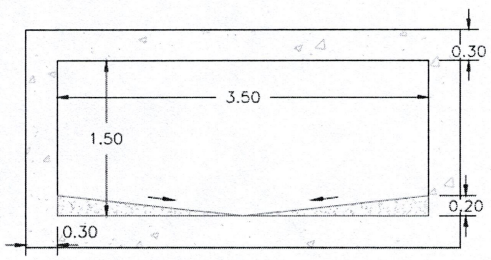

BOX CULVERT TIPO II

ESCALA: 1:40

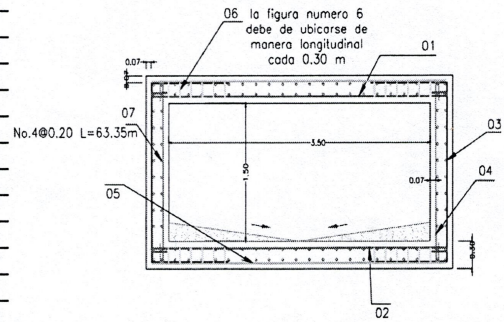

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JOSE JOVAR	NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago / Ing. Residente
CARGO: SUBDIRECTOR INTERV.	CARGO:
INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES

José Daniel "VB"

Jhon Edison Vale.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	Consorcio Aerovias Flandes Interventoria	CONSORCIO GP FLANDES

FORMATO DE LIBERACION


TIPO INTERVENCION	Box Coulvert	FECHA EJECUCIÓN	25-02-25
ACTIVIDAD	Acero refuerzo para box Coulvert	ITEM	8.2

ANOTACIONES Y ESQUEMAS

ACERO ALETAS BOX COULVERT IV


Identificación	Barra No.	Peso Unitario [Kg/m]	Cantidad	Longitud [m]	PESO TOTAL
01	3	0,560	96	3,26	175,26
01	3	0,560	48	3,26	87,63
02	4	0,994	40	4,21	167,39
03	4	0,994	2	5,16	10,26
03	4	0,994	2	5,19	10,32
03	4	0,994	2	5,22	10,38
03	4	0,994	2	5,26	10,46
03	4	0,994	2	5,29	10,52
03	4	0,994	2	5,32	10,58
03	4	0,994	2	5,36	10,66
03	4	0,994	2	5,39	10,72
03	4	0,994	2	5,42	10,77
03	4	0,994	2	5,45	10,83
04	4	0,994	2	3,54	7,04
04	4	0,994	2	3,55	7,06
04	4	0,994	2	3,57	7,10
04	4	0,994	2	3,59	7,14
04	4	0,994	2	3,6	7,16
04	4	0,994	2	3,62	7,20
04	4	0,994	2	3,64	7,24
04	4	0,994	2	3,65	7,26
04	4	0,994	2	3,67	7,30
04	4	0,994	2	3,69	7,34
04	4	0,994	2	3,7	7,36
04	4	0,994	2	3,72	7,40
04	4	0,994	2	3,74	7,44
04	4	0,994	2	3,75	7,46
04	4	0,994	2	3,77	7,49
04	4	0,994	2	3,79	7,53
04	4	0,994	2	3,8	7,55
04	4	0,994	2	3,82	7,59
04	4	0,994	2	3,84	7,63
04	4	0,994	2	3,85	7,65
05	3	0,560	48	3,46	93,00
PESO TOTAL DE LOS ELEMENTOS					**775,68**

ACERO PARA ALETA Y SOLERA

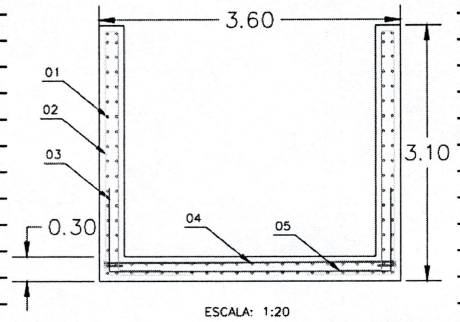

ESCALA: 1:20

DESPIECE DE ACERO PARA ALETA Y SOLERA



ESCALA: 1:40

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

FIRMA P/P	FIRMA José Daniel "VB"
NOMBRE: JAIME TOVAR	NOMBRE: José Daniel Vallejos Buitrago / Ing. Residente
CARGO: SUBDIRECTOR INTERVENTORIA	CARGO:
INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES

Jhon Edison Velez.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023 Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)	Consorcio Aerovias Flandes Interventoría	CONSORCIO GP FLANDES

FORMATO DE LIBERACION

TIPO INTERVENCION	Box Coulvert	FECHA EJECUCIÓN	25-02-25
ACTIVIDAD	Acero refuerzo para box Coulvert	ITEM	8.2

ANOTACIONES Y ESQUEMAS


ACERO BORDILLOS BOX COULVERT IV

Identificación	Barra No.	Peso Unitario [Kg/m]	Cantidad	Longitud [m]	PESO TOTAL
01	3	0,560	68	1,46	55,60
02	3	0,560	8	3,75	16,80
PESO TOTAL DE LOS ELEMENTOS					**72,40**

ACERO ZARPA BOX COULVERT IV


Identificación	Barra No.	Peso Unitario [Kg/m]	Cantidad	Longitud [m]	PESO TOTAL
06	4	0,994	32	3,2	101,79
07	4	0,994	118	2,04	239,28
08	4	0,994	16	3,58	56,94
PESO TOTAL DE LOS ELEMENTOS					**398,00**

DETALLE DE ACERO EN ZARPA



ESCALA: 1:60

DETALLE ZARPA



ESCALA: 1:10

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

FIRMA	P/P	FIRMA	José Daniel "UB"
NOMBRE:	JAIME TOVAR	NOMBRE:	José Daniel Villegas Buitrago / Ing. Residente
CARGO:	SUBDIRECTOR INTERVENT.	CARGO:	
INTERVENTORÍA		CONTRATISTA	
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES		CONSORCIO GP FLANDES	

Jhon Edison Velez.

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes

PREACTA 04

8,3	RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT	26/02/2025


BOX 2 - CALLE RODAJE BRAVO

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
65,49	0,15	5,10	**50,10**

BOX 1 - CALLE RODAJE ALFA

Largo	Espesor	Ancho	Volumen
70,01	0,15	5,10	**53,56**

TOTAL	**103,7**

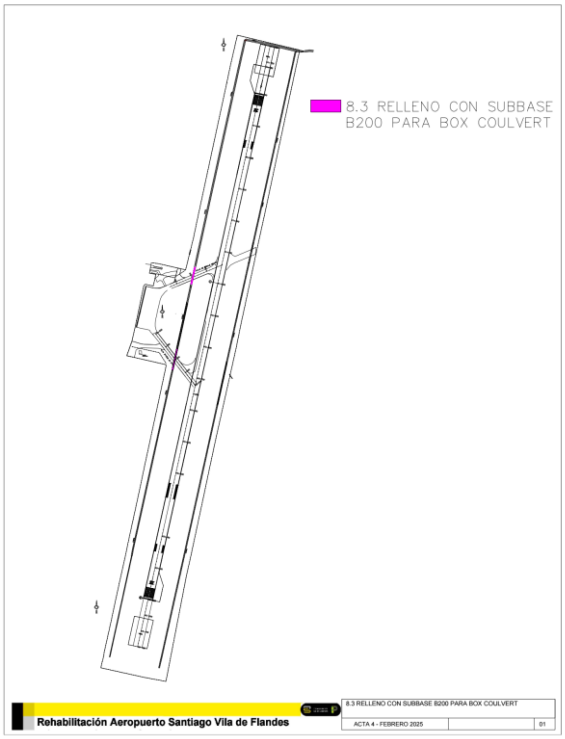

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: GERMAN A RIVERA CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA	**INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buitrago. CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023

Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)

Consorcio Aerovias Flandes
Interventoria

CONSORCIO GP FLANDES

FORMATO DE LIBERACION


TIPO INTERVENCION	Box Coulvert	FECHA EJECUCIÓN	25-02-25
ACTIVIDAD	Concreto 28 Mpa para Box Coulvert	ITEM	8.4

ANOTACIONES Y ESQUEMAS


CONCRETO ALETAS BOX COULVET TIPO IV


DESCRIPCION	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL
SOLERAS	0,3	3	3,44	2	6,19
CAÑUELAS	0,1	3	0,75	4	0,90
ZARPAS	0,5	0,28	8,67	2	2,43
ALETA TIPO I	0,3	2,9	3	4	10,44
DESCUENTO AREA VENTANA ALETA	0,3	1,5	1,1	-1	-0,50
BORDILLO	0,2	0,2	3,6	2	0,288

ISOMETRICO BOX TIPO IV

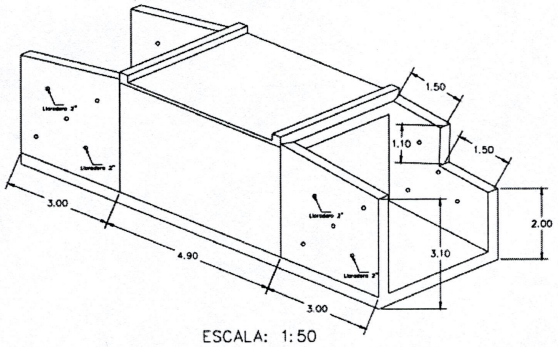

ESCALA: 1:50

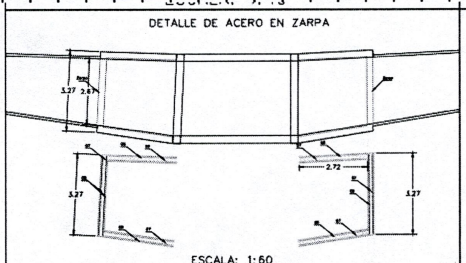

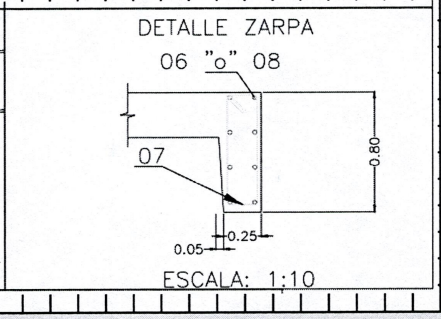

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

FIRMA P/P	FIRMA
NOMBRE: JAIME TOVAR	NOMBRE: Jose Daniel Villegas Restrepo / Ing. Residente
CARGO: SUBDIRECTOR INTERVENTORIA	CARGO:
INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES

Jhon Edison Leiva.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023

Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)

Consorcio Aerovias Flandes
Interventoria

CONSORCIO GP FLANDES


FORMATO DE LIBERACION

TIPO INTERVENCION	Box Coulvert	FECHA EJECUCIÓN	25-02-25
ACTIVIDAD	Concreto 28 Mpa para Box Coulvert	ITEM	8.4

ANOTACIONES Y ESQUEMAS


CONCRETO BOX COULVET TIPO II

DESCRIPCION	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL
CAÑUELAS	0,2	0,875	20	2	7
LOSA INFERIOR	0,3	4,1	20	1	24,6
MURO	1,5	0,3	20	2	18

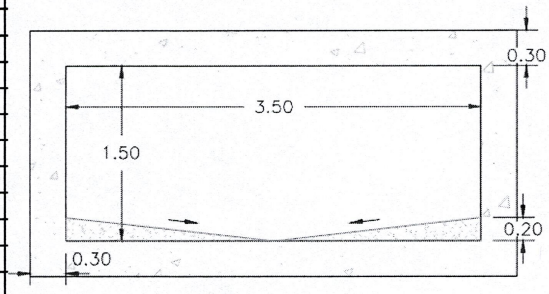

BOX CULVERT TIPO II

ESCALA: 1:40

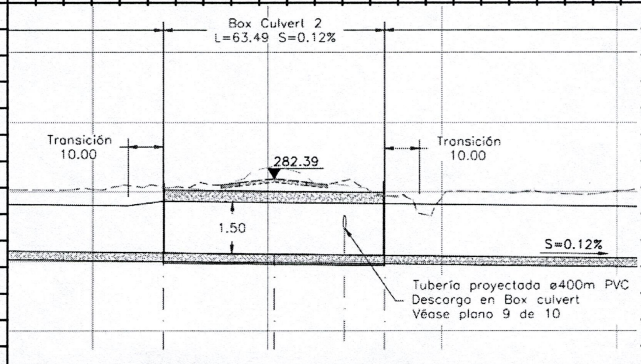

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

FIRMA P/P	FIRMA
NOMBRE: JAIME TOVAR	NOMBRE: José Daniel Villegas Buchego / Ing. Residente
CARGO: SUBDIRECTOR INTERVENTORIA	CARGO:
INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	CONSORCIO GP FLANDES

Juan Edison Leiva.

INFORME MENSUAL No. 09

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)



CONSORCIO GP FLANDES

CONTRATO 23001258 H4

3 DE MARZO 2025

LISTA DE DISTRIBUCION

El Original y las copias del presente documento han sido entregados a las siguientes dependencias:

DEPENDENCIA	ORIGINAL	COPIA
CONSORCIO GP FLANDES	X	
CONSORCIO AEROPUERTOS TOLIMA	X	
SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA AEROCIVIL		X

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
03/03/2025	V1.0	Versión inicial

RESPONSABLES Y FIRMAS

FIRMA			
NOMBRE CARGO EMPRESA	Ricardo Alberto Muñoz Director de obra Consorcio GP Flandes	John Edgar Arango Especialista PMP Consorcio GP Flandes	Consorcio Aerovías de Flandes
RESPONSABILIDAD	Elaboró	Revisó	Aprobó

Índice de contenido

Índice de contenido 3
Índice de tablas 4
Índice de ilustraciones 4
INTRODUCCION 5
DATOS GENERALES 6
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 7
GESTION DEL PROGRAMA DE GERENCIA 19
Gestión del alcance: 20
Gestión del Cronograma: 21
Gestión de costos: 27
Gestión del riesgo: 30
Gestión de las comunicaciones 35
Gestión de la calidad 39
Gestión de recursos y adquisiciones 42
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

Índice de tablas

Tabla 1- Datos generales del estado de los contratos (fuente propia) 6
Tabla 2. Estado de gestiones y permisos 6
Tabla 3- Listado de actividades del mes (fuente propia) 7
Tabla 4- Cumplimiento de la programación (fuente propia) 8
Tabla 5- Detalle inversión mensual febrero de 2025 (Fuente propia) 9
Tabla 6- Matriz de integración con las áreas de conocimiento (fuente propia) 19
Tabla 7- Actividades programadas para el mes de febrero de 2025 (fuente propia) 21
Tabla 8- Recursos dispuestos para las actividades programadas en el mes 22
Tabla 9- Balance financiero del contrato con corte al acta de obra N°4 (fuente propia) 27
Tabla 10- Actividades facturadas Acta #4 de obra (fuente propia) 28
Tabla 11- Tratamiento y valoración a los riesgos de la etapa de construcción (fuente propia) 31
Tabla 12- Listado de riesgos gestionados con el tratamiento propuesto en la matriz 34
Tabla 13- Matriz de interesados actualizada a febrero de 2025 (fuente propia) 35
Tabla 14- Resumen de comités de obra realizados en el mes de febrero del año 2025 (fuente propia) 38
Tabla 15- Control de correspondencia enviada (fuente propia) 39
Tabla 16- Control de correspondencia recibida (fuente propia) 39
Tabla 17. Controles a implementar actividades ejecutadas mes 4. 41
Tabla 18- Adquisición del equipo de especialistas 42
Tabla 19- Adquisición del equipo de dirección 42
Tabla 20- Adquisición del equipo de construcción 42
Tabla 21. Relación proveedores inscritos. 43

Índice de ilustraciones

Ilustración 1- Estrategia constructiva aeropuerto de Flandes (fuente propia) 9
Ilustración 2- Construcción de canal Norte 23
Ilustración 3- Puesta al servicio box Coulvert de salida 24
Ilustración 4- Construcción de Box Couvlert 2 24
Ilustración 5- Construcción de Box Coulvert 1 25
Ilustración 6- Explanación de calle Alpha 25
Ilustración 7- Rehabilitación de pista 26
Ilustración 8- Descapote y excavación en zonas de seguridad 26
Ilustración 9- Comportamiento de la ejecución frente a la programación en el informe semanal (fuente propia) 37

INTRODUCCION

De acuerdo con el programa de gerencia el proyecto se desarrollará con un enfoque PREDICTIVO y en el presente informe se resumen las gestiones realizadas durante las etapas de EJECUCION y CONTROL del proyecto cuyo objeto es realizar el "MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)"

En el informe de febrero del año 2025, que corresponde al noveno mes de ejecución del contrato, se presenta la gestión de las áreas de conocimiento para el buen desarrollo de las actividades de obra y el control que se adelanta tanto para el aseguramiento de la calidad como en el control de cambios.

Las obras y todos sus componentes complementarios se están desarrollando acorde a lo programado, incluso por encima de las expectativas. En el periodo del mes de febrero del año 2025 se alcanzó un buen rendimiento de las actividades previstas y se completaron hitos parciales importantes como la culminación el fresado completo de la pista y las calles de rodaje, contempladas para la segunda fase de la etapa de construcción. Para resaltar, se determinaron algunas modificaciones en el alcance del contrato junto con la Interventoría y la Aeronáutica Civil como lo es la decisión de no pavimentar las márgenes (3m) y emplear ese recurso en la ampliación del mejoramiento con afirmado hasta los 28m desde el borde del pavimento de la pista en las zonas de seguridad. Se cumplió el mes 1 de los 4 meses previstos de cierre total del aeropuerto para llevar a cabo las actividades constructivas de la FASE 2, programado entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2025.

DATOS GENERALES

Estado general del contrato

El contrato actualmente se encuentra en etapa de construcción concentrando las intervenciones en los hitos de la FASE 2, acorde a los estudios y diseños apropiados por el consorcio GP Flandes y que fueron aprobados por la interventoría.

En la tabla 1 se presenta un resumen general tanto de la información contractual del contratista de obra como de la interventoría, en lo referente a los contratos celebrados por la entidad contratante "UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL", para el desarrollo del objeto del contrato que es "MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF):

DATOS	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista:	CONSORCIO GP FLANDES	CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES
Contrato No:	23001258 H4	23001322 H3
Valor Inicial:	$ 48.620.604.781,00	$ 4.387.634.000,00
Plazo pre-construcción:	4 MESES	4 MESES
Plazo de construcción:	15 MESES	15 MESES
Plazo total:	19 MESES	19 MESES
Fecha de iniciación:	28-may-24	28-may-24
Fecha de vencimiento:	31-dic-25	31-dic-25

Tabla 1- Datos generales del estado de los contratos (fuente propia)

Información general del proyecto

- Para el correcto desarrollo de la etapa de construcción se deben tramitar los siguientes permisos, aprobaciones y reuniones que han continuado en el mes de febrero:

DESCRIPCIÓN GESTIÓN / PERMISO	ESTADO
Trámite del permiso de aprovechamiento forestal	Pendiente radicar por parte de la Aerocivil ante Cortolima
Concepto de señalización	En trámite

Tabla 2. Estado de gestiones y permisos

Durante el mes de febrero se ajustó el plan de aprovechamiento forestal, de acuerdo a las observaciones de los especialistas de la Aerocivil, el cual se entregó el día 8 de enero de 2025, pero a la fecha no se ha radicado el documento ante la autoridad ambiental correspondiente, lo cual está a cargo de la entidad contratante como dueño del proyecto.

Igualmente se avanza en el trámite para la aprobación de los precios No Previstos, resultantes de la etapa de pre-construcción, para lo cual se han realizado mesas de trabajo en conjunto con la supervisión y la interventoría, en donde se ha establecido la no procedencia del nuevo precio de la mezcla asfáltica, sin embargo se solicita por parte del contratista, en su lugar, el cambio de especificación y el reconocimiento del asfalto recomendado como una equivalencia al precio de mezcla asfáltica de contrato, dada la necesidad del aeropuerto Santiago Vila de Flandes.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Programación de obra

Para la etapa constructiva se presenta un cronograma basado en las cantidades de obra actualizadas en el presupuesto del diseño ajustado y la estrategia constructiva aprobada. Para el mes de febrero se tenían programadas las siguientes actividades:

ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE FLANDES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
FASE 2 (K0+400 - K1+350) Cierre aeropuerto
REHABILITACION DE PAVIMENTOS
Rehabilitación de pista K0+400 a K1+350
Excavación hombros
Mejoramiento con Rajón
Subbase granular P-154
Subbase reciclada
MEJORAMIENTO DE MARGENES CENTRO
Nivelación de zonas de seguridad K1+085 a K1+350
Descapote
Excavación a máquina zona de seguridad
Filtros subsuperficiales
Obras complementarias
Box Coulvert calle Alpha
Box Coulvert calle Bravo
Canales trapezoidales en concreto
Aprovechamiento forestal

Tabla 3- Listado de actividades del mes (fuente propia)

Basados en la tabla 3 se presenta semanalmente un informe con el avance, completando la semana 40 desde el inicio del contrato, como se muestra en la siguiente tabla.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			FECHA:	28-feb-25
Semana No	40	Del :	22-feb-25	AL:	28-feb-25
Plazo Total		582	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		276	días		
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)		47,42%			
Nombre del Supervisor :		ING. JUANITA VILLAMIZAR			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado construcción	2,07%	23,58%	(%) Ejecutado	2,72%	28,43%
Valor programado ($)	$ 1.004.831.833	$ 11.464.883.837	Valor ejecutado($)	$ 1.322.585.272	$ 13.823.634.257
			Evaluación	Avance =	4,85%
				Valor avance =	$ 2.358.750.420,00

Tabla 4- Cumplimiento de la programación (fuente propia)

Como se puede observar, se lleva un adelanto del 4,85% que corresponde a $ 2.358 millones con respecto a lo planeado con corte al 28 de febrero de 2025.

En los informes semanales se presenta un registro fotográfico que muestra la ejecución de las tareas descritas complementado con un seguimiento a la inversión para llevar un riguroso control del avance de la ejecución.

Igualmente se llevan a cabo comités semanales de seguimiento en compañía de la supervisión y la interventoría, se hacen mesas de trabajo sobre temas importante, reuniones de socialización con diferentes interesados y el control de correspondencia.

Se encuentran consolidadas todas las actividades preliminares en los diferentes frentes de trabajo y se cuenta con los recursos de personal, herramienta, equipos y logística necesaria para el desarrollo de las actividades constructivas.

A pesar del fuerte invierno que azota todo el país y en especial las lluvias presentadas a principio de mes en la zona de las obras, lo que ha dificultado el normal rendimiento de los trabajos y ha generado reprocesos en varios frentes, se logró construir rápidamente drenajes para la evacuación de las aguas y dar continuidad a las actividades programadas.

Presupuesto de obra

Para el mes de febrero se tenía prevista la siguiente inversión presupuestal acorde al programa de trabajo y el flujo de inversión:

ACTIVIDAD	feb-25
FASE 2 (K0+400 - K1+350) Cierre aeropuerto	**$ 4.063.014.093**
REHABILITACION DE PAVIMENTOS	$ 1.310.696.840
Rehabilitación de pista K0+400 a K1+350	$ 1.310.696.840
Excavación hombros	$ 335.238.949
Mejoramiento con Rajón	$ 516.630.613
Subbase granular P-154	$ 276.389.703
Subbase reciclada	$ 182.437.574
MEJORAMIENTO DE MARGENES CENTRO	$ 2.752.317.253
Nivelación de zonas de seguridad K1+085 a K1+350	$ 1.505.464.979
Descapote	$ 1.092.588.859
Excavación a máquina zona de seguridad	$ 394.993.327
Filtros subsuperficiales	$ 17.882.792
Obras complementarias	$ 1.246.852.274
Box Coulvert calle Alpha	$ 448.637.616
Box Coulvert calle Bravo	$ 198.671
Canales trapezoidales en concreto	$ 781.954.633
Aprovechamiento forestal	$ 16.061.352

Tabla 5- Detalle inversión mensual febrero de 2025 (Fuente propia)

Para el mes de febrero se alcanzó una facturación de $ 3.880 millones quedando por debajo de lo programado, lo cual se refleja en la ejecución de actividades No Previstas que deberían estar aprobadas para esta FASE, pero que al encontrarse en trámite no se pueden realizar mostrando un pequeño desfase de $ 183 millones, pero que en el avance acumulado del contrato no representan atraso, ya que se lleva un adelanto de $ 2.358 millones.

Programación y Estrategia constructiva:

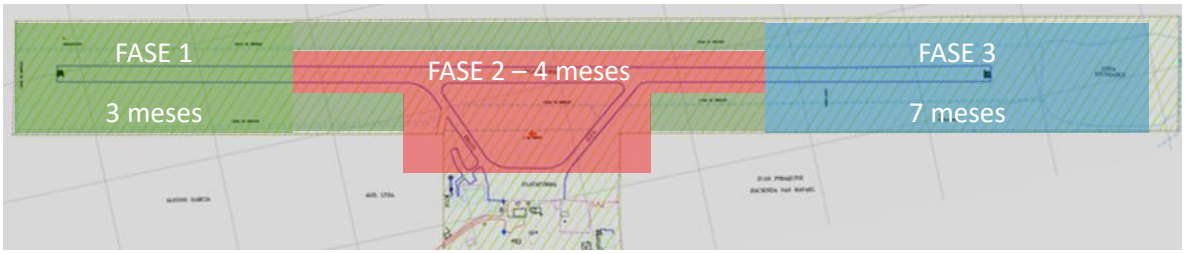


Ilustración 1- Estrategia constructiva aeropuerto de Flandes (fuente propia)

Actualmente nos encontramos en la FASE 2, donde se tiene el compromiso de cumplir con el HITO de 1.200 m de pista pavimentada y lista para la operación de las aeronaves para el día 31 de mayo de 2025.

Para el cumplimiento de este HITO, se deben realizar las siguientes actividades:

- **Fresado de pista**: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100%, el material producto del fresado denominado “RAP” según los diseños se mezcla con material granular existente debajo del pavimento actual.
- **Reciclado de pavimento**: consiste en el mezclado con ayuda de una maquina tipo recicladora, la cual tiene un tambor con puntas que es capaz de remover el granular existente y revolverlo con el RAP, para conformar una subbase tipo P-154.
- **Conformación y compactación de subbase reciclada**: Consiste en la extensión del material mezclado a los niveles de diseño y su compactación hasta alcanzar el 100% de la densidad de laboratorio.
- **Suministro e instalación de base granular**: Consiste en la colocación de base P-259 sobre la capa subyacente de subbase, en un espesor de 15 cm y su posterior compactación al 100 % de ensayo de laboratorio.
- **Suministro e instalación de mezcla asfáltica:** Una vez instalada la base granular se debe imprimar con emulsión asfáltica, para luego instalar la mezcla asfáltica P-401.
- **Señalización horizontal:** Con el fin de entrar en operación se debe evaluar en conjunto con la interventoría la señalización mínima que se debe pintar para el correcto funcionamiento del tramo de pista que se va a colocar en servicio.
- **Zonas de seguridad:** Simultáneamente se debe trabajar en las zonas aledañas a la pista para garantizar la seguridad de las aeronaves en caso de un incidente por salida de pista de una aeronave.
- **Calle de rodaje**: Igualmente se estará trabajando en las calles de rodaje Alpha y Bravo, para habilitar al menor una calle para la operación del aeropuerto y el acceso a la plataforma.
- **Ayudas visuales:** Durante el mes de febrero se dará inicio a los preliminares de la parte eléctrica con la evaluación de las adecuaciones en el cuarto técnico y el replanteo de la obra civil para las instalaciones eléctricas, de acuerdo a los diseños.
- **Drenajes:** Paralelamente se debe avanzar en la construcción de canales, box Coulvert y filtros en las diferentes zonas intervenidas, con el fin de garantizar la correcta evacuación de las aguas lluvias.

También se debe avanzar en el trámite del permiso de aprovechamiento forestal, tanto para los árboles del sector sur del aeropuerto como de los árboles del canal de descole.

En cuanto a las vías de acceso en el presente mes se destaca la gestión realizada por el consorcio GP Flandes para habilitar el paso de las volquetas por la vía privada de la hacienda San Rafael, con lo cual se disminuye en un 80% el paso de vehículos cargados por la vía urbana de acceso al aeropuerto Santiago Vila de Flandes.

Registro de actividades de obra

Durante el mes de febrero del año 2025 se llevaron a cabo actividades de obra, como se muestra en el siguiente registro.

1- Actividades de replanteo, localización y levantamientos topográficos





Se realiza localización y replanteo en los diferentes frentes de trabajo que se tienen en obra, tales como pista, box Coulvert en las calles de rodaje Bravo y Alpha, el fresado, los canales y las zonas de seguridad en los costados noroccidental y nororiental.

2- Descapote y conformación.





Se continúa con la actividad de descapote en los sectores aledaños a la pista y entre calles de rodaje, quedando pendiente solo el sector de las estaciones meteorológicas y los árboles.

3- Excavación para mejoramiento de zonas de seguridad



En las zonas de seguridad se adelanta la excavación para llegar a la subrasante previo al mejoramiento entre las abscisas K1+200 a K1+345

4- Excavación para construcción de filtros y canales.





Se avanza en la excavación de filtros y canales en el sector norte del aeropuerto. Se han completado 1300 m de filtros de 6” y 8”, y de canales se completó el costado derecho hasta la calle de rodaje Bravo 1 y el costado norte, actualmente se trabaja en el canal del costado izquierdo para llegar hasta la calle de rodaje Bravo.

A principio de mes se tuvieron reprocesos por las lluvias, sobre todo en el frente de canales, debido a que la parte inferior queda en un estrato de arenas y estas son suceptibles de erosión por la escorrentía.

Se ha realizado la excavación para la construcción de los box Coulvert que interceptan la calle de rodaje Alpha y la calle de rodaje Bravo.

5- Canales perimetrales







Se realiza el retiro de la subestación eléctrica del costado nor-oriental por parte de la Aerocivil, y se puede completar la línea de canal de ese costado hasta la calle de rodaje Bravo 1.

Actualmente se trabaja en el vaciado de canal norte, donde las paredes tienen una inclinación de 60°, con una dificultad mayor para la colocación del concreto.

Se recibió visita de los proveedores Argos y Cemex, con el fin de validar la presencia de fisuras en el concreto de canales, estimando que son de tipo retracción por temperatura y recomendaron mejorar el curado y cambiar las horas de vaciado a las 7 am.

6- Fresado, mezclado (reciclado) y conformación de subbase reciclada de la pista.





Se avanza en la actividad de fresado, mezclado y conformación de subbase reciclada de la pista, de acuerdo con los diseños apropiados y la estructura de pavimento optimizada, donde se reutiliza el material del pavimento existente para convertirlo en una subbase granular, en un espesor de 30 cm.

Se dio inicio a las actividades de fresado en la calle de rodaje Alpha y Bravo

7- Fresado, mezclado y conformación de subbase reciclada de la pista.



Se concluye con éxito la actividad de fresado en los 1600m de pista existente y se avanza en el reciclado del material tipo RAP mezcla con el granular existente y una adición de subbase desde la K1+050 hasta la K1+685.

8- Estaciones meteorológicas









Se recibe visita de la dirección regional y grupo de mantenimiento de equipos meteorológicos y se inicia el retiro de las Estaciones Meteorológicas que pertenecen a la Aerocivil, una en el costado norte y otra en el costado sur La estación del IDEAM, fue gestionada por la entidad y también fue retirada.
Se retiró la Estación meteorológica del costado norte, con lo cual se pudo completar el canal perimetral de este sector hasta la calle de rodaje Bravo 1 y También se retiró la EMA del costado sur por personal de la Aerocivil.
Se iniciarían los trabajos de construcción de las bases en concreto para reubicar las dos estaciones de la Aerocivil, contando con el acompañamiento del personal encargado de la entidad.

9- Reprocesos por lluvias








Debido a las fuertes lluvias se tuvieron reprocesos en la excavación mecánica y perfilación de canales, disminuyendo el rendimiento de esta actividad, al igual que ha causado retrasos en el vaciado de concretos en canales, al no poder correr el agua libremente en el sector donde se encontraba la Estación meteorológica, se inundó la zona de trabajos.

10- Calidad

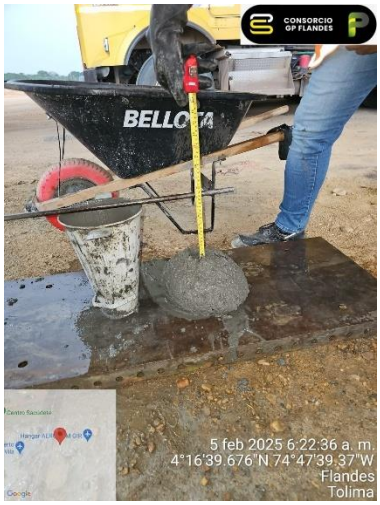



Control de concretos:

Para cada camión de concreto que llega a la obra se le toma el asentamiento y la temperatura, como primer control de la calidad del concreto que llega a la obra, luego se sacan muestras de concreto en cilindros de 10x20 cm, se marcan y se llevan a la poceta de curado.


Ya se ha implementado el laboratorio en obra, en donde se procesarán ensayos de control de calidad de materiales granulares, tales como, afirmado, subbases y bases, mediante ensayos de granulometrías, límites, índice de plasticidad. Y para el concreto se ha instalado una prensa hidráulica para el fallo de los cilindros de concreto. Todos los equipos están calibrados y tienen su certificado emitido por Pinzuar.

11- Componente social





Se finalizó la labor de elaboración de las actas de vecindad y entorno de las viviendas y propiedades aledañas al proyecto.

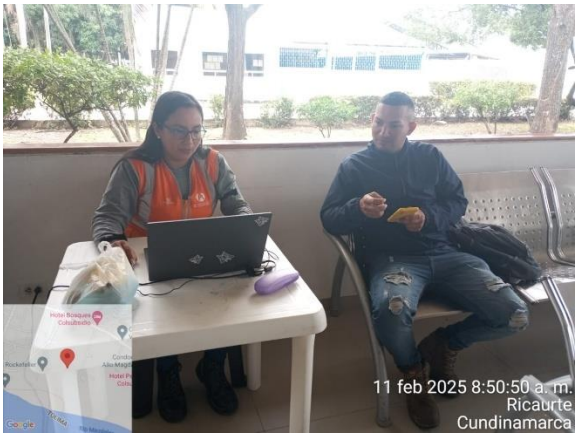



Se continua con la atención de PQRs y la recepción de hojas de vida del personal residente en Flandes, con el fin de vincularlos al proyecto, en donde se ha logrado ingresar a mas del 50% de personal de la zona y entre ellas a un grupo de madres cabeza de familia que están desempeñando como controladoras viales, para lo cual se realizó una capacitación a estas auxiliares de tránsito, para mejorar el ingreso de vehículos a la obra y el control de los diferentes actores de tránsito que intervienen en la vía de acceso al aeropuerto.

También se han realizado convenios con y propietarios de casas, que se han visto afectadas por la emisión de polvo al paso de las volquetas, las cuales mantienen humectación de la vía y el consorcio retribuye dicha laborar con el pago de los recibos del agua.

Como parte del componente social se visitaron a los diferentes operadores del aeropuerto y se realizaron actas de vecindad de cada una de las instalaciones que se encuentran en el aeropuerto y que se pueden ver afectadas por las actividades constructivas.

12- Vías de ingreso al proyecto.



En la vía urbana de acceso al aeropuerto se presenta un incidente con una volqueta que transportaba material para la obra, la cual se hunde por un daño pre-existente en la red de alcantarillado. El consorcio GP Flandes hace presencia en el sector con maquinaria y apoya a la empresa de alcantarillado AQUALIA para la reparación correspondiente, rehabilita la estructura colocando material para los llenos hasta la terminación de los trabajos.



Se logra obtener permiso por una vía alterna por la hacienda San Rafael , con el objetivo de reducir los riesgos sociales del proyecto y disminuir en un 80% el tráfico generado por la construcción en la vía de acceso principal. Actualmente, se están realizando las negociaciones y atendiendo las solicitudes del propietario del predio por donde pasará la vía alterna para obtener los permisos requeridos.

GESTION DEL PROGRAMA DE GERENCIA

Actualmente el proyecto se encuentra en el proceso de EJECUCION y SEGUIMIENTO, y se desarrolla de acuerdo con los planes de gestión para cada área de conocimiento establecidos en el programa de gerencia, donde se establecen las principales acciones a implementar como se detalla a continuación:

PLAN DE GESTION	EJECUCION Y SEGUIMIENTO
Alcance	Definición de mejoramiento en zonas de seguridad definición de tipo de asfalto a emplear en la mezcla P-401 Control de cambios
Cronograma	Cierre total del aeropuerto
	Programación de obra aprobado – Línea base
	Liberación de áreas para Fase 2
	Seguimiento a las actividades constructivas
Costos	Especificaciones de obra
	Flujo de caja y medición de avance por obra ejecutada
	Trámite de precios No Previstos
Riesgos	Tratamiento y estrategia de respuesta Seguimiento y gestión de nuevos riesgos
Comunicaciones	Matriz de interesados
	Correspondencia Actas de comité de obra Actas de vecindad y entorno Reunión con interesados
Calidad	Plan de inspección y ensayos Cumplimiento de materiales a emplear Certificación de equipos de laboratorio Control de fuentes de material con proveedores Implementación de laboratorio en obra Aseguramiento de la calidad en actividades desarrolladas Certificación de materiales empleados en la obra
Recursos y adquisiciones	Compra y negociación de insumos
	Contratación de personal
	Gestión del anticipo y Trámite de órdenes de pago por fiducia Gestión de pagos de cortes de obra Contratación de nuevos equipos para la FASE 2 Contratación de operadores de la zona y disminución del personal foráneo

Tabla 6- Matriz de integración con las áreas de conocimiento (fuente propia)

Gestión del alcance:

Para completar el alcance establecido luego de la culminación de la etapa de pre-construcción, se presentaron durante el mes de febrero de 2025 las siguientes novedades, que, aunque no modifican el alcance, si constituyen actividades imprevistas que se deben ejecutar:

- Revegetalización de taludes en canales excavados.
- Servidumbre de paso alternativo para ingreso de material en volquetas al proyecto.
- Reubicaciones de torres meteorológicas.
- Bombeo de aguas lluvia.
- Incorporación de fibras en los concretos para minimizar la aparición de fisuras.
- Demolición de estructuras de concreto

Dado que la Autoridad Aeronáutica objetó la pavimentación de los 3,0 de márgenes a lado y lado de la pista como estaba en los diseños originales, se aumentó el mejoramiento de las zonas de seguridad los 28 m medidos desde el borde de pista. Para la legalización del presupuesto se requiere la aprobación de precios no previstos y el balance de las cantidades de obra de acuerdo con los siguientes cambios que arrojaron los diseños:

1- Canal de descarga por fuera del predio del aeropuerto
2- Construcción de filtros
3- Cuarto técnico para equipo eléctricos
4- Zona inundable costado Sur
5- Box Coulvert
6- Optimización de la estructura de pavimento
7- Zona blanda en margen de seguridad

Los anteriores puntos describen las modificaciones que se deben realizar en el presupuesto de obra para dejar el aeropuerto operativo, manteniendo el mismo alcance inicial que corresponde al mejoramiento de la infraestructura lado aire del aeropuerto Santiago Vila, llevando a categoría 3:C en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 14, pero no siguiendo cabalmente la recomendación de la norma FAA en cuanto a la capacidad del terreno que conforma la zona de seguridad, ya que solo se podrá hacer un mejoramiento parcial de la misma con los recursos disponibles actualmente.

Finalmente se puede concluir que las obras al interior del aeropuerto tienen una modificación en el alcance en tres aspectos, la primera tiene que ver con el cuarto eléctrico, la segunda con la incorporación de obras de drenaje subsuperficial en las zonas de seguridad y la tercera con el revestimiento del canal de salida que se encontraban en el proyecto inicial.

Gestión del Cronograma:

A continuación, se presenta el seguimiento al flujo de inversión para las actividades desarrolladas por el consorcio GP Flandes, en el mes de febrero de 2025:

Capitulos -Actividades (CA)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado $ Valor programado	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA + IVA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA + IVA	$ Valor Ejecutado %Ejecutado	feb-25
GENERALES	$955.477.332	1,98%	100,00%	% P	0,20%
				$ P	$94.294.311
	$562.340.284	1,16%	$562.340.284	% E	0,34%
				$ E	$166.627.758
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA	$11.965.174.499	24,75%	100,00%	% P	2,39%
				$ P	$1.155.420.541
	$236.338.897	0,49%	$236.338.897	% E	-0,12%
				$ E	-$55.857.145
NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	$19.374.085.212	40,08%	100,00%	% P	2,95%
				$ P	$1.427.647.236
	$10.541.711.297	21,68%	$10.541.711.297	% E	6,02%
				$ E	$2.911.465.930
REHABILITACION CALLE DE RODAJE ALPHA	$1.132.242.886	2,34%	100,00%	% P	0,00%
				$ P	$0
	$14.596.026	0,03%	$14.596.026	% E	0,03%
				$ E	$14.596.026
REHABILITACION CALLE DE RODAJE BRAVO	$859.814.086	1,78%	100,00%	% P	0,00%
				$ P	$0
	$12.336.261	$0	$12.336.261	% E	0,03%
				$ E	$12.336.261
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	$617.881.716	1,28%	100,00%	% P	0,00%
				$ P	$0
	$81.662.033	0,17%	$81.662.033	% E	0,00%
				$ E	$0
SISTEMA DE DRENAJE	$5.195.321.755	10,75%	100,00%	% P	1,65%
				$ P	$799.834.683
	$1.596.099.592	3,28%	$1.596.099.592	% E	0,90%
				$ E	$433.962.655
BOX COULVERT	$1.321.557.408	2,73%	100,00%	% P	0,93%
				$ P	$448.836.288
	$549.275.809	1,13%	$549.275.809	% E	1,00%
				$ E	$485.456.707
AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE ILUMINACIÓN)	$2.971.768.040	6,15%	0%	% P	0,00%
				$ P	$0
	$0	0,00%	$0	% E	0,00%
				$ E	$0
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS	$3.656.316.402	7,56%	0%	% P	0,16%
				$ P	$77.059.482
	$0	0,00%	$0	% E	0,00%
				$ E	$0
GESTIÓN FORESTAL	$56.091.384	0,12%	0%	% P	0,03%
				$ P	$16.061.352
	$0	0,00%	$0	% E	0,00%
				$ E	$0
APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR	$229.274.060	0,47%	100,00%	% P	0,00%
				$ P	$173.437
	$229.274.060	0,47%	$229.274.060	% E	0,00%
				$ E	$0

Tabla 7- Actividades programadas para el mes de febrero de 2025 (fuente propia)

En el mes de febrero de 2025, se ejecutaron las actividades programadas y en el cuadro de seguimiento se observa un leve atraso en el capítulo de REHABILITACION Y AMPLIACION DE PISTA, debido a que el NP no ha sido aprobado y a la actividad de fresado no se le dio avance, a pesar de ser parte de la solución planteada en la optimización de diseños.

La inversión programada del mes de febrero del 2025 corresponde a un 8,3% del valor total del contrato y con la ejecución reportada se alcanzó un 8,0% de lo programado a pesar de las lluvias de principio de mes.

En la ejecución acumulada se lograron adelantar actividades en varios frentes de trabajo consiguiendo una ejecución acumulada del 28,4% sobre un 24,1%, manteniendo un adelanto del 4,3% que representa 19 días de adelanto.

Con este resultado, el contratista se encuentra cumpliendo los indicadores de gestión de Porcentaje de ejecución y de costo del proyecto que establece la Aeronáutica Civil.

Como parte de la gestión del cronograma el consorcio GP Flandes ha dispuesto de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas como se muestra en la tabla 8:

DESCRIPCIÓN	RECURSOS
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4 comisiones de topografía 4 estación total 4 niveles de precisión 1 equipo RTK
DESCAPOTE A MÁQUINA Y EXCAVACIONES, RAJÓN	3 buldócer 1 excavadoras 20 Ton 6 volquetas 6 ayudantes 2 controladoras de tránsito
MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD	1 excavadora 20 Ton 2 motoniveladoras 2 compactadores vibratorios 1 carrotanque de agua 1 retrocargador 13 volquetas
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PISTA	1 fresadora 1 recicladora 1 motoniveladora 1 vibro compactador 1 carrotanque de agua 3 volquetas 1 retrocargador de llantas
INSTALACIÓN DE CONCRETOS	15 ayudantes 12 oficiales Formaletas Herramienta menor Laboratorio Concreto Argos

Tabla 8- Recursos dispuestos para las actividades programadas en el mes

Indicadores de gestión:

Cuantificación del tiempo real ejecutado: SPI

SPI = EV / PV = 13.823 / 11.711 = **1,18**

Donde:

PV: Valor Planeado acumulado a febrero de 2025
EV: Valor Ejecutado acumulado (corte informe semanal # 40)

Evaluación: EVAL (etapa de construcción = 15 meses)

EVAL = Tiempo de ejecución total / 100 x Avance
Tiempo de ejecución total = 15 x 30 = 450 días
Avance = 4,3%

EVAL = 450 / 100 x 4,3 = 19,3 días

La evaluación del tiempo arroja un muy buen desempeño por parte del contratista de obra, con un adelanto de 19,3 días con respecto a lo programado.

En la tabla 7 se puede observar el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el mes de febrero de 2025, de acuerdo a la programación de obra.

Por otro lado, el mes de febrero de 2025 finaliza con la ejecución de siete (7) frentes de trabajo simultáneos, distribuidos así:

Frente 1: Construcción de canales, en este frente se desarrollan actividades de excavación por el costado izquierdo donde se tuvieron inconvenientes la semana pasada por la erosión de taludes por las fuertes lluvias y gran parte de esta semana se estuvo corrigiendo la base del canal. Por otro lado, en el costado Norte se avanzó en la perfilación, amarre de acero y colocación de concreto para los canales.



Ilustración 2- Construcción de canal Norte

Frente 2: Terminación de box Coulvert de salida, en este frente se fallaron los testigos de concreto a 7 y 14 días, obteniendo resistencias satisfactorias por lo que se procede con el llenado de los aproches y aletas, para retomar el paso por esta estructura en la vía que conduce al campamento de obra.



Ilustración 3- Puesta al servicio box Coulvert de salida

Frente 3: Box Coulvert calle de rodaje Bravo, en este frente se avanza con la instalación de acero de refuerzo y vaciado de piso y muros, completando un avance del 25% en esta estructura.



Ilustración 4- Construcción de Box Couvlert 2

Frente 4: Box Coulvert calle de rodaje Alpha, la semana pasada se avanzó con la excavación total de la estructura y la colocación del mejoramiento para la cimentación del box.



Ilustración 5- Construcción de Box Coulvert 1

Frente 5: Calle de rodaje Alpha y Bravo, en este frente se terminó con la actividad de fresado y se inició la excavación de la calle Alpha para dar paso a la instalación de la estructura del pavimento que consiste en mejoramiento con piedra, sellado con afirmado, subbase P-154, base P-259 y mezcla asfáltica P-401.



Ilustración 6- Explanación de calle Alpha

Frente 6: Pista, en este frente se avanza con las ampliaciones laterales y la colocación de subbase reciclada, ya se terminó todo el fresado y se tienen dos recicladoras para la mezcla del RAP con el granular existente, y una motoniveladora con vibro compactador y carrotanque para la conformación del material reciclado.



Ilustración 7- Rehabilitación de pista

Frente 7: Zonas de seguridad, se terminó el descapote de todos los sectores a intervenir haciendo falta solo la zona de los árboles donde se tramita el permiso de aprovechamiento forestal se avanza en varios sectores simultáneamente con actividades como excavación para mejoramiento, instalación de afirmado tipo B400, colocación de limo y llenado de canales existentes.



Ilustración 8- Descapote y excavación en zonas de seguridad

Gestión de costos:

A continuación, se presenta el balance financiero acumulado incluyendo la etapa de pre-construcción y el acta de obra No. 4 con periodo de corte del 26 de enero de 2025 al 25 de febrero de 2025, en el que se observa la obra ejecutada para el periodo citado, correspondiente al 7,99% respecto al valor total del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		$ 48.620.604.781
2.Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 48.620.604.781
4. Valor pagado del anticipo %	23,3%	$ 11.302.256.916
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 37.318.347.865
6. Valor presente acta		$ 3.884.422.519
7. Valor amortizado en la presente acta	23,3%	$ 905.070.447
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 2.979.352.072
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 8.162.819.889
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 1.030.990.294
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 22.444.428.877
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 26.176.175.904
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 9.366.196.175
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**26,90%**

Tabla 9- Balance financiero del contrato con corte al acta de obra N°4 (fuente propia)

Para este período se realizaron actividades en diferentes de trabajo y se validaron las obras con base en los diseños aprobados, con el fin de controlar que solo se ejecute la obra contratada, como sigue:

Frente 1: Se revisó la sección transversal del canal con la topografía de la interventoría y se implementaron controles con una comisión topográfica adicional que ingreso en el mes de febrero. En cuanto al revestimiento con concreto y acero, se realizaron pruebas con diferentes componentes como fibras y plásticos en la zona baja de la cuneta, pero la que mejor ha dado resultado es el vaciado en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde.

Frente 2: Se terminaron las aletas del box Coulvert de salida y se realizaron los llenos para retomar el paso por esta vía privada. Queda pendiente la adecuación del terreno para el sostenimiento del árbol que se encuentra cercano a la estructura y que no quedó dentro del inventario.

Frente 3: En cuanto al box Coulvert 2, se trabaja con base en los diseños aprobados en la instalación de acero de refuerzo revisando el distanciamiento de las barras según cartilla y el vaciado de concreto según cotas de planos.

Frente 4: En el Box Coulvert 1, correspondiente a la calle de rodaje Alpha se termina la instalación del mejoramiento y se programa el vaciado de concreto de solado para obtener una superficie limpia y uniforme para la instalación del acero de refuerzo de esta estructura.

Frente 5: En cuanto a la calle de rodaje Alfa, ya se terminó la excavación y se espera recibo de interventoría para proceder a la instalación del mejoramiento, el cual se hace con crudo de río y sellado de 15 cm con Afirmado tipo B-400.

Frente 6: Para la rehabilitación de pista, se presentan los NPs correspondientes para su aprobación

Frente 7: En las zonas de seguridad se establece que se realizará mejoramiento hasta los 28 m, medidos desde el borde la pista y el resto quedará conformado con limo de la zona.

Las actividades ejecutadas y su cantidad de obra validada por interventoría son las siguientes:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 4	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT	V/ PARCIAL
1- GENERALES					
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	M2	$ 2.200	76.276,8	$ 167.808.960,00
2- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA					
3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA					
3.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	$ 37.905	56.815,8	$ 2.153.602.899,00
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 65.700	1.307,7	$ 85.915.890,00
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	$ 144.000	2.784,0	$ 400.896.000,00
4- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA					
4.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 51.127	284,2	$ 14.530.293,40
5- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO					
5.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 51.127	240,2	$ 12.280.705,40
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 164.000	355,0	$ 58.220.000,00
6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
7- SISTEMA DE DRENAJE					
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 65.700,0	4.622,2	$ 303.678.540,00
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	$ 1.001.929,0	221,3	$ 221.726.887,70
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	$ 10.055,0	2.167,5	$ 21.794.212,50
8- BOX COULVERT					
8.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	$ 65.700	2.594,3	$ 170.445.510,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	$ 10.055	12.740,9	$ 128.109.749,50
8.3	RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT	M3	$ 123.500	103,7	$ 12.806.950,00
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	$ 1.658.684	69,4	$ 115.112.669,60
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU					**$ 3.866.929.268**
IVA					$ 17.493.251
A. TOTAL OBRAS					**$ 3.884.422.519**

Tabla 10- Actividades facturadas Acta #4 de obra (fuente propia)

En la ejecución mensual hubo un desfase de $ 183 millones, pero en el acumulado se tiene un adelanto de $ 2.358 millones, lo que representa un 4,8% por encima a lo planeado.

Como parte de la gestión de costo, se destacan las siguientes acciones para completar las tareas propuestas para el mes de febrero del año 2025:

1- Implementación de frentes de trabajo por fuera de la zona de seguridad en la nueva clasificación de aeródromo 2:B
2- Excavación de canales por etapas para generar zonas de drenaje en caso de lluvias
3- Extensión de las jornadas de trabajo para aprovechar las horas luz del día y evitar tiempos muertos del personal y los equipos. Adicional para evitar fisuramientos en los concretos por vaciados durante climas extremos.
4- Actividades de bombeo y “secado” del material para mitigar la afectación por las lluvias.
5- Taller de mecánica en obra para mantenimientos y rápida reparación de equipos.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la interventoría para analizar y revisar la fórmula de ajuste con los índices ICOCIV de acuerdo con el contrato de obra, en donde se define que se utilizará el indicador global para el cálculo del factor de ajuste tomando los meses de abril de los años 2025 y 2024 para dicho calculo y se aplicará desde el mes de enero de 2025, con el mismo valor de ajuste para todo el año, mes a mes.

Indicadores de gestión del costo

Cumplimiento: VAL

VAL = Costo real período / costo programado período x 100

Costo real período = $ 3,968.588.191

Costo programado período = $ 4.019.327.331

VAL = 98,7%, se obtiene un porcentaje de ejecución cercano al 100%

La pequeña variación del costo presentada, se debe a dos razones principalmente:

1- Lluvias intensas al principio del mes
2- Aprobación de ítems No Previstos

Durante la revisión de compromisos en los comités celebrados durante el mes de febrero de 2025, se discutió el estado de revisión de los precios No Previstos (NP). De parte de la interventoría se informó que este compromiso se encuentra en estado de "Atención y complementación" por parte del contratista de obra y por mutuo acuerdo entre las partes, se estableció como nueva fecha de entrega el 24 de febrero de 2025, día en el cual el contratista presentó la documentación con las observaciones atendidas para la revisión por parte de la interventoría.

Gestión del riesgo:

A la fecha continuamos realizando la gestión de riesgo bajo la matriz presentada durante la etapa de pre-construcción. En la tabla 11 se relacionan los principales riesgos (por probabilidad e impacto) seleccionados en el análisis inicial de ocurrencia de eventos, y describiremos la materialización de algunos y el tratamiento dado por parte del contratista.

ETAPA DE CONSTRUCCION FECHA: Noviembre de 2024



No.	Descripcion	Tipo	Tratamiento propuesto	Clasificación despues del tratamiento		
				Probabilidad	Impacto	Categoría
1	Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales y/o transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato debido a cambios intempestivos de las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado.	Económico	Tramitar el anticipo y hacer un análisis de fuente de materiales, para negociar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo de la obra.	1	2	3
2	Escases de mano de obra calificada y no calificada	Económico	Realizar la divulgación de vacantes en las diferentes plataformas y redes sociales locales. Hacer estrategias de contratación con la alcaldía del municipio de Flandes	1	2	3
3	Mayores costos del transporte de material resultante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado.	Económico	Realizar una investigación en los predios vecinos donde se cuenta con permisos de nivelación, para disponer adecuadamente el material de excavación resultante de la obra. Reciclar material de acuerdo al PAGA, para la conformación de la capa blanda en la superficie final de las zona de seguridad.	1	2	3
4	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vias de acceso al Aeropuerto.	Social Politico	Monitorear constantemente el entorno de vecindad al aeropuerto y hacer gestión social, atender las PQRS de la comunidad vecina de forma inmediata	1	2	3
5	Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas.	Social Politico	Implementar adecuadamente un Plan de Manejo de Transito, mantener humectadas las vías de acceso al aeropuerto que son destapadas. Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comuniocación fluida y asertiva con las comunidades del entorno del Aeropuerto o de la zona de obra. Articular proyectos sociales con la alcaldía local y atender necesidades básicas de las counidades vulnerables.	2	3	5
6	Retención forzada de personal y/o equipos	Social Politico	Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona.	2	3	5
7	Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades extemas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros	Social Politico	Incluir en la matriz de interesados a los operadores del aeropuerto, gremios, proyectos de desarrollo vecinos e indagar sobre sus intereses y como gestionarlos	2	3	5
8	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Social Politico	Establecer un plan de seguridad física, contratar una empresa de seguridad y mantener comunicación con el servicio de vigilancia del aeropuerto	1	3	4
9	Terminación o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia de la ejecución de un contrato de concesión u otro contrato en ejecución y/o modificaciones al contrato de concesion u otros contratos existentes en el Aeropuerto.	Operacional	Solicitar a la interventoría información sobre contratos vigentes o en trámite del aeropuerto, tanto en su operación como en la construcción de infraestructura física	1	2	3

10	Falta del contrato suscrito de interventoría para el incio del contrato de obra	Operacional	Trasladar a la entidad, manteniendo las obligaciones del contratista de obra al día en cumplimiento de todos los requerimientos contractuales	1	3	4
12	Demoras en la expedición de permisos internos por el concesionario o el explotador del aeródromo o aeropuerto para realizar los trabajos en áreas restringidas de la zona lado tierra o lado aire del aeropuerto.	Operacional	Gestionar permiso con propietario de predio privado Conseguir concepto de franjas en el mes de noviembre 2024 Realizar trabajos en zonas donde no se requieran permisos	1	3	4
22	Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra	Operacional	Implementar un plan integral de vectores de acuerdo a la normavidad vigente aplicable	1	2	3
24	Riesgos por eventos asociados a la operación aeréa.	Operacional	Tramitar los NOTAM necesarios para la ejecución de los trabajos de construcción	1	2	3
26	No disponibilidad de "STOCK" para sistemas de ayudas visuales, cuando se afecte como consecuencia de daños causados por el contratista	Operacional	Realizar un plan de compras de acuerdo con la programación de obra y adelantar el contrato con el proveedor especializado para que inicie los procesos de importación	2	2	4
27	Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto.	Natural	Construir canales provisionales para un adecuado manejo de las aguas lluvias	2	2	4
28	Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos	Natural	Construir vías industriales para acceder a los sitios de trabajo en donde sea posible	2	2	4
31	Ocurrencia de fenómenos naturales que puedan afectar la ejecución de la obra.	Natural	Monitorear las redes de emergencia como bomberos, defensa civil y oficina nacional de atención de desastres, para establecer los planes de contingencia que se requieran	1	2	3
32	Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	Natural	Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios.	1	2	3
36	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Social Politico	Monitorear las redes sociales de la alcaldía de Flandes, La Gobernación del Tolima y su alineación con el gobierno nacional	1	2	3
37	Cambio en los indicadores de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras.	Financiero	Tramite del anticipo de obra y gestión de pago de actas con cortes mensuales, legalización de los precios No Previstos	2	3	5

Tabla 11- Tratamiento y valoración a los riesgos de la etapa de construcción (fuente propia)

Como se puede observar tenemos los siguientes riesgos en color rojo, que representan una amenaza para el proyecto y que deben mantenerse monitoreados e implementar los tratamientos adecuados, como se describe a continuación:

Riesgo 4: Vía de acceso al aeropuerto: el tránsito de volquetas ha generado inconvenientes con la comunidad del Barrio Obrero. En la vía de acceso al aeropuerto se presenta un incidente con una volqueta que transportaba material para la obra, la cual se hunde por un daño pre-existente en la red de alcantarillado. El consorcio GP Flandes hace presencia en el sector con maquinaria y apoya a la empresa de alcantarillado AQUALIA para la reparación correspondiente, rehabilita la estructura colocando material para los	

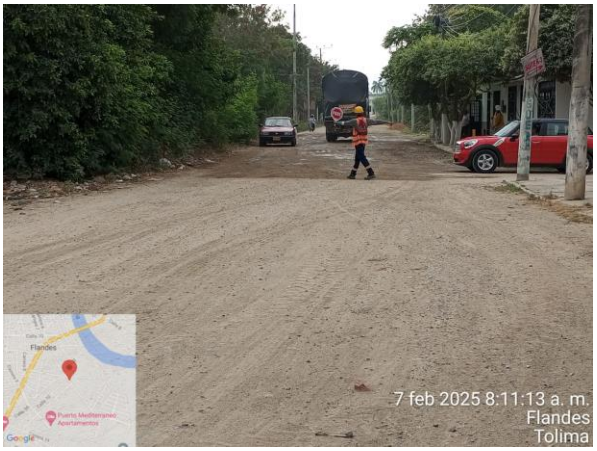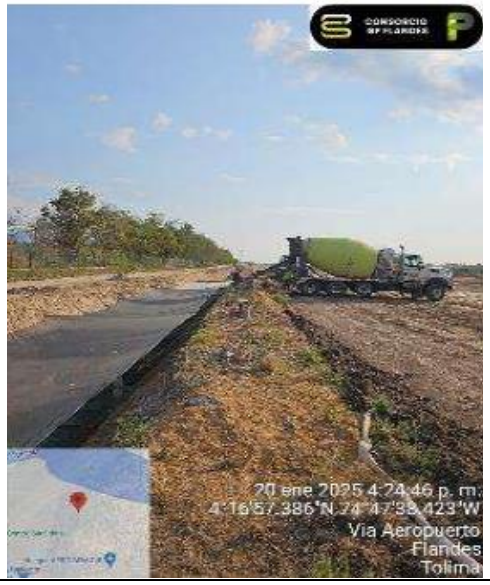llenos hasta la terminación de los trabajos. Se está gestionando una propuesta de ruta diferente a la vía de acceso actual al aeropuerto, con el objetivo de reducir los riesgos sociales del proyecto y disminuir en un 80% el tráfico generado por la construcción en la vía de acceso principal. Actualmente, se están realizando las negociaciones y atendiendo las solicitudes del propietario del predio por donde pasará la vía alterna para obtener los permisos requeridos. Se realiza jornada de aseo y limpieza y se divulga el incidente con los conductores para tomar los correctivos durante la circulación por esta vía.	
<u>Riesgos 27 y 28</u>: Se han presentado fuertes lluvias que han inundado las zonas de trabajo generando retrasos en la ejecución de actividades de excavación, conformación de subrasante y vaciado de concretos. Se han empleado metodologías de retiro del agua de manera manual y mecánica.	
<u>Riesgo 28</u>: Se continúa con el vaciado de canales con concreto de 21Mpa. Se han estado realizando pruebas con diferentes materiales y métodos de construcción para mitigar la aparición de fisuras. Se han explorado opciones como el uso de plásticos y microfibras en la mezcla del concreto, así como la implementación de técnicas de curado más eficientes. Sin embargo, aún no se ha encontrado una solución definitiva que elimine por completo el problema. Por lo tanto, se acordó continuar investigando y probando nuevas alternativas, con el objetivo de identificar la causa raíz de las fisuras y encontrar una solución que	

garantice la durabilidad y estabilidad del canal a largo plazo.	
Riesgo 40: Respecto al NP relacionado con el asfalto, la entidad manifestó que no ve factible su inclusión bajo las condiciones establecidas, ya que implicaría que la entidad pague una actividad de menor especificación a un mayor precio que el contractual. Se enfatizó que se podría mantener el asfalto contractual conservando la misma estructura propuesta, sin necesidad de incluir el nuevo NP, dado que el cambio solo afectaría el gradiente de temperatura y no la estructura como tal. Aún está pendiente un informe con el que se pretende demostrar que la ejecución de los trabajos con un asfalto tipo PG 70-22 en lugar del PG76-10 tendría los mismos resultados en lo concerniente a acabado, durabilidad, comportamiento y demás propiedad físicas y químicas de la estructura final.	
Riesgo 24: Se recibe visita de la supervisión del contrato y la dirección de interventoría con el especialista aeronáutico, con quienes se revisan algunos conceptos sobre los obstáculos presentes en el costado sur del aeropuerto Santiago Vila. Se tienen obstáculos correspondientes a 2 torres de energía de alta de 13.200 voltios a 2km, de gran altura, las aeronaves que aterrizan con pendiente mínima deben tener en cuenta este obstáculo debido a que las torres son más altas que lo permitido para el aeropuerto, sin embargo este obstáculo ya se encontraba determinado y cuenta con un NOTAM de altura El riesgo consiste en que al ampliar la pista hacia el costado sur se “aumentó”	

el riesgo del obstáculo, con lo cual se debe tener en cuenta este factor para actualizar el NOTAM. El obstáculo ya está declarado en el AIP.	

Tabla 12- Listado de riesgos gestionados con el tratamiento propuesto en la matriz

Como se puede observar en las medidas tomadas anteriormente para los riesgos materializados, el tratamiento a funcionado adecuadamente y se ha logrado mantener dentro de niveles aceptables para la ejecución. En cuanto a los otros riesgos se mantienen los tratamientos propuestos y constante monitoreo.

Gestión de las comunicaciones

Durante el mes de febrero del año 2025 se identifican nuevos interesados y se alimenta la matriz de interesados en la que se incluyen tanto representantes de la entidad contratante, como de la interventoría y contratista, y la comunidad aeroportuaria de Flandes, como sigue:

MATRIZ DE INTERESADOS

Obra:	MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES	Fecha última actualización:	31/10/2024	CONSORCIO GP FLANDES

Parte Interesada	Nombre Contacto	Cargo	Tel/Cel	Correo electrónico	Observaciones
AEROCIVIL	Andres Arboleda Salazar	Secretario de servicios aeroporturaios	3102356471	andres.arboleda@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Alexander García	Jefe Contratos de mantenimiento Aerocivil	3112699634	alexander.garcia@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Juanita Villamizar	Supervisora del contrato	3194891110	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Johan Camilo Silva	Ingeniero de apoyo a la supervision	3166260591	camilo.silva@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Michel Moreno	Ingeniero de apoyo a la supervision	3124509795	michel.moreno@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Hayder Suarez Zamudio	Supervisor Contrato de Interventoría			
	Gilma del Pilar Lozano	Administradora Aeropuerto Flandes	3208792261	gilma.lozano@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
INTERVENTORIA	Roselly Pajaro	Representante Legal	3012331719	gerencia@gepobras.com	Resultado de interventoría
	Nelson López	Consorciado EPYPSA	3107663103	nelson.lopez@epypsa.com	Resultado de interventoría
	Alfredo Pérez Santos	Director de Interventoría	3167528617	interventoriaflandes@gmail.com	Cumplimiento del contrato
	Jose David	Residente de interventoría	3134286246	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
	Andres Carrillo	Auxiliar de ingeniería de interventoría	3208366270	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
CONTRATISTA	Juan Carlos López de Mesa	Representante Legal	3207971787	gerencia@procopal.com	Resultado del contrato de obra
	Juan Diego Blair Llorens	Gerente General Gisaico	3116297156	gerencia@gisaico.com.co	Resultado del contrato de obra
	Jose Fránklin Hincapie	Gerente UEN Infraestructura Gisaico	3104953297	franklin.hincapie@gisaico.com.co	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ruben Medina	Director técnico Procopal	3104360382	ruben.medina@procopal.com	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ricardo Alberto Muñoz	Director de obra consorcio GP Flandes	3108900285	ricardo.munoz@procopal.com	Dirección y Gestión del proyecto
	Jhon Velez	Ingeniero de apoyo	3225944964	jhon.velez@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Jose Daniel Villegas	Ingeniero residente	3148414926	jose.villegas@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Alvaro Alzate	Topografo líder oficina técnica	3136638805	alvaro.alzate@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
AUTORIDADES	Ana Judith Gamboa	Alcaldesa de Flandes	3102152832	Alcaldesa@flandes.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Adriana Magali Matiz	Gobernadora del Tolima	(608) 2611111	contactenos@tolima.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Salomón Said Arias	Alcalde de Girardot	(601) 8393510	atencionalciudadano@girardot-cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Jorge Emilio Rey	Gobernador de Cundinamarca	(601) 7490000	contactenos@cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
PROVEEDORES	Andrés Perez Frías	Comandante policia Flandes	3213760022	Flandes@policia.gov.co	Seguridad física
	Jorge Tobón	Evaltec	3154593672	gerencia@evaltec.com	Consultoría
	Ricardo Adame	Skytech	3105747923	ceo@skytechsas.com	Consultoría
	Wilson Castell	Cayto tractores	3102231718		Petreos y mezcla asfaltica
	Enrique Mayorga	Mavi Pavimentaciones	3153112256		Petreos y mezcla asfaltica
	Gustavo Pabón	Nautila	3142534199		Materiales petreos
	Felipe Cardenas	Base fija de operaciones - FBO	3125016916		Alquiler zonas de campamento
	Monica Sanchez	Concretos La Floresta	3203876292		Materiales petreos
COMUNIDAD	Luis Henry Varon	Predios contiguos al Aeropuerto	3173705451	henryvaron@me.com	Zodme, afirmado y vía de acceso
	Juan Carlos Ramirez	Predios contiguos al Aeropuerto	3158317059		Posible Zodme por permiso de nivel
	Diego Alvarez	Analista de rutas de SATENA	3192476210	diego.alvarez@satena.com	Nueva ruta en Flandes
	Bernardo Alvarez	Representante Inveraereas	3112365943	inveaereassas@gmail.com	Operación aeropuerto
	David Vilaro	Escuela de instrucción Aeronova	3219703344	coor.calidad@ptcacademy.net	Operación aeropuerto
	Fernando Crespo	Escuela de instrucción Aeroandes	3114428838	operacionesgirardot@aeroandes.edu.co	Operación aeropuerto
	Nestor Caballero	Escuala de instrucción Acahel	3102485525	acahel.academia@gmail.com	Operación aeropuerto
	Elizabeth Medina	Escuela de instrucción Protecnica	3142280014	sms@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Abel Urrea	Escuela de instrucción Aeroclub	3112536392	gerencia@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Ricardo Ospina - Maria Paula C	Escuala de paracaidismo SKY	3165290699	jefedeoperaciones@aerodubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Veronica Restrepo	Asociación de pilotos y aeronaves	3204960558	ricardo@skydivecolombia.com	Operación aeropuerto
	Miguel Angel Ponce	Globe Air FuelIL (combustible aviones)	3124576900	gerencia@gafcolombia.com	Operación aeropuerto
	Felipe Cardenas	FBO - Aerotaxis Guaymaral	3112365943	lfcfbo@hotmail.com	Operación aeropuerto
	Raul Carvajal	Junta de acción comunal - Los Almendros	3219464118		Bienestar para la comunidad

Tabla 13- Matriz de interesados actualizada a febrero de 2025 (fuente propia)

Adicionalmente como parte de la gestión de las comunicaciones se mantienen los grupos de WhatsApp creados con interventoría y supervisión para una comunicación permanente entre las partes, destacando los siguientes temas tratados en el mes de enero de 2025:

- Trámite de Anticipo y creación de terceros en la fiducia
- Permiso del propietario del predio del canal de descole
- Llegada de equipos a obra
- NOTAM y socialización explotadores aeropuerto
- Socialización de acta de permiso del propietario del predio del Box para su construcción
- Registro fotográfico del avance de la obra
- Agenda de comité de seguimiento
- Desmonte estación meteorológica
- Precios de obra extra
- Facturación del acta de obra No. 2 y No. 3.
- Trámite para la aprobación de los ítems no previstos
- Aprobación de la Valla de la obra
- Radicación del plan de aprovechamiento forestal
- Acta de obra No. 4

- Programa social y vía de acceso al aeropuerto

También se ha hecho entrega de informes semanales para cuatro (4) semanas del mes de febrero de 2025, donde se informan las actividades realizadas con su respectivo registro fotográfico y se hace el informe de avance con respecto a lo programado, como se observa en la siguiente gráfica:



Ilustración 9- Comportamiento de la ejecución frente a la programación en el informe semanal (fuente propia)

En cuanto a las reuniones realizadas durante el mes de febrero se destacan las reuniones con los especialistas aeronáuticos y las reuniones con los especialistas en pavimentos.

Comités de obra

Durante el mes de enero del año 2025 se realizaron 2 comités de obra, como se relaciona a continuación:

Comité No.	Temas de la reunión	Planes de acción	Cumplimiento
31. Fecha: 11/02/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 30. Socialización informe semanal N°37. Avance de obra Facturación. Anticipo. Fisuras en los concretos.	Atención de las observaciones de los NPs Radicar a la interventoría las actas de vecindad y entorno de la vía de acceso al aeropuerto	Contratista 24/02/2025 Contratista 24/02/2025

	Nuevos precios (NP's) Notam. Radicación actas de vecindad y de entorno. Servidumbre nueva.		
32. Fecha: 21/02/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 31. Socialización informe semanal. Avance de obra Facturación. Anticipo. Microfisuras en los concretos. Desmonte Torre meteorológica Servidumbre nueva. Nuevos precios (NP's) Notam (ampliación)	Atención y entrega de observaciones a los Nuevos Precios (NPs). Reunión de revisión de componentes ambiental, SST y social. Entrega de actas de comité	Contratista 24/02/2025 Interventoría 26/02/2025 Interventoría 26/02/2025

Tabla 14- Resumen de comités de obra realizados en el mes de febrero del año 2025 (fuente propia)

Como se puede observar en el mes de febrero se trataron temas importantes y necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas, también se dio trámite a las solicitudes por parte del contratista y se elaboró el tercer corte de obra del consorcio GP Flandes, además de presentar los documentos para el desembolso del anticipo.

Se dejaron claros temas relevantes del tema de facturación para la etapa de obra, incluido lo referente a los ajustes.

Correspondencia

Como se puede observar en las siguientes tablas, se ha mantenido una comunicación formal y fluida entre las partes. Destacando los temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales, en donde el contratista ha suministrado la información solicitada por la interventoría, haciendo los ajustes requeridos y las aclaraciones pertinentes, de una manera ágil y efectiva.

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)		CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA		**Código:** FC - 01 **Revisión:** 01 **Vigencia:** Mayo de 2022
Área:	**Tecnica**	**Contrato / Obra:**	**Contrato No. 23001258 H4 2023 / Aeropuertop Flandes**	**Mejoramiento de la infraestructura lado aire del aeropuerto Santiago Vila de Flandes**
FECHA	**ASUNTO**	**CONSECUTIVO**	**DESTINATARIO**	**RESPUESTA**
6/02/2025	Justificación Técnica del refuerzo de las Aletas para el Box Coulvert tipo IV.	15_2288_04_104	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
7/02/2025	Alcance respuesta a su comunicado CIAF-1322H32023-229	15_2288_04_105	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
9/02/2025	Respuesta comunicado paso vehicular vía de acceso al aeropuerto	15_2288_04_106	Presidenta de junta de acción comunal. Barrio La Esperanza de Flandes	
10/02/2025	Abstenerse de efectuar retención en la fuente a título de ICA en el municipio de Flandes - Tolima		Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	
12/02/2025	Entrega de actas de vecindad para revisión de Interventoria	15_2288_04_107	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
13/02/2025	Respuesta solicitud de pago del anticipo contrato de suministro SPS-001-2024 y cumplimiento del contrato		Ferretería Multihierros Girardot S.A.S	
17/02/2025	Oficio Remisorio de Acta de obra No 3	15_2288_04_108	Representante legal Consorcio Aerovias Flandes	
27/02/2025	Respuesta a las dos solicitudes (PQRS) recibido el día 21 de febrero de 2025	15_2288_04_109	Administradora del conjunto puerto Bahia - Etapa 2 Km 1 - Vía al Aeropuerto Santiago Vila de Flandes	
27/02/2025	Respuesta derecho de petición recibido el día 8 de febrero de 2025	15_2288_04_110	Administradora del conjunto puerto Bahia - Etapa 2 Km 1 - Vía al Aeropuerto Santiago Vila de Flandes	

Tabla 15- Control de correspondencia enviada (fuente propia)

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)			CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA				**Código:** FC - 02 **Revisión:** 01 **Vigencia:** Julio de 2024
Área:	**Tecnica**	**Contrato / Obra:**	**Contrato No. 23001258 H4 2023 / Aeropuertop Flandes**	**Objeto contrato:**	**Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).**		
CONSECUTIVO INTERNO	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA OFICIO**	**ASUNTO**	**CÓDIGO DEL DOCUMENTO RECIBIDO**	**DIRIGIDO A**	**OFICIO RESPUESTA**	**OBSERVACIONES**
		6/02/2025	Informe mensual de enero de 20225	CIAF-1322H32023-229	Ricardo Alberto Muñoz		
		21/02/2025	Acta de cobro No.3-Contrato de obra 23001258 H4 2023	CIAF-1322H32023-237	Juanita Villamizar		

Tabla 16- Control de correspondencia recibida (fuente propia)

Gestión de la calidad

Las actividades de obra ejecutadas durante el mes de febrero de 2025 fueron las siguientes:

1.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD

3.1 DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)

3.2 EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

3.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.

4.1 FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

5.1 FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

5.3 MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

7.2 EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

7.3 CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.

7.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)

8.1 EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.

8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)

8.3 RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT

8.4 CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC

Los controles de obra descritos en el plan de inspección y ensayos fueron realizados durante las intervenciones. Los ensayos o análisis respecto a la calidad de la obra ejecutada se presentarán en el siguiente mes y corresponden a los siguiente:

ACTIVIDAD	ENSAYO / EVIDENCIA
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	Para los niveles y estaciones: - Certificado de calibración vigente (Externo) - PCF-62 Control del Equipo de Seguimiento y Medición - Sticker de calibración - CC-F-38 Programación de Verificación y Calibración de Equipos - CCP-01 Procedimiento para el control de los equipos de seguimiento y medición - PCF-30 Recibo de Niveles por Topografía R2 - Cartera topográfica
Actividades de excavación y descapote	Para la geometría: - Informe de inspección en obra - Registros de visita a obra del geotecnista. - Cartera topográfica Para el acabado: - De ser necesario adelantar ensayos de PDC para determinar la cota final de la excavación según el tipo de suelo.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS. MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT.	Para el material: - Ensayo de laboratorio externo de DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161 – 13 Para el acabado geométrico: - Informe de inspección en obra - Cartera topográfica

ACERO DE REFUERZO	- Certificado de Calidad del material - FR-CO-06 Informe de inspección en obra
CONCRETOS DE 21MPA Y 28MPA	Para el material: - Remisión. - Resultado del ensayo a compresión. - FR-CO-06 Informe de inspección en obra - FR-CO-10 Control resistencia a la compresión de concreto Para el elemento vaciado: - FR-CO-06 Informe de inspección en obra - FR-CO-10 Resistencia a la compresión de concretos

Tabla 17. Controles a implementar actividades ejecutadas mes 4.

Como parte del aseguramiento de la calidad durante el mes de febrero se adelantaron ensayos de RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO bajo la norma INV E – 410: 2013 para la mezcla de concreto que se está utilizando en la construcción del Box Coulvert y demás estructuras de drenaje. Los resultados son preliminares ya que solo se tienen las resistencias a 7 días, quedando a la espera de los resultados de resistencia a 28 días. Cabe destacar que aún a tan temprana edad de fallo, los cilindros arrojan resistencias por encima de los esperado.

Se adjuntan los ensayos de calidad de los materiales.

Gestión de recursos y adquisiciones

En cuanto a las adquisiciones resaltamos la consolidación de los equipos de la siguiente manera.

Se tiene el acompañamiento de los siguientes especialistas:

Especialidad	Nombre
Pavimentos	Stella Martínez Naranjo
Geotecnia	Jorge Alberto Tobón García
Hidrología e Hidráulica	Gloria Jenny Mejía Sierra
Eléctrico AGL	William Ricardo Adame Manosalva
Costos y Programación	Carlos Andrés Bedoya
Ambiental	Ana María Saldarriaga
Forestal	Leidy Johana Calderón

Tabla 18- Adquisición del equipo de especialistas

Como equipo directivo y acompañamiento en la etapa de pre-construcción se tiene a las siguientes personas:

Cargo	Nombre
Director de obra	Ricardo Alberto Muñoz
Residente de obra 1	José Daniel Villegas
Residente de obra 2	Jorge Mario Soto
Ingeniero de apoyo	Jhon Edison Vélez
Jefe de topografía	Álvaro Álzate
Profesional social	Maida Berrío
Gestor SST	Alexander Acevedo
Abogada	Luz Mercedes Vélez
Especialista PMP	John Edgar Arango

Tabla 19- Adquisición del equipo de dirección

Como equipo de construcción complementario se ha dispuesto al siguiente personal

Cargo	Nombre
Técnico Sisoma	Alex Gustavo Pachón
Auxiliar SST	Estefany Tafur
Auxiliar Social	Mary Cruz Vélez
Ingeniero mecánico	Pablo Torres
Técnicos electricistas	Cristian Castellanos, Ángel Duván Manosalva Johan Smith Rozo Julio Nova
Topógrafos	Heli Castro Villareal Nixon Arturo Calle Leonardo Miranda Alvaro Alzate
Cadeneros tecnólogos	Luisa Fernanda Perdomo David Ricardo Rodríguez Gustavo Andrés Rubiano Diana Ortiz

Tabla 20- Adquisición del equipo de construcción

Para la elaboración de las fichas PAGA se ha contratado a la especialista ambiental Norella Galvis.

Dentro de los proveedores de materiales, se han adelantado negociaciones con los siguientes:

Proveedor	Localización	Materiales que proveen
Nautila SAS	Km 5 vía Flandes hacia El Espinal	Base y Subbase granular
MAVI Pavimentos	Km 3 vía a Carmen de Apicalá	Recebo Base y Subbase granular Mezcla asfáltica
Cantera La Colina	Km 8 vía a Melgar sector Nilo	Afirmado B400
Ferretería Multihierros Girardot	Sede principal en Girardot, fuentes de material en Melgar	Piedra rajón
Tornillería La 7a	Girardot	Materiales de construcción
Ana Carvajal	Km 3 vía a Ibague	Combustible
Argos	Intercambiador Espinal	Concreto hidráulico
Stecker aceros	Planta de Bogotá	Acero de refuerzo

Tabla 21. Relación proveedores inscritos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Durante el mes de febrero se continuó la gestión de los trámites para conseguir los diferentes permisos que se requieren para iniciar los trabajos de construcción faltantes en cada uno de los frentes de trabajo de las fases siguientes.

2- El consorcio GP Flandes hasta la fecha ha superado las metas propuestas en el programa de obra, alcanzando un avance del 4,85% sobre lo planeado. Se observa adelanto en actividades como la intervención de la pista y las calles de rodaje donde ya se ha terminado la etapa de fresado, además del descapote que ya se ha ejecutado en todas las áreas disponibles, mostrando un excelente desempeño del contratista con miras al cumplimiento de los compromisos de la FASE 2, para la entrega de 1.200m de pista para la operación del aeropuerto Santiago Vila.

3- Con corte a 25 de febrero de 2025 se lleva una inversión acumulada de $ 13.078.232.703 (TRECE MIL SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS.)

4- De acuerdo con los planes de acción de los comités de obra, se continúa con los siguientes pendientes por parte de la entidad contratante:

- Aprobación de actas de vecindad y entorno.

- Revisión de propuesta técnica para control de microfisuras en concreto.

5- Se continúa con el trámite de aprobación de Precios No Previstos resultantes de la etapa de pre-construcción y como parte de la optimización de los diseños.

6- En la gestión de las comunicaciones se presenta un buen cuadro de control tanto de correspondencia recibida como enviada, y a la fecha no se evidencian comunicados sin respuesta mayor a una semana.

7- En la gestión del riesgo se observa que los tratamientos implementados han funcionado y que las amenazas materializadas fueron bien gestionadas, especialmente a la mitigación de afectaciones ambientales en los acopios y la vía de acceso. Se continúa gestionando las soluciones en el tema técnico de las microfisuras.

8- En la gestión de la calidad se obtienen resultados óptimos de densidades en campo, lo que ayuda a comprobar la calidad de las fuentes de materiales para el afirmado que se requiere en el mejoramiento de la zona de seguridad. Igualmente, en lo referente a las resistencias de concreto.

9- En la gestión de las adquisiciones se destacan los equipos de personas conformadas para las diferentes etapas que conlleva el proyecto. Adicionalmente se destaca la constante disponibilidad de equipo que ha permitido obtener unos rendimientos por encima de lo esperado en las actividades de instalación de materiales granulares, y en el fresado y reciclaje de la estructura existente.

10- El contratista se encuentra al día en la entrega de los requerimientos efectuados por la interventoría y en la presentación de los informes semanales en formato de la entidad contratante.

11- A pesar de la fuerte lluvia se ha logrado mantener un ritmo de ejecución que permita continuar por encima de la línea base de cronograma, sin embargo, está pendiente realizar una reprogramación por ajustes en las actividades próximas a ejecutar y los cambios en el alcance.
