

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR NO. 13
PERIODO JUNIO DE 2022
URIBIA –LA GUAJIRA.

Ingeniero,
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA.
Periodo:	Del 3 de junio de 2022 al 30 de Junio de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	LP-DT-066-2020		
CONTRATO DE OBRA No.	1009 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	NIT:	901477981 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JMV INGENIEROS S.A.S	24%	800095951 - 9
	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S.	25%	800119086 - 8
	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	24%	890932730 - 7
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA S.A.S.	24%	900182018 - 7
	TECCIVIL S.A.S.	1%	830117761 - 1
	GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A	1%	860034551 - 3
	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	1%	901259571 - 5
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33061	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
ANTICIPO	2.4%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 6.500.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$2.007.971.832		
SALDO POR AMORTIZAR:	$4.492.028.168		

PLAZO INICIAL:	110 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	**$ 4.363.070.830**	**$ 4.363.070.830**	**$ 0,00**
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	**$ 4.641.385.647**	**$ 4.641.385.647**	**$ 0,00**
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	**$ 104.400.000**	**$ 104.400.000**	**$ 0,00**
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	**$ 4.165.000.000**	**$ 4.165.000.000**	**$ 0,00**
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	**$ 14.284.000.000**	**$ 10.478.259.798**	**$ 3.805.740.202**
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	**$ 4.096.000.000**	**$ 0**	**$ 4.096.000.000**
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	**$ 133.333.333**	**$ 0**	**$ 133.333.333**
TOTAL				**$ 31.787.189.810**	**$ 23.752.116.275**	**$ 8.035.073.535**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (obra)	$ 60.185.430	$ 439.817	$ -	$ 60.625.247
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (E&D)	$ 300.000.000	$ 57.000.000	$ -	$ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5	$ 1.001.780	$ 7.321	$ -	$ 1.009.101
Acta de Ajuste D No 5	$ 86.279	$ 631	$ -	$ 86.910
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 305.151.023	$ 2.229.950	$ -	$ 307.380.973
Acta de Ajuste P No 6	$ 4.639.328	$ 33.903	$ -	$ 4.673.231
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 7.214.453.093	$ 52.721.003	$ 1.360.216.747	$ 5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7	$ 135.136.133	$ 987.533	$ -	$ 136.123.666
Acta de Ajuste D No 6	$ 602.101	$ 4.400	$ -	$ 606.501
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 384.632.498	$ 2.810.776	$ 192.316.249	$ 195.127.025
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 910.877.671	$ 6.656.414	$ 455.438.836	$ 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 1.939.415.022	$ 14.172.648	$ 135.759.052	$ 1.817.828.618
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 5.183.649.828	$ 37.880.518	$ 414.691.986	$ 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7	$ 80.431.253	$ 587.767	$ -	$ 81.019.020

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 3.304.260.771	$ 24.146.521	$ 264.340.862	$ 3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 4.203.494	$ 798.664	$ -	
Acta de Ajuste D No 8	$ 18.926.637	$ 138.310		$ 19.064.947
Acta de Ajuste D No 9	$ 26.418.432	$ 193.058		$ 26.611.490
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$ 3.104.941.512	$ 22.689.957	$ 248.395.321	$ 2.879.236.148
TOTAL	**$ 22.979.012.285**	**$ 223.499.191**	**$ 3.071.159.053**	**$ 20.131.352.422**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO


Según el informe de interventoría No. 52 de fecha 30 de junio de 2022, para el periodo 24 de junio al 30 de junio de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

GRANDES PARTIDAS					
	CONTRATADO	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO EJECUTADO**	**PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO**
EXPLANACIONES	$ 8.897.289.322	$ 381.647.101,93	$ 1.127.135.354	4,29%	12,67%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 56.400.135.500	$ 7.101.219.980,28	$ 9.575.519.587	12,59%	16,98%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 80.761.829.346	$ 6.551.189.248,90	$ 9.241.769.375	8,11%	11,44%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 61.693.102.983	$ 2.683.772.758,95	$ 1.866.476.131	4,35%	3,03%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.411.327.040	$ 142.189.071,66	$ 16.820.430	5,90%	0,70%
TRANSPORTES	$ 11.895.937.138	$ 624.871.547,61	$ 579.845.971	5,25%	4,87%
TOTAL	$ 222.059.621.329	$ 17.484.889.709	$ 22.407.566.848	7,87%	10,09%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 222.059.621.329	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 17.484.889.710,70	7,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 23.177.028.074,00	10,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 357.000.000,00	0,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 23.959.141.848,00	9,01%

GRAFICA 1.4.1

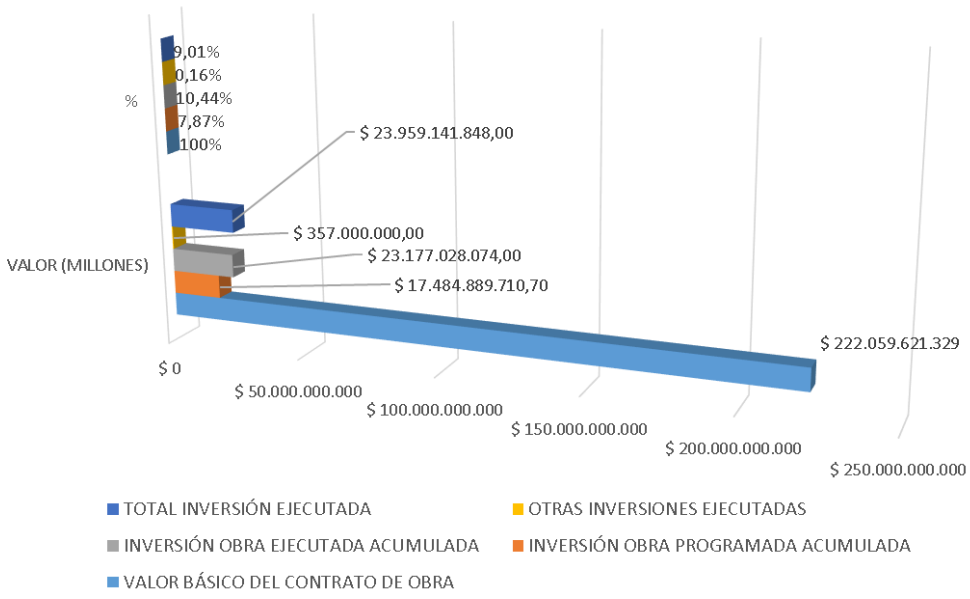

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO)

Meta física programada %: 8,6 %
Meta física ejecutada %: 10,5 %

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO							
FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA**
22/10/2021	NP1	Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3	9.240,00	$ 303.867	$ 2.807.731.080	9,24
22/10/2021	NP2	Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3	7.913,00	$ 318.020	$ 2.516.492.260	6.416,40
22/10/2021	NP3	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	5.050,00	$ 1.002.812	$ 5.064.200.600	3.553,10
22/10/2021	NP4	Geotextil BX 50 o similar	m2	56.000,00	$ 13.127	$ 735.112.000	56.000
14/01/2022	NP5	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	ml	2.253	$ 1.682.190	$ 3.789.974.070	2.253
14/01/2022	NP6	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior	ml	1674	$ 3.770.044	$ 6.311.053.656	1.674
14/01/2022	NP7	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	ml	1052	$ 77.932	$ 81.984.464	1054
14/01/2022	NP8	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	ml	29	$ 106.496	$ 3.088.384	29
14/01/2022	NP9	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	ml	308	$ 159.744	$ 49.201.152	308
14/01/2022	NP10	Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	M2	21800	$ 38.846	$ 846.842.800	21.800

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2021	Acta de modificación de cantidades No. 1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2022-06-09	Acta de OBRA No 12.	En Tramite
2022-06-20	Acta de ajuste 8D	En Tramite
2022-06-20	Acta de ajuste 9D	En Tramite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.799.762.649,39	400033683 Anexo No. O	11/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 6.500.000.000,00		11/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 17.599.525.298,78		11/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 26.388.956.943,00		31/12/2025	31/12/2030
Calidad	$ 535.500.000,00		31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 4.398.159.491	400033682 Anexo No. O	11/06/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
...			...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO


MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.14. **LOCALIZACION DEL PROYECTO:**



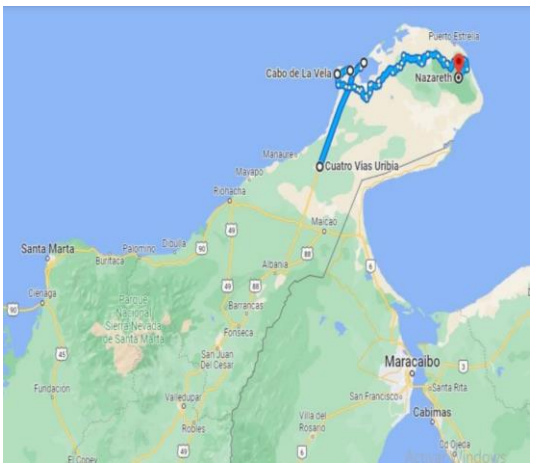

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	CMA-DT-191-2020		
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1005 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	NIT:	901480409 – 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS S.A.S	40%	901218647 - 8
	GINPROCOL S.A.S	40%	901162700 - 0
	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	10%	900761711 - 8
	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10%	890929122 - 8
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y		

	MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33063	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$19.119.769.140 IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$19.119.769.140 IVA		
ANTICIPO	5.29%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 849.884.570		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$148.741.236,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 701.143.334,00		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420.521,00	2.021,00	54,00	C-2402-0600-13-0-2402006-02	1.604.169.140,00	1.604.169.140,00	
420.521,00	2.021,00	54,00	C-2402-0600-13-0-2402021-02	95.600.000,00	95.600.000,00	-
268.422,00	2.022,00	11,00	C-2402-0600-13-0-2402006-02	1.486.666.667,00	317.377.266,60	1.169.289.400,40
TOTAL				3.186.435.807,00	2.017.146.406,60	1.169.289.400,40

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 24.130.120,00	$ 4.584.722,80	$ 0,00	$ 28.714.842,80
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 109.958.920,00	$ 20.892.194,80	$ 0,00	$ 130.851.114,80
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 121.448.320,00	23.075.180,80	$ 0,00	$ 144.523.500,80
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 138.869.200,00	26.385.148,00	$ 0,00	$ 165.254.348,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 115.447.760,00	21.935.074,40	$ 0,00	$ 137.382.834,40
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 153.292.720,00	29.125.616,80	$ 0,00	$ 182.418.336,80
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 119.710.440,00	22.744.983,60	$ 59.855.220,00	$ 82.600.203,60
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 148.143.360,00	28.147.238,40	$ 88.886.016,00	$ 87.404.582,40


Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 153.695.300	$ 29.202.107	$ 76.847.650	$ 106.049.757
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 147.916.400,00	$ 28.104.116	$ 73.958.200	$ 102.062.316
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 145.249.600,00	$ 28.404.544,00	$ 74.748.800,00	$ 103.153.344,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$ 211.693.800,00	$ 40.221.822,00	$ 72.399.279,60	$ 179.516.342,40
TOTALES	$ 1.589.555.940,00	$ 302.822.748,60	$ 446.695.165,60	$ 1.449.931.523,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe de interventoría No. 52 de fecha 30 de junio de 2022, para el periodo 24 de junio al 30 de junio de 2022, reporta un avance para la interventoría, relacionado a continuación.


2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 19.119.769.140,00	100%
INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA	$ 1.881.658.988,00	9,84%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA	$ 1.822.613.210,60	9,53%

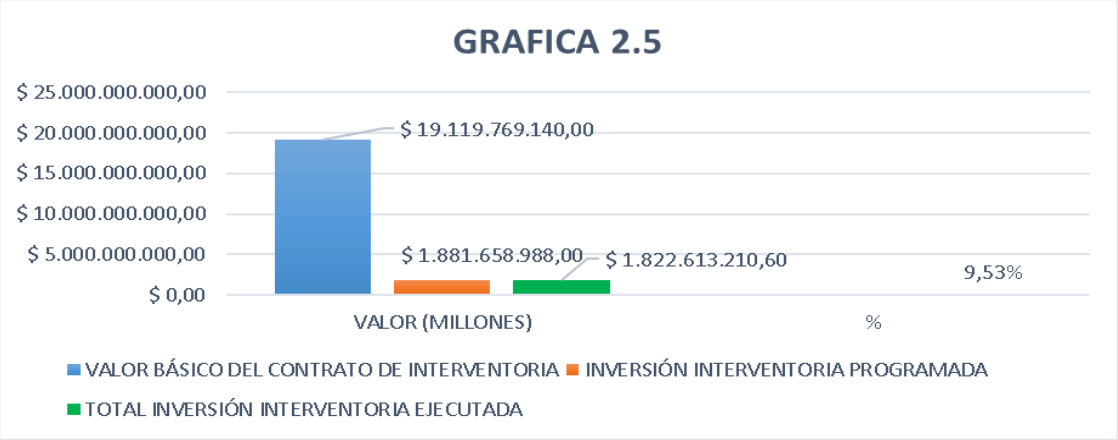

2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS	VALOR (MILLONES)	%
Otorgado	$ 849.884.570	100%
Amortizado	$ 372.171.886	44%
Saldo	$ 477.712.684	56%

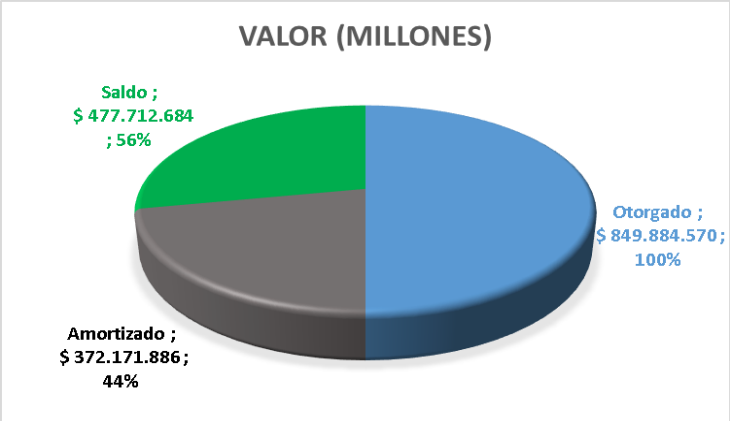

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 9,84%
Meta ejecutada %: 9,53 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/06/2022	ACTA de COSTO No 12.	TRAMITE

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$701.043.580,70	NB-100164941 Anexo No. 2	19/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$849.884.570,00		19/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.402.087.161,40		19/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$2.103.130.742,10		31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Hasta la fecha del presente informe, se han presentado muy buenos rendimientos por parte del contratista en el desarrollo de sus actividades de ejecución de obras programadas, lo que constituye un avance porcentual del 2,22% de lo ejecutado con relación o a lo esperado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Con relación a la sabana predial y los informes mensuales, se recomienda a la interventoría solicitar la certificación de carencia registral ante la ORIP, para que el contratista realice y presente el estudio de documentos y antecedentes legales y agotar el tramite establecido en la Ley para obtener la Resolución o Acto Administrativo de legalización la adjudicación de los 3 predios baldíos identificados a favor del proyecto:" CONEXIÓN ALTA GUAJIRA".

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- La supervisión INVIAS realiza el seguimiento y revisión del presupuesto para la actividad de gerencia de regiones. Se realizó revisión de la cartilla de cultura vial.

  La supervisión INVIAS, asistió al comité técnico que se llevó acabo en las instalaciones del contratista. También realizamos el acompañamiento a funcionarios de INVIAS del área de sostenibilidad ambiental y social en visita al contratista.

  La supervisión INVÍAS, participo en una reunión con el Ministerio de defensa para coordinar acciones para el desarrollo de la actividad deportiva de Gerencia de Regiones.

- Se recomienda a la interventoría y al contratista presenten lo más pronto posible los insumos prediales de las áreas demandadas para el proyecto vial, porque solo han presentado dos (2) expedientes de los seis (6) relacionados inicialmente en el requerimiento predial para el proyecto, ocasionando un atraso en la presentación de los expedientes.

- Al finalizar el periodo no se cuenta con el pronunciamiento por parte de Corpoguajira al Comunicado SAL-00000720 del 13 de abril 2022 Radicado 2165, mediante el cual se solicita la ampliación de la Resolución 0173 del 31/01/2022, Por la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce para siete obras de drenaje entre el Pr 80+000 al Pr 85+000 de tramo Uribía – Puerto Bolívar.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

- Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo:
  Comité de obra Virtual No. 47, de fecha 14/05/2022.
  Comité de obra Virtual No. 48, de fecha 21/06/2022.
  Comité de obra Virtual No. 49, de fecha 28/06/2022.

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría:



Esquema correspondiente al informe de interventoría No.52,
para el periodo 24 de junio al 30 de junio de 2022.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Con relación a la sabana predial y los informes mensuales, se recomienda a la interventoría solicitar la certificación de carencia registral ante la ORIP, para que el contratista realice y presente el estudio de documentos y antecedentes legales y agotar el tramite establecido en la Ley para obtener la Resolución o Acto Administrativo de legalización la adjudicación de los 3 predios baldíos identificados a favor del proyecto:" CONEXIÓN ALTA GUAJIRA".

Cordialmente,

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA.
Dirección Territorial Guajira
