



INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR NO. 21
PERIODO FEBRERO DE 2023
URIBIA –LA GUAJIRA.

SEÑORES:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA.
Periodo:	Del 3 de febrero de 2023 al 02 de marzo de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	LP-DT-066-2020		
CONTRATO DE OBRA No.	1009 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	NIT:	901477981 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JMV INGENIEROS S.A.S	24%	800095951 - 9
	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S.	25%	800119086 - 8
	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	24%	890932730 - 7
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA S.A.S.	24%	900182018 - 7
	TECCIVIL S.A.S.	1%	830117761 - 1
	GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A	1%	860034551 - 3
	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	1%	901259571 - 5
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33061	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
ANTICIPO	2.4%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 6.500.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$3.569.862.515,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$2.930.137.485,00		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		

TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 4.363.070.830,00	$ 4.363.070.830,00	$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 4.641.385.647,00	$ 4.641.385.647,00	$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 104.400.000,00	$ 104.400.000,00	$ -
469121	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 4.165.000.000,00	$ 4.165.000.000,00	$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 14.284.000.000,00	$ 14.284.000.000,00	$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 4.096.000.000,00	$ 4.096.000.000,00	$ -
268222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 133.333.333,00	$ 133.333.333,00	$ -
760222	2022	20	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 10.000.000.000,00	$ 10.000.000.000,00	
215923	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 10.972.000.000,00	$ 3.138.534.010,00	$ 7.833.465.990,00
TOTAL				**$ 52.759.189.810,00**	**$ 44.925.723.820,00**	**$ 7.833.465.990,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 3	$ -	$ -	$ -	$ -

Acta de Ajuste D No 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (obra)	$ 60.185.430	$ 439.817	$ -	$ 60.625.247
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (E&D)	$ 300.000.000	$ 57.000.000	$ -	$ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5	$ 1.001.780	$ 7.321	$ -	$ 1.009.101
Acta de Ajuste D No 5	$ 86.279	$ 631	$ -	$ 86.910
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 305.151.023	$ 2.229.950	$ -	$ 307.380.973
Acta de Ajuste P No 6	$ 4.639.328	$ 33.903	$ -	$ 4.673.231
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 7.214.453.093	$ 52.721.003	$ 1.360.216.747	$ 5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7	$ 135.136.133	$ 987.533	$ -	$ 136.123.666
Acta de Ajuste D No 6	$ 602.101	$ 4.400	$ -	$ 606.501
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 384.632.498	$ 2.810.776	$ 192.316.249	$ 195.127.025
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 910.877.671	$ 6.656.414	$ 455.438.836	$ 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 1.939.415.022	$ 14.172.648	$ 135.759.052	$ 1.817.828.618
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 5.183.649.828	$ 37.880.518	$ 414.691.986	$ 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7	$ 80.431.253	$ 587.767	$ -	$ 81.019.020
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 3.304.260.771	$ 24.146.521	$ 264.340.862	$ 3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 4.203.494	$ 798.664	$ -	
Acta de Ajuste D No 8	$ 18.926.637	$ 138.310		$ 19.064.947
Acta de Ajuste D No 9	$ 26.496.596	$ 193.629		$ 26.690.225
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$ 3.104.941.512	$ 22.689.957	$ 248.395.321	$ 2.879.236.148
Acta de Ajuste D No 6	$ 602.101	$ 4.400		$ 606.501
Acta de Ajuste D No 10	$ 122.315.344	$ 893.843		$ 123.209.187
Acta de Ajuste D No 11	$ 448.267.524	$ 3.275.801		$ 451.543.325
Acta de Ajuste D No 12	$ 290.046.283	$ 2.119.569		$ 292.165.852
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$ 3.623.646.251	$ 26.480.492	$ 289.891.700	$ 3.360.235.043
Acta de Ajuste D No 13	$ 303.714.643	$ 2.219.453		$ 305.934.096

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$ 2.610.147.019	$ 19.074.151	$ 208.811.762	$ 2.420.409.408
PAGA	$ 4.159.949	$ 86.826		$ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 14	$ 411.388.771,00	$ 3.006.303,00		$ 414.395.074,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$ 2.331.780.845,00	$ 17.039.937,00	$ 186.542.468,00	$ 2.162.278.314,00
Acta de Ajuste D No 15	$ 308.364.033,00	$ 2.253.429,00		$ 310.617.462,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$ 2.730.866.474,00	$ 19.956.332,00	$ 218.469.318,00	$ 2.532.353.488,00
Acta de Ajuste D No 16	$ 242.147.686,00	$ 1.769.541,00		$ 243.917.227,00
Acta de Ajuste D No 17	$ 301.476.049,00	$ 2.203.094,00		$ 303.679.143,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$ 1.664.505.438,00	$ 12.163.694,00	$ 133.160.435,00	$ 1.543.508.697,00
Acta de Ajuste P No 18	$ 227.474.899,00	$ 1.662.317,00		$ 229.137.216,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$ 433.625.741,00	$ 3.168.803,00	$ 34.690.059,00	$ 402.104.485,00
Acta de Ajuste P No 19	$ 56.219.526,00	$ 410.835,00		$ 56.630.361,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$ 3.384.565.917,00	$ 24.733.366,00	$ 270.765.273,00	$ 3.138.534.010,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$ 1.620.164.535,00	$ 11.839.664,00	$ 129.613.163,00	$ 1.502.391.036,00
TOTAL	$ 44.093.365.274	$ 377.852.811	$ 4.543.103.231	$ 39.928.114.855

1.4. AVANCE DEL CONTRATO


Según el informe de interventoría No. 87 de fecha 02 de marzo de 2023, para el periodo del 24 de febrero al 02 de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

GRANDES PARTIDAS					
	CONTRATADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE PROGRAMADO EJECUTADO	PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO
EXPLANACIONES	$ 7.028.366.013	$ 939.185.787	$ 1.938.070.422	13%	28%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 96.944.209.723	$ 16.986.750.847,28	$ 19.005.650.090,00	18%	20%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 80.129.858.961	$ 14.545.391.077,90	$ 14.445.560.184,00	18%	18%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 43.164.097.411	$ 5.187.124.980,95	$ 4.279.702.223,00	12%	10%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 1.024.654.647	$ 222.868.138,67	$ 160.882.721,00	22%	16%
TRANSPORTES	$ 3.223.151.933	$ 790.458.417,61	$ 977.003.427,00	25%	30%
TOTAL	$ 231.514.338.688	$ 38.671.779.249,35	$ 40.806.869.066	16,70%	17,63%

El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecución de actividades programadas lo cual se traduce en avance del 0,92% de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

GRAFICA 1.4.1

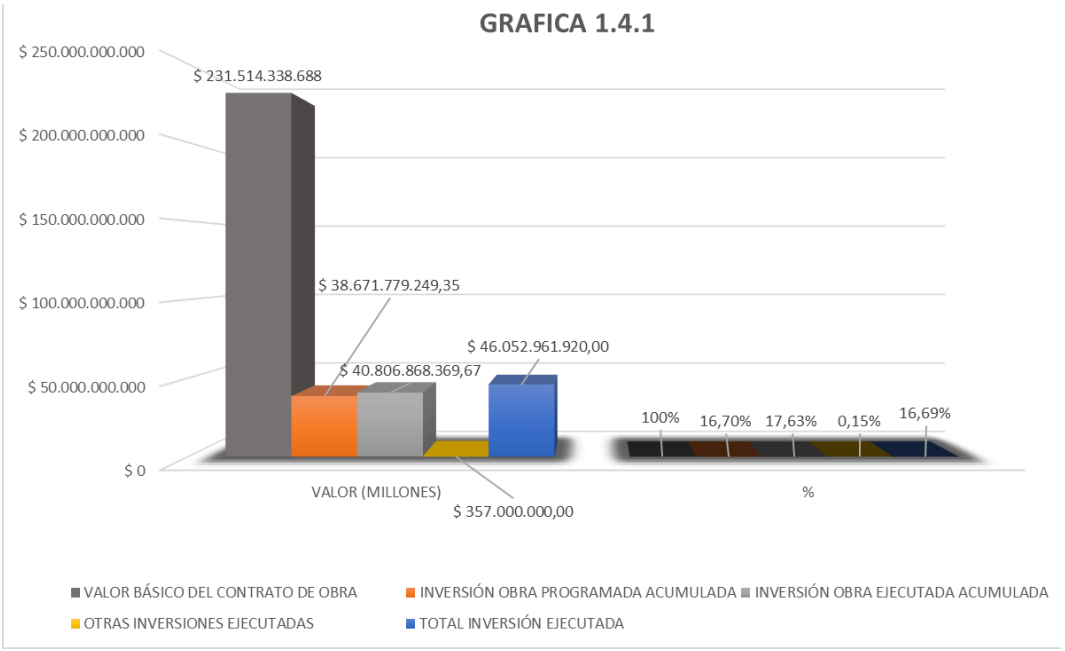

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 231.514.338.688	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 38.671.779.249,35	16,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 40.806.868.369,67	17,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 357.000.000,00	0,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 46.052.961.920,00	16,69%

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO)

Meta fisica programada %: 20,1 %

Meta fisica ejecutada %: 20,4 %

SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO							
FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA**
22/10/2021	NP1	Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3	9.240,00	$ 303.867	$ 2.807.731.080	30.069,91
22/10/2021	NP2	Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3	7.913,00	$ 318.020	$ 2.516.492.260	23.411,70
22/10/2021	NP3	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	5.050,00	$ 1.002.812	$ 5.064.200.600	13.957,30
22/10/2021	NP4	Geotextil BX 50 o similar	m2	56.000,00	$ 13.127	$ 735.112.000	184.582,00
14/01/2022	NP5	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	ml	2.253	$ 1.682.190	$ 3.789.974.070	691,14
14/01/2022	NP6	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior	ml	1674	$ 3.770.044	$ 6.311.053.656	193,26
14/01/2022	NP7	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	ml	1052	$ 77.932	$ 81.984.464	394,60
14/01/2022	NP8	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	ml	29	$ 106.496	$ 3.088.384	110,80
14/01/2022	NP9	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	ml	308	$ 159.744	$ 49.201.152	44,10
14/01/2022	NP10	Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	M2	21800	$ 38.846	$ 846.842.800	5.906,56
4/08/2022	NP11	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	300	$ 1.306.682	$ 392.004.600	
4/08/2022	NP12	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	850	$ 2.357.951	$ 2.004.258.350	233,09
4/08/2022	NP13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	210	$ 2.766.862	$ 581.041.020	15,54
4/08/2022	NP14	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	650	$ 3.312.344	$ 2.153.023.600	
4/08/2022		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	M	800	$ 5.029.589	$ 4.023.671.200	
4/08/2022	NP15	Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 cm)	M	1226	$ 711.620	$ 872.446.120	64,00
4/08/2022	NP16	Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	M	80	$ 698.422	$ 55.873.760	15,00
4/08/2022	NP18	Señal vertical de transito tipo informativa (SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV	m2	60	$ 711.002	$ 42.660,12	
4/08/2022	NP19	Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)	UND	400	$ 552.005	$ 220.802.000	

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2021	Acta de modificación de cantidades No. 1
28/09/2022	Acta de modificación de cantidades No. 2

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2023-01-03	Acta de OBRA No 20.	En Tramite

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.799.762.649,39	400033683 Anexo No. 2	11/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 6.500.000.000,00		11/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 17.599.525.298,78		11/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 26.388.956.943,00		31/12/2025	31/12/2030
Calidad	$ 535.500.000,00		31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 4.398.159.491	400033682 Anexo No. 2	11/06/2021	31/12/2025
Otros	$ 17.592.637.964	400033682 Anexo No. 2	11/06/2021	31/12/2025

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
...			...


1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.13. **LOCALIZACION DEL PROYECTO:**



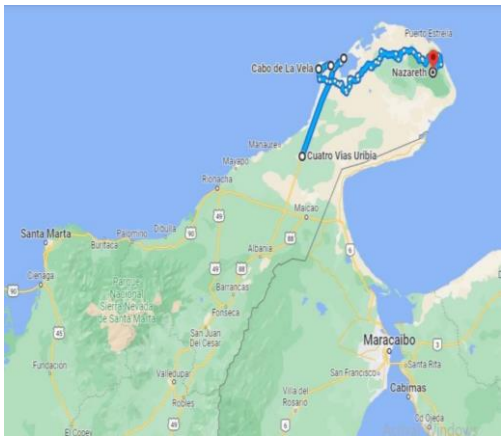

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	CMA-DT-191-2020		
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1005 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	NIT:	901480409 – 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS S.A.S	40%	901218647 - 8
	GINPROCOL S.A.S	40%	901162700 - 0
	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	10%	900761711 - 8
	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10%	890929122 - 8
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,		

	MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33063	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$19.119.769.140 IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$19.119.769.140 IVA		
ANTICIPO	5.29%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 849.884.570		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 608.780.647,92		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 241.103.922,08		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
420.521	2.021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1.604.169.140,00	$ 1.604.169.140,00	
420.521	2.021	54	C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 95.600.000,00	$ 95.599.999,60	$ 0,40
268.422	2.022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1.486.666.667,00	$ 1.486.666.667,00	
240.623	2.023	11	C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 6.807.177,00	$ 6.807.177,00	
240.623	2.023	11	C-2402-600-13-0-2402006-02	$ 949.192.823,00	$ 98.308.782,00	$ 850.884.041,00
TOTAL				$ 4.142.435.807,00	$ 3.186.435.806,60	$ 850.884.041,40

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1				
Acta Mensual de Costos No. 2				
Acta Mensual de Costos No. 3				
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 121.448.320,00	23.075.180,80	$ 0,00	$ 144.523.500,80
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 138.869.200,00	26.385.148,00	$ 0,00	$ 165.254.348,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 115.447.760,00	21.935.074,40	$ 0,00	$ 137.382.834,40
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 153.292.720,00	29.125.616,80	$ 0,00	$ 182.418.336,80
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 119.710.440,00	22.744.983,60	$ 59.855.220,00	$ 82.600.203,60
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 148.143.360,00	28.147.238,40	$ 88.886.016,00	$ 87.404.582,40
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 153.695.300,00	$ 29.202.107	$ 76.847.650	$ 106.049.757
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 147.916.400,00	$ 28.104.116	$ 73.958.200	$ 102.062.316
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 149.497.600,00	$ 28.404.544,00	$ 74.748.800,00	$ 103.153.344,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 211.693.800,00	$ 40.221.822,00	$ 72.399.279,60	$ 179.516.342,40
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 231.978.841,00	$ 44.075.979,79	$ 82.398.884,32	$ 193.655.936,47
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 159.373.196,00	$ 30.280.907,24	$ 79.686.598,00	$ 109.967.505,24
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 160.729.529,85	$ 30.538.610,67	$ 2.410.942,95	$ 188.857.197,57
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 165.328.444,00	$ 31.412.404,36	$ 2.479.926,66	$ 194.260.921,70
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 165.588.986,00	$ 31.461.907,34	$ 2.483.834,79	$ 197.050.893,34

Acta Mensual de Costos No. 19	$ 150.622.068,13	$ 28.618.192,95	$ 14.501.701,74	$ 162.254.724,15
Acta Mensual de Costos No. 20	$ 106.177.736,71	$ 20.173.769,97	$ 21.235.547.34	$ 105.115.959,34
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 141.864.541,00	$ 26.954.262,79	$ 28.372.908,20	$ 140.445.895,59
TOTALES	$ 2.741.496.108,84	$ 520.884.260,67	$ 680.267.277,98	$ 2.582.113.091,53

2.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe de interventoría No. 87 de fecha 02 de marzo de 2023, para el periodo del 24 de febrero al 02 de marzo de 2023, reporta un avance para la interventoría, relacionado a continuación.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO


ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 19.119.769.140,00	100%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA	$ 3.373.801.357,13	17,65%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA	$ 3.265.403.834,00	17,08%



2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS	VALOR (MILLONES)	%
Otorgado	$ 849.884.570	100%
Amortizado	$ 608.780.647,92	71,63%
Saldo	$ 241.103.922,08	28,37%

ANTICIPO

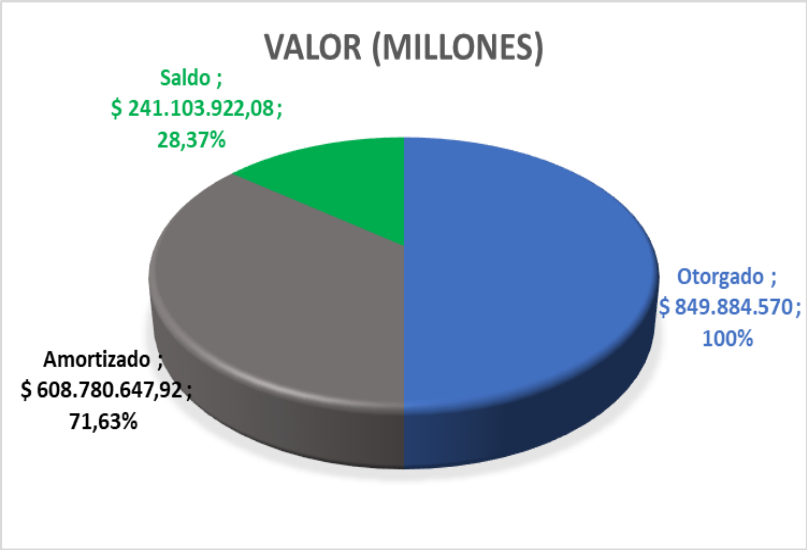

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 17,65%
Meta ejecutada %: 17,08%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/10/2021	ACTA DE MODIFICACION No.1

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	ACTA de COSTO No 19.	TRAMITE

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$701.043.580,70	NB-100164941 Anexo No. 2	19/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$849.884.570,00		19/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.402.087.161,40		19/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$2.103.130.742,10		31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Continúan los bloqueos, los 1 al 3 de febrero en la vía de cuestecitas por lo que las volquetas que pernotan en la vía de barrancas no pueden llegar a las canteras, igualmente con bloqueos en la vía férrea, sector cuatro vías de Uribia afectando parcialmente la operación para el proyecto.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado Inconvenientes.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS.

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- En la parte ambiental, en cuanto a los trámites ambientales, el día 31 de enero se recibió la resolución 162, que concedió el permiso para el tramo vial Uribia - Puerto Bolívar la con 5 años de vigencia, donde fueron aprobadas 145 obras hidráulicas solo las ubicadas para el reemplazo de las estructuras hidráulicas existentes; Dejando por fuera en este permiso las obras hidráulicas las nuevas de las bateas del Pr 78 y del Pr 142. Por lo que hay que hacer un trámite adicional por ser obras nuevas y tienen unas condiciones diferentes a las presentadas en la solicitud.

- En la parte social, la Comunidad de Ululuway ha realizado una solicitud de instalación en la vía reductores de velocidad; prácticamente exigiendo a la UT Andino la colocación de reductores frente a su comunidad entre el Pr 96 y el Pr 97, ellos aluden que han tenido varios accidentes donde se han visto afectados sus animales porque se los llevan los vehículos que transitan a altas velocidades por la zona, que tienen riesgo porque ellos deben atravesar hacia la margen derecha en busca del agua.

  Se observa que durante este periodo la documentación y gestiones relacionadas con la ejecución de los programas de gestión ambiental aprobados en el PAGA., PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD se está llevando en su normal desarrollo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

- Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de febrero:

  Comité de obra Virtual No. 84, de fecha 09/02/2023.
  Comité de obra Virtual No. 85, de fecha 16/02/2023.
  Comité de obra Virtual No. 86, de fecha 23/02/2023.
  Comité de obra Virtual No. 87, de fecha 02/03/2023.

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría:

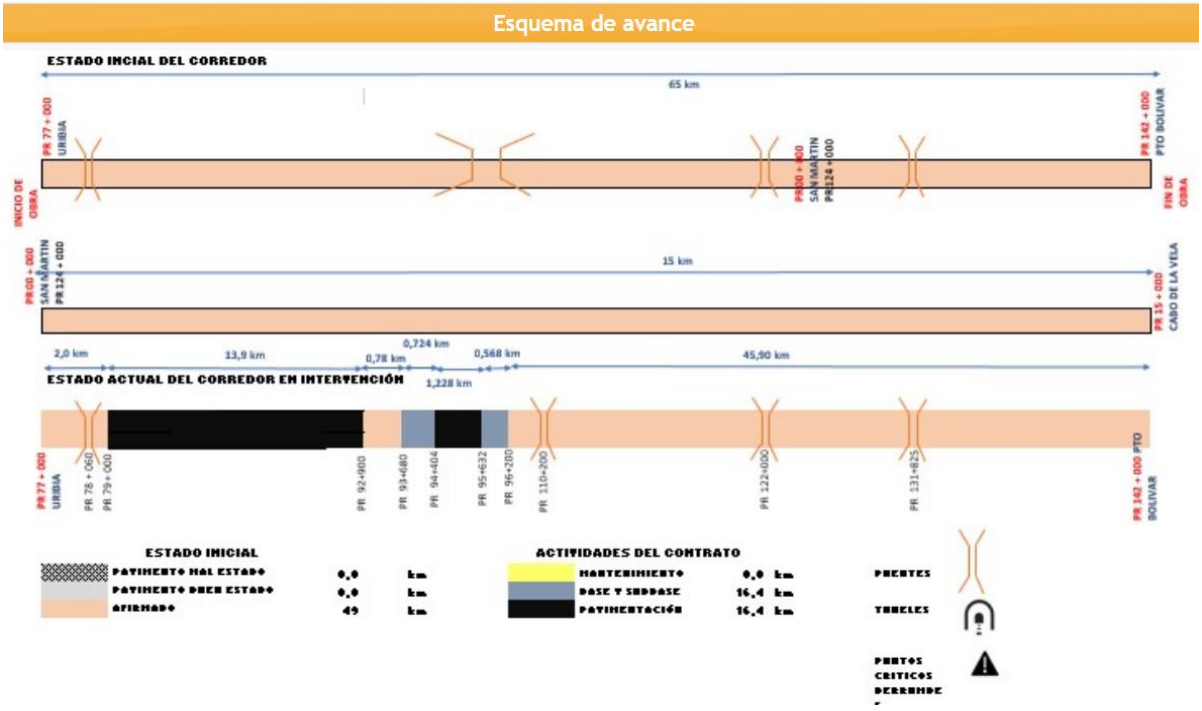


Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 87 de fecha 02 de marzo de 2023, para el periodo del 24 de febrero al 02 de marzo de 2023.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Esta supervisión recomienda, realizar los tramites que sean necesarios para la obtención de los permisos ambientales para la construcción de la totalidad de las obras hidráulicas contenidas en el tramo Uribia – Puerto Bolívar. Así como continuar con la construcción del pavimento bajo las especificaciones invias y se solicita de reprogramación de entrega de los E&D e ir reportando frente al bloqueos de la vía, se recomienda de igual manera provisionarse frente a posibles paros y bloqueos y garantizar que las actividades de ejecución no se paralicen.

Cordialmente,



_____

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA.
Dirección Territorial Guajira
