Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	
VALOR INICIAL	$ 7.825.698.944
PLAZO INICIAL:	5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	PERIODO
	1-mar.-25 / 31-mar.-25

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA N°1		ACTA N°2		ACTA N°3		ACTA N°4		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				PRELIMINARES														
	1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, alinearía BIF, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total (Dodf tds-902e o similar), colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de taser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en pentak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); Bovlas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	día	50,00	$ 668.161	$ 49.308.050	3,00	$ 2.004.483,00	4,00	$ 3.944.644,00		$ -	9,00	$ 6.875.442,00	56,00	$ 11.778.576
	1.2			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	2.000,00	$ 1.269	$ 2.538.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Subtotal								$ 51.844.050		$ 2.004.483,00		$ 3.944.644,00		$ -		$ 6.875.442,00	0,00	$ 11.778.576
2				RETIROS Y DEMOLICIONES													0,00	
	2.1			Demolición de piso o andén en concreto, e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.200,00	$ 33.222	$ 272.420.400	1069,06	$ 36.180.751,32	702,37	$ 23.334.068,31	1968,62	$ 65.401.983,41	1569,77	$ 52.615.295,75	5349,82	$ 177.731.697
	2.2			Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	500,00	$ 17.291	$ 8.645.500	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	2.3			Demolición de anderas o placa de cualquier espesor, INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	m2	9.181,00	$ 65.474	$ 601.116.794	466,935	$ 30.572.102,19	187,04	$ 12.245.968,87	330,16	$ 21.616.791,06	578,70	$ 37.889.526,81	1562,80	$ 102.324.389
	2.4			Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	un	20,00	$ 19.024	$ 380.480	5,00	$ 95.120,00	15,00	$ 285.360,00		$ -		$ -	20,00	$ 380.480
Subtotal								$ 882.543.174		$ 66.847.973,51		$ 35.865.415,18		$ 87.016.354,49		$ 90.704.824,56	0,00	$ 280.436.568
3				MOVIMIENTOS DE TIERRA													0,00	
3.1				Excavaciones					0,00	$ -	0,00	$ -					0,00	$ -
	3.1.1			EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0,30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2.600,00	$ 83.568,00	$ 165.276.800	228,70	$ 14.538.166,58	0,00	$ -	177,40	$ 11.277.081,44	304,63	$ 19.364.466,46	710,73	$ 45.179.715
3.2				Llenos					0,00	$ -	0,00	$ -					0,00	$ -
	3.2.1			LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	100,00	$ 172.066	$ 17.206.600	0,00	$ -	11,93	$ 2.052.128,66	69,20	$ 11.906.401,10	11,98	$ 2.061.949,81	93,11	$ 16.020.481
	3.2.2			Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	2.600,00	$ 337.253	$ 876.657.800	0,00	$ -	279,82	$ 94.371.429,51	336,02	$ 113.324.287,81	364,34	$ 119.503.241,83	979,19	$ 327.198.959
3.3																$ -	0,00	
	3.3.1			Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	105.000,00	$ 3.387	$ 355.466.000	11552,55	$ 39.781.697,76	3673,33	$ 12.331.372,59	16.296,66	$ 54.714.594,91	18.383,09	$ 61.644.886,67	49907,62	$ 167.472.712
	3.3.2			Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	4.200,00	$ 7.486	$ 31.441.200	462,10	$ 3.459.204,45	140,93	$ 1.059.884,62	657,32	$ 4.920.714,89	709,33	$ 5.983.796,07	2043,68	$ 15.443.600
Subtotal								$ 1.443.257.400		$ 58.779.350,09		$ 119.854.818,5782		$ 195.143.079,8305		$ 208.556.360,8319	0,00	$ 171.559.616
4				CONCRETOS													0,00	
4.1				Concretos para Anderes, rampas y Escalas					0,00	$ -	0,00	$ -		$ -			0,00	$ -
	4.1.1			Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y fajeado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huella y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las fajas en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	m2	200,00	$ 120.530	$ 24.106.000	0,00	$ -	5,88	$ 709.186,47		$ -	28,31	$ 3.412.565,69	34,20	$ 4.121.752
	4.1.2			Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas. Vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	56,00	$ 1.337.463	$ 82.266.258	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4.1.3			Construccion de contenedor de raices U350, incluye viga de fundacion en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP	m	30,00	$ 210.825	$ 6.327.750	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4.1.4			Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm, dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	m	50,00	$ 359.151	$ 17.957.550	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4.1.5			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 36 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0,10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado escobillado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subbase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	17.400,00	$ 136.000	$ 2.366.400.000	281,85	$ 38.330.920,00	957,66	$ 130.241.120,60	2.384,19	$ 324.250.220,80	2.385,55	$ 324.434.718,40	6009,24	$ 817.256.980
4.2				Concreto para solado, cunetas y cordones					0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4.2.1			Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres cara, juntas rematadas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	m	10.000,00	$ 120.703,00	$ 1.207.030.000	167,90	$ 22.660.093,70	1369,24	$ 165.271.375,72	1.511,67	$ 182.463.104,01	1.781,99	$ 215.091.536,97	4830,80	$ 585.506.132

	4.2.2			Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa, 0,30 x 0,25 x 0,20 m, según ficha U180 del MEP. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arena y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	1.480,00	$ 139.396,00	$ 203.521.080	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4.2.3			Suministro, transporte y Construcion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Segùn detalle S.I.F. No Incluye refuerzo.	m	862,00	$ 201.501,00	$ 173.663.862	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4.2.4			Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	1.333,00	$ 42.060,00	$ 56.105.970	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Subtotal								$ 4.147.428.470		$ 61.011.013,70		$ 295.221.662,99		$ 508.713.324,81		$ 542.936.823,26	0,00	$ 1.406.886.865
5				ACERO DE REFUERZO													0,00	
	5.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, segùn diseño o recomendaciones estructurales.	kg	2500,00	$ 9.328	$ 18.852.000	0,00	$ -	6,72	$ 62.670,72		$ -		$ -	6,72	$ 62.675
	5.2			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo C84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	4200,00	$ 15.704	$ 65.956.800	0,00	$ -	175,44	$ 2.755.185,14	645,69	$ 10.139.989,57	41,87	$ 657.548,47	863,00	$ 13.552.723
	5.3			Acero interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia máxima 1,00 m.	kg	1273,00	$ 983	$ 843.900	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Subtotal								$ 85.452.700		$ -		$ 2.817.855,86		$ 10.139.989,57		$ 657.548,47	0,00	$ 13.615.394
6				INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS													0,00	
	6.1			Realice para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de hemjas de anderes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	un	315,00	$ 83.554	$ 26.322.660	0,00	$ -	86,00	$ 7.186.504,00	196,00	$ 16.378.544,00	33,00	$ 2.757.612,00	315,00	$ 26.322.660
	6.2			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.	un	190,00	$ 172.204	$ 32.718.760	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	6.3			Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (Lx90cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y hierraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	un	25,00	$ 907.292	$ 18.145.840	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.721.876,00	3,00	$ 2.721.876,00	6,00	$ 5.443.752
Subtotal								$ 77.187.260		$ -		$ 7.186.504,00		$ 19.100.420,00		$ 5.479.488,00	0,00	$ 31.766.412
7				COMPLEMENTARIOS EN ADOQUIN PARA PISOS													0,00	
	7.1			Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X8 un LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Segun recomendaciones MEP color AMARILLO.	m2	48,00	$ 214.709	$ 10.306.032	0,00	$ -	30,59	$ 6.568.969,79	17,28	$ 3.710.171,52	-	$ -	47,87	$ 10.279.363
	7.2			Colocación de ADOQUIN TACTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 8. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	8600,00	$ 45.895	$ 394.697.000	0,00	$ -	145,53	$ 6.668.151,85		$ -	122,01	$ 5.598.648,95	267,54	$ 12.215.965
	7.3			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin ADOP-A de 10x20x8 cm, en color amarillo, salmón o playa, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, segun recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC, el adoquin debera resistance por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	m	8500,00	$ 36.909	$ 313.726.500	0,00	$ -	118,64	$ 4.378.683,76	249,33	$ 9.202.520,87	110,12	$ 4.064.419,08	478,09	$ 17.645.624
Subtotal								$ 718.729.532		$ -		$ 17.624.028,40		$ 12.912.092,49		$ 8.684.068,03	0,00	$ 40.206.784
8				BARANDAS Y PASAMANOS													0,00	
	8.1			Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tubería galvanizada tipo acueducto en diámetros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y maquillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores especificados en el diseño. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro. los tubos verticales estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hará con platinas de 0,15x0,15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario. Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el diseño. Incluya todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.	m	50,00	$ 667.922	$ 34.398.100	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Subtotal								$ 34.398.100		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9				ARBORIZACION Y PAISAJISMO													0,00	
	9.1			Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	m2	300,00	$ 38.160,00	$ 11.448.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Subtotal								$ 11.448.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
							SUBTOTAL OBRAS	$ 7.452.315.785		$ 167.596.826,00		$ 473.514.944,00		$ 833.027.901,00		$ 866.870.562,00		$ 2.360.038.197

SUBTOTAL OBRAS				$ 7.452.315.785
Destinación pago de Reajustes			NO MODIFICAR	$ 165.079.642,00
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT - Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 157.581.021,00
Pólizas - Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 29.811.496,00
VALOR TOTAL				$ 7.825.688.944

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN A=	26,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO I=	1,00%
NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.	UTILIDAD U=	5,00%
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Socia - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos.	TOTAL A.I.U	A.I.U.= 32,00%
NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago definida en los documentos del proceso.	Consorcio Vial VG-HW - Representante Legal	
NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.		
NOTA 8: Los valores Definidos para los ítems Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT y Pólizas NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.		

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN ACUENCA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	1
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	1.1	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	UNID.	DÍA	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

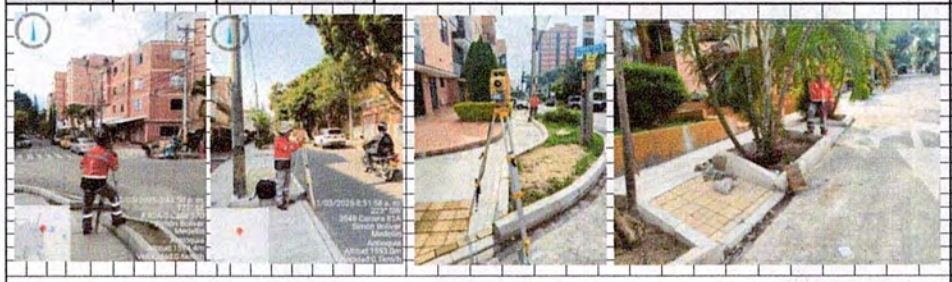

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (DÍA)	CANTIDAD TOTAL
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	5,00	5,00
LAURELES - ACACIAS	4,00	4,00
		-
Subtotal		9,00
TOTAL		9,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,85	1,85	1,5725	**1,57**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	42,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	5,55	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,00	3,00	9,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	12,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	5,18	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,80	3,00	11,40	
MENOS CAJAS				1,44	**83,69**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,10	1,40	4,34	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	2,70	5,40	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,70	1,20	11,64	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,20	1,60	14,72	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		8,50	3,00	25,50	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,80	1,30	8,84	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,50	1,50	2,25	
MENOS CAJAS				0,310	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	18,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	21,00	
MENOS CAJAS				0,16	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	12,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	11,70	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	8,71	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	10,80	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	30,38	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	12,71	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	9,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	36,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	2,64	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	1,00	
MENOS CAJAS				1,60	**244,55**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		9,50	3,76	35,72	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	4,30	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	18,05	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	4,99	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	7,99	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	2,19	3,50	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,03	1,65	5,00	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	16,55	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,65	6,93	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	2,00	8,40	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	16,55	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,65	6,93	
MENOS CAJAS				3,50	**131,42**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	21,70	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	7,56	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	8,57	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	3,26	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	6,08	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	3,90	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	1,14	



CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	1,00	2,80	
CR 75 - CL 30 Y 30A		9,76	4,25	41,48	
CR 75 - CL 30 Y 30A		22,80	2,80	63,84	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,60	1,46	2,34	
CR 75 - CL 30 Y 30A		7,05	2,80	19,74	
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,30	1,32	7,00	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,25	1,00	3,25	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,30	2,77	3,60	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,32	2,32	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	49,55	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	2,48	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	22,76	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	22,93	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	11,76	
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,30	1,00	5,30	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,00	1,76	
MENOS CAJAS				0,88	**314,23**
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,94	1,90	75,89	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,96	1,90	20,86	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,86	2,10	8,11	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	4,54	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,62	1,80	2,92	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,99	1,80	8,98	
CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	25,88	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	7,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	6,43	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,18	1,80	3,92	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,42	1,80	9,76	
MENOS CAJAS				2,63	**171,85**
CR 74 - CL 27 Y 28		3,88	1,80	6,96	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,66	1,80	4,82	**11,81**
Del 16 al 23 de marzo					
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	6,72	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,50	21,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	21,70	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,60	1,60	2,56	
MENOS CAJAS				0,36	**51,62**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		3,50	2,00	7,00	**7,00**
BELÉN GRANADA					
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,00	2,30	11,50	
CL 28 - CR 75 Y 74A		12,50	2,00	25,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		20,50	2,00	41,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	2,10	8,40	**85,90**
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A - CLL 58 Y 54		5,90	1,50	8,85	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		27,10	1,42	38,48	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,90	4,60	13,34	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		4,55	1,50	6,83	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,40	3,00	7,20	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,45	1,50	3,68	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,00	2,15	6,45	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		25,60	1,48	37,89	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		9,50	4,40	41,80	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		5,50	2,15	11,83	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,00	2,30	4,60	
MENOS CAJAS				1,59	**179,35**
Del 24 al 31 de marzo					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	41,00	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	13,50	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	14,82	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	2,88	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	12,32	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	11,04	
CL 57-CR 36A Y 34		54,70	1,22	66,73	
MENOS CAJAS				4,63	**157,67**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	15,45	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	13,75	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	11,18	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	11,55	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	19,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	13,30	**84,73**
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	33,75	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	14,62	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,00	2,00	16,00	**64,37**
					-
	Subtotal				**1.589,77**
	TOTAL				**1.589,77**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	3
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ITEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	47,06	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	6,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	43,05	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	6,05	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	1,20	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	3,60	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	5,10	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	2,81	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	3,20	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	47,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,50	45,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,50	41,10	
MENOS CAJAS				4,97	**246,70**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		13,40	3,80	50,92	**50,92**
BELÉN GRANADA					
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,23	3,80	19,87	**19,87**
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	62,69	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	1,95	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,10	1,50	4,65	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	23,78	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	4,20	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	39,44	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	15,60	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,90	2,90	40,31	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	2,85	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	9,57	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	18,30	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	9,84	
MENOS CAJAS				6,14	**227,04**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	2,88	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	3,60	**6,48**
Del 16 al 23 de marzo del 2025					
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		6,60	2,10	13,86	**13,86**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	3,84	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	3,92	**7,76**
Del 24 al 31 de marzo					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	1,20	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	2,86	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	1,00	2,00	**6,06**
			Subtotal		**578,70**
			TOTAL		**578,70**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	4
FECHA	**DD**	31	**MM**	3	**AA**	2025	**PERÍODO**	01/03/2025 - 31/03/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — **FECHA DE INICIO**

ÍTEM	**3.1.1**	**DESCRIPCIÓN**	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**UNID.**	m3	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025						
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR						
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	0,10	4,71	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	0,10	0,60	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	0,10	4,31	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	0,10	0,61	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	0,10	0,12	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	0,10	0,36	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	0,10	0,51	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	0,10	0,28	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	0,10	0,32	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	0,10	4,75	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,50	0,10	4,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,50	0,10	4,11	
MENOS CAJAS			4,97	0,10	0,50	**24,67**
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		6,70	1,40	0,17	1,59	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,17	2,04	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,00	1,50	0,17	1,53	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,20	3,00	0,17	1,63	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,30	3,00	0,17	1,68	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,00	0,17	0,61	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,30	3,00	0,17	2,19	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	3,00	0,17	4,08	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,50	1,40	0,17	1,07	
CL 36 - CR 80 Y 81		5,00	3,00	0,17	2,55	
MENOS CAJAS				0,75	-0,75	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,10	3,00	0,17	3,11	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,50	1,15	0,17	1,27	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,10	0,17	0,63	
CL 36 - CR 80 Y 81		10,90	1,20	0,17	2,22	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	2,75	0,17	3,74	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,30	1,25	0,17	1,55	
MENOS CAJAS				0,09	-0,09	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	0,18	7,56	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,18	1,00	
MENOS CAJAS				0,03	-0,03	**39,21**
LAURELES - LORENA						
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	0,28	5,04	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	0,18	3,78	
MENOS CAJAS					0,03	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	0,18	2,16	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	0,28	3,28	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	0,18	1,57	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	0,18	1,94	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	0,18	5,47	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	0,18	2,29	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	0,18	1,62	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	0,18	6,48	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	0,18	0,48	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	0,18	0,18	
MENOS CAJAS					0,29	**33,96**







BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	0,13	2,82	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	0,13	0,98	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	0,13	1,11	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	0,13	0,42	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	0,13	0,79	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	0,13	0,51	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	0,13	0,15	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	1,00	0,13	0,36	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	0,13	6,44	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	0,13	0,32	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	0,13	2,96	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	0,13	2,98	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	0,13	1,53	
MENOS CAJAS					0,11	**21,27**
BELÉN GRANADA						
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,98	1,90	0,16	3,34	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,94	1,90	0,16	12,14	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	0,16	1,03	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	0,16	1,15	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,86	2,10	0,16	1,30	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	0,16	0,73	
CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	0,16	4,14	
MENOS CAJA S					0,42	**23,40**
CR 74 - CL 27 Y 28		21,87	1,58	0,13	4,49	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,52	1,80	0,13	1,29	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,00	1,00	0,97	2,91	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	1,00	1,37	2,74	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,50	2,00	1,37	6,85	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,13	0,80	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,32	1,80	0,13	1,24	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,13	0,80	**21,12**
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	0,10	6,27	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	0,10	0,20	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	0,10	2,38	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	0,10	0,42	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	0,10	3,94	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	0,10	1,56	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	0,10	0,29	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	0,10	0,96	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	0,10	1,83	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	0,10	0,98	
MENOS CAJAS			6,14	0,10	0,61	**18,21**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	0,05	0,14	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,18	1,50	0,25	0,82	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	0,05	0,18	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,22	2,20	0,25	0,67	**1,81**
Del 16 al 23 de marzo						
LAURELES - LAS ACACIAS		3	3	0,18	1,62	
CL 36 - CR 80 Y 81		2	1,4	0,18	0,50	
CL 36 - CR 80 Y 81		4	3	0,18	2,16	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,7	1,4	0,18	0,93	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,8	3	0,18	2,05	
MENOS CAJAS					0,258318	**7,01**
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		7,00	3,90	0,19	5,19	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	0,19	0,82	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	0,19	3,43	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	0,19	0,95	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	3,90	0,19	1,19	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,56	7,30	0,19	4,94	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	0,19	1,52	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,14	3,56	0,19	5,51	**23,53**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	2,44	0,12	2,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,20	1,55	0,12	0,22	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,46	0,12	0,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	1,50	0,12	0,45	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,50	0,12	0,33	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,90	1,50	0,12	0,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,80	2,50	0,12	1,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,40	1,40	0,12	0,40	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,12	0,30	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,40	1,40	0,12	0,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,00	2,76	0,12	0,99	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	2,50	0,12	1,14	
CR 75 - CL 30A Y 28		14,00	1,40	0,12	2,35	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,25	1,10	0,12	0,17	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	1,30	0,12	0,16	**12,51**
CR 74 - CL 27 Y 28		3,68	1,8	0,13	0,91	



CR 74 - CL 27 Y 28		2,68	1,8	- 0,13	0,63	**1,54**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,30	2,00	0,23	0,60	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	0,03	0,12	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	4,80	0,23	1,10	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	0,03	0,12	**1,93**
Del 24 al 31 de marzo						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	0,15	6,15	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	0,15	2,03	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	0,15	2,22	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	0,15	0,43	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	0,15	1,85	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	0,15	1,66	
CL 57-CR 36A Y 34		12,20	1,22	0,15	2,23	**16,67**
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	0,18	1,21	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,40	0,18	3,53	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	0,18	3,91	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,30	3,00	0,18	7,72	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,18	1,00	
MENOS CAJAS					0,36	**17,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	0,05	0,06	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	1,10	0,23	0,51	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	2,00	0,03	0,06	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	0,05	0,14	**0,77**
BELÉN GRANADA						
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	0,16	5,40	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,00	2,00	0,16	12,48	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	0,16	2,34	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,40	2,00	0,16	2,69	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,00	2,00	0,16	0,96	**23,87**
CR 74 - CL 27 Y 28		24,45	1,80	0,13	5,72	
CR 74 - CL 27 Y 28		40,50	2,00	0,13	10,53	**16,25**
	Subtotal					**304,63**
	TOTAL					**304,63**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	5
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.2.1	DESCRIPCIÓN	LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

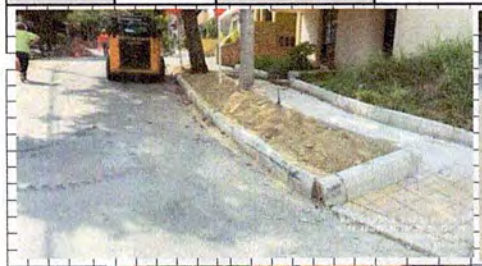




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 16 al 23 de marzo del 2025						
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR						
CL 37D - CR 82A Y 83A		15,00	0,80	0,05	0,60	
CL 37D - CR 82A Y 83A		12,80	1,20	0,05	0,77	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,70	1,10	0,08	0,15	
CL 37D - CR 82A Y 83A		7,00	1,15	0,05	0,40	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,92	21,40	0,05	0,98	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,96	4,63	0,05	0,22	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,09	2,80	0,05	0,15	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,33	4,73	0,05	0,31	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,80	5,40	0,04	0,17	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,90	4,20	0,05	0,19	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,90	4,80	0,05	0,22	
CL 37D - CR 82A Y 83A		15,90	0,90	0,05	0,72	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,80	1,20	0,05	0,17	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,60	1,22	0,05	0,10	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,45	1,37	0,05	0,17	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,20	15,70	0,05	0,94	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,09	3,52	0,05	0,19	
CL 40A - CR 83A Y 84		3,20	1,20	0,08	0,31	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,37	3,37	0,08	0,37	
CL 40A - CR 83A Y 84		18,40	1,18	0,08	1,74	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,20	7,90	0,08	0,76	
CL 40A - CR 83A Y 84		4,22	1,00	0,08	0,34	
CL 40A - CR 83A Y 84		9,40	1,15	0,08	0,86	
CL 40A - CR 83A Y 84		10,80	1,23	0,08	1,06	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,00	1,15	0,08	0,09	11,98
		Subtotal				11,98
TOTAL						11,98

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	PERÍODO	01/03/2026 - 31/03/2026	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.2.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS



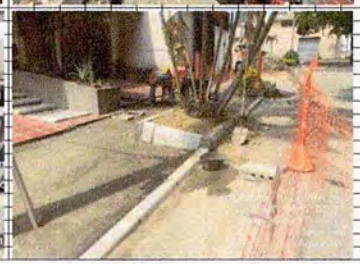

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 01 al 15 de marzo del 2026						
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR						
CL 40A - CR 83A Y 84		28,20	1,50	0,15	6,35	
CL 40A - CR 83A Y 84		5,40	0,80	0,15	0,65	
CL 40A - CR 83A Y 84		27,60	1,40	0,15	5,80	
CL 40A - CR 83A Y 84		10,40	1,20	0,15	1,87	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,73	1,20	0,15	0,31	
CL 40A - CR 83A Y 84		17,00	1,93	0,15	4,92	
CL 40A - CR 83A Y 84		5,12	3,66	0,15	2,81	
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	0,15	7,06	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	0,15	0,90	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	0,15	6,46	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	0,15	0,91	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	0,15	0,18	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	0,15	0,54	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	0,15	0,77	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	0,15	0,42	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	0,15	0,48	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	0,15	7,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,51	0,15	6,60	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,55	0,15	6,37	
MENOS CAJAS		6,72		0,15	1,01	59,70
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		6,70	1,40	0,15	1,41	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,15	1,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,00	1,50	0,15	1,35	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,20	3,00	0,15	1,44	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,30	3,00	0,15	1,49	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,00	0,15	0,54	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,30	3,00	0,15	1,94	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	3,00	0,15	3,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,50	1,40	0,15	0,95	
CL 36 - CR 80 Y 81		5,00	3,00	0,15	2,25	
MENOS CAJAS				0,66	-0,66	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,10	3,00	0,15	2,75	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,50	1,15	0,15	1,12	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,10	0,15	0,56	
CL 36 - CR 80 Y 81		10,90	1,20	0,15	1,96	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	2,75	0,15	3,30	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,30	1,25	0,15	1,37	
MENOS CAJAS				0,08	-0,08	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	0,15	6,30	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,15	0,83	
MENOS CAJAS				0,02	-0,02	34,18
LAURELES - LORENA						
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	0,15	2,70	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	0,15	3,15	
MENOS CAJAS				0,03	0,03	5,82
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	0,15	0,75	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	2,63	0,15	1,49	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	0,15	2,48	
CL 53A - CR 81 Y 80		13,40	1,65	0,15	3,32	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,60	0,15	1,01	
CL 53A - CR 81 Y 80		9,50	3,76	0,15	5,36	14,40



BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	0,15	3,26	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	0,15	1,13	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	0,15	1,29	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	0,15	0,49	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	0,15	0,91	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	1,50	0,15	0,59	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	0,15	0,17	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	1,00	0,15	0,42	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	0,15	7,43	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	0,15	0,37	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	0,15	3,41	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	0,15	3,44	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	0,15	1,76	
MENOS CAJAS					0,13	**24,54**
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,98	1,90	0,15	3,13	
CR 75 - CL 30 Y 30A		39,94	1,90	0,15	11,38	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,57	1,80	0,15	0,96	
CR 75 - CL 30 Y 30A		7,20	1,00	0,15	1,05	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,86	2,10	0,15	1,22	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,39	1,90	0,15	0,66	
CR 75 - CL 30 Y 30A		17,25	1,50	0,15	3,85	
MENOS CAJAS					0,39	**21,94**
CR 74 - CL 27 Y 28		21,87	1,58	0,15	5,18	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,52	1,80	0,15	1,49	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,00	1,00	0,97	2,91	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	1,00	1,37	2,74	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,50	2,00	1,37	6,85	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,15	0,92	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,32	1,80	0,15	1,44	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,15	0,92	**22,45**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	0,05	0,14	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,18	1,50	0,17	0,56	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	0,05	0,18	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,22	2,20	0,17	0,46	**1,34**
Del 16 al 23 de marzo del 2025						
LAURELES - LAS ACACIAS		3,00	3,00	0,15	1,35	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,40	0,15	0,42	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,15	1,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	0,15	0,78	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,80	3,00	0,15	1,71	
MENOS CAJAS					0,26	**5,80**
LAURELES - LORENA						
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	0,15	1,80	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	0,15	1,76	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	0,15	1,31	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	0,15	1,62	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	0,15	4,56	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	0,15	0,40	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	0,15	0,15	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	0,15	1,91	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	0,15	1,35	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	0,15	5,40	
MENOS CAJAS					0,29	**19,95**
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		25,20	1,65	0,15	6,24	
CL 53A - CR 81 Y 80		22,60	1,65	0,15	5,59	
CL 53A - CR 81 Y 80		0,94	2,00	0,15	0,28	
CL 53A - CR 81 Y 80		6,80	2,00	0,15	2,04	
MENOS CAJAS					0,53	**13,63**
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	0,15	9,40	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	0,15	0,29	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,10	1,50	0,15	0,70	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	0,15	3,57	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	0,15	0,63	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	0,15	5,92	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	0,15	2,34	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,90	2,90	0,15	6,05	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	0,15	0,43	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	0,15	1,44	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	0,15	2,75	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	0,15	1,48	
MENOS CAJAS					0,921	**34,06**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	0,15	0,58	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,30	2,00	0,15	0,39	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	0,15	0,59	
Del 24 al 31 de marzo		1,00	4,80	0,15	0,72	**2,27**
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	0,15	6,15	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	0,15	2,03	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	0,15	2,22	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	0,15	0,43	
CL 57-CR 36A Y 34		1,90	3,50	0,15	1,00	**11,83**
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	0,15	1,01	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,40	0,15	2,94	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	0,15	3,26	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,30	3,00	0,15	6,44	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,15	0,83	





MENOS CAJAS					0,36	14,11
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	0,15	0,18	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	2,20	0,15	0,66	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	0,15	0,43	1,27
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,50	0,15	0,41	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,90	1,50	0,15	0,65	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,80	2,50	0,15	2,18	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,40	1,40	0,15	0,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,40	1,40	0,15	0,92	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,00	2,76	0,15	1,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	2,50	0,15	1,43	
CR 75 - CL 30A Y 28		12,30	1,61	0,15	2,97	
CR 75 - CL 30A Y 28		13,30	2,14	0,15	4,27	
CR 75 - CL 30A Y 28		9,00	1,40	0,15	1,89	16,84
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	0,15	5,06	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,00	2,00	0,15	11,70	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	0,15	2,19	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,40	2,00	0,15	2,52	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,00	2,00	0,15	0,90	22,38
CR 74 - CL 27 Y 28		62,08	2,00	0,15	18,62	
CR 74 - CL 27 Y 28		12,57	1,80	0,15	3,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		11,88	1,80	0,15	3,21	
CR 74 - CL 27 Y 28		9,73	1,80	0,15	2,63	27,85
	Subtotal					**354,34**
	TOTAL					**354,34**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA					CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	7	
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.3.1	DESCRIPCIÓN	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	UNID.	m3-km	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	DISTANCIA	CANTIDAD (M3KM)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025								
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR.								
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	0,15	7,06	25,00	176,48	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	0,15	0,90	25,00	22,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	0,15	6,46	25,00	161,44	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	0,15	0,91	25,00	22,69	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	0,15	0,18	25,00	4,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	0,15	0,54	25,00	13,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	0,15	0,77	25,00	19,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	0,15	0,42	25,00	10,52	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	0,15	0,48	25,00	12,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	0,15	7,13	25,00	178,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,50	0,15	6,75	25,00	168,75	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,50	0,15	6,17	25,00	154,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,85	1,85	0,15	0,24	25,00	5,90	
JARDINERAS		7,82	0,14	0,15	0,16	25,00	4,11	
JARDINERAS		6,20	0,14	0,15	0,13	25,00	3,26	
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	0,10	4,71	25,00	117,65	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	0,10	0,60	25,00	15,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	0,10	4,31	25,00	107,63	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	0,10	0,61	25,00	15,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	0,10	0,12	25,00	3,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	0,10	0,36	25,00	9,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	0,10	0,51	25,00	12,75	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	0,10	0,28	25,00	7,01	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	0,10	0,32	25,00	8,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	0,10	4,75	25,00	118,75	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,50	0,10	4,50	25,00	112,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,50	0,10	4,11	25,00	102,75	
BORDILLOS		88,00	0,35	0,30	9,24	25,00	231,00	
BORDILLOS		41,00	0,35	0,48	6,89	25,00	172,20	
JARDINERAS 40A		3,76	0,26	0,18	0,18	25,00	4,40	
JARDINERAS 40A		4,96	0,19	0,10	0,09	25,00	2,36	
MENOS CAJAS			1,24			25,00	31,03	1.965,09
LAURELES - LAS ACACIAS								
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	0,08	3,36	25,00	84,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,08	0,44	25,00	11,10	






CL 36 - CR 80 Y 81		3,00	3,00	0,08	0,72	25,00	18,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,08	0,96	25,00	24,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	0,08	0,41	25,00	10,36	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,80	3,00	0,08	0,91	25,00	22,80	
MENOS CAJAS							-2,87	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,70	1,40	0,17	1,59	25,00	39,87	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,17	2,04	25,00	51,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,00	1,50	0,17	1,53	25,00	38,25	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,20	3,00	0,17	1,63	25,00	40,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,30	3,00	0,17	1,68	25,00	42,08	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,00	0,17	0,61	25,00	15,30	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,30	3,00	0,17	2,19	25,00	54,83	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	3,00	0,17	4,08	25,00	102,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,50	1,40	0,17	1,07	25,00	26,78	
CL 36 - CR 80 Y 81		5,00	3,00	0,17	2,55	25,00	63,75	
RESTA CAJAS							-18,81	
CL 36 - CR 80 Y 81		19,96	0,35	0,48	3,35	25,00	83,83	
CL 36 - CR 80 Y 81		29,94	0,35	0,30	3,14	25,00	78,59	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,10	3,00	0,17	3,11	25,00	77,78	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,50	1,15	0,17	1,27	25,00	31,77	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,10	0,17	0,63	25,00	15,81	
CL 36 - CR 80 Y 81		10,90	1,20	0,17	2,22	25,00	55,59	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	2,75	0,17	3,74	25,00	93,50	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,30	1,25	0,17	1,55	25,00	38,78	
MENOS CAJAS							-2,13	
CL 36 - CR 80 Y 81		62,88	0,35	0,30	6,60	25,00	165,06	
CL 36 - CR 80 Y 81		41,92	0,35	0,48	7,04	25,00	176,06	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	0,18	7,56	25,00	189,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,18	1,00	25,00	24,98	
RESTA CAJAS							-0,70	
CL 36 - CR 80 Y 81		24,80	0,35	0,48	4,17	25,00	104,16	
CL 36 - CR 80 Y 81		27,40	0,35	0,30	2,88	25,00	71,93	**1.827,23**
LAURELES - LORENA								
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,10	1,40	0,08	0,35	25,00	8,68	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	2,70	0,08	0,43	25,00	10,80	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,70	1,20	0,08	0,93	25,00	23,28	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,20	1,60	0,08	1,18	25,00	29,44	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		8,50	3,00	0,08	2,04	25,00	51,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,80	1,30	0,08	0,71	25,00	17,68	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,50	1,50	0,08	0,18	25,00	4,50	
MENOS CAJAS						25,00	0,62	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	0,07	1,26	25,00	31,50	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	0,07	1,47	25,00	36,75	
MENOS CAJAS					0,00	25,00	0,28	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	0,28	5,04	25,00	126,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	0,18	3,78	25,00	94,50	
MENOS CAJAS						25,00	0,72	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		31,10	0,35	0,30	3,27	25,00	81,64	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		8,00	0,35	0,48	1,34	25,00	33,60	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	0,07	0,84	25,00	21,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	0,07	0,82	25,00	20,48	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	0,07	0,61	25,00	15,24	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	0,07	0,76	25,00	18,90	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	0,07	2,13	25,00	53,16	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	0,07	0,89	25,00	22,23	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	0,07	0,63	25,00	15,75	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	0,07	2,52	25,00	63,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	0,07	0,18	25,00	4,62	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	0,07	0,07	25,00	1,75	
MENOS CAJAS							2,90	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	0,18	2,16	25,00	54,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	0,28	3,28	25,00	81,90	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	0,18	1,57	25,00	39,20	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	0,18	1,94	25,00	48,60	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	0,18	5,47	25,00	136,69	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	0,18	2,29	25,00	57,17	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	0,18	1,62	25,00	40,50	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	0,18	6,48	25,00	162,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	0,18	0,48	25,00	11,88	-
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	0,18	0,18	25,00	4,50	
MENOS CAJAS							7,20	**1.410,31**
LA AMÉRICA - FERRINI								
CL 53A - CR 81 Y 80		9,50	3,76	0,07	2,50	25,00	62,51	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	0,07	0,30	25,00	7,53	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	0,07	1,26	25,00	31,58	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	0,07	0,35	25,00	8,74	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	0,07	0,56	25,00	13,98	






CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	2,19	0,07	0,25	25,00	6,13	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,03	1,65	0,09	0,45	25,00	11,25	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	0,09	1,49	25,00	37,25	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,65	0,09	0,62	25,00	15,59	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	2,00	0,09	0,76	25,00	18,90	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	0,09	1,49	25,00	37,25	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,65	0,09	0,62	25,00	15,59	
CL 53A - CR 81 Y 80		13,40	3,80	0,25	12,73	25,00	318,25	
CL 53A - CR 81 Y 80		35,40	0,30	0,50	5,31	25,00	132,75	
CL 53A - CR 81 Y 81		42,00	0,30	0,30	3,78	25,00	94,50	
CL 53A - CR 81 Y 82		23,98	0,30	0,30	2,16	25,00	53,96	
CL 53A - CR 81 Y 83		15,30	0,30	0,30	1,38	25,00	34,43	
MENOS CAJAS							0,06	900,10
BELÉN GRANADA								
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	0,12	2,60	25,00	65,10	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	0,12	0,91	25,00	22,68	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	0,12	1,03	25,00	25,71	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	0,12	0,39	25,00	9,77	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	0,12	0,73	25,00	18,23	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	0,12	0,47	25,00	11,70	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	0,12	0,14	25,00	3,42	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,93	1,00	0,12	0,23	25,00	5,78	
CR 75 - CL 30 Y 30A		9,76	4,25	0,12	4,98	25,00	124,44	
CR 75 - CL 30 Y 30A		22,60	2,80	0,12	7,66	25,00	191,52	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,60	1,46	0,12	0,28	25,00	7,01	
CR 75 - CL 30 Y 30A		7,05	2,80	0,12	2,37	25,00	59,22	
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,30	1,32	0,12	0,84	25,00	20,99	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,25	1,00	0,12	0,39	25,00	9,75	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,30	2,77	0,12	0,43	25,00	10,80	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,32	0,12	0,28	25,00	6,97	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	0,12	5,95	25,00	148,65	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	0,12	0,30	25,00	7,45	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	0,12	2,73	25,00	68,27	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	0,12	2,75	25,00	68,79	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	0,12	1,41	25,00	35,28	
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,30	1,00	0,12	0,64	25,00	15,90	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,00	0,12	0,21	25,00	5,28	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	0,13	2,82	25,00	70,53	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	0,13	0,98	25,00	24,57	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	0,13	1,11	25,00	27,86	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	0,13	0,42	25,00	10,58	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	0,13	0,79	25,00	19,75	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	0,13	0,51	25,00	12,68	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	0,13	0,15	25,00	3,71	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,93	1,00	0,13	0,25	25,00	6,26	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	0,13	6,44	25,00	161,04	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	0,13	0,32	25,00	8,07	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	0,13	2,96	25,00	73,95	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	0,13	2,98	25,00	74,52	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	0,13	1,53	25,00	38,22	
CR 75 - CL 30 Y 30A		28,82	0,30	0,50	4,32	25,00	108,08	
CR 75 - CL 30 Y 30A		63,46	0,30	0,35	6,66	25,00	166,58	1.749,08
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,94	1,90	0,09	6,83	25,00	170,74	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	0,30	0,50	0,54	25,00	13,39	
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,02	0,30	0,30	1,98	25,00	49,55	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,98	1,90	0,09	1,88	25,00	46,94	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,98	1,90	0,16	3,34	25,00	83,45	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,94	1,90	0,16	12,14	25,00	303,54	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,57	0,30	0,50	1,14	25,00	28,39	
CL 28 - CR 75 Y 74A		26,16	0,30	0,30	2,35	25,00	58,86	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,66	2,10	0,09	0,73	25,00	18,24	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	0,09	0,41	25,00	10,22	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,62	1,80	0,09	0,26	25,00	6,56	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,99	1,80	0,09	0,81	25,00	20,21	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	0,30	0,50	0,60	25,00	15,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,68	0,30	0,30	2,76	25,00	69,03	
CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	0,09	2,33	25,00	58,22	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,84	0,30	0,30	0,71	25,00	17,64	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	0,09	0,65	25,00	16,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	0,09	0,58	25,00	14,46	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	0,16	1,03	25,00	25,70	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	0,16	1,15	25,00	28,80	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,23	3,80	0,25	4,97	25,00	124,21	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,66	2,10	0,16	1,30	25,00	32,42	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,18	1,80	0,09	0,35	25,00	8,83	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	0,16	0,73	25,00	18,16	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,42	1,80	0,09	0,88	25,00	21,95	

CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	0,16	4,14	25,00	103,50	
MENOS CAJAS							0,66	**1.363,58**
CR 74 - CL 27 Y 28		3,88	1,80	0,12	0,84	25,00	20,95	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,68	1,80	0,12	0,58	25,00	14,47	
CR 74 - CL 27 Y 28		21,87	1,58	0,13	4,49	25,00	112,30	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,52	1,80	0,13	1,29	25,00	32,29	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,00	1,00	0,97	2,91	25,00	72,75	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	1,00	1,37	2,74	25,00	68,50	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,50	2,00	1,37	6,85	25,00	171,25	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,13	0,80	25,00	19,89	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,32	1,80	0,13	1,24	25,00	31,12	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,13	0,80	25,00	19,89	**663,42**
BOSTON - ENCISO								
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	0,15	9,40	25,00	235,10	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	0,15	0,29	25,00	7,31	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,10	1,50	0,15	0,70	25,00	17,44	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	0,15	3,57	25,00	89,18	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	0,15	0,63	25,00	15,75	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	0,15	5,92	25,00	147,90	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	0,15	2,34	25,00	58,50	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,90	2,90	0,15	6,05	25,00	151,16	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	0,15	0,43	25,00	10,69	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	0,15	1,44	25,00	35,89	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	0,15	2,75	25,00	68,63	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	0,15	1,48	25,00	36,90	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	0,10	6,27	25,00	156,73	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	0,10	0,20	25,00	4,88	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	0,10	2,38	25,00	59,45	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	0,10	0,42	25,00	10,50	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	0,10	3,94	25,00	98,60	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	0,10	1,56	25,00	39,00	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	0,10	0,29	25,00	7,13	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	0,10	0,96	25,00	23,93	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	0,10	1,83	25,00	45,75	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	0,10	0,98	25,00	24,60	
MENOS CAJAS					1,54	25,00	38,38	**1.306,62**
LA AMÉRICA - CALASANZ								
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	0,20	0,58	25,00	14,41	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	0,05	0,14	25,00	3,60	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,18	1,50	0,25	0,82	25,00	20,44	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	0,20	0,72	25,00	17,99	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	0,05	0,18	25,00	4,50	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,22	2,20	0,25	0,67	25,00	16,76	**77,71**
Del 16 al 23 de marzo del 2025								
LAURELES - LAS ACACIAS								
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	0,07	0,47	25,00	11,76	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,50	0,07	1,47	25,00	36,75	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	0,07	1,52	25,00	37,98	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,60	1,60	0,07	0,18	25,00	4,48	
MENOS CAJAS						25,00	0,63	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,00	3,00	0,18	1,62	25,00	40,50	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,40	0,18	0,50	25,00	12,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,18	2,16	25,00	54,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	0,18	0,93	25,00	23,31	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,80	3,00	0,18	2,05	25,00	51,30	
CL 36 - CR 80 Y 81		16,56	0,35	0,30	1,74	25,00	43,47	
CL 36 - CR 80 Y 81		11,04	0,35	0,48	1,85	25,00	46,37	
MENOS CAJAS							6,46	**365,43**
LAURELES - LORENA								
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		61,53	0,35	0,30	6,46	25,00	161,52	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		41,02	0,35	0,48	6,89	25,00	172,28	**333,80**
LA AMÉRICA - FERRINI								
CL 53A - CR 81 Y 80		3,50	2,00	0,10	0,70	25,00	17,50	
CL 53A - CR 81 Y 80		7,00	3,90	0,19	5,19	25,00	129,68	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	0,19	0,82	25,00	20,43	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	0,19	3,43	25,00	85,73	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	0,19	0,95	25,00	23,71	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	3,90	0,19	1,19	25,00	29,64	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,56	7,30	0,19	4,94	25,00	123,44	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	0,19	1,52	25,00	37,95	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,14	3,56	0,19	5,51	25,00	137,65	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,30	0,30	0,50	0,65	25,00	16,13	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,80	0,30	0,30	0,25	25,00	6,30	**628,16**

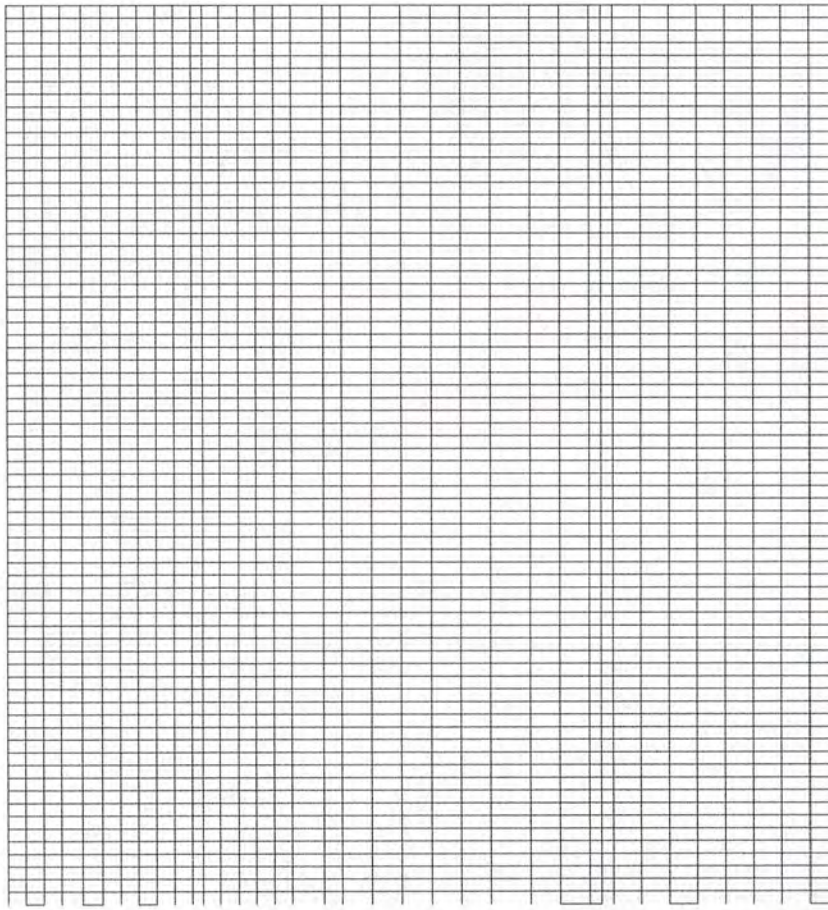

BELÈN GRANADA								
CR 75 - CL 30A Y 28		6,60	2,10	0,25	3,47	25,00	86,63	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	2,44	0,12	2,25	25,00	56,36	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,20	1,55	0,12	0,22	25,00	5,58	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,46	0,12	0,74	25,00	18,45	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	1,50	0,12	0,45	25,00	11,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,50	0,12	0,33	25,00	8,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,90	1,50	0,12	0,52	25,00	13,05	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,80	2,50	0,12	1,74	25,00	43,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,40	1,40	0,12	0,40	25,00	10,08	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,12	0,30	25,00	7,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,40	1,40	0,12	0,74	25,00	18,48	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,00	2,76	0,12	0,99	25,00	24,84	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	2,50	0,12	1,14	25,00	28,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		14,00	1,40	0,12	2,35	25,00	58,80	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,25	1,10	0,12	0,17	25,00	4,13	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	1,30	0,12	0,16	25,00	3,90	
CR 75 - CL 30A Y 28		108,15	0,30	0,50	16,22	25,00	405,56	
CR 75 - CL 30A Y 28		46,86	0,30	0,30	4,22	25,00	105,44	**910,29**
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,00	2,30	0,13	1,50	25,00	37,38	
CL 28 - CR 75 Y 74A		12,50	2,00	0,13	3,25	25,00	81,25	
CL 28 - CR 75 Y 74A		20,50	2,00	0,13	5,33	25,00	133,25	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	2,10	0,13	1,09	25,00	27,30	**279,18**
BOSTON - ENCISO								
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		46,02	0,35	0,30	4,83	25,00	120,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		59,30	0,35	0,48	9,96	25,00	249,06	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,90	1,50	0,10	0,89	25,00	22,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,42	0,10	3,85	25,00	96,21	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	4,60	0,10	1,33	25,00	33,35	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,55	1,50	0,10	0,68	25,00	17,06	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	3,00	0,10	0,72	25,00	18,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,45	1,50	0,10	0,37	25,00	9,19	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	2,15	0,10	0,65	25,00	16,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,60	1,48	0,10	3,79	25,00	94,72	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	4,40	0,10	4,18	25,00	104,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,50	2,15	0,10	1,18	25,00	29,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	2,30	0,10	0,46	25,00	11,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,70	0,25	0,12	0,20	25,00	5,03	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	0,63	0,20	0,96	25,00	23,94	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	0,35	0,15	0,36	25,00	8,93	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	0,50	0,13	0,49	25,00	12,35	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,36	0,39	0,10	0,17	25,00	4,25	
MENOS CAJAS							3,96	**872,73**
LA AMÉRICA - CALASANZ								
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	0,20	0,77	25,00	19,20	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	0,20	0,78	25,00	19,60	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,30	2,00	0,23	0,60	25,00	14,95	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	0,03	0,12	25,00	2,88	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	4,80	0,23	1,10	25,00	27,60	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	0,03	0,12	25,00	2,94	
CL 50A - CR 86 Y 96C		6,80	0,30	0,50	1,02	25,00	25,50	**112,67**
Del 24 al 31 de marzo								
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR.								
CL 40A-CR 83A Y 84		24,58	0,35	0,48	4,13	25,00	103,24	
CL 40A-CR 83A Y 84		52,92	0,35	0,30	5,56	25,00	138,92	**242,15**
BOSTON - ENCISO								
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	0,10	4,10	25,00	102,50	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	0,10	1,35	25,00	33,75	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	0,10	1,48	25,00	37,05	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	0,10	0,29	25,00	7,20	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	0,10	1,23	25,00	30,80	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	0,10	1,10	25,00	27,60	
CL 57-CR 36A Y 34		54,70	1,22	0,10	6,67	25,00	166,84	
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	0,15	6,15	25,00	153,75	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	0,15	2,03	25,00	50,63	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	0,15	2,22	25,00	55,58	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	0,15	0,43	25,00	10,80	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	0,15	1,85	25,00	46,20	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	0,15	1,66	25,00	41,40	
CL 57-CR 36A Y 34		12,20	1,22	0,15	2,23	25,00	55,82	
MENOS CAJAS					0,46	25,00	11,56	**808,34**

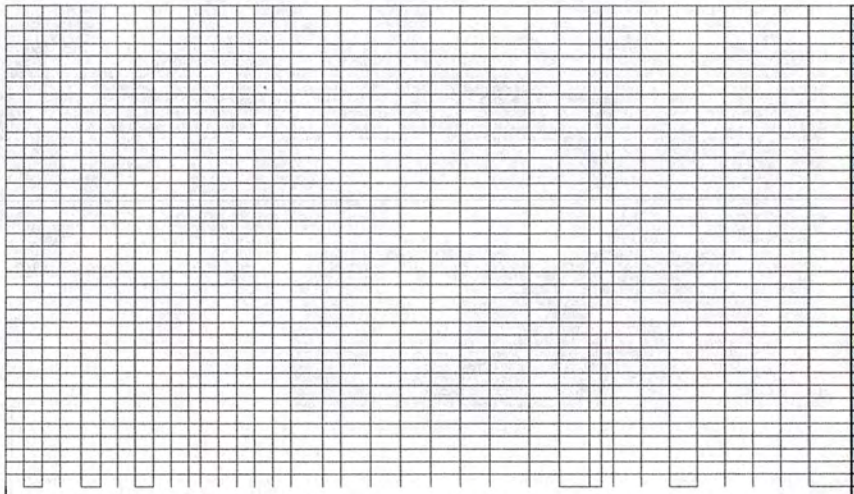

LAURELES - LAS ACACIAS								
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	0,18	1,21	25,00	30,24	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,40	0,18	3,53	25,00	88,20	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	0,18	3,91	25,00	97,65	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,30	3,00	0,18	7,72	25,00	193,05	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,18	1,00	25,00	24,98	**434,12**
LA AMÉRICA - CALASANZ								
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	0,20	0,24	25,00	6,00	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	0,20	0,57	25,00	14,30	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	1,00	0,20	0,40	25,00	10,00	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	0,05	0,06	25,00	1,50	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	1,10	0,23	0,51	25,00	12,65	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	2,00	0,03	0,06	25,00	1,50	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	0,05	0,14	25,00	3,58	
CL 50A - CR 86 Y 96C		4,00	0,30	0,50	0,60	25,00	15,00	**64,53**
BELÉN GRANADA								
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	0,15	2,32	25,00	57,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	0,15	2,06	25,00	51,56	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	0,15	1,68	25,00	41,93	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	0,15	1,73	25,00	43,31	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	0,15	2,93	25,00	73,13	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	0,15	2,00	25,00	49,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		27,60	0,50	0,30	4,14	25,00	103,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		15,00	0,30	0,35	1,58	25,00	39,38	**460,61**
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	0,09	3,04	25,00	75,94	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	0,09	1,32	25,00	32,90	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,00	2,00	0,09	1,44	25,00	36,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	0,16	5,40	25,00	135,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,00	2,00	0,16	12,48	25,00	312,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	0,16	2,34	25,00	58,48	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,40	2,00	0,16	2,69	25,00	67,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,00	2,00	0,16	0,96	25,00	24,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		36,96	0,30	0,50	5,54	25,00	138,60	
CL 28 - CR 75 Y 74A		102,82	0,30	0,35	10,80	25,00	269,90	**1150,02**
CR 74 - CL 27 Y 28		24,45	1,80	0,13	5,72	25,00	143,03	
CR 74 - CL 27 Y 28		40,50	2,00	0,13	10,53	25,00	263,25	
CR 74 - CL 27 Y 28		53,98	0,30	0,35	5,67	25,00	141,70	**547,98**
		Subtotal						**18.363,09**
TOTAL								**18.363,09**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	8
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.3.2	DESCRIPCIÓN	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025						
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR						
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	0,15	7,06	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	0,15	0,90	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	0,15	6,46	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	0,15	0,91	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	0,15	0,18	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	0,15	0,54	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	0,15	0,77	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	0,15	0,42	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	0,15	0,48	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	0,15	7,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,50	0,15	6,75	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,50	0,15	6,17	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,85	1,85	0,15	0,24	
JARDINERAS		7,82	0,14	0,15	0,16	
JARDINERAS		6,20	0,14	0,15	0,13	
CL 37D - CR 82A Y 83A		18,10	2,60	0,10	4,71	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	1,50	0,10	0,60	
CL 37D - CR 82A Y 83A		28,70	1,50	0,10	4,31	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,50	1,10	0,10	0,61	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	1,20	0,10	0,12	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,60	0,10	0,36	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,10	1,00	0,10	0,51	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,55	1,10	0,10	0,28	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,00	3,20	0,10	0,32	
CL 37D - CR 82A Y 83A		19,00	2,50	0,10	4,75	
CL 37D - CR 82A Y 83A		30,00	1,50	0,10	4,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		27,40	1,50	0,10	4,11	
BORDILLOS		88,00	0,35	0,30	9,24	
BORDILLOS		41,00	0,35	0,48	6,89	
CL 40A - CR 83A Y 84		28,20	1,50	0,10	4,23	
CL 40A - CR 83A Y 84		5,40	0,80	0,10	0,43	
CL 40A - CR 83A Y 84		27,60	1,40	0,10	3,86	
CL 40A - CR 83A Y 84		10,40	1,20	0,10	1,25	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,73	1,20	0,10	0,21	
CL 40A - CR 83A Y 84		17,00	1,93	0,10	3,28	
CL 40A - CR 83A Y 84		5,12	3,66	0,10	1,87	
CL 40A - CR 83A Y 84		3,76	0,26	0,18	0,18	
CL 40A - CR 83A Y 84		4,96	0,19	0,10	0,09	
MENOS CAJAS					1,42	93,57
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	0,08	3,36	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,08	0,44	



CL 36 - CR 80 Y 81		3,00	3,00	0,08	0,72	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,08	0,96	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	0,08	0,41	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,80	3,00	0,08	0,91	
MENOS CAJAS					-0,11	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,70	1,40	0,17	1,59	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,17	2,04	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,00	1,50	0,17	1,53	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,20	3,00	0,17	1,63	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,30	3,00	0,17	1,68	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,00	0,17	0,61	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,30	3,00	0,17	2,19	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	3,00	0,17	4,08	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,50	1,40	0,17	1,07	
CL 36 - CR 80 Y 81		5,00	3,00	0,17	2,55	
MENOS CAJAS					-0,75	
CL 36 - CR 80 Y 81		19,96	0,35	0,48	3,35	
CL 36 - CR 80 Y 81		29,94	0,35	0,30	3,14	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,10	3,00	0,17	3,11	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,50	1,15	0,17	1,27	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,10	0,17	0,63	
CL 36 - CR 80 Y 81		10,90	1,20	0,17	2,22	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	2,75	0,17	3,74	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,30	1,25	0,17	1,55	
MENOS CAJAS					-0,09	
CL 36 - CR 80 Y 81		62,88	0,35	0,30	6,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		41,92	0,35	0,48	7,04	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	3,00	0,18	7,56	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,18	1,00	
MENOS CAJAS					-0,03	
CL 36 - CR 80 Y 81		24,80	0,35	0,48	4,17	
CL 36 - CR 80 Y 81		27,40	0,35	0,30	2,88	**73,09**
LAURELES - LORENA						
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,10	1,40	0,08	0,35	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	2,70	0,08	0,43	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,70	1,20	0,08	0,93	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,20	1,60	0,08	1,18	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		8,50	3,00	0,08	2,04	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,80	1,30	0,08	0,71	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,50	1,50	0,08	0,18	
MENOS CAJAS					-0,02	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	0,07	1,26	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	0,07	1,47	
MENOS CAJAS					-0,01	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,00	3,00	0,28	5,04	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	0,18	3,78	
MENOS CAJAS					-0,03	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		31,10	0,35	0,30	3,27	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		8,00	0,35	0,48	1,34	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	0,07	0,84	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	0,07	0,82	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	0,07	0,61	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	0,07	0,76	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	0,07	2,13	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	0,07	0,89	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	0,07	0,63	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	0,07	2,52	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	0,07	0,18	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	0,07	0,07	
MENOS CAJAS					-0,11	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		4,00	3,00	0,18	2,16	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,90	3,00	0,28	3,28	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,70	1,30	0,18	1,57	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,60	3,00	0,18	1,94	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		22,50	1,35	0,18	5,47	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,70	1,65	0,18	2,29	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	3,00	0,18	1,62	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		24,00	1,50	0,18	6,48	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,20	1,20	0,18	0,48	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,00	1,00	0,18	0,18	
MENOS CAJAS					-0,29	**56,41**
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		9,50	3,76	0,07	2,50	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	0,07	0,30	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	0,07	1,26	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	0,07	0,35	




CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	0,07	0,56	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	2,19	0,07	0,25	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,03	1,65	0,09	0,45	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	0,09	1,49	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,65	0,09	0,62	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	2,00	0,09	0,76	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,90	1,86	0,09	1,49	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,20	1,65	0,09	0,62	
CL 53A - CR 81 Y 80		13,40	3,80	0,25	12,73	
CL 53A - CR 81 Y 80		35,40	0,30	0,50	5,31	
CL 53A - CR 81 Y 80		42,00	0,30	0,30	3,78	
CL 53A - CR 81 Y 80		23,98	0,30	0,30	2,16	
CL 53A - CR 81 Y 80		15,30	0,30	0,30	1,38	**36,01**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	0,12	2,60	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	0,12	0,91	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	0,12	1,03	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	0,12	0,39	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	0,12	0,73	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	0,12	0,47	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	0,12	0,14	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,93	1,00	0,12	0,23	
CR 75 - CL 30 Y 30A		9,76	4,25	0,12	4,98	
CR 75 - CL 30 Y 30A		22,80	2,80	0,12	7,66	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,60	1,46	0,12	0,28	
CR 75 - CL 30 Y 30A		7,05	2,80	0,12	2,37	
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,30	1,32	0,12	0,84	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,25	1,00	0,12	0,39	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,30	2,77	0,12	0,43	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,32	0,12	0,28	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	0,12	5,95	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	0,12	0,30	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	0,12	2,73	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	0,12	2,75	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	0,12	1,41	
CR 75 - CL 30 Y 30A		5,30	1,00	0,12	0,64	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,00	0,12	0,21	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,17	0,13	2,82	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	0,13	0,98	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	0,13	1,11	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	0,13	0,42	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,17	0,13	0,79	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	0,13	0,51	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	0,13	0,15	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,93	1,00	0,13	0,25	
CR 75 - CL 30 Y 30A		24,53	2,02	0,13	6,44	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	0,13	0,32	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,94	2,08	0,13	2,96	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,67	0,13	2,98	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	0,13	1,53	
CR 75 - CL 30 Y 30A		28,82	0,30	0,50	4,32	
CR 75 - CL 30 Y 30A		63,46	0,30	0,35	6,66	**69,96**
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,94	1,90	0,09	6,83	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	0,30	0,50	0,54	
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,02	0,30	0,30	1,98	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,98	1,90	0,09	1,88	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,98	1,90	0,16	3,34	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,94	1,90	0,16	12,14	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,57	0,30	0,50	1,14	
CL 28 - CR 75 Y 74A		26,16	0,30	0,30	2,35	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,86	2,10	0,09	0,73	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	0,09	0,41	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,62	1,80	0,09	0,26	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,99	1,80	0,09	0,81	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	0,30	0,50	0,60	
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,68	0,30	0,30	2,76	
CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	0,09	2,33	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,84	0,30	0,30	0,71	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	0,09	0,65	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	0,09	0,58	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	0,16	1,03	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	0,16	1,15	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,23	3,80	0,25	4,97	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,86	2,10	0,16	1,30	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,18	1,80	0,09	0,35	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	0,16	0,73	



CL 28 - CR 75 Y 74A		5,42	1,80	0,09	0,88	
CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	0,16	4,14	**54,57**
CR 74 - CL 27 Y 28		3,88	1,80	0,12	0,84	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,68	1,80	0,12	0,58	
CR 74 - CL 27 Y 28		21,87	1,58	0,13	4,49	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,52	1,80	0,13	1,29	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,00	1,00	0,97	2,91	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	1,00	1,37	2,74	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,50	2,00	1,37	6,85	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,13	0,80	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,32	1,80	0,13	1,24	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	0,13	0,80	**22,54**
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	0,15	9,40	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	0,15	0,29	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,10	1,50	0,15	0,70	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	0,15	3,57	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	0,15	0,63	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	0,15	5,92	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	0,15	2,34	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,90	2,90	0,15	6,05	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	0,15	0,43	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	0,15	1,44	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	0,15	2,75	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	0,15	1,48	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		21,18	2,96	0,10	6,27	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,50	1,30	0,10	0,20	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	2,90	0,10	2,38	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		2,80	1,50	0,10	0,42	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,60	2,90	0,10	3,94	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,40	1,50	0,10	1,56	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,90	1,50	0,10	0,29	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		3,30	2,90	0,10	0,96	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		12,20	1,50	0,10	1,83	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		8,20	1,20	0,10	0,98	
MENOS CAJAS					1,54	**52,26**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	0,20	0,58	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	0,05	0,14	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,18	1,50	0,25	0,82	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	0,20	0,72	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	0,05	0,18	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,22	2,20	0,25	0,67	**3,11**
Del 16 al 23 de marzo del 2025						
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	0,07	0,47	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,50	0,07	1,47	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	0,07	1,52	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,60	1,60	0,07	0,18	
MENOS CAJAS					0,63	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,00	3,00	0,18	1,62	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,40	0,18	0,50	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	0,18	2,16	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	0,18	0,93	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,80	3,00	0,18	2,05	
CL 36 - CR 80 Y 81		16,56	0,35	0,30	1,74	
CL 36 - CR 80 Y 81		11,04	0,35	0,48	1,85	
MENOS CAJAS					6,46	**14,50**
LAURELES - LORENA						
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		61,53	0,35	0,30	6,46	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		41,02	0,35	0,48	6,89	**13,35**
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		3,50	2,00	0,10	0,70	
CL 53A - CR 81 Y 80		7,00	3,90	0,19	5,19	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	0,19	0,82	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	0,19	3,43	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	0,19	0,95	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	3,90	0,19	1,19	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,56	7,30	0,19	4,94	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	0,19	1,52	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,14	3,56	0,19	5,51	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,30	0,30	0,50	0,65	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,80	0,30	0,30	0,25	**25,13**
BELÉN GRANADA						

CR 75 - CL 30A Y 28		6,60	2,10	0,25	3,47	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	2,44	0,12	2,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,20	1,55	0,12	0,22	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,46	0,12	0,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	1,50	0,12	0,45	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,50	0,12	0,33	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,90	1,50	0,12	0,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,80	2,50	0,12	1,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,40	1,40	0,12	0,40	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,12	0,30	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,40	1,40	0,12	0,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,00	2,76	0,12	0,99	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	2,50	0,12	1,14	
CR 75 - CL 30A Y 28		14,00	1,40	0,12	2,35	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,25	1,10	0,12	0,17	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	1,30	0,12	0,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		108,15	0,30	0,50	16,22	
CR 75 - CL 30A Y 28		46,86	0,30	0,30	4,22	**36,41**
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,00	2,30	0,13	1,50	
CL 28 - CR 75 Y 74A		12,50	2,00	0,13	3,25	
CL 28 - CR 75 Y 74A		20,50	2,00	0,13	5,33	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	2,10	0,13	1,09	**11,17**
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		46,02	0,35	0,30	4,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		59,30	0,35	0,48	9,96	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,90	1,50	0,10	0,89	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,42	0,10	3,85	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	4,60	0,10	1,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,55	1,50	0,10	0,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	3,00	0,10	0,72	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,45	1,50	0,10	0,37	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	2,15	0,10	0,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,60	1,48	0,10	3,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	4,40	0,10	4,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,50	2,15	0,10	1,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	2,30	0,10	0,46	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,70	0,25	0,12	0,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	0,63	0,20	0,96	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,80	0,35	0,15	0,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	0,50	0,13	0,49	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,36	0,39	0,10	0,17	
MENOS CAJAS					0,16	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,90	1,50	0,10	0,89	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,42	0,10	3,85	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	4,60	0,10	1,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,55	1,50	0,10	0,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	3,00	0,10	0,72	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,45	1,50	0,10	0,37	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	2,15	0,10	0,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,60	1,48	0,10	3,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	4,40	0,10	4,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,50	2,15	0,10	1,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	2,30	0,10	0,46	**53,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	0,20	0,77	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	0,20	0,78	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,30	2,00	0,23	0,60	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	0,03	0,12	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	4,80	0,23	1,10	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	0,03	0,12	
CL 50A - CR 86 Y 96C		6,80	0,30	0,50	1,02	**4,51**
Del 24 al 31 de marzo						
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR.						
CL 40A-CR 83A Y 84		24,58	0,35	0,48	4,13	
CL 40A-CR 83A Y 84		52,92	0,35	0,30	5,56	**9,69**
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	0,10	4,10	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	0,10	1,35	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	0,10	1,48	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	0,10	0,29	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	0,10	1,23	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	0,10	1,10	
CL 57-CR 36A Y 34		54,70	1,22	0,10	6,67	
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	0,15	6,15	

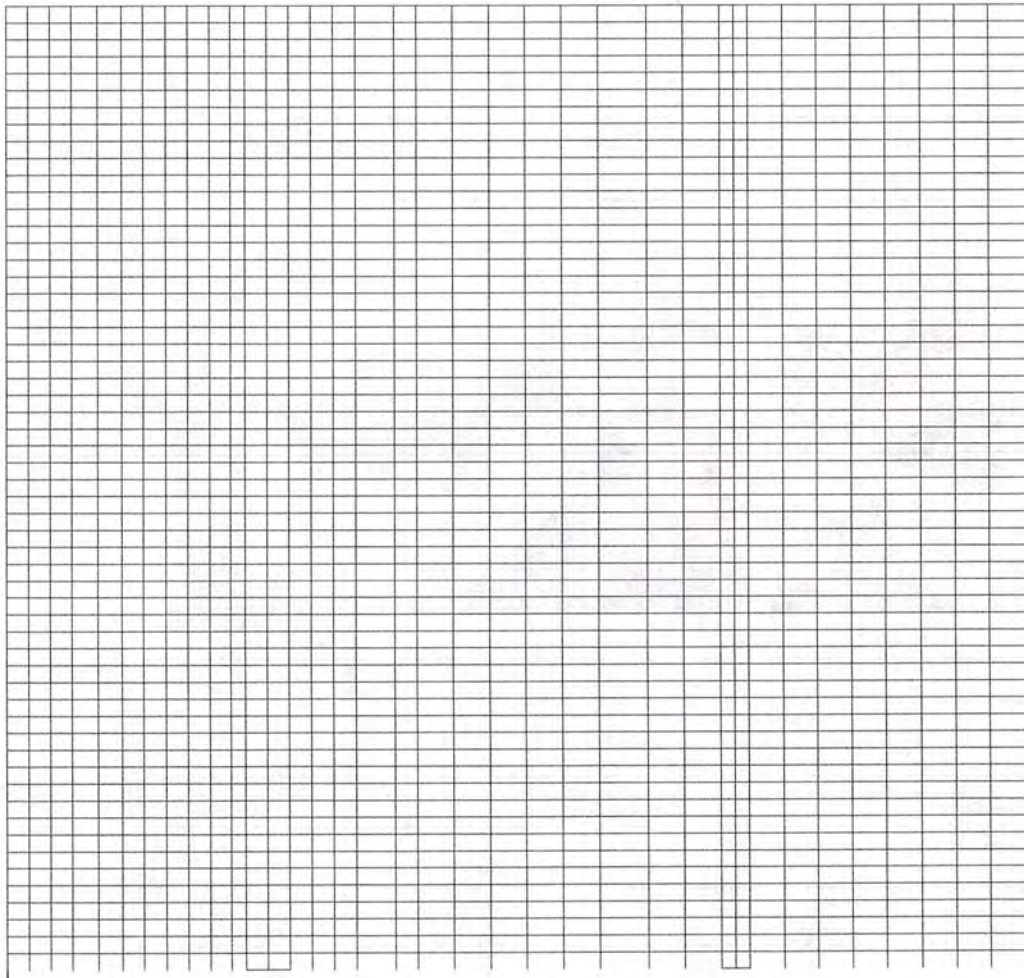

CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	0,15	2,03	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	0,15	2,22	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	0,15	0,43	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	0,15	1,85	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	0,15	1,66	
CL 57-CR 36A Y 34		12,20	1,22	0,15	2,23	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,30	1,50	0,10	0,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,94	2,90	0,10	4,04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,90	1,50	0,15	1,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,42	0,15	5,77	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	4,60	0,15	2,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,55	1,50	0,15	1,02	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	3,00	0,15	1,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,45	1,50	0,15	0,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	2,15	0,15	0,97	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,60	1,48	0,15	5,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	4,40	0,15	6,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,50	2,15	0,15	1,77	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	2,30	0,15	0,69	
MENOS CAJAS					0,70	63,77
LAURELES - LAS ACACIAS						
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	0,18	1,21	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,40	0,18	3,53	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	0,18	3,91	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,30	3,00	0,18	7,72	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,50	0,18	1,00	17,36
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	0,20	0,24	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	0,20	0,57	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	1,00	0,20	0,40	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,20	1,00	0,05	0,06	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,00	1,10	0,23	0,51	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	2,00	0,03	0,06	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,30	0,05	0,14	
CL 50A - CR 86 Y 96C		4,00	0,30	0,50	0,60	2,58
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	0,15	2,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	0,15	2,06	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	0,15	1,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	0,15	1,73	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	0,15	2,93	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	0,15	2,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		27,60	0,50	0,30	4,14	
CR 75 - CL 30A Y 28		15,00	0,30	0,35	1,58	18,42
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	0,09	3,04	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	0,09	1,32	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,00	2,00	0,09	1,44	
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	0,16	5,40	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,00	2,00	0,16	12,48	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	0,16	2,34	
CL 28 - CR 75 Y 74A		8,40	2,00	0,16	2,69	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,00	2,00	0,16	0,96	
CL 28 - CR 75 Y 74A		36,96	0,30	0,50	5,54	
CL 28 - CR 75 Y 74A		102,82	0,30	0,35	10,80	46,00
CR 74 - CL 27 Y 28		24,45	1,80	0,13	5,72	
CR 74 - CL 27 Y 28		40,50	2,00	0,13	10,53	
CR 74 - CL 27 Y 28		53,98	0,30	0,35	5,67	21,92
	Subtotal					799,33
	TOTAL					799,33

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	9
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ITEM	4.1.1	DESCRIPCIÓN	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 23 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,20	1,20	3,84	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,30	1,20	1,56	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,62	1,10	2,88	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,18	1,50	3,27	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,80	1,40	3,92	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	4,80	4,80	
CL 50A - CR 86 Y 96C		3,27	1,10	3,60	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,22	2,20	2,68	**26,55**
Del 24 al 31 de marzo					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,80	2,20	1,76	**1,76**
				Subtotal	**28,31**
				TOTAL	**28,31**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	4.1.5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.






LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,80	1,20	3,36	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,20	0,55	0,66	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,15	0,58	0,67	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,90	1,45	4,21	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,90	2,55	15,05	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,57	1,75	4,50	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,65	1,22	5,67	
CL 37D - CR 82A Y 83A		3,75	2,45	9,19	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,85	1,85	1,57	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,45	1,33	3,26	
CL 37D - CR 82A Y 83A		15,96	1,45	23,14	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,34	3,78	8,85	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,80	1,55	7,44	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,37	4,90	11,61	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,10	1,55	6,36	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,50	2,50	11,25	
CL 37D - CR 82A Y 83A		6,00	1,50	9,00	
CL 37D - CR 82A Y 83A		3,00	2,60	7,80	
CL 37D - CR 82A Y 83A		21,30	1,50	31,95	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,70	2,40	6,48	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,20	1,50	7,80	
CL 40A - CR 83A Y 84		3,15	1,30	4,10	
CL 40A - CR 83A Y 84		5,10	2,59	13,21	
CL 40A - CR 83A Y 84		3,87	1,57	6,08	
CL 40A - CR 83A Y 84		17,86	1,42	25,36	
CL 40A - CR 83A Y 84		3,05	4,03	12,29	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,87	7,90	14,77	
CL 40A - CR 83A Y 84		7,55	1,38	10,42	
CL 40A - CR 83A Y 84		2,41	1,90	4,58	
CL 40A - CR 83A Y 84		8,00	1,36	10,88	
CL 40A - CR 83A Y 84		6,42	2,51	16,11	
CL 40A - CR 83A Y 84		3,90	6,85	26,72	
CL 40A - CR 83A Y 84		0,60	1,85	1,11	








CL 40A - CR 83A Y 84		3,60	3,00	10,80	
MENOS CAJAS			0,46		335,77
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		3,60	3,00	10,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,70	1,45	3,92	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,70	3,00	5,10	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,90	1,40	5,46	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,00	2,90	17,40	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,40	1,50	6,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,80	3,00	14,40	
MENOS CAJAS				4,43	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,00	2,60	15,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,90	1,40	4,06	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,00	2,80	8,40	
MENOS CAJAS				0,56	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,70	1,40	9,38	
CL 36 - CR 80 Y 81		9,90	3,00	29,70	
MENOS CAJAS				0,35	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,10	3,00	18,30	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,50	1,15	7,48	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	3,10	3,72	
CL 36 - CR 80 Y 81		10,90	1,20	13,08	
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	2,75	22,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,30	1,25	9,13	
MENOS CAJAS				1,41	197,77
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,10	1,40	4,34	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	2,70	5,40	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,70	1,20	11,64	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		9,20	1,60	14,72	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		8,50	3,00	25,50	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,80	1,30	8,84	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,50	1,50	2,25	
MENOS CAJAS				-1,14	71,55
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		9,50	3,86	36,67	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,74	1,57	4,30	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,76	4,80	18,05	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,56	3,20	4,99	
CL 53A - CR 81 Y 80		1,60	4,00	6,40	
CL 53A - CR 81 Y 80		3,56	7,30	25,99	
CL 53A - CR 81 Y 80		4,70	1,70	7,99	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,14	3,56	28,98	133,37
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30 Y 30A		27,64	2,30	63,57	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,80	2,70	7,56	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,17	3,95	8,57	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,50	2,17	3,26	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,60	1,50	3,90	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,20	0,95	1,14	
CR 75 - CL 30 Y 30A		3,50	3,36	11,76	
CR 75 - CL 30 Y 30A		13,73	1,47	20,18	
CR 75 - CL 30 Y 30A		11,50	2,08	23,92	
CR 75 - CL 30 Y 30A		2,07	1,20	2,48	
CR 75 - CL 30 Y 30A		1,76	1,32	2,32	148,67
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,00	1,60	48,00	








CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	1,00	7,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,80	5,67	**60,87**
CR 74 - CL 27 Y 28		10,00	1,30	13,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,10	1,30	6,63	
CR 74 - CL 27 Y 28		14,00	1,80	25,20	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,80	2,00	13,60	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	1,00	1,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,50	4,00	**63,43**
Del 16 al 23 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		3,81	2,41	9,18	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,64	1,59	8,97	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,47	2,50	3,68	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,85	1,25	6,06	
CL 37D - CR 82A Y 83A		6,70	2,45	16,42	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,86	1,35	3,86	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,73	2,39	6,52	
CL 37D - CR 82A Y 83A		5,09	1,36	6,92	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,80	2,11	5,91	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,24	0,53	0,66	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,81	1,61	1,30	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,27	1,42	1,80	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,32	1,05	1,39	
MENOS CAJAS				2,23	**70,44**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		9,90	3,00	29,70	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,80	1,30	8,84	
CL 36 - CR 80 Y 81		6,60	1,40	9,24	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,50	2,90	13,05	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	1,40	5,18	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,70	2,85	10,55	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,40	2,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,20	2,80	8,96	
CL 36 - CR 80 Y 81		3,20	1,40	4,48	
CL 36 - CR 80 Y 81		4,00	3,00	12,00	
MENOS CAJAS				2,00	**102,79**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,00	1,50	21,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		5,80	1,40	8,12	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,70	2,60	4,42	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,30	1,40	10,22	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,00	2,90	8,70	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		7,00	1,30	9,10	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		3,70	2,90	10,73	
MENOS CAJAS				2,27	
MENOS CAJAS				0,16	**69,86**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		22,80	2,36	53,81	
CR 75 - CL 30A Y 28		14,00	1,40	19,60	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,25	1,10	1,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	1,30	1,30	**76,08**
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,39	1,90	4,54	
CL 28 - CR 75 Y 74A		17,25	1,50	25,88	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,80	1,80	











CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,80	1,80	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,80	1,80	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	1,80	1,80	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,57	1,80	6,43	
MENOS CAJAS				2,10	**41,94**
CR 74 - CL 27 Y 28		5,52	1,80	9,94	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,40	1,80	6,12	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,65	1,80	6,57	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,32	1,80	9,58	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,88	1,80	6,98	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,68	1,80	4,82	**44,01**
Del 24 al 31 de marzo					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		10,00	4,10	41,00	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	1,80	13,50	
CL 57-CR 36A Y 34		3,90	3,80	14,82	
CL 57-CR 36A Y 34		3,52	3,50	12,32	
CL 57-CR 36A Y 34		2,30	4,80	11,04	
CL 57-CR 36A Y 34		3,20	0,90	2,88	
CL 57-CR 36A Y 34		30,00	1,22	36,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,43	2,40	3,43	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	3,00	6,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,70	3,00	8,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,80	1,40	3,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,20	3,00	12,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,30	1,40	4,62	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	3,00	3,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	1,40	2,24	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,50	3,00	4,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,90	3,00	5,70	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,00	3,00	18,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	1,30	3,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	3,00	24,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,25	1,40	4,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,80	3,00	5,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,90	1,40	5,46	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	3,00	6,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,90	1,40	8,26	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	2,90	2,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,40	3,29	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		15,00	3,00	45,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	1,40	11,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,70	1,30	13,91	
MENOS CAJAS				9,94	**328,50**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		2,40	2,80	6,72	
CL 36 - CR 80 Y 81		14,00	1,40	19,60	
CL 36 - CR 80 Y 81		7,00	3,10	21,70	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,60	1,60	2,56	
MENOS CAJAS				0,36	**50,22**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		14,60	1,60	23,36	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		10,30	1,60	16,48	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		6,30	2,40	15,12	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		10,60	1,45	15,37	





CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,40	2,50	6,00	
MENOS CAJAS				1,60	**74,73**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		2,50	1,65	4,13	
CL 53A - CR 81 Y 80		0,50	2,00	1,00	
CL 53A - CR 81 Y 80		17,90	1,73	30,97	
CL 53A - CR 81 Y 80		2,00	2,00	4,00	
CL 53A - CR 81 Y 80		8,50	1,90	16,15	**56,24**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	2,44	18,79	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,20	1,55	1,86	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,46	6,15	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	1,50	3,75	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,50	2,75	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,90	1,50	4,35	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,80	2,50	14,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,40	1,40	3,36	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	2,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,40	1,40	6,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,00	2,76	8,28	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	2,50	9,50	**81,95**
CR 74 - CL 27 Y 28		7,10	2,40	17,04	
CR 74 - CL 27 Y 28		10,50	1,50	15,75	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,40	1,00	4,40	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,40	2,48	13,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		9,30	1,50	13,95	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,80	1,70	9,86	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,22	1,00	6,22	**80,61**
MR DE 20CM					
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		6,40	2,65	16,96	
CL 37D - CR 82A Y 83A		13,60	2,85	38,76	**55,72**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		8,00	3,00	24,00	**24,00**
Del 16 al 23 de marzo del 2025					
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		6,40	3,10	19,84	**19,84**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		12,00	3,00	36,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		10,00	3,00	30,00	**66,00**
Del 24 al 31 de marzo					
BOSTON - ENCISO		9,00	3,00	27,00	**27,00**
MR 15CM					
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		9,00	2,00	18,00	
CL 53A - CR 81 Y 80		9,38	2,10	19,69	
CL 53A - CR 81 Y 80		14,25	0,60	8,55	**46,24**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30 Y 30A		26,70	2,17	57,94	**57,94**
	Subtotal				**2.385,55**
	TOTAL				**2.385,55**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	11
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025		
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR	259,70	259,70
LAURELES - LAS ACACIAS	197,90	197,90
LAURELES - LORENA	52,05	52,05
LA AMÉRICA - FERRINI	119,12	119,12
BELÉN GRANADA	327,33	327,33
LA AMÉRICA - CALASANZ	1,60	1,60
Del 16 al 23 de marzo del 2025		
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR	69,50	69,50
LAURELES - LAS ACACIAS	27,90	27,90
LAURELES - LORENA	139,55	139,55
BELÉN GRANADA	83,97	83,97
BOSTON - ENCISO	155,32	155,32
LA AMÉRICA - CALASANZ	1,60	1,60
Del 24 al 31 de marzo		
BOSTON - ENCISO	60,00	60,00
LAURELES - LAS ACACIAS	61,05	61,05
LAURELES - LORENA	51,00	51,00
LA AMÉRICA - CALASANZ	1,60	1,60
BELÉN GRANADA	172,80	172,80
Subtotal		1.781,99
TOTAL		1.781,99

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	12
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,12	2,60	10,71	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,67	1,20	3,20	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,28	1,40	3,19	
CL 37D - CR 82A Y 83A		4,00	2,73	10,92	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,85	0,85	1,57	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,56	2,34	3,65	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,27	1,39	1,77	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,19	1,08	1,29	
CL 40A - CR 83A Y 84		0,50	1,69	0,85	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,00	2,30	2,30	
CL 40A - CR 83A Y 84		0,60	2,35	1,41	
CL 40A - CR 83A Y 84		1,45	0,70	1,02	**41,87**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		1,70	1,27	2,16	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,50	1,44	2,16	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,80	1,25	2,25	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,20	2,80	3,36	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,90	1,44	2,74	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,80	1,35	3,78	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,50	1,10	1,65	
CL 36 - CR 80 Y 81		9,90	1,50	14,85	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,70	1,40	2,38	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,30	1,20	1,56	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,50	1,20	1,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,30	1,20	2,76	**41,45**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,40	2,80	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,80	1,40	2,52	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,80	1,40	2,52	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,50	3,00	**10,84**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		10,00	1,45	14,50	
CL 53A - CR 81 Y 80		16,00	1,45	23,20	
MENOS CAJAS				2,28	**35,43**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30 Y 30A		38,00	2,10	79,80	
CR 75 - CL 30 Y 30A		35,60	2,17	77,25	
CR 75 - CL 30 Y 30A		10,00	2,30	23,00	
MENOS CAJAS				4,20	**175,85**
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,00	1,60	48,00	
MENOS CAJAS				2,63	**45,38**
CR 74 - CL 27 Y 28		8,00	2,00	16,00	
MENOS CAJAS				0,70	**15,30**





Del 16 al 23 de marzo del 2025					
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR					
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,04	1,50	1,56	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,33	1,48	1,97	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,34	1,30	1,74	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,29	1,45	1,87	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,48	2,35	3,48	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,30	0,58	1,33	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,41	0,95	1,34	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,53	2,36	3,61	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,69	1,20	2,03	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,45	2,35	3,41	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,49	0,97	1,45	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,40	1,20	2,88	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,05	2,56	5,25	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,12	1,21	2,57	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,17	0,60	1,30	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,33	3,41	4,54	
CL 37D - CR 82A Y 83A		2,47	1,43	3,53	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,05	1,32	1,39	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,53	1,24	0,66	
CL 37D - CR 82A Y 83A		0,81	1,61	1,30	
CL 37D - CR 82A Y 83A		1,27	1,42	1,80	**49,00**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,50	3,00	
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,40	2,80	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,80	1,50	2,70	
CL 36 - CR 80 Y 81		1,95	1,50	2,93	**11,43**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,40	2,80	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,40	2,80	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,90	1,50	2,85	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,90	1,50	2,85	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,90	1,40	2,66	**13,96**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		17,80	2,17	77,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,00	1,65	33,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,00	1,65	16,50	
MENOS CAJAS				2,63	**124,13**
CR 74 - CL 27 Y 28		10,00	2,00	20,00	
MENOS CAJAS				0,88	**19,13**
Del 24 al 31 de marzo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	1,43	2,86	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,43	1,45	2,07	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,36	1,31	1,78	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,41	3,95	5,57	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	3,11	9,02	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	1,41	2,19	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	2,00	6,00	**29,49**
LAURELES - LAS ACACIAS					
CL 36 - CR 80 Y 81		2,00	1,40	2,80	**2,80**
LAURELES - LORENA					
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,60	3,20	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,60	3,20	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		2,00	1,50	3,00	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,80	1,40	2,52	
CR 79 - CL 38 Y TV 39B		1,80	1,40	2,52	**14,44**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		20,00	1,65	33,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		38,00	1,65	62,70	
MENOS CAJAS				5,08	**90,63**
	SUBTOTAL				**721,10**
	TOTAL				**721,10**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	6.1	DESCRIPCIÓN	Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025		
LA AMÉRICA- SIMÓN BOLIVAR	32,00	32,00
LAURELES - LORENA	1,00	1,00
Subtotal		33,00
TOTAL		33,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	14
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.3	DESCRIPCIÓN	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 16 al 23 de marzo del 2025		
BELÉN GRANADA	3,00	3,00
Subtotal		3,00
TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	15
FECHA	**DD**	31	**MM**	3	**AA**	2025	**PERÍODO**	01/03/2025 - 31/03/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	

ÍTEM	7.2	**DESCRIPCIÓN**	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	**UNID.**	m	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	**LONGITUD**	**MEDIDA TOTAL**
Del 01 al 15 de marzo del 2025		
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	7,90	**7,90**
BELÉN GRANADA	77,75	**77,75**
LA AMÉRICA - CALASANZ	2,20	**2,20**
Del 16 al 23 de marzo del 2025		
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	3,36	**3,36**
BELÉN GRANADA	18,00	**18,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ	3,60	**3,60**
Del 24 al 31 de marzo		
LA AMÉRICA - CALASANZ	2,00	**2,00**
LA AMÉRICA - FERRINI	7,20	**7,20**
	Subtotal	**122,01**
	TOTAL	**122,01**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	16
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 15 de marzo del 2025			
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR		3,40	3,40
LAURELES - LAS ACACIAS		8,00	8,00
LAURELES - LORENA		11,70	11,70
BELÉN GRANADA		24,95	24,95
LA AMÉRICA - CALASANZ		4,67	4,67
Del 16 al 23 de marzo del 2025			
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR		2,60	2,60
LAURELES - LORENA		4,00	4,00
BELÉN GRANADA		2,00	2,00
LA AMÉRICA - CALASANZ		6,80	6,80
Del 24 al 31 de marzo			
LAURELES - LAS ACACIAS		8,60	8,60
LAURELES - LORENA		19,00	19,00
LA AMÉRICA - CALASANZ		4,40	4,40
LA AMÉRICA - FERRINI		2,00	2,00
BELÉN GRANADA		8,00	8,00
Subtotal			110,12
TOTAL			110,12

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
VALOR PPTO AMBIENTAL	$ 126.711.013
PLAZO INICIAL:	5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	**PERIODO**
	1-dic.-24 a **31-ene.-25**

CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha de realizacion del presupuesto 7/03/2024

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA N°2 DICIEMBRE		ACTA N°2 ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO	
GESTIÓN AMBIENTAL																	
1,0	**Manejo de residuos sólidos**			**PPTO CONTRACTUAL**													
1,1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y organicos)	Juego	8,00	$ 175.030,00	$ 1.400.240,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 175.030,00	1,00	$ 175.030,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2	$ 350.060,00
1,2	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales) *	Juego	6,00	$ 541.116,00	$ 3.246.696,00	1,00	$ 541.116,00	5,00	$ 2.705.580,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	6	$ 3.246.696,00
1,3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 694,00	$ 1.526.800,00	50,00	$ 34.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100	$ 69.400,00	84	$ 58.296,00	234	$ 162.396,00
1,4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 708,00	$ 1.557.600,00	50,00	$ 35.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	80	$ 56.640,00	76	$ 53.808,00	206	$ 145.848,00
1,5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 638,00	$ 1.403.600,00	50,00	$ 31.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	60	$ 38.280,00	76	$ 48.488,00	186	$ 118.668,00
1,6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1100,00	$ 1.077,00	$ 1.184.700,00	50,00	$ 53.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50	$ 53.850,00	40	$ 43.080,00	140	$ 150.780,00
1,7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	un	4,00	$ 297.507,00	$ 1.190.028,00	1,00	$ 297.507,00	3,00	$ 892.521,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	4	$ 1.190.028,00
1,8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	200,00	$ 5.236,00	$ 1.047.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	20,00	$ 51.487,00	$ 1.029.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	22,00	$ 63.008,00	$ 1.386.176,00	2,00	$ 126.016,00	4,00	$ 252.032,00	11,00	$ 693.088,00	5	$ 315.040,00	0	$ 0,00	22	$ 1.386.176,00
1,11	Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg *	un	1,00	$ 87.424,00	$ 87.424,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	14,00	$ 12.000,00	$ 168.000,00	2,00	$ 24.000,00	12,00	$ 144.000,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	14	$ 168.000,00
2,00	**Maquinaria, vehículos y equipo en obra**																
2,1	Lona banner, 13 onzas para vehiculo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	20,00	$ 35.000,00	$ 700.000,00	5,00	$ 175.000,00	5,00	$ 175.000,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	10,00	$ 350.000,00
3,00	**Ahorro y uso eficiente de agua y energía**																
3,1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *	un	1,00	$ 264.710,00	$ 264.710,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,00	**Manejo de sustancias químicas**																
4,1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	8,00	$ 260.048,00	$ 2.080.384,00	1,00	$ 260.048,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 780.144,00	2,00	$ 520.096,00	1,00	$ 260.048,00	7,00	$ 1.820.336,00
4,2	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	un	8,00	$ 443.258,00	$ 3.546.064,00	1,00	$ 443.258,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.329.774,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.773.032,00
5,00	**Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción**																
5,1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	44,00	$ 20.000,00	$ 880.000,00	20,00	$ 400.000,00	24,00	$ 480.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 880.000,00
5,2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	110,00	$ 8.300,00	$ 913.000,00	55,00	$ 456.500,00	55,00	$ 456.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 913.000,00
5,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	22,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 852.170,00
5,4	Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	44,00	$ 1.225.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.225.246,00
5,5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	2,00	$ 24.000,00	8,00	$ 96.000,00	12,00	$ 144.000,00	12,00	$ 144.000,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 408.000,00
6,00	**Control de emisiones atmosféricas**																
6,1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	200,00	$ 9.802,00	$ 1.960.400,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 1.960.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 1.960.400,00
6,2	Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	4,00	$ 87.663,00	$ 350.652,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

7,00	**Protección del suelo**																
7,1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	kg	220,00	$ 8.300,00	$ 1.826.000,00	55,00	$ 456.500,00	165,00	$ 1.369.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 1.826.000,00
8,00	**Manejo de campamento e instalaciones temporales**																
8,1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	4,00	$ 48.000,00	4,00	$ 48.000,00	8,00	$ 96.000,00	6,00	$ 72.000,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 264.000,00
8,2	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	44,00	$ 1.225.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.225.246,00
8,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	22,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 852.170,00
9,00	**Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos**																
9,1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	8,00	$ 51.878,00	$ 415.024,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	440,00	$ 1.994,00	$ 877.360,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 199.400,00	100,00	$ 199.400,00	240,00	$ 478.560,00	0,00	$ 0,00	440,00	$ 877.360,00
9,3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	66,00	$ 716.115,00	$ 47.263.590,00	2,00	$ 1.432.230,00	6,00	$ 4.296.690,00	1,00	$ 716.115,00	6,00	$ 4.296.690,00	3,00	$ 2.148.345,00	18,00	$ 12.890.070,00
10,00	**Gestión de la fauna y la flora**																
10,1	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	50,00	$ 1.994,00	$ 99.700,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 99.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 99.700,00
10,2	Estacón en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 9.940,00	$ 695.800,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 298.200,00	30,00	$ 298.200,00	10,00	$ 99.400,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 695.800,00
	Plan de Manejo de Tránsito																
11,00	**Señalización y Desvíos**																
11,1	Señales informativa. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	8,00	$ 1.328.328,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.328.328,00
11,2	Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	8,00	$ 164.779,00	$ 1.318.232,00	8,00	$ 1.318.232,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.318.232,00
11,3	Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vias secundarias. 60x60 *	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	8,00	$ 1.328.328,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.328.328,00
11,4	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 160.000,00	6,00	$ 240.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 400.000,00
11,5	Maletín (2,0 x 1,0 m) *	un	8,00	$ 274.976,00	$ 2.199.808,00	8,00	$ 2.199.808,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.199.808,00
11,6	Balizas (1,4 m) *	un	66,00	$ 27.847,00	$ 1.837.902,00	66,00	$ 1.837.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	66,00	$ 1.837.902,00
11,7	Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	16,00	$ 54.232,00	$ 867.712,00	16,00	$ 867.712,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 867.712,00
11,8	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	8,00	$ 210.364,00	$ 1.682.912,00	8,00	$ 1.682.912,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.682.912,00
11,9	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,10	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	220,00	$ 1.749,00	$ 384.780,00	220,00	$ 384.780,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 384.780,00
11,11	Teleras 1,35m x 0,90 m	un	40,00	$ 20.000,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 800.000,00
11,12	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	8,00	$ 222.013,00	$ 1.776.104,00	4,00	$ 888.052,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 888.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.776.104,00
12,0	**Subprograma de seguridad y salud en el trabajo**																
12,1	Extintor multiproposito 10 Lb (incluye recarga en caso de necesitarse)*	un	8,00	$ 34.769,00	$ 278.152,00	4,00	$ 139.076,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 139.076,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 278.152,00
12,2	Silvato brigadista	un	8,00	$ 8.571,00	$ 68.568,00	2,00	$ 17.142,00	6,00	$ 51.426,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 68.568,00
12,3	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	un	8,00	$ 144.086,00	$ 1.152.688,00	4,00	$ 576.344,00	2,00	$ 288.172,00	2,00	$ 288.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.152.688,00
12,4	Botiquín primeros auxilios (en lona) TIPO A	un	8,00	$ 171.898,00	$ 1.375.184,00	4,00	$ 687.592,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 687.592,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.375.184,00
13,0	**Personal para brigada Ambiental**																
13,1	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	hr	3025,00	$ 9.017,00	$ 27.276.425,00	40,00	$ 360.680,00	240,00	$ 2.164.080,00	2100,00	$ 18.935.700,00	645,00	$ 5.815.965,00	0,00	$ 0,00	3025,00	$ 27.276.425,00
	TOTAL				**$ 126.711.013,00**		**$ 22.771.746,00**		**$ 16.392.231**		**$ 24.840.569**		**$ 13.289.696**		**$ 2.612.068**		**$ 79.906.305**

ERNESTO MILLÁN CUENCA
CONTRATISTA

MAYRA ALEJANDRA PIMINETO GUTIÉRREZ
INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/02/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





			CANTIDAD
FRENTE:			
Las Americas			
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b		10,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a		4,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84		4,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80		7,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C		4,00
Laureles			
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81		20,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)		8,00
Candelaria			
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46		1,00
Belén Granada			
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28		7,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B		5,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74		5,00
Boston/Enciso			
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57		7,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35		2,00
			-
Subtotal			84,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	9,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	4,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	4,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	5,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	4,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	15,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	8,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	1,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	7,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	5,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	5,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	7,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	2,00
		-
Subtotal		76,00
TOTAL		76,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	3
FECHA	**DD**	31	**MM**	3	**AA**	2025	**PERÍODO**	01/03/2025 - 31/03/2025	**ELABORÓ**	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	**6/11/2024**

ÍTEM	1,50	**DESCRIPCIÓN**	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	**UNID.**	un	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	9,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	5,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	4,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	5,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	4,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	15,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (36b)	8,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	7,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	5,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	5,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	7,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	2,00
		-
Subtotal		76,00
TOTAL		76,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	4
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/02/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,60	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	4,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	2,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	2,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	3,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	2,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	10,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	3,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 26	3,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	3,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	3,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	4,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
		-

OBSERVACIONES:

Subtotal	40,00
TOTAL	40,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	5
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	4,1	DESCRIPCIÓN	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Subtotal		1,00
TOTAL		1,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	6
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/03/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	9,3	DESCRIPCIÓN	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	1,00
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	2,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
		-
Subtotal		3,00
TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CONTRATO	4600102792 DE 2024	
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
	VALOR PPTO SOCIAL	$ 30.782.608	
	PLAZO INICIAL:	5 MESES	
	CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF	
	INTERVENTORÍA	SITELSA SAS	
	FECHA ACTA:	PERIODO	
		1-mar.-26	31-mar.-26

PLANTILLA PRESUPUESTO GESTION SOCIAL EN OBRA

APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Programa de información y comunicación a la comunidad**					**ACTA N°1 Del 06 al 30 de noviembre**		**ACTA N°2 Del 01 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025**		**ACTA N°3 Del 1 al 28 de febrero 2025**		**ACTA N°4 Del 1 al 31 de marzo 2025**		**ACUMULADO**	
1,1	Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	un	11000	165	$ 1.815.000	240,00	$ 39.600	463,00	$ 76.395,00	428,00	$ 70.620,00	$ 403,00	$ 66.495,00	1.534,00	$ 253.110,00
1,2	Cartelera informativa (corcho con marco de madera y banner en adhesivo full color.) 120x80 (incluye diseño y producción).	un	8	164000	$ 1.312.000	4,00	$ 656.000	1,00	$ 164.000,00	-	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 820.000,00
1,3	Buzón de sugerenoias 24cm de Ancho 16cm de alto por 15c de fondo, material en acrílico, impresión adhesivo en inkjet.	un	8	120210	$ 961.680	2,00	$ 240.420	3,00	$ 360.630,00	-	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 601.050,00
1,4	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) **Incluye producción y diseño.**	un	8	393410	$ 3.147.280	2,00	$ 788.820	6,00	$ 2.360.460,00	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 3.147.280,00
1,5	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) Incluye producción y diseño) unidades adicionales por reposición, robo, durabilidad	un		393410	$ -		$ -	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
1,6	Imantado para vehículos Foto Vinilo impreso a 720 Dpi 0,5x0,3 (Según manual de obra)	un	2	65570	$ 131.140	2,00	$ 131.140	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 131.140,00
2	**Programa de participación comunitaria**														
2,1	Logística reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ sillelería + auditorio para 30 personas)	un	17	43700	$ 742.900	2,00	$ 87.400	3,00	$ 131.100,00	1,00	$ 43.700,00	$ 1,00	$ 43.700,00	7,00	$ 305.900,00
2,2	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio y finalización para 30 personas por reunion/ reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	510	8190	$ 4.176.900	28,00	$ 229.320	90,00	$ 737.100,00	60,00	$ 491.400,00	$ 30,00	$ 245.700,00	208,00	$ 1.703.520,00
2,3	Logística reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ sillelería para 20 personas)	un	5	43700	$ 218.500	0	$ -	1,00	$ 43.700,00	0,00	$ -	$ 1,00	$ 43.700,00	2,00	$ 87.400,00
2,4	Refrigerios para reuniones con CCO / 20 personas por CCO/ 7 reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	140	8190	$ 1.146.600	0	$ -	20,00	$ 163.800,00	0,00	$ -	$ 15,00	$ 122.850,00	35,00	$ 286.650,00
3	**Programa de formación y capacitación**														
3,1	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller. + video beam)	un	17	150000	$ 2.550.000	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ 1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00
3,2	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 20 personas por taller/ 17 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	340	8190	$ 2.784.600	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ 15,00	$ 122.850,00	-	$ 122.850,00
4	**Programa de Sostenibilidad y calidad de la obra**														
4,1	Actividades de sostenibilidad y apropiación de obras /(logística de la actividad asociada de acuerdo al objeto de contrato)	un	17	400000	$ 6.800.000	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,2	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 11 actividades/ 20 personas Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	340	8190	$ 2.784.600	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
5	**Plan de divulgación (Plan de Manejo de Tránsito (PMT)**														
5,1	Instalación de pasacalle con las siguientes características: Lona impresa full color **Tamaño:** 90 cms de alto x 9 mts de ancho con 5 palos, uno en cada lateral y 3 distribuidos en el centro. **Incluye:**producción, instalación y desinstalación.	un	8	276426	$ 2.211.408	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
	TOTAL				**$ 30.782.608**		**$ 2.170.700**		**$ 4.037.185**		**$ 606.720,00**		**$ 795.296,00**		**$ 7.608.900**

ERNESTO MILLÁN CUENCA
CONTRATISTA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ
INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	1
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	1,1	DESCRIPCIÓN	Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	UNID.	un	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
EXTENSIÓN HORARIO DE OBRA	Comuna 10	Boston	32,00
	Comuna 16	Belén Granada	14,00
	Comuna 11	Laureles	3,00
DIVULGACIÓN	Comuna 14	La Florida - Las Lomas	354,00
			-
Subtotal			
TOTAL			403,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	2	
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2,1	DESCRIPCIÓN	Logística reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silletería + auditorio para 30 personas)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
COMUNA 14	La Florida		1,00
	Las Lomas		
			-
Subtotal			1,00
TOTAL			1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	3
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	2,2	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio y finalización para 30 personas por reunion/ reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
COMUNA 14	La Florida		30,00
	Las Lomas		
			-
Subtotal			30,00
TOTAL			30,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Logística reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ silletería para 20 personas)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
COMUNA 12	Simón Bolívar		1,00
			-
Subtotal			1,00
TOTAL			1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	5
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2.4	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para reuniones con CCO / 20 personas por CCO/ 7 reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

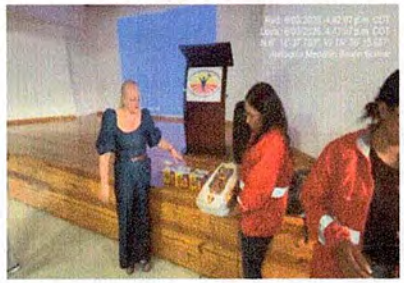



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 12	Simón Bolívar		15,00

Subtotal	15,00
TOTAL	15,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	3,1	DESCRIPCIÓN	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 12	Simón Bolivar		1,00
			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	7
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2025	PERÍODO	01/03/2025 - 31/3/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	3.2	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 20 personas por taller/ 17 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 12	Simón Bolivar		15,00
		Subtotal	15,00
		TOTAL	15,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL VG-VNF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 # 13 A - 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 5 4 1 1 2 6	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	1	4	4	8	5	5																			

53. Código

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 18 / 16 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 7 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 7 5 8 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA VG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1388138457	9484211226	E	2025/04/23	2025/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$24,482,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO COMFAMA (26 Afiliados)																					$71,533,809	$11,607,100			$73,500,113	$2,921,700			$73,255,213	$2,911,900			$73,500,113		$5,066,700		$0	$0		$22,507,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,091,350	$43,700			$1,423,500		$5,700		$0	$0		$334,300
Centro de Trabajo: OFICINA BOGOTA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,091,350	$43,700			$1,423,500		$5,700		$0	$0		$334,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,091,350	$43,700			$1,423,500		$5,700		$0	$0		$334,300
33	CC	52494108	CASTELLANOS TINOCO DIANA MARCELA																		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS001	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$1,091,350	$43,700	14-7	23	$1,091,350	0.522%	$5,700	23	$0	$0	SI	$267,800
34	CC	52494108	CASTELLANOS TINOCO DIANA MARCELA											X							25-14	7	$332,150	$53,200	EPS001	7	$332,150	$13,300	CCF22	0	$0	$0	14-7	7	$332,150	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$66,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO COMFENALCO ANT (1 Afiliados)																							$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900
35	CC	80178125	OROZCO DIAZGRANADOS LUIS FERNANDO																		230201	30	$5,300,000	$848,000	EPS010	30	$5,300,000	$212,000	CCF03	30	$5,300,000	$212,000	14-7	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	SI	$1,640,900
Total			**Afiliados(28)**																				$78,257,309	$12,683,000			$80,223,613	$3,190,700			$79,646,563	$3,167,600			$80,223,613		$5,441,300		$0	$0		$24,482,600

2025/04/04 03:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1388138457	9484211226	E	2025/04/23	2025/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$24,482,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$12,683,000	$0	$0	$12,683,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,191,600	$0	$0	$1,191,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,692,800	$0	$0	$3,692,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,215,000	$0	$0	$3,215,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$4,583,600	$0	$0	$4,583,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$5,441,300	$0	$0	$5,441,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	28	$5,441,300	$0	$0	$5,441,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				28	$3,167,600	$0	$0	$3,167,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$43,700	$0	$0	$43,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	26	$2,911,900	$0	$0	$2,911,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$212,000	$0	$0	$212,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$3,190,700	$0	$0	$3,190,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$2,054,400	$0	$0	$2,054,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$627,800	$0	$0	$627,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$113,300	$0	$0	$113,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$228,000	$0	$0	$228,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				28	$24,482,600	$0	$0	$24,482,600

Bogotá D.C., 23 de septiembre del 2024

Señores
A Quien interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VIAL VG-VNF identificado con NIT 901.871.689-9 se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 20/09/2024 a través del (los) producto (s):

Producto	No. producto	Fecha de apertura	Estado del producto
CUENTA AHORROS	096-07423-5	23/09/2024	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Operaciones
Banco Itaú

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 www.itau.co
Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, defensoritau@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 4:17 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes,

Consorcio Vial VG VNF, se encuentra registrado desde el **24.09.2024** con el consecutivo interno (Acreedor) N°**1200056338** Tener en cuenta que la inscripción en el registro de proveedores se hace una sola vez y este le sirve para futuros trámites con el Distrito de Medellín, en caso tal que sus datos generales y bancarios hayan cambiado, deben solicitar actualización del registro a este mismo correo.

Se aclara que:

En esta dependencia "Gestión de Proveedores" (Secretaría de Suministros y Servicios), SOLO realizamos la Inscripción como proveedores de personas naturales o jurídicas en el Dato Maestro de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por diferentes conceptos. Debe seguir gestionando el trámite con la dependencia con quien lo inició (Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Humana, Secretaría General, entre otras) para que procedan a realizar el contrato o hacer el pago respectivo de ser pertinente, una vez verifiquen la totalidad de los requisitos exigidos y los documentos que debe adjuntar.

Este pantallazo es la prueba de su registro, puede imprimir este correo y adjuntarlo como evidencia que está registrado:



Cordialmente,

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41d42893b27497fd996bbb34772117517fad649fa1f08b86938ec2efeef5b0d4571e71fd5ff9e56d202c670999b3c958

Número de Factura: FVE-9
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Acta de recibo parcial de obra No.4 del contrato 46 00102792 de 2024 cuyo objeto es construcción mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2025.	94	1,00	$ 866.878.562,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 866.878.562,00
2	02	Acta Socioambiental No 4	94	1,00	$ 3.407.360,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.407.360,00

Notas Finales

Linea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 50%, VNF SAS (Nit.900.049.274-8) 50%. AIU:32.68%

Documento generado el:
04/04/2025 17:18:48
Documento validado por la DIAN:
04/04/2025 17:18:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		870285922
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		870285922
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		870285922
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 870285922

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		870.285.922,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		870.285.922,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		870.285.922,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=) $	**COP**	$870.285.922,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000757763 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 07.04.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE9
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	870.285.922	870.285.922,00	5111150000	160070124	200030	010
		TOTAL	**870.285.922**	**870.285.922,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 07.04.2025 11:52:53

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	FVE9	Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF	Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Fecha	04.04.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	096074235
Valor	870.285.922,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000757763	5100008518	200030	160070124	870.285.922,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	870.285.922,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado 07.04.2025 11:54:15

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100446594

División: 01

Fecha: 04.04.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE9
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 09.04.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-748.619.466	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	870.285.922	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-17.405.718	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-1.567.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-43.514.296	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-8.702.859	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-17.405.718	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-4.351.430	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-11.313.717	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-17.405.718	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **748.619.466-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 09.04.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).
