
| INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 | | |
|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA EL CHURIMBO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" | | |
| **No. DEL CONVENIO:** 006-2025 | **NOMBRE CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CHURIMBO | **NIT:** 900.299.273-2 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 3/02/2025 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 10/02/2025 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 10/06/2025 | |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | Acta parcial de obra Nº1 | |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |

**UBICACIÓN Y GEOREFERENCICIÓN PROYECTO PLACA HUELLA -VEREDA CHURIMBO:**



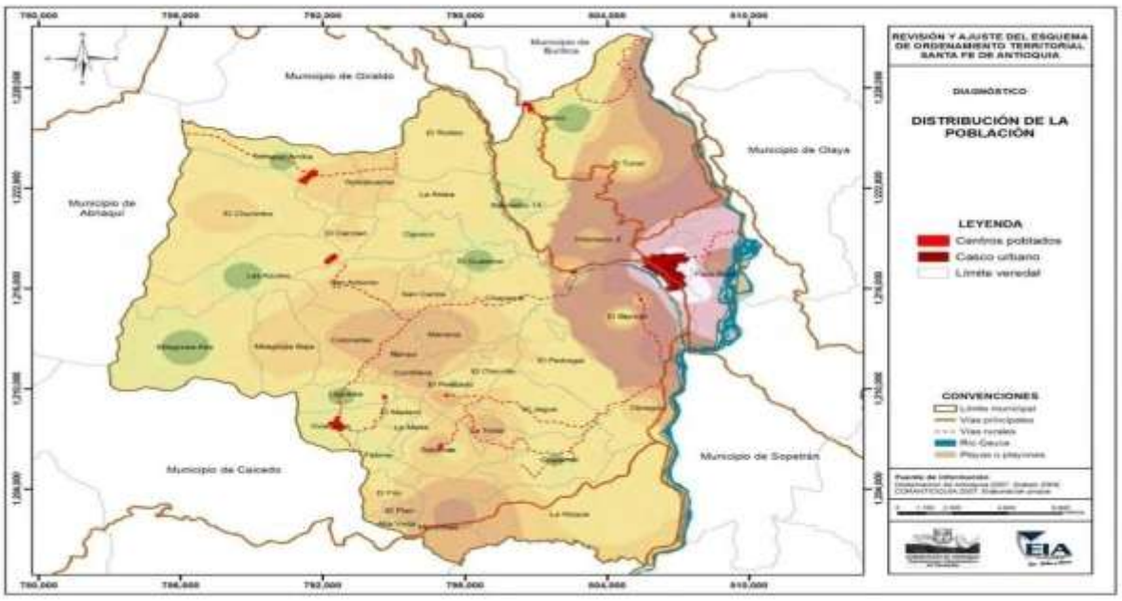


**OBJETIVO:**

Con el propósito de entregar informe número 001, de la ejecución del contrato con objeto “ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA EL CHURIMBO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA” concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el clausula 2 y como se dio cumplimiento a esta actividad.

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** Se presenta en este cobro las actividades ejecutadas para alcanzar el primer 30% de avance contractual, estas actividades pueden ser evidenciadas en el sitio del proyecto:

| **CONVENIO SOLIDARIO 006 de 2025** | | **CONTRATANTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA: 2 de abril de 2025** | | **CONTRATISTA** | | | | |
| **ACTIVIDADES Y CANTIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE VAN A COBRAR** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION ACTIVIDAD** | **UND** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | ESTADO |
| 1 | Localización y replanteo | m | 28 | $ 616,87 | 17.272,33 | CUMPLE |
| 2 | Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros | m3 | 13,06 | $23.227 | 303.340,96 | CUMPLE |
| 3 | Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue) | m2 | 75,51735 | $2.819 | 212.882,01 | CUMPLE |
| 4 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero. | kg | 895,14 | $803 | 718.618,39 | CUMPLE |
| 5 | Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento | m | 28 | $62.766 | 1.757.438,48 | CUMPLE |
| 6 | Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento | m3 | 5,292 | $126.665 | 670.312,87 | CUMPLE |
| 7 | Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento | m | 56 | $29.152 | 1.632.534,99 | CUMPLE |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$5.312.400** | |
| **ADMINISTRACION 9,02%** | | | | | **$479.178** | |
| **TOTAL OBRA** | | | | | **$5.791.579** | |
| **APORTE MUNICIPIO** | | | | | **$5.484.040** | |
| **APORTE OAC** | | | | | **$307.307** | |

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago Caja de compensación | Pago ARL | Para fiscal | Total, pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO 2025 | 9484540391 | $124.600 | $0 | $39.900 | $5.300 | $49.900 | $219.700 |
| MARZO 2025 | 9484540522 | $534.000 | $455.600 | $171.000 | $131.500 | $213.900 | $1.506.000 |

- Resumen de la ejecución de los recursos económicos:

| | |
|---|---|
| Valor del Convenio (RECURSOS) | $19.929.000 |
| Aporte en especie | $1.116.752 |
| Valor ejecutado desembolsable ACTA No.1 | $5.484.040 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $0 |
| Saldo a favor del conveniente | $ 14.444.960 |
| Porcentaje de ejecución financiera (pagos efectuados) | 0% |

A continuación se presentan las cantidades ejecutadas y su respectivo registro fotográfico, conforme se encuentran los ítems del presupuesto definitivo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Localización y replanteo | m | 28 | $ 616,87 | 17.272,33 |

Se realizo la verificación en campo de la zona y de segmento a antevenir con el presente proyecto.






Recorrido para verificar la localización y determinar con claridad el segmento a intervenir

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros | m3 | 13,116 | $23.227 | 304.641,66 |

Realizo una excavación a la suerficie de 0,66m e espesor en general para garantica la continuidad de los hilos en la superficie mas 9 brechas adicionales para las viga-riostras.

**28m x 4,6m x 0,1m = 12,88m3**

**9 x (0,15m x 0,2m x 4,6m) = 1,24m3**

**12,88m3 + 1,24,3m3 = 14,12m3**





Excavación para hacer la nivelación y establecer el ancho efectivo de la vía para la construcción de la placa huella

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue) | m2 | 128,8 | $2.819 | $363.084,82 |



Segmento de vía debidamente conformado para iniciar la aplicación del material de concreto.

4,6m de ancho

16,42m de largo (para este corte de obra)

**4,6m x 16,42m = 75,517m2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero. | kg | 895,14 | $803 | 718.618,39 |

- Cada riel lleva en su interior 5 varillas de ½
  28.5 m x 5 x 2 x 1kg/ml = **285 kg**
  NOTA: se trabaja con 28.5 para incluir los traslapos

- Cada riel lleva en su interior 9 segmentos de 0,8m de largo
  9 x 9 x 0.8m x 2 x 0,56kg/ml = **72,58kg**

- En el interior de las cunetas hay 4 varillas de ½”
  28m x 4 x 2 x 1kg/ml = **224kg**

- En el interior de la cunetas de manera transversal hay 9 bastones de 3/8” de 0,65m de largo
  9 x 9 x 2 x 0,65m x 0,56kg/ml = **59kg**

- Cada viga riostra tiene 4,6m de largo y tiene en su interior 4 varillas de ½” se ha construido 10 viga riostras
  4,6m x 4 x 10 x 1kg/ml = **184kg**

- Para cada viga riostra se usaron 18 estribos de 3/8” de una segmento de 0,7m
  18 x 0,7m x 10 x 0,56kg/ml = **70,56kg**





Parrilla de acero al interior de la placa huella

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento | m | 28 | $62.766 | 1.757.438,48 |

En campo se verifica y se midió; se constata una longitud de 28m de placa huellas debidamente terminadas, se adjuntan fotos

| | |
|---|---|
|  |  |
| Placa huella hacia la parte final del segmento que se concluyo | Parte inicial del proyecto, sección transversal completamente terminada |



Imágenes desde diferentes ángulos de la placa huella en la vereda el Churimbo; tramo de 28ml concluido

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento | m3 | 5,292 | $126.665 | 670.312,87 |

Se han construido 9 segmentos de 2,8m de largo por 0,9 de ancho mas un sobre ancho de 0,5m de ancho.

- 9 x 2,8m x 0,9m x 0,15m = 3,402m3
- 9 x 2,8m x 0,5m x 0,15m = 189m3





Construcción del segmento en concreto ciclópeo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento | m | 56 | $29.152 | 1.632.534,99 |

Se han construido 28ml de placa huellas, a ambos lados se han construido las cunetas

- 28ml x 2 = 56ml



Cunetas con sus bordillos a ambos lados de la placa huella

Este informe se efectúa en cumplimiento de la normatividad vigente y de las cláusulas contractuales, que determinan las actividades de ejecución contractual de la Junta de Acción Comunal.

Cualquier información adicional que se requiera, será entregada según observaciones.



**MARIA NERY ALCARAZ BORJA**
Presidenta Junta De Acción Comunal Vereda El Churimbo
