	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 016 DE 2023 **Contratista:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Contrato de Interventoría No. 4763 DE 2023 **Interventoría:** CONSORCIO SADINTECON

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** oct-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		21
3.1	Información general del contrato		21
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		22
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		23
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		23
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		28
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	28
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	28
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	28
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	26
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	29
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	29
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	29
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	29
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		29
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	29
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	29
	• Seguimiento Programa de Obra		30
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	30
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	30
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	30
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	30
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
5.1	Información general del contrato		50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		51
5.3	Informes especialistas y profesionales		53
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		53
5.5	Informe matriz de riesgos.		53
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		53
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		53
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		55
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	55
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	55
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	55
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	55
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	55
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		55
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	55
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	55
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	55
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	55
7	**Conclusiones y recomendaciones**		55
8	**Anexos**		58
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		59
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		61
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		64
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		68

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: MONICA MONTENEGRO Q.
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** oct-24

CONTRATO DE OBRA No.: 016 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

PLAZO INICIAL: TRES MESES
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 5/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2024
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 23.137.768.645,10
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 4.895.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 28.032.768.645,10
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 11.568.884.300,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 3.225.990.143,21

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4763 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO.

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	11,1
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Alcantarillas	UND	27
	Box Culvert	UND	5
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	3,85	3,85
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Alcantarillas	UND	9	25
	Box Culvert	UND	0	5
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			22.904.510.491,30
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			4.895.000.000,000
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			233.258.153,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			28.032.768.645,10

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	5.106.922.918,50			16.726.335.708,50
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	5.106.922.918,50			16.726.335.708,50

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 18.548.861.120
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 16.726.452.561
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,90%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 14
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 39
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **64**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Vaciado de concreto reforzado de 21 Mpa para construcción de obras de drenaje, construcción de terraplén (arena limosa) hasta la abscisa K3+790 (CAÑO FLORES)







Imprimación, Aplicación de MDC-19 , K2+280 hasta k3+ 850 (Carril derecho e Izquierdo), Vaciado de concreto reforzado de 21 Mpa para construcción de obras de drenaje. (Palmarito).

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO No. 4763 DE 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9

PERIODO

1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

CONSORCIO SADINTECON

MINISTERIO DE TRANSPORTE

IINSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9

PERIODO

1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

Elaborado por:	Revisado por: JAVIER E. FUENTES CAPACHO.	Aprobado por: JAVIER E. FUENTES CAPACHO
ESNEIDER FUENTES ZÁRATE RUBEN A. BORRERO CAMPOS Cargos: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA 	FIRMA 
Fecha: 31/10/2024	Fecha: 31/10/2024	Fecha: 31/10/2024

CONSORCIO SADINTECON

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8

2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 10

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 13

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 18

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 18

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 19

3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul. 19

3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso. 20

3.2.3 Vallas informativas. 21

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 21

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA 23

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 25

4.1 INFORME SEMANAL 25

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 29

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 29

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 29

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 29

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 30

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO 30

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 30

4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual 30

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 30

4.9.2 Seguimiento Programa de obra 30
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 30
4.9.4 Acta de comité de obra 46
4.9.5 Acta de reunión. 46

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 47

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 48

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 51

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 51

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 51

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 51
5.6.1 CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura) 51
5.6.2 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 51

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO 52
6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo 52
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 52
6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas a la inversion del Anticipo 52

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53

8 ANEXOS 55

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 55

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS 57

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST 59

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 65

8.5 FORMATOS 65

CONTENIDO DE TABLA

Tabla 1. Información del contrato de Obra 18

Tabla 2. Informes semanales en el mes de octubre de 2024. 29

Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de octubre de 2024. 46

Tabla 4. Reuniones celebradas en el mes de octubre de 2024 46

Tabla 5. Información sobre el contrato de interventoría 47

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización especifica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth). 8

Imagen 2. Localización especifica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth). 9

1 INTRODUCCIÓN

El departamento de Arauca cuenta con 1. 730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

La deficiencia vial, aunado a las extensiones geográficas que caracterizan al Departamento y a la debilidad de infraestructura productiva, ha puesto una limitante a la comercialización de la producción y a la integración tanto interna como hacia el exterior del territorio, es decir hacia otras regiones del país. A pesar de ello la producción de Arauca se direcciona hacia otras regiones como los Santanderes, Casanare, Bogotá y Venezuela de manera ilegal, principalmente; siendo de todos modos muy baja su participación en la producción total nacional que se moviliza hacia esos territorios. En el caso del comercio con Venezuela, el departamento no ha aprovechado y canalizado adecuadamente su condición de zona fronteriza, lo cual se constituye en un potencial a desarrollar, aunque hoy se encuentre restringida y las condiciones del país vecino no favorezcan el desarrollo, se debe propender por avanzar integraciones con otros países que permitan globalizar los mercados.

Las vías terciarias que comunica la zona rural Municipio de Fortul con el casco urbano y vías principales presentan un estado inadecuado, lo cual dificulta la accesibilidad y el desarrollo integral de esas veredas y de sus habitantes. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos. Se presentan también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al número de tiempos de viajes se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos y en cuantos al comercio se presenta disminución en la afecta de demanda de los productos de la región.

El Proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones técnicas de la vía que conduce a de la vereda Caño Flores - El milagro, San Francisco - Sitio Nuevo, y el tramo de vías que comunica las veredas Palmarito - La Paz Gaitán - Alto Jordán - El Paraíso para ofrecer la interconexión de estas veredas con la zona urbana del Municipio de Fortul, garantizando mayor

seguridad y comodidad a los habitantes para el traslado de sus productos agrícolas y pecuarios, disminuir el tiempo de movilización de los habitantes hacia el área urbana.

La selección del Contratista de obra se realizó a través del Proceso de Contratación No. LP-FRL-SPI- 009- 2023 del SECOP I y la selección de la interventoría se realizó a través del CMA-DEO-SVR-076-2023 y el número de ID del SECOP II es CO1.NTC.4900402.

El presente documento contiene **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.9** correspondiente al Periodo del **01 al 31 de octubre de 2024**, elaborado por CONSORCIO SADINTECON, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVIAS, Versión 2022, actualización del 01 febrero de 2022 y una vez surtido el proceso de del contrato de interventoría No. 4763 de 2023, con fecha de inicio a partir del 14 de diciembre de 2023.

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos de seguimiento y control, solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico en el cual se evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante este periodo.

El Supervisor del Contrato de Interventoría asignado es la ingeniera MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO, cuyo acto administrativo de designación es la resolución 4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023, la Gestora Técnica asignada es la ingeniera JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que hace parte del corredor que comunica las veredas Palmarito, Caranal, La Paz, Gaitán, Alto Jordán y Paraíso del Municipio de Fortul.

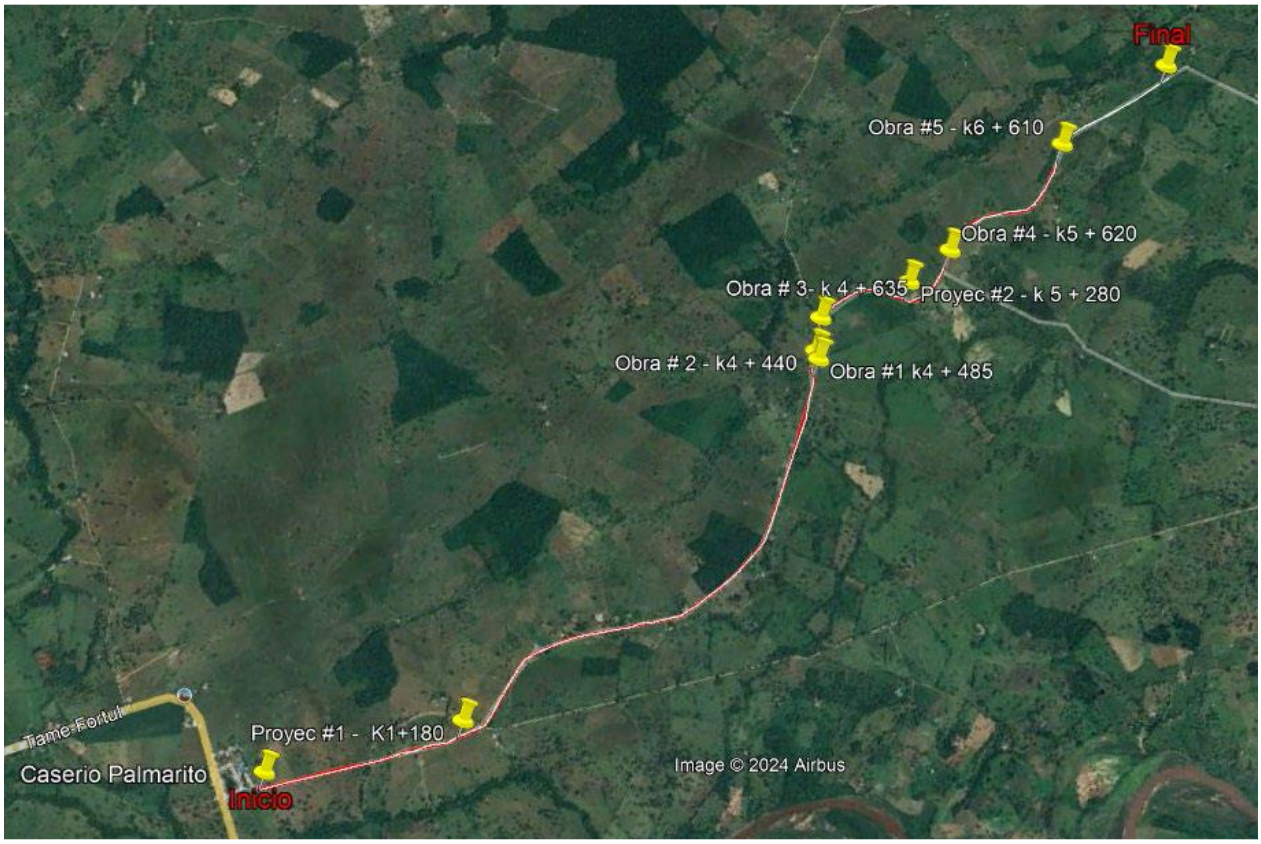


Imagen 1. Localización especifica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth).

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que comunica las veredas de Caño Flores - Sitio Nuevo del Municipio de Fortul.

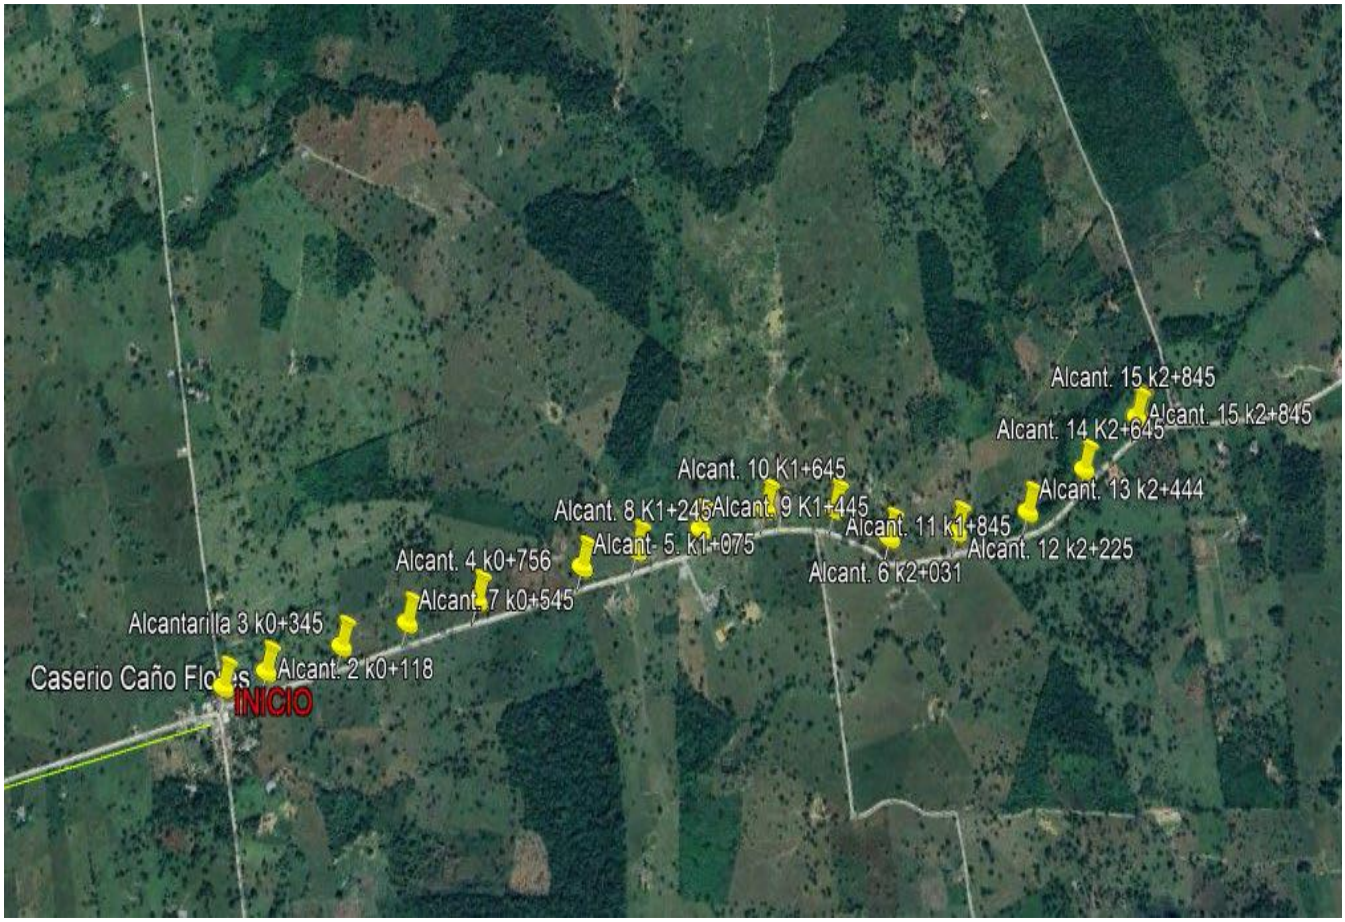


Imagen 2. Localización especifica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth).

2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

A continuación, se hace una descripción de cada uno de los tramos a intervenir:

El departamento de Arauca cuenta con 1.730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

Actualmente el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO presentan dificultades para la movilidad y comunicación en especial con el área urbana, debido al mal estado en el que se encuentra la superficie de rodadura, la falta de mantenimiento periódico o rutinario de las mismas por parte del Municipio. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, aunado con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial.

El aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros en la témpora de invierno afecta directamente a los pequeños productores quienes optan por perder sus cosechas debido a los altos costos de transporte para sacar la producción al casco urbano del Municipio.

A continuación, se presenta registro fotográfico donde se evidencia el avance del proyecto en el presente periodo, para cada tramo:

TRAMO 1. CAÑO FLORES:

K3+550	
	
ANTES	DESPUÉS
K3+690	
	
ANTES	DESPUÉS
K2+850	
	
ANTES	DESPUÉS

K3+245	
	
ANTES	DESPUÉS

TRAMO 2. PALMARITO:

K2+000	
	
ANTES	DESPUÉS
K2+710	
	
ANTES	DESPUÉS

<table>
<tr><td colspan="2">K2+670</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">K5+630</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DESPUÉS</td></tr>
</table>

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Los tramos a intervenir pertenecen a un sector de carreteras terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal. Se divide en 2 tramos:


LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,40 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado según el diseño de la estructura del pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K7+400

- Ancho vía: 6.0 m
- Ancho bermas: 0.5 m
- Capa Asfáltica: 0.1O m
- Base granular: 0.15 m
- Subbase granular: 0.20 m

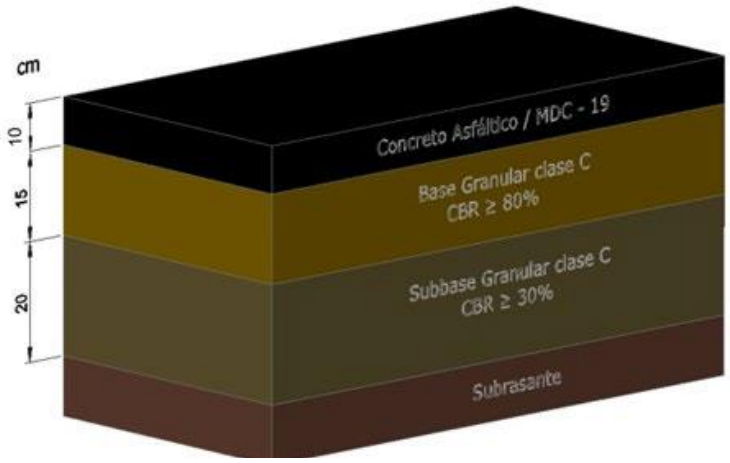

Según la modificación de obra No.3, las obras de drenaje transversal a construir en el tramo de Palmarito son:

OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+000
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 3 X1 m	K1+180
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+385
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+620
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+861
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+020
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+400
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+454
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+175
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+310
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+638
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K6+026
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K6+633

El proyecto incluye la actualización a la caracterización del tramo total de la vía que comunica el caserío de Palmarito con intersección de la vía agua linda.

TRAMO A INTERVENIR	PUNTO	COORDENADA	LONGITUD KM
CASERIO PALMARITO-VEREDA EL PARAISO	INICIAL	6º44'48.01"N	7,40
		71º42'53.19"0	
	FINAL	6º47'12.83"N	
		71º401' 2.90"0	

Adicionalmente el proyecto contempla la ejecución de actividades complementarias indispensables para la correcta ejecución y operación del proyecto.

Las actividades principales se listan a continuación:

- Realizar obras de excavaciones.
- Implementar la estructura vial.
- Implementar las obras de drenaje.
- Implementar la señalización vertical y demarcación vial.
- Realizar actividades de caracterización vial implementar el PMT.
- Implementar el PAGA.
- Actividades medidas de compensación ambiental.

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

Consiste en la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km así:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.


A partir del análisis, se plantea una alternativa de estructura de pavimento utilizando la familia de estabilizantes T4 - Sales Inorgánicas, ya que el proceso de estabilización mediante la adición de este producto químico mejora de forma directa el desempeño mecánico - elástico del material, actuando como agente cementante, ligante y deflexivo en la matriz suelo - estabilizante.

El producto químico estabilizador de suelos ayuda a mejorar las propiedades mecánicas y cualitativas del suelo, mediante la interacción de las fuerzas de tensión superficial que conforman la macro estructura del suelo.

La metodología concluye que el espesor de suelo estabilizado aumenta la capacidad de soporte del suelo reemplazando posteriormente parte de la estructura de soporte del pavimento.

MODELO ESTRUCTURAL

Realizando los respectivos cálculos mediante el método AASHTO, se establece una estructura de pavimento que incluye una capa de mezcla densa en caliente (MDC-19) con un espesor de 7.5 centímetros, una capa estabilizada con sales inorgánicas con un espesor de 25 centímetros.

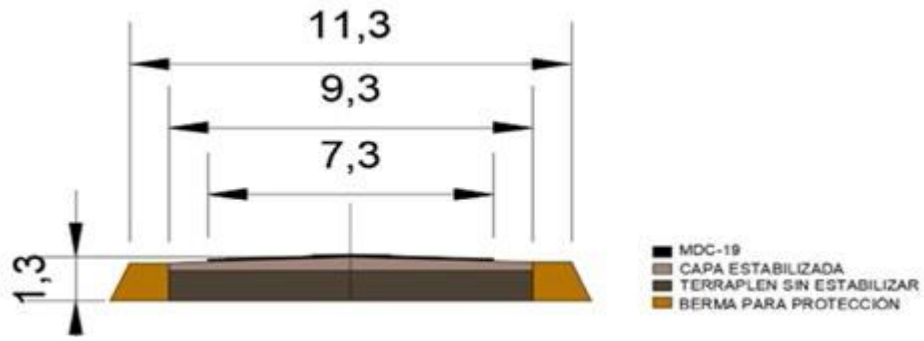

Modelo estructural - Sección transversal

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado según el diseño de la estructura de pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K2+860

- Ancho vía 7.30 m
- Ancho bermas 1.00 m
- Bombeo: 2%

- Peralte máximo: 4%
- Sobreancho máximo: 1.00 m



Sección transversal tipo en tan gente Unidad de diseño No. 02 estructura con Subrasante Estabilizada con Sales Inorgánicas

Con los ajustes realizados según acta de modificación No.3 y acta de adición No.1 del contrato de obra, se realizará la construcción de 19 estructuras de drenaje transversal en el tramo Caño Flores, los cuales son:

OBRAS DE DRENAJE SEGÚN MODIFICATORIO No.3		
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 1,5 X 1 m	k0+000
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 1 m	k0+137
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+435
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+545
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+757
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 1 m	k1+076
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+277
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+445
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+645
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+845
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 2 m	k2+031
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+224
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+444
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+644
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+845

OBRAS DE DRENAJE SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1		
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+045
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+245
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+455
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+645

Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Aspectos generales del contrato de obra:

Tabla 1. Información del contrato de Obra

CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	**016 DE 2023**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTE DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
N° PROCESO DE SELECCIÓN:	N°LP-FRL-SPI-009-2023 Aperturado mediante -resolución N°496 del 27 de 2023 del 29 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL • CONYCA SOLUCIONES SAS (78%) NIT 900.701.968-7 R.L LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ C.C 17.589.706 • CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%) NIT 834.000.202-7 R.L LEONEL ALBERTO ARIAS ROJAS C.C 79.447.547 • HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%) NIT 901.100579-1 R.L HORACIO DIAZ TORRES C.C 13.701.763 • VANUR SAS NIT 901335047-2 (10%) NIT 901.335.047-2 R.L HECTOR JULIAN RESTREPO MARÍN C.C 1.128.395.598
REP. LEGAL:	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ C.C 1.176.782.711
N° NIT:	901.758.303-9
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	$23.137.768.645,10 LOTE N°01: $12.024.004.631,44 LOTE N°02: $11.113.764.013,66
CDP	N° 320 del 14 de agosto del 2023
RP	N° 600 del 29 de septiembre de 2023
ANTICIPO	$ 11.568.884.300 (50%)

FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE MARZO DE 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PERIODO SUSPENSIÓN N°01	DESDE CINCO (05) DE ENERO DE 2024 HASTA EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024
PERIODO PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01	DESDE EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL TRES (03) DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO N°01	CUATRO (04) DE MARZO DEL 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según REINICIO N°01)	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2024
OTROSI MODIFICATORIO N° 001 (ADICION DE PLAZO)	CATORCE (14) DE MARZO DE 2024 SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Adicional de Plazo)	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024.
OTROSI MODIFICATORIO N° 002	VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2024 Modificación Clausula N°25 GARANTIAS
PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO)	Compañía Mundial de Seguros S.A. – NB–100285361 – NB-100069639 – Anexo 4
OTROSI MODIFICATORIO N° 003	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2024 Modificación Mayores y menores cantidades, Items nuevos.
OTROSI MODIFICATORIO ADICION EN VALOR No.1	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024 Legalización acta de adición en valor No.1.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades las cuales se dividen por tramos y áreas de Trabajo.

3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de terraplén (arena limosa) La conformación del terraplén y la protección de los taludes se va conformando por capas, para este mes, se realizaron actividades en las siguientes abscisas: K2+860 – K3+000, K3+000 - K3+510 y K3+510 - K3+790 (Tramo según adicional en valor N°1).
- Se realizó actividades de replanteo topográfico para intervenir las obras de drenaje correspondiente al tramo K2+860 al K3+790. Se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas durante las semanas del periodo del informe.
- Excavación mecánica en material común entre 0-2 en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas), sobre el carril derecho.

- Vaciado de concreto simple de 17 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarilla) sobre el carril derecho.
- Instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril derecho.
- Instalación de acero de refuerzo en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril derecho.
- Relleno y compactación de material seleccionado en las obras de drenaje transversal en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril derecho.
- Se realizó ensayo de densidad de campo con el cono de arena.
- Se realizó la toma de muestras para el ensayo de compresión simple del concreto.

3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.


Se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación mecánica en material común entre 0-2 en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Vaciado de concreto simple de 17 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Instalación de acero de refuerzo en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Relleno y compactación de material seleccionado en las obras de drenaje transversal en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares desde el K0+630 al K0+680; K1+1160 al K1+200 y del K7+200 al K7+400.
- Instalación de base granular clase B gradación fina desde K6+740 al K7+200.
- Verificación de niveles desde el K7+200 al K7+400.

- Instalación de geotextil, Sub Base granular SBG-50, Base Granular Clase II, en los tramos correspondientes a obras de drenaje (k4+380 - k4+490) (k4+640 - k4+680) (k5+150 - k5+200) (k5+260 -k5+310).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K0+40 hasta el K3+950
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K0+40 hasta el K3+850 ambos carriles.
- Se realiza ensayo de densidad de campo con el cono de arena.

3.2.3 Vallas informativas.

Valla informativa instalada en la vía entre la vereda Palmarito y Caranal, en la finca la virgen, municipio de Fortul.

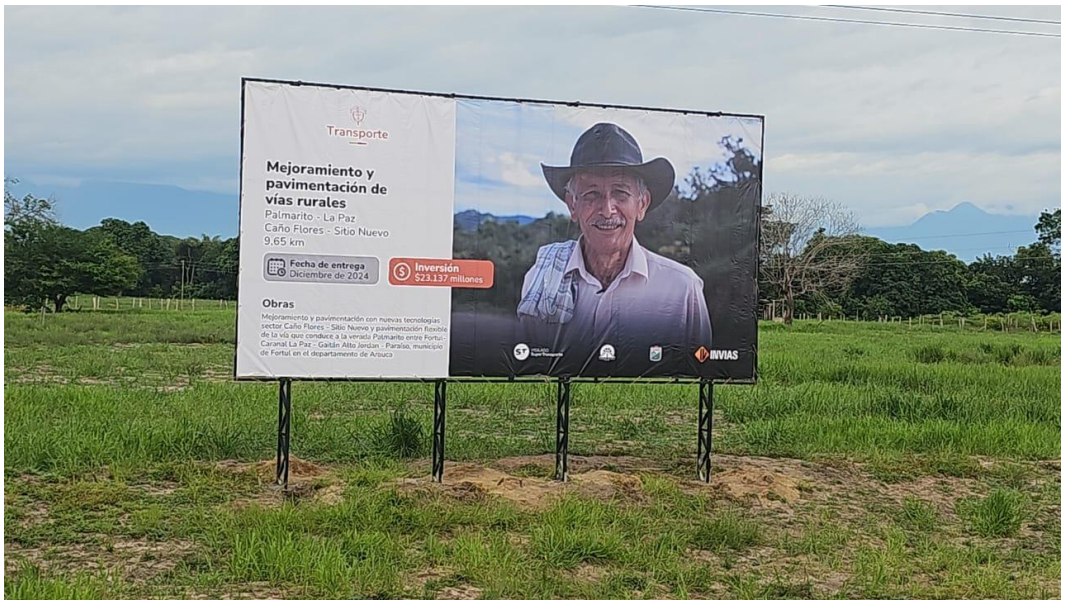

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Para el presente informe correspondiente al mes de octubre, no se presentaron por parte del Contratista de Obra ítems no previstos, a la fecha no se ha iniciado las actividades de movimiento de la red eléctrica las cuales fueron aprobadas y generadas según el acta de modificación No.3 y que se presentan en el tramo de Caño Flores.

La interventoría, revisó y aprobó el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, y posteriormente se presentaron a la alcaldía de Fortul, para realizar la legalización y tramites respectivo.

A continuación, se relacionan los ítems no previstos así y que fueron aprobados en el acta de modificación No. 3:

1.3 N	**MOVIMIENTO RED ELECTRICA**		
1.3.1 N	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT**		
1.3.1.1 N	REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	KM	0,33
	SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT		
1.3.2 N	**APOYOS MT**		
1.3.2.1 N	CONCRETO 3000 PSI (Incluye material, mano de obra y herramienta y equipos)	M3	1,80
1.3.2.2 N	POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hicada y aplomada)	UND	2
1.3.2.3 N	DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	UND	2
	SUBTOTAL APOYOS MT		
1.3.3 N	**VESTIDA/ARMADA POSTES MT**		
1.3.3.1 N	ESTRUCTURAS 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.2 N	ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.3 N	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.4 N	ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1
1.3.3.5 N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	UND	4
	SUBTOTAL VESTIDA/ARMADA POSTES		
1.3.4 N	**TEMPLETES MT**		
1.3.4.1 N	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	UND	4
	SUBTOTAL TEMPLETES MT		
1.3.5 N	**VESTIDA/ARMADA POSTES MT**		
1.3.5.1 N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	UND	1
1.3.5.2 N	ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

Para el presente informe, en términos generales esta Interventoría puede informar que, la ejecución de las actividades de obra se ha realizado normalmente sin inconvenientes, el contratista continúa realizando actividades de topografía, corte y figurado del acero, construcción de terraplén (arena limosa), excavaciones mecánicas y manuales, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, instalación de base granular clase B gradación fina, construcción de obras de drenaje (Alcantarillas y Box culvert), riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) y mezcla densa en caliente tipo MDC-19.

En el seguimiento administrativo del contrato de obra, el contratista de obra tramitó ante la Alcaldía Municipal el acta de obra No.02, a la fecha se está a la espera del pago de dicha acta. También se realizaron los comités de obra para seguimiento y avance de las obras y reuniones con la comunidad.

En cuanto al componente ambiental se evidencia que el contratista mejoró la señalización de los puntos en los cuales se realizó acopio de materiales en obra. Por parte de la interventoría se realizó la revisión de los informes mensuales que el contratista no había presentado a la fecha, por otro lado, no se evidencia avance en la entrega y actualización del documento PAGA, el cual debió ser entregado a la interventoría en el mes de agosto para su aprobación y posterior envió a él invias. Se está en la revisión por parte de la interventoría el informe del programa para el uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) del proyecto, el cual fue actualizado por el contratista el día 2 de octubre.

Se realizó reunión virtual contratista -interventoría en la cual participa el profesional ambiental del contratista, el profesional ambiental de la interventoría y el especialista ambiental de la interventoría; en esta reunión se solicita nuevamente por parte de la interventora la entrega del documento PAGA, el cual debe ser radicado en dirección de sostenibilidad de invias. Por parte del contratista se reporta unas talas ilegales que se están realizando desde la comunidad dentro del área de influencia del proyecto, desde la interventoría se da la directriz al contratista de informar esta situación con registro fotográfico a la autoridad ambiental y a el municipio con copia a la interventoría, con el fin de dejar la trazabilidad de que las intervenciones en ningún momento fueron realizadas por la obra o personal de la misma. Se revisa el documento de modificación

entregado por la autoridad ambiental Corporinoquia en el cual se autorizan las obras adicionales, se verifica las actividades en campo en las cuales se solicita al contratista documentación de la maquinaria que realiza las actividades de pavimento ya que a la fecha estas máquinas no están aprobadas por la interventoría dado que no se presentó la totalidad de la documentación requerida.

Se verificó las actividades en campo en las que se evidencia que la comunidad realiza el retiro de las talas reportadas en semanas anteriores que no hacen parte de la obra, se entregó por parte del contratista póliza extracontractual y queda pendiente la entrega del cronograma de mantenimiento de las maquinas en obra. Se realiza recorrido de obra y se acompaña visita de personal del INVIAS.

Desde el componente social, se realizó capacitación al personal operativo sobre el tema gobernanza social, también se realizó un recorrido y reunión con la comunidad para resolver dudas acerca de las obras hidráulicas (Caño Flores), se realizó por parte del Contratista la e card de invitación a la reunión de veeduría, desde la Interventoría se realizó la revisión y aprobación, también se elaboró el informe mensual de Interventoría y se realizó la revisión del informe mensual del Contratista, capacitación al personal operativo acerca de la prevención y atención de todo tipo de violencia y acoso basados en el género con la participación de 18 personas, capacitación al personal operativo, también se realizó acompañamiento a la visita técnica por parte de los funcionarios de INVIAS. El 24 de octubre se realizó la jornada educativa sobre seguridad vial con la comunidad y seguidamente se desarrolló la reunión con la veeduría ciudadana del sector de Caño Flores. En Palmarito se realizó la actualización de la cartelera informativa y la planeación de la capacitación para el personal de obra que se realizará el viernes 18 de octubre, reunión con la Veeduría de este sector.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, se presenta el avance ejecutado acumulado del proyecto a la fecha del presente informe, por actividades y por capítulos:

31 DE COTUBRE DE 2024											
No.	ITEM DE PAGO			DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO 31 DE OCTUBRE DE 2024		
				LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
EXCAVACIONES									CANT EJECUTADAS ACUM.	VR TOTAL	% FISICO ACUM
1	1.1	X		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO)	M3	4976,39	$ 20.756,00	$ 103.289.950,84	4850,47	$ 100.676.355,32	97,47%
SUBTOTAL EXCAVACIONES								**$ 103.289.950,84**		**$ 100.676.355,32**	**97,47%**
ESTRUCTURA DE VIA											
2	2.1	X		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	51800	$ 12.133,00	$ 628.489.400,00	50750,00	$ 615.749.750,00	97,97%
3	2.2	X		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	5776,08	$ 144.582,00	$ 835.117.198,56	3590,89	$ 519.178.057,98	62,17%
4	2.3	X		SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	M3	11262,68	$ 182.611,00	$ 2.056.689.257,48	11249,2	$ 2.054.227.661,20	99,88%
5	2.4	X		BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	M3	8053,86	$ 222.012,00	$ 1.788.053.566,32	7094,70	$ 1.575.108.536,40	88,09%
6	2.5	X		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	M2	51800	$ 5.034,00	$ 260.761.200,00	26950	$ 135.666.300,00	52,03%
7	2.6	X		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	4516,87	$ 1.481.973,00	$ 6.693.879.384,51	2281	$ 3.380.380.413,00	50,50%
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE VIA								**$ 12.262.990.006,87**		**$ 8.280.310.718,58**	**67,52%**
OBRAS DE DRENAJE											
8	3.1	X		CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	M3	13,16	$ 828.183,00	$ 10.898.888,28	11,62	$ 9.619.345,55	88,26%
9	3.2	X		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	134,97	$ 1.200.425,00	$ 162.021.362,25	125,125	$ 150.203.178,13	92,71%
10	3.3	X		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	M3	25,85	$ 1.665.009,00	$ 43.040.482,65	25,85	$ 43.040.482,65	100,00%
11	3.4	X		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14387,14	$ 8.309,00	$ 119.542.746,26	13037,82	$ 108.331.205,78	90,62%
12	3.5	X		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	117,00	$ 1.074.554,00	$ 125.722.818,00	108	$ 116.051.832,00	92,31%
13	3.6 N	X		DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	M3	51,11	$ 283.648,00	$ 14.497.249,28	51,11	$ 14.497.249,28	100,00%
SUB TOTAL OBRAS DE DRENAJE								**$ 475.723.546,72**	0	**$ 441.743.293,4**	**92,86%**
SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL											

13	4.1	X		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	UND	35,00	$ 766.985,00	$ 26.844.475,00	0	$ -	0,00%
14	4.2	X		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	22200	$ 3.164,00	$ 70.240.800,00	0	$ -	0,00%
SUB TOTAL SEÑALIZAION Y DEMARCACIÓN VIAL								**$ 97.085.275,00**			
SUB TOTAL								**$ 12.939.088.779,43**			**0,00%**
ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL											
15	1P	X		ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR	KM	7,40	$ 674.337,00	$ 4.990.093,80	0	$ -	0,00%
SUB TOTAL CARACTERIZACIÓN VIAL								**$ 4.990.093,80**			0,00%
ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL											
16		X		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UND	1,00	$ 126.680.567	$ 126.680.567,38	0	$ -	0,00%
SUB TOTAL MEIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL								**$ 126.680.567,38**			0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO PALMARITO								**$ 13.070.759.440,61**		**$ 8.822.730.367,28**	**67,50%**
1	**LOTE 1. CAÑO FLORES - SITIO NUEVO**										
1.1	**VIA**										
1.1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
1	1.1.2.1	X		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. (Incluye Transporte)	m3	1.119,61	$ 28.183,00	$ 31.553.968,63	129,33	$ 3.644.907,39	11,55%
2	1.1.2.2	X		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	m3	1.092,68	$ 187.612,00	$ 204.999.880,16	602,41	$ 113.019.344,92	55,13%
3	1.1.2.3	X		TERRAPLENES	m3	55.304,45	$ 124.804,00	$ 6.902.216.577,80	54929,66	$ 6.855.441.657,06	99,32%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS								**$ 7.138.770.426,59**		**$ 6.972.105.909,37**	**97,67%**
1.1.3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**										
4	1.1.3.1	X		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	37.941,80	$ 12.133,00	$ 460.347.859,40	0	$ -	0,00%
5	1.1.3.2	X		ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	m3	9.322,16	$ 247.006,00	$ 2.302.629.452,96	0	$ -	0,00%
6	1.1.3.3	X		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	m2	37.476,80	$ 5.034,00	$ 188.658.211,20	0	$ -	0,00%
7	1.1.3.4	X		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	2.229,29	$ 1.501.457,00	$ 3.347.183.075,53	0	$ -	0,00%
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								**$ 6.298.818.599,09**		**$ -**	**0,00%**
1.1.4	**SEÑALIZACIÓN**										
8	1.1.4.1	X		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	Und	32,00	$ 766.271,00	$ 24.520.672,00	0	$ -	0,00%
9	1.1.4.2	X		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	m	15.160,00	$ 3.163,00	$ 47.951.080,00	0	$ -	0,00%
10	1.1.4.3	X		TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	Und	1.264,00	$ 9.838,00	$ 12.435.232,00	0	$ -	0,00%

11	1.1.4.4	X		DEFENSA VEHICULAR METALICA EN ACERO GALVANIZADO	m	439,00	$ 321.963,00	$ 141.341.757,00	0	$ -	0,00%
12	1.1.4.5	X		CAPTAFAROS	Und	115,00	$ 14.658,00	$ 1.685.670,00	0	$ -	0,00%
13	1.1.4.6	X		DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m)	Und	9,00	$ 684.263,00	$ 6.158.367,00	0	$ -	0,00%
SUBTOTAL SEÑALIZACION								**$ 234.092.778,00**		**$ -**	0,00%
SUBTOTAL VIA								**$ 13.671.681.803,68**		**$ 6.972.105.909,37**	**51,00%**
1.2	**OBRAS DE DRENAJE**										
1.2.1	**PRELIMINARES**										
14	1.1.2.1	X		DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	m3	55,38	$ 283.648,00	$ 15.708.426,24	55,38	$ 15.708.426,24	100,00%
SUBTOTAL PRELIMINARES								**$ 15.708.426,24**		**$ 15.708.426,24**	**100,00%**
1.2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
15	1.2.2.1	X		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M.	m3	550,80	$ 28.183,00	$ 15.523.196,40	486,00	$ 13.696.938,00	88,24%
16	1.2.2.2	X		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	m3	30,92	$ 40.245,00	$ 1.244.375,40	0	$ -	0,00%
17	1.2.2.3	X		RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO	m3	375,88	$ 233.118,00	$ 87.624.393,84	312,67	$ 72.889.005,06	83,18%
SUBTOTAL EXCAVACION Y RELLENOS								**$ 104.391.965,64**		**$ 86.585.943,06**	**82,94%**
1.2.3	**CONCRETOS**										
15	1.2.3.1	X		CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m2	6,40	$ 852.720,00	$ 5.457.408,00	0	$-	0,00%
16	1.2.3.2	X		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	358,80	$ 1.647.023,00	$ 590.951.852,40	302,47	$ 498.175.046,81	84,30%
17	1.2.3.3	X		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	180,00	$ 1.074.555,00	$ 193.419.900,00	150,00	$ 161.183.250,00	83,33%
	1.2.3. 4 N	X		CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m3	29,17	$ 852.720,00	$ 24.873.842,40	28,92	$ 24.664.073,28	99,16%
SUBTOTAL CONCRETOS								**$ 814.703.002,80**		**$ 684.022.370,090**	**83,96%**
1.2.4	**ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa**										
18	1.2.4.1	X		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	21.238,80	$ 8.333,00	$ 176.982.920,40	17422,62	$ 145.182.692,46	82,03%
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO								**$ 176.982.920,40**		**$ 145.182.692,46**	**82,03%**
SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE								**$ 1.111.786.315,08**		**$ 931.499.431,85**	**83,78%**
	1.3 N			**MOVIMIENTO RED ELECTRICA**							
	1.3.1N			**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT**							
	1.3.1.1N			REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	KM	0,33	$ 519.376,00	$ 171.394,08	0	$ -	**0,00%**
				SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT				**$ 171.394,08**			
	1.3.2N			**APOYOS MT**							
	1.3.2.1N			Concreto 3000 PSI (Incluye Material, Mano de Obra, y Herramienta y Equipos)	M3	1,80	$ 1.137.476,00	$ 2.047.456,80	0	$ -	**0,00%**
	1.3.2.2N			POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada y aplomada)	Und	2,00	$ 4.592.568,00	$ 9.185.136,00	0	$ -	**0,00%**

	1.3.2.3N			DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	Und	2,00	$ 763.318,00	$ 1.526.636,00	0	$ -	0,00%
				SUBTOTAL APOYOS MT				**$ 12.759.228,80**			0,00%
	1.3.3N			**VESTIDA / ARMADA POSTES MT**							
	1.3.3.1N			ESTRUCTURA 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 710.849,00	$ 710.849,00	0	$ -	0,00%
	1.3.3.2N			ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 1.160.615,00	$ 1.160.615,00	0	$ -	0,00%
	1.3.3.3N			ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 3.072.512,00	$ 3.072.512,00	0	$ -	0,00%
	1.3.3.4N			ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 5.638.150,00	$ 5.638.150,00	0	$ -	0,00%
	1.3.3.5N			DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	Und	4,00	$ 230.362,00	$ 921.448,00	0	$ -	0,00%
				SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES MT				**$ 11.503.574,00**			0,00%
	1.3.4N			**TEMPLETES MT**							
	1.3.4.1N			TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	Und	4,00	$ 714.703,00	$ 2.858.812,00	0	$ -	0,00%
				SUBTOTAL TEMPLETES MT		-		**$ 2.858.812,00**			
	1.3.5N			**VESTIDA / ARMADA POSTES BT**							
	1.3.5.1N			DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	Und	1,00	$ 140.918,00	$ 140.918,00	0	$ -	0,00%
	1.3.5.2N			ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 229.245,00	$ 229.245,00	0	$ -	0,00%
				SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES BT		-		**$ 370.163,00**			0,00%
				SUBTOTAL MOVIMIENTO RED ELECTRICA				**$ 27.663.171,88**			0,00%
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 14.811.131.290,64**		**$ 7.903.605.341,22**	53,36%
19	1P			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 148.313.198,55		$ -	0,00%
20	2P			ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM)				$ 2.555.738,41		$ -	0,00%
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 14.962.000.227,60**		**$ 7.903.605.341,22**	
				VALOR TOTAL				**$ 28.032.759.668,21**		**$ 16.726.335.708,5**	59,67%
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				**$ 8.976,89**			
				TOTAL				**$ 28.032.768.645,10**			

Anexo A. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Tabla 2. Informes semanales en el mes de octubre de 2024.

N° SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO
Semanal No. 34 (4 al 10 de octubre 2024)	42,0 %
Semanal No. 35 (11 al 17 de octubre 2024)	47,0 %
Semanal No. 36 (18 al 24 de octubre 2024)	53,0%
Semanal No. 37 (25 al 31 de octubre 2024)	57,0%

El seguimiento y control de la ejecución del proyecto, se realiza teniendo en cuenta el programa de inversión vigente presentando por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo B. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (maquinaria y equipo contrato de obra).

Se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo C. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (personal contrato de obra).

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo el Contratista tramitó para pago ante la Alcaldía Municipal el acta parcial de obra No.2 por un valor de $3.928.517.820,19.

Anexo D MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo E, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

Debido a la distancia entre los frentes de trabajo, se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.

- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo F Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO

Anexo G. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Se Anexa Ultimas Pólizas Actualizadas entregadas por el Contratista.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Anexo H. Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

- Anexo I. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

- Anexo J. Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2

4.9.2 Seguimiento Programa de obra

- Anexo K.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

- Anexo L. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

- Anexo M. Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2.

El CONTRATO FIDUCIARIO creado para el buen manejo del anticipo entre el CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. menciona que, los rendimientos financieros del anticipo, será girados mensualmente a la entidad contratante, responsable del contrato de obra, para este proyecto, la alcaldía del municipio de Fortul

La Alcaldía del Municipio de Fortul presentó la información correspondiente a los giros realizados por concepto del buen manejo del anticipo. A continuación, se muestra la información presentada:

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
147

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Febrero 22 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$10,291,749.00	$0.00	$10,291,749.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$10,291,749.00
			TOTAL PAGADO	**$10,291,749.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
148

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Febrero 22 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,901,424.00	$0.00	$5,901,424.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$5,901,424.00
			TOTAL PAGADO	**$5,901,424.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N° 2 - 2014824
Fecha 22/02/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Forma de Pago:
Documentos Relacionados:

Por Concepto De:
Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$5,901,424.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$5,901,424.00
		SUMAS IGUALES -->	**$5,901,424.00**	**$5,901,424.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
264

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Marzo 14 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO
DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,542,286.00	$0.00	$5,542,286.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$5,542,286.00
			TOTAL PAGADO	**$5,542,286.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N° 2 - 2026424
Fecha 14/03/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:
Orden de Pago No. 264/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$5,542,286.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$5,542,286.00
		SUMAS IGUALES -->	**$5,542,286.00**	**$5,542,286.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
265

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Marzo 14 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$99,592,859.10	$0.00	$99,592,859.10

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$99,592,859.10
			TOTAL PAGADO	**$99,592,859.10**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	493

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$341,880.00	$0.00	$341,880.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$341,880.00
			TOTAL PAGADO	**$341,880.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049324	30/05/2024

Pagado A: **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$341,880.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$341,880.00
		SUMAS IGUALES -->	**$341,880.00**	**$341,880.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL **NIT: 800136069-4** **SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL** Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 **Pág. Web:** www.fortul-arauca.gov.co **E-mail** archivo@fortul-arauca.gov.co	**CÓDIGO:** F-DIR-GR-P03-05 **VERSIÓN: 01**

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	494

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$117,684.00	$0.00	$117,684.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$117,684.00
			TOTAL PAGADO	**$117,684.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL **NIT: 800136069-4** **SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL** Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 **Pág. Web:** www.fortul-arauca.gov.co **E-mail** archivo@fortul-arauca.gov.co	**CÓDIGO:** F-DIR-GR-P03-05 **VERSIÓN: 01**

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049424	30/05/2024

Pagado A: **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$117,684.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$117,684.00
		SUMAS IGUALES -->	**$117,684.00**	**$117,684.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO

495

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$103,345,286.00	$0.00	$103,345,286.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$103,345,286.00
			TOTAL PAGADO	**$103,345,286.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049524	30/05/2024

Pagado A: **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$103,345,286.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$103,345,286.00
		SUMAS IGUALES -->	**$103,345,286.00**	**$103,345,286.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
496

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$93,280,801.55	$0.00	$93,280,801.55

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$93,280,801.55
			TOTAL PAGADO	**$93,280,801.55**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049624	30/05/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$93,280,801.55	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$93,280,801.55
		SUMAS IGUALES -->	**$93,280,801.55**	**$93,280,801.55**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	810

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$184,150.00	$0.00	$184,150.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$184,150.00
			TOTAL PAGADO	$184,150.00

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081024	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$184,150.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$184,150.00
		SUMAS IGUALES -->	$184,150.00	$184,150.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	811

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$176,682.00	$0.00	$176,682.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$176,682.00
			TOTAL PAGADO	$176,682.00

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081124	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$176,682.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$176,682.00
		SUMAS IGUALES -->	$176,682.00	$176,682.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	812

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$183,470.00	$0.00	$183,470.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$183,470.00
			TOTAL PAGADO	$183,470.00

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081224	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$183,470.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$183,470.00
		SUMAS IGUALES -->	$183,470.00	$183,470.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	814

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$51,876,007.99	$0.00	$51,876,007.99

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$51,876,007.99
			TOTAL PAGADO	**$51,876,007.99**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081424	26/08/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$51,876,007.99	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$51,876,007.99
		SUMAS IGUALES -->	**$51,876,007.99**	**$51,876,007.99**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO:	F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN:	01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	816

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$56,889,776.32	$0.00	$56,889,776.32

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$56,889,776.32
			TOTAL PAGADO	**$56,889,776.32**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO:	F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN:	01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081624	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 816/24, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$56,889,776.32	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$56,889,776.32
		SUMAS IGUALES -->	**$56,889,776.32**	**$56,889,776.32**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	817

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$36,202,558.18	$0.00	$36,202,558.18

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$36,202,558.18
			TOTAL PAGADO	**$36,202,558.18**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081724	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$36,202,558.18	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$36,202,558.18
		SUMAS IGUALES -->	**$36,202,558.18**	**$36,202,558.18**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Año	Mes	Dia	Comprobante	Concepto	Nit	Nombre Tercero	Inicial	Valor Debito	Valor Credito	Saldo
2024	2	22	2014724	Orden de Pago No. 147/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	10,291,749	11,744,043,367.10
2024	2	22	2014824	Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	5,901,424	11,738,141,943.10
2024	3	14	2026424	Orden de Pago No. 264/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	5,542,286	11,841,469,855.10
2024	3	14	2026524	Orden de Pago No. 265/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	99,592,859.10	11,741,876,996
2024	5	30	2049324	Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	341,880	16,730,335,481.55
2024	5	30	2049424	Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	117,684	16,730,217,797.55
2024	5	30	2049524	Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	103,345,286	16,626,872,511.55
2024	5	30	2049624	Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	93,280,801.55	16,533,591,710
2024	8	26	2081024	Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	184,150	16,710,047,757.55
2024	8	26	2081124	Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	176,682	16,709,871,075.55
2024	8	26	2081224	Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	183,470	16,709,687,605.55
2024	8	26	2081424	Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	51,876,007.99	16,657,811,597.56

Acti
Ve a C

2024	8	26	2081624	Orden de Pago No. 816/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	56,889,776.32	16,600,921,821.24
2024	8	26	2081724	Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	36,202,558.18	16,564,719,263.06

De acuerdo a la información mostrada anteriormente, se presenta el siguiente resumen:

FECHA	ORDEN DE PAGO	MES REPORTADO	VALOR GIRADO
22-feb-24	147	ene-24	$ 10.291.749,00
22-feb-24	148	ene-24	$ 5.901.424,00
14-mar-24	264	feb-24	$ 5.542.286,00
14-mar-24	265	feb-24	$ 99.592.859,10
30-may-24	493	mar-24	$ 341.880,00
30-may-24	494	abr-24	$ 117.684,00
30-may-24	495	abr-24	$ 103.345.286,00
30-may-24	496	abr-24	$ 93.280.801,55
26-ago-24	810	may-24	$ 184.150,00
26-ago-24	811	jun-24	$ 176.682,00
26-ago-24	812	jul-24	$ 183.470,00
26-ago-24	814	may-24	$ 51.876.007,99
26-ago-24	816	jun-24	$ 56.889.776,32
26-ago-24	817	jul-24	$ 36.202.558,18
		TOTAL	**$ 463.926.614,14**

Según la relación mostrada, es importante que el instituto nacional de vías INVIAS, se comunique con la alcaldía del municipio de Fortul, para despejar cualquier duda, con respecto a los giros realizados con el rendimiento financiero del anticipo del contrato de obra No.016 de 2023.

4.9.4 Acta de comité de obra

Anexo N. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de octubre de 2024.

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
Reunión INVIAS Dirección Territorial Casanare	11/10/2024	Verificación solicitud de ingreso al personal al contrato de Interventoría No. 4763 de 2023 y aumento de la dedicación de los especialistas.
Comité de obra N°20	11/10/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°21	19/10/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°22	18/10/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°23	25/10/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.

4.9.5 Acta de reunión.

Anexo O. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

Tabla 4. Reuniones celebradas en el mes de octubre de 2024

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
Acta de reunión	24/10/2024	Exponer a la comunidad el avance actual del proyecto (Caño Flores).
Acta de reunión	26/10/2024	Exponer a la comunidad el avance actual del proyecto (Palmarito).

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 5. Información sobre el contrato de interventoría

CONTRATO N°:	**4763 DE 2023**
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE
VALOR INICIAL	$1.856.588.140
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
CONCURSO DE MÉRITOS	CMA-DEO-SVR-076-2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0 SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1 GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARLY YULIETH MENDEZ AGUIRRE
VALOR CONTRATO	$1.856.588.140
CDP	173523 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N°01	DESDE 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE FEBRERO DE 2024
PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE REANUDACION	01 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA N°01	DESDE EL 4 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 (10 MESES)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

A partir de las actividades generales inherentes a las labores de la interventoría tenemos las siguientes:

- Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.
- Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría.
- Supervisar materiales y fuente de materiales.
- Verificar el cumplimiento de especificaciones y planos a que haya lugar.
- Supervisar las obras.
- Controlar la calidad de la obra a través de los ensayos de laboratorio.
- Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
- Medir obra ejecutada.
- Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
- Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
- Controlar el cronograma o programa de trabajo.
- Controlar los aspectos ambientales.
- Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios.
- Elaborar informe mensual ambiental (parte del informe mensual de interventoría).
- Controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento.
- Realizar seguimiento y acompañamiento de reuniones con la comunidad e interacciones necesarias en el área social.
- Verificar que el personal esté afiliado al Sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (caja de compensación, ICBF, SENA)
- Efectuar el control de registros y archivo de interventoría.
- Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada.
- Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras.
- Llevar un registro fotográfico del proyecto.
- Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra.
- Expedir constancia de cumplimientos de normas de calidad.
- Efectuar un seguimiento al cumplimiento del plan de calidad de la interventoría.
- Atender observaciones y lineamientos de la entidad contratante.
- Realizar la medición de los indicadores del proyecto.

- Revisar que los equipos estén calibrados y registrar o actualizar el listado de equipos.
- Informar permanentemente sobre el desarrollo del proyecto y sobre incumplimientos del contratista.
- Elaborar informe mensual de la interventoría.

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo, en los frentes de trabajo.

Tramo 1. Caño Flores a Sitio nuevo.

Se realizó el acompañamiento y supervisión en las siguientes actividades de los dos tramos.

- Construcción de terraplén (arena limosa) La conformación del terraplén y la protección de los taludes se va conformando por capas, para este mes, se realizaron actividades en las siguientes abscisas: K2+860 – K3+000, K3+000 - K3+510 y K3+510 - K3+790 (Tramo según adicional en valor N°1).

- Se realizó actividades de replanteo topográfico para intervenir las obras de drenaje correspondiente al tramo K2+860 al K3+790. Se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas durante las semanas del periodo del informe.

- Excavación mecánica en material común entre 0-2 en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas), sobre el carril derecho.

- Vaciado de concreto simple de 17 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarilla) sobre el carril derecho.

- Instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril derecho.

- Instalación de acero de refuerzo en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril derecho.

- Relleno y compactación de material seleccionado en las obras de drenaje transversal en las abscisas K3+045, K3+245, K3+455, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril derecho.

- Se realizó ensayo de densidad de campo con el cono de arena.

- Se realizó la toma de muestras para el ensayo de compresión simple del concreto.

Tramo 2: La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

- Excavación mecánica en material común entre 0-2 en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Vaciado de concreto simple de 17 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Instalación de acero de refuerzo en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Relleno y compactación de material seleccionado en las obras de drenaje transversal en las abscisas K0+000, K1+620, K1+861, K2+020, K4+400, K4+454, K6+026. (Alcantarillas y Boxculvert).
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares desde el K0+630 al K0+680; K1+1160 al K1+200 y del K7+200 al K7+400.
- Instalación de base granular clase B gradación fina desde K6+740 al K7+200.
- Verificación de niveles desde el K7+200 al K7+400.
- Instalación de geotextil, Sub Base granular SBG-50, Base Granular Clase II, en los tramos correspondientes a obras de drenaje (k4+380 - k4+490) (k4+640 - k4+680) (k5+150 - k5+200) (k5+260 -k5+310).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K0+40 hasta el K3+950
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K0+40 hasta el K3+850 ambos carriles.
- Se realiza ensayo de densidad de campo con el cono de arena.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Anexo P. Se adjunta el respectivo informe de los Especialistas y profesionales socio-ambientales.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Anexo Q. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

Anexo R.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.6.1 CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura)

Anexo S. No se anexa reporte de información cargada en el Plataforma CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura) e informes.

5.6.2 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

Anexo T.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo U. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (equipo contrato de Interventoría).

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo V. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría).

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo W. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo X. MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Se anexan Pólizas.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo Y. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO

6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo

Anexo Z. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 A la fecha la Interventoría no ha solicitado el desembolso del anticipo.

Anexo AA. Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Anexo AB. Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas a la inversion del Anticipo

Anexo AC. Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contratista de obra viene cumpliendo con las actividades programadas de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado por esta Interventoría, a la fecha de corte del 31 de octubre de 2024, se evidencia un avance físico ejecutado del 57,0% y un avance físico programado del 68,0%, una inversión obra programada acumulada del 66,18% y una inversión obra ejecutada acumulada del 59,67%. Se presenta un atraso del 11% en el avance físico debido a que no se han iniciado las actividades de movimiento de la red eléctrica, las cuales debieron haber iniciado el 14 de octubre de 2024, estructura de pavimento (Geotextil, estabilización química, imprimación y mezcla asfáltica), estas actividades debieron haber iniciado el 10 de octubre de 2024 en el tramo de Caño Flores, la Interventoría solicitó al Contratista el plan de contingencia para recuperar los atrasos presentados a la fecha.

- La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.

- Durante el periodo del presente informe se realizaron cinco (05) comités de obra donde se realizó el seguimiento del avance de las actividades de obra, se aclararon las dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra. También se realizó la verificación solicitud de ingreso al personal al contrato de Interventoría No. 4763 de 2023 y aumento de la dedicación de los especialistas en las oficinas del INVIAS en la Dirección Territorial Casanare.

- Se viene cumpliendo por parte del Contratista de obra, con la entrega de los resultados de ensayos realizados a los materiales utilizados para el mejoramiento de la estructura de la vía, así como los certificados de calidad y calibración de materiales y equipos utilizados en obra.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
COMUNICACIÓN	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
CSVF-1091-2024	01-oct-24	Definición de los puntos de ubicación de señalización vertical.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1093-2024	02-oct-24	Entrega de presentación para la socialización adicional	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1095-2024	03-oct-24	Entrega de afiliaciones AFP, EPS, CCF	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1096-2024	03-oct-24	Entrega de declaración importación FINISHER	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1098-2024	04-oct-24	Entrega de programación según adicional de valor No.1	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
Email componente social	04-oct-24	Informe mes de septiembre de 2024, componente social.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Prof. Gina Nieves
Email componente social	08-oct-24	Convocatoria a reunión con veeduría	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Prof. Gina Nieves
CSVF-1102-2024	09-oct-24	Entrega de ordenes de operación	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1103-2024	09-oct-24	Entrega de AIU contrato no.016 de 2023	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VCAS-054386	10-oct-24	Ingreso Inspectores técnicos CTO 4763-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
Email Representante legal	11-oct-24	RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN PERMISOS AMBIENTALES	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
Email componente social	15-oct-24	Entrega de Código de conducta	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Prof. Gina Nieves
CSVF-1106-2024	16-oct-24	AFILIACIONES	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1108-2024	17-oct-24	Póliza extracontractual de la FINISHER	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1110-2024	17-oct-24	Póliza civil Extracontractual maquinaria	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1111-2024	18-oct-24	Hojas de vida y registros de Mantenimiento Maquinaria Asfalto	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VBOG-072064	21-oct-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-076106; Respuesta a CONECTARAUCA-INVIAS-2024-057	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Oscar Rodolfo Acevedo Castro
CSVF-1113-2024	21-oct-24	Certificados de afiliación al Sistema de seguridad social – Camilo Hunda	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1114-2024	22-oct-24	Notificación de Cambio de Inspector SST – Caño Flores	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
Email componente social	23-oct-24	Actas de capacitación y sensibilización por subsanar.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Prof. Gina Nieves
Email Alcaldía de Fortul	23-oct-24	Revisión y aprobación de la desagregación del AIU del contrato de obra No.016 de 2023	Secretaría de Planeación e infraestructura	Ing. Willmer Riatiga Ocampo
Email componente SST	23-oct-24	Seguridad social julio y agosto CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Adalberto Alarcón Olaya
CSVF-1116-2024	25-oct-24	Diseño Pavimento Caño Flores	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VBOG-074689	29-oct-24	Fechas de Cierre Fiscal 2024, contrato No. 4763 de 2023.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Oscar Rodolfo Acevedo Castro

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**	**DIRIGIDO A**
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-079	02-oct-24	Acta de modificación de costos de la interventoría No.1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Juan Gabriel Rodríguez Solano
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-080	02-oct-24	Presentación hoja de vida de Director de Interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Juan Gabriel Rodríguez Solano
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-081	03-oct-24	Solicitud programación de obra actualizada.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-082	08-oct-24	solicitud de planillas de seguridad social.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-083	07-oct-24	Respuesta oficio 2024S-VBOG-072064	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Juan Gabriel Rodríguez Solano
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-084	16-oct-24	Reiteración Documentos (maquinaria y equipo).	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-085	16-oct-24	SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA PARA AMBOS FRENTES (PALMARITO-CAÑO FLORES)	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-086	18-oct-24	Informes mensuales, fechas de entrega	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-087	21-oct-24	Retiro de Materiales – producto de demolición Actividades de encole y descole en obras de drenaje.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-088	21-oct-24	Acta de modificación de costos de la interventoría No.1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Juan Gabriel Rodríguez Solano
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-089	22-oct-24	Aprobación hojas de vida.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-090	25-oct-24	Solicitud Atención Observaciones al AIU para Revisión y Aprobación de la desagregación del AIU del Contrato de Obra No 016-2023	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-091	25-oct-24	Solicitud de liquidaciones personal contractual y de obra	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-093	28-oct-24	Entrega de documentos y acta de costos No.6 cto de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-094	28-oct-24	Entrega de documentos soporte y actas de costos No.8, Septiembre de 2024.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-095	28-oct-24	Entrega de Actas de Comité No 01 a la No 20	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-096	30-oct-24	Entrega de Actas de Comité No 21 a la No 23	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-097	30-oct-24	solicitud de documentos	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-098	31-oct-24	REITERACIÓN RESIDENTES DE INTERVENTORIA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-099	31-oct-24	Recurrentes Incumplimientos a Solicitudes Componente ambiental Contrato.	Secretaría de Planeación e infraestructura	Ing. Willmer Riatiga Ocampo

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

TRAMO 1 CAÑO FLORES	
	
Figura 1. 26/10/2024 Conformación de terraplén del K3+000 al K3+790, capas posteriores.	**Figura 2.** 31/10/2024 Construcción de obras de drenaje.
	
Figura 3. 25/10/2024. Conformación de terraplén del K3+000 al K3+790, capas posteriores.	**Figura 4.** 19/10/2024. Conformación de terraplén del K3+000 al K3+790, capas posteriores.
	
Figura 5. 21/10/2024. Conformación de terraplén del K3+000 al K3+750.	**Figura 6**. 16/10/2024. Conformación de terraplén del K3+000 al K3+750.

TRAMO 2 PALMARITO	
	
Figura 1. 30/10/2024. Construcción obra de drenaje (Alcantarilla).	**Figura 2.** 29/10/2024. Aplicación de MDC-19, K2+280 hasta k3+ 850 (Carril derecho e Izquierdo).
	
Figura 3. 21/10/2024. Aplicación de MDC-19, K1+400 hasta k2+280 (Carril derecho).	**Figura 4.** 1510/2024. Pavimentación con mezcla asfáltica, K1+335 hasta k1+400 (Carril derecho) y K1+005 hasta k1+606 (Carril Izquierdo)
	
Figura 5. 16/10/2024. Construcción obra de drenaje (alcantarilla en tubo de diámetro 36”).	**Figura 6**. 12/10/2024. Pavimentación con mezcla asfáltica, K1+335 hasta k1+400 (Carril derecho).

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST

✓ GESTIÓN AMBIENTAL

Registro fotográfico octubre 2024	
CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL	
	
	
Jornadas de sensibilización ambiental	
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
	





Materiales de construcción en frentes de obra.

SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES









Señalización en obra

SUMINISTRO DE AGUA Y HUMECTACIÓN EN OBRA





Humectación en obra para mitigar material particulado.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CANTIDADES GENERADAS (ORDINARIOS, RECICLABLES, PELIGROSOS)









Recolección y separación de residuos sólidos.

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS









Maquinaria y equipo en obra.

✓ **GESTIÓN SOCIAL**

Contrato de obra No 016 de 2023	
Registro fotográfico Octubre	
SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD	
	
Capacitación a personal operativo	
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
	





Oficina de Atención e instalación de cartelera informativa

SUB PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



Jornada Educativa

CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA





Reunión con Veeduria Ciudadana

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo AD. Se adjunta copia de la bitácora de los siguientes sectores, respetivamente:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.

- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

8.5 FORMATOS

ANEXOS		
A	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Informe Semanal
B	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
C	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
D	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
E	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Estado General del Tiempo
F	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Resumen Ensayos de Laboratorio
G	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
H	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
I	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Plan de inversión de anticipo de obra
J	MEPI-MN-IN-2-FR-2	Seguimiento a la Inversión del Anticipo
k		Seguimiento programa de obra
L	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Programa de Inversión o reprogramación obra
M	MEPI-MN-IN-6-FR-2	Seguimiento Programa de Inversiones
N	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Actas de Comité de Obra
O	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Actas de Reunión
P		Informes especialistas y profesionales
Q		Informe del Programa Anual de Caja - PAC
R		Informe matriz de riesgos.
S		Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría
T		Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.
U	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
V	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
W	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

ANEXOS		
X	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Y	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Z	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Plan de inversión del anticipo de interventoría
AA	MEPI-MN-IN-3-FR-2	Seguimiento al plan de inversión del anticipo
AB	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado
AC	MEPI-MN-IN-9-FR-3	Seguimiento al Plan de Cargas
AD		Copia bitácora
AE		Informe Administración Vial

ANEXO A

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Informes Semanales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 34 del 4/10/2024 al 10/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas).
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas).

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.178.143.539	43,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.733.312.133	45,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 555.168.594	1,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.178.143.539	43,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.733.312.133	45,43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 555.168.594	1,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 667.555.414	2,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.113.899.343	3,97%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.381.646.996	74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.381.646.996	74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 43% Avance o Atraso Físico % 1%
Meta Física Ejecutada % 42%

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		72%			72,0%
		103600			Ejec		68%			68,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		8%			8,0%
		12703,7			Ejec		16%			16,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		0%			0,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		4%			4,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	80%				80,0%
					Ejec	77%				77,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	4%				4,0%
		54626			Ejec	0%				0,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	97%				97,0%
		523,41			Ejec	95%				95,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	0%				0,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	0%				0,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con dos puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos a mbientales, los sitios utilizados a la fecha son las siguientes canteras:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia dela RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se entrega por parte de la interventoría las observaciones al documento PAGA, a la fecha el contratista aun continua con las correcciones del documento.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	74	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	60	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	36	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 89

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 9 21 30

OBSERVACIONES: Se realizó capacitación al personal operativo el 27 de septiembre acerca del tema Gobernanza Social. Ese mismo día en la tarde se realizó reunión con la Veeduría del sector de Palmarito. El 1 de octubre se realizó reunión extraordinaria con la comunidad de la vereda San Francisco del sector de Caño Flores para resolver inquietudes respecto a la ubicación de algunas estructuras hidráulicas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Terraplén en las siguientes abscisas K2+860 - K3+700; se realizó replanteo topográfico para intervenir las obras de drenaje conrrespondiente al tramo k2+860 - 3790. Desde el componente social se realizó por parte del Contratista la e card de invitación a la reunión de veeduria, desde la Interventoría se realizó la revisión y aprobación, también se elaboró el informe mensual de Interventoría y se realizó la revisión del informe mensual del Contratista. **TRAMO 2 (Palmarito)**: Actividades:2,1 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares tramo (k6+790 - k7+170) ; 2.2 Subbase granular clase A SBG-50 tramo (k6+790 - k7+170) ; 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 K0+440 hasta k1+335 (carril derecho) y K0+440 hasta k1+005 (carril izquierdo) ; 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 K0+440 hasta k1+335 (carril derecho) y K0+440 hasta k1+005 (carril izquierdo).
Desde el componente ambiental para esta se mana se reporta la siguiente información:
1.A la fecha el contratista continua sin realizar la entrega de las cantidades de material que ingresan a obra.
2.Por parte de la interventoría se continua con la revisión de los informes mensuales que el contratista presento de manera extemporánea.
3.Se realiza reunión virtual contratista -interventoría en la cual participa el profesional ambiental del contratista, el profesional ambiental de la interventoría y el especialista ambiental de la interventoría; en esta reunión se solicita nuevamente por parte de la interventora la entrega del documento PAGA, el cual debe ser radicado en dirección de sostenibilidad de invias.
4.Por parte del contratista se reporta unas talas ilegales que se están realizando desde la comunidad dentro del área de influencia del proyecto, desde la interventoría se da la directriz al contratista de informar esta situación con registro fotográfico a la autoridad ambiental y a el municipio con copia a la interventoría, con el fin de dejar la trazabilidad de que las intervenciones en ningún momento fueron realizadas por la obra o personal de la misma.

Desde el Componente Social se realizó por parte del Contratista la e card de invitación a la reunión de veeduria, desde la Interventoría se realizó la revisión y aprobación, también se elaboró el informe mensual de Interventoría y se realizó la revisisón del informe mensual del Contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, instalación de sub-base granular clase A SBG-50, instalación de base granular clase B gradación fina, corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se debe entregar el informe mensual por parte del Contratista y la elaboración por parte de la Interventoría.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

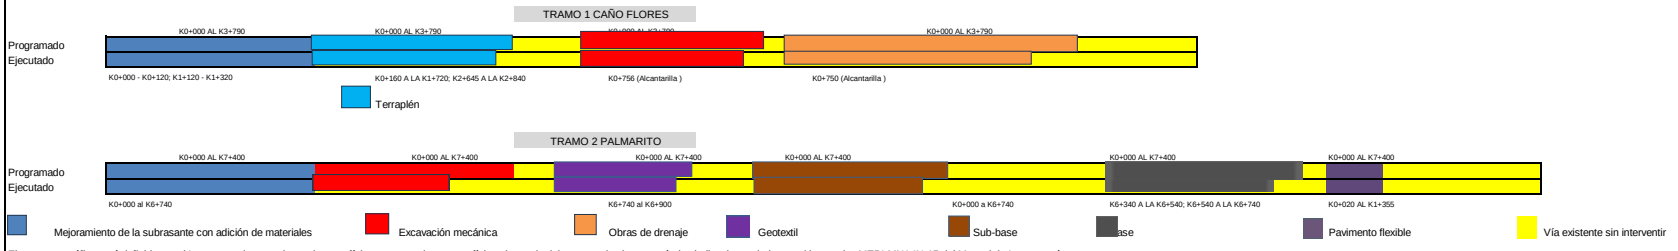

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terraplen de la abs K2+860 a la abs K3+700 (Tramo 1)



Conformación de terraplen de la abs K2+860 a la abs K3+700 (Tramo 1)



Conformación de terraplen de la abs K2+860 a la abs K3+700 (Tramo 1)



Alamacenamiento de materiales en obra



Punto de separación de residuos solidos en obra



Subbase Granular de la abs K6+790 a la abs K7+170 (Tramo 1)



Pavimentación con mezcla asfaltica, de la abs K0+440 a la abs K1+335 carril derecho (Tramo 2)



Pavimentación con mezcla asfaltica, de la abs K0+440 a la abs K1+005 carril izquierdo (Tramo 2)



Intervenciones forestales ilegales realizadas por la comunidad



Intervenciones forestales ilegales realizadas por la comunidad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE Gustavo A. Becerra Gil

Matrícula Profesional No.: 17202-60829 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 35 del 11/10/2024 al 17/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. C

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.844.205.968	49,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13.563.012.528	48,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (281.193.440)	-1,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.844.205.968	49,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13.563.012.528	48,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (281.193.440)	-1,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.666.062.429	5,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 831.795.697	2,97%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.338.470.527	72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.338.470.527	72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 51% Avance o Atraso Físico % 4%
Meta Física Ejecutada % 47%

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		68%			68,0%
		103600			Ejec		68%			68,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		0%			0,0%
		12703,7			Ejec		16%			16,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		0%			0,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		0%			0,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	77%				77,0%
					Ejec	77%				77,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	0%				0,0%
		54626			Ejec	0%				0,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	100%				100,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	0%				0,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	0%				0,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con dos puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos a mbientales, los sitios utilizados a la fecha son las siguientes canteras:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se entrega por parte de la interventoría las observaciones al documento PAGA, a la fecha el contratista aun continua con las correcciones del documento.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	59	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	34	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El martes 15 de octubre se realizó actualización de la cartelera informativa, el miércoles 16 de octubre se realizó capacitación y sensibilización para la prevención de todo tipo de violencia y acoso basados en el género, la cual contó con la participación de 18 personas en el sector de Caño Flores.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Terraplén en las siguientes abscisas K3+000 - K3+510 y K3+520 - K3+750 ; se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas durante la semana. Desde el componente social se realizó capacitación al personal operativo acerca de la prevención y atención de todo tipo de violencia y acoso basados en el género con la participació de 18 personas. **TRAMO 2 (Palmarito)**: Actividades:2,1 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares tramo (k7+170 - k7+400) ; 2.2 Subbase granular clase A SBG-50 tramo (k7+170 - k7+400) ; 2.3 Base granular Clase B gradación fina tramo (k6+790 - k7+200) ; 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 K1+335 hasta k1+400 (Carril derecho) y K1+005 hasta k1+606 (Carril Izquierdo); 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 K1+335 hasta k1+400 (Carril derecho) y K1+005 hasta k1+606 (Carril Izquierdo). Se ejecutaron actividades correspondientes a obras de drenaje (K0+000, k1+620,k1+861, k2+020, k4+400, k4+454, k6+026)

Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información:


Para la semana en curso dentro del componente ambiental se continua con la revisión de los informes que el contratista entrega de manera extemporánea, se revisa el documento de modificación entregado por la autoridad ambiental Corporinoquia en el cual se autorizan las obras adicionales, se verifica las actividades en campo en las cuales se solicita al contratista documentación de la maquinaria que realiza las actividades de pavimento ya que a la fecha estas máquinas no están aprobadas por la interventoría dado que no se presentó la totalidad de la documentación requerida.

Desde el Componente Social se realizó la actualización de la cartelera informativa y la planeación de la capacitación para el personal de obra que se realizará el viernes 18 de octubre.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, instalación de sub-base granular clase A SBG-50, instalación de base granular clase B gradación fina, corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará capacitación al personal de obra del sector de Palmarito, se realizará capacitación al personal de obra de Caño Flores, también se desarrollarán las reunión con la veeduria del sector de Caño Flores,así como jornada educativa con la comunidad de este mismo sector.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terraplen de la abs K3+000 a la abs K3+750 (Tramo 1)



Conformación de terraplen de la abs K3+000 a la abs K3+750 (Tramo 1)



Conformación de terraplen de la abs K3+000 a la abs K3+750 (Tramo 1)



Conformación de terraplen de la abs K3+000 a la abs K3+750 (Tramo 1)



Maquinaria sin autorización por parte de la interventoría (sin documentación requerida).



Construccion de obras drenaje - carril derecho (Tramo 2)



Pavimentación con mezcla asfaltica, K1+335 hasta k1+400 (Carril derecho) y K1+005 hasta k1+606 (Carril Izquierdo) (Tramo 2)



Pavimentación con mezcla asfaltica, K1+335 hasta k1+400 (Carril derecho) y K1+005 hasta k1+606 (Carril Izquierdo) (Tramo 2)



Geotextil, SBG (k7+170 - k7+400)



Maquinaria presentando fallas y sin la totalidad de documentación requerida.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra. Medir obra ejecutada. Llevar y mantener diario de la obra (bitácora). Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias. Llevar un registro fotográfico del proyecto. Supervisar materiales y fuente de materiales. Elaborar informe semanal	FIRMA NOMBRE: Gustavo A. Becerra Gil Matrícula Profesional No.: 17202-60829 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 36 del 18/10/2024 al 24/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. C

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

14702528940
16192435468

OBRA			**INTERVENTORÍA**		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.192.435.468	57,77%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.702.528.940	52,45%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.338.470.527	72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.489.906.528)	-5,32%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.338.470.527	72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.192.435.468	57,77%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.702.528.940	52,45%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.489.906.528)	-5,32%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.348.229.500	8,38%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.139.516.412	4,07%			

	SI	NO		SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 60% Avance o Atraso Físico % 7%
Meta Física Ejecutada % 53%

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		85%			85,0%
		103600			Ejec		54%			54,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		43%			43,0%
		12703,7			Ejec		85%			85,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		0%			0,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		0%			0,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	94%				94,0%
					Ejec	96%				96,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	75%				75,0%
		54626			Ejec	0%				0,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	70%				70,0%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	0%				0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	0%				0,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	0%				0,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI x NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con dos puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos a mbientales, los sitios utilizados a la fecha son las siguientes canteras:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se entrega por parte de la interventoría las observaciones al documento PAGA, a la fecha el contratista aun continua con las correcciones del documento.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	59	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	34	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El viernes 18 de octubre se realizó capacitación sobre equidad de género e inclusión social con el personal operativo del frente de Palmarito, también se participó en el comité de obra realizado con la Alcaldía Municipal de Fortul. El día lunes 21 de octubre se realizó capacitación al personal del tramo de Caño Flores en horas de la mañana sobre equidad de género e inclusión social. El día martes 22 de octubre se realizó confirmación de reuniones con las veedurías de ambos sectores para los días jueves y viernes, así como también la jornada educativa con la comunidad de Caño Flores. El día miércoles 23 de octubre se realizó recorrido en los dos sectores y el día jueves 24 de octubre se realizó acompañamiento a la visita por parte de INVIAS y en la tarde se realizó la jornada educativa sobre seguridad vial con la comunidad y seguidamente se realizó la reunión mensual con la Veeduría Ciudadana en el tramo de Caño Flores.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Terraplén en las siguientes abscisas K3+000 - K3+510 y K3+520 - K3+790 ; se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas durante la semana. Desde el componente social se realizó capacitación al personal operativo, tambien se realizó acompañamiento a la visita técnica por parte de los funcionarios de INVIAS. El 24 de octubre se realizó la jornada educativa sobre seguridad vial con la comunidad y seguidamente se desarrolló la reunión con la veeduría ciudadana de este sector. **TRAMO 2 (Palmarito)**: ; 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 K1+1400 hasta k2+280 (Carril derecho) y K1+606 hasta k2+240 (Carril Izquierdo); 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 K1+1400 hasta k2+280 (Carril derecho) y K1+606 hasta k2+240 (Carril Izquierdo). Se ejecutaron actividades correspondientes a obras de drenaje (K0+000, k1+620,k1+861, k2+020, k4+400, k4+454, k6+026)


Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información:
Para la semana en curso dentro del componente ambiental se culminó la revisión de la totalidad de los informes remitidos por parte del contratista de manera extemporánea, se verifica las actividades en campo en las se evidencia que la comunidad realiza el retiro de las talas reportadas en semanas anteriores que no hacen parte de la obra, se entrega por parte del contratista póliza extracontractual y queda pendiente la entrega del cronograma de mantenimiento de las maquinas en obra.
Se realiza recorrido de obra y se acompaña visita de personal del invias.

Desde el Componente Social se realizó capacitación al personal de obra y acompañamiento a la visita técnica por parte de los funcionarios de INVIAS el jueves 24 de octubre.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, instalación de sub-base granular clase A SBG-50, instalación de base granular clase B gradación fina, corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará reunión con la Veeduría de Palmarito y se participará en el comité de obra semanal.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terraplén de la abs K3+000 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Conformación de terraplén de la abs K3+000 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Conformación de terraplén de la abs K3+000 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Solicitud de orden y aseo frentes de obra.



Acompañamiento recorridos frentes de obra Invías.



Construcción de obras drenaje - Palmarito



Imprimación, Aplicación de MDC-19 , K1+400 hasta k2+280 (Carril derecho) y K1+606 hasta k2+420 (Carril Izquierdo) (Tramo 2)



Imprimación, Aplicación de MDC-19 , K1+400 hasta k2+280 (Carril derecho) y K1+606 hasta k2+420 (Carril Izquierdo) (Tramo 2)



Verificasion de puntos de separacion de manteriales en obra.



Recolección de residuos en frentes de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO

Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 37 del 25/10/2024 al 31/10/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Sí Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.548.861.120	66,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 16.726.452.561	59,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.822.408.559)	-6,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.548.861.120	66,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.726.452.561	59,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.822.408.559)	-6,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.356.425.652	8,41%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.023.923.621	7,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.381.646.996	74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.381.646.996	74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 68% Avance o Atraso Físico % 11%
Meta Física Ejecutada % 57%

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de preallistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		90%			90,0%
		103600			Ejec		68%			67,5%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		61%			61,0%
		12703,7			Ejec		93%			92,9%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		20%			20,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		38%			38,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de preallistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	99%				99,0%
					Ejec	98%				97,7%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	44%				44,0%
		54626			Ejec	0%				0,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	84%				84,0%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	0%				0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	30%				30,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	3%				3,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con dos puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos a mbientales, los sitios utilizados a la fecha son las siguientes canteras:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovech amiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se entrega por parte de la interventoría las observaciones al documento PAGA, a la fecha el contratista aun continua con las correcciones del documento.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	57	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 84

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El sábado 26 de octubre se realizó reunión con la comunidad y veeduría de Palmarito para informar sobre los avances del mes y resolver dudas e inquietudes de la comunidad. Se realizó la elaboración del informe mensual por parte del Contratista. Se realizó seguimiento a los compromisos generados en la reunión con la Veeduría del sector de Caño Flores.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Terraplén en las siguientes abscisas K3+000 - K3+510 y K3+520 - K3+790 ; se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas durante la semana. 1.2.2.1 Excavación mecánica en material común , 1.2.2.3 Relleno con material seleccionado, 1.2.3.4 N Concreto simple (17 Mpa), 1.2.3.2 Concreto reforzado resistencia 21mpa, 1.2.3.3 Tubería de concreto reforzado, clase II-900 mm en Alcantarillas (K3+045, K3+245, K3+455, K3+645) Sobre el Carril derecho. Desde el componente social se realizó seguimiento a los compromisos generados en reunión con la veeduria de este sector y se elaboró el informe mensual. **TRAMO 2 (Palmarito)**: ;se realizó: 2,1 Geotextil , 2,3 Sub Base granular SBG-50 , 2,4 Base Granular Clase II , En los tramos correspondientes a obras de drenaje (k4+380 - k4+490) (k4+640 - k4+680) (k5+150 - k5+200) (k5+260 -k5+310) . 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 desde k2+280 hasta k3+950 (Carril derecho) y K2+420 hasta k3+850 (Carril Izquierdo); 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 k2+280 hasta k3+850 (Carril derecho) y k2+280 hasta k3+850 (Carril Izquierdo). Se ejecutaron actividades correspondientes a obras de drenaje (k4+454, k6+026)


Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información:
Se realiza mesa de trabajo con el contratista en la cual se explica las observaciones y requerimientos a los informes mensuales que se han entregado de manera extemporánea.
Se realiza recorrido en los frentes de obra y se acompañan reunión social con la veeduría.
En compañía del área técnica se verídica el trayecto desde los frentes de obra hasta la cante el sol la cual suministra parte del material utilizado en obra.
Se realiza revisión de los puntos de separación de residuos en los frentes de obras.
Se verifica el avance de las obras transversales y su construcción según lo establecido.
Se da aclaración a la comunidad en relación con los temas de compensación ambiental quedando como conclusión la realización de una reunión en la cual se encuentren el contratista, el municipio, la corporación ambiental y la interventoría.
Se informa que a la fecha por parte de la interventoría no se conoce el plan de inversión ambiental que el contratista pretende ejecutar, dado que este luego de las observaciones realizadas por la interventoría no se conoce gestión ejecutada por el contratista y el municipio ante la corporación ambiental para la entrega y aprobación de este presupuesto.

Desde el Componente Social se realizó reunión con la veeduría de este sector y comunidad en general para informar sobre los avances del proyecto y resolver dudas e inquietudes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, instalación de sub-base granular clase A SBG-50, instalación de base granular clase B gradación fina, corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará informe mensual y se continuará con el seguimiento a los compromisos pactados en cada una de las reuniones con comunidad.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terraplén de la abs K3+000 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Conformación de terraplén de la abs K3+000 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Construcción de obras de drenaje (Tramo 1)



Solicitud de orden, aseo y limpieza de frentes de obra.



Limpieza y recolección de residuos en los frentes de obra.



Construcción de obras drenaje - Palmarito



Imprimación, Aplicación de MDC-19 , K2+280 hasta k3+ 850 (Carril derecho e Izquierdo)



Imprimación, Aplicación de MDC-19 , K2+280 hasta k3+ 850 (Carril derecho e Izquierdo)



Verificación de puntos de separación de materiales en obra.



Verificación de materiales que ingresan a los frentes de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Ing. JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO

Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO B

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				OCTUBRE																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	MAZDA / 2013	1000-5	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CARROTANQUE	INTERNACIONAL/ 2005	12000	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EXCAVADORA	KOMATSU/	220-8	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR/	10.700 c	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	LIUGONG/ 2011	….....	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR/ 2022	….....	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MEZCLADORA	M2G9H	2 bultos	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	CAÑO FLORES	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			TOTAL ACTIVO	9	9	9	9	9	0	8	8	8	8	9	9	0	9	9	9	9	8	8	0	8	9	9	9	9	8	0	9	9	9	9
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	9	1	1	1	1	0	0	9	0	0	0	0	1	1	9	1	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	279	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	235	84,2
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	44	15,8

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: * LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN INACTIVOS LOS DIAS DOMINGOS DEL MES. *

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparació
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta c
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				OCTUBRE																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	TOYOTA / 2013	1000-5	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CARROTANQUE	CEHVROLET / 1994	12000	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EXACAVADORA	CATTERPILLAR	416F2	PALMARITO	A	R	R	R	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	SEM / 2022	…….	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	BOMAG / 2011	…….	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MEZCLADORA	M2G9H	2 bultos	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPACTADOR DE NEUMÁTICO	HAMM / GRW-15	…….	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
PAVIMENTADORA-FINISHER	CATTERPILLAR / AP 1050B 1992	…….	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND. / SD-70D PRO-PAC	…….	PALMARITO	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			TOTAL ACTIVO	11	10	10	10	10	0	11	9	11	11	11	11	0	11	11	11	11	8	11	3	9	11	11	11	8	11	3	11	11	11	
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	1	11	0	2	0	0	0	0	11	0	0	0	0	3	0	8	2	0	0	0	3	0	8	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	278	84,2
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	3	0,9
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	49	14,8

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: * LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN INACTIVOS LOS DÍAS DOMINGOS DEL MES. EXCEPTO EN 2 DOMINGOS QUE SE LABORÓ CON INSTALACIÓN DE ASFALTO MDC-19.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Firma
Nombre: Esneider Fuentes Zárate
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105731 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO C

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** VIAS FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31-oct-24 **PROYECTO:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ	1116782711	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.700.000	$ 188.000	5	NUEVA EPS	80651973	$ 108.000	PORVENIR	80651973	$ 432.000	$ 108.000			
2	SANDRA JOHANNA AMAYA PULIDO	1102718125	PROFESIONAL HSEQ	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	80651973	$ 52.000	PORVENIR	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
3	OLGA PIERINA CISNEROS FLORES	1116787329	PROFESIONAL HSEQ	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	80651973	$ 52.000	PORVENIR	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
4	ALEJANDRO ROJAS GOMEZ	80233801	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	80651973	$ 52.000	COLPENSIONES	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
5	WILFREDO RAMIREZ RAMIREZ	1116787495	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	80651973	$ 52.000	PORVENIR	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
6	EDIER JAFETH MAROTTA PADILLA	1124383047	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.700.000	$ 188.000	5	SANITAS	80651973	$ 108.000	COLPENSIONES	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
7	MARLA ALESSANDRA DAVILA RAMIREZ	1102718125	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.800.000	$ 125.300	5	NUEVA EPS	80651973	$ 72.000	PORVENIR	80651973	$ 288.000	$ 72.000			
8	ACEVEDO CAÑAS YERNEY	1007325544	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 78.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.600	PORVENIR	79905934	$ 208.100	$ 45.100	$ 22.600	$ 33.900	
9	ACEVEDO CAÑAS JESSICA PAOLA	1007397121	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
10	MARTINEZ NIETO LUZ ANDREA	1115723899	INSPECTOR HSEQ	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	COLPENSIONES	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
11	DURAN CALVO RODRIGO	1098752215	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
12	SUESCUN CAICEDO ENDERSON	1115722111	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 84.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 159.100	PORVENIR	79905934	$ 208.100	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	
13	ACEVEDO AGUILAR LAURA MAGDALENA	1116782616	AUXILIAR SISO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.500.000	$ 104.400	5	NUEVA EPS	78254700	$ 187.500	PORVENIR	79905934	$ 240.000	$ 60.000	$ 30.000	$ 45.000	
14	SIERRA JIMENEZ IVAN DARIO	1116801241	ALMACENISTA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 84.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 159.100	PORVENIR	79905934	$ 208.100	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	
15	HERRERA ALVAREZ CRISTIAN ALEXANDER	1116806695	AUX RESIDENTE DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.500.000	$ 174.000	5	SANITAS	78254700	$ 312.500	COLPENSIONES	79905934	$ 400.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	
16	ROJAS BENITEZ JUAN DAVID	1119180729	CADENERO+E42:E44	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
17	ORTEGA SUESCUN MARYURY DANIELA	1119181598	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
18	VILLARRAGA ARCHILA DUMAR	1119182031	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
19	CUBIDES RIOS FREDY EMEL	1119182525	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
20	GONZALEZ PEDRAZA WILMER ALEXANDER	1121842709	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
21	CORTES RIALPE SEGUNDO FLORENCIO	12906422	OFICIAL	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.400.000	$ 97.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 175.000	PORVENIR	79905934	$ 224.000	$ 56.000	$ 28.000	$ 42.000	
22	CUBIDES PEÑA DADEY ARNOLDO	17570610	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	COLPENSIONES	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
23	PABON VILLAMIZAR ELICEO	17570742	CADENERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	COLPENSIONES	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
24	PAOLA CRISTINA OJEDA SANCHEZ	37329121	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.800.000	$ 194.900	5	NUEVA EPS	78254700	$ 350.000	COLPENSIONES	79905934	$ 448.000	$ 112.000	$ 56.000	$ 84.000	
25	RODRIGUEZ SIERRA LEIDY VANESSA	60264418	SECRETARIA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	FOSYGA	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
26	HERNANDEZ GIRALDO DUIMAR JAVIER	74860225	MAESTRO DE OBRA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.400.000	$ 97.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 175.000	PORVENIR	79905934	$ 224.000	$ 56.000	$ 28.000	$ 42.000	
27	HERNANDEZ HENAO BERNARDO	7505900	MAESTRO DE OBRA	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.600.000	$ 111.400	5	NUEVA EPS	78254700	$ 200.000		79905934	$ -	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
28	MIRANDA RUIDIAZ TARCISIO	79775680	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
29	ALARCON OLAYA ADALBERTO	79844309	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.350.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 3.350.000	$ 233.200	5	NUEVA EPS	78254700	$ 418.800	COLPENSIONES	79905934	$ 536.000	$ 134.000	$ 67.000	$ 100.500	
30	RODRIGUEZ BAUTISTA HECTOR	88203373	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 160.800	COLPENSIONES	79905934	$ 208.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
31	HERRERA TUNJANO LUIS ALBERTO	91243330	ALMACENISTA	$ 1.625.362	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.625.362	$ 113.200	5	NUEVA EPS	78254700	$ 203.200	PORVENIR	79905934	$ 260.100	$ 65.100	$ 32.600	$ 48.800	
32	ROPERO GOMEZ ISAIAS	91536077	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
33	RODRIGUEZ SALSEDO WILSON	96192995	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
34	GOMEZ FERNANDEZ LUIS ALEXANDER	96193901	TOPOGRAFO	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.500.000	$ 174.000	5	NUEVA EPS	78254700	$ 312.500	PORVENIR	79905934	$ 400.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista a la fecha (06/11/2024) no ha entregado las planillas de seguridad social del mes de octubre.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901758303-9	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		CLL 19 22 31	6017942623	auxiliargestionhumana2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	02	ARAUCA	ARAUCA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81560994	$1.538.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.400	0		0		0	2	100	0	57.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.400	0		0		0	2	200	0	129.600	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	538.800	0	0	0	0	2	800	0	539.600	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	2	300	0	208.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	325.100				325.100	2	500	325.600			3.251	325.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	277.100	2	400	277.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	186.800	187.100
Pensión	2	746.800	747.900
Riesgos Laborales	1	325.100	325.600
CCF	1	277.100	277.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.535.800	1.538.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901758303-9	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		CLL 19 22 31	6017942623	auxiliargestionhumana2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	02	ARAUCA	ARAUCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81560994	$1.538.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102718125	AMAYA PULIDO SANDRA JOHANNA	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF67	550.695	22.100	0	0	0	0	0
2	CC	1116777367	DAVILA RAMIREZ MARLA ALESSANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF67	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	1116782711	SANABRIA JIMENEZ JAVIER ORLANDO	1	0			S		X															230301	90.000	14.400	0	0	0	0	EPS037	90.000	3.600	14-23	90.000	5	6.300	CCF67	1.143.750	45.800	0	0	0	0	0
4	CC	1116787329	CISNEROS FLOREZ OLGA PIERINA	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF67	550.695	22.100	0	0	0	0	0
5	CC	1116787495	RAMIREZ RAMIREZ WILFREDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1124383047	MARIOTTA PADILLA EDIER JAFETH	1	0			S		X															230301	90.000	14.400	0	0	0	0	EPS005	90.000	3.600	14-23	90.000	5	6.300	CCF67	277.500	11.100	277.500	0	0	0	0
7	CC	80233801	ROJAS GOMEZ ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901758303-9	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		CLL 19 22 31	6017942623	auxiliargestionhumana2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	ARAUCA	ARAUCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					62	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81417273	$20.224.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	523.400	0		0		0	2	800	0	524.200	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	641.100	0		0		0	2	1.000	0	642.100	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.355.300	0		0		0	2	2.000	0	1.357.300	36
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	7.416.200	0	0	0	0	2	10.500	0	7.426.700	45
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.168.300	0	0	0	0	2	4.500	0	3.172.800	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.427.300				4.427.300	2	6.300	4.433.600			44.273	4.433.600	62

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	2.611.700	2	3.700	2.615.400	62

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.571.800	2.575.700
Pensión	2	10.584.500	10.599.500
Riesgos Laborales	1	4.427.300	4.433.600
CCF	1	2.611.700	2.615.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	20.195.300	20.224.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901758303-9	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		CLL 19 22 31	6017942623	auxiliargestionhumana2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	ARAUCA	ARAUCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					62	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81417273	$20.224.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006594349	PEÑA VERA GUSTAVO ADRIAN	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS041	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF67	375.556	15.100	375.556	0	0	0	0
2	CC	1006594896	MARTINEZ SANTAFE MARIO ANTONIO	1	0			S		X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS041	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF67	704.167	28.200	704.167	0	0	0	0
3	CC	1007325544	ACEVEDO CAÑAS YERNEY	1	0			S		X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS041	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF67	989.440	39.600	989.440	0	0	0	0
4	CC	1007397121	ACEVEDO CAÑAS JESSICA PAOLA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1007900760	ZUÑIGA NICOL VANNESA	1	0			S	X																230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS041	1.040.000	41.600	14-23	1.040.000	5	72.400	CCF67	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
6	CC	1010141920	GAMARRA IPUANA JOSE FELIX	1	0			S																	230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS037	866.667	34.700	14-23	866.667	5	60.400	CCF67	866.667	34.700	0	0	0	0	0
7	CC	1010141920	GAMARRA IPUANA JOSE FELIX	1	0			S									X								230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS037	433.334	0	14-23	433.334	5	0	CCF67	433.334	0	0	0	0	0	0
8	CC	1098752215	DURAN CALVO RODRIGO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1115722111	SUESCUN CAICEDO ENDERSON	1	0			S																	230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS041	910.000	36.400	14-23	910.000	5	63.400	CCF67	910.000	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	1115722111	SUESCUN CAICEDO ENDERSON	1	0			S									X								230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS041	390.000	0	14-23	390.000	5	0	CCF67	390.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	1115722758	TORRES DIAZ FREIDER WILFRED	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS041	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF67	693.334	27.800	0	0	0	0	0
12	CC	1115743830	CABALLERO ALVAREZ JESUS DIOMEDES	1	0			S	X																230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS005	1.040.000	41.600	14-23	1.040.000	5	72.400	CCF67	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
13	CC	1116493180	ROJAS CONTRERAS ANGIE YULIETH	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.455.278	58.300	1.455.278	0	0	0	0
14	CC	1116498190	HERNANDEZ PINEDA SAMUEL	1	0			S		X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS005	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF67	368.334	14.800	368.334	0	0	0	0
15	CC	1094242568	VERA VILLAMIZAR ARNOLDO	1	0			S																	230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS041	780.000	31.200	14-23	780.000	5	54.300	CCF67	780.000	31.200	0	0	0	0	0
16	CC	1094242568	VERA VILLAMIZAR ARNOLDO	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
17	CC	1094242568	VERA VILLAMIZAR ARNOLDO	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
18	CC	1094242568	VERA VILLAMIZAR ARNOLDO	1	0			S									X								230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	0	14-23	433.334	5	0	CCF67	433.334	0	0	0	0	0	0
19	CC	1095823482	GARCES REY ANDREA	1	0			S																	25-14	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-23	900.000	5	62.700	CCF67	900.000	36.000	0	0	0	0	0
20	CC	1095823482	GARCES REY ANDREA	1	0			S										X							25-14	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS005	600.000	24.000	14-23	600.000	5	0	CCF67	600.000	0	0	0	0	0	0
21	CC	1098150064	FLOREZ RODRIGUEZ ALEXIS JAVIER	1	0			S		X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF67	355.695	14.300	355.695	0	0	0	0
22	CC	1116802371	SILVA PRADA LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF67	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
23	CC	1116805300	HUNDA CAMPOS CAMILO ANDRES	1	0			S	X																25-14	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS005	433.334	17.400	14-23	433.334	5	30.200	CCF67	433.334	17.400	0	0	0	0	0
24	CC	1116807119	HIDALGO GOMEZ JESUS ALBERTO	1	0			S		X															230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS037	700.000	28.000	14-23	700.000	5	48.800	CCF67	758.333	30.400	758.333	0	0	0	0
25	CC	1115723899	MARTINEZ NIETO LUZ ANDREA	1	0			S		X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF67	249.167	10.000	249.167	0	0	0	0
26	CC	1115724075	DAZA ROMAN JAIDER YESID	1	0			S		X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS041	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF67	368.334	14.800	368.334	0	0	0	0
27	CC	1115733580	CARRILLO CABALLERO CARLOS EDUARDO	1	0			S		X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF67	343.056	13.800	343.056	0	0	0	0
28	CC	1119181163	AYALA NIÑO PEDRO DAVID	1	0			S		X															25-14	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS041	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF67	375.556	15.100	375.556	0	0	0	0
29	CC	1119181188	HERNANDEZ CAMARGO KELLY NATALIA	1	0			S		X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS041	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF67	292.500	11.700	292.500	0	0	0	0
30	CC	1119181471	ROMAN CASTAÑEDA JUAN GABRIEL	1	0			S		X															25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS005	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF67	355.695	14.300	355.695	0	0	0	0
31	CC	1116782616	ACEVEDO AGUILAR LAURA MAGDALENA	1	0			S																	230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS041	1.150.000	46.000	14-23	1.150.000	5	80.100	CCF67	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
32	CC	1116782616	ACEVEDO AGUILAR LAURA MAGDALENA	1	0			S									X								230301	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS041	350.000	0	14-23	350.000	5	0	CCF67	350.000	0	0	0	0	0	0
33	CC	1116796838	NIEVES TINEO GINA LIDIA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF67	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
34	CC	1116801241	SIERRA JIMENEZ IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.625.362	260.100	0	0	0	0	EPS041	1.625.362	65.100	14-23	1.625.362	5	113.200	CCF67	1.625.362	65.100	0	0	0	0	0
35	CC	1119182525	CUBIDES RIOS FREDY EMEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	1119183518	GUERRERO RANGEL JOSE ESNEYDER	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF67	399.028	16.000	399.028	0	0	0	0
37	CC	1119185578	BERNAL VERA EMERSON	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS041	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF67	399.028	16.000	399.028	0	0	0	0
38	CC	1116872509	OSORIO LEON YESSICA BRIYITH	1	0			S		X															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.365.000	54.600	1.365.000	0	0	0	0
39	CC	1119180440	HERNANDEZ CAMARGO JESUS DAVID	1	0			S																	230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS041	780.000	31.200	14-23	780.000	5	54.300	CCF67	780.000	31.200	0	0	0	0	0
40	CC	1119180440	HERNANDEZ CAMARGO JESUS DAVID	1	0			S									X								230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	0	14-23	433.334	5	0	CCF67	433.334	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901758303-9	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		CLL 19 22 31	6017942623	auxiliargestionhumana2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	ARAUCA	ARAUCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					62	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81417273	$20.224.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1119180729	ROJAS BENITEZ JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
42	CC	13928578	MERCHAN BASTO JULIO EFRAIN	1	0			S		X															25-14	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS005	563.334	22.600	14-23	563.334	5	39.300	CCF67	630.140	25.300	630.140	0	0	0	0
43	CC	13928578	MERCHAN BASTO JULIO EFRAIN	1	0			S									X								25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
44	CC	13928578	MERCHAN BASTO JULIO EFRAIN	1	0			S									X								25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
45	CC	17529024	GALINDO SAAVEDRA CIRO ALFONSO	1	0			S																	25-14	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS041	933.334	37.400	14-23	933.334	5	65.000	CCF67	933.334	37.400	0	0	0	0	0
46	CC	17529024	GALINDO SAAVEDRA CIRO ALFONSO	1	0			S										X							25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	0	14-23	466.667	5	0	CCF67	466.667	0	0	0	0	0	0
47	CC	17570610	CUBIDES PEÑA DADEY ARNOLDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
48	CC	1119181598	ORTEGA SUESCUN MARYURY DANIELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
49	CC	1119181657	PUIN CASTAÑEDA JHONATAN ALEXANDER	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS041	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF67	375.556	15.100	375.556	0	0	0	0
50	CC	1119182031	VILLARRAGA ARCHILA DUMAR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
51	CC	17591204	TORRES PACHECO FERNANDO JOSE	1	0			S	X																230301	921.039	147.400	0	0	0	0	EPS041	921.039	36.900	14-23	921.039	5	64.200	CCF67	921.039	36.900	0	0	0	0	0
52	CC	17595697	COIRAN OVIEDO LEONAR YEXI	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF67	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
53	CC	52389038	CARABALI GONZALEZ MARIA ZENAIDA	1	0			S	X																25-14	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF67	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
54	CC	1121842709	GONZALEZ PEDRAZA WILMER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
55	CC	12906422	CORTES RIALPE SEGUNDO FLORENCIO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF67	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
56	CC	13906862	MERCHAN BASTO MIGUEL ANGEL	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS041	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF67	426.111	17.100	426.111	0	0	0	0
57	CC	13906862	MERCHAN BASTO MIGUEL ANGEL	1	0			S									X								230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS041	303.334	0	14-23	303.334	5	0	CCF67	303.334	0	0	0	0	0	0
58	CC	79775680	MIRANDA RUIDIAZ TARCISIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
59	CC	79844309	ALARCON OLAYA ADALBERTO	1	0			S																	25-14	3.350.000	536.000	0	0	0	0	EPS037	3.350.000	134.000	14-23	3.350.000	5	233.200	CCF67	3.350.000	134.000	0	0	0	0	0
60	CC	88271788	ANGARITA TRIGOS JOSE MIGUEL	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF67	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
61	CC	17570623	GELVIZ BASTOS ANIBAL	1	0			S																	230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS041	866.667	34.700	14-23	866.667	5	60.400	CCF67	866.667	34.700	0	0	0	0	0
62	CC	17570623	GELVIZ BASTOS ANIBAL	1	0			S									X								230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	0	14-23	433.334	5	0	CCF67	433.334	0	0	0	0	0	0
63	CC	17570742	PABON VILLAMIZAR ELICEO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
64	CC	96186739	CARVAJALINO BAYONA ELIGIO	1	0			S																	25-14	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS041	933.334	37.400	14-23	933.334	5	65.000	CCF67	933.334	37.400	0	0	0	0	0
65	CC	96186739	CARVAJALINO BAYONA ELIGIO	1	0			S									X								25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	0	14-23	466.667	5	0	CCF67	466.667	0	0	0	0	0	0
66	CC	96187716	CABALLERO GELVES JESUS	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS041	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF67	693.334	27.800	0	0	0	0	0
67	CC	96190056	ROA FRANCO HILMER	1	0			S																	25-14	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS041	780.000	31.200	14-23	780.000	5	54.300	CCF67	780.000	31.200	0	0	0	0	0
68	CC	96190056	ROA FRANCO HILMER	1	0			S									X								25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
69	CC	96190056	ROA FRANCO HILMER	1	0			S									X								25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
70	CC	96190056	ROA FRANCO HILMER	1	0			S									X								25-14	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	0	14-23	433.334	5	0	CCF67	433.334	0	0	0	0	0	0
71	CC	60264418	RODRIGUEZ SIERRA LEIDY VANESSA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MIN002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
72	CC	74860225	HERNANDEZ GIRALDO DUIMAR JAVIER	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS041	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF67	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
73	CC	7505900	HERNANDEZ HENAO BERNARDO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF67	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
74	CC	96192995	RODRIGUEZ SALCEDO WILSON	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF67	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
75	CC	96192995	RODRIGUEZ SALCEDO WILSON	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
76	CC	96192995	RODRIGUEZ SALCEDO WILSON	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
77	CC	96193901	GOMEZ FERNANDEZ LUIS ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS041	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF67	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
78	CC	96194221	RODRIGUEZ SALCEDO ROBINSON	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF67	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
79	CC	96194221	RODRIGUEZ SALCEDO ROBINSON	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
80	CC	96194221	RODRIGUEZ SALCEDO ROBINSON	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF67	43.334	0	0	0	0	0	0
81	CC	91536077	ROPERO GOMEZ ISAIAS	1	0			S																	230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS041	1.040.000	41.600	14-23	1.040.000	5	72.400	CCF67	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
82	CC	91536077	ROPERO GOMEZ ISAIAS	1	0			S									X								230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS041	303.334	0	14-23	303.334	5	0	CCF67	303.334	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901758303-9	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		CLL 19 22 31	6017942623	auxiliargestionhumana2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	ARAUCA	ARAUCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					62	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81417273	$20.224.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
83	CC	96124422	TORRES VEGA JOSE ABEL	1	0			S	X																230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF67	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
84	CC	96126178	ZUÑIGA MANRIQUE OSCAR LEONARDO	1	0			S		X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS041	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF67	368.334	14.800	368.334	0	0	0	0
85	CC	1119180440	HERNANDEZ CAMARGO JESUS DAVID	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	3.500	14-23	86.667	5	0	CCF67	86.667	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA No 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

	DATOS DEL TRABAJADOR										AFILIACION A SGSST						
N°	NOMBRE	NIT C.C	CARGO	CENTRO DE TRABAJO	TIPO DE CARGO	SALARIO BASE	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE RETIRO	DIAS LABORADOS	EPS	ARL	C.C.F	PENSION	ESTADO	EJECUTOR	N° PLANILLA
PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
1	YESICA LUCIA SALAMANCA MUJICA	1116793656	LIDER SST	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 3.400.000,00	23/09/2024	22/10/2024		9	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	
2	YEFERSON ELIAS DUARTE NIEVES	1102720082	INGENIERO RESIDENTE	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 3.002.000,00	18/01/2024	7/10/2024		24	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	81610113
3	GINA LIDIA NIEVES TINEO	1116706838	PROFESIONAL SOCIAL	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000.00	8/27/2024	2/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
4	WILFREDO RAMIREZ RAMIREZ	1116787495	INGENIERO AMBIENTAL	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1,800,000.00	5/24/2024	25/05/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
5	ADALBERTO ALARCON OLAYA	79844309	DIRECTOR DE OBRA	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 3,350,000.00	5/06/2024	14/05/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPESIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
6	BERNARDO HERNANDEZ HENAO	7505900	MAESTRO DE OBRA	PALMARITO-CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1,300,000.00	2/28/2024	13/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
7	OLGA PIERINA CISTEROS FLOREZ	1116787329	PROFESIONAL HSEQ	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000.00	12/28/2024	9/03/2024	22/10/2024	22	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
8	LEIDY VANESSA RODRIGUEZ SIERRA	60264418	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000.00	45294	45358		31	ADRES	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
9	ALEJANDRO ROJAS GOMEZ	80233801	ESPECIALISTA EN VIAS	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000.00	2/19/2024	23/12/2023		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
10	MARLA ALESSANDRA DAVILA	1116777367	ESPECIALISTA HIDRAULICA	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 2,300,000.00	12/19/2023	22/12/2023		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
11	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ	1116782711	RESIDENTE DE OBRA	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 2,700,000.00	2/19/2024	21/12/2023		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
12	SANDRA JOHANA AMAYA PULIDIO	1102718125	PROFESIONAL HSEQ	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000.00	1/18/2024	21/12/2023		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
13	EDDIER MARIOTTA	1124386047	RESIDENTE DE OBRA	PALMARITO-CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 2,700,000.00		21/12/2023		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81560994
PERSONAL OPERATIVO - CAÑO FLORES																	
14	ANGI YOLEIDI PEROZA CALDERON	1116792186	INSPECTOR DE SST	CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1.800.000,00	3/11/2023	22/10/2024		9	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	
15	LUIS CARLOS SILVA PRADA	1116802371	CADENERO	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 2.000.000,00	5/07/2024	10/07/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
16	IVAN DARIO SIERRA JIMENEZ	1116601241	ALMACENISTA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.625.362,00	21/06/2024	24/06/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
17	RODRIGO DURAN CALVO	1098752215	CONTROLADORA VIAL	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	11/06/2024	17/06/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
18	JOSE MIGUEL ANGARITA	88271788	INSPECTOR DE OBRA	CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 2.500.000,00	5/06/2024	11/06/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
19	MARYURY DANIELA ORTEGA SUESCUN	1119181598	CONTROLADORA VIAL	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/05/2024	9/05/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
20	LAURA MAGDALENA ACEVEDO AGUILAR	1116782616	INSPECTOR SST	CAÑO FLORES	ADMINISTRATIVO	$ 1.800.000,00	2/05/2024	6/05/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
21	HERNANDO HUERFANO BAQUERO	137498994	OPERADOR MOTONIVELADORA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 4.000.000,00	16/04/2024	22/04/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	
22	RAMIRO ORLANDO VILLALBA HUERFANO	3225735	OPERADOR	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 2.257.200,00	15/04/2024	22/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	
23	JESSICA PAOLA ACEVEDO CAÑAS	1007397121	CONTROLADORA VIAL	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
24	DADEY ARNOLDO CUBIDES PEÑA	91536077	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
25	FREDY EMEL CUBIDES RIOS	1119182525	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
26	ISAIAS ROPERO GOMEZ	17570610	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
27	YERNEY ACEVEDO CAÑAS	1007325544	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024	15/10/2024	15	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
28	ENDERSON SUESCUN CAICEDO	1115722111	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
29	DUIMAR JAVIER HERNANDEZ GIRALDO	74860225	MAESTRO DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	28/02/2024	13/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
30	WILMER ALEXANDER GONZALEZ PEDRAZA	1121842709	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	28/02/2024	13/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
31	TARCISIO MIRANDA RUIDIAZ	79775680	AYUDANTE DE OBRA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	28/02/2024	13/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
32	FAYDER JOHAN BERMEJO BERMEJO	1007167591	CONDUCTOR	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 2.283.050,00	13/03/2024	18/03/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	
33	ALEXANDER PACHECO MUÑOZ	6609522	CONDUCTOR	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 1.702.587,00	7/03/2024	11/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	

	DATOS DEL TRABAJADOR										AFILIACION A SGSST						
N°	NOMBRE	NIT C.C	CARGO	CENTRO DE TRABAJO	TIPO DE CARGO	SALARIO BASE	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE RETIRO	DIAS LABORADOS	EPS	ARL	C.C.F	PENSION	ESTADO	EJECUTOR	N° PLANILLA
34	VILMO AFRANIO RUBIO GONZALEZ	19147344	TOPOGRAFO	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 3.586.990,00	1/03/2024	5/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONYCA SOLUCIONES SAS	
35	DAYRON GIOVANNY VEGA MAYORGA	1116872560	OPERADOR DE MAQUINARIA	CAÑO FLORES	OPERATIVO	$ 2.257.200,00	19/02/2024	3/05/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	LUIS CARLOS PEREZ	80570010
	PERSONAL OPERATIVO - PALMARITO																
36	CAMILO ANDRES HUNDA CAMPOS	1116805300	INSPECTOR SST	PALMARITO	ADMINISTRATIVO	$ 1.600.000,00	19/10/2024	21/10/2024		10	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
37	FERNANDO JOSE TORRES PACHECO	17591204	ALMACENISTA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.625.362,00	14/05/2024	15/10/2024		16	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
38	JESUS CABALLERO GELVES	96187716	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	8/10/2024	15/10/2024		16	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
39	FREIDER WILFRED TORRES DIAZ	1115722758	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	8/10/2024	15/10/2024		16	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
40	NICOL VANNESA ZUÑIGA	1007900760	CONTROLADORA VIAL	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	4/10/2024	7/10/2024		24	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
41	JESUS DIOMEDES CABALLERO ALVAREZ	1115743830	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	7/10/2024		24	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
42	MARIA ZENAIDA CARABALI GONZALEZ	52389038	CONTROLADORA VIAL	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	1/10/2024	3/10/2024		28	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
43	JOSE ABEL TORRES	96124422	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	3/10/2024		28	NUEVA E.P.S	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
44	YESSICA BRIYITH OSORIO LEON	1116872509	CONTROLADORA VIAL	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	24/09/2024	25/09/2024	30/10/2024	30	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
45	GUSTAVO ADRIAN PEÑA VERA	1006594349	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	19/09/2024	23/09/2024	8/10/2024	8	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
46	JHONATAN ALEXANDER PUIN	1119181657	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	20/09/2024	23/09/2024	8/10/2024	8	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
47	PEDRO DAVID AYALA NIÑO	1119181163	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	18/09/2024	23/09/2024	8/10/2024	8	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
48	LEONAR YEXI COIRAN OVIEDO	17595697	INSPECTOR DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 2.500.000,00	11/09/2024	16/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
49	MARIO ANTONIO MARTINEZ SANTAFE	1006594896	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	12/09/2024	16/09/2024	15/10/2024	15	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
50	JESUS ALBERTO HIDALGO	1116807119	OFICIAL DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.400.000,00	12/09/2024	16/09/2024	15/10/2024	15	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
51	CARLOS EDUARDO CARRILLO CABALLERO	1115733580	OFICIAL DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	12/09/2024	16/09/2024	7/10/2024	7	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
52	RAMON ALCIDES BELLO MOSQUERA	17587832	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	12/09/2024	16/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
53	JOSE FELIX GAMARRA IPUANA	1010141920	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	7/09/2024	10/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
54	JESUS DAVID HERNANDEZ CAMARGO	1119180440	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	7/09/2024	10/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
55	EMERSON BERNAL VERA	1119185578	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	7/09/2024	10/09/2024	8/10/2024	8	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
56	ANIBAL GELVIZ BASTOS	17570623	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	7/09/2024	10/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
57	JOSE ESNEYDER GUERRERO RANGEL	1119183518	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	7/09/2024	10/09/2024	8/10/2024	8	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
58	ALEXIS JAVIER FLOREZ RODRIGUEZ	1098150064	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/09/2024	9/09/2024	7/10/2024	7	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
59	JUAN GABRIEL ROMAN CASTAÑEDA	1119181471	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/09/2024	9/09/2024	7/10/2024	7	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
60	JULIO EFRAIN MERCHAN BASTO	13928578	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/09/2024	9/09/2024	15/10/2024	15	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
61	CIRO ALFONSO GALINDO SAAVEDRA	17529024	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/09/2024	9/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
62	ELIGIO CARVAJALINO	96186739	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/09/2024	9/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
63	HILMER ROA FRANCO	96190056	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	6/09/2024	9/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
64	ARNOLDO VERA VILLAMIZAR	1094242568	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	27/08/2024	2/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
65	JAIDER YESID DAZA ROMAN	1115724075	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	28/08/2024	2/09/2024	7/10/2024	7	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
66	SAMUEL HERNANDEZ PINEDA	1116498190	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	30/08/2024	2/09/2024	7/10/2024	7	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
67	MIGUEL ANGEL MERCHAN BASTO	13906862	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	27/08/2024	2/09/2024	15/10/2024	15	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
68	OSCAR LEONARDO ZUÑIGA MANRIQUE	96126178	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	27/08/2024	2/09/2024	7/10/2024	7	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
69	ROBINSON RODRIGUEZ SALCEDO	96194221	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	27/08/2024	1/09/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273

	DATOS DEL TRABAJADOR										AFILIACION A SGSST						
N°	NOMBRE	NIT C.C	CARGO	CENTRO DE TRABAJO	TIPO DE CARGO	SALARIO BASE	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	FECHA DE INGRESO A LA OBRA	FECHA DE RETIRO	DIAS LABORADOS	EPS	ARL	C.C.F	PENSION	ESTADO	EJECUTOR	N° PLANILLA
70	ANDREA GARCES REY	1095823482	AUXILIAR SST	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
71	ANGIE YULIETH ROJAS CONTRERAS	1116493180	CONTROLADORA VIAL	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	31/07/2024	5/08/2024	30/10/2024	30	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
72	KELLY NATALIA HERNANDEZ CAMARGO	1119181188	CONTROLADORA VIAL	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	26/06/2024	4/07/2024	3/10/2024	3	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
73	LUZ ANDREA MARTINEZ NIETO	1115723899	CONTROLADORA VIAL	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	26/06/2024	3/07/2024	2/10/2024	2	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	RETIRADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
74	LUIS ALEXANDER GOMEZ	96193901	TOPOGRAFO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 2.500.000,00	9/05/2024	10/05/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
75	CARLOS ARNOLDO JIMENEZ MENDEZ	17591625	CONDUCTOR	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.729.587,00	1/05/2024	3/05/2024		31	NUEVA EPS	SURA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	LUIS CARLOS PEREZ	80570010
76	WILSON RODRIGUEZ SALCEDO	96192995	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	9/04/2024	10/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
77	DUMAR VILLARAGA ARCHILA	1119182031	AYUDANTE DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	8/04/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
78	JUAN DAVID ROJAS BENITEZ	1119180729	CADENERO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	3/04/2024	3/04/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
79	ELICEO PABON VILLAMIZAR	17570742	CADENERO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/04/2024	3/04/2024		31	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
80	SEGUNDO FLORENCIO CORTES RIALPE	12906422	OFICIAL DE OBRA	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	28/02/2024	13/03/2024		31	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	COLPENSIONES	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81417273
81	FREDY ALEXANDER ROSO BERNAL	96195495	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	17/10/2024		14	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
82	DEDERLEY TOBON PALACIO	13860508	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
83	DEIFER YESID REY GUERRERO	1115742458	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
84	JHON EDINSON ALVAREZ	1115724774	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
85	JHONATAN ALEXANDER ARDILA VELANDIA	1116780822	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	COOPSALUD	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
86	JOEL ANTONIO PEÑALOZA ALVARADO	1002353455	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
87	RAMIRO JOYA BARRERA	13350702	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	SANITAS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477
88	SAUL ANTONIO RANGEL BAYONA	1116774660	PERSONAL DE ASFALTO	PALMARITO	OPERATIVO	$ 1.300.000,00	2/10/2024	3/10/2024		28	NUEVA EPS	POSITIVA	COMFIAR	PORVENIR	ACTIVO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	81442477

ANEXO D

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VIAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	600 DE 2023	Transporte					
		Infraestrutura red vial regional		080 - CONVENIOS	CONTRATO PRINCPICAL	$ 23.137.768.645	$ -
2024	596 de 2024	Transporte					
		Infraestrutura red vial regional		080 - CONVENIOS	CONTRATO ADICIONAL No. 01	$ 4.895.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 28.032.768.645,10**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	parcial	2024			$ 6.451.980.286,41	$ 3.225.990.143,21	$ 3.225.990.143,20	$ 8.342.894.156,80							PAGADA
2	parcial	2024			$ 3.928.517.820	$ 1.964.258.910,10	$ 1.964.258.910,09	$ 6.378.635.246,70	15/09/2024						EN PROCESO DE COBRO
3	parcial	2024			$ 5.031.893.468	$ 2.515.946.734,03	$ 2.515.946.734,02	$ 3.862.688.512,67	31/10/2024						EN REVISIÓN
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

OBSERVACIONES: Para el período del presente informe No se presentaron actas parciales por parte del contrato de obra

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

El acta parcial 2 se encuntra en proceso para pago con la unidad ejecutora. El acta parcial 3 se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Firma

Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma

Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO E

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	23	22	22	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	736
Lluvias moderadas		1																														1
Lluvias intensas			2	2					2														1									7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

EN HORAS LABORALES SE HAN PRESENTADO ALGUNAS LLUVIAS MODERADAS DURANTE ESTE PERIODO, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTÓ LOS TRABAJOS DE CAMPO.

Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	23	22	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	22	24	24	23	24	24	24	24	24	732
Lluvias moderadas			1	1	2				2											1			1			1						9
Lluvias intensas									2														1									3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

EN HORAS LABORALES SE HAN PRESENTADO ALGUNAS LLUVIAS MODERADAS DURANTE ESTE PERIODO, SIN EMBARGO ESTO NO AFECTÓ LOS TRABAJOS DE CAMPO.

Firma
Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Firma
Nombre: Esneider Fuentes Zárate
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105731 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS DESCARGADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) MES DE OCTUBRE 2024

ESTACIÓN CERCANA AL APROYECTO

CodigoEstacion	NombreEstacion	Categoria	Entidad	Departament	Municipio	IdParametro	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/10/2024 0:00	1
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2024 0:00	54.5
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2024 0:00	8.5
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2024 0:00	65.5
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2024 0:00	13.8
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2024 0:00	21.4
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2024 0:00	23.2
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2024 0:00	0
36030030	MORICHAL [36030030]	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Arauca	Tame	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2024 0:00	0

ANEXO F

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAL RURAL FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
1	3/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+065 - K0+430 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	12977	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,11	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,4	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,19	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,7	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
2	3/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+065 - K0+430 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13210	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,15	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	5,7	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	20	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,2	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	70	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
3	4/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+040 - K0+420 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13828	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,15	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,5	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,41	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,77	SI	

4	5/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+320 - K0+725 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13089	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,14	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,1	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,18	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,78	SI	
5	5/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+420 - K0+725 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	12205	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	3,79	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
6	7/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+725 - k0+960 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	12205	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	3,79	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,69	Si/ No	Presentó un % Límite de la tolerancia
7	7/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+725 - k0+960 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13893	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,44	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,1	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,04	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,8	SI	
8	8/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+440 - k0+695 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	14018	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,22	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,35	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	

						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,73	SI	
9	8/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+440 - k0+695 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13914	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,13	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,45	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,71	SI	
10	9/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k0+695 - k1+020 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13284	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,13	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,72	SI	
11	10/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+020 -k1+345 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13094	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,03	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,33	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,77	SI	
12	11/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+050 -k1+350 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13713	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,04	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,51	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,74	SI	
13	12/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+350 - k1+620 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13894	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,07	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,7	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,53	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	69	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,75	SI	

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1	3/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k0+100 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	12540	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,1	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	5,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	18,44	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,53	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	69	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,74	SI	
	22/10/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR2+510-DER	1	≥ 95%		98,00%	SI	
	22/10/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR2+600-EJE	1	≥ 95%		98,80%	SI	
	22/10/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR2+740-IZQ	1	≥ 95%		99,00%	SI	
	22/10/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR2+850-DER	1	≥ 95%		98,20%	SI	
	22/10/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR2+990-IZQ	1	≥ 95%		98,30%	SI	
	22/10/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR3+100-EJE	1	≥ 95%		98,40%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+100-EJE	1	≥ 95%		98,40%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+210-DER	1	≥ 95%		98,70%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+320-IZQ	1	≥ 95%		98,00%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+422-EJE	1	≥ 95%		98,20%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+532-DER	1	≥ 95%		98,60%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Palmarito / PR3+620-IZQ	1	≥ 95%		98,40%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

SOLICITANTE

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MEZCLA ASFALTICA

MDC-19

TRAMO

PR0+000 AL PR1+620 M. IZQ

PR0+000 AL PR1+345 M. DER

OCTUBRE DE 2024

ARAUCA/ARAUCA

INFORME DE LABORATORIO

2024-10-01 AL 2024-10-12

MEZCLA ASFALTICA MDC-19

Material 1 (M1)	Triturado 3/4” retiene No 4, Procedente de Cantera Alfonso Sarmiento.
Material 2 (M2)	Triturado 3/8” retiene No 4, Procedente de Cantera Alfonso Sarmiento.
Material 3 (M3)	Arena pasa No 4, Procedente de Cantera Alfonso Sarmiento.
Cemento asfaltico	60/70 Normalizado

ENSAYOS DE LABORATORIO

PR0+000 AL PR1+620 M. IZQ

PR0+000 AL PR1+345 M. DER


EXTRACCION DE ASFALTO

GRANULOMETRIA

ESTABILIDAD Y FLUJO

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+065 AL Pr0+430 M. Derecha	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-03
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

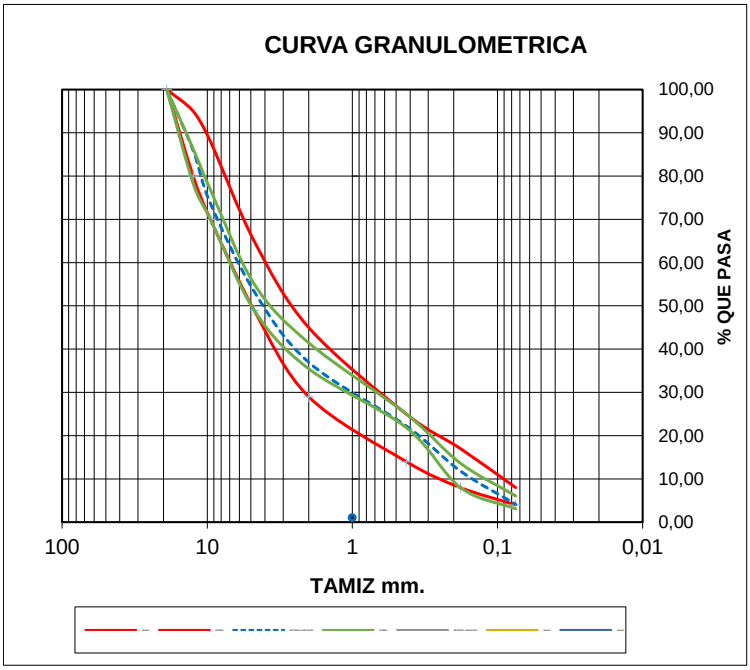

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1439,0		
	Peso retenido tamiz No.200:			1379,3		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	202,5	14,07	14,07	85,93	80,00	95,00
3/8"	176,3	12,25	26,32	73,68	70,00	88,00
No.4	292,6	20,33	46,66	53,34	49,00	65,00
No.10	235,5	16,37	63,02	36,98	29,00	45,00
No.40	212,2	14,75	77,77	22,23	14,00	25,00
No.80	150,0	10,42	88,19	11,81	8,00	17,00
No. 200	110,2	7,66	95,85	4,15	4,00	8,00
FONDO	59,7	4,15	100,00	0,00		
	1439,0	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1527,0	Peso Inicial gr	20,2	150
Peso final gr	1439,0	Peso final gr	20,4	
Diferencia gr	88,0	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,76**			

BRIQUETA NUMERO	1	2	3	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	66,4	68,0	66,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1210,0	1196,0	1166,0			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1214,0	1202,0	1169,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	678,2	667,0	650,2	665,1		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	535,8	535,0	518,8			
Peso especifico aparente	2,258	2,236	2,247	2,247		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,94	0,90	0,94			
Estabilidad medida N.	14490	13270	14220			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13621	11943	13367	12977	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,24	2,88	3,11	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,0	4,9	4,4	4,4	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,3	3,7	4,6	4,19	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	67	69	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,76
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+065 AL Pr0+430 M. Derecha	**VIAJE No**	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-03
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

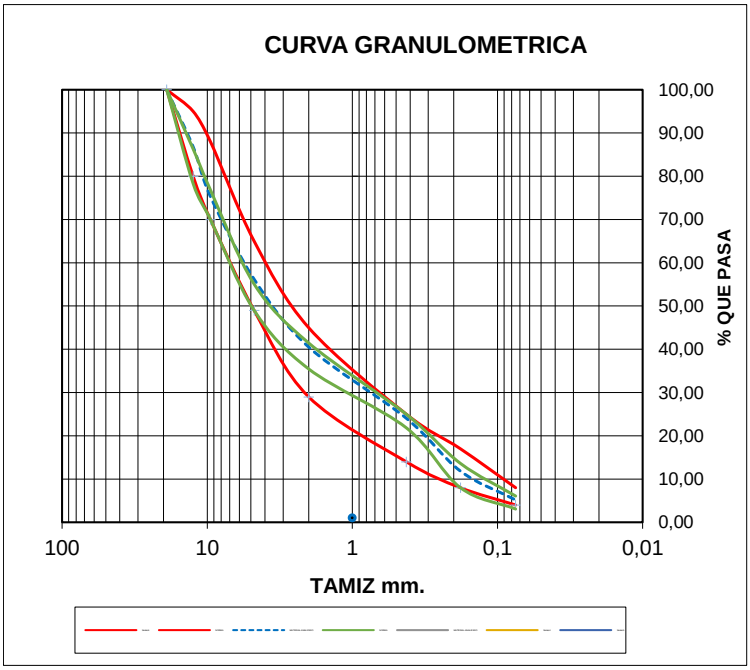

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1533,3
Peso retenido tamiz No.200:	1454,0

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	202,5	13,21	13,21	86,79	80,00	95,00
3/8"	176,2	11,49	24,70	75,30	70,00	88,00
No.4	293,1	19,12	43,81	56,19	49,00	65,00
No.10	240,2	15,67	59,48	40,52	29,00	45,00
No.40	252,3	16,45	75,93	24,07	14,00	25,00
No.80	187,4	12,22	88,16	11,84	8,00	17,00
No. 200	102,3	6,67	94,83	5,17	4,00	8,00
FONDO	79,3	5,17	100,00	0,00		
	1533,3	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1627,1	Peso Inicial gr	20,3	**150**
Peso final gr	1533,3	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	93,8	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,76**			

BRIQUETA NUMERO	**4**	**5**	**6**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	66,0	65,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1230,0	1215,0	1225,0			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1238,0	1225,0	1226,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	682,2	678,0	674,0	678,1		**% asf.** 5,76
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	555,8	547,0	552,0			**Gmm** 2,352
Peso especifico aparente	2,213	2,221	2,219	2,218		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,94	0,96	0,96			
Estabilidad medida N.	13205	14250	14100			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	12413	13680	13536	13210	9000	SI
Flujo en mm.	3,12	3,08	3,25	3,15	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	5,9	5,5	5,6	5,7	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	20	20	20	20	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,0	4,4	4,2	4,19	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	70	70	70	70	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+040 AL Pr0+420 M. Izquierda	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-04
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

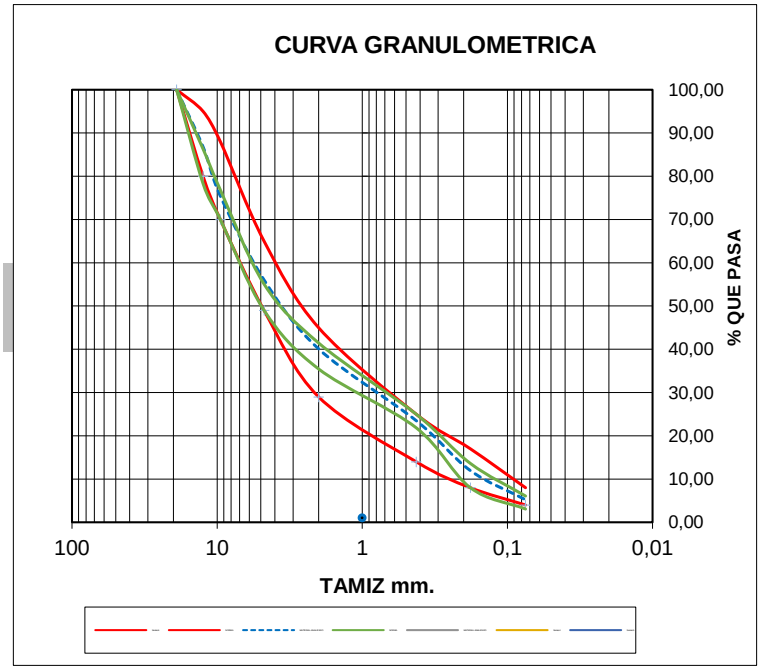

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1531,2
Peso retenido tamiz No.200:	1451,2

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	202,3	13,21	13,21	86,79	80,00	95,00
3/8"	174,2	11,38	24,59	75,41	70,00	88,00
No.4	296,8	19,38	43,97	56,03	49,00	65,00
No.10	243,9	15,93	59,90	40,10	29,00	45,00
No.40	254,1	16,59	76,50	23,50	14,00	25,00
No.80	176,7	11,54	88,04	11,96	8,00	17,00
No. 200	103,2	6,74	94,78	5,22	4,00	8,00
FONDO	80,0	5,22	100,00	0,00		
	1531,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1623,4	Peso Inicial gr	20,4	**150**
Peso final gr	1531,2	Peso final gr	20,6	
Diferencia gr	92,2	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,68**			

BRIQUETA NUMERO	**7**	**8**	**9**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	63,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1214,3	1205,8	1215,3			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1215,7	1207,3	1217,3			
Peso de la briqueta en el agua grs.	678,0	673,3	678,9	676,7		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,7	534,0	538,4			
Peso especifico aparente	2,258	2,258	2,257	2,258		
Peso especifico max. Medido	2,354	2,354	2,354	2,354		
Factor de Correlación	0,96	1,01	0,96			
Estabilidad medida N.	13250	12041	13389			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	12720	12161	12853	12578	9000	SI
Flujo en mm.	3,14	3,30	3,28	3,24	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,1	4,1	4,1	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	18	18	18	18	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,1	3,7	3,9	3,88	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,68
Gmm	2,354


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+040 AL Pr0+420 M. Izquierda	**VIAJE No**	8
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-04
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

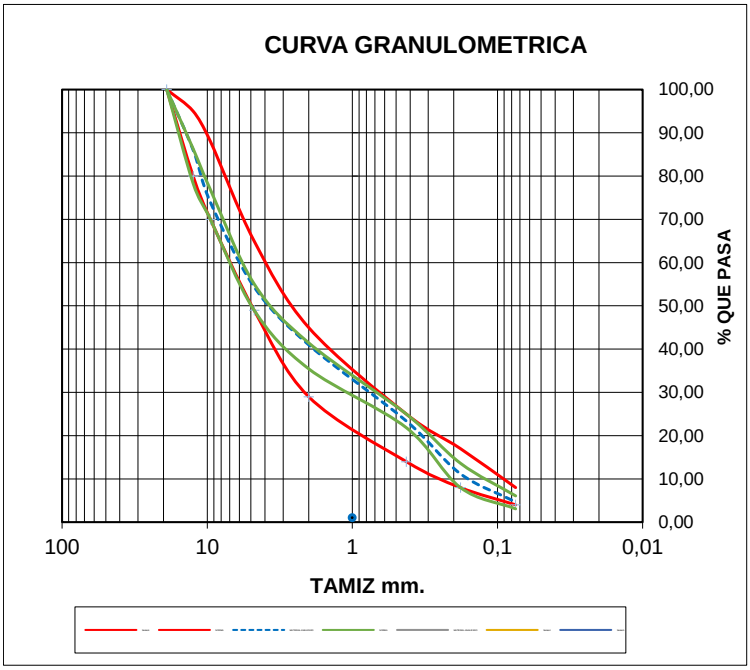

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1427,3		
	Peso retenido tamiz No.200:			1360,5		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	199,4	13,97	13,97	86,03	80,00	95,00
3/8"	172,6	12,09	26,06	73,94	70,00	88,00
No.4	279,1	19,55	45,62	54,38	49,00	65,00
No.10	191,1	13,39	59,01	40,99	29,00	45,00
No.40	251,3	17,61	76,61	23,39	14,00	25,00
No.80	174,2	12,20	88,82	11,18	8,00	17,00
No. 200	92,8	6,50	95,32	4,68	4,00	8,00
FONDO	66,8	4,68	100,00	0,00		
	1427,3	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1514,7	Peso Inicial gr	20,2	**150**
Peso final gr	1427,3	Peso final gr	20,4	
Diferencia gr	87,4	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,77**			

BRIQUETA NUMERO	**10**	**11**	**12**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	67,0	64,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1207,2	1212,7	1203,3			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1209,3	1215,4	1205,8			
Peso de la briqueta en el agua grs.	672,2	674,5	671,1	672,6		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,1	540,9	534,7			
Peso especifico aparente	2,248	2,242	2,250	2,247		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,96	0,92	0,99			
Estabilidad medida N.	13504	15594	14316			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12964	14346	14173	13828	9000	SI
Flujo en mm.	3,29	3,14	3,01	3,15	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,4	4,7	4,3	4,5	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,6	4,7	4,41	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,77
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+420 AL Pr0+725 M. Izquierda	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-05
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

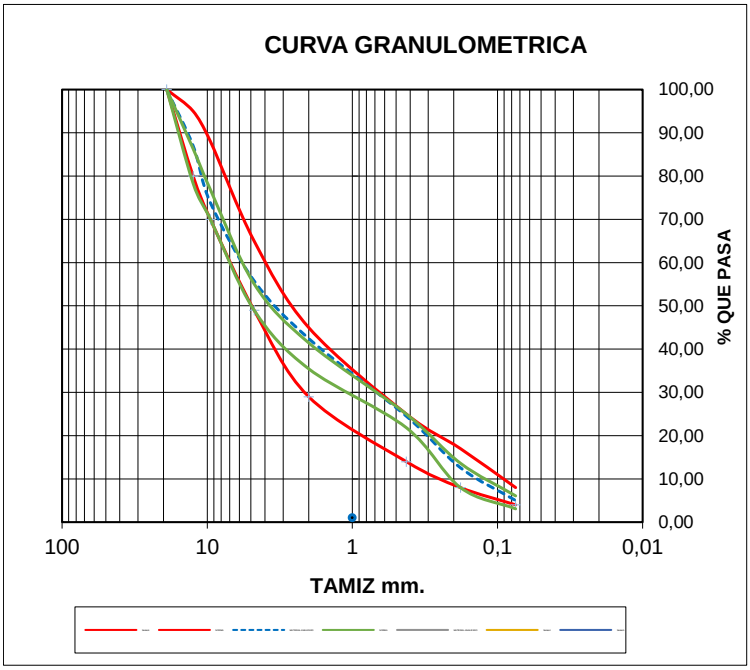

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1531,2		
	Peso retenido tamiz No.200:			1454,4		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	199,4	13,02	13,02	86,98	80,00	95,00
3/8"	201,5	13,16	26,18	73,82	70,00	88,00
No.4	276,2	18,04	44,22	55,78	49,00	65,00
No.10	203,9	13,32	57,54	42,46	29,00	45,00
No.40	274,9	17,95	75,49	24,51	14,00	25,00
No.80	182,6	11,93	87,42	12,58	8,00	17,00
No. 200	115,9	7,57	94,98	5,02	4,00	8,00
FONDO	76,8	5,02	100,00	0,00		
	1531,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1625,1	Peso Inicial gr	20,5	150
Peso final gr	1531,2	Peso final gr	20,7	
Diferencia gr	93,9	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,78**			

BRIQUETA NUMERO	13	14	15	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	63,0	64,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1203,4	1197,4	1201,9			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1205,9	1201,8	1206,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	672,2	669,8	673,2	671,7		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	533,7	532,0	532,8			
Peso especifico aparente	2,255	2,251	2,256	2,254		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,96	1,01	0,99			
Estabilidad medida N.	12398	13578	13789			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	11902	13714	13651	13089	9000	SI
Flujo en mm.	3,30	3,08	3,05	3,14	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,3	4,1	4,1	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,6	4,5	4,5	4,18	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,78
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+420 AL Pr0+725 M. Izquierda	**VIAJE No**	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-05
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

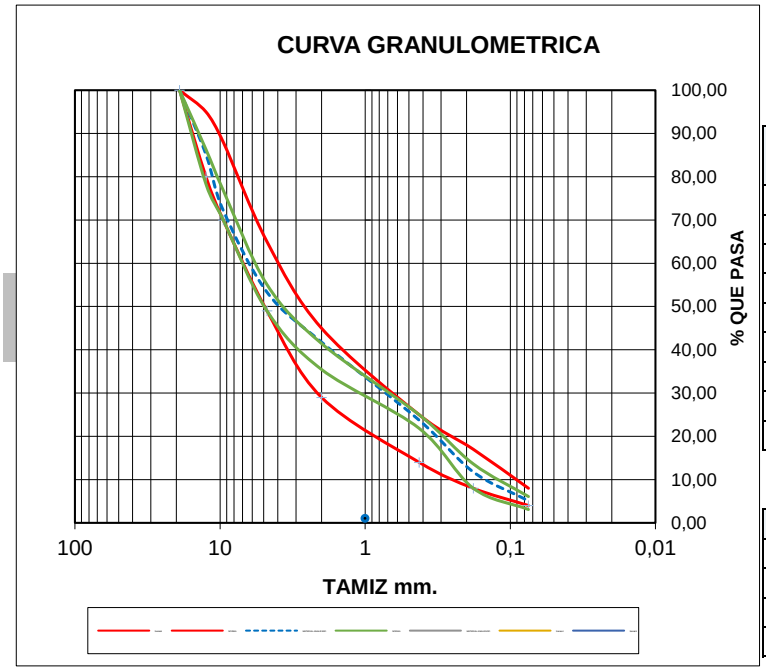

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1491,1
Peso retenido tamiz No.200:	1415,1

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19 INF.	NORMA MDC-19 SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	221,7	14,87	14,87	85,13	80,00	95,00
3/8"	192,8	12,93	27,80	72,20	70,00	88,00
No.4	281,5	18,88	46,68	53,32	49,00	65,00
No.10	172,2	11,55	58,23	41,77	29,00	45,00
No.40	268,9	18,03	76,26	23,74	14,00	25,00
No.80	178,6	11,98	88,24	11,76	8,00	17,00
No. 200	99,4	6,67	94,90	5,10	4,00	8,00
FONDO	76,0	5,10	100,00	0,00		
	1491,1	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1582,2	Peso Inicial gr	20,3	**150**
Peso final gr	1491,1	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	91,1	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,76**			

BRIQUETA NUMERO	**16**	**17**	**18**	**PROM.**	**NORMA**	**CUMPLE**
Espesor de la briqueta mm.	65,0	68,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1209,1	1209,0	1206,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,5	1210,2	1207,6			
Peso de la briqueta en el agua grs.	675,5	672,2	672,2	673,3		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	536,0	538,0	535,4			
Peso especifico aparente	2,256	2,247	2,253	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,90	0,96			
Estabilidad medida N.	13130	12930	12890			
Estabilidad corregida N.	12605	11637	12374	12205	9000	SI
Flujo en mm.	3,25	2,89	3,56	3,23	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,4	4,2	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,0	3,5	3,79	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,76
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+725 AL Pr0+960 M. Izquierda.	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-07
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

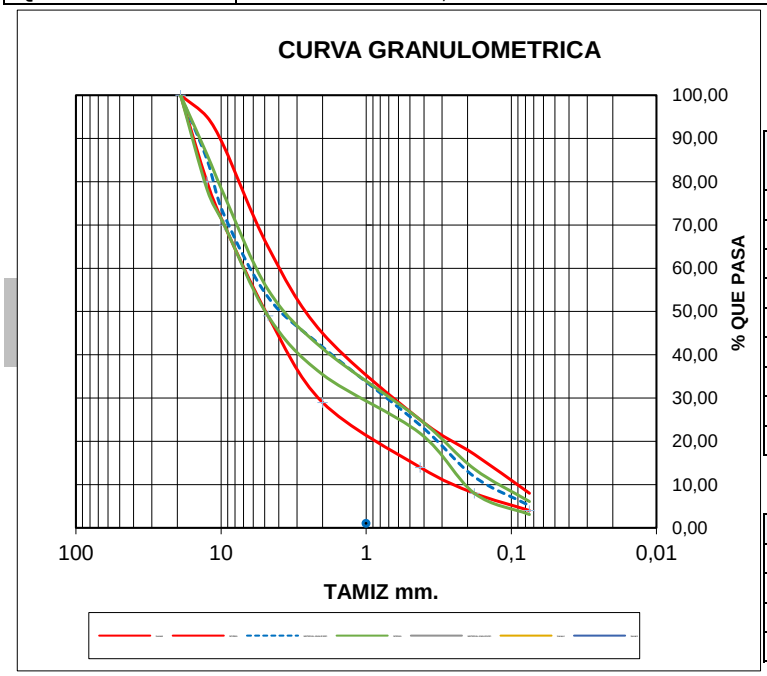

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1492,2
Peso retenido tamiz No.200:	1415,6

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	221,7	14,86	14,86	85,14	80,00	95,00
3/8"	192,8	12,92	27,78	72,22	70,00	88,00
No.4	281,7	18,88	46,66	53,34	49,00	65,00
No.10	172,0	11,53	58,18	41,82	29,00	45,00
No.40	269,8	18,08	76,26	23,74	14,00	25,00
No.80	177,8	11,92	88,18	11,82	8,00	17,00
No. 200	99,8	6,69	94,87	5,13	4,00	8,00
FONDO	76,6	5,13	100,00	0,00		
	1492,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1582,3	Peso Inicial gr	20,3	**150**
Peso final gr	1492,2	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	90,1	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	**5,69**			

BRIQUETA NUMERO	**16**	**17**	**18**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	68,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1209,1	1209,0	1206,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,5	1210,2	1207,6			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,2	672,2	673,8	673,4		**% asf.** 5,69
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,3	538,0	533,8			**Gmm** 2,354
Peso especifico aparente	2,250	2,247	2,259	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,354	2,354	2,354	2,354		
Factor de Correlación	0,96	0,90	0,96			
Estabilidad medida N.	13130	12930	12890			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	12605	11637	12374	12205	9000	SI
Flujo en mm.	3,25	2,89	3,56	3,23	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,4	4,5	4,0	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	18	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,0	3,5	3,79	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+725 AL Pr0+960 M. Izquierda.	**VIAJE No**	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-07
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

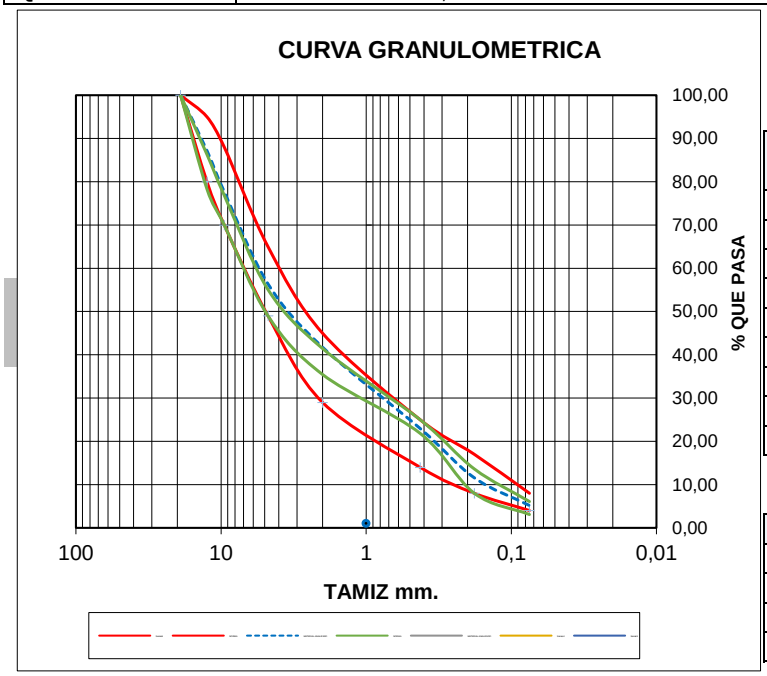

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	2079,1
Peso retenido tamiz No.200:	1971,7

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	266,5	12,82	12,82	87,18	80,00	95,00
3/8"	197,8	9,51	22,33	77,67	70,00	88,00
No.4	442,3	21,27	43,61	56,39	49,00	65,00
No.10	304,3	14,64	58,24	41,76	29,00	45,00
No.40	390,5	18,78	77,02	22,98	14,00	25,00
No.80	237,1	11,40	88,43	11,57	8,00	17,00
No. 200	133,2	6,41	94,83	5,17	4,00	8,00
FONDO	107,4	5,17	100,00	0,00		
	2079,1	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	2207,0	Peso Inicial gr	20,5	150
Peso final gr	2079,1	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	127,9	Diferencia (gr)	0,6	
% Asfalto	**5,80**			

BRIQUETA NUMERO	19	20	21	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	64,2	63,8	64,2			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1210,4	1202,5	1204,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,8	1203,8	1206,1			
Peso de la briqueta en el agua grs.	675,5	670,2	671,8	672,5		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	536,3	533,6	534,3			
Peso especifico aparente	2,257	2,254	2,255	2,255		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,98	0,99	0,98			
Estabilidad medida N.	14205	14177	14003			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13921	14035	13723	13893	9000	SI
Flujo en mm.	3,47	3,41	3,44	3,44	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,0	4,1	4,1	4,1	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,0	4,1	4,0	4,04	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	67	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,80
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+440 AL Pr0+695 M. Derecha.	**VIAJE No**	3
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-08
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

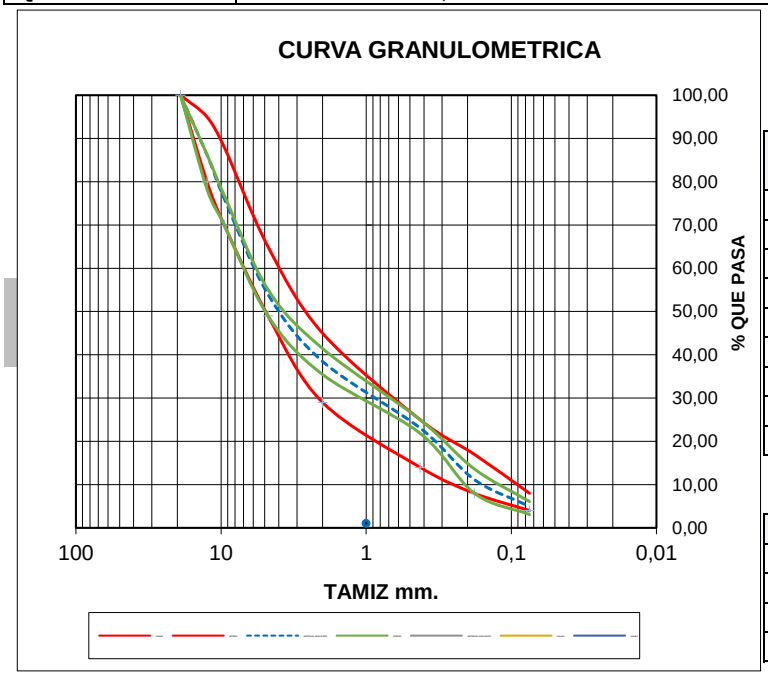

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	2020,7
Peso retenido tamiz No.200:	1920,5

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19 INF.	NORMA MDC-19 SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	277,9	13,75	13,75	86,25	80,00	95,00
3/8"	205,1	10,15	23,90	76,10	70,00	88,00
No.4	447,0	22,12	46,02	53,98	49,00	65,00
No.10	313,2	15,50	61,52	38,48	29,00	45,00
No.40	311,4	15,41	76,93	23,07	14,00	25,00
No.80	240,4	11,90	88,83	11,17	8,00	17,00
No. 200	125,5	6,21	95,04	4,96	4,00	8,00
FONDO	100,2	4,96	100,00	0,00		
	2020,7	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	2143,6	Peso Inicial gr	20,4	**150**
Peso final gr	2020,7	Peso final gr	21,3	
Diferencia gr	122,9	Diferencia (gr)	0,9	
% Asfalto	**5,73**			

BRIQUETA NUMERO	**22**	**23**	**24**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	63,7	62,4	63,1			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1214,5	1199,6	1211,6			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1215,7	1201,8	1212,8			
Peso de la briqueta en el agua grs.	677,4	670,2	672,2	673,3		**% asf.** 5,73
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	538,3	531,6	540,6			**Gmm** 2,352
Peso especifico aparente	2,256	2,257	2,241	2,251		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	1,00	1,03	1,01			
Estabilidad medida N.	13987	14256	13250			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13987	14684	13383	14018	9000	SI
Flujo en mm.	3,24	3,18	3,25	3,22	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,1	4,7	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,3	4,6	4,1	4,35	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	69	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+440 AL Pr0+695 M. Derecha.	**VIAJE No**	3
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-08
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

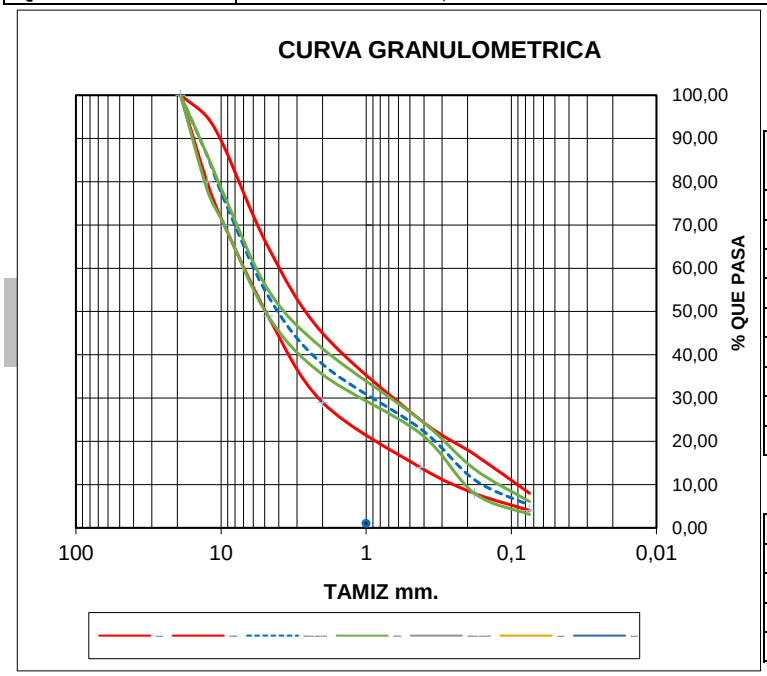

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	2049,2
Peso retenido tamiz No.200:	1942,9

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	284,1	13,86	13,86	86,14	80,00	95,00
3/8"	212,3	10,36	24,22	75,78	70,00	88,00
No.4	453,3	22,12	46,34	53,66	49,00	65,00
No.10	324,0	15,81	62,16	37,84	29,00	45,00
No.40	305,0	14,88	77,04	22,96	14,00	25,00
No.80	242,2	11,82	88,86	11,14	8,00	17,00
No. 200	122,0	5,95	94,81	5,19	4,00	8,00
FONDO	106,3	5,19	100,00	0,00		
	2049,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	2173,3	Peso Inicial gr	20,3	**150**
Peso final gr	2049,2	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	124,1	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	**5,71**			

BRIQUETA NUMERO	**25**	**26**	**27**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	64,0	63,9	62,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1218,7	1215,5	1199,3			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1219,6	1217,5	1221,1			
Peso de la briqueta en el agua grs.	678,4	674,4	692,2	681,7		**% asf.** 5,71
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	541,2	543,1	528,9			**Gmm** 2,353
Peso especifico aparente	2,252	2,238	2,268	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,353	2,353	2,353	2,353		
Factor de Correlación	0,99	0,99	1,04			
Estabilidad medida N.	13987	14256	13250			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13847	14113	13780	13914	9000	SI
Flujo en mm.	3,14	3,05	3,19	3,13	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,3	4,9	3,6	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	18	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,6	4,3	4,45	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	69	67	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+690 AL Pr1+020 M. Derecha	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-09
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

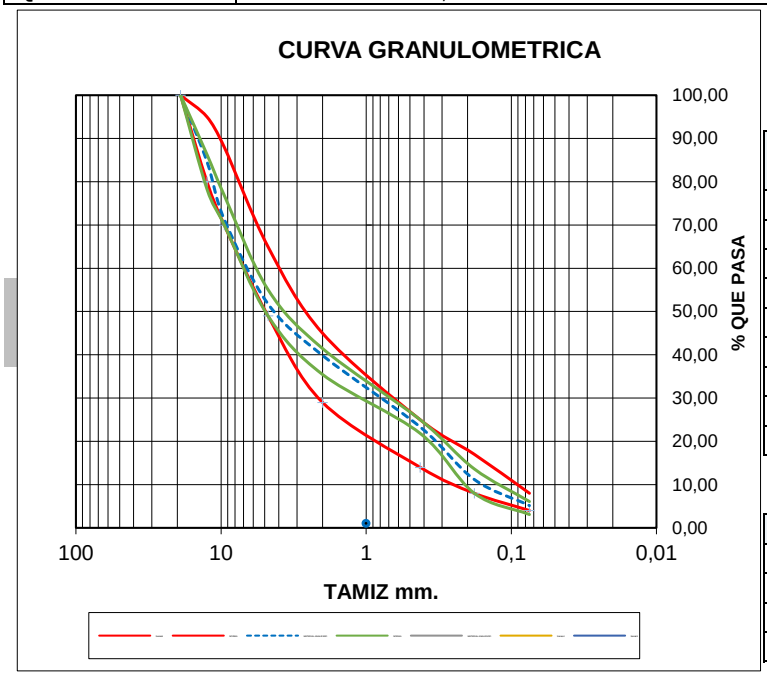

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1342,6
Peso retenido tamiz No.200:	1273,5

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	206,0	15,34	15,34	84,66	80,00	95,00
3/8"	179,5	13,37	28,71	71,29	70,00	88,00
No.4	261,9	19,51	48,22	51,78	49,00	65,00
No.10	160,0	11,92	60,14	39,86	29,00	45,00
No.40	222,0	16,54	76,67	23,33	14,00	25,00
No.80	163,0	12,14	88,81	11,19	8,00	17,00
No. 200	81,1	6,04	94,85	5,15	4,00	8,00
FONDO	69,1	5,15	100,00	0,00		
	1342,6	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1424,1	Peso Inicial gr	20	**150**
Peso final gr	1342,6	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	81,5	Diferencia (gr)	0,5	
% Asfalto	**5,72**			

BRIQUETA NUMERO	**19**	**20**	**21**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	67,0	64,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1205,1	1200,0	1210,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1208,3	1201,4	1211,8			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,2	668,9	672,2	671,8		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	534,1	532,5	539,6			
Peso especifico aparente	2,256	2,254	2,243	2,251		
Peso especifico max. Medido	2,353	2,353	2,353	2,353		
Factor de Correlación	0,92	0,99	0,96			
Estabilidad medida N.	14205	13259	14225			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13069	13126	13656	13284	9000	SI
Flujo en mm.	3,25	2,89	3,56	3,23	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,2	4,7	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,0	4,5	3,8	4,13	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	69	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,72
Gmm	2,353


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+690 AL Pr1+020 M. Derecha	**VIAJE No**	8
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-09
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

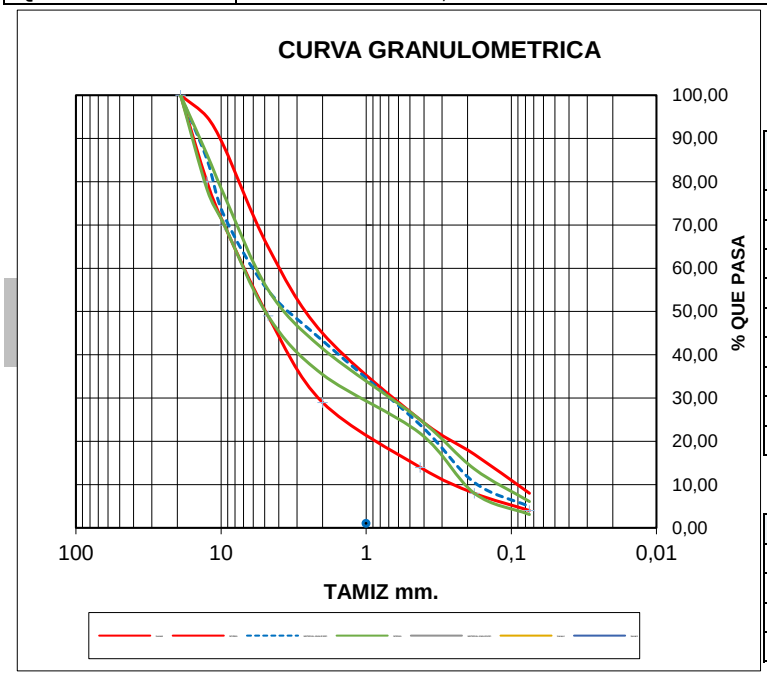

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1433,8
Peso retenido tamiz No.200:	1363,3

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	212,7	14,83	14,83	85,17	80,00	95,00
3/8"	187,9	13,11	27,94	72,06	70,00	88,00
No.4	246,0	17,16	45,10	54,90	49,00	65,00
No.10	166,7	11,63	56,72	43,28	29,00	45,00
No.40	279,0	19,46	76,18	23,82	14,00	25,00
No.80	191,0	13,32	89,50	10,50	8,00	17,00
No. 200	80,0	5,58	95,08	4,92	4,00	8,00
FONDO	70,5	4,92	100,00	0,00		
	1433,8	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1521,1	Peso Inicial gr	20	**150**
Peso final gr	1433,8	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	87,3	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	**5,74**			

BRIQUETA NUMERO	**22**	**23**	**24**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	64,0	62,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1212,4	1205,1	1204,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1219,1	1207,6	1206,2			
Peso de la briqueta en el agua grs.	681,9	673,0	671,1	675,3		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,2	534,6	535,1			
Peso especifico aparente	2,257	2,254	2,251	2,254		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,99	1,04			
Estabilidad medida N.	14250	13987	12980			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13680	13847	13499	13675	9000	SI
Flujo en mm.	3,11	3,04	3,11	3,09	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,2	4,3	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,6	4,3	4,43	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,74
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+020 AL Pr1+345 M. Derecha	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-10
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

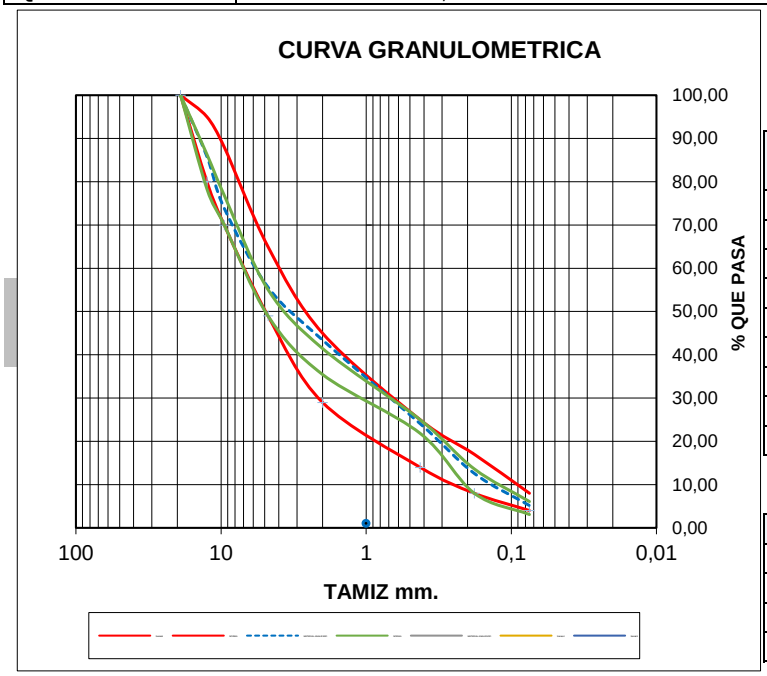

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1416,9
Peso retenido tamiz No.200:	1343,9

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	201,2	14,20	14,20	85,80	80,00	95,00
3/8"	169,3	11,95	26,15	73,85	70,00	88,00
No.4	258,0	18,21	44,36	55,64	49,00	65,00
No.10	173,0	12,21	56,57	43,43	29,00	45,00
No.40	274,1	19,35	75,91	24,09	14,00	25,00
No.80	163,0	11,50	87,42	12,58	8,00	17,00
No. 200	105,3	7,43	94,85	5,15	4,00	8,00
FONDO	73,0	5,15	100,00	0,00		
	1416,9	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1503,7	Peso Inicial gr	20	**150**
Peso final gr	1416,9	Peso final gr	21,2	
Diferencia gr	86,8	Diferencia (gr)	1,2	
% Asfalto	**5,77**			

BRIQUETA NUMERO	**25**	**26**	**27**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	66,0	65,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1209,4	1205,3	1208,4			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,3	1208,3	1210,9			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,2	673,2	674,2	673,9		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,1	535,1	536,7			
Peso especifico aparente	2,252	2,252	2,252	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,94	0,96	0,96			
Estabilidad medida N.	14250	13987	12980			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13395	13428	12461	13094	9000	SI
Flujo en mm.	3,04	3,08	2,96	3,03	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,2	4,2	4,2	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,4	4,2	4,33	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,77
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+020 AL Pr1+345 M. Derecha	**VIAJE No**	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-10
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

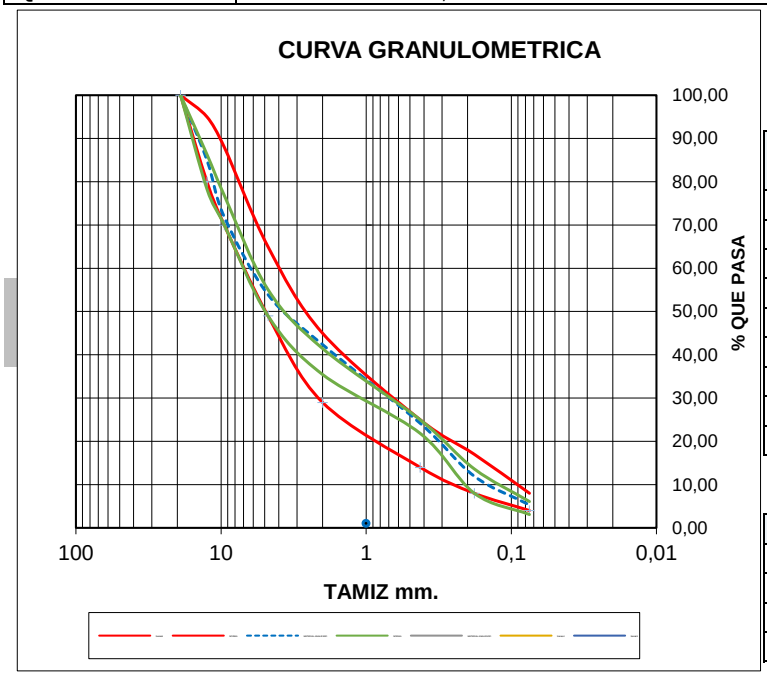

GRADACION No.2

Peso inicial muestra:	1491,2
Peso retenido tamiz No.200:	1412,1

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19 INF.	NORMA MDC-19 SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	224,0	15,02	15,02	84,98	80,00	95,00
3/8"	195,7	13,12	28,15	71,85	70,00	88,00
No.4	267,4	17,93	46,08	53,92	49,00	65,00
No.10	172,3	11,55	57,63	42,37	29,00	45,00
No.40	271,1	18,18	75,81	24,19	14,00	25,00
No.80	182,7	12,25	88,06	11,94	8,00	17,00
No. 200	98,9	6,63	94,70	5,30	4,00	8,00
FONDO	79,1	5,30	100,00	0,00		
	1491,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1582,2	Peso Inicial gr	20	**150**
Peso final gr	1491,2	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	91,0	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	**5,75**			

BRIQUETA NUMERO	**28**	**29**	**30**	**PROM.**	**NORMA**	**CUMPLE**
Espesor de la briqueta mm.	65,0	64,0	63,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1202,1	1201,3	1197,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1203,8	1203,5	1200,2			
Peso de la briqueta en el agua grs.	670,0	669,2	668,9	669,4		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	533,8	534,3	531,3			
Peso especifico aparente	2,252	2,248	2,253	2,251		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,99	1,01			
Estabilidad medida N.	13025	14002	13689			
Estabilidad corregida N.	12504	13862	13826	13397	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,04	2,88	3,04	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,2	4,4	4,2	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,6	4,8	4,42	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,75
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+050 AL Pr1+350 M. Izquierda	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-11
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

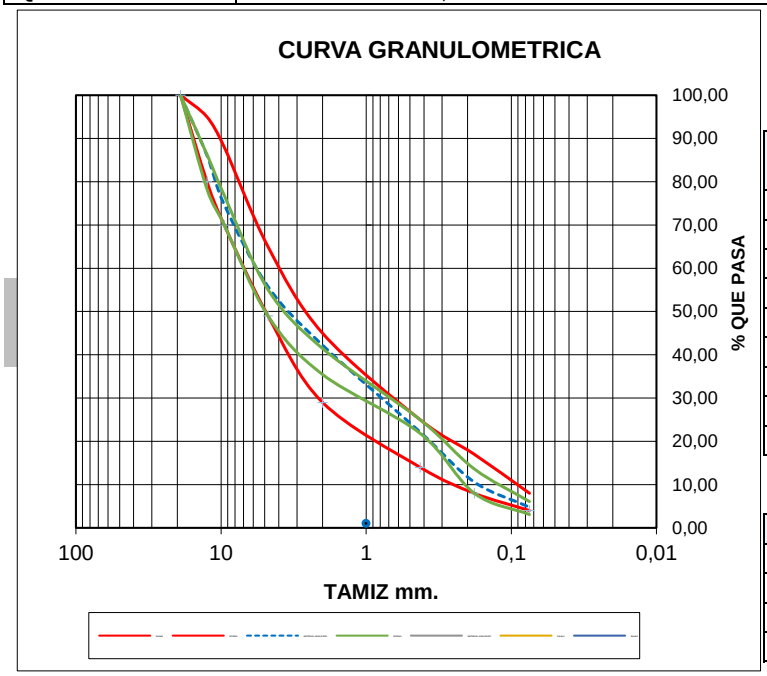

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1661,2
Peso retenido tamiz No.200:	1581,8

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19 INF.	NORMA MDC-19 SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	231,0	13,91	13,91	86,09	80,00	95,00
3/8"	189,3	11,40	25,30	74,70	70,00	88,00
No.4	314,2	18,91	44,22	55,78	49,00	65,00
No.10	225,1	13,55	57,77	42,23	29,00	45,00
No.40	333,6	20,08	77,85	22,15	14,00	25,00
No.80	192,1	11,56	89,41	10,59	8,00	17,00
No. 200	96,5	5,81	95,22	4,78	4,00	8,00
FONDO	79,4	4,78	100,00	0,00		
	1661,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1762,3	Peso Inicial gr	20	**150**
Peso final gr	1661,2	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	101,1	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	**5,74**			

BRIQUETA NUMERO	**31**	**32**	**33**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	64,0	63,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1204,7	1202,4	1206,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1206,1	1205,2	1208,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	670,0	672,2	673,3	671,8		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	536,1	533,0	534,7			
Peso especifico aparente	2,247	2,256	2,257	2,253		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,99	1,01	0,96			
Estabilidad medida N.	14110	13890	13690			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13969	14029	13142	13713	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,04	2,88	3,04	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,5	4,1	4,1	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,6	4,6	4,51	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,74
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+050 AL Pr1+350 M. Izquierda	**VIAJE No**	8
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-11
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

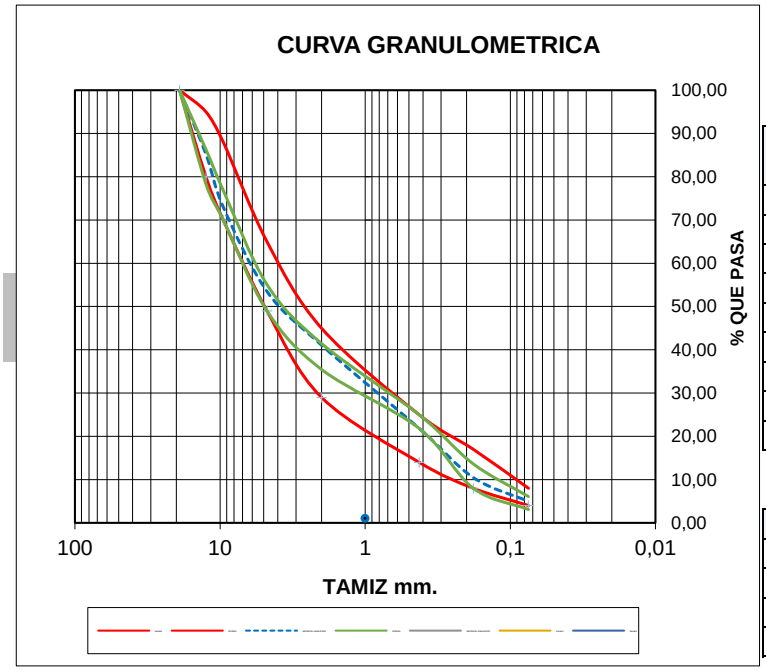

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1442,2
Peso retenido tamiz No.200:	1370,8

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	213,5	14,80	14,80	85,20	80,00	95,00
3/8"	176,2	12,22	27,02	72,98	70,00	88,00
No.4	281,1	19,49	46,51	53,49	49,00	65,00
No.10	178,9	12,40	58,92	41,08	29,00	45,00
No.40	277,3	19,23	78,14	21,86	14,00	25,00
No.80	164,2	11,39	89,53	10,47	8,00	17,00
No. 200	79,6	5,52	95,05	4,95	4,00	8,00
FONDO	71,4	4,95	100,00	0,00		
	1442,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1529,9	Peso Inicial gr	20	**150**
Peso final gr	1442,2	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	87,7	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	**5,73**			

BRIQUETA NUMERO	**24**	**25**	**26**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	65,0	64,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1206,1	1207,4	1203,4			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1208,4	1209,2	1205,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	672,5	672,2	670,2	671,6		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	535,9	537,0	534,8			
Peso especifico aparente	2,251	2,248	2,250	2,250		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,96	0,99			
Estabilidad medida N.	14110	13890	13690			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13546	13334	13553	13478	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,04	2,88	3,04	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,3	4,4	4,3	4,4	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,2	4,4	4,7	4,44	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,73
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+350 AL Pr1+620 M. Izquierda	**VIAJE No**	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-12
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

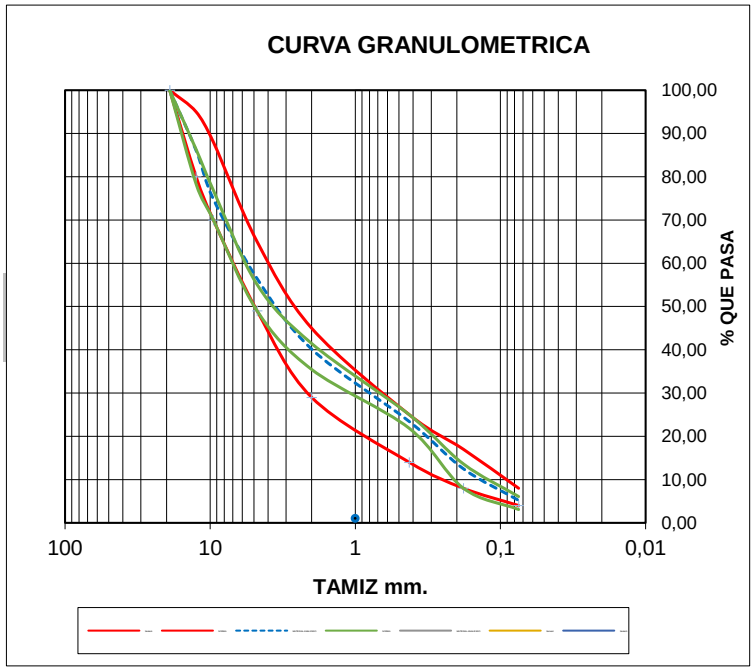

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1536,2
Peso retenido tamiz No.200:	1456,4

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	214,0	13,93	13,93	86,07	80,00	95,00
3/8"	173,0	11,26	25,19	74,81	70,00	88,00
No.4	282,0	18,36	43,55	56,45	49,00	65,00
No.10	250,2	16,29	59,84	40,16	29,00	45,00
No.40	257,2	16,74	76,58	23,42	14,00	25,00
No.80	167,8	10,92	87,50	12,50	8,00	17,00
No. 200	112,2	7,30	94,81	5,19	4,00	8,00
FONDO	79,8	5,19	100,00	0,00		
	1536,2	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1630,2	Peso Inicial gr	20,4	**150**
Peso final gr	1536,2	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	94,0	Diferencia (gr)	0,7	
% Asfalto	**5,77**			

BRIQUETA NUMERO	**27**	**28**	**29**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	64,0	63,2	63,7			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1241,1	1212,2	1207,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1243,5	1214,0	1209,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	689,0	674,2	672,2	678,5		**% asf.** 5,77
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	554,5	539,8	536,8			**Gmm** 2,351
Peso especifico aparente	2,238	2,246	2,250	2,245		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,99	1,01	1,00			
Estabilidad medida N.	14003	14158	14008			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13863	14300	14008	14057	9000	SI
Flujo en mm.	3,17	3,28	3,02	3,16	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,8	4,5	4,3	4,5	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,4	4,6	4,46	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	69	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	**CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19**	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+350 AL Pr1+620 M. Izquierda	**VIAJE No**	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	**FECHA:**	2024-10-12
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

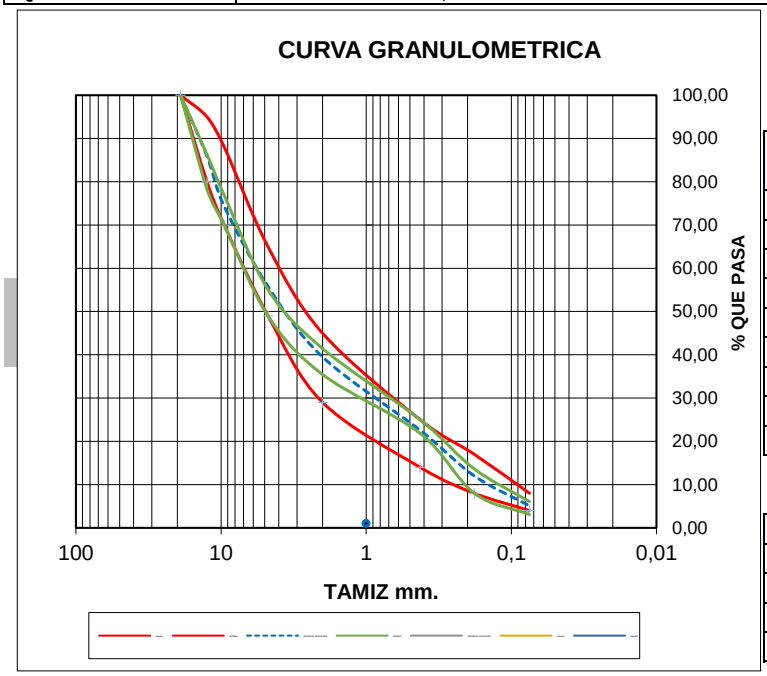

GRADACION No.1

Peso inicial muestra:	1518,6
Peso retenido tamiz No.200:	1441,4

TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	214,7	14,14	14,14	85,86	80,00	95,00
3/8"	175,5	11,56	25,69	74,31	70,00	88,00
No.4	281,0	18,50	44,20	55,80	49,00	65,00
No.10	247,3	16,28	60,48	39,52	29,00	45,00
No.40	257,4	16,95	77,43	22,57	14,00	25,00
No.80	160,3	10,56	87,99	12,01	8,00	17,00
No. 200	105,2	6,93	94,92	5,08	4,00	8,00
FONDO	77,2	5,08	100,00	0,00		
	1518,6	100,00				

EXTRACCION No 1		**PESO FILTRO (g)**		**TEMP.**
Peso Inicial gr	1611,2	Peso Inicial gr	20,4	**150**
Peso final gr	1518,6	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	92,6	Diferencia (gr)	0,7	
% Asfalto	**5,75**			

BRIQUETA NUMERO	**30**	**31**	**32**	**PROM.**	**NORMA**	
Espesor de la briqueta mm.	63,8	64,2	62,5			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1215,4	1217,5	1205,6			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1217,0	1219,0	1206,3			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,5	674,9	670,0	673,1		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	542,5	544,1	536,3			
Peso especifico aparente	2,240	2,238	2,248	2,242		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,99	0,98	1,03			
Estabilidad medida N.	14110	13890	13690			**CUMPLE**
Estabilidad corregida N.	13969	13612	14101	13894	9000	SI
Flujo en mm.	3,11	3,02	3,08	3,07	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,7	4,9	4,4	4,7	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,5	4,5	4,6	4,53	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	69	69	68	69	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,75
Gmm	2,352

OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

ENSAYO DE FALLA DE BRIQUETAS PARA MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19

G&SDC
GEOTECNIA & SUELOS DE COLOMBIA
Laboratorio de suelos concretos y asfaltos

PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	4763 DE 2023		
LOCALIZACIÒN:	MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
MATERIAL:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19		
ABCISA DE TOMA	K0+100 MARGEN DERECHA SECTOR 1 CAÑO FLORES (**VIAJE NUMERO 2**)		
NORMA ASOCIADA:	NORMA INVIAS E- 450-13	FECHA:	jueves, 3 de octubre de 2024
EQUIPO UTILIZADO:			

Prueba Nº 1	
Peso Inicial gr	1180,5
Peso final gr	1112,7
Diferencia gr	67,8
% Asfalto	**5,74**

Prueba Nº 2	
Peso Inicial gr	
Peso Final gr	
Diferencia gr	
% Asfalto	

Prueba Nº 3	
Peso Inicial gr	
Peso Final gr	
Diferencia gr	
% Asfalto	

	% QUE PASA				
TAMIZ No.	Prueba No.1	Prueba No.2	Prueba No.3	NORMA(MDC-1)	NORMA(MDC-2)
1"	100,00			100	100
3/4"	100,00			80-100	100
1/2"	92,37			67-85	80-100
3/8"	79,99			60-77	70-88
No.4	59,72			43-54	51-68
No.10	41,48			29-45	38-52
No.40	27,30			14-25	17-28
No.80	13,37			17-28	17-28
No.200	6,58			4-8	4-8
FONDO	0,00				
	0,00				

BRIQUETA NUMERO	**1**	**2**	**3**	**PROM.**	**NORMA**
Espesor de la briqueta mm	65,0	65,0	66,0		
Peso de la briqueta en el aire grs.	1245,0	1255,0	1261,0		
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1247,0	1257,0	1262,0		
Peso de la briqueta en el agua grs.	691,0	692,0	695,0		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	556,0	565,0	567,0		
Peso especifico aparente	2,239	2,221	2,224	2,228	
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351	
Factor de Correlación	0,96	0,96	1,01		
Estabilidad medida kgs.	1274,0	1287,0	1292,0		
Estabilidad corregida kgs.	1223,0	1235,5	1304,9	1254	750
Flujo en mm.	3,2	2,8	3,3	3,100	2 - 3,5
Vacios con aire %	4,7	5,5	5,4	5,2	4 - 6
Vacios en los agreg. Minerales %	18,03	18,69	18,59	18,44	Mim. 15

GS. Agre. grs/cm^3	2,575

% asf.	5,6
A	10125
E	6274
D	456
Gmm	2,351

ARNEIDO CAÑA CONTRERAS
LABORATORISTA

JOHANN. MOYANO.

ING. J0HANN WALDIR MOYANO SOLANO
M.PN°54202127220 NTS

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

G&SDC
GEOTECNIA & SUELOS DE COLOMBIA
Laboratorio de suelos concretos y asfaltos

PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SOLICITANTE	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0
LOCALIZACIÒN:	SECTOR 2 PALMARITO VEREDA PALMARITO MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MATERIAL:	BASE GRANULAR CANTERA ROSA BLANCA MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NORMA INVIAS	E - 161,150 INVIAS 2013
FECHA DE TOMA	martes, 22 de octubre de 2024

Ensayo		1	2	3	4	5	6				
Abscisa		**K2+510 DER**	**K2+600 EJE**	**K2+740 IZQ**	**K2+850 DER**	**K2+990 IZQ**	**K3+100 EJE**				
Peso frasco+cono+arena inicial	grs	6022	6015	6010	5985	5981	5974				
Peso frasco+cono+arena restante	grs	2541	2596	2485	2591	2589	2595				
Constante del cono	grs	**1606**									
Peso unitario arena	grs/cc	**1,410**									
Volumen del hueco	cc	1330	1286	1361	1268	1267	1257				
Peso material extraído húmedo total	grs	3236	3143	3366	3092	3095	3074				
Peso material extraído grueso	grs	2214	2158	2389	2106	2114	2099				
Peso material extraído fino	grs	1022	985	977	986	981	975				
Humedad particulas finas	%	5,8%	4,6%	6,2%	6,0%	6,4%	6,2%				
Humedad particulas gruesas	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%				
Porcentaje de partículas gruesas	%	68,4%	68,7%	71,0%	68,1%	68,3%	68,3%				
Porcentaje de partículas finas	%	31,6%	31,3%	29,0%	31,9%	31,7%	31,7%				
Peso unitario Húmedo del material total	grs/cc	2,433	2,444	2,473	2,438	2,443	2,445				
Humedad corregida	%	3,2%	2,8%	3,2%	3,3%	3,4%	3,3%				
Peso unitario Seco del material total	grs/cc	2,358	2,377	2,396	2,361	2,363	2,366				
Peso unitario seco laboratorio material fino	grs/cc	**2,168**									
Peso unitario seco total corregido	grs/cc	2,406	2,407	2,420	2,404	2,405	2,405				
Contenido de humedad óptima laboratorio	%										
Gravedad específica del material grueso	grs/cc	**2,600**									
Grado compactación individual	%	98,0%	98,8%	99,0%	98,2%	98,3%	98,4%				

OBSERVACIONES:

LAS DENSIDADES TOMADA EN EL SITIO DE OBRA CUMPLEN

FORMULA DE TRABAJO	GC_I (90)	GCI (90) ≥ 98 %	**98,4%**

DM	98,4	K	0,603
S	0,004	N	6

ARNEIDO CAÑA CONTRERAS
LABORATORISTA

JOHANN. MOYANO

ING. JOHANN WALDIR MOYANO SOLANO
M.P N° 54202127220 NTS

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

G&SDC
GEOTECNIA & SUELOS DE COLOMBIA
Laboratorio de suelos concretos y asfaltos

PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SOLICITANTE	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0
LOCALIZACIÒN:	SECTOR 1 CAÑO FLORES MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MATERIAL:	MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 4" CANTERA ROSA BLANCA MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NORMA INVIAS	E - 161,150 INVIAS 2013
FECHA DE TOMA	martes, 5 de noviembre de 2024

Ensayo	**No**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**				
Abscisa		**K3+100 EJE**	**K3+210 DER**	**K3+320 IZQ**	**K3+422 EJE**	**K3+532 DER**	**K3+620 IZQ**				
Peso frasco+cono+arena inicial	grs	6224	6218	6215	6210	6204	6200				
Peso frasco+cono+arena restante	grs	2594	2584	2576	2581	2591	2555				
Constante del cono	grs	**1606**									
Peso unitario arena	grs/cc	**1,410**									
Volumen del hueco	cc	1435	1438	1442	1435	1423	1446				
Peso material extraído húmedo total	grs	3470	3411	3450	3450	3458	3465				
Peso material extraído grueso	grs	2485	2412	2465	2475	2476	2484				
Peso material extraído fino	grs	985	999	985	975	982	981				
Humedad particulas finas	%	5,5%	4,8%	4,5%	5,0%	5,2%	5,5%				
Humedad particulas gruesas	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%				
Porcentaje de partículas gruesas	%	71,6%	70,7%	71,4%	71,7%	71,6%	71,7%				
Porcentaje de partículas finas	%	28,4%	29,3%	28,6%	28,3%	28,4%	28,3%				
Peso unitario Húmedo del material total	%	2,417	2,372	2,393	2,405	2,429	2,396				
Humedad corregida	%	3,0%	2,8%	2,7%	2,8%	2,9%	3,0%				
Peso unitario Seco del material total	grs/cc	2,347	2,307	2,330	2,338	2,361	2,327				
Peso unitario seco laboratorio material fino	grs/cc	**2,115**									
Peso unitario seco total corregido	grs/cc	2,424	2,419	2,423	2,424	2,424	2,424				
Contenido de humedad óptima laboratorio	%										
Gravedad específica del material grueso	grs/cc	**2,600**									
Grado compactación individual	%	96,8%	95,4%	96,2%	96,4%	97,4%	96,0%				

OBSERVACIONES:

LAS DENSIDADES TOMADA EN EL SITIO DE OBRA CUMPLEN			
FORMULA DE TRABAJO	GC_i (90)	GCI (90) ≥ 95 %	**96,4%**

DM	96,4	K	0,603
S	0,007	N	6

ARNEIDO CAÑA CONTRERAS
LABORATORISTA

JOHANN. MOYANO

ING. JOHANN WALDIR MOYANO SOLANO
M.P N° 54202127220 NTS

ANEXO G

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO MODIFICATORIO 001: 9 MESES Y 25 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **14/12/2024**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 23.137.768.645,10
VALOR ADICIONAL: $ 4.895.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 28.032.768.645,10
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: NO APLICA

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: NO APLICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	21/12/2023	21/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	21/12/2023	21/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	21/12/2023	21/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…....	…. …. …..	…. …. ….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	21/3/2024	21/3/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 71833285 / **anexo 2**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

POLIZA DE SEGURO RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL ESCONTRACTUAL	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29/9/2023	21/3/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100285361 NB-100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 001

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	4	3	2023	20/09/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	21	12	2023	20/09/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	21	12	2023	20	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	21	3	2024	20	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/03/204

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 001

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	21	3	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 001 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	14	3	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	14	3	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	14	3	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/04/2024

FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** **001** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 3/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** **002** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	26	4	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	26	4	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	26	4	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** **002** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **003** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	6	8	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	6	8	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	6	8	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **003** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 3/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.803.276.864,51	9	9	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	9	9	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 5.606.553.729,02	9	9	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 8.409.830.593,53	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.401.638.432,26	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN PRESENTADO ACTUALIZACIONES DE PÓLIZAS, DEBIDO A QUE NO SE HAN PRESENTADO ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: x9X52wiFNtxn17enEgcRQg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 285 1220 - www.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1117-P-05-PPSUS2000000059-DNOT

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	720079844	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	3227139196
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	3227139196

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESEDNTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSI 3 CON FECHA DE 08 DE AGOSTO DE 2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA A 23.137.768.645.10

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/08/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.313.776.864,51	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 06/08/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.322,55	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/08/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	4.627.553.729,02	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	6.941.330.593,53	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.589,61	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADA ANI

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72079844	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL** , expedida por la Compañía en **30/08/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **30** días del mes **AGOSTO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA-APF

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 6
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30/08/2024		
OBSERVACIÓN:	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO 3 CON FECHA 08/08/2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA A $23.137.768.645.10		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 6)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	06/08/2024	16/04/2025	$ 2.313.776.864,51
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/08/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.322,55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/08/2024	16/12/2027	$ 4.627.553.729,02
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 6.941.330.593,53

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	lpAhsHV6bfLMi/pg6eYyOQ==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	6
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	11/06/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 28/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 28/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 28/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 28/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide a los tres (03) días del mes de septiembre del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Juridico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Juridica	Firma

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.27 15:09:41 -05:00

Código de Seguridad: jvDEXeJ1n5ECjulWIIegow==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71833285	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	21/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	CALLE 06 N 28-52	**TELÉFONO**	3134007528
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	CALLE 06 N 28-52	**TELÉFONO**	3134007528

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 21/12/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	2.313.776.864,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	11.568.884.323,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/03/2027	4.627.553.729,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 21/03/2024	24:00 Horas Del 21/03/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935. O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.

LIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71833285	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	21/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DO
A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA ABF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL** , expedida por la Compañía en **27/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.27 15:08:22 -05:00

Código de Seguridad: oAQBXa9qNEhYEkKDbI0bnw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71833284	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	21/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 21/12/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	0,00
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBROS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71833284	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	21/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA

CONTRATO DE OBRA NO:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL"	
PLAZO:	TRES (03) MESES	
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($23.137.768.645,10).	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	
NIT:	901.758.303-9	
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ	
CC:	1.116.782.711 DE ARAUCA-ARAUCA	
PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO	NB-100285361 ANEXO 2
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100069639 ANEXO 3
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
FECHA DE EXPEDICIÓN:	POLIZA NB-100285361	27 DE DICIEMBRE DE 2023
	POLIZA NB- 100069639	27 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS

PÓLIZAS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/12/2023	21/07/2024	$2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	21/12/2023	21/07/2024	$11.568.884.323,00
PRESTACIONES SOCIALES	21/12/2023	21/03/2027	$4.627.553.729,20

CALIDAD DE LA OBRA	21/03/2024	21/03/2029	$6.941.330.593,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/09/2023	21/03/2024	$1.156.888.432,30

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual el municipio de Fortul aprueba las garantías, para efectos de acta de inicio del contrato (5folios).

La presente constancia se expide a los veintisiete (27) días del mes diciembre de 2023.

JAVIER ALONSO GABRERA HUERTAS
Alcalde Municipal

Dra. Judith Mora
Jefe Oficina Jurídica.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.13 09:35:29 -05:00

Código de Seguridad: aWHETyg1E2HdCEDgHRbHfg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2856600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71904819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	20/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN LAS SIGUIENTES ACTAS:

-ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/01/2024
-ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/02/2024
-ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 04/03/2024

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (05/01/2024) HASTA (04/03/2024).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 20/05/2024

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 20/09/2024	2.313.776.864,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 20/09/2024	11.568.884.323,00	5.800.289,95
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 20/05/2027	4.627.553.729,20	2.282.081,29
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/05/2024	24:00 Horas Del 20/05/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	8.082.371,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	8.082.371,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.535.650,54
TOTAL A PAGAR	$	9.618.021,78

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71904819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	20/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL** , expedida por la Compañía en **13/03/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañia.

BOGOTA a los **13** días del mes **MARZO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.13 09:36:17 -05:00

Código de Seguridad: j5KGnUmt/epE68/bbMf6Vg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2854600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	71904820	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/03/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	20/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN LAS SIGUIENTES ACTAS:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/01/2024
ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/02/2024
ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 04/03/2024

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (05/01/2024) HASTA (04/03/2024).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 20/05/2024

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	570.520,32
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	570.520,32
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	570.520,32
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	108.398,86
TOTAL A PAGAR	$	678.919,18

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71904820	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	20/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 3
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/03/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN ACTA DE REINICIO DE FECHA 04/03/2024		
PÓLIZAS:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	NB-100069639	ANEXO 4
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/03/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN ACTA DE REINICIO DE FECHA 04/03/2024		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS


PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 3)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	04/03/2024	20/09/2024	$ 2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	04/03/2024	20/09/2024	$ 11.568.884.323,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/03/2024	20/05/2027	$ 4.627.553.729,20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/05/2024	20/05/2029	$ 6.941.330.593,80

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 4)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/09/2023	25/05/2024	$ 1.156.888.432,30

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

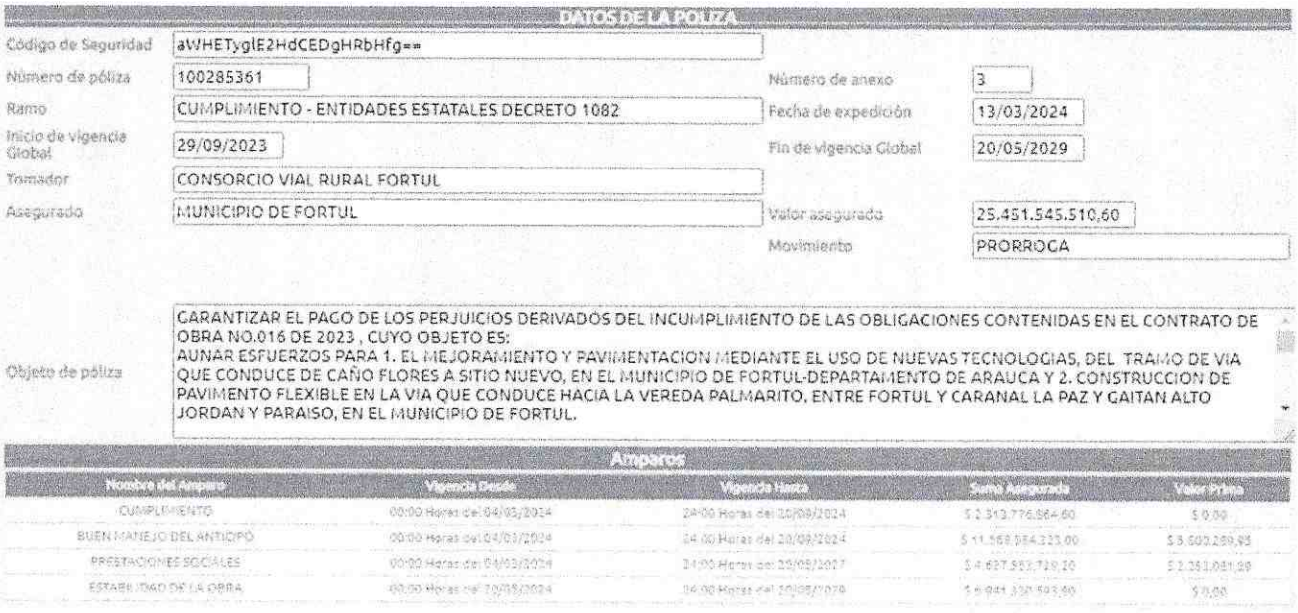

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	aWHETyglE2HdCEDgHRbHfg==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	3
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	13/03/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	20/05/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	25.451.545.510,60
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/09/2024	$ 2.313.776.564,60	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/09/2024	$ 11.569.054.323,00	$ 3.600.259,95
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2027	$ 4.627.553.729,20	$ 2.261.081,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 20/05/2024	24:00 Horas del 20/05/2029	$ 6.941.330.593,80	$ 0,00

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	JSKGnUmt/epE68/bbMf6Vg==		
Número de poliza	100069639	Numero de anexo	4
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	13/03/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	20/05/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	PRORROCA

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 570.320,32
PATRONAL	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 147.066.329,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 147.066.329,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 147.066.329,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide, a los quince (15) días del mes de marzo del 2024.

FREDY GARCIA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó y aprobó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	NUEVE (09) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS		
VALOR:	VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 ($28.032.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 7
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/09/2024		
OBSERVACIÓN:	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 DEL 09/09/2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA PÓLLIZA A $28.032.768.645.10		
PÓLIZAS:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100069639	ANEXO 7
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/09/2024		
OBSERVACIÓN:	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 DEL 09/09/2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA PÓLLIZA A $28.032.768.645.10		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 7)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	09/09/2024	16/04/2025	$ 2.803.276.864,51
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	09/09/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.322,55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	09/09/2024	16/12/2027	$ 5.606.553.729,02

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 8.409.830.593,53

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 7)			
AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2023	16/12/2024	$ 1.401.638.432,26

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	hjSNM+pXx2iuZQ5vcjJdTQ==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	7
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	13/09/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	28.388.545.509,61
		Movimiento	MODIFICACION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del: 09/09/2024	24:00 Horas del: 16/04/2025	$ 2.803.276.664,51	$ 881.100,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del: 09/09/2024	24:00 Horas del: 16/04/2025	$ 11.366.854.322,53	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del: 09/09/2024	24:00 Horas del: 15/12/2027	$ 5.806.553.729,02	$ 9.599.564,38
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del: 16/12/2024	24:00 Horas del: 16/12/2029	$ 8.409.830.593,53	$ 22.039.569,86

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Jxk3Wkay+UgKhvVADiz0yg==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	7
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	13/09/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.401.638.432,26
		Movimiento	MODIFICACION
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y CAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.401.638.432,26	$ 197.141,10
PATRONAL	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 420.491.529,68	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 420.491.529,68	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 420.491.529,68	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

CONSORCIO VIAL RURAL
FORTUL

Fortul, 16 de septiembre 2024

CSVF-1083-2024

Señores
OFICINA JURÍDICA
Municipio de Fortul

Ref. Contrato de obra No. 016-2023 con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL"

Asunto: Aprobacion de Pólizas Según Adicional Valor No.1.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir pólizas de cumplimiento NB-100285361 anexo No.7 y póliza de responsabilidad civil NB-100069639 anexo No.7 según adicional de valor No.1, para su revisión y aprobacion.

Anexo:

- Pólizas de cumplimiento
- Pólizas de responsabilidad civil

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
R/ CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
NIT 901.758.303-9

Elaborado por:
Adalberto Alarcon Olaya
Revisado por:
Ing Javier Orlando Sanabria J.

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Calle 19 No. 22 – 31, Arauca, Arauca
consorciovialfortul@gmail.com

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: hjSNM+pXx2iuZQ5vcjJdTQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	**No. ANEXO**	7	**No. CERTIFICADO**	72095836	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/09/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3227139196
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3227139196

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESEDNTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 CON FECHA DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA A 28.032.768.645.10

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.803.276.864,51	881.100,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.322,55	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	5.606.553.729,02	9.599.564,38
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	8.409.830.593,53	22.039.569,86
		TOTAL ASEGURADO	$ 28.388.545.509,61	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	32.520.234,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	32.520.234,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.178.844,51
TOTAL A PAGAR	$	38.699.078,75

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52 646 070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la poliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL ,** expedida por la Compañía en **13/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañia.

BOGOTA a los **13** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIACIÓN A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Jxk3Wkay+UgKhvVADiz0yg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095838	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESEDNTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 CON FECHA DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA A 28.032.768.645.10

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	700.819.216,00	1.401.638.432,00	1.401.638.432,26	197.141,10
PATRONAL	420.491.529,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	420.491.530,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	420.491.530,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.401.638.432,26	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	197.141,10
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	197.141,10
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	37.456,81
TOTAL A PAGAR	$	234.597,91

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52 646 070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095838	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023 HASTA 16/12/2024
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Or9iPNGMi2vsu754A1JD9A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71980991	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL DEL OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 02 DEL 26/04/2024

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/04/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.313.776.864,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/04/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.323,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/04/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	4.627.553.729,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71980991	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: lpAhsHV6bfLMi/pg6eYyOQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71980995	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL DEL OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 02 DEL 26/04/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	0,00
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71980995	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 5
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/06/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 002 DE FECHA 26/04/2024		
PÓLIZAS:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	NB-100069639	ANEXO 6
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/06/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 002 DE FECHA 26/04/2024		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 5)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	26/04/2024	16/04/2025	$ 2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/04/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.323,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/12/2024	16/12/2029	$ 4.627.553.729,20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 6.941.330.593,80

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 6)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2023	16/12/2024	$ 1.156.888.432,30

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Or9iPNGMi2vsu754A1JD9A==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	5
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	11/06/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	25.451.545.510,60
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/04/2025	$ 2.313.776.964,60	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/04/2025	$ 11.568.884.823,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2027	$ 4.627.553.729,20	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 16/12/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 6.941.330.593,80	$ 0,00

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	lpAhsHV6bfLMi/pg6eYyOQ==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	6
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	11/06/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide, a los trece (13) días del mes de junio del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: X8HSIrYeN1CUfvCOSJurVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSZR000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71920454	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUEDANDO COMO PLAZO TOTAL (9) MESES Y (25) DIAS, SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO N. 01 DEL 14/03/2024.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 16/12/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/03/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.313.776.864,60	3.955.607,57
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 14/03/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.323,00	19.778.037,86
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/03/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	4.627.553.729,20	7.907.284,52
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	31.720.929,95
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	31.720.929,95
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.026.976,69
TOTAL A PAGAR	$	37.747.906,64

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71920454	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ARF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL ,** expedida por la Compañía en **03/04/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **03** días del mes **ABRIL** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XvqvvOywpbVRzI7aL57uUw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71920377	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUEDANDO COMO PLAZO TOTAL (9) MESES Y (25) DIAS, SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO N. 01 DEL 14/03/2024.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 16/12/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	1.996.821,13
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.996.821,13
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.996.821,13
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	379.396,01
TOTAL A PAGAR	$	2.376.217,14

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71920377	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 4
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03/04/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 001 DEL 14/03/2024		
PÓLIZAS:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	NB-100069639	ANEXO 5
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03/04/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 001 DEL 14/03/2024		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 4)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	14/03/2024	16/04/2025	$ 2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/03/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.323,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/03/2024	16/12/2027	$ 4.627.553.729,20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 6.941.330.593,80

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 5)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2023	16/12/2024	$ 1.156.888.432,30

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	X8HSIrYeN1CUfvCOSJurVw==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	4
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/04/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	25.451.545.510,60
		Movimiento	PRORROGA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 15/04/2025	$ 2.313.776.864,60	$ 3.855.607,57
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 15/04/2025	$ 11.365.884.323,00	$ 19.776.037,86
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 4.627.553.729,20	$ 7.997.264,92
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 16/12/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 6.941.330.593,80	$ 0,00

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	XvqvvOywpbVRzI7aL57uUw==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	5
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	3/04/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	PRORROGA
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 1.996.921,13
PATRONAL	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide, a los ocho (08) días del mes de abril del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó y aprobó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

ANEXO H

MEPI-MN-1IN-15-FR-14

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 026 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **PLAZO ADICIONAL:** 6 MESES Y 25 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

No se presentaron auditorias

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

No se presento un plan de inspección, medición y ensayos. Sin embargo para el período del presente informe se han realizado los ensayos de laboratorio pertinentes y se encuentran relacionados en formato 15-FR-11.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

para el el presente inform No se presentaron No conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

para el el presente inform No se presentaron quejas y reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
2	ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	22/02/2024	11/07/2024	22/12/2024	**ok**
2	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	22/02/2024	11/07/2024	22/12/2024	**ok**

OBSERVACIONES:

DENTRO DEL CONTROL REALIZADO PARA LA CALIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS UTILIZADOS EN CAMPO.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya	Nombre:	Nombre: Javier E. Fuentes Capacho	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO I

MEPI-MN-IN-2-FR-1

Seguimiento a la inversión del Anticipo

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 Y 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO PRINCIPAL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES					$ 7.660.884.300,00	66,22%
2	TRANSPORTE					$ 2.489.000.000,00	21,51%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS					$ 1.419.000.000,00	12,27%
TOTAL						$ 11.568.884.300,00	100,00%

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO ADICIONAL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES					$ 1.290.566.750,00	52,73%
2	TRANSPORTE					$ 856.625.000,00	35,00%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS					$ 300.308.250,00	12,27%
TOTAL						$ 2.447.500.000,00	100,00%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma:
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO J

MEPI-MN-IN-2-FR-2

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 10 **MES:** OCT **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo) ENTIDAD FINANCIERA: ALIZANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS

CUENTA BANCARIA No. 4000008399 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: ARAUCA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50% **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO CONTRATO PRINCIPAL : **$ 11.568.884.300,00** **(M/CTE)**

VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL: **$ 2.447.500.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	CCT No. 046	8-mar-24	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS	$ 500.000.000,00	3	MAQUINARIA Y EQUIPOS
FACTURA	CT. No. 047	8-mar-24	CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS	$ 1.000.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV 130	12-mar-24	ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 98.200.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 01	20-mar-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	CT. No. 048	20-mar-24	CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS	$ 580.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	CCT No. 050	11-abr-24	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS	$ 919.000.000,00	3	MAQUINARIA Y EQUIPOS
FACTURA	ASOV135	25-abr-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 96.236.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 02	8-may-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV136	10-may-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 60.984.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV137	22-may-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 137.829.300,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 03	31-may-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV138	7-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 150.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV139	13-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 33.275.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FV22	24-jun-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 27.437.080,00	2	TRANSPORTE
_____	_____	24-jun-24	INVERSIONES Y SOLUCIONES ARDILA SAS ZOMAC	$ 11.241.789,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV140	28-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 157.266.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 03	2-jul-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	FV25	18-jul-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 29.465.892,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV141	11-jul-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 107.064.939,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 04	24-jul-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 500.000.000,00	2	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 05	16-ago-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.530.000.000,00	2	MATERIALES
FACTURA	FACTURA LP 38	16-ago-24	LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ	$ 1.530.000.000,00	2	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 06	19-sep-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 90.000.000,00	2	MATERIALES
FACTURA	**ASOV148**	**15-oct-24**	**ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL**	**$ 79.114.000,00**	**2**	**TRANSPORTE**
FACTURA	**ASOV149**	**15-oct-24**	**ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL**	**$ 120.886.000,00**	**2**	**TRANSPORTE**

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM **(CONTRATO PRINCIPAL)**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 7.660.884.300,00	$ 7.560.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 7.650.000.000,00	$ 10.884.300,00
2	TRANSPORTE	$ 2.489.000.000,00	$ 2.489.000.000,00	$ -	$ 2.489.000.000,00	$ -
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1.419.000.000,00	$ 1.419.000.000,00	$ -	$ 1.419.000.000,00	$ -
TOTALES		**$ 11.568.884.300,00**	**$ 11.468.000.000,00**	**$ 90.000.000,00**	**$ 11.558.000.000,00**	**$ 10.884.300,00**

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM **(CONTRATO ADICIONAL)**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.290.566.750,00		$ -	$ -	$ 1.290.566.750,00
2	TRANSPORTE	$ 856.625.000,00		$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 656.625.000,00
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 300.308.250,00		$ -	$ -	$ 300.308.250,00
TOTALES		**$ 2.447.500.000,00**	**$ -**	**$ 200.000.000,00**	**$ 200.000.000,00**	**$ 2.247.500.000,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma:
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA ENTREGA DE ANTICIPO

FECHA DEL ACTA:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE OBRA Nº :	016 DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FORTUL
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
NIT/C.C:	901.758.303-9
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO SADINTECON
NIT/C.C:	901.742.046-0
R/L	MARLY YULIETH AGUIRRE MENDEZ
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.
VALOR CONTRATO:	VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 23.137.768.645,10) MCTE
VALOR ANTICIPO:	ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS ($ 11.568.884.300) MCTE
NOMBRE DE LA CUENTA:	FIDUCIA
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ALFONSO TRASLAVIÑA MARÍN / Secretario de Planeación e Infraestructura
BANCO:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NUMERO DE CUENTA:	04000008399
FECHA DE APERTURA:	07/12/2023

En el Municipio de Fortul, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron las siguientes personas: Sr. JAVIER ALONSO CABRERA HUERTAS, Alcalde Municipio de Fortul, ING. CARLOS ALFONSO TRASLAVIÑA MARÍN, Secretario de Planeación e infraestructura, LAURA BONILLA ANGARITA, Secretaria de Hacienda y Tesorería, CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL Representado por JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ identificado con la Cedula de Ciudadanía Nº 1.116.782.711 Expedida En Arauca (Arauca), Contratista de obra, CONSORCIO SADINTECON representando por MARLY YULIETH AGUIRRE MENDEZ identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.116.790.583 Expedida en Arauca, (Arauca), interventoría externa. Con el fin de elaborar el acta de entrega de anticipo por la suma de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS ($ 11.568.884.300) MCTE, para ser invertidos de acuerdo al plan de inversión aprobado por el supervisor del contrato:

PLAN INVERSIÓN ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	PORCENTAJE %
1	MATERIALES	$ 7.660.884.300	66,22%
2	TRANSPORTE	$ 2.489.000.000,00	21,51%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1.419.000.000,00	12,27%
TOTAL		**$ 11.568.884.300,00**	**100,00%**

Que a la fecha 06 de diciembre de 2023, fue aprobada las garantías –póliza de cumplimiento No. NB-100285361 Anexo 0-1 Aseguradora Seguros Mundial Tu Compañía Siempre; que asegura los riesgos especificados en la cláusula del contrato de Obra No. 016 de 29 de septiembre de 2023 y en especial el correcto manejo de anticipo.

Que se constituyó la Fiducia con tipo de cuenta de ahorro a través de Bancolombia con nombre de la ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS, con tipo de Cuenta Ahorros y No. De Cuenta 04000008399 apertura el 07 de diciembre de 2023.

Que el municipio aprobó el cronograma de trabajo y fijó la fecha de iniciación de los trabajos, ateniendo a lo anterior, las partes ACUERDAN:

Entregar al contratista la suma de **ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS ($ 11.568.884.300) MCTE,** a título de anticipo.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Fortul a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.

JAVIER ALONSO CABRERA HUERTAS
Alcalde municipal

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL 2023
R/L JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
contratista

Dra. LAURA BONILLA ANGARITA
Secretaria de Hacienda y Tesorería

Ing. CARLOS ALFONSO TRASLAVIÑA MARÍN
secretario de Planeación e infraestructura

CONSORCIO SADINTECON
R/L MARLY YULIETH AGUIRRE MENDEZ
Interventoría externa

Transferencia No. _____
Banco _____

Valor $ 11.568.884.300
Orden de Pago _____

Elaboro:
Andrés Mauricio Sarmiento
Profesional de Apoyo

Revisó: Judth Mora
Asesor Jurídico

ACTA ENTREGA DE ANTICIPO
(CONTRATO ADICIONAL DE VALOR N° 001)

FECHA DEL ACTA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE OBRA N.°:	016 DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FORTUL
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
NIT/C.C:	901.758.303-9
R/	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO SADINTECON
NIT/C.C:	901.742.046-0
R/	RUTH ELENA TABARES ZULETA
OBJETO CONTRATO PRINCIPAL:	"AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL
OBJETO CONTRATO ADICIONAL DE VALOR N° 01:	ADICIONAL EN VALOR 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 23.137.768.645,10) MCTE
VALOR CONTRATO ADICIONAL DE VALOR N° 01	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($4.895.000.000 COP)
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL DE VALOR N° 01:	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($2.447.500.000 COP)
NOMBRE DE LA CUENTA:	ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS
SUPERVISOR:	ING. WILLMER RIATIGA OCAMPO / secretario de Planeación e Infraestructura
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NUMERO DE CUENTA:	04000008399
FECHA DE APERTURA:	07/12/2023

En el Municipio de Fortul, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: WILLMER RIATIGA OCAMPO, Secretario De Planeación e Infraestructura, Supervisor, LAURA BONILLA ANGARITA, Secretaria de Hacienda y Tesorería, CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL Representado por JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ identificado con la Cedula de Ciudadanía N.° 1.116.782.711 Expedida En Arauca (Arauca), Contratista de obra, CONSORCIO SADINTECON representado por RUTH ELENA TABARES ZULETA identificada con cedula de ciudadanía N.° 30.303.454 Expedida en Manizales, interventoría externa. Con el fin de elaborar el acta de

entrega de anticipo del contrato adicional de valor No. 01 por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($2.447.500.000 COP), para ser invertidos de acuerdo al plan de inversión aprobado por la interventoria del contrato de obra 016 de 2023.

PLAN INVERSIÓN ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	PORCENTAJE %
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.290.566.750,00	52,73%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 856.625.000,00	35,00%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 300.308.250,00	12,27%
	TOTAL	**$ 2.447.500.000,00**	**100,00%**

Que el dia 16 de septiembre de 2024, fue aprobada las garantias –póliza de cumplimiento No. NB-100285361 Anexo 7 Aseguradora Seguros Mundial Tu Compañía Siempre; que asegura los riesgos especificados en la cláusula del contrato de Obra No. 016 de 29 de septiembre de 2023 y en especial el correcto manejo de anticipo.

Que se constituyó la Fiducia con tipo de cuenta de ahorros a través del banco Bancolombia con nombre de ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS, con tipo de Cuenta Ahorros No. 04000008399 apertura el dia 07 de diciembre de 2023.

ateniendo a lo anterior, las partes ACUERDAN:

Entregar al contratista la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($2.447.500.000 COP),** a titulo de anticipo.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Fortul a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre de 2024.

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL 2023
R/ JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Contratista

CONSORCIO SADINTECON
R/ RUTH ELENA TABARES ZULETA
Interventoria externa

Ing. WILLMER RIATIGA OCAMPO
secretario de Planeación e infraestructura

Dra. LAURA BONILLA ANGARITA
secretaria de Hacienda y Tesoreria

Transferencia No. _____ Valor $ 2.447.500.000
Banco _____ Orden de Pago _____

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ASOV148

ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL

NIT 901398066-2
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4923
Municipio: Fortul (Arauca)
Dirección: CL 10 24 31 BRR VILLA LUCIA
Correo: asovolfor@gmail.com
Teléfono: 3214527819

CUFE: 0c976deda02d9483535119b2e43939ce7ec474a4bc14fdb7d60589365ca9a513b857d1e26ab793b846041f3e9a5dc937

Fecha de emisión
2024-10-02

Fecha y hora de autorización
2024-10-02 18:20:31

Prefijo
ASOV

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2024-10-02

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Número de documento
NIT - 901758303-9

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Arauca

Municipio
Arauca

Dirección
CL 19 22 31

Teléfono
3023224964

Correo
consorciovialfortul@gmail.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SVT039	TRANSPORTE DE MATERIALES	1,00	UNIDAD	$79.114.000,00	0%	0%		$79.114.000,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$79.114.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$79.114.000,00**
Subtotal más impuestos	=	**$79.114.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$79.114.000,00**

Número de autorización: 18764057766994
Rango Autorizado:desde ASOV 116 hasta ASOV 200
Expedida: 2023-10-10 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2024-10-10

Firma Digital:

TTEXNCoopE4hg6UEZsUt+ULWuij3CPYAq3zt5ZHbYeSLrFiexX6HvTw8L1TNpNiRMY7009Gx5zKuJP6JrH8Z2peq88vV7MWvNLhx+BTEaYWtnrPgN
ZkXu6ugiNQMYb9EVAPF3pK9MhZGVbob+1tgQhmOwlLFuCD19tI0QScxe/1Rq5OA2dUiGVGTbZQ36be7vobEUcfuIMC5c6CX0+P1unMlGlW4P7/+
mehoilcNvlOVbj8v110vZyZ/NDKkaMkgKdn6QxTmLg/Vblasm4sSkGz6jHG5Q9OF4+xzRb+jYkPBqKDgwa1zJI5dYfog1mpsKOsASXDWOSiS9GbOv
71JHg==

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #644369 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_545949 del 15/10/2024 17:45:19, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
35	BANCO AGRARIO - CC - 373150003037	901398066	ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	PG - Pagado	OP_545949-DES:TRANSPORTE	$200,000,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 16/10/2024 09:24:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ASOV149



ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL

NIT 901398066-2
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4923
Municipio: Fortul (Arauca)
Dirección: CL 10 24 31 BRR VILLA LUCIA
Correo: asovolfor@gmail.com
Teléfono: 3214527819

CUFE: 0641f184a96d3eeb424d38928e65dabf6da50416583b76a3eedd5649064528f726f37a46c0ad0849fb74446ab7d2a123

Fecha de emisión 2024-10-08	**Fecha y hora de autorización** 2024-10-08 12:04:24	**Prefijo** ASOV	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2024-10-08	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Número de documento NIT - 901758303-9	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Arauca	**Municipio** Arauca	**Dirección** CL 19 22 31	**Teléfono** 3023224964
Correo consorciovialfortul@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SVT039	TRANSPORTE DE MATERIALES	1,00	UNIDAD	$120.886.000,00	0%	0%		$120.886.000,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Número de autorización: 18764057766994
Rango Autorizado:desde ASOV 116 hasta ASOV 200
Expedida: 2023-10-10 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2024-10-10

Firma Digital:
iU4lqihy9AnvzRURsWRd5cJn8Lkn2VXNe7omdlFnSlpLbxRFfu+am+zRhTfx4dm8+A7bm1XIewoLsHrbg4bYb6oU4RW9f/AepoMw/uiylbZKfH4eh8cTnbobi8ZxL/Z5l9rZlZ3oLQeHX9YVL9ZwNvSHPS4CE8WsM3D36PiplSNgIDa3Vv24QrD777oNXUOnmuVrl8Dzucc7g8k8cEtoba7RyNHq50FVrCyOz8pFlcUxlPyFSnofYHeuk2lZ12n3EHiW/xqAhbnAlMX7tbW7mMlemSTflErgYzTLTv3qkoWCgG2esN4cASBLVPZ2YYnuQdm8FjBDKw3/YzRJcnBMgg==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$120.886.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$120.886.000,00**
Subtotal más impuestos	=	**$120.886.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$120.886.000,00**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #644369 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_545949 del 15/10/2024 17:45:19, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
35	BANCO AGRARIO - CC - 373150003037	901398066	ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	PG - Pagado	OP_545949-DES:TRANSPORTE	$200,000,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 16/10/2024 09:24:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2


ANEXO K

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

Programa de obra

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UND	% compl	Costo	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**CONTRATO DE OBRA 016 DE 2023**		35%	$ 28.032.768.645,10		259 días?	mar 19/12/23	vie 13/12/24	
2			FASE DE PREALISTAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE		10...	$ 0,00		24 días	jue 21/12/23	lun 18/03/24	
3		II	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		35%	$ 13.070.759.440,61		191 días	mar 19/03/24	mar 10/12/24	
4		1	EXCAVACIONES		60%	$ 103.289.950,84		20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24	
5		1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE	M3	60%	$ 103.289.950,84	4.976,39	20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24	2
6		2	ESTRCTURA DE VIA		64%	$ 12.262.990.006,87		175 días	mar 19/03/24	lun 18/11/24	
7		2.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	80%	$ 628.489.400,00	51.800,00	47 días	mar 16/04/24	mié 19/06/24	8FC-10 días
8		2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	10...	$ 835.117.198,56	5.776,08	30 días	mar 19/03/24	lun 29/04/24	5CC
9		2.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	M3	80%	$ 2.056.689.257,48	11.262,68	55 días	mar 16/04/24	lun 28/10/24	7CC
10		2.4	BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	M3	90%	$ 1.788.053.566,32	8.053,86	50 días	mar 18/06/24	vie 1/11/24	9FC-10 días
11		2.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	M2	0%	$ 260.761.200,00	51.800,00	32 días	jue 3/10/24	vie 15/11/24	
12		2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC- 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	0%	$ 6.693.879.384,51	4.516,87	32 días	vie 4/10/24	lun 18/11/24	11CC+1 día
13		3	OBRAS DE DRENAJE		0%	$ 475.723.546,72		26 días	mié 9/10/24	mié 13/11/24	
14		3.1	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	M3	0%	$ 10.898.888,28	13,16	20 días	mar 15/10/24	lun 11/11/24	5FC+15 días
15		3.2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0%	$ 162.021.362,25	134,97	21 días	mié 16/10/24	mié 13/11/24	18CC+1 día
16		3.3	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	M3	0%	$ 43.040.482,65	25,85	14 días	jue 24/10/24	mar 12/11/24	15CC+6 días
17		3.4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0%	$ 119.542.746,26	14.387,14	26 días	mié 9/10/24	mié 13/11/24	15CC-5 días
18		3.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	0%	$ 125.722.818,00	117,00	21 días	mar 15/10/24	mar 12/11/24	14CC
19		3.6	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	M3	0%	$ 14.497.249,28	51,11	20 días	lun 14/10/24	vie 8/11/24	
20		4	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIA		0%	$ 97.085.275,00		12 días	mar 19/11/24	mié 4/12/24	
21		4. 1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	UND	0%	$ 26.844.475,00	35,00	4 días	mar 19/11/24	vie 22/11/24	12
22		4 .2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0%	$ 70.240.800,00	22.200,00	10 días	jue 21/11/24	mié 4/12/24	12FC+2 días
23			**ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL**		0%	$ 4.990.093,80		30 días	jue 24/10/24	mié 4/12/24	
24		1P	ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR	KM	0%	$ 4.990.093,80	7,40	30 días	jue 24/10/24	mié 4/12/24	22FF
25			**ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL**		0%	$ 126.680.567,38		45 días	mié 9/10/24	mar 10/12/24	
26			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UND	0%	$ 126.680.567,38	1,00	45 días	mié 9/10/24	mar 10/12/24	
27		I	**EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**		30%	$ 14.962.009.204,49		259 días?	mar 19/12/23	vie 13/12/24	
28		1.1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		72%	$ 7.138.770.426,59		124 días	mar 14/05/24	vie 1/11/24	
29		1.1.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. (Incluye Transporte)	m3	80%	$ 31.553.968,63	1.119,61	10 días	mar 14/05/24	lun 27/05/24	2FC+40 días
30		1.1.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	m3	80%	$ 204.999.880,16	1.092,68	10 días	mar 14/05/24	lun 27/05/24	29CC
31		1.1.2.3	TERRAPLENES	m3	70%	$ 6.902.216.577,80	55.304,45	61 días	mar 14/05/24	vie 1/11/24	29CC
32		1.1.3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		0%	$ 6.298.818.599,09		41 días	lun 7/10/24	lun 2/12/24	
33		1.1.3.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	0%	$ 460.347.859,40	37.941,80	20 días	lun 7/10/24	vie 1/11/24	
34		1.1.3.2	ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	m3	0%	$ 2.302.629.452,96	9.322,16	20 días	lun 14/10/24	vie 8/11/24	33CC
35		1.1.3.3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	m2	0%	$ 188.658.211,20	37.476,80	25 días	lun 28/10/24	vie 29/11/24	34FC-10 días
36		1.1.3.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC- 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0%	$ 3.347.183.075,53	2.229,29	25 días	mar 29/10/24	lun 2/12/24	35CC+1 día
37		1.1.4	**SEÑALIZACIÓN**		0%	$ 234.092.778,00		12 días	lun 25/11/24	mar 10/12/24	
38		1.1.4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	Und	0%	$ 24.520.672,00	32,00	5 días	mar 3/12/24	lun 9/12/24	36
39		1.1.4.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	m	0%	$ 47.951.080,00	15.160,00	6 días	mar 3/12/24	mar 10/12/24	36
40		1.1.4.3	TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	Und	0%	$ 12.435.232,00	1.264,00	6 días	mar 3/12/24	mar 10/12/24	39CC
41		1.1.4.4	DEFENSA VEHICULAR METALICA EN ACERO GALVANIZADO	m	0%	$ 141.341.757,00	439,00	10 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	36FC-6 días
42		1.1.4.5	CAPTAFAROS	Und	0%	$ 1.685.670,00	115,00	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	41CC
43		1.1.4.6	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m)	Und	0%	$ 6.158.367,00	9,00	2 días	vie 29/11/24	lun 2/12/24	42
44		1.2	**OBRAS DE DRENAJE**		64%	$ 1.111.786.315,08		204 días?	mar 19/12/23	vie 27/09/24	
45		1.2.1	**PRELIMINARES**		40%	$ 15.708.426,24		5 días	mar 28/05/24	lun 3/06/24	
46		1.2.1.1	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	m3	40%	$ 15.708.426,24	55,38	5 días	mar 28/05/24	lun 3/06/24	29
47		1.2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		48%	$ 104.391.965,64		200 días	mar 19/12/23	lun 23/09/24	
48		1.2.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M.	m3	90%	$ 15.523.196,40	550,80	5 días	mar 4/06/24	lun 23/09/24	
49		1.2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	m3	0%	$ 1.244.375,40	30,92	5 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23	
50		1.2.2.3	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO	m3	60%	$ 87.624.393,84	375,88	3 días	mar 30/07/24	jue 1/08/24	
51		1.2.3	**CONCRETOS**		68%	$ 814.703.002,80		204 días?	mar 19/12/23	vie 27/09/24	
52		1.2.3.1	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m2	0%	$ 5.457.408,00	6,40	10 días	mar 19/12/23	lun 15/04/24	
53		1.2.3.2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90%	$ 590.951.852,40	358,80	16 días	mar 9/07/24	vie 27/09/24	
54		1.2.3.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO	m	70%	$ 193.419.900,00	180,00	8 días	mar 11/06/24	mar 24/09/24	
55		1.2.3.4	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU		10...	$ 24.873.842,40	29,17	10 días?	mar 28/05/24	lun 23/09/24	
56		1.2.4	**ACERDO DE REFUERZO**		70%	$ 176.982.920,40		71 días	vie 21/06/24	vie 27/09/24	
57		1.2.4.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	70%	$ 176.982.920,40	21.238,80	23 días	vie 21/06/24	vie 27/09/24	
58			**MOVIMIENTO RED ELECTRICA**		0%	$ 27.663.171,88		4 días?	lun 14/10/24	jue 17/10/24	
59			**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT**		0%	$ 171.394,08		1 día	lun 14/10/24	lun 14/10/24	
60			REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT		0%	$ 171.394,08	0,33	1 día	lun 14/10/24	lun 14/10/24	
61			**APOYOS MT**		0%	$ 12.759.228,80		3 días?	mar 15/10/24	jue 17/10/24	
62			CONCRETO 3000 PSI (Incluye material, mano de obra y herramienta y equipos)		0%	$ 2.047.456,80	1,80	3 días?	mar 15/10/24	jue 17/10/24	60
63			POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hicada y aplomada)		0%	$ 9.185.136,00	2,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24	60
64			DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)		0%	$ 1.526.636,00	2,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24	60

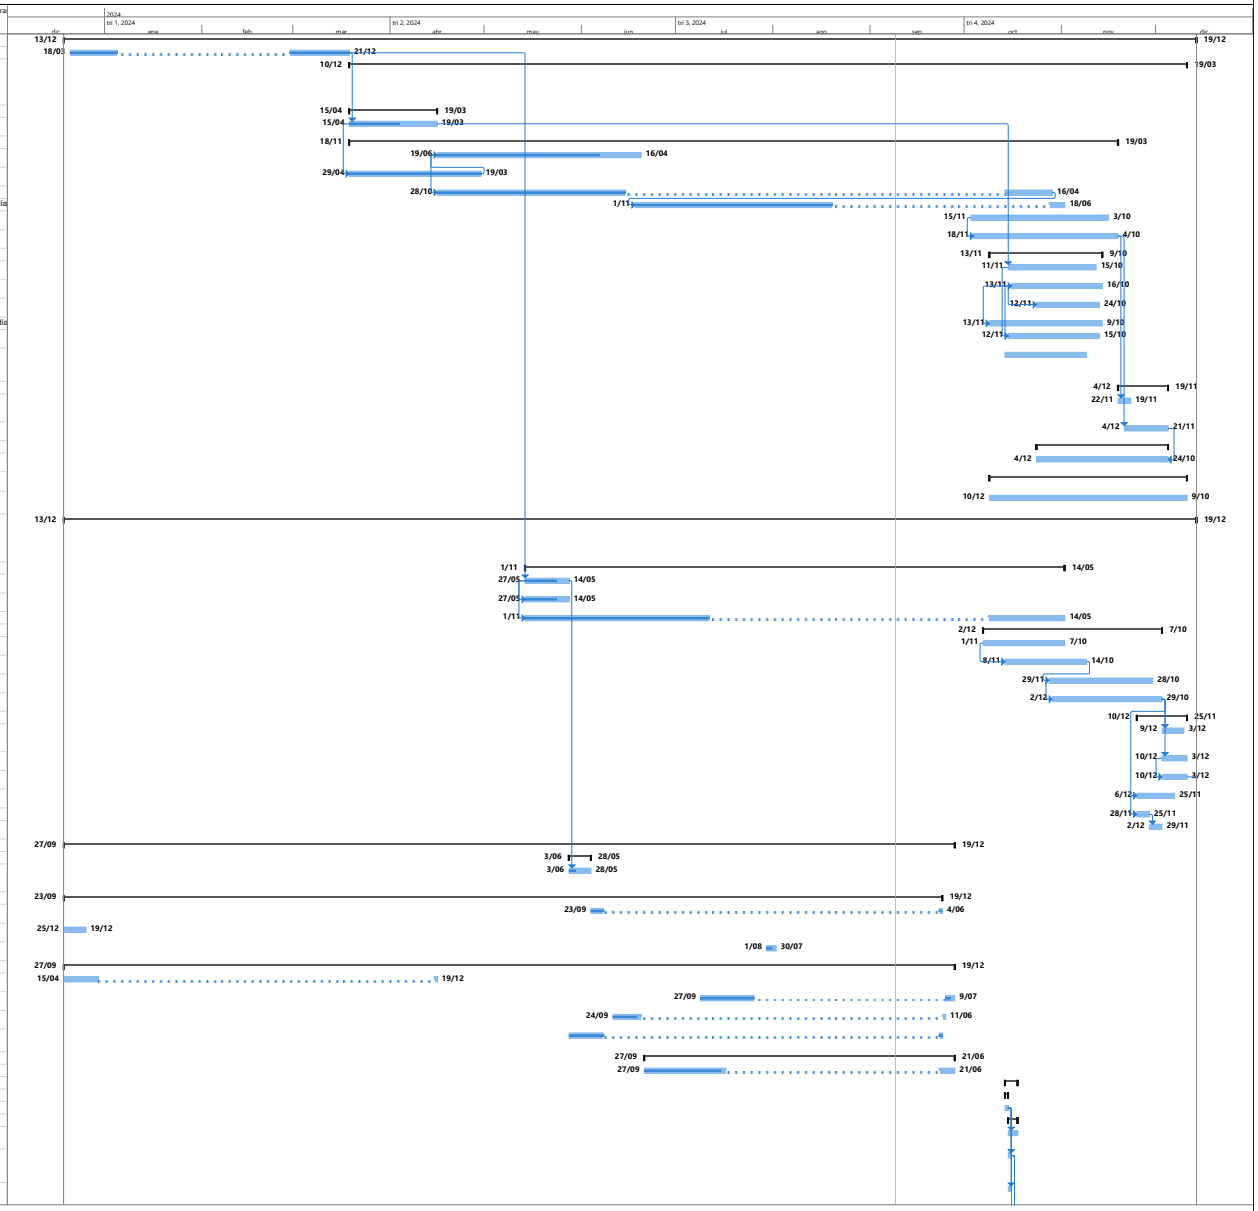

Proyecto: PROGRAMACION FOR
Fecha: lun 9/09/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

ANEXO L

MEPI-MN-IN-6-FR-1

Programa de inversión o reprog. programa inversión

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día/mes /año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. X **DE** X (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. X
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 016 DE 2023

OBJETO:

ALINAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 203 **INTERVENTOR:**

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 23.137.768.645,10 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 23.137.768.645,10

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 25 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	%
PALMARITO																	
EXCAVACIONES	$136.735.962	0,59%	0,59%	0,00%	SUSPENSION 01	PRORROGA SUSPENSION 01	0,27%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$0			$61.531.183	$75.204.179	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$136.735.962	0,59%	$136.147.944	$0			$96.031.993	$4.644.363	$0	$0	$35.471.588	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,42%	0,02%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA DE VIA	$11.453.751.317	49,50%	23,57%	0,00%			0,67%	4,67%	5,53%	5,15%	2,96%	11,55%	2,37%	4,90%	0,00%	0,00%	
				$0			$155.753.417	$1.079.555.988	$1.278.805.977	$1.190.821.089	$684.803.118	$2.672.116.525	$549.349.629	$1.133.810.586	$0	$0	
	$11.453.751.317	49,50%	$5.453.536.246	$0			$518.178.078	$685.798.781	$1.267.902.086	$1.189.818.036	$872.857.212	$917.982.054	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	2,24%	2,96%	5,48%	5,14%	3,77%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE DRENAJE	$215.120.993	0,93%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	0,50%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$0			$0	$0	$49.009.113	$51.490.143	$114.621.737	$0	$110.988.050	$0	$0	$0	
	$215.120.993	0,93%	$215.120.993	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$215.120.993	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACÓN VIAL	$97.085.275	0,42%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,27%	0,09%	100%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.844.476	$52.660.600	$17.560.200	
	$97.085.275	0,42%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL	$4.990.094	0,02%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	90%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.079.206	$1.663.365	$415.841	
	$4.990.094	0,02%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$116.320.991	0,50%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,08%	0,10%	0,00%	0,10%	0,08%	0,02%	80%
				$0			$0	$0	$0	$4.846.708	$19.386.832	$24.233.540	$0	$24.233.540	$19.386.832	$4.846.708	
	$116.320.991	0,50%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70%
CAÑO FLORES																	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$5.067.530.783	21,90%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	7,00%	7,27%	7,27%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60%
				$0			$0	$0	$1.620.337.887	$1.681.557.510	$1.681.557.510	$87.177.876	$0	$0	$0	$0	
	$5.067.530.783	21,90%	$5.289.812.436	$0			$0	$0	$781.601.150	$1.167.666.224	$1.505.011.436	$1.435.533.626	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	3,38%	5,05%	6,50%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$4.698.654.724	20,31%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	8,18%	0,00%	1,58%	0,00%	0,00%	50%
				$0			$0	$0	$0	$0	$784.289.067	$1.891.595.898	$0	$457.731.464	$0	$0	
	$4.698.654.724	20,31%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$211.916.215	0,92%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,26%	0,02%	40%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$147.477.223	$59.756.104	$4.662.888	
	$211.916.215	0,92%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE DRENAJE	$1.023.715.223	4,42%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	1,16%	1,01%	2,26%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	30%
				$0			$0	$0	$267.320.945	$234.546.551	$521.797.916	$0	$35.670.800	$0	$0	$0	
	$1.023.715.223	4,42%	$1.023.715.223	$0			$0	$0	$227.542.766	$208.172.338	$249.022.707	$68.620.264	$170.357.148	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,98%	1,33%	1,08%	0,30%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$110.018.464	0,48%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,08%	0,10%	0,00%	0,10%	0,08%	0,02%	20%
				$0			$0	$0	$0	$4.584.103	$18.336.411	$22.920.513	$0	$22.920.513	$18.336.411	$4.584.103	
	$110.018.464	0,48%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM)	$1.928.605	0,01%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$803.585	$642.868	$160.717	
	$1.928.605	0,01%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
TOTAL OTROS ITEMS																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 23.137.768.645,10**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 23.137.768.645,10**																

Reprogramación Reinicio No.1 **Reprogramación Adicional de tiempo No.1**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provis
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agru

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%			0,94%	4,99%	13,90%	13,69%	16,53%	20,29%	3,01%	7,85%	0,66%	0,14%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$217.284.600,29	$1.154.760.767,00	$3.215.473.921,70	$3.167.895.914,37	$3.824.792.591,82	$4.694.944.352,30	$696.008.477,87	$1.815.900.591,79	$152.466.179,44	$32.250.456,86			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%			0,94%	5,93%	19,83%	33,52%	50,05%	70,34%	41,07%	48,91%	49,57%	49,71%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$ 217.284.600,29	$ 1.372.045.367,29	$ 4.587.519.288,99	$ 7.755.415.203,36	$ 11.580.207.795,18	$ 10.814.872.647,00	$ 11.510.881.124,87	$ 13.326.781.716,66	$ 13.479.247.896,10	$ 13.511.498.352,96			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%			0,00%	2,66%	7,35%	11,86%	12,72%	12,16%	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$0	$615.210.071	$1.699.587.060	$2.743.740.648	$2.943.852.179	$2.812.482.690	$1.303.460.195,50	$0	$0	$0			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%			0,00%	2,66%	10,00%	21,86%	34,59%	19,50%	41,45%	12,72%	12,16%	5,63%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$0	$615.210.071	$2.314.797.131	$5.058.537.778	$8.002.389.957	$10.315.952.595	$11.619.412.790,00	$2.943.852.179	$2.812.482.690	$1.303.460.196			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

OBSERVACIONES: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE MODIFICACIÓN No.3, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 3024 SE LEGALIZO EL ACTA DE ADICIÓN ENVALOR No.1, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL, NI CON LA PROGRAMACIÓN REALIZADA EN MES ANTERIOR

Aprueba Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente De Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula profesional No. 68202112214 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO M

MEPI-MN-IN-6-FR-2

Seguimiento Programa de Inversiones

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(31 / 10 / 2024)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. X **DE** X (indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. X
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 016 DE 2023

OBJETO:

ALINAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 203 **INTERVENTOR:**

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 23.137.768.645,10 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 23.137.768.645,10

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 25 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	%
PALMARITO																	
EXCAVACIONES	$136.735.962	0,59%	0,59%	0,00%	SUSPENSION 01	PRORROGA SUSPENSION 01	0,27%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$0			$61.531.183	$75.204.179	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$136.735.962	0,59%	$136.147.944	$0			$0	$96.031.993	$4.644.363	$0	$0	$35.471.588	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA DE VIA	$11.453.751.317	49,50%	19,60%	0,00%			0,67%	4,67%	5,53%	5,15%	2,96%	11,55%	2,37%	4,90%	0,00%	0,00%	
				$0			$155.753.417	$1.079.555.988	$1.278.805.977	$1.190.821.089	$684.803.118	$2.672.116.525	$549.349.629	$1.133.810.586	$0	$0	
	$11.453.751.317	49,50%	$4.535.554.172	$0			$0	$519.178.058	$685.798.781	$1.267.902.086	$1.189.818.036	$872.857.212	$917.982.054	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	2,24%	2,96%	5,48%	5,14%	3,77%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE DRENAJE	$215.120.993	0,93%	0,93%	0,00%			0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	0,50%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$0			$0	$0	$49.009.113	$51.490.143	$114.621.737	$0	$110.988.050	$0	$0	$0	
	$215.120.993	0,93%	$215.120.993	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$215.120.993	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACÓN VIAL	$97.085.275	0,42%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,23%	0,08%	100%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.844.475	$52.680.600	$17.560.200	
	$97.085.275	0,42%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL	$4.990.094	0,02%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	90%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.079.206	$4.663.365	$415.841	
	$4.990.094	0,02%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$116.320.991	0,50%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,08%	0,10%	0,00%	0,10%	0,08%	0,02%	80%
				$0			$0	$0	$0	$4.846.708	$19.386.832	$24.233.540	$0	$24.233.540	$19.386.832	$4.846.708	
	$116.320.991	0,50%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70%
CAÑO FLORES																	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$5.067.530.783	21,90%	20,01%	0,00%			0,00%	0,00%	7,00%	7,27%	7,27%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60%
				$0			$0	$0	$1.620.337.887	$1.681.557.510	$1.681.557.510	$84.077.876	$0	$0	$0	$0	
	$5.067.530.783	21,90%	$4.629.991.631	$0			$0	$637.813.962	$781.601.150	$1.167.666.224	$1.505.011.436	$537.896.983	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	2,76%	3,38%	5,05%	6,50%	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$4.698.654.724	20,31%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	8,11%	0,00%	1,58%	0,00%	0,00%	50%
				$0			$0	$0	$0	$0	$784.289.067	$1.881.395.898	$0	$457.731.464	$0	$0	
	$4.698.654.724	20,31%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$211.916.215	0,92%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,26%	0,02%	40%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$147.477.223	$59.756.104	$4.662.888	
	$211.916.215	0,92%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE DRENAJE	$1.023.715.223	4,42%	5,11%	0,00%			0,00%	0,00%	1,16%	1,01%	2,26%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	30%
				$0			$0	$0	$267.320.945	$234.546.551	$521.797.816	$0	$35.670.800	$0	$0	$0	
	$1.023.715.223	4,42%	$1.182.520.692	$0			$0	$158.805.469	$227.542.766	$208.172.338	$249.022.707	$68.620.264	$170.357.148	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,69%	0,98%	1,33%	1,08%	0,30%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$110.018.464	0,48%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,10%	0,08%	0,10%	0,00%	0,02%	20%
				$0			$0	$0	$0	$4.584.103	$18.336.411	$22.920.513	$18.336.411	$22.920.513	$18.336.411	$4.584.103	
	$110.018.464	0,48%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM)	$1.928.605	0,01%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$321.434	$803.585	$642.868	$160.717	
	$1.928.605	0,01%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
TOTAL OTROS ITEMS																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 23.137.768.645,10**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 23.137.768.645,10**																

Reprogramación Reinicio No.1 **Reprogramación Adicional de tiempo No.1**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provis
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agru

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%			0,94%	4,99%	13,90%	13,69%	16,53%	20,29%	3,01%	7,85%	0,66%	0,14%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$217.284.600,29	$1.154.760.766,64	$3.215.473.921,70	$3.167.895.914,37	$3.824.792.591,82	$4.694.944.352,30	$696.008.477,87	$1.815.900.591,79	$152.466.179,44	$32.250.456,86			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%			0,94%	5,93%	19,83%	33,52%	50,05%	70,34%	41,07%	48,91%	49,57%	49,71%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$ 217.284.600,29	$ 1.372.045.366,93	$ 4.587.519.288,63	$ 7.755.415.203,00	$ 11.580.207.794,82	$ 16.275.152.147,12	$ 11.510.881.124,87	$ 13.326.781.716,66	$ 13.479.247.896,10	$ 13.511.498.352,96			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%			0,00%	6,10%	7,35%	11,86%	12,72%	6,55%	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$0	$1.411.829.382	$1.699.587.060	$2.743.740.648	$2.943.852.179	$1.514.848.023	$1.303.460.196	$0	$0	$0			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%			0,00%	6,10%	13,45%	25,31%	38,03%	13,89%	41,45%	12,72%	6,55%	5,63%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$0	$1.411.829.382	$3.111.416.441	$5.855.157.089	$8.799.009.268	$10.313.857.291	$11.619.412.790	$2.943.852.179	$1.514.848.023	$1.303.460.196			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

OBSERVACIONES: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE MODIFICACIÓN No.3, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 3024 SE LEGALIZO EL ACTA DE ADICIÓN ENVALOR No.1, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL, NI CON LA PROGRAMACIÓN REALIZADA EN MES ANTERIOR

Aprueba Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente De Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoria
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO N

MEPI-MN-IN-14-FR-1

Actas de Comité de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 11 oct 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ..... (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONVENIO No. 2283 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

MUNICIPIO: Fortul

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de la vía Palma-rito entre Fortul y Caranal-La Paz-Gaitan, Alto Sordan y Paraiso en el Departamento de Arauca

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Rural Fortul

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Sadintecon

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación Solicitud de ingreso al personal al contrato de interventoria No. 4763 de 2023. y aumento de dedicaciones especialistas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Aprobación ingreso de personal nuevo.
- Aumento del tiempo de dedicación de especialistas.
- Aprobación equipo, vehiculos y oficina para el contrato de interventoria.

Desarrollo de la reunión:

La interventoria expone la necesidad del ingreso del ingeniero auxiliar, inspector SST, inspectos de obra; según los frentes de obra activos en el proyecto y por las distancias de los tramos, se requiere de personal en cada frente, por lo tanto la entidad ve viable ingresar el ingeniero auxiliar y un inspector SST; con ello queda un residente, auxiliar y SST para cada frente de obra, junto con cada inspector de interventoria.

La entidad no ve viable incluir otra oficina para el proyecto, aunque el proyecto tiene dos frentes; se ejecuta en un mismo contrato de obra y en un mismo municipio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El aumento del tiempo en los profesionales y especialistas: La profesional social y el ~~ingeniero~~ especialista ambiental no se autoriza el incremento de la participación debido a que el contrato al que se le hace seguimiento no presenta dificultades en este tema.
Profesional Social queda con el 50%
Especialista ambiental queda con el 50%

Los especialistas estructural, pavimentos e hidraulico se proponé una dedicación mensual de 20% sujeta a las necesidades del proyecto, la cual tambien puede aumentar dependiendo de algun caso fortuito. y con previa autorización de la entidad.

El especialista en geotecnia se autoriza un 50% de dedicación en el mes de octubre y noviembre, sujeto a la actividad de estabilización con sales inorganicas en el tramo de cuñas flores.

La entidad ve viable el ingresos de dos motocicletas adicionales para la movilización de los ingenieros auxiliares en cada frente de obra, sin embargo no se da viabilidad a la facturación de una oficina adicional.

Queda como compromiso de la interventoría presentar la justificación del ingreso de los profesionales y demas items mencionados anteriormente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 d 3

FECHA: 11 oct 2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing. Ruben Alonso Borrero C	Ing. Residente de interv.	Consorcio Sadinteron	
Ing. Gustavo A. Becerra Gil	ING. DIRECTOR.	CONSORCIO SADINTECON	
Monica Montenegro C.	SUPERVISOR INTERVENT	INVIAS	
Jhon Jairo Pachon	Apoyo Superv.	Invias	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Gestión de tramites ambientales y entrega de las observaciones realizadas por parte de la interventoría al PAGA del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.

Establecimiento de comités semanales

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el ingeniero Wilmer Riatiga Ocampo, anunciando que el motivo del comité de obra es para presentar los avances del proyecto , conocer los por menores, inquietudes y de ser necesario tomar acciones para contribuir al desarrollo normal del proyecto. De esta manera se da inicio al comité con la presentación por parte del director de la interventoría, quien expresa que la idea es realizar estos comités semanales a partir de la fecha debido a que se acerca el límite contractual de terminación del contrato y necesario tomar acciones preventivas para lograr el objetivo en el tiempo establecido .

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoría por medio de su Residente ambiental manifiesta su preocupación desde el componente ambiental debido a que varias ocasiones se ha solicitado la entrega del documento PAGA , el cual debe ser radicado en dirección de sostenibilidad de invias; hasta la fecha no se tiene el documento definitvo. El residente ambiental del contratista de obra toma la palabra explicando que hay unos temas de cartografía pendientes y se compromete a entrgarlos el 18 de cotubre .

COMPONENTE SOCIAL:

Desde el componente social toma la palabra la interventoría mencionando que ha la fecha se han venido desarollando la labor social del proyecto con total normalidad y que los temas pendientes por subsanar se han realizado. Sin embargo menciona que es necesario tener al día las actas de vecindad del tramo adicional.

El contratista de obra manifiesta que estas actas de vecindad ya estan realizadas y serán remitidas a la interventoría para su revisión en el transcurso de la semana próxima.

COMPONENTE SST:

Desde el componente SST se expresa que han existido recomendaciones por parte de la interventoría respecto a la relación de personal en campo, por otra parte se menciona que se estan ejecutando muchas actividades al tiempo y es necesario preveer que se presentarán mas actividades simultáneamente, lo cual es importante aplicar el plan de señalización de manera efectiva y si es necesario realizar algunos ajustes, de tal manera que se garantice la seguridad dentro del area de trabajo.

COMPONENTE TÉCNICO:

Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (11/10/2024) presenta un avance ejecutado acumulado financiero de 45% y Fisico del 43 %, y que según el seguimiento a la programación contractual el proyecto No presenta atrasos en su ejecución. Sin embargo menciona que a partir del 14 de octubre está programado el inicio de la actividad (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA), de esta manera se advierte que si esta actividad no se realiza según el cronograma establecido, se generará un atraso significativo en las próximas semanas.

La secretaría de planeación del municipio de Fortul menciona que es necesario seguir de esta manera y cumpliendo con la reprogramación contractaual, siendo así es importante priorizar la ruta crítica de la programación para evitar atrasos e incovenientes en el cumplimiento del contrato. Por último se agradece la asistencia al presente comité y se establece que se realizarán cada 8 dias en las instalaciones de la alacaldía.



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar la entrega del PAGA definitivo actualizado	18/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Gestion y entrega de resolucion CORPORINOQUIA según Adcional de valor 001	25/10/2024	SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL, CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Informes mensuales Ambientales (Realizar entrega a medida que se finaliza observaciones por mes)	Inmediato	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Remisiones y cantidades de material - canteras (para trámites ambientales)	14/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Entrega de actas de vecindad definitivas - Tramo Adicional Caño flores.	25/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Inicio de actividad (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA)	21/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Realizar comités semanales los días viernes (Alcaldia de Fortul)	18/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	-
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	-
Gustavo Adolfo Becerra Gil	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	-
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	-
Javier Fuentes	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	-
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	-
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	-
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	-
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	-
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	-
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	-


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT – 800136069-4		Código: F-GIN-AC-M01-01
FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	GESTION DE LA INFORMACION - ATENCIÓN AL CIUDADANO		Versión:01 Página 1-1
	CONTROL DE ASISTENCIA		Fecha: 31/12/2018

FECHA: 11 de Octubre. 2024 LUGAR: Soc. Planeación. de Infraestructura PROGRAMA:
TEMA: Acta de Comite Obra d16.2023. DEPENDENCIA: Soc. Planeación e Infraestructura

ITEM	NOMBRE COMPLETO	TIPO DOC	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	GENERO		ENFOQUE DIFERENCIAL								INSTITUCION / ENTIDAD	CARGO	CORREO	DIRECCION	No. ELULAR	FIRMA
					M	F	Afro	Indigena	DISCAPACIDAD			VICTIMA								
									SI Y REGISTRADO	SI Y NO REGISTRADO	NO	DESPLAZAMIENTO FORZADO	HOMICIDIO	DESAPARICION FORZADA	OTRO						
1	Javier E. Fuentes C.	C.C	13.721.542	45	X											CONSORCIO SADINTECON	Director Interv	i.sadintecon@gmail.com	-	3184019410	
2	Adalberto Arciniegas	CC	79514309	46	X											CONSORCIO VIAS FORTUL	INGENIERO	INGADALBERTO@GMAIL.COM		3108600395	
3	Deisi Yohana Ortiz	CC	1116854383			X										CONSORCIO SADINTECON	INGP SST	Yohanaortiz0225@gmail.com.		3186514635	
4	Esteban Pico Mendez	CC	1.095820683		X											CONSORCIO SADINTECON	Ing. Ambiental	i. Sadintecon@gmail.com		314448 1334	
5	Narly Caro Zambrano	CC	1094778920	30		X					X					Alcaldia Fortul	Prof. Apoyo Soc Planeación	barcodeproyectos@fortul-arauca.gov.co	Sf Ramirez	3228285	
6	Wilmer Rodrigo Ocampo	CC	1093742330	31	X						X					Alcaldia	Soc. Planeación	planeacion@fortul-arauca.gov.co		3147149681	
7																					
8																					
9																					
10																					

RESPONSABLE: _____

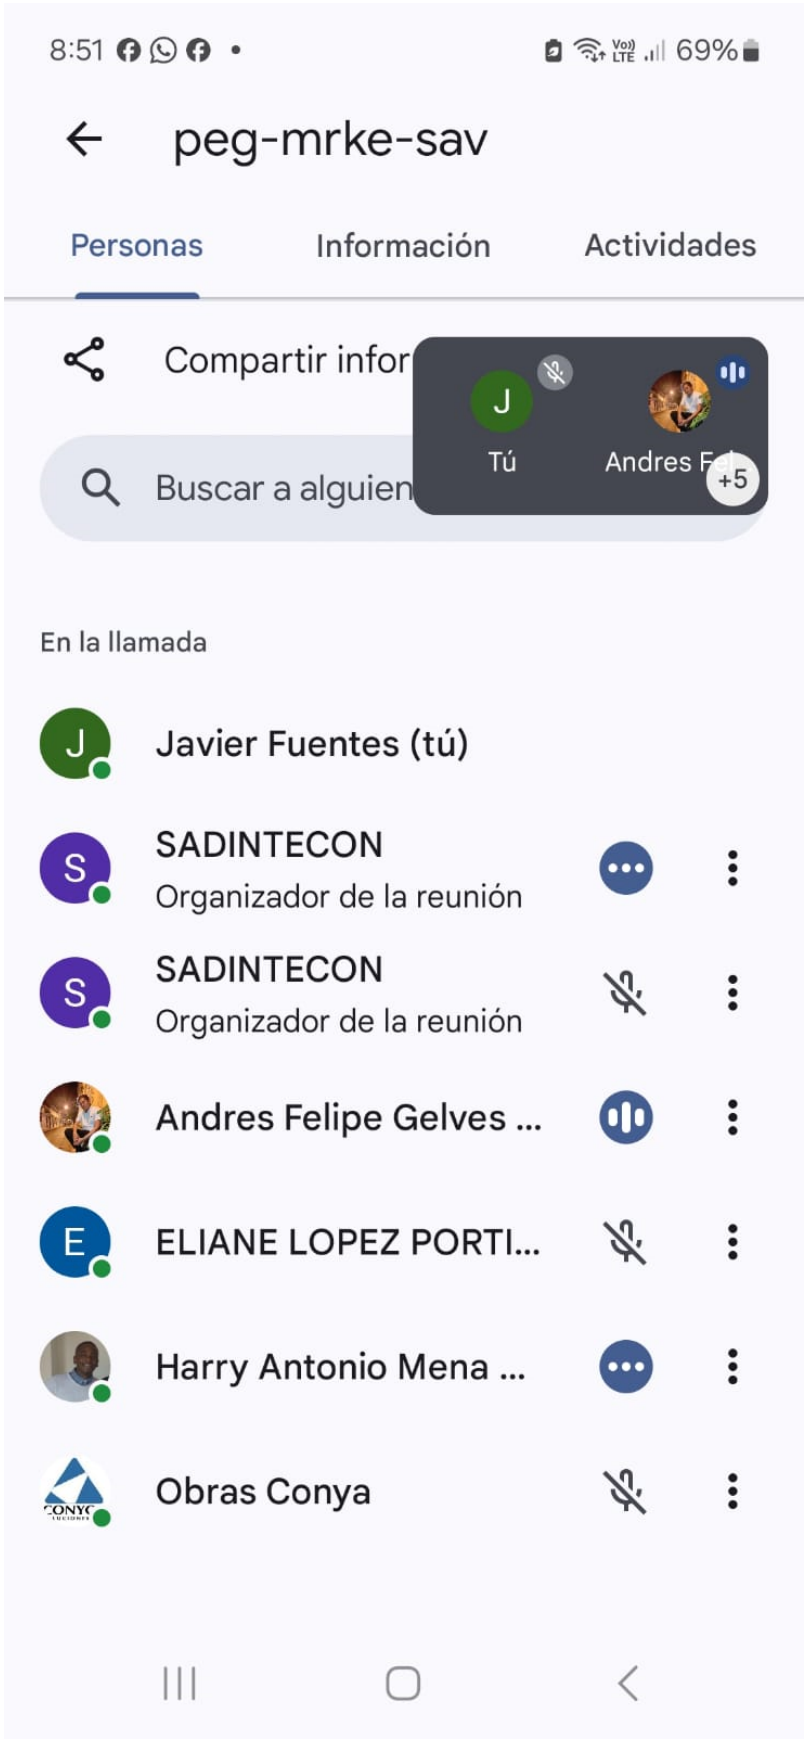
8:51
69%
peg-mrke-sav
Personas
Información
Actividades
Compartir infor
Buscar a alguien
Tú
+5
En la llamada
Javier Fuentes (tú)
SADINTECON
Organizador de la reunión
SADINTECON
Organizador de la reunión
Andres Felipe Gelves ...
ELIANE LOPEZ PORTI...
Harry Antonio Mena ...
Obras Conya

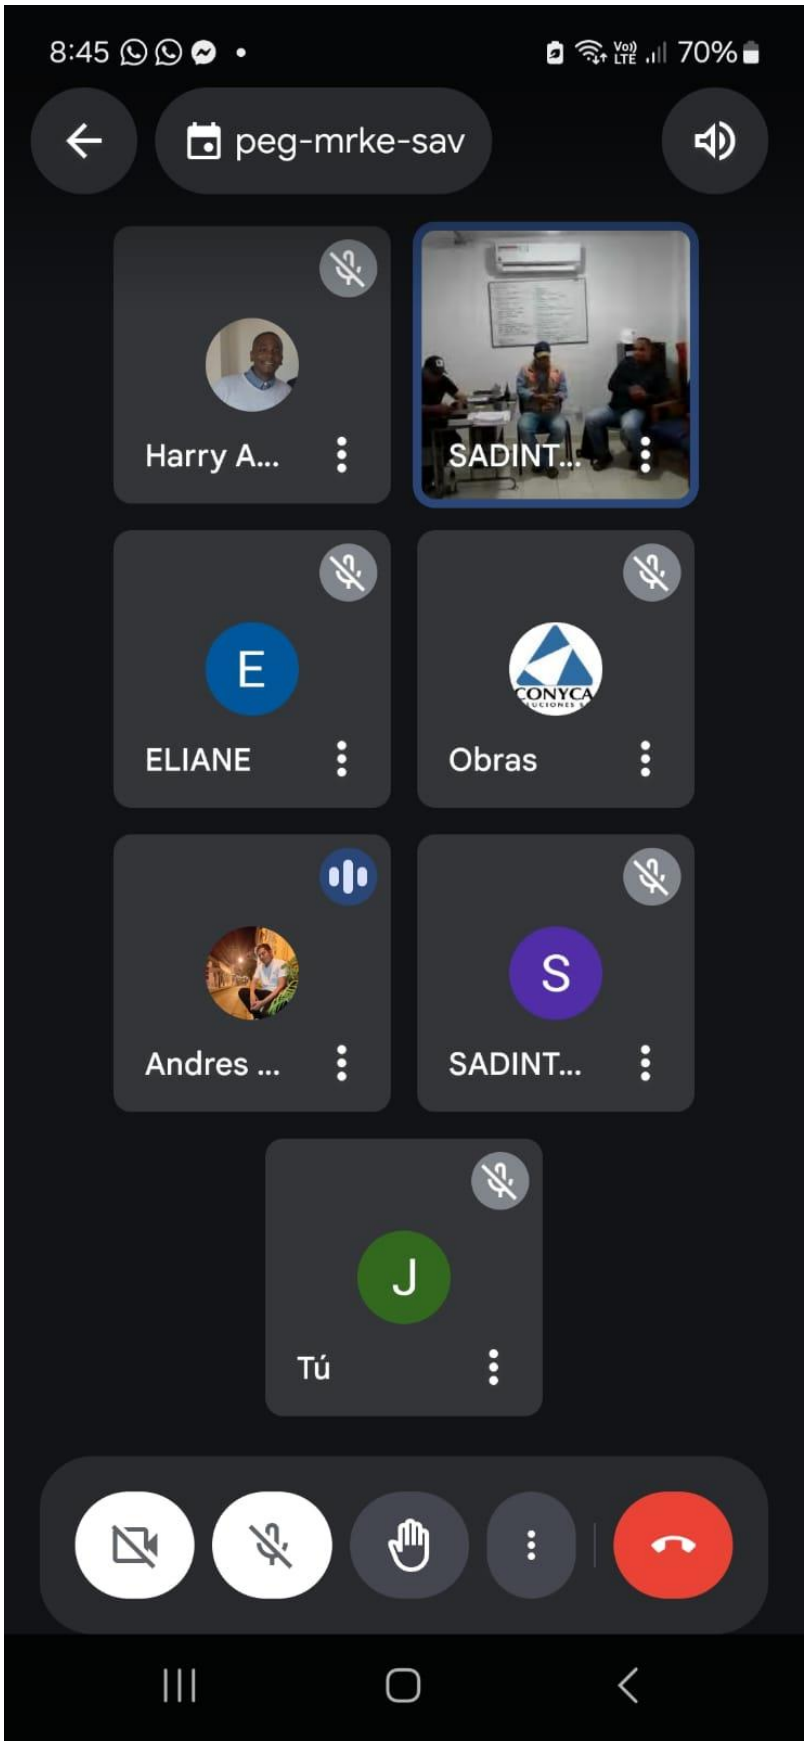
8:45
70%
peg-mrke-sav
Harry A...
SADINT...
E
ELIANE
CONYCA
Obras
Andres ...
S
SADINT...
J
Tú

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de PAGA definitivo por parte de obra a la Interventoría.

COMITÉ TECNICO - (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

PRESENTACION DE DISEÑO - (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría mencionando que uno de los comopromisos adquiridos en el comité anterior es la presentación del diseño de pavimento en el sector caño flores (ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE TERRAPLÉN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA) y de esta manera validar estos diseños e iniciar con esta actividad lo antes posible.

El contratista de obra toma la palabra mencionando que ya se realizaron los ensayos de laboratorio pertinentes para obener el diseño y dosificación para la capa estabilizada. De esta manera expone y explica cada uno de los parámetros de diseño establecidos para incorporar esta capa estabilizada con sales inorganicas al diseño estructural del pavimento sector caño flores.

El especialista en pavimentos de la Interventoría toma la palabra y cuestiona acerca del proceso constructivo que se pretende llevar a cabo; de esta manera menciona que para este tipo de material (Arcilla CL estabilizada con arena y grava) se debe tener en cuenta que la lluvia puede incidir negativamente en la capa estabilizada. por esta razon se recomineda que una vez se extienda y se compacte No se puede dejar mucho tiempo en contacto con el agua lluvia , ya que esto generaría efectos negativos en las densidades. por esta razón es necesario iniciar lo mas pronto posible con la imprimación y aplicacion de MDC-19 .

El contratista de obra acepta la recomendación por parte de la interventoría y se compromete a entregar en los proximos 3 días los diseños definitivos para la capa estabilizada y una vez la interventoria realice sus observaciones poder dar inicio a esta actividad.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE DISEÑOS DEFINITIVOS - ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA.	25/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
INICIO DE ACTIVIDAD - CAPA ESTABILIZADA	26/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/10/2024 (Dia / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.


3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Adolfo Becerra Gil	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Hernando muñoz Lara	Especialista en Pavimentos	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Carlos Alberto Zapata	Especialista en Geologia	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

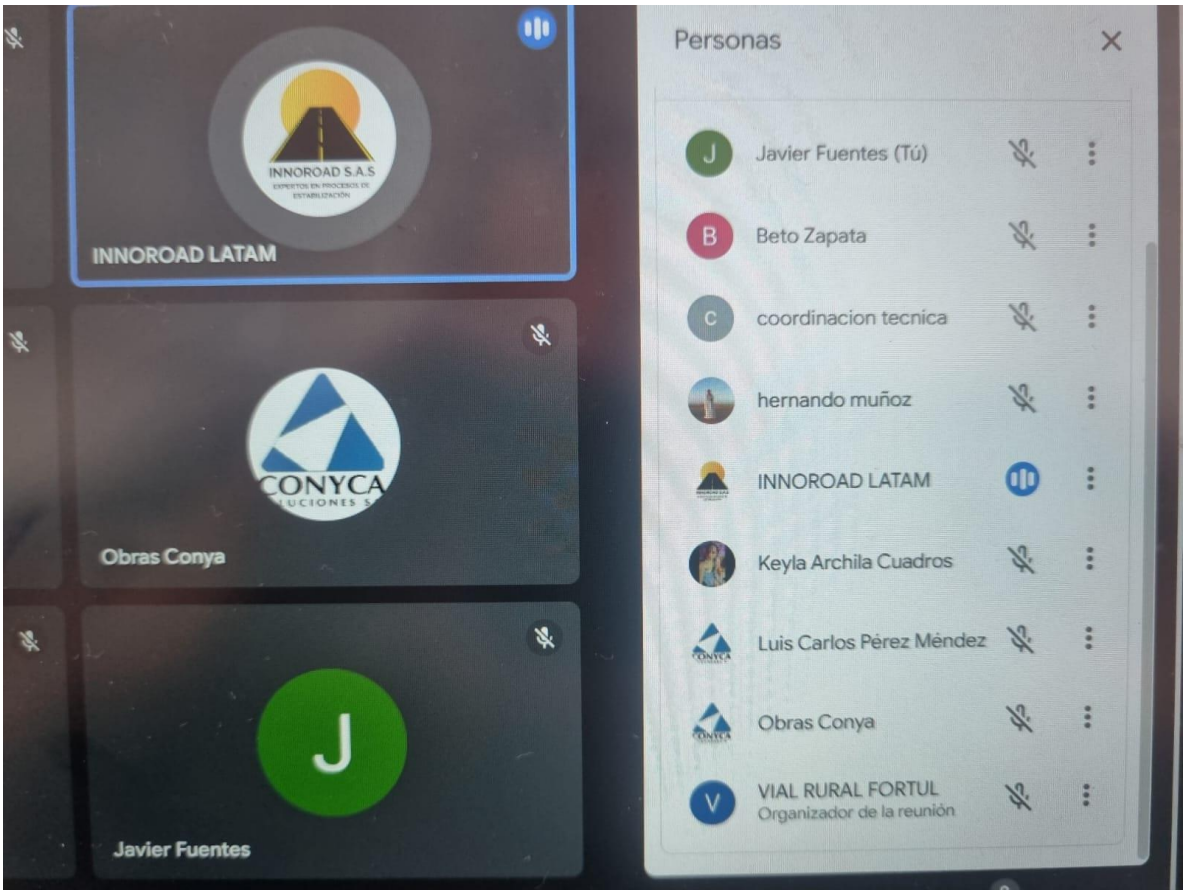


INNOROAD S.A.S
INNOROAD LATAM
CONYCA
Obras Conya
J
Javier Fuentes
Personas
Javier Fuentes (Tú)
Beto Zapata
coordinacion tecnica
hernando muñoz
INNOROAD LATAM
Keyla Archila Cuadros
Luis Carlos Pérez Méndez
Obras Conya
VIAL RURAL FORTUL
Organizador de la reunión

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de PAGA definitivo por parte de obra a la Interventoría.

Gestión de tramites ambientales y entrega de las observaciones realizadas por parte de la interventoría al PAGA del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.

Revisar el cumplimeinto de los compromisos adquiridos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría exponiendo los compromisos adquiridos en el comité anterior y mencionando que es nesario dar cumplimiento a cada uno de éstos, para que el proyecto avance de manera adecuada. De igual manera en el presente comité se realiza para presentar los avances del proyecto , conocer los por menores, inquietudes y de ser necesario tomar acciones para contribuir al desarrollo normal del proyecto.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoría por medio de su Residente ambiental manifiesta su preocupación desde el componente ambiental debido a que existía un compromiso por parte del contratista de obra para entregar el PAGA definitivo y no se ha dado cumplimiento, de esta manera establece una fecha definitiva a más tardar el 28 de cotubre o de lo contrario habria que tomar acciones al respecto. El residente ambiental del contratista de obra toma la palabra y se muestra de acuerdo con lo anterior.

COMPONENTE SOCIAL:

Desde el componente social se menciona que para la próxima semana están programados comités de veeduría ciudadana (jueves y viernes) para lo cual se le realizará el acompañamiento por parte de la interventoría. El contratista de obra manifiesta que estas actas de vecindad ya estan realizadas y serán remitidas a la interventoría para su revisión en el transcurso de la semana próxima.

COMPONENTE SST:

Desde el componente SST se Reitera que han existido recomendaciones por parte de la interventoría respecto a la relación de personal en campo, por otra parte se recomienda al contratista de obra que se de puntualidad a la entrega de informes mensuales de SST. Adicionalmente se se reitera que es necesario preveer que se presentarán mas actividades simultáneamente, lo cual es importante aplicar el plan de señalización de manera efectiva y si es necesario realizar algunos ajustes, de tal manera que se garantice la seguridad dentro del

COMPONENTE TÉCNICO:

Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (17/10/2024) presenta un avance ejecutado acumulado financiero de 49,39% y Fisico del 47 %, y que según el seguimiento a la programación contractual el proyecto presenta un atraso en su ejecución. Por otra parte se menciona que aún no se iniciado ni entregado ningún avance en lo que tiene que ver con la actividad (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA), de esta manera se advierte que si esta actividad no se realiza según el cronograma establecido, se generará un atraso significativo en las próximas semanas.

La secretaría de planeación del municipio de Fortul menciona que es importante priorizar la ruta crítica de la programación para evitar atrasos e incovenientes en el cumplimiento del contrato. A partir de esto manifiesta su preocupación y solicita al contratista de obra que de inicio lo más pronto posible a las activades de ruta crítica. Por último se agradece la asistencia al presente comité y se establece que se realizarán cada 8 dias en las instalaciones de la alacaldía.

Finalmente el contratista de obra manifiesta que el dia 19 de octubre se realizará un comité técino, cuya finalidad es presentar a la interventoría el los diseños y muestras por parte del proveedor de la capa Estabilizada con Sal inorgánica. De esta manera la interventoría realizará el acompañamiento a dicho comité con los Especialistas en el área junto con el contratista de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Realizar la entrega del PAGA definitivo actualizado	28/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Entrega de actas de vecindad definitivas - Tramo Adicional Caño flores.	25/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
COMITÉ TECNICO - (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA)	19/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON.
Comité con veeduría ciudadana	24/10/2024 -25/10/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/10/2024 (Dia / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.


3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Gustavo Adolfo Becerra Gil	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Eliane Lopez Portilla	Profesional Social Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

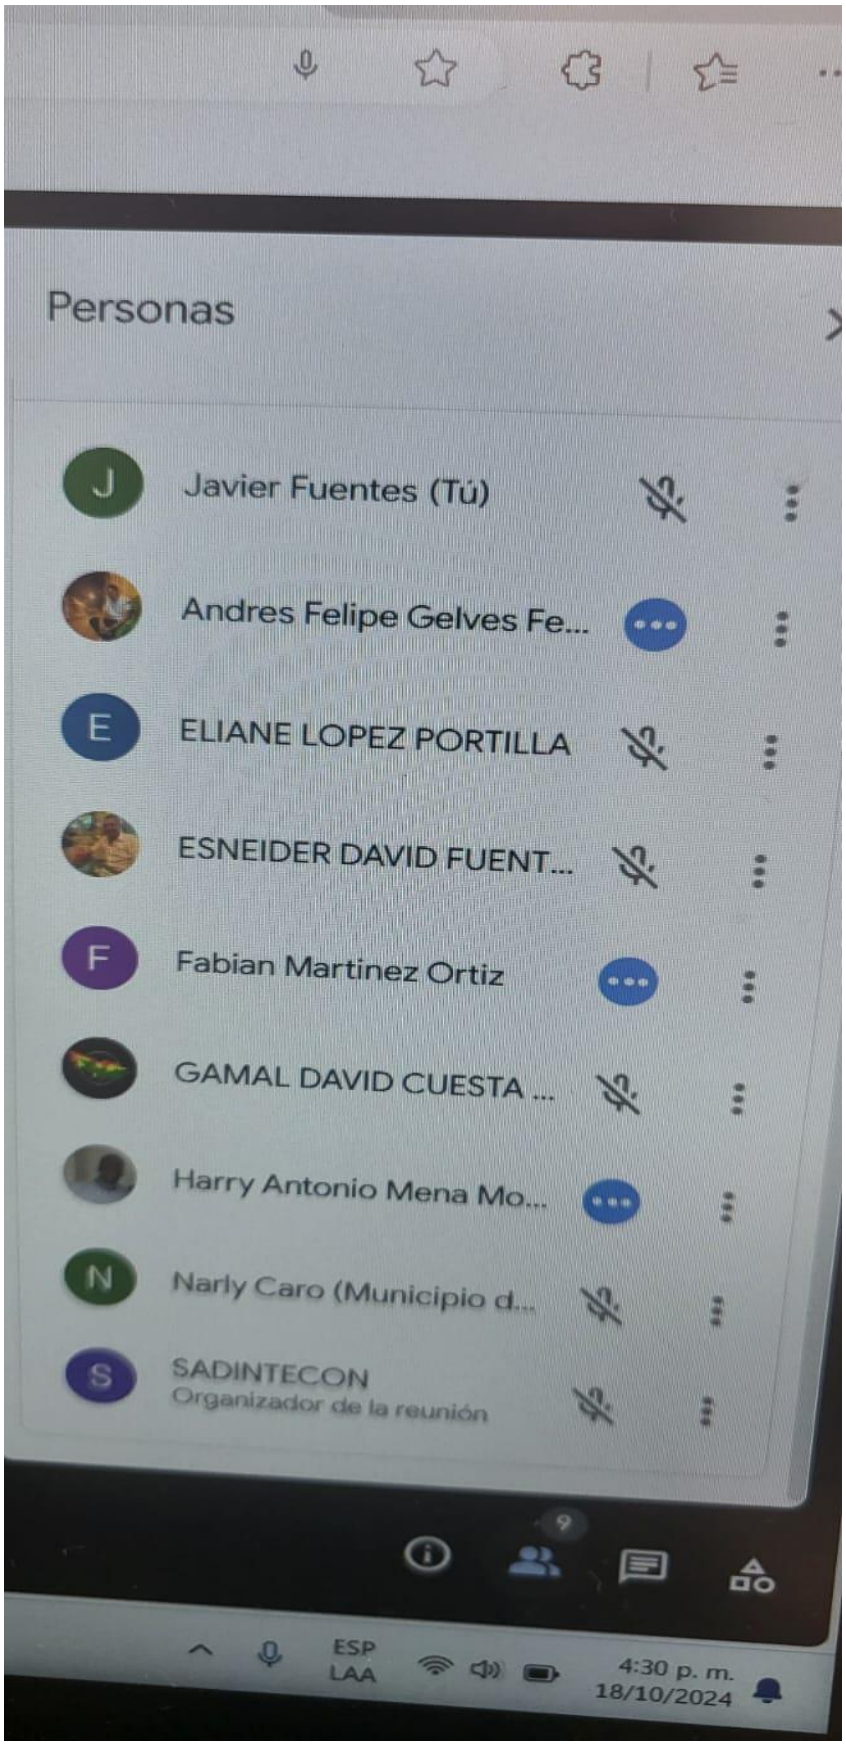


Personas
Javier Fuentes (Tú)
Andres Felipe Gelves Fe...
ELIANE LOPEZ PORTILLA
ESNEIDER DAVID FUENT...
Fabian Martinez Ortiz
GAMAL DAVID CUESTA ...
Harry Antonio Mena Mo...
Narly Caro (Municipio d...
SADINTECON
Organizador de la reunión
ESP
LAA
4:30 p. m.
18/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 23
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de PAGA definitivo por parte de obra a la Interventoría.

Entrega de acta de vecindad (Adicional de valor 01) , para revisión de la interventoría.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.

Revisar el cumplimeinto de los compromisos adquiridos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría exponiendo los compromisos adquiridos en el comité anterior y mencionando que es necesario dar cumplimiento a cada uno de éstos, para que el proyecto avance de manera adecuada. De igual manera el presente comité se realiza para presentar los avances del proyecto , conocer los por menores, inquietudes y de ser necesario tomar acciones para contribuir al desarrollo normal del proyecto.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoría por medio de su Residente ambiental menciona que a parte de los compromisos por cumplir referentes al PAGA, existe un tema pendiente por definir como lo es "la compensación ambiental" . El día 24 de octubre se sostuvo una reunión con la veeduría donde manifestaron que a la fecha aún no se define las actividades correspondientes para el tema de compensación ambiental, de esta manera la veeduría ciudadadana solicitó que se aclare este tema. La interventoría solicita al municipio y al contratista de obra que por favor realicen esta gestión con Corporinoquia, y que una vez se defina esta sotuación se remita la información para hacer la revisión, ajustes y aprobación.

El contratista de obra menciona que junto con el municipio se han realizado acercamientos con la autoridad ambiental (Corporinoquia) y que está a la espera de una respuesta definitiva de lo refrente a la compensación ambiental del proyecto, una vez se tenga esta respuesta se realizarán los ajustes pertinentes y la posterior socialización con la comunidad.

COMPONENTE SOCIAL:
Desde el componente social se menciona que el contratista de obra ya entregó la documentación que estaba pendiente por entregar y que ya está en manos de la interventoría realizar la gestión y tratamiento a esta información . Por otra parte se menciona que el día 24 de octubre se realizó una reunión con la veeduría en donde surgieron las dudas referentes a la compensación ambiental. Ademas de esto la interventoría por medio de su profesional social recomienda que para próximas reuniones se establezca un orden crónologico para el desarrollo de estas reuniones y que se realice la participación de todos de manera adecuada.
COMPONENTE SST:
Desde el componente SST se Reitera que han existido recomendaciones por parte de la interventoría respecto a la relación de personal en campo, a la fecha ya se realizó entrega de la relación de personal sin embargo la interventría realizo unas observaciones que para el mes de septiembre ya fueron subsanadas. Adicionalmente se se reitera que es necesario preveer que se presentarán mas actividades simultáneamente, lo cual es importante aplicar el plan de señalización de manera efectiva. El contratista de obra menciona que ya en campo cuenta con Maletines adicionales y señalización adicional para garantizar una movilidad segura en la obra .
COMPONENTE TÉCNICO:
Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (24/10/2024) presenta un avance ejecutado acumulado financiero de 52,45% y que según el seguimiento a la programación contractual el proyecto presenta un atraso de 5,31 % en su ejecución. Por otra parte se menciona que aún no se iniciado ni entregado ningún avance en lo que tiene que ver con la actividad (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA), de esta manera se advierte que si esta actividad no se realiza según el cronograma establecido, continuará en aumento el atraso.
La secretaría de planeación del municipio de Fortul menciona que es importante priorizar la ruta crítica de la programación para evitar atrasos e incovenientes en el cumplimiento del contrato. De esta manera solicita al contratista de obra que inicie lo mas pronto posible con la actividad referente a capa estabilizada con sal inorgánica y que por favor tenga en cuenta que no se han realizado el movimiento de la red eléctrica que interfiere con el diseño geométrico del proyecto en el sector caño flores.
Finalmente el contratista de obra manifiesta que en ya radicó los ensayos y diseños de la capa estabilizada a la interventoría , para su respectiva aprovación y revisión. Por otra parte manifiesta que para la próxima semana tiene programado iniciar con esta actividad.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
DEFINIR COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA	1/11/2024	MUNICIPIO DE FORTUL - CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
INICIO DE ACTIVIDAD - ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE TERRAPLÉN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
PROXIMO COMITÉ	1/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1/11/2024 (Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Eliane Lopez Portilla	Profesional Social Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Andrés Felipe Gelves Ferrer	Ing apoyo ambiental - obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

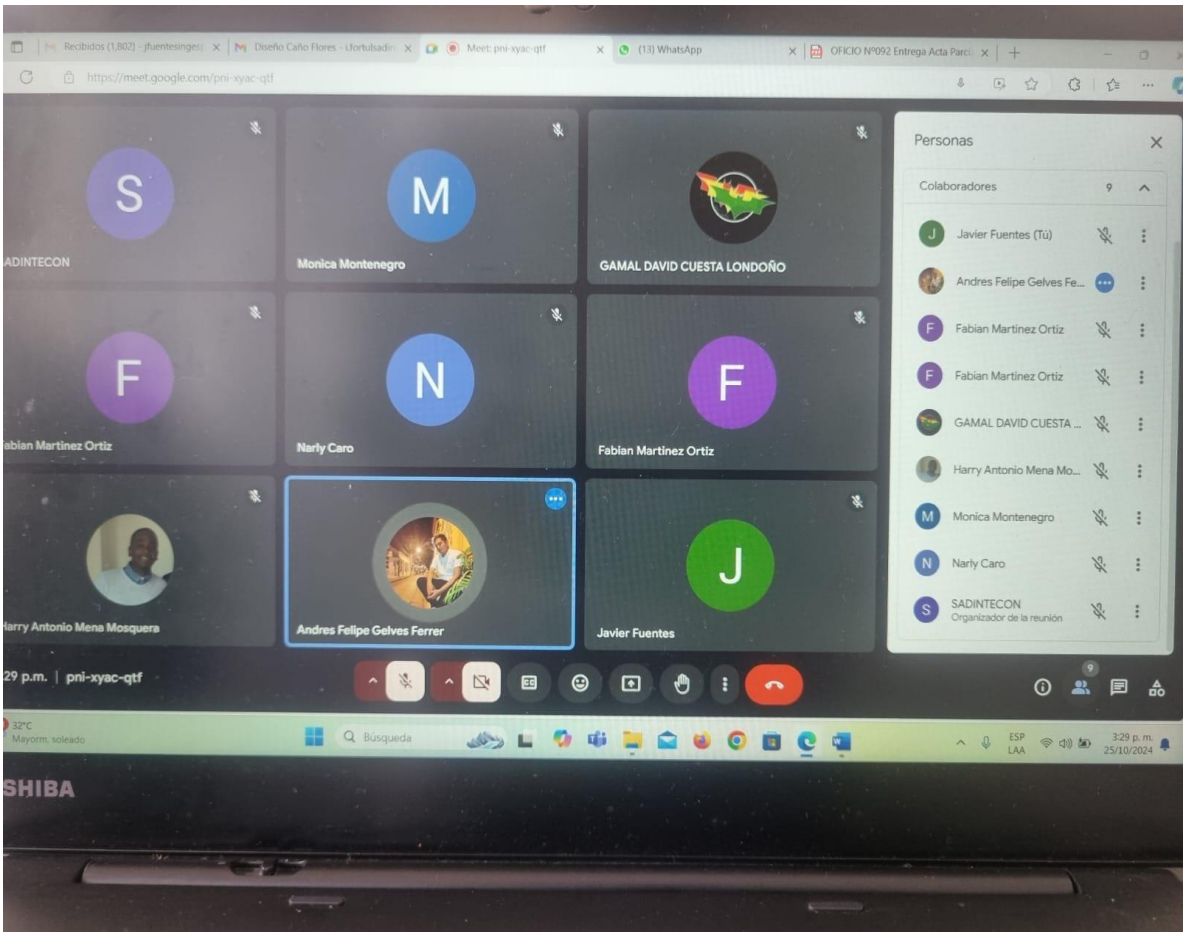
Personas
Colaboradores
Javier Fuentes (Tú)
Andres Felipe Gelves Fe...
Fabian Martinez Ortiz
Fabian Martinez Ortiz
GAMAL DAVID CUESTA ...
Harry Antonio Mena Mo...
Monica Montenegro
Narly Caro
SADINTECON
Organizador de la reunión
Monica Montenegro
GAMAL DAVID CUESTA LONDOÑO
Narly Caro
Fabian Martinez Ortiz
Andres Felipe Gelves Ferrer
Javier Fuentes
pni-xyac-qtf

ANEXO O

MEPI-MN-IN-14-FR-2

Actas de Reunión

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1.

FECHA: 26/oct/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Exponer el avance actual del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Avance de proyecto
- Dudas e inquietudes

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a las 10:26

Se hace presentación del personal de interventoría, se da a conocer el objetivo de la reunión y se pregunta si se va a tratar otro tema.

Toma la palabra el ing Adalberto quien expone información general del contrato de obra, menciona que en cuanto al sector de palmarito va bien, que se ha ido avanzando, que falta una alcantarillo y que esta se dejo de ultima por el paso de tanto paso y que esta será intervenida proximamente.

Tambien menciona que proximamente se inicia con la señalización La comunidad pregunta por la posibilidad de hacer un reductor de velocidad; a esto el ingeniero contratista responde que el proyecto no contempla reductores de velocidad.

El ingeniero de obra menciona que a fecha de la semana pasada se tenía un 1% de atraso.

Desde el componente Social se informan las actividades desarrolladas durante el mes de octubre, las actividades con el personal de la obra y la comunidad.

Con respecto del componente ambiental el ingeniero de obra menciona la compensación ambiental y explica que se está a la espera de una reunión con coorporinoquía, veedurías, interventoria contratista y alcaldía municipal.

Toma la palabra el director de interventoría quien menciona que por medio de coorporinoquia es quien determina esa ofalización y

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

que ya existe una resolución, y que se está a la espero de que se dé la pecha de la reunion.
Representante de la veeduría reitera la intencion de que se haga un reductor de velocidad en el K0+000, el director de interventoría pide la palabra y expresa la importancia de hacer estas peticiones a traves de una solicitud escrita y firmada por la veeduría
La veeduría menciano su preocupacion con respecto del asfalto y algunas partes donde dicen se ve
La interventoría toma la palabra y explica que el asfalto tiene un tiempo de curado y que este esta sujeto a cambios segun el olima y se han implementado procesos para darle más consistencia. y que hasta ahora este se ha mantenido en el rango correcto, tambien menciona que se detecto un fallo y se va a esperar para arreglarlo.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	4

FECHA: 26/oct/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Esneider Fuentes	Res. Interventoría	CONSORCIO SADINTECON	
Luis Felipe Hessa	Veedor	J.A.C.	Luis F Hessa
Henry D Herrera	VC. Presidente	J.D.C Palmarito	Henry Herrera
Bernabe Daza	Delegado	J.A.C.	Bernabe
María Rosalba C.	Presidenta	J.A.C.	María Rosalba C.
Julio H Rojas M.	Tesorero	JAC Palmarito	
Nilson Rios	Tesorero	JAC	
Omaira Vega A	Veeduria	J.A.C	
Javier E. Fuentes C.	Director Interventoría	CON. SADINTECON	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-04-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

FECHA (Día / Mes / Año)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gina Nieves	Profesional Social	Consorcio Vial R.F	Gina N.
Alberto Alarcón	Director Obra.	Coop Vial Rural F.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 24 / oct / 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Exponer el avance actual del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Avance del proyecto
- Dudas e inquietudes de la comunidad.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 4:00pm.
El ingeniero de obra inicia manifestando que el terraplen del tramo adicional va en un 70 a 80% y que los tiempos se siguen desarrollando con normalidad de 10 a 15 días podría llegar al nivel.

Con el número de alcantarillas manifiesta que se está avanzando con estas estructuras, así mismo menciona que especialistas de contratista, interventoría se han reunido para evaluar el tema de las sales, y que este diseño se entregó a la interventoría y que se espera que en aprox en 15 días se inicia a trabajar con las sales.
Un representante de la comunidad manifiesta su preocupación debido a que en el tramo adicional se está depando material y que la motoniveladora lo extiende y en ocaciones las motos se entienden.
Toma la palabra el ingeniero residente se compromete con que a partir de hoy el material se va a dejar el material señalizado.

El ingeniero de obra menciona el tema de la electricidad con respecto del movimiento de postes y dice que se está a la espera de que los postes lleguen de Arauca.

Un representante de la comunidad manifiesta su interes de que se mejore la vía desde donde se ha sacado material y a esto el ingeniero contratista dice que se van a arreglar donde se ha dañado.

Un representante de la comunidad manifiesta su preocupación por la poca presencia de la interventoría, a esto el ingeniero Esteban representante de la ~~interventoria~~ interventoria manifiesta que que desde el inicio el trabajo se está haciendo con la comunidad y procede a presentar el equipo de interventoría.

La comunidad manifiesto su preocupación por el tema de la compensación ambiental del proyecto debido a que a la fecha aún no se le ha informado de manera precisa cuándo, como, y que se va a implementar. El contratista de obra, interventoría y comunidad proponen una reunión entre alcaldía, interventoría, corporinoquia y comunidad para darle claridad a este punto, porque hasta ahora no hay nada aprovado.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
		FECHA	24/oct/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programar reunión con alcaldía municipal, interventoría, veeduría para tratar el tema ambiental.		Interventoría y contratista de obra.
· Ubicacion o reubicación de postas.		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Esteban Pico Mendez	Ing. Aux. Interventoría	CONSORCIO SABINTECON	
Elaine Lopez P.	Prof. Social	CONSORCIO SABINTECON	
Canal Cuesta L.	prof Ambiental	" "	
Esneider Fuentes	Res. Interventoría	CONSORCIO SABINTECON	
Yesica L. Sabogal M.	Ute SST Contratista	CONSORCIO VIAL RURAL PATRUL	
YEROUINSON BURGOS	VEEDURIA	J.A.C.	
Maria Isaisa Rios	Veeduria -	J A C	
Javier Ortiz C	Veeduria	J.A.C.	
Benjamin Duran	Vocal caño Flores	delegad- JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

FECHA: 24 / oct / 2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DUVERLIS PINTO	VEEDORA		
ALFREDO TORRES	VEEDOR	IAC SONFRANSISCO	
JAVIER E. FUENTES C.	DIRECTOR INTV	CON. SADINTECON	
ADALBERTO ALARCÓN	DIRECTOR OBRA	CONCOVIAL PORAC F	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

ANEXO P

Informes especialistas y profesionales

ANEXO Q

Informe del Programa Anual de Caja - PAC

ANEXO R

Informe matriz de riesgos.


MATRIZ DE RIESGOS


AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.


No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	miento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimineto
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Prolongación del tiempo planeado por la entidad para el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Secretaria de planeación Municipal involucradas en el proyecto	♦ Retraso en la iniciación del contrato de obra ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	Proponente o contratista	♦ Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. ♦ FDLUSA como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de inicio y Acta e terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.	No se ha materializado el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto, de variaciones en el alcance de las intervenciones	♦ Disminución del alcance del contrato.	2	1	3	Bajo	Municipio de Fortul	♦ Modificar elcontrato en su valor y en los anexos técnicos. ♦ Control del presupuesto. ♦ Control delalcance del proyecto.	1	1	2	Bajo	SI	Coordinador / Supervisor	Acta de inicio y Acta e terminación	♦ Control delpresupuesto ♦ Control decantidades de obra	Quincenal	No se ha materializado el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Climático	Condiciones climáticas o ambientales que se encuentren por fuera del registro esperado según el comportamiento histórico.	♦ Posibles retrasos en la ejecución, daños a Obras ya ejecutadas.	1	4	5	Medio	Proponente o contratista	♦ Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de obra. ♦ Determinaciónde acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. ♦ Presentaciónde plan de contingencia por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal /Contratista	1. Etapa de formulación 2. Fecha actade inicio 1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas	Semanal	No se ha materializado el riesgo
4	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Contagio de un trabajador por COVID 19	♦ Demoras en el desarrollo de las actividades de obra.	4	4	8	Extremo	Proponente o contratista	♦ Control de los trabajadores con los protocolos establecidos	3	2	4	Alto	SI	Contratista	Acta de inicio y Acta e terminación	Seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19 (PAPSO).	Semanal	No se ha materializado el riesgo
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual aprobado y soportes respectivos) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	♦ Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro.	4	2	6	Alto	Proponente o contratista	♦ Establecer fechas de corte de obra cada mes y presentación de factura máximo al día 10 de cada mes.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2. Fecha actade inicio 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la Alcaldía Local.	Mensual	Se materializó el riesgo, no se han radicado facturas a la fecha ante la Entidad

ANEXO S

Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

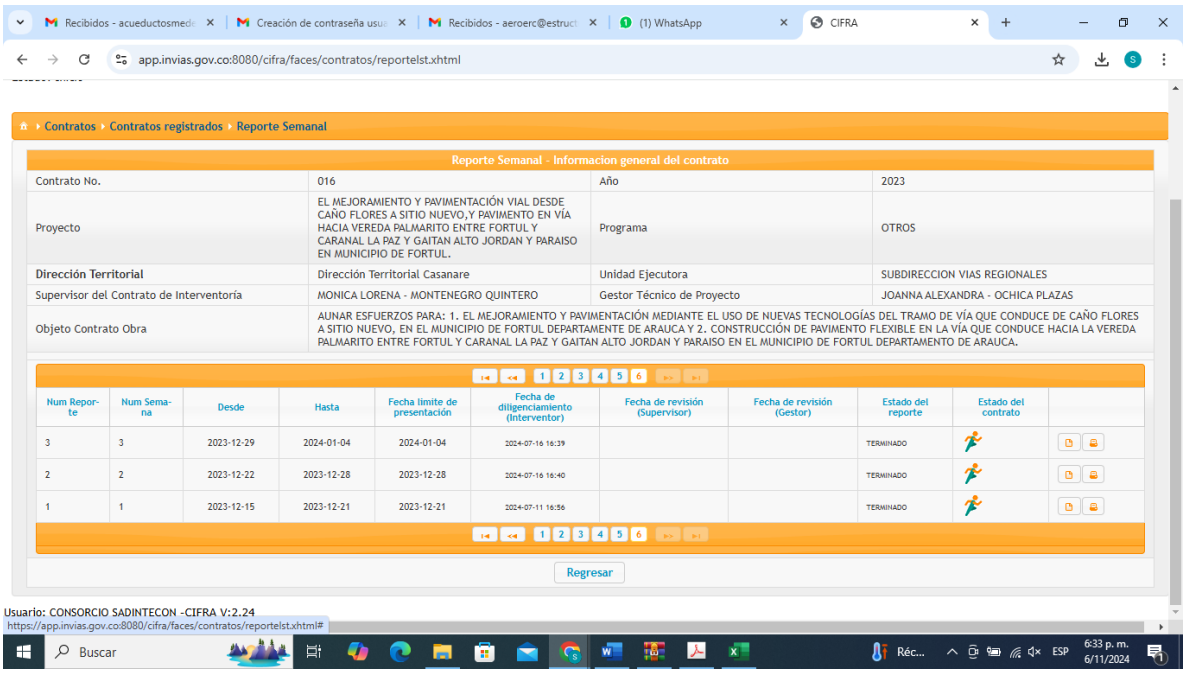
Recibidos - acueductosmed
Creación de contraseña usu
Recibidos - aeroerc@estruct
(1) WhatsApp
CIFRA
app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/reportelst.xhtml
Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal
Reporte Semanal - Informacion general del contrato
Contrato No. 016 Año 2023
Proyecto EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIAL DESDE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO,Y PAVIMENTO EN VÍA HACIA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN MUNICIPIO DE FORTUL. Programa OTROS
Dirección Territorial Dirección Territorial Casanare Unidad Ejecutora SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría MONICA LORENA - MONTENEGRO QUINTERO Gestor Técnico de Proyecto JOANNA ALEXANDRA - OCHICA PLAZAS
Objeto Contrato Obra AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTE DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Num Reporte | Num Semana | Desde | Hasta | Fecha limite de presentación | Fecha de diligenciamiento (Interventor) | Fecha de revisión (Supervisor) | Fecha de revisión (Gestor) | Estado del reporte | Estado del contrato
3 | 3 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-07-16 16:39 | | | TERMINADO
2 | 2 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-16 16:40 | | | TERMINADO
1 | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-07-11 16:56 | | | TERMINADO
Regresar
Usuario: CONSORCIO SADINTECON -CIFRA V:2.24
https://app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/reportelst.xhtml#
Buscar
Réc...
ESP
6:33 p. m.
6/11/2024

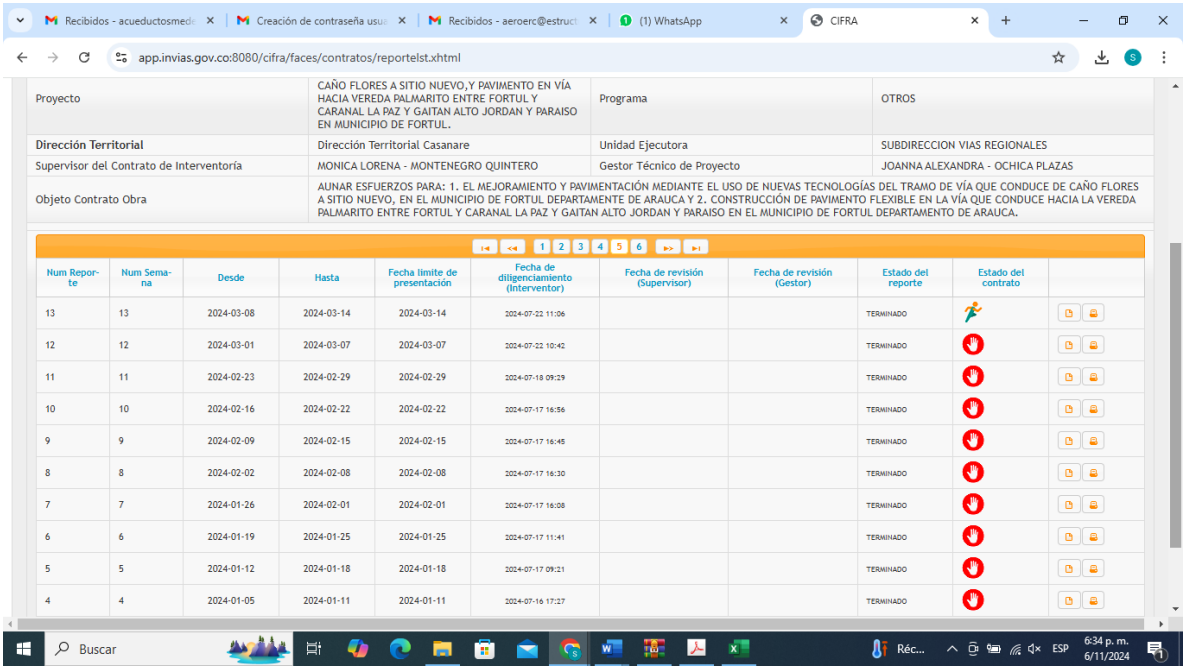
Recibidos - acueductosmed
Creación de contraseña usu
Recibidos - aeroerc@estruct
(1) WhatsApp
CIFRA
app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/reportelst.xhtml
Proyecto CAÑO FLORES A SITIO NUEVO,Y PAVIMENTO EN VÍA HACIA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN MUNICIPIO DE FORTUL. Programa OTROS
Dirección Territorial Dirección Territorial Casanare Unidad Ejecutora SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría MONICA LORENA - MONTENEGRO QUINTERO Gestor Técnico de Proyecto JOANNA ALEXANDRA - OCHICA PLAZAS
Objeto Contrato Obra AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTE DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Num Reporte | Num Semana | Desde | Hasta | Fecha limite de presentación | Fecha de diligenciamiento (Interventor) | Fecha de revisión (Supervisor) | Fecha de revisión (Gestor) | Estado del reporte | Estado del contrato
13 | 13 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-07-22 11:06 | | | TERMINADO
12 | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-07-22 10:42 | | | TERMINADO
11 | 11 | 2024-02-23 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-07-18 09:29 | | | TERMINADO
10 | 10 | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-07-17 16:56 | | | TERMINADO
9 | 9 | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-07-17 16:45 | | | TERMINADO
8 | 8 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-07-17 16:30 | | | TERMINADO
7 | 7 | 2024-01-26 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-07-17 16:08 | | | TERMINADO
6 | 6 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-07-17 11:41 | | | TERMINADO
5 | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-07-17 09:21 | | | TERMINADO
4 | 4 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-07-16 17:27 | | | TERMINADO
Buscar
Réc...
ESP
6:34 p. m.
6/11/2024

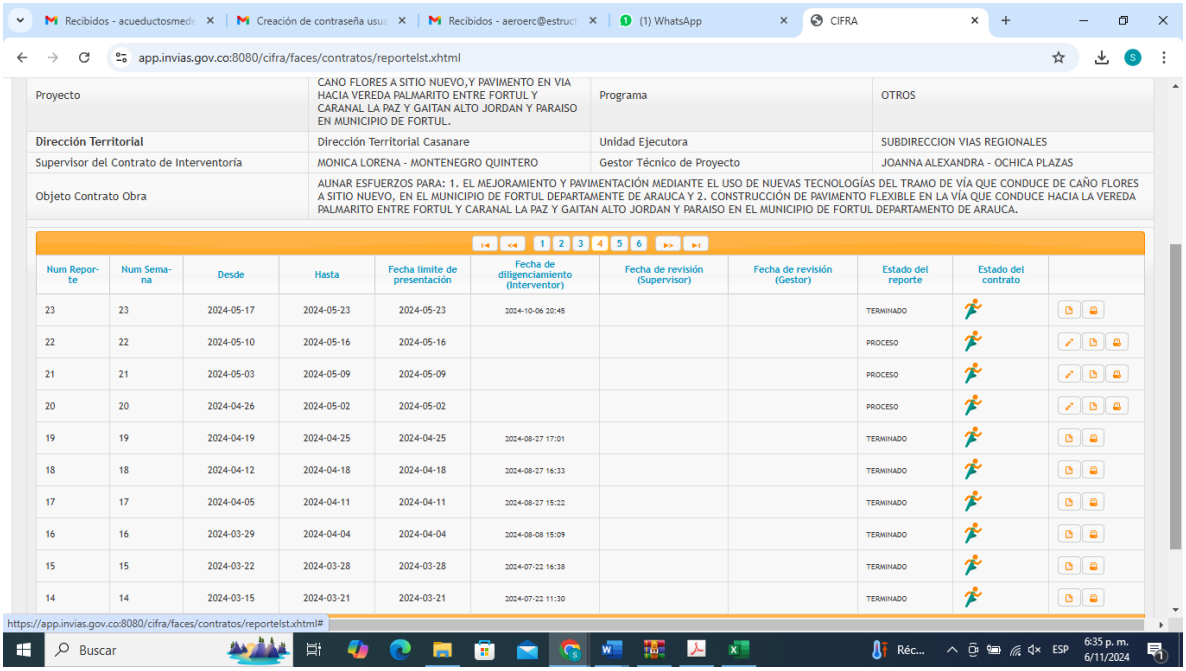
Recibidos - acueductosmedi
Creación de contraseña usua
Recibidos - aeroerc@estruct
(1) WhatsApp
CIFRA
app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/reportelst.xhtml
Proyecto
CANO FLORES A SITIO NUEVO,Y PAVIMENTO EN VIA HACIA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN MUNICIPIO DE FORTUL.
Programa
OTROS
Dirección Territorial
Dirección Territorial Casanare
Unidad Ejecutora
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría
MONICA LORENA - MONTENEGRO QUINTERO
Gestor Técnico de Proyecto
JOANNA ALEXANDRA - OCHICA PLAZAS
Objeto Contrato Obra
AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTE DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
1 2 3 4 5 6
Num Reporte
Num Semana
Desde
Hasta
Fecha limite de presentación
Fecha de diligenciamiento (Interventor)
Fecha de revisión (Supervisor)
Fecha de revisión (Gestor)
Estado del reporte
Estado del contrato
23 23 2024-05-17 2024-05-23 2024-05-23 2024-10-06 20:45 TERMINADO
22 22 2024-05-10 2024-05-16 2024-05-16 PROCESO
21 21 2024-05-03 2024-05-09 2024-05-09 PROCESO
20 20 2024-04-26 2024-05-02 2024-05-02 PROCESO
19 19 2024-04-19 2024-04-25 2024-04-25 2024-08-27 17:01 TERMINADO
18 18 2024-04-12 2024-04-18 2024-04-18 2024-08-27 16:33 TERMINADO
17 17 2024-04-05 2024-04-11 2024-04-11 2024-08-27 15:22 TERMINADO
16 16 2024-03-29 2024-04-04 2024-04-04 2024-08-08 15:09 TERMINADO
15 15 2024-03-22 2024-03-28 2024-03-28 2024-07-22 16:38 TERMINADO
14 14 2024-03-15 2024-03-21 2024-03-21 2024-07-22 11:30 TERMINADO
https://app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/reportelst.xhtml#
Buscar
Réc...
ESP
6:35 p. m.
6/11/2024

ANEXO T

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

ANEXO U

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	Placa GEN540 Marca NISSAN Linea NP300 FRONTIER Modelo 2020	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
CAMIONETA	Placa FUP887 Marca RENAULT Linea DUSTER Modelo 2020	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
Motocicleta	Motocicleta Pulsar 180CC WTE67D 2016	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
Motocicleta	Motocicleta Benelli TRK 500cc UGB78F 2022	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
ESTACIÓN TOTAL	Marca GOWIN REFERENCIA TKS202" serie. 8A8171	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Javier Enrique Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214 STD

Firma Mónica Montenegro Q.
Nombre: Mónica Lorena Montenegro Quintero
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO V

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO DE OBRA No.: 016 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	BECERREA GIL GUSTAVO ADOLFO	10.269.301	Director de Interventoría	$ 518.000	X	X																													7	GRUPO INTECON SAS	$ 518.000	$ 36.100	V	EPS SURA	73726235	$ 20.700	PORVENIR	73726235	$ 82.880	$ 20.700			RETIRO
2	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	13.721.542	Director de Interventoría	$ 6.882.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93	CONSORCIOSADINTECON	$ 6.882.000	$ 479.000	V	EPS SURA	73728947	$ 275.300	PORVENIR	73728947	$ 1.101.120	$ 275.300			INGRESO
3	FUENTES ZARATE ESNEIDER DAVID	79.788.059	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 5.400.000	$ 375.900	V	EPS SANITAS	73728947	$ 216.000	COLFONDOS	73728947	$ 864.000	$ 216.000			
4	BORRERO CAMPOS RUBÉN ALONSO	13702878	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	GRUPO INTECON SAS	$ 5.400.000	$ 375.900	V	NUEVA EPS	73726235	$ 216.000	COLPENSIONES	73726235	$ 864.000	$ 216.000			
5	PICO MENDEZ ESTEBAN	1.095.820.682	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 3.150.000	$ 219.300	V	NUEVA EPS	73728947	$ 126.000	PORVENIR	73728947	$ 504.000	$ 126.000			
6	PALAU VASCO ISABEL CRISTINA	1.037.581.346	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 1.575.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	GRUPO INTECON SAS	$ 1.575.000	$ 109.700	V	EPS SURA	73726235	$ 63.000	COLFONDOS	73726235	$ 252.000	$ 63.000			INGRESO
7	LOPEZ PORTILLA ELIANE LIZETH	1.098.632.763	Profesional Social	$ 2.050.000				X	X	X	X	X					X	X	X	X	X							X	X	X	X	X			50	GRUPO INTECON SAS	$ 2.050.000	$ 142.700	V	EPS SURA	73726235	$ 82.000	COLPENSIONES	73726235	$ 328.000	$ 82.000			
8	CUESTA LONDOÑO GAMAL DAVID	8.026.052	Profesional Ambiental	$ 4.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	GRUPO INTECON SAS	$ 4.100.000	$ 285.400	V	EPS SURA	73726235	$ 164.000	COLFONDOS	73726235	$ 656.000	$ 164.000			
9	ORTIZ QUINTERO JEINI YOHANA	1.116.854.387	Inspector SST	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 2.450.000	$ 170.600	V	NUEVA EPS	73728947	$ 98.000	PORVENIR	73728947	$ 392.000	$ 98.000			
10	GIRALDO AGUDELO SANDRA MILENA	31.430.623	Inspector SST	$ 1.225.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	GRUPO INTECON SAS	$ 1.225.000	$ 85.300	V	EPS SURA	73726235	$ 49.000	PORVENIR	73726235	$ 196.000	$ 49.000			INGRESO
11	HERNANDEZ POSADA VALERIA	1.152.216.024	Técnico Administrativo	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	73728947	$ 52.000	PORVENIR	73728947	$ 208.000	$ 52.000			
12	JIMENEZ URAB ELKIN DE JESUS	15.505.311	Inspector	$ 460.000	X	X																												7	GRUPO INTECON SAS	$ 460.000	$ 32.100	V	SURA	73728947	$ 18.400	COLPENSIONES	73728947	$ 73.600	$ 18.400			RETIRO
13	SUAREZ ARRUBLA DIEGO ANDRES	1.152.187.904	Inspector	$ 460.000	X	X																												7	GRUPO INTECON SAS	$ 460.000	$ 32.100	V	SURA	73728947	$ 18.400	PROTECCIÓN	73728947	$ 73.600	$ 18.400			RETIRO
14	ZAPATA GARCIA CARLOS ALBERTO*	3.482.037	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 3.250.000				X	X	X	X	X					X	X	X	X	X							X	X	X	X	X			50	CONSORCIOSADINTECON	$ 3.250.000	$ 226.200	V	EPS SANITAS	73728947	$ 130.000	COLPENSIONES	73728947	$ 520.000	$ 130.000			
15	MENA MOSQUERA HARRY ANTONIO*	12.023.693	Especialista Ambiental	$ 3.250.000				X	X	X	X	X					X	X	X	X	X							X	X	X	X	X			50	CONSORCIOSADINTECON	$ 3.250.000	$ 226.200	V	SURA	73728947	$ 130.000	PORVENIR	73728947	$ 520.000	$ 130.000			
16	RUIZ ARDILA EDGAR	1.119.183.687	Inspector	$ 1.840.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93	CONSORCIOSADINTECON	$ 1.840.000	$ 128.100	V	NUEVA EPS	73728947	$ 73.600	PORVENIR	73728947	$ 294.400	$ 73.600			INGRESO
17	AGUIRRE JIMENEZ YEIDER	1.119.184.031	Inspector	$ 1.840.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93	CONSORCIOSADINTECON	$ 1.840.000	$ 128.100	V	NUEVA EPS	73728947	$ 73.600	PORVENIR	73728947	$ 294.400	$ 73.600			INGRESO
																																			$ -													
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 45.150.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 13/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula profesional No. 68202112214 STD

Firma Monica Montenegro Q.
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:39:42 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 10269301		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BECERRA GIL GUSTAVO ADOLFO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	23	23	23	23			F	$ 7.400.000	230301		16 %	$ 5.673.334	$ 907.800	$ 28.400	$ 28.400	EPS010		4 %	$ 5.673.334	$ 227.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 5.673.334	$ 394.900	CCF04	4 %	$ 5.673.334	$ 227.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 907.800	$ 28.400	$ 28.400	$ 227.000	$ 394.900	$ 227.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.813.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:46:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 13702878		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BORRERO CAMPOS RUBEN ALONSO	85001000 - 85		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.250.000	25-14		16 %	$ 6.250.000	$ 1.000.000	$ 31.300	$ 31.300	EPS037		4 %	$ 6.250.000	$ 250.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.250.000	$ 435.000	CCF69	4 %	$ 6.250.000	$ 250.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACASANARE	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.000.000	$ 31.300	$ 31.300	$ 250.000	$ 435.000	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.997.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:43:40 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8026052		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CUESTA LONDOÑO GAMAL DAVID	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 4.100.000	231001		16 %	$ 4.100.000	$ 656.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 4.100.000	$ 164.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 4.100.000	$ 285.400	CCF04	4 %	$ 4.100.000	$ 164.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 656.000	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 285.400	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.269.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:42:56 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098632763		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					LOPEZ PORTILLA ELIANE LIZETH	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.050.000	25-14		16 %	$ 2.050.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.050.000	$ 82.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.050.000	$ 142.700	CCF04	4 %	$ 2.050.000	$ 82.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 82.000	$ 142.700	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:40:46 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037581346		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PALAU VASCO ISABEL CRISTINA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	30	30	30	30					F	$ 6.300.000	231001		16 %	$ 6.300.000	$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	EPS010		4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.300.000	$ 438.500	CCF04	4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	$ 252.000	$ 438.500	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.013.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:48:16 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31430623		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIRALDO AGUDELO SANDRA MILENA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.000.000	230301		16 %	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.000.000	$ 208.800	CCF04	4 %	$ 3.000.000	$ 120.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 04:47:25 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73726235

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-13 15:59:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS				
Documento	NI 901616027	**Dirección**	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13991274		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15505311		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					JIMENEZ URAN ELKIN DE JESUS	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.000.000	25-14		16 %	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.000.000	$ 208.800	CCF04	4 %	$ 3.000.000	$ 120.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 05:04:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73728947

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 13/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SADINTECON		
Documento	NI901742046	**Dirección**	CL 48C #65 A - 3 EDIFICIO GARDENIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TABARES ZULETA RUTH ELENA	**Identificación**	CC 30303454
Total Afiliados	14	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095820682	ESTEBAN PICO MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.150.000	$ 504.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.150.000	$ 126.000	6,960	$ 3.150.000	$ 219.300	(CCF67) COMFIAR	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.300
CC 1110486936	JUAN CARLOS GARCIA SANTAMARIA	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 996.667	$ 39.900	6,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF67) COMFIAR	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 1116854387	JEINI YOHANA ORTIZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF67) COMFIAR	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 1119183687	EDGAR RUIZ ARDILA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.146.667	$ 343.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.146.667	$ 85.900	6,960	$ 2.146.667	$ 149.500	(CCF67) COMFIAR	$ 2.146.667	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.800
CC 1119184031	YEIDER AGUIRRE JIMENEZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.146.667	$ 343.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.146.667	$ 85.900	6,960	$ 2.146.667	$ 149.500	(CCF67) COMFIAR	$ 2.146.667	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.800
CC 1126423223	DORAINYS VILLARRUEL BAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800
CC 1152187904	DIEGO ANDRES SUAREZ ARRUBLA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 153.334	$ 24.600	(EPS010) EPS SURA	$ 153.334	$ 6.200	6,960	$ 153.334	$ 10.700	(CCF04) COMFAMA	$ 153.334	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.700
CC 1152216024	VALERIA HERNANDEZ POSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 12023693	HARRY ANTONIO MENA MOSQUERA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 13721542	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 6.906.667	$ 1.174.300	(EPS010) EPS SURA	$ 6.906.667	$ 276.300	6,960	$ 6.906.667	$ 480.800	(CCF04) COMFAMA	$ 6.906.667	$ 276.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.207.700
CC 3482037	CARLOS ALBERTO ZAPATA GARCIA	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 5199532	EUDORO HERNANDO MUÑOZ LARA	01	01	X																0	0	12	12	12	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 70033330	GONZALO HINCAPIE AGUDELO	01	01	X																0	0	12	12	12	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.040.000	$ 41.600	6,960	$ 1.040.000	$ 72.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.040.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.600
CC 79788059	ESNEIDER DAVID FUENTES ZARATE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.400.000	$ 918.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.400.000	$ 216.000	6,960	$ 5.400.000	$ 375.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.725.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.250.002	$ 31.590.002	$ 31.590.002	$ 31.590.002	$ 4.803.400	$ 1.263.800	$ 2.115.600	$ 1.263.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.446.600	$ 0	$ 9.446.600

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 05:07:11 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 73742675

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 13/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SADINTECON		
Documento	NI901742046	**Dirección**	CL 48C #65 A - 3 EDIFICIO GARDENIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581859
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TABARES ZULETA RUTH ELENA	**Identificación**	CC 30303454
Total Afiliados	3	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10221652	GERMAN MONSALVE SAENZ	59	00	R																0	0	0	12	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 12023693	HARRY ANTONIO MENA MOSQUERA	59	00		R															0	0	0	18	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.950.000	$ 135.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.800
CC 3482037	CARLOS ALBERTO ZAPATA GARCIA	59	00		R															0	0	0	18	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.950.000	$ 135.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.100	$ 0	$ 362.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO W

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO DE OBRA No: 016 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023-2024	1352623	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.670.929.326,00	$ 1.113.444.266
2023-2024	1352623	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 185.658.814,00	$ 123.716.030
TOTAL						**$ 1.856.588.140,00**	**$ 1.237.160.296**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.856.588.140**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402041-02	Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402112-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
					$ -		**$ -**	**$ 1.670.929.326,00**	**$ 185.658.814,00**	**$ 1.856.588.140,00**		
								$ -	**$ -**	**$ -**		
1	**DICIEMBRE DE 2023 (DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023)**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
2	**MARZO DE 2024**	$ 50.621.700,00	$ 9.618.123,00	$ 60.239.823,00	$ -	$ 60.239.823,00	$ -	$ 1.616.713.485,30	$ 179.634.831,70	$ 1.796.348.317,00		
3	**ABRIL DE 2024**	$ 72.599.500,00	$ 13.793.905,00	$ 86.393.405,00	$ -	$ 86.393.405,00	$ -	$ 1.538.959.420,80	$ 170.995.491,20	$ 1.709.954.912,00		
4	**MAYO DE 2024**	$ 77.364.500,00	$ 14.699.255,00	$ 92.063.755,00	$ -	$ 92.063.755,00	$ -	$ 1.456.102.041,30	$ 161.789.115,70	$ 1.617.891.157,00		
5	**JUNIO DE 2024**	$ 71.570.700,00	$ 13.598.433,00	$ 85.169.133,00	$ -	$ 85.169.133,00		$ 1.379.449.821,60	$ 153.272.202,40	$ 1.532.722.024,00		
6	**JULIO DE 2024**	$ 110.511.600,00	$ 20.997.204,00	$ 131.508.804,00	$ -	$ 131.508.804,00	$ -	$ 1.337.744.117,70	$ 148.638.235,30	$ 1.486.382.353,00		
7	**AGOSTO DE 2024**	$ 121.891.900,00	$ 23.159.461,00	$ 145.051.361,00		$ 145.051.361,00	$ -	$ 1.248.903.596,70	$ 138.767.066,30	$ 1.387.670.663,00		
8	**SEPTIEMBRE DE 2024**	$ 126.479.300,00	$ 24.031.067,00	$ 150.510.367,00		$ 150.510.367,00	$ -	$ 1.113.444.266,40	$ 123.716.029,60	$ 1.237.160.296,00		
9	**OCTUBRE DE 2024**	$ 134.102.800,00	$ 25.479.532,00	$ 159.582.332,00		$ 159.582.332,00	$ -	$ 969.820.167,60	$ 107.757.796,40	$ 1.077.577.964,00		
TOTALES		**$ 765.142.000,00**	**$ 145.376.980,00**	**$ 910.518.980,00**	**$ -**	**$ 910.518.980,00**	**$ -**	**$ 969.820.167,60**	**$ 107.757.796,40**	**$ 1.077.577.964,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 598.920.800,00	$ 113.794.952,00	$ 712.715.752,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 166.221.200,00	$ 31.582.028,00	$ 197.803.228,00
SUBTOTAL COSTOS	$ 765.142.000,00	$ 145.376.980,00	$ 910.518.980,00
VALOR TOTAL	**$ 765.142.000,00**	**$ 145.376.980,00**	**$ 910.518.980,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO X

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

FECHA DE INICIO: 14/12/2032

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.856.588.140,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.856.588.140,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	2	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	2	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	2	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	2	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	2	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	2	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	14	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	14	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	14	12	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	14	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	14	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	14	12	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

Se presenta las polizas aprobadas en secop 2 con corte a octubre de 2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214 STD

Firma Monica Montenegro Q.

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO Y

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

ANEXO Z

MEPI-MN-IN-3-FR-1

Seguimiento a la inversión del Anticipo

ANEXO AA

MEPI-MN-IN-3-FR-2

Informe inversión buen manejo anticipo Interventoría

ANEXO AB

MEPI-MN-IN-9-FR-2

Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PROYECTO REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
RESOLUCIÓN No.: 4270 DE 27/11/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 016 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12(2023 - 29/02/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.856.588.140,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.856.588.140,00

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		Acta de Modif. No. 1 de fecha 21/02/2024		ACUMULADO SEPTIEMBRE DE 2024		AÑO 2024																		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
1	1	Director de Interventoría	$ 7.400.000,00		3,00	$ 22.200.000,00			10,40	$ 76.960.000,00	6,75	$ 49.950.000	1	$ 7.400.000	1	$ 7.400.000	0,83	$ 6.142.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,58	$ 70.892.000
2	2	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.400.000,00		6,00	$ 32.400.000,00			20,80	$ 112.320.000,00	13,3	$ 71.820.000	2	$ 10.800.000	2	$ 10.800.000	1,96	$ 9.964.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	18,96	$ 102.384.000
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.150.000,00		3,00	$ 9.450.000,00			10,40	$ 32.760.000,00	3	$ 9.450.000	1	$ 3.150.000	1	$ 3.150.000	0,83	$ 2.614.500		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	5,83	$ 18.364.500
4	1	Profesional Ambiental	$ 4.100.000,00		3,00	$ 12.300.000,00			10,40	$ 42.640.000,00	5,5	$ 22.550.000	1	$ 4.100.000	1	$ 4.100.000	0,83	$ 3.403.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	8,33	$ 34.153.000
5	1	Profesional Social	$ 4.100.000,00		1,50	$ 6.150.000,00			5,20	$ 21.320.000,00	3,5	$ 14.350.000	0,5	$ 2.050.000	0,5	$ 2.050.000	0,42	$ 1.722.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,92	$ 20.172.000
6	1	Profesional SIG	$ 4.100.000,00		1,50	$ 6.150.000,00			5,20	$ 21.320.000,00	0	$ 0	1	$ 4.100.000	1	$ 4.100.000	1,00	$ 4.100.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	3,00	$ 12.300.000
7	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)							-	$ -	0	$ 0																			0,00	$ 0
8	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,00	$ 19.500.000,00			3,00	$ 19.500.000,00	0,29	$ 1.885.000	0,7	$ 4.550.000	0,7	$ 4.550.000	0,7	$ 4.550.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,39	$ 15.535.000
9	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	0,4	$ 2.600.000	0,25	$ 1.625.000	0,25	$ 1.625.000	0,25	$ 1.625.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,15	$ 7.475.000
10	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	1,5	$ 9.750.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,50	$ 9.750.000
11	1	Especialista Ambiental	$ 6.500.000,00		2,50	$ 16.250.000,00			2,50	$ 16.250.000,00	1,5	$ 9.750.000	0,4	$ 2.600.000	0,4	$ 2.600.000	0,2	$ 1.300.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	2,50	$ 16.250.000
12	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,50	$ 9.750.000,00			1,50	$ 9.750.000,00	0,5	$ 3.250.000	0,4	$ 2.600.000	0,4	$ 2.600.000	0,1	$ 1.950.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1,60	$ 10.400.000
13	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	0	$ 0	0,25	$ 1.625.000	0,25	$ 1.625.000	0,25	$ 1.625.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	0,75	$ 4.875.000
14		**PERSONAL TÉCNICO**							-	$ -																						
15	2	Inspector	$ 2.300.000,00		6,00	$ 13.800.000,00			20,80	$ 47.840.000,00	3,6	$ 8.280.000	2	$ 4.600.000	2	$ 4.600.000	2	$ 4.600.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,60	$ 22.680.000
16	1	Inspector SST	$ 2.450.000,00		3,00	$ 7.350.000,00			10,40	$ 25.480.000,00	3,1	$ 7.595.000	1	$ 2.450.000	1	$ 2.450.000	1	$ 2.450.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	6,10	$ 14.945.000
17		**PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**							-	$ -																						
18	1	Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,00	$ 3.900.000,00			10,40	$ 13.520.000,00	1	$ 3.900.000	1	$ 1.300.000	1	$ 1.300.000	1	$ 1.300.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	4,00	$ 7.800.000
		OTROS COSTOS DE PERSONAL																														
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 178.700.000				$ 459.160.000		$ 215.130.000		$ 52.950.000		$ 52.950.000		$ 46.345.500	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 367.375.500
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	2,36		2,36		2,36	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 421.732.000				$ 1.083.617.600		$ 507.706.800		$ 124.962.000		$ 124.962.000		$ 109.375.380	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 867.006.180

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costos	Unidad	Acta de Modif. No. 1 de fecha 21/02/2024 Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	ACUMULADO SEPTIEMBRE DE 2024		2024																		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
													2024																		TOTAL	
											SEPTIEMBRE DE 2024		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		0		0		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1		**OTROS COSTOS DIRECTOS**																														
2	12	**VIÁTICOS**																														
3		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00		36	$ 7.560.000			120,00	$ 25.200.000,00	5,44	$ 1.142.400,00	24	$ 5.040.000	24	$ 5.040.000	24	$ 5.040.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	77,4	$ 16.262.400
4		**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**							-	$ -	-	$ -																					
5	2	Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 6.000.000,00		6	$ 36.000.000			20,80	$ 124.800.000,00	11,90	$ 71.400.000,00	2	$ 12.000.000	2	$ 12.000.000	2	$ 12.000.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	17,9	$ 107.400.000
6	2	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 665.000,00		6	$ 3.990.000			31,20	$ 20.748.000,00	5,50	$ 3.657.500,00	4	$ 2.660.000	4	$ 2.660.000	4	$ 2.660.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	17,5	$ 11.637.500
7	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.200.000,00		3	$ 18.600.000			14,56	$ 90.272.000,00	6,90	$ 42.780.000,00	2	$ 12.400.000	2	$ 12.400.000	2	$ 12.400.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	12,9	$ 79.980.000
8	2	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 665.000,00		6	$ 3.990.000			10,40	$ 6.916.000,00	2,72	$ 1.808.800,00	3	$ 1.995.000	3	$ 1.995.000	1,4	$ 931.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	10,12	$ 6.729.800
9	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.480.000,00		3	$ 4.440.000			10,40	$ 15.392.000,00	6,90	$ 10.212.000,00	1,1	$ 1.628.000	1,1	$ 1.628.000	1,2	$ 1.776.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	10,3	$ 15.244.000
10		**OTROS COSTOS**							-	$ -	-	$ -																			0	$ 0
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.450.000,00		3,00	$ 4.350.000			10,40	$ 15.080.000,00	2,45	$ 3.552.500,00	2,00	$ 2.900.000	2,00	$ 2.900.000	1,95	$ 2.827.500		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	8,4	$ 12.180.000
12	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 570.000,00		3,00	$ 1.710.000			10,40	$ 5.928.000,00	3,56	$ 2.029.200,00	2,00	$ 1.140.000	2,00	$ 1.140.000	1,74	$ 991.800		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	9,3	$ 5.301.000
13	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 950.000,00		3,00	$ 2.850.000			10,40	$ 9.880.000,00	2,20	$ 2.090.000,00	2,20	$ 2.090.000	2,20	$ 2.090.000	2,08	$ 1.976.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	8,68	$ 8.246.000
14	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00		3,00	$ 450.000			10,40	$ 1.560.000,00	-	$ -	2,60	$ 390.000	2,60	$ 390.000	2,60	$ 390.000		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	7,80	$ 1.170.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														$ 268.236,720
		+ SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 83.940.000				$ 315.776.000		$ 138.672.400		$ 42.243.000		$ 42.243.000		$ 40.992.300	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 532.387.420
		+ SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 505.672.000				$ 1.399.393.600		$ 646.379.200		$ 167.205.000		$ 167.205.000		$ 150.367.680	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.399.393.600
		+ PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 1.054.486.101				$ 160.764.501																						$ 160.764.501
		+ SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 1.560.158.101				$ 1.560.158.101		$ 646.379.200		$ 167.205.000		$ 167.205.000		$ 150.367.680	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.560.158.101
		+ IVA = 19% * (E) = (F)				$ 296.430.039				$ 296.430.039		$ 122.812.048		$ 31.768.950		$ 31.768.950		$ 28.569.859	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 296.430.039
		+ COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 1.856.588.140				$ 1.856.588.140		$ 769.191.248		$ 198.973.950		$ 198.973.950		$ 178.937.539	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.856.588.140

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La solicitud de prórroga No.1 está sustentada en la solcitud realizada por el Contratista de obra mediante comunicado CSVF-1001-2024 del 21 de febrero de 2024, en el cual fue solicitada una prórroga del contrato por 7 meses hasta el 14 de diciembre de 2024. Con el fin que el contrato de obra no quede sin interventoría, se requiere una ampliación de plazo del contrato de Interventoría hasta el 14 de diciembre de 2024. El plazo actual del contrato es hasta el 3 de marzo de 2024.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: RUTH ELENA TABARES ZULETA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Firma:
Nombre: MONICA MONTENERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND
(Suscribe según su competencia)

ANEXO AC

MEPI-MN-IN-9-FR-3

Seguimiento al Plan de Cargas

ANEXO AD

Copia bitácora del mes correspondiente
CAÑO FLORES

	PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador excavadora, carrotanque. CLIMA: soleado.
29 Sept Domingo 2024	(sin novedades para este día). (Domingo)
30 Sept Lunes 2024	Se realiza instalación y compactación de terraplén sobre tramo K2+960 - K3+120. Se realiza conformación de talud con material arcilloso con el Fin de confinar y proteger. Se realizan chequeo de niveles para llevar control de volumenes por capas extendidas en el día. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador excavadora, Carrotanque. Clima: soleado.
01 Octubre Martes 2024	Se realiza instalación y compactación de terraplén sobre tramo K3+120 - K3+200. se realiza conformación de talud con material arcillaso con el Fin de confinar y proteger. Se realizan chequeo de niveles para llevar control de volumen por capas extendidas en el día. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro y controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque. CLIMA: Soleado
02 octubre Miercoles 2024	se realiza instalación y compactación de terraplén sobre tramo K3+150 - K3+300, otra capa. Se realiza conformación de talud con material arcillaso con el Fin de confinar y proteger el terraplén. Se realiza chequeo de niveles del material conformado. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, cadeneros, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora excavadora, vibrocompactador, carrotanque

Scanned with CamScanner

03 oct Jueves 2024 — Se realiza instalación y compactación de terraplén en tramo K3+150 – K3+355, correspondiente a otra capa. Se realiza conformación de talud con material arcilloso con el Fin de confinar y proteger el terraplén. Se realiza chequeos de niveles de material conformado. PERSONAL: Ing residente, HSQE topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora excavadora, Vibrocompactador, carrotanque CLIMA: Soleado.

04 oct Viernes 2024 — Se realiza instalación y compactación de terraplén en tramo K3+355 – K3+500. Se realiza conformación de talud con material arcilloso con el Fin de confinar y proteger terraplén. Se realizaron los respectivos chequeos de niveles topográficos de material extendido durante el día. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora excavadora, vibrocompactador, carrotanque. CLIMA: soleado.

05 oct Sábado 2024 — Se realiza instalación y compactación de terraplén en tramo K3+500 – K3+600. Se realiza conformación de talud con material arcilloso con el Fin de confinar y proteger el terraplén. Se realizaron los respectivos chequeos de niveles de material extendido durante el día. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador excavadora, carrotanque. CLIMA: soleado.

6 oct Domingo 2024 — SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (DOMINGO – NO se laboró)

7 oct Lunes 2024 — Se realiza instalación y compactación de terraplén en tramo K3+600 – K3+700 carril derecho. Se realiza conformación de talud con material arcilloso con el Fin de confinar y proteger el terraplén. Se realizaron los respectivos chequeo de niveles del material extendido en el día. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, vibrocompactador, carrotanque. CLIMA: soleado.

Scanned with CamScanner

08 octubre Martes 2024	Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en otra capa en tramo K2+860 - K2+960 se realizan accesos a los predios adyacentes al proyecto. se realizan las respectivas chequeos de niveles al material extendido. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora excavadora, Vibrocompactador, carrotanque. Clima: Soleado.
09 octubre Miercoles 2024	Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en otra capa posterior K2+960 - K3+750 La interventoría solicita al contratista regar con agua todo el corredor del proyecto, ya que se están generando polvaredas. PERSONAL: Ing residente, HSQE topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora, carrotanque. CLIMA: SOLEADO.
10 octubre Jueves 2024	Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en otra capa posterior K3+150 - K3+320 carril izquierdo. Se realizan chequeo de niveles de material extendido durante la jornada. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador excavadora, carrotanque. CLIMA: Soleado.
11 octubre Viernes 2024	Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en otra capa K3+000 - K3+510 carril derecho. Se realizaron chequeos de niveles de material extendido y compactado durante la jornada. Ingresa Materiales Petreos, tubería de 36" e insumos a bodega para contrucción de obras de drenaje. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro excavadora, carrotanque. Clima: soleado.

Scanned with CamScanner

12 oct Sábado 2024 — Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en otra capa posterior K3+000 - K3+510 carril izquierdo. Se realizaron cheques de niveles de material extendido durante la jornada. Se realizan replanteos topográficos para obras de drenaje. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque. CLIMA: SOLEADO.

13 oct Domingo 2024 — SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (Domingo – No se laboró)

14 oct Lunes 2024 — SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (Lunes Festivo – No se laboró)

15 oct Martes 2024 — Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en capa posterior tramo K3+520 – K3+750 carril derecho. Se realizaron cheques de niveles de material extendido durante la jornada. Se realizó excavación mecánica para obras de drenaje en carril derecho (K3+045, K3+245, K3+455) y posteriormente se fundió solado (17Mpa). PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, Maestro, oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, Vibrocompactador, carrotanque CLIMA: Soleado.

16 oct Miercoles 2024 — Se realiza instalación y compactación de material para terraplén en capa posterior tramo K3+520 – K3+750 carril izquierdo. se realizaron cheques de niveles de material extendido, durante la jornada. Se instaló tubería de concreto 36" carril derecho sobre obras de drenaje (K3+045, K3+245, K3+455). PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, Maestro oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora excavadora, Vibrocompactador, carrotanque. CLIMA: Soleado.

Scanned with CamScanner

17 octubre Jueves 2024	Se realizo Irrigación con agua a todo el material extendido, con el Fin de compactar por segunda vez para garantizar un grado de compactación óptimo. Se realiza excavación para alc K3+645 costado derecho. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo cadenero, ayudante, Maestro, oficial, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, Vibrocompactador, carrotangue. Clima: Soleado.
18 octubre Viernes 2024	Se realiza instalación y compactación terraplén capa posterior K2+860 - K3+000 costado izquierdo. Se deposita material para terraplén K3+445 - K3+645 para proceder a extender. Se realiza Fundida de Solado para solera en al (K3+045, K3+245, K3+455).. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, cadenero, ayudantes, oficial, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora carrotangue, Clima: Soleado.
19 octubre Sábado 2024	Se extendió y compactó material de terraplén en capa posterior K3+460 - K3+640. Se realizaron ensayos de densidades (K3+245 - K3+455) Se realizó Fundida de Solera y dentellón para obras de drenaje (K3+045, K3+245, K3+455) costado derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, Topógrafo, Maestro, oficial, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora, Carrotangue CLIMA: soleado.
20 octubre Domingo 2024	SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (Domingo no se laboró)

Scanned with CamScanner

21-oct Lunes 2024 Extendido y compactado material de terraplen en capa superior-posterior, K 03+455.
Se funde solado (17MPa) para K3+645 costado derecho
Se realiza armado de acero refuerzo y encofrado para Muros y aletas en alcantarillas (K 3+045)(K3+245) (K 3+455) costado derecho. PERSONAL: ING Residente, HSQE, Topografo, Cadenero, Ayudante, Maestro, Oficial, Controlador Vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro Compactador, Carrotanque Excavadora, Clima soleado
1S

22-oct Martes 2024 Descarga de material y extendido, compactado material de terraplen en capa posterior (K 3+355 - 3+640), Descarga de Material arcilla costado derecho (K 3+950 - 3+610),
Se instalo tuberia 36" para K3+645 costado derecho, se Funden Muros, aletas (K3+045) (3+245) (K 3+455) costado derecho,
Se rellena con material seleccionado costado izquierdo. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, Topografo, cadenero, Ayudante, Maestro, oficial, Controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, vibro compactador, carrotanque, excavadora, Clima soleado.
1S

23-oct Miercoles 2024 Extendido y compactación de material en terraplen en capa Posterior (K 3+455 - 3+655), descarga de material Arcilla,
Se realiza armado de acero para solera y dentellón K 3+645 Costado derecho. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, Topografo, Cadenero, Ayudante, Maestro, oficial, Controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro compactador, Carro tanque, excavadora, Clima Soleado.
1S

24-oct Jueves 2024 Extendido y compactado de material de terraplen en capa posterior (K 3+460 - 3+990)
Se realiza, Se realiza armado de aceros Final dentellon y solera
Se Funde solera y dentellon K 3+645 costado derecho, Excavación Mecanica (3+045) (3+245) (3+455) costado izquierdo
Y Posteriormente se funde solado (17MPa). PERSONAL: Ing Residente., HSQE, Topografo, Cadenero, Ayudante, Maestro, oficial, Controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro compactador
1S

Scanned with CamScanner

	Carrotanque, Retroexcavadora, Clima Soleado.
	f/s
25-Oct-2024 Viernes	Extendido y compactado de material de terraPl en Capa Posterior. (K 2+845 - 2+980) - (K 3+245 - 3+445).
	Se realiza instalacion de tuberia, de 36" (K 3+045, K 3+245, K 3+455) costado Izquierdo, se tellena con Material Seleccionado K 3+645 costado derecho. PERSONAL: Ing Residente HSQE, Topografo, Cadenero, Ayudante, Maestro, Oficial Controlador Vial, MAQUINARIA: motoniveladora, Vibro Compactador, Retroexcavadora, Carrotanque, Clima Sole
	f/s
6-octubre Sabado 2024	Extendido y compactado de material de terraplén en capa posterior (K 3+245 - 3+425)
	Se Funde para placa soporte superior de tuberia (K 3+B45) costado derecho. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, TOPÓGRAFO, Cadenero, Ayudante, Maestro, Oficial, Controlador Vial, MAQUINARIA: motoniveladora, Vibro Compactador, excavadora, Carrotanque, Clima soleado.
	f/s
27-octubre Domingo 2024	SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (Domingo no se laboró)
	f/s
28-octubre Lunes 2024	Extendido y compactado de material para terraplén en capa posterior (K3+425 - K3+628).
	Se realiza armado de acero para solera y dentellón alc (K3+045, K3+245, K3+455) costado izquierdo. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Cadenero, ayudantes, Maestro, oficiales, controlador viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora, Carrotanque, Clima: soleado
	f/s

Scanned with CamScanner

29 oct Martes 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplén (K3+628 - K3+790) en capa posterior.
Se realiza Fundida de Solera y dentellón (K3+045, K3+245, K3+455) costado izquierdo. Se realizan chequeos topográficos.
PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, OFICIALES ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro-compactador, carrotangue, excavadora. clima: soleado

30 oct Miercoles 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplén (K3+199 - K3+300) capa posterior.
Se realiza actividades de acero para Muros y aletas en alcantarillas (K3+045; K3+245, K3+455) costado izquierdo.
PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, OFICIALES, ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, carrotangue, excavadora. clima: soleado

31 oct Jueves 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplén (K3+498 - K3+539) capa posterior.
Se realiza Fundida de Muros y aletas para alcantarillas (K3+045, K3+245, K3+455) costado izquierdo.
PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, OFICIALES ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, carrotangue, excavadora, clima: soleado.

Scanned with CamScanner

ANEXO AD

Copia bitácora del mes correspondiente
PALMARITO

30 sept lunes 2024	Se realiza armado de acero para muros y aletas K5+635. Se reactiva la maquinaria correspondiente a Motoniveladora, vibrocompactador. para realizar replanteo y conformación de subrasante en los tramos correspondiente a las obras de drenaje. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro oficiales, ayudantes, controlador vial, MAQUINARIA: excavadora, Carrotanque, Motoniveladora, Vibrocompactador CLIMA: Soleado.
01 octubre Martes 2024	Se realiza Fundida de muros y aletas para K5+635 costado izquierdo. Se toman muestras de concreto. Se realiza instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares en tramo (K0+630 - K0+680). Se instaló subbase granular K0+630 - K0+680 y se compactó. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro oficiales, Ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, Carrotanque CLIMA: Soleado (mañana), lluvias dispersas (2h) tarde
02 octubre Miercoles 2024	Se funde guarda ruedas faltantes de obras de drenaje que ya cuentan con muros y aletas. Se rellena con material Seleccionado las obras de drenaje pendientes. Se realiza instalación de geotextil (K1+160 - K1+200) instalación de SBG y BS (K1+160 - K1+200). Se realiza liberación de K0+040 al K1+000 para proceder a aplicar MDC-19. Se realiza imprimación K0+040 - K0+440 carril derecho. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro oficial, Ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora, Carrotanque. CLIMA: Soleado.

Scanned with CamScanner

3 oct Jueves 2024	Se instala MDC-19 K0+040 - K0+440 carril derecho. Se realizó imprimación K0+040 - K0+440 carril izquierdo Se realizan ensayos para liberar tramos para aplicación de asfalto. Se procedió a cerear base granular a medida que se avanza con el fin de remover impurezas o material suelto. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, vibrocompactador, excavadora, FINISHER, irrigador de asfalto CLIMA: soleado.
04 oct Viernes 2024	Se instaló MDC-19 K0+040 - K0+440 carril izquierdo. Se realizó imprimación K0+440 - K0+840 carril izquierdo. Se realizo instalación de geotextil, subbase granular K6+790 al K7+170. Se realizan ensayos aplicables al MDC-19 para el control de calidad. (Finisher presentó fallas y se encuentra en reparación) PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora, vibrocompactador escavadora, carrotanque, Finisher, irrigador asfalto CLIMA: Soleado
05 oct Sábado 2024	Se realizó replanteo topográfico de tramo K7+200 - K7+400 del tramo adicional, para posteriormente proceder a conformar la estructura de la vía. Siguen suspendida Finisher en reparación. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales, ayudantes controlador vial. MAQUINARIA. Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora carrotanque. Se han realizado actividades de cereo de base granular CLIMA: SOLEADO.
06 oct Domingo	(Sin novedades para este día) (Domingo)
07 oct Lunes 2024	Se realizó instalación MDC-19 K0+440 - K0+800 carril izquierdo Se realizó imprimación K0+840 - K1+000 carril izquierdo. En la abs K0+760 se presentó un comportamiento inusual en el asfalto dicho punto se marcó para posterior seguimiento. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, Oficiales, Ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador,

Scanned with CamScanner

	excavadora, carrotanque, Finisher, irrigador asfalto..
	CLIMA: soleado.
08 octubre Martes 2024	Se realizó instalación MDC-19. K0+440 - K0+800 carril derecho. Se realizan briquetas para ensayos de laboratorio correspondientes al asfalto. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficial ayudante, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, carrotanque, excavadora, Finisher, irrigador asfalto.. - CLIMA: soleado.
09 octubre Miercoles 2024	Se realizó instalación de MDC-19. K0+800 - K1+000 carril izquierdo. Se realizaron los ensayos de laboratorio aplicables para el control de calidad del asfalto. Se realizó imprimación. K0+800 hasta K1+400. carril derecho PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, OFICIAL ayudante, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, Carrotanque, excavadora, Finisher, irrigados asfalto CLIMA: SOLEADO
10 octubre Jueves 2024	Se realizó instalación MDC-19 K0+800 - K1+335 C. derecho Se realizo imprimación K1+000 - K1+350 carril izquierdo Se realizaron briquetas, ensayos de laboratorio aplicables a la MDC-19. Se realizan chequeos topográficos de base granular y ceveo. PERSONAL: Ing. Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, OFICIALES, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora, carrotanque, Finisher, irrigador de asfalto CLIMA: soleado
11 octubre Viernes 2024	Se realizó instalación MDC-19 K1+000 - K1+341 C. izquierdo Se realiza imprimación. K1+341 - K1+621. C. izquierdo Se realiza excavación mecánica para carril izquierdo correspondiente a alc 36" (K1+385, K1+620, K1+861, K2+020 K5+175, K5+310, K6+030). Se realizan obras de contención para evitar desprendimientos del carril izquierdo habilitado para vehículos.

Scanned with CamScanner

Se recibió notificación por parte CORPORINOQUIA que ya existe Resolución No. 700.36.24.0109 actualizada según otro sí modificatorio 03 se instaló geotextil y sub base granular K7+170 - K7+290. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales, Ayudantes controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladova, vibrocompactador, excavadova, carrotanque, Finisher, irrigador de asfalto. CLIMA: soleado - lluvias dispersas (1 hora).

12 oct Sábado 2024 Se realizó instalación de MDC-19 K1+341 - K1+621 c. izquierdo. Se realizaron briquetas y se tomaron muestras de asfalto para hacer control de calidad. Se realiza imprimación K1+335 - K1+440 costado derecho. Se funde Solado (17 Mpa) para carril derecho en obras de drenaje que se excavaron el 11 de octubre. Inguesa tubería en concreto de 36" a campo y se almacena en los puntos a intervenir. Se realiza cerco de base granular y ensayos de laboratorio para control de densidades. PERSONAL: Ing. residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficial, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, excavadora, finisher, irrigador de asfalto. CLIMA: soleado.

13 oct Domingo 2024 SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (Domingo - No se laboró).

14 oct. Lunes 2024 SIN NOVEDADES PARA ESTE DÍA (Lunes Festivo - No se laboró)

15 oct Martes 2024 Se instaló MDC-19 K1+335 - K1+400 carril derecho (Se recibió notificación por parte de la planta proveedora de MDC-19 que existen inconvenientes en los equipos de producción). Se instaló geotextil y subbase granular K7+290 - K7+400. Se instaló tubería de 36" en las obras de drenaje que se mencionan desde el 11 de octubre. Se realizaron actividades de ceveo y chequeo de niveles de base granular para libevar tramos.

Scanned with CamScanner

	PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro oficial, Ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Urbocompactador, excavadora cavotanque, Finisher, irrigador de asfalto. CLIMA: soleado.
16 octubre Miercoles 2024	No se realizaron actividades correspondientes a la aplicación de imprimación y MDC-19, ya que la planta proveedora de asfalto tiene inconvenientes en los equipos de producción. Se realiza instalación de base granular K6+740 - K6+960. se realiza armado de acero para soleras y dentellón de a/c (carril derecho) - (K4+385 - K1+620, K1+861, K2+020 K5+175, K5+310, K6+030). Carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Urbocompactador, excavadora, Carvotanque Finisher, irrigador de asfalto. CLIMA: soleado
17 octubre Jueves 2024	Continúan suspendidas actividades correspondientes a aplicación de imprimación y MDC-19. Se realiza instalación de base granular K6+960 - K7+200 Se realiza Fundida de solera y dentellón para obras de drenaje (K4+385, K1+620, K1+681 y K2+020) carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo Maestro, oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Urbocompactador, excavadora. carvotanque, Finisher, irrigador asfalto, compactado de llanta neumática CLIMA: SOLEADO
18 octubre Viernes 2024	Continúan suspendidas actividades correspondiente a aplicación de imprimación y MDC-19. La interventoría Solicita al contratista Una Solución para reactivar estas actividades y que no se generen atrasos. Se instala base granular K7+200 a K7+260 se realiza Fundida de solera y dentellón para obras de drenaje (K5+175, K5+310, K6+030). carril derecho

Scanned with CamScanner

PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales, Ayudantes controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, Finisher, irrigador de asfalto, compactador de llanta asfalto. CLIMA: Soleado.

19 oct Sábado 2024 Se reactivan los trabajos correspondientes a imprimación y MDC-19. Se instaló MDC-19 K1+400 - K1+700 por el carril derecho. se toman muestras de MDC-19 para realizar control de calidad. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro oficiales, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, Finisher, irrigador asfalto, compactador de llantas para asfalto. CLIMA: soleado.

20 oct Domingo 2024 Se instaló MDC-19 en tramo correspondiente K1+700 - K1+985 carril derecho. Se toman muestras de MDC-19 para realizar control de calidad. Se realiza imprimación K1+985 - K2+150 carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo Maestro, oficial, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, Finisher irrigador de emulsión de imprimación, compactador de neumatico. CLIMA: soleado.

21 Oct lunes 2024 Se instalo MDC-19 en el tramo correspondiente del K1+984-K2+280 en el carril derecho. Se toman muestras de MDC-19 para realizar control de calidad. Se realiza imprimacion del K1+620-K2+00 del carril izquierdo. Se esparce material de subbase en el tramo K7+260-K7+400. Se realiza ensayos de laboratorio aplicables a la MDC-19. Se relleno con material seleccionado alcantarillos (K4+385, [illegible], [illegible], [illegible], K5+175, K5+310, K6+030) carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE topógrafo, maestro, oficial, Ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, finisher irrigador de emulsion de imprimacion, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado.

Scanned with CamScanner

22 Oct Martes 2024

Se realizo la instalacion de MDC-19 en el tramo K1+620 - K1+900 carril izquierdo. Se realiza muestras de MDC-19 para control de calidad. Se realiza imprimacion del tramo K1+900 - K2+310 carril izquierdo. Se estiende geotextil para la separacion de capas y subrasante en el tramo K4+320 - K4+610. Se realizo la actividad de esparcir crudo en los tramos (K5+090, K5+200, K5+6 K5+780). Se hizo verificacion de niveles por parte de topografo en el tramo K5+160 - K5+520. Se realizo excavacion mecanica para alcantarillas (K4+385, [illegible] K5+175, K5+310, K6+030) carril izquierdo. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, maestro, oficial, ayudantes, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, finisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado. (mañana), lluvias dispersas (1h) tarde.

23 Oct Miercoles 2024

Se realiza trabajo de imprimacion del K2+310 - K2+600 del carril izquierdo. Se instalo MDC-19 en el tramo correspondiente al K1+900 - K2+220 por el carril izquierdo. Se reactivan labores de esparcir material de subbase en el tramo K2+640 - K2+820. Se trabaja recoleccion de escombros de la alcantarilla K4+452. Se realizo la labor de esparcir subbase en el tramo K5+982 - K5+110. Se instala geotextil y subbase en el tramo K5+240 - K5+308. Se toma muestras de MDC-19 para realizar control de calidad. Se instalo tuberia de 36" para las alcantarillas (K4+385, [illegible] K5+175, K5+310, K6+030) carril izq PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, maestro, ofic ayudantes, controlador vial, MAQUINARIA: carrotanque, motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, finisher, irrigador de asfalto, compactador de llantas para asfal CLIMA: Soleado.

Scanned with CamScanner

Se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente en el K2+220 - K2+420. carril izquierdo. Se toman muestras de MDC-19 para realizar control de calidad. Se realiza imprimacion del K2+600 - K2+900. Se instala geotextil en el tramo K4+593 - K4+680. Se realiza remoción
10 Oct de escombros en el K4+655. Se realizo la actividad
eves de esparcir crudo y de compactar en el K5+150 hasta
024 K5+240 y en el mismo tramo se instalo geotextil y subbase. Se compacto material de subbase en el tramo K3+800 - K4+200. Se realizo armada de acero para solera y dentellón de las alcantarillas (K4+385, [illegible], [illegible], [illegible], K5+175, K5+310, K6+030) carril izquierdo. Se realizo visita tecnica por parte de invias de la subdireccion regional de yopal y acompañamiento de la supervision. PERSONAL: Ing. residente, HSQE, topografa, controlador vial. Maestro, oficiales, ayudantes. MAQUINARIA: motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, finisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico CLIMA: Soleado.

No se realiza actividades correspondientes a la aplicacion de imprimacion y de MDC-19, ya que la planta proveedora de asfalto tiene inconvenientes en los equipos de produccion. Se realiza instalacion de la
5 Oct subbase granular en el tramo (K4+458 - K4+503, K4+593
ernes - K4+680). Se esparce material de subbase y base en el
024 tramo K4+078 - K4+200. Se realiza ensayos de laboratorios para el control de densidades en las ubicaciones (K2+680, K2+800, K2+880, K2+960). Se realiza fundida de solera y dentellón de las alcantarillas (K4+385, [illegible], [illegible], [illegible], K5+175, K5+310, K6+030). Carril izquierdo. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografa, controlador vial, maestro, oficiales, ayudantes. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, finisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado.

Scanned with CamScanner

26 Oct Sabado 2024	Se instala MDC-19 en el tramo K2+420 - K2+700 carril izquierdo. Se realizo ensayos de laboratorios de MDC-19 para la calidad. Se realizó la esparcion de material de subbase en el tramo K3+150 - K3+400. PERSONAL: Ing. residente, HSQE, topografo, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, vibrocompactador, sinisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado.
27 Oct Domingo 2024	Se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente al K2+700 - K2+890 carril izquierdo. Se realiza ensayo de laboratorio de MDC-19 para control de calidad. Se realizó imprimación del tramo K2+280 - K2+600. carril derecho. PERSONAL: Ing. residente, HSQE, topografo, control vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, sinisher excavadora, vibrocompactador, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado.
28 oct Lunes 2024	se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente al K2+280 - K2+990 carril derecho. previamente imprimado se realizan ensayos de control de calidad de MDC-19. Se realiza armada de acero para muros y aletas (K4+385, [illegible], K5+175, K5+310, K6+030) carril izquierdo. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, controladores viales, ayudantes, Maestro, oficiales. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, vibrocompactador, irrigador de asfalto, compactador de neumático Finisher asfaltadora. CLIMA: Soleado
29 oct Martes 2024	se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente al K2+890 - K3+390 carril izquierdo. previamente imprimado. Se realizan ensayos de control de calidad de MDC-19. Se realiza encofrado para muros y aletas en alcantarillas (K4+385, [illegible], K5+175, K5+310, K6+030) carril izquierdo. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo Maestro, oficiales, Maestro, ayudantes, controlador vial

Scanned with CamScanner

MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque compactador de neumáticos, irrigador de asfalto, Finisher. CLIMA: soleado

30 oct Miercoles 2024 | se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente al K2+990 - K3+850 carril derecho. Se realizaron ensayos de control de calidad. Se realizó fundida (K4+385, K5+175, K5+310, K6+080) carril izquierdo. (de muros y aletas) • PERSONAL: Ing residente, HSQE TOPÓGRAFO, Maestro, oficiales, ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, excavadora irrigador de asfalto, compactador de neumático, Finisher. Clima: Soleado

31 oct Jueves 2024. | Se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente a K3+390 - K3+850 carril izquierdo, previamente imprimado. Se realizaron ensayos de control de calidad MDC-19. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, irrigador de asfalto, compactador neumatico, Finisher. Clima: Soleado

Scanned with CamScanner
