v&m
ingenieria
SAS

RECIBI: 04-ABR-25.

Neiva, 04 de abril de 2025 V&M-GUA-017

Señores
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
ANT. ING. DANIELA CARRILLO
R.L Interventoría

Referencia: Contrato No. CLOPIH221 de 2024 de objeto "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar prórroga del contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024, celebrado con el Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA) y V&M INGENIERIA S.A.S.

Considerando que la ejecución de las actividades se ha visto afectada por factores externos no imputables al contratista, específicamente por factores como:

la funcionalidad del sistema eléctrico requiere revisión y presupuesto ajustado al diseño suministrado por la entidad el 13 de marzo del presente año, las actividades y cantidades de este componente afectan el cierre del Balance No.1 – Mayores y menores, por ende, se solicita amablemente extender el plazo de ejecución con el fin de garantizar, la revisión del presupuesto vs diseños, coordinación de análisis de precios unitarios, evaluación de precios en el mercado para definir costos de ítems no previstos del componente eléctrico y garantizar la meta física y funcionalidad del proyecto.

Por otra parte, el ingreso de materiales de obra se vio afectado por las constantes protestas y bloqueos de vías por parte del sector arrocero en el departamento del Huila y Tolima lo que impidió en transporte y entrega oportuna de materiales, herramienta y equipos.

Finalmente, pero no menos importante las condiciones climáticas adversas en la presente ola invernal que afectan la región, con días de constantes lluvias torrenciales han dificultado la ejecución de las actividades.

Estos factores han generado un atraso en el desarrollo de las actividades contractuales debido a que se ha ocasionado deterioro de las vías de acceso a las plantas que proveen de materiales pétreos, ingreso de maquinaria, equipos y materiales de ferretería programados para entrega en obra. Esto ha afectado las actividades de los ítems (2,1)


DIRECCION: CR 4 NO. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

v&m ingenieria SAS

"EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL", (2,3) "RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO", CAPITULO DE AGUAS LLUVIAS (3.1 - 3.5), "FUNDICIÓN DE PLACAS" (4.1 -4.5) "CERRAMIENTO" (5.1 – 5.10) "ILUMINACION" (6.1 – 6.10).


El aumento en las precipitaciones que ha ocasionado la ola invernal que afecta la región por la época ha generado pérdidas económicas considerables al contratista de obra debido a la perdida de la estructura de la placa y materiales pétreos lo cual genera reprocesos y retrasos en el cronograma de actividades predecesoras. A continuación, relacionamos historial del promedio mensual de lluvias en el municipio de Guadalupe Huila durante la ola invernal:

Promedio mensual de lluvia en febrero en Guadalupe

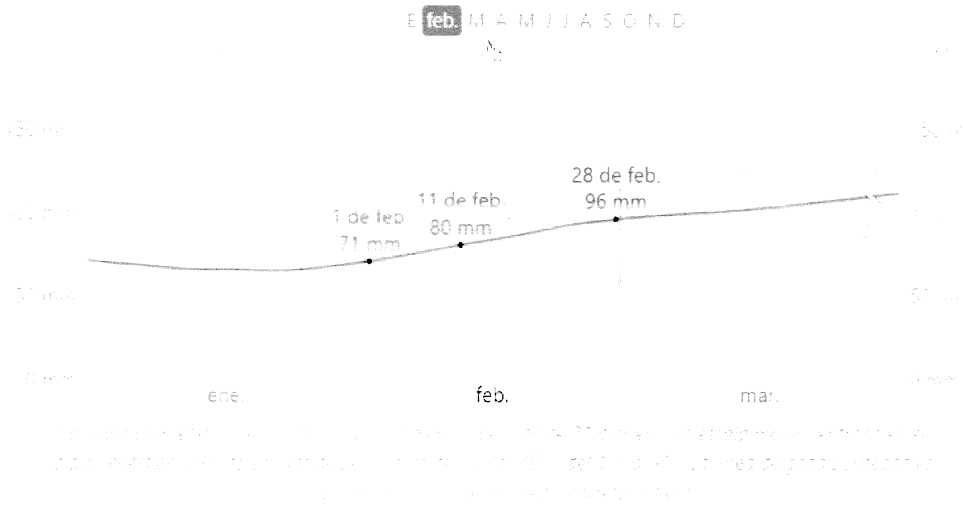


DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel- 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

Categorías de nubosidad en febrero en Guadalupe

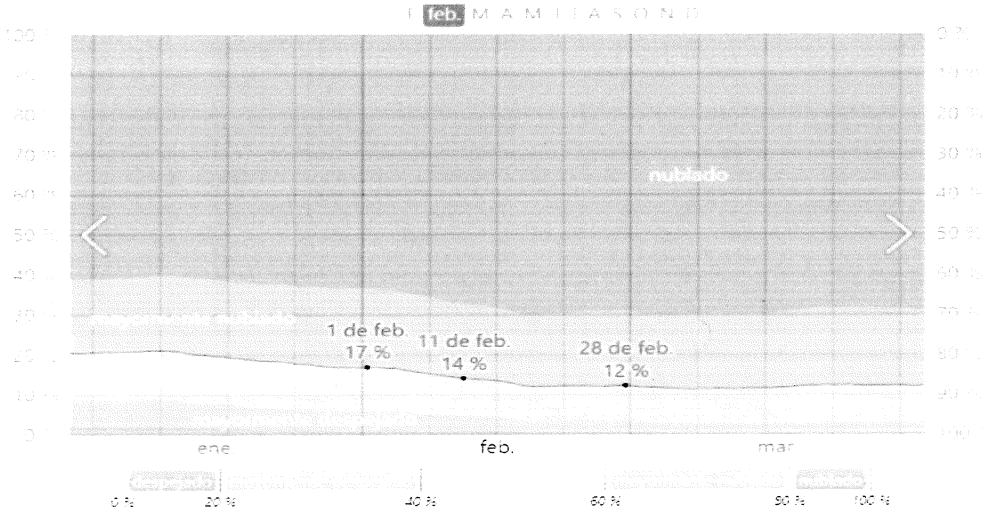


Promedio mensual de lluvia en marzo en Guadalupe

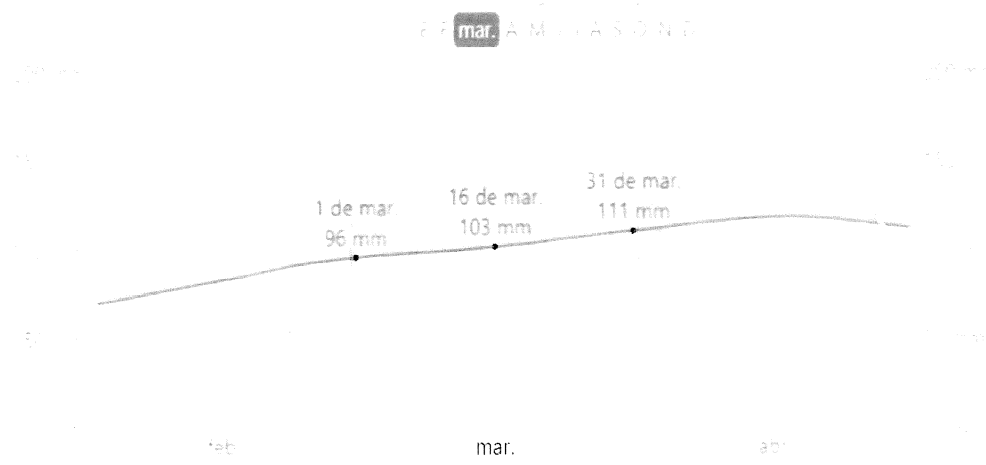


DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

Categorías de nubosidad en marzo en Guadalupe

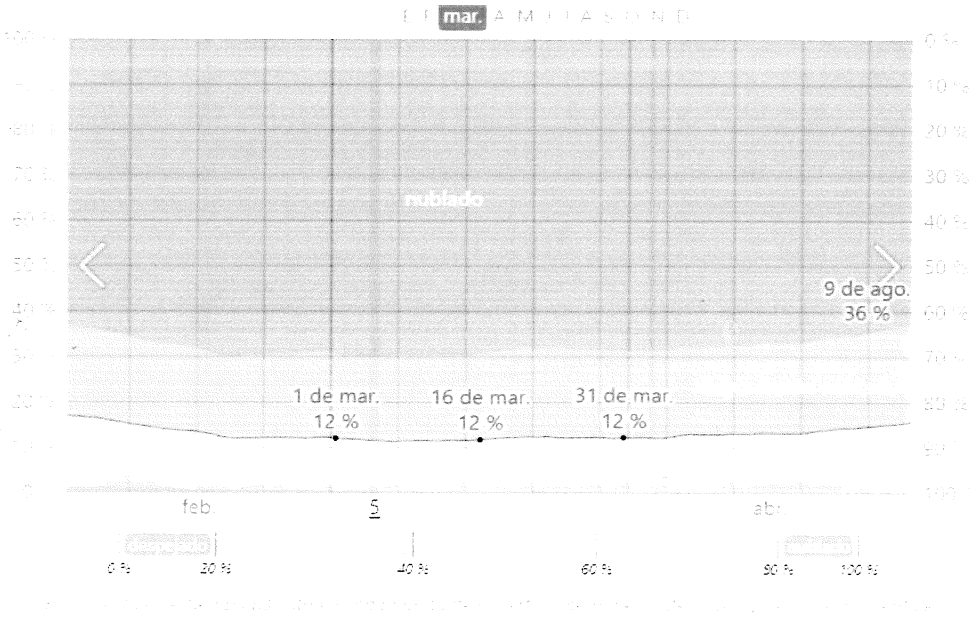


Promedio mensual de lluvia en abril en Guadalupe

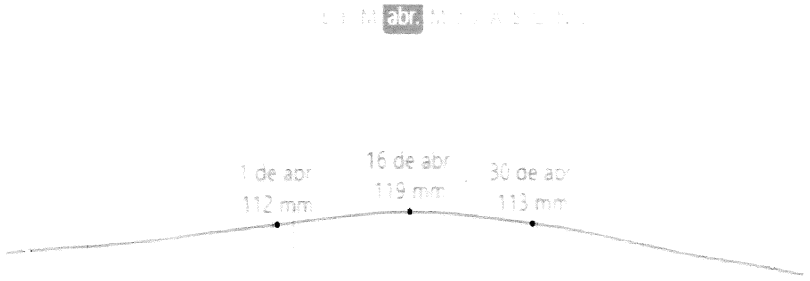

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede observar que el régimen de lluvias en los meses de febrero, marzo y abril son abundantes.

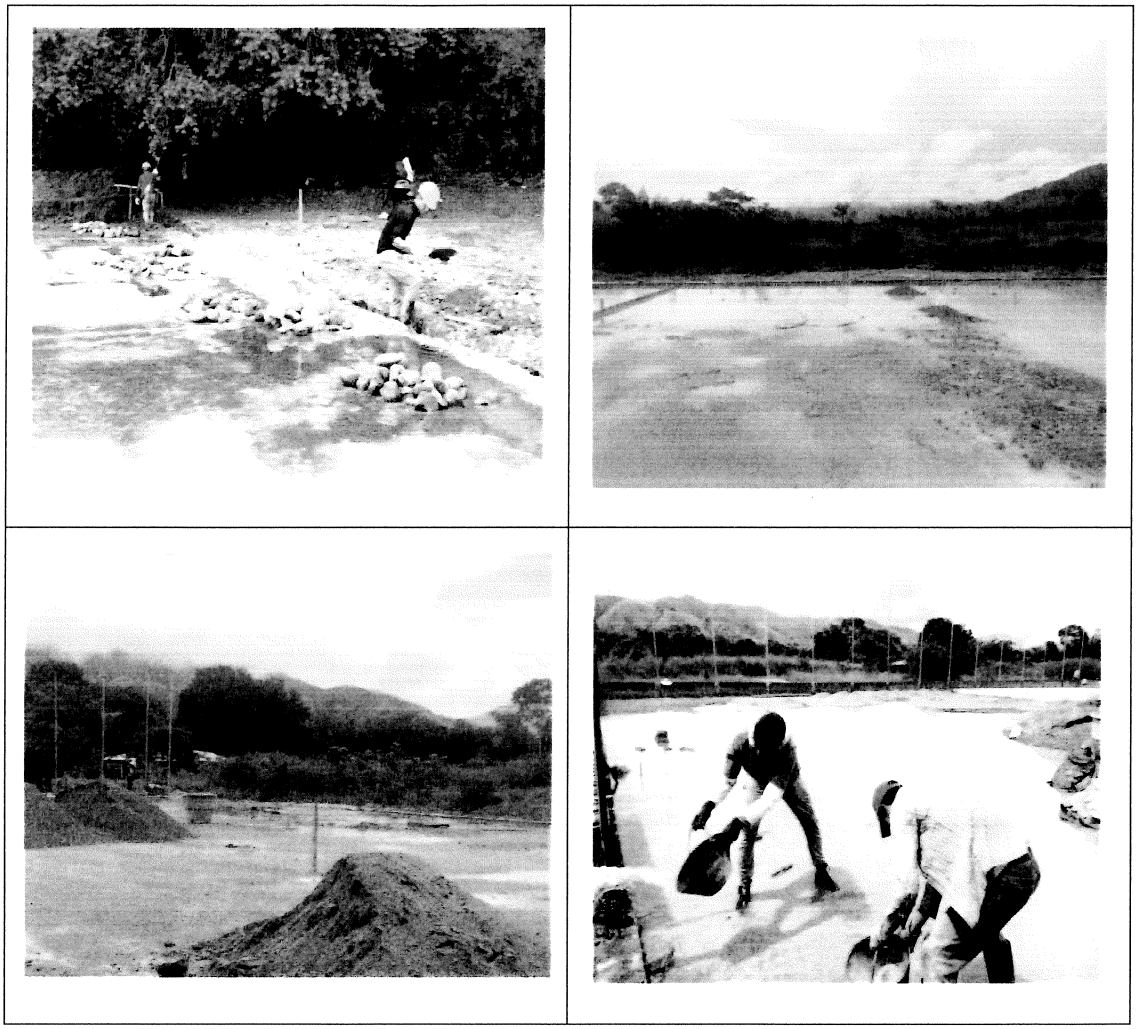

Por lo anterior, V&M INGENIERIA S.A.S., contratista del contrato de obra CLOPIH221 de 2024, solicita formalmente una prórroga por un plazo de dos (02) meses a fin de culminar con el alcance del proyecto.

Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Representante Legal

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

v&m
ingenieria
SAS

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com
