SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **1** Del: 2 de diciembre de 2024 Al: 8 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: ORIP SANTANDER DE QUILICHAO - AGRUPACION PACIFICO | SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,04%	0,04%
Valor básico de la Obra programada:	$ 14.435,75	$ 14.435,75

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE SAS
Contrato No.	2345 de 2024
Valor Inicial:	$ 118.826.031,00
Valor Actualizado:	NA
Plazo Inicial:	2 MESES y 3 DÍAS
Plazo Actualizado:	NA
Fecha de Iniciación:	28/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA SAS
Contrato No.	2367 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	NA
Plazo Inicial:	2 MESES y 3 DÍAS
Plazo Actualizado:	NA
Fecha de Iniciación:	28/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024


IMAGEN OFICINA

eidelca s.a.s
Equipos e Ingeniería del Caribe S.A.S.
Nit. 900.267.736-3

IMAGEN OFICINA

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT 901.489.856-3

AVANCE

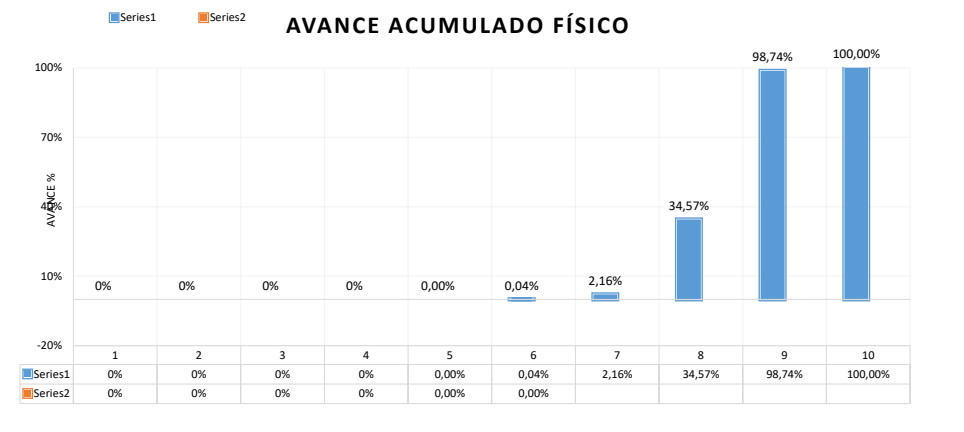

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Series1	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,04%	2,16%	34,57%	98,74%	100,00%
Series2	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%				

"Informe semanal 02 al 08 de diciembre de 2024

Durante la semana del 02 al 08 de diciembre de 2024, esta interventoría mediante oficio JVM - SNR-013- 2367 -2024, dio el AVAL a los CRONOGRAMAS DE OBRA de la AGRUPACIÓN PACIFICO de las Sedes de: Santander de Quilichao, Bolívar, Quibdó, La Cruz, Ipiales, Leticia y Puerto López, esta interventoría mediante oficio JVM - SNR-017- 2367 -2024, se dio aprobación de documentos de gestión de los componentes SST, ambiental y de calidad. No se ha llevado a cabo la ejecución de actividades, se adelanta un proceso de incumplimiento a la firma contratista de obra. Hasta la fecha, el porcentaje programado es del 0,04% en comparación con un avance ejecutado del cero por ciento (0%)."

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES

Para esta semana no se inician las intervenciones en la **ORIP SANTANDER DE QUILICHAO**. Sin embargo, el contratista deberá implementar un plan de contingencia para lograr superar el atraso que presenta a la fecha.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : **FABIAN RADA SEGURA.**
Matrícula No.:MP 08700-55928 del Atlantico.
