INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO – LLORÓ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.



CONTRATO DE OBRA

4521 DE 2023 CONSORCIO YUTO 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CISA SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4732 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA #2

PERIODO:
20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
   2.1. Localización 6
   2.2. Características técnicas del proyecto 6
3. CONTRATO DE OBRA 7
   3.1. ANTECEDENTES 7
   3.2. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA 10
   3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA 11
   3.4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS EN EL MES. 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
   4.1. Informe semanal 12
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
   5.1. Descripción de las actividades y acciones realizadas por el Interventor 14
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
7. ANEXOS 18

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización tramo a intervenir Vía Yuto- Lloró Código INVIAS 44291..... 6

TABLAS

Tabla 1. Lista Municipios priorizados 8
Tabla 2. Contrato de obra suscrito 10
Tabla 3. Información general Contrato 4521 de 2023 10
Tabla 8. Información general del contrato de interventoría 13
Tabla 9. Acciones del interventor 14

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS , estructuró el programa "COLOMBIA RURAL" que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Lloró situado en la zona Occidental del departamento del Chocó; la vía Yuto – Lloró tiene una longitud de 10.4 Km, esta vía pertenece a la red vial terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vías y es la única vía carreteable que comunica a la cabecera del municipio de Lloró con la Ruta Nacional 1307 (Las Animas – Quibdó), que hacia el norte se comunica con el municipio de Atrato y la capital del departamento del Chocó y hacia el sur conduce a los municipios de Certegüí y Unión Panamericana. Por medio de este proyecto se pretende la pavimentación de un tramo en dicha vía que corresponde a 450 metros de pavimento en concreto rígido, con el propósito de mejorar la transitabilidad, garantizar seguridad, comodidad y mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

En congruencia con lo anterior, se celebra el contrato No. **4521 de 2023**, entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS** y el CONSORCIO YUTO 2023 para el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO – LLORÓ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Para la interventoría, el INVÍAS contrató a través de la plataforma secop II a la empresa **CISA SERVICIOS S.A.S,** cuyo ID de contrato en el SECOP **CO1.PCCNTR.5595221** y de contrato No. **4732 de 2023**.


A lo largo de las siguientes páginas, se desglosarán minuciosamente los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y financieros, relacionados con el cotrato referido anteriormente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El municipio de Lloró se encuentra situado en la zona Occidental del departamento del Chocó, en la parte alta del río Atrato a 12 Km del Municipio del Atrato, posee una extensión total de 905 Km2 y los asentamientos de sus pobladores se distribuyen a lo largo de cuatro ríos (El Atrato, Andágueda, Capa y Tumutumbudo). Al oeste limita con el municipio del Atrato, al este con el municipio del Carmen de Atrato, al norte con el municipio de Bagadó y al sur con el municipio de Certegüí.

Ilustración 1. Localización tramo a intervenir Vía Yuto- Lloró Código INVIAS 44291

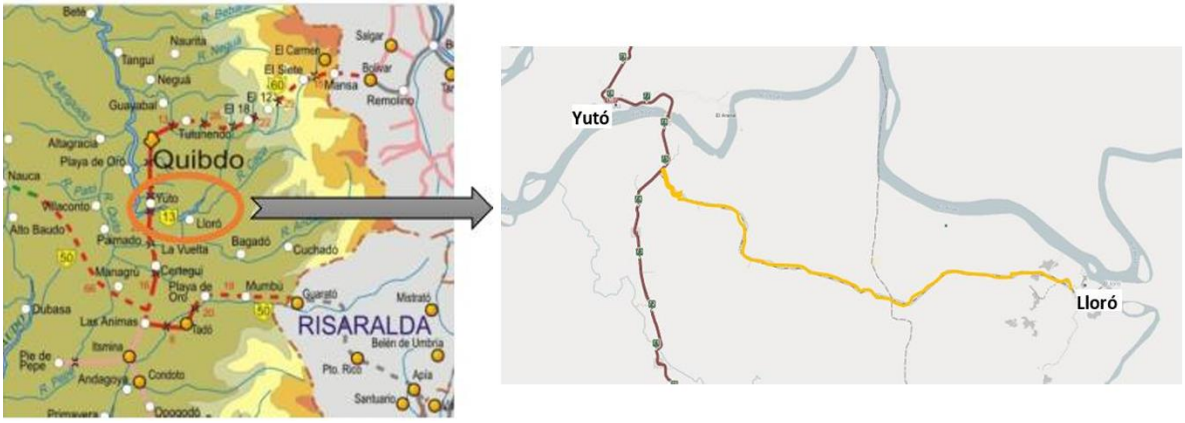

Fuente: ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

2.2. Características técnicas del proyecto

La definición del alcance final de las obras a ejecutarse determinada de manera conjunta por las partes que intervienen en el proyecto mediante aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIA".

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

Las actividades y/u obras a ejecutar son las siguientes:

- Mejoramiento de la estructura de pavimento en concreto hidráulico de aproximadamente 450 metros, así como la construcción de las obras necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía en las temporadas de lluvias como bordillos y cunetas.
- Construcción o rehabilitación de las obras de drenaje y subdrenajes, todas aquellas que se requieran de acuerdo con la revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños que debe realizar el contratista conforme a las especificaciones y normas técnicas y normatividad vigente y la Rehabilitación y/o Mantenimiento de los sectores priorizados a lo largo del corredor.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. ANTECEDENTES

El programa Colombia Rural inició en mayo de 2019, con la inscripción de 1.018 municipios y 24 gobernaciones, logrando así un 92% de participación, las cuales fueron realizadas de manera virtual. Luego de la etapa de visitas de verificación de la información suministrada, en donde se recorrió el 100%, de los corredores postulados, cifra histórica en la manifestación de interés por un programa del Gobierno.

El Programa Colombia Rural es el camino a través del cual el Gobierno Nacional impulsa el desarrollo del campo con infraestructura de calidad, aplicando tecnología moderna e innovadora que favorezca la conectividad de las regiones y la durabilidad de las obras.

Cumpliendo con los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías, inició la etapa de presentación y formalización de proyectos priorizados en el marco del programa Colombia Rural, optimizando la transitabilidad y conectividad en las vías, acercando territorios y permitiendo transportar los productos que nacen de las profundas tierras rurales colombianas hasta las principales urbes en donde se encuentran los grandes centros de comercialización y exportación.

Con los recursos asignados en el primer semestre de 2020, el Gobierno Nacional continuará suscribiendo convenios con los municipios que en orden de elegibilidad quedaron aprobados. A continuación, se presenta la lista de municipios priorizados emitida por el INVIAS, en la cual se encuentra el municipio de Lloró, el cual es el municipio de referencia para el objeto del presente contrato.

Tabla 1. Lista Municipios priorizados

Departamento	No de Municipios Priorizados	Municipios
Amazonas	1	Leticia
Antioquia	27	Rionegro, Cisneros, San Juan De Urabá, Anzá, Hispania, Barbosa, Yolombó, Dabeiba, Granada, Campamento, Santo Domingo, Ciudad Bolívar, Medellín, Amagá, Caracolí, Titibirí, Anorí, Tarazá, Santa Bárbara, Copacabana, Puerto Nare, Nechí, Caicedo, Zaragoza, Remedios, Jardín y Cáceres.
Arauca	1	Puerto Rondón
Atlántico	2	Galapa y Candelaria.
Bolívar	6	Barranco de Loba, Margarita, Arenal, Santa Catalina, San Martín de Loba y Turbaná.
Boyacá	18	Soatá, Tasco, Santana, Chitaraque, Soracá, Chivor, Sogamoso, Ventaquemada, Siachoque, Socha, Moniquirá, San Pablo de Borbur, Sutatenza, Mongua, Togüí, Úmbita, Oicatá y Otanche.
Caldas	5	Aguadas, Chinchiná, Marquetalia, Pensilvania y Anserma.
Caquetá	11	Valparaíso, El Pajuil, Curillo, La Montañita, Milán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Morelia, Solita, El Doncello.
Casanare	8	Tauramena, Yopal, Hato Corozal, Sabanalarga, Pore, Monterrey, Paz de Ariporo y Aguazul.
Cauca	11	Sucre, Popayán, Timbío, Puerto Tejada, La Vega, El Tambo, Rosas, Timbiquí, Almaguer, Bolívar y Mercaderes.
Cesar	3	Astrea, Río de Oro y Tamalameque.

Departamento	No de Municipios Priorizados	Municipios
Chocó	8	El Carmen de Atrato, Ríosucio, Bahía Solano, Bagadó, Lloró, Atrato, Río Iró y Bajo Baudó.
Córdoba	13	San Andrés de Sotavento, Canalete, La Apartada, Moñitos, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Montelíbano, San Carlos, Buenavista, San Bernardo del Viento, Pueblo Nuevo y Los Córdobas.
Cundinamarca	14	Apulo, Cabrera, Tena, Pandi, Pulí, El Rosal, Tibirita, Nimaima, Tabio, Tenjo, Bojacá, Vianí, Medina y Supatá.
Guainía	1	Inírida.
Guaviare	2	Miraflores y Calamar.
Huila	10	Neiva, Saladoblanco, Aipe, Rivera, Garzón, La Argentina, Palermo, Isnos, Acevedo y Agrado.
La Guajira	5	Maicao, Uribia, Manaure, Dibulla y Barrancas.
Magdalena	7	Zona Bananera, Ariguaní, Sabanas de San Ángel, San Zenón, Nueva Granada, San Sebastián de Buenavista y Chibolo.
Meta	10	Cubarral, Castilla La Nueva, Guamal, Acacías, Villavicencio, Uribe, Mapiripán, San Juan de Arama, El Dorado y Puerto Concordia.
Nariño	11	Buesaco, Pasto, La Llanada, Roberto Payán, Iles, San Pedro de Cartago, Cuaspud Carlosama, Ancuyá, Taminango, El Tablón de Gómez y Pupiales.
Norte de Santander	13	Convención, Hacarí, El Carmen, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Tarra, Tibú, Villa del Rosario, Chitagá, Los Patios, La Esperanza y Silos.
Putumayo	1	Puerto Caicedo.
Quindío	1	Salento
Risaralda	3	Belén de Umbría, Mistrató, Guática.
Santander	24	Hato, Rionegro, Los Santos, Mogotes, Albania, El Playón, Gámbita, Palmar, San Vicente de Chucurí, Galán, El Guacamayo, Suaita, Zapatoca, Güepsa, Ocamonte,

Departamento	No de Municipios Priorizados	Municipios
		Aratoca, Encino, Bolívar, La Paz, Piedecuesta, Guaca, Suratá, Sucre y Capitanejo.
Sucre	10	San Benito Abad, El Roble, Corozal, San Marcos, Galeras, San Onofre, Sampués, Sucre, Majagual y Chalán.
Tolima	17	Icononzo, Suárez, Murillo, Flandes, Ataco, Roncesvalles, Ibagué, Rovira, Anzoátegui, Falan, Villahermosa, Fresno, Dolores, Palocabildo, Prado, Valle de San Juan y Coyaima.
Valle del Cauca	11	Caicedonia, Buenaventura, Obando, La Cumbre, Florida, Pradera, Yotoco, Dagua, Ginebra, Toro y Bugalagrande.
Vaupés	1	Mitú.
Vichada	2	Cumaribo y La Primavera.

Fuente: Página web (https://www.invias.gov.co)

Tabla 2. Contrato de obra suscrito

CONTRATO No. 4521 DE 2023	CONSORCIO YUTO 2023
	R.L. ANILIO ABADIA SERNA
	ORDEN DE INICIO 27 DICIEMBRE DE 2023

Fuente: Elaboración Propia

3.2. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

Se detalla en la siguiente tabla la información general respectiva al contrato de obra en cuestión.

Tabla 3. Información general Contrato 4521 de 2023

NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5475269
NÚMERO DEL CONTRATO	4521-2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO – LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

CONTRATISTA	CONSORCIO YUTO 2023
	NIT. 901.769.054-7
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ
	NIT. 800.215.807-2
VALOR INICIAL	MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS ($1.190.066.017) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS ($1.190.066.017) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
FECHA DE INICIO	27/12/2023
MODIFICACIONES	PRORROGADO HASTA EL 20 JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1	08/02/2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2	11/03/2024
REANUDACIÓN	18/04/2024
INICIO PRORROGA 1	21/04/2024
FIN PRORROGA 1	20/07/2024
DIRECCIÓN	CALLE 19 No 96b-17 BOGOTÁ D.C.

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA


En este periodo, se comienzan las actividades de campo. La información financiera hasta la fecha de corte del presente informe se encuentra resumida de manera general en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la modalidad de pago es por avance de obra.

Tabla 4. Resumen financiero contrato 4521-2023

Valor inicial del contrato de obra	$ 1.190.066.017
Saldo del contrato	$ 1.190.066.017
Cobro Parcial	$ 0
Saldo del Contrato	$ 1.190.066.017

3.4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS EN EL MES.

En este apartado se compara la planificación inicial con la ejecución alcanzada; ver anexo1

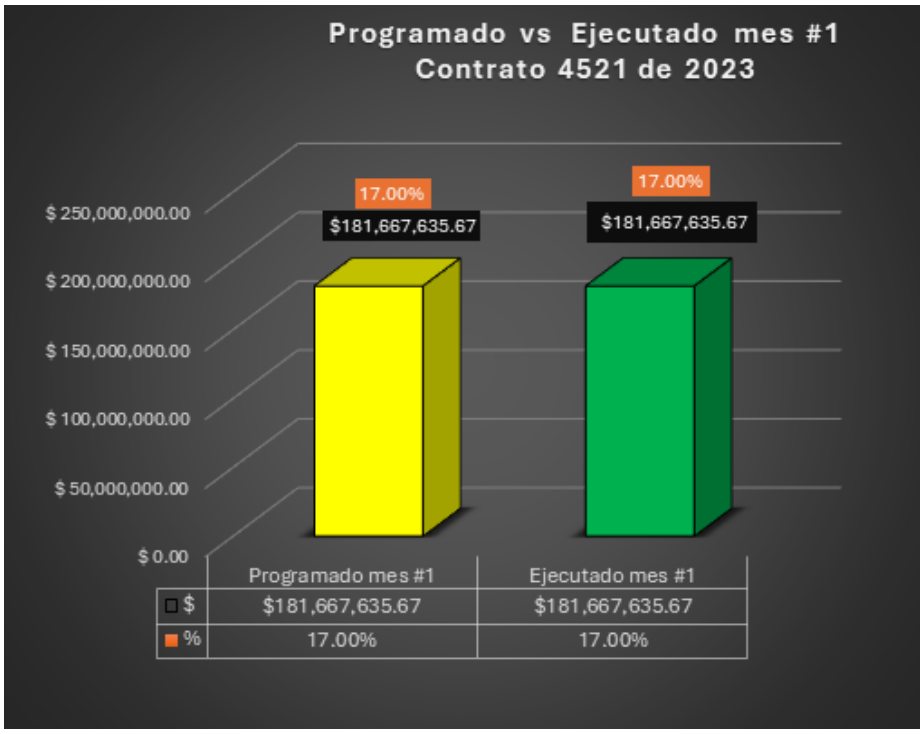

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe semanal

En aras de cumplir las condiciones contractuales, se adjuntan los informes semanales donde, la interventoría deja constancia de las actividades correspondientes en el presente mes, como medida de seguimiento periódico realizado por la empresa interventora (CISA SERVISIOS S.A.S), al cumplimiento de la ejecución del contrato de obra. Ver anexo 2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato 4521-2023 con el CONSORCIO YUTO 2023, cuyo objeto busca el mejoramiento vial en el departamento del Chocó aunado al programa "COLOMBIA RURAL"; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad realizó el proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría mediante la plataforma Secop II, donde se evaluaron las diferentes ofertas de los proponentes para el proceso de selección de mínima cuantía No **N° P-DT-CHO-018-2023;** cuyo objeto, ***" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO – LLORÓ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.***

Después de llevar a cabo el proceso de evaluación de los criterios de elegibilidad y de las propuestas económicas, el INVIAS otorgó el contrato al licitante que presentó la propuesta más favorable. Ahora, dicho licitante actúa como contratista INTERVENTOR para la ejecución de la obra pública, identificado con el número de seguimiento **4732 DE 2023**. Este contrato fue concedido a la persona jurídica **CISA SERVICIOS S.A.S** identificada con Número de Identificación Tributaria (NIT) 900792044-6.

El contrato **N° 4732 DE 2023** fue formalizado en la plataforma SECOP II mediante la aceptación de la propuesta el 29 de noviembre de 2023. Se detalla en la siguiente tabla la información respectiva al contrato de interventoría.

Tabla 5. Información general del contrato de interventoría

NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5595221
NÚMERO DEL CONTRATO	4732 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO LLORÓ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA	CISA SERVICIOS S.A.S.
NIT	900792044-6
VALOR INICIAL	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (87.770.235,00)
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (87.770.235,00)
MODIFICACIONES	PRORROGADO HASTA EL 20 JULIO DE 2024

SUSPENSIÓN 1	30/12/2023
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1	08/02/2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2	11/03/2024
REANUDACIÓN	19/04/2024
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE INICIO	27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	20 JULIO DE 2024
DIRECCIÓN	Carrera 27 No. 24 – 142 (QUIBDÓ CHOCO)

5.1. Descripción de las actividades y acciones realizadas por el Interventor

Se describe a continuación el desarrollo del plan de calidad del Interventor, el cual se ha adelantado con los procedimientos respectivos para las actividades de la fase se revisión de estudios y diseños. Para esta etapa se abordan los aspectos incluidos en el presente contrato de interventoría.

Tabla 6. Acciones del interventor

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
Contrato No. 4732 de 2023	• Trazabilidad correspondencia con contratista, contratante y otros. • Definición del alcance del contrato a través de la ficha técnica. • Elaboración, revisión y entrega del informe mensual de avance y de las semanas contenidas en el periodo. • Elaboración de las correspondientes actas. • Seguimiento a seguros y garantías, que se encuentren vigentes y acorde a las fechas del contrato. • Revisión del contrato y documentación legal. • Supervisar el cumplimiento de obligaciones contractuales • Proteger la confidencialidad de la información sensible y datos personales. • Aprobación personal de obra y observaciones
ASPECTOS AMBIENTALES	
Contrato No. 4732 de 2023	• Seguimiento al plan de gestión socio ambiental contemplado por el contratista de obra.

	•

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las labores de seguimiento y supervisión del contrato suscrito durante este lapso posibilitan inferir lo siguiente.

- En el presente periodo la interventoría emite concepto favorable de aprobación al personal postulado por el contratista de obra.


- El contratista de obra (CONSORCIO YUTO 2023), dispone de la capacidad operativa para atender las eventuales emergencias que puedan ocurrir en el corredor vial.

- Se precipitan lluvias fuertes, pero se logra alcanzar un avance en obra del 16.97% frente a las dificultades presentadas asociadas a los factores climáticos.

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
REP. LEGAL DE CISA SERVICIOS SAS

Tabla 7. Registros fotográficos

	
ACTIVIDADES DE CAMPO	**ACTIVIDADES DE CAMPO**
	
ACTIVIDADES DE CAMPO	**ACTIVIDADES DE CAMPO**
	
ACTIVIDADES DE CAMPO	**ACTIVIDADES DE CAMPO**

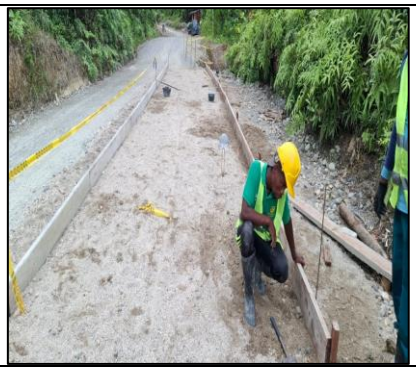	
ACTIVIDADES DE CAMPO	**ACTIVIDADES DE CAMPO**

7. ANEXOS

ANEXO #1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPHMNI-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	-
FECHA	15/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES ■

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4521 DE 2023.

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO YUTO 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4732 de 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: N/A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/04/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1,190,066,017
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1,190,066,017.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado / $ Valor programado		ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS								EJECUCIÓN			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado		abr-24	may-24	may-24	may-24	may-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	jul-24	jul-24	jul-24
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Desmonte y limpieza en bosque	$1,787,610	0.17%		% P	AMPLIACION 2 DI									0.17%			
	$1,787,610	0.17%		$ P										$1,787,610			
				$ E										$1,787,610			
				% E										0.17%			
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$600,440	0.06%		% P										0.06%			
	$600,440	0.06%		$ P										$600,440			
				$ E										$600,440			
				% E										0.06%			
Excavación en material común de la explanación y canales	$4,938,000	0.46%		% P										0.23%	0.23%		
	$4,938,000	0.46%		$ P										$2,469,000	$2,469,000		
				$ E										$2,469,000	$2,469,000		
				% E										0.23%	0.23%		
Remoción de derrumbes	$8,659,750	0.81%		% P										0.81%			
	$8,659,750	0.81%		$ P										$8,659,750			
				$ E										$8,659,750			
				% E										0.81%			
Conformación de taludes existentes	$1,926,600	0.18%		% P												0.18%	
	$1,926,600	0.18%		$ P												$1,926,600	
				$ E												$1,926,600	
				% E												0.18%	
Conformación de la Calzada existente	$4,212,000	0.39%		% P										0.20%	0.20%		
	$4,212,000	0.39%		$ P										$2,106,000	$2,106,000		
				$ E										$2,106,000	$2,106,000		
				% E										0.20%	0.20%		
Afirmado	$74,493,000	6.97%		% P											0.63%	0.63%	0.63%
	$74,493,000	6.97%		$ P											$6,772,091	$6,772,091	$6,772,091
				$ E											$6,772,091	$6,772,091	$6,772,091
				% E											0.63%	0.63%	0.63%
Subbase Granular clase C	$79,764,750	7.46%		% P											0.68%	0.68%	0.68%
	$79,764,750	7.46%		$ P											$7,251,341	$7,251,341	$7,251,341
				$ E											$7,251,341	$7,251,341	$7,251,341
				% E											0.68%	0.68%	0.68%
Geotextil tipo tejido Grab mínima 1400N	$32,400,000	3.03%		% P	SUSPENSION 1 : 29/12/2023 hasta 08/02/2024												
	$32,400,000	3.03%		$ P	SUSPENSION 1 11/03/2024 hasta 18/04/2024												
				$ E													
				% E													
Pavimento en Concreto Hidráulico	$443,091,600	41.46%		% P												3.19%	3.19%
	$443,091,600	41.46%		$ P												$34,083,969	$34,083,969
				$ E												$34,083,969	$34,083,969
				% E												3.19%	3.19%
Acero de Refuerzo fy=4200MPa	$66,042,144	6.18%		% P												0.48%	0.48%
	$66,042,144	6.18%		$ P												$5,080,165	$5,080,165
				$ E												$5,080,165	$5,080,165
				% E												0.48%	0.48%
Geotextil tipo No tejido Grab mínima 700N	$20,622,600	1.93%		% P													
	$20,622,600	1.93%		$ P													
				$ E													
				% E													
Tubería de plástico tipo perforada para filtro diametro 4"	$32,374,800	3.03%		% P													
	$32,374,800	3.03%		$ P													
				$ E													
				% E													
Material Granular Drenante	$71,474,400	6.69%		% P													
	$71,474,400	6.69%		$ P													
				$ E													
				% E													
Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo	$151,091,960	14.14%		% P	AMPLIACION 1 DE SUSPENSION 1 08/02/2024 hasta el 11/03/2024												
	$151,091,960	14.14%		$ P													
				$ E													
				% E													
Bordillo en Concreto Vaciada In Situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	$53,586,000	5.01%		% P													
	$53,586,000	5.01%		$ P													
				$ E													
				% E													
Linea de demarcación con pintura en frio	$4,240,350	0.40%		% P													
	$4,240,350	0.40%		$ P													
				$ E													
				% E													
Tacha Reflectiva tipo A	$2,438,055	0.23%		% P													
	$2,438,055	0.23%		$ P													
				$ E													
				% E													
Señal vertical de tránsito tipo (SP SI SR u otros dispositivos para regulación del tránsito) dimensiones (75x75) con lámina retroreflectiva tipo IV.	$10,089,092	0.94%		% P													
	$10,089,092	0.94%		$ P													
				$ E													
				% E													
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	$4,800,000	0.45%		% P	AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSION 1 08/02/2024 hasta el 11/03/2024									0.22%	0.22%		
	$4,800,000	0.45%		$ P										$2,400,000	$2,400,000		
				$ E										$2,400,000	$2,400,000		
				% E										0.22%	0.22%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1,068,633,151.00**				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1,068,633,151.00**																

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%					**1.69%**	**2.0%**	**5.16%**	**4.98%**		**5%**	**6%**	**6%**	**7%**	**7%**	**10%**	**9%**	**9%**	**8%**	**7%**	**7%**	**3%**
	VALOR (Miles de Pesos)					**$18,022,800**	**$20,998,432**	**$55,114,166**	**$53,187,566**		**$65,461,766**	**$65,461,766**	**$65,461,766**	**$75,895,766**	**$75,895,766**	**$105,135,475**	**$99,735,475**	**$99,735,475**	**$85,712,043**	**$70,629,978**	**$75,674,524**	**$36,510,390**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%					**1.69%**	**3.65%**	**8.81%**	**13.79%**		**19.91%**	**26.04%**	**32.16%**	**39.27%**	**46.37%**	**56.21%**	**65.54%**	**74.87%**	**82.89%**	**89.50%**	**96.58%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)					**$18,022,800**	**$39,021,232**	**$94,135,398**	**$147,322,964**		**$212,784,730**	**$278,246,496**	**$343,708,262**	**$419,604,028**	**$495,499,794**	**$600,635,268**	**$700,370,743**	**$800,106,217**	**$885,818,260**	**$956,448,238**	**$1,032,122,761**	**$1,068,633,151**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%					**1.69%**	**2%**	**5.16%**	**4.98%**													
	VALOR (Miles de Pesos)					**$18,022,800**	**$20,998,432**	**$55,114,166**	**$53,187,566**													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%					**1.69%**	**3.65%**	**8.81%**	**13.79%**													
	VALOR (Miles de Pesos)					**$18,022,800**	**$39,021,232**	**$94,135,398**	**$147,322,964**													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 20,659,881.00 / $ 20,659,881.00	$ -	%
*SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 1,089,293,032.00 / $ 1,089,293,032.00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 33,724,841.00 / $ 33,724,841.00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS, DARAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)	$ 2,560,000.00 / $ 2,560,000.00	$ -	%
*VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1,125,577,873.00 / $ 1,125,577,873.00	$ -	%
*VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 8,225,377.00 / $ 8,225,377.00	$ -	%
*VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1,133,803,250.00 / $ 1,133,803,250.00	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$ 19,500,000.00	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA	$ 3,705,000.00	$ -	%
	$ 3,705,000.00		%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	$ 23,205,000.00	$ -	%
	$ 23,205,000.00	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA) (L)	**$ 33,057,767.00**	**$ -**	**%**
	$ 33,057,767.00	**$ -**	**%**
VALOR TOTAL = H + K + L	**$ 1,190,066,017.00**	$ -	%
	$ 1,190,066,017.00	$ -	%

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: COSORCIO YUTO 2023 — Representante legal o apoderado del Contratista: ANILO ABADIA SERNA — Matrícula Profesional No.: 2520226068 CND

Aprueba Firma: Nombre: CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:05202-124561 ANT

Revisó Firma: Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO #2. INFORMES SEMANALES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**		**FECHA**	25	5 2024
DIRECCION TERRITORIAL	**CHOCO**		**CONTRATO DE OBRA**	4521 de 2023	
SEMANA NUMERO	5	DEL 18 de mayo de 2024	AL	24 de Mayo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:	150	dias			
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Ing. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

ETAPA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.69%	1.69%
Valor total de la Obra	$ 18,059,900.25	$ 18,059,900.25

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	1.69%	1.69%
Valor total de la Obra	$ 18,059,900.3	$ 18,059,900.3

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO YUTO 2023	**Interventor:**	CISA SERVICIOS S.A.S
Contrato No.	4521 DE 2023.	Contrato No.	4732 de 2023
Valor básico de obra:	$ 1,068,633,151.00		
Valor Total:	$ 1,190,066,017.00	Valor Inicial:	$ 87,770,235.00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023
Prorroga:	20 de julio de 2024	Prorroga:	20 de julio de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Campamento provisional de obra para almacenamiento de equipos y herramienta menores.
* Desmonte y limpieza
* Excavación en material común de la explanación y canales
* Localización y replanteo
* Remoción de derrumbes
* Conformación de la Calzada existente

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Conformación de la Calzada existente
* Localización y replanteo
* Excavación en material común de la explanación y canales
* Ingreso material petreo para afirmado y subbase
* Instalación valla del proyecto.

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Equipos de oficina	Un (1) Ingeniero residente de obra
Dos (02) Ranas compactadoras	Dos (02) Oficiales
Una (01) Moto niveladora	Seis (06) Ayudantes
Una (01) Retro excavadora mini	
Cuatro (04) Volquetas	
Una (01) Planta eléctrica	
Herramientas menores	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En el presente periodo se inician las actividades de ejecución en campo, una vez culminada la etapa de actualización y/o revisión de estudios y diseños.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
El presente informe que obedece a la semana 9, corresponde a la semana de inicial de actividades en campo.	Cristiam Alborñoz Barrios **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Instalación campamento provisional



Figura 2. Desmonte y limpieza



Figura 3. Excavación en material común de la explanación y canales



Figura 4. Localización y replanteo



Figura 5. Remoción de derrumbes

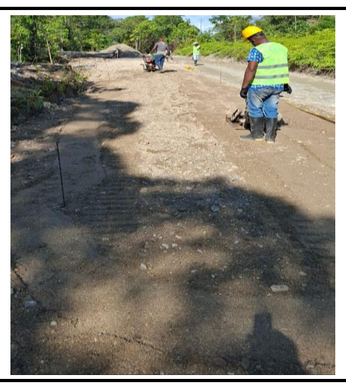


Figura 6. Conformación de la Calzada existente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**	**FECHA**	1 6 2024
DIRECCION TERRITORIAL	**CHOCO**	**CONTRATO DE OBRA**	4521 de 2023

SEMANA NUMERO	6		DEL	25 de mayo de 2024		AL	31 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:				157	dias		

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

ETAPA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.96%	3.65%
Valor total de la Obra	$ 20,998,431.82	$ 39,005,110.01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	1.96%	3.65%
Valor total de la Obra	$ 20,998,431.8	$ 39,005,110.0

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO YUTO 2023	**Interventor:**	CISA SERVICIOS S.A.S
Contrato No.	4521 DE 2023.	Contrato No.	4732 de 2023
Valor básico de obra:	$ 1,068,633,151.00		
Valor Total:	$ 1,190,066,017.00	Valor Inicial:	$ 87,770,235.00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023
Prorroga:	20 de julio de 2024	Prorroga:	20 de julio de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Conformación de la Calzada existente
* Desmonte y limpieza
* Excavación en material común de la explanación y canales
* Localización y replanteo
* Ingreso material petreo para afirmado y subbase
* Control de trafico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Conformación de Talud existente
* Excavación en material común de la explanación y canales
* Ingreso material petreo para afirmado y subbase
* Instalación y compactación material petreo para afirmado y subbase
* Instalación valla del proyecto.
* Señalización de taludes
* Acero de refuerzo FY=4200MPA
* Pavimento en concreto hidráulico

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Equipos de oficina	Un (1) Ingeniero residente de obra
Dos (02) Ranas compactadoras	Dos (02) Oficiales
Una (01) Moto niveladora	Seis (06) Ayudantes
Una (01) Retro excavadora mini	
Cuatro (04) Volquetas	
Una (01) Planta eléctrica	
Herramientas menores	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En el presente periodo se continuan las actividades de ejecución en campo, con el objetivo de avanzar con las metas físicas programadas y con el avance integral de la obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
Las fuertes precipitaciones y condiciones climatológicas de la región no permiten un avance considerable en la ejecución de actividades de obra.	Cristiam Albornoz Barrios **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Conformación de calzada existente

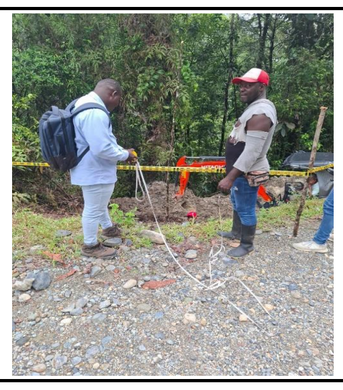


Figura 2. Localización y replanteo



Figura 3. Localización y replanteo



Figura 4. Control de trafico



Figura 5. Excavación en material común de la explanación y canales



Figura 6. Instalación y compactación Subbase granular clase C

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**	**FECHA**	10 / 6 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	**CHOCO**	**CONTRATO DE OBRA**	4521 de 2023

SEMANA NUMERO	7		DEL	01 de junio de 2024		AL	10 de junio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:			166	dias			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

ETAPA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.16%	8.81%	Obra Física	5.16%	8.81%
Valor total de la Obra	$ 55,114,165.97	$ 94,135,397.79	Valor total de la Obra	$ 55,114,166.0	$ 94,135,397.79

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO YUTO 2023	**Interventor:**	CISA SERVICIOS S.A.S
Contrato No.	4521 DE 2023.	Contrato No.	4732 de 2023
Valor básico de obra:	$ 1,068,633,151.00		
Valor Total:	$ 1,190,066,017.00	Valor Inicial:	$ 87,770,235.00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023
Prorroga:	20 de julio de 2024	Prorroga:	20 de julio de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Señalización de taludes
* Conformación de Talud existente
* Instalación y compactación material para afirmado
* Instalación y compactación subbase granular clase C
* Ingreso material petreo para afirmado y subbase
* Acero de refuerzo FY=4200MPA
* Pavimento en concreto hidráulico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Excavación en material común de la explanación y canales
* Acopio material petreo para afirmado y subbase
* Instalación y compactación material petreo para afirmado y subbase
* Instalación valla del proyecto.
* Señalización de taludes
* Acero de refuerzo FY=4200MPA
* Pavimento en concreto hidráulico

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Equipos de oficina	Un (1) Ingeniero residente de obra
Dos (02) Ranas compactadoras	Dos (02) Oficiales
Una (01) Moto niveladora	Seis (06) Ayudantes
Una (01) Retro excavadora mini	
Cuatro (04) Volquetas	
Una (01) Planta eléctrica	
Herramientas menores	
Un (01) Vibrador para concreto	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En el presente periodo se continuan las actividades de ejecución en campo, con el objetivo de avanzar con las metas físicas programadas y con el avance integral de la obra.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Las fuertes precipitaciones y condiciones climatológicas de la región no permiten un avance considerable en la ejecución de actividades de obra.	CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Señalización de taludes



Figura 2. Excavación en material común de la explanación y canales



Figura 3. Instalación y compactación material para afirmado



Figura 4. Instalación y compactación subbase granular clase C



Figura 5. Acero de refuerzo FY=4200MPA



Figura 6. Pavimento en concreto hidráulico

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**		**FECHA**	19	6 2024
DIRECCION TERRITORIAL	**CHOCO**		**CONTRATO DE OBRA**	4521 de 2023	
SEMANA NUMERO	8	DEL 11 de junio de 2024	AL	19 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:	175	dias			
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Ing. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

ETAPA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7.98%	17.00%
Valor total de la Obra	$ 85,246,560.50	$ 181,667,635.67

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	7.98%	17.00%
Valor total de la Obra	$ 85,246,560.5	$ 181,667,635.67

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO YUTO 2023	**Interventor:**	CISA SERVICIOS S.A.S
Contrato No.	4521 DE 2023.	Contrato No.	4732 de 2023
Valor básico de obra:	$ 1,068,633,151.00		
Valor Total:	$ 1,190,066,017.00	Valor Inicial:	$ 87,770,235.00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023	Fecha de Inicio:	27 de diciembre de 2023
Prorroga:	20 de julio de 2024	Prorroga:	20 de julio de 2024
Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024	Fecha final de terminacion del contrato	20 de julio de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Conformación de Talud existente
* Instalación y compactación subbase granular clase C
* Ingreso material petreo para afirmado y subbase
* Acero de refuerzo FY=4200MPA
* Pavimento en concreto hidráulico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Excavación en material común de la explanación y canales
* Acopio material petreo para afirmado y subbase
* Instalación y compactación material petreo para afirmado y subbase
* Instalación valla del proyecto.
* Señalización de taludes
* Acero de refuerzo FY=4200MPA
* Pavimento en concreto hidráulico

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Equipos de oficina	Un (1) Ingeniero residente de obra
Dos (02) Ranas compactadoras	Dos (01) Oficial
Dos (02) Mezcladoras de concreto (Mixer)	Seis (05) Ayudantes
Una (01) Retro excavadora mini	
Cuatro (04) Volquetas	
Una (01) Planta eléctrica	
Herramientas menores	
Un (01) Vibrador para concreto	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En la presente semana el CONSORCIO YUTO 2023 en condición de contratista de obra, solicita la suspensión del contrato de obra 4521-2023; debido a la escasez de suministro de materiales en la zona. Los altos niveles de los ríos, sujetos a extracción de material, han afectado la disponibilidad de los materiales esenciales para la ejecución de las actividades contractuales. Otra razón por lo que es necesario suspender el contrato debido al no acceso de maquinaria y equipo a la zona de ejecución de la obra, por causas no imputables al contratista, cabe resaltar que en la zona hay problemas de orden público lo cual afecta la normal ejecución del proyecto.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoría bajo las justificaiones emitidas por el CONSORCIO YUTO 2023, considera viable y da respuesta oportuna a la solicitud de suspensión del contrato 4521 de 2023.	Cristiam Albornoz Barrios **DIRECTOR INTERVENTORIA : CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS** **MP - 05202-124561 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Subbase granular clase C



Figura 2. Acopio de materiales pétreos



Figura 3. Instalación formaletas



Figura 4. Pavimento en concreto hidráulico

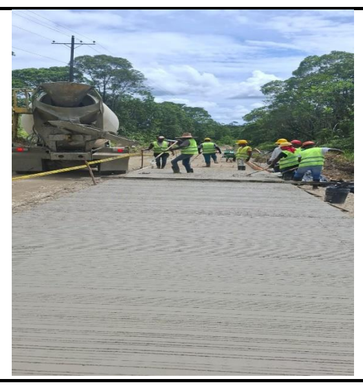


Figura 5. Pavimento en concreto hidráulico



Figura 6. Pavimento en concreto hidráulico

ANEXO #3. ESTADO CLIMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4521 DE 2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO YUTO 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4732 de 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																				20	22	23	23	22	24	23	20	22	21	22		242
Lluvias moderadas																				2	2		1	2			1	1	1			10
Lluvias intensas																				2		1				1	3	1	2	2		12
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LEIDI QUINCHIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: MP: 05202-270799 ANT

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4521 DE 2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO YUTO 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4732 de 2023 **INTERVENTOR:** CISA SERVICIOS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	22	21	23	24	23	23	22	23	24	23	22	24	23	22	20	24														410
Lluvias moderadas			2		1			1	2			1	1		1		2														11
Lluvias intensas	1			3			1			1			1			2	2														11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LEIDY QUINCHIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: MP: 05202-270799 ANT

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO #4. POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101199951	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	07	2024	27	12	2023	00:00	05	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO YUTO 2023	NIT: 901.769.054-7	CL 29 NRO. 3 - 29	QUIBDO, CHOCO	3152107565

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO NUMERO 4521 DE 2023,EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CUYO OBJETO ES : EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR PARA EL INSTITUTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES, EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA RESPECTIVA LICITACION PUBLICA, LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA ACEPTADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
NOTA : EL AMPARAO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A ENTERA SATISFACCION.

NOTA : EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE EXTIENDE A LA REVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALUCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURAL $ 19.500.000.MAS IVA $ 3.705.000. IGUAL A $ 23.205.000. SU VIGENCIA ES DE CINCO AÑOS (5) CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A ENTERA SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	17/11/2024	$119,006,601.70	$119,006,601.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/07/2027	$238,013,203.40	$238,013,203.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$357,019,805.10	$357,019,805.10
CALIDAD DEL SERVICIO	05/02/2024	05/02/2029	$6,961,500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	24/01/2025	$589,067,820.00	$589,067,820.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA PRORROGA No 1 DEL CONTRATO No 4521 DE 2023, SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 20 JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMIMOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****347,849.00	$ *******8,000.00	$ ******67,611.00	$ **********423,460.00	$ ****1,310,068,930.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101199951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101199951	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	07	2024	27	12	2023	00:00	05	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO YUTO 2023		**NIT: 901.769.054-7**
DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 3 - 29	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	3152107565

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ABADIA SERNA ANILIO	79278221-2	90.00
PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S.	900788875-4	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101199951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101199951, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de JULIO de 2024

14-44-101199951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061279	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	07	2024	27	12	2023	00:00	27	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO YUTO 2023	NIT: 901.769.054-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 29 NRO. 3 - 29	QUIBDO, CHOCO	3152107565

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO NUMERO 4521 DE 2023, CUYO OBJETO ES : EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR PARA EL INSTITUTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES, EL MEJORAMIENTO DE LA VA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLOR - DEPARTAMENTO DEL CHOC EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA RESPECTIVA LICITACIN PBLICA, LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA ACEPTADA POR EL INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS Y/O CONSORCIO YUTO 2023
BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/07/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/07/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/07/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA No. 4521 DE 2023 SE PRORROGA EL PLAZO POR EL TERMINO DE 2 MESES MAS DEL 21/04/2024 HASTA EL 20/06/2024 ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****108,630.00	$ *******3,000.00	$ ******21,209.00	$ **********132,839.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061279	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	07	2024	27	12	2023	00:00	27	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO YUTO 2023		**NIT: 901.769.054-7**
DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 3 - 29	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	3152107565

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/07/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/07/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/07/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061279	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	07	2024	27	12	2023	00:00	27	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO YUTO 2023		**NIT: 901.769.054-7**
DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 3 - 29	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	3152107565

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:**	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ABADIA SERNA ANILIO	79278221-2	90.00
PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S.	900788875-4	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO #5. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 2 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ E

CONTRATO No. 4521 DE 2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO YUTO 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4732 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CISA SERVICIOS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES JUNIO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	Honda	360 kg	Lloró-Chocó																								A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	Caterpillar	140K	Lloró-Chocó																								A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA	Caterpillar	51.1 kN	Lloró-Chocó																								A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2.9	95%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0.0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0.1	5%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:LEIDI QUINCHIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:MP: 05202-270799 ANT

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 2 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO - LLORO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ E

CONTRATO No. 4521 DE 2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO YUTO 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4732 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CISA SERVICIOS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	Honda	360 kg	Lloró-Chocó	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												
MOTONIVELADORA	Caterpillar	140K	Lloró-Chocó	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												
RETROEXCAVADORA	Caterpillar	51.1 kN	Lloró-Chocó	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												
VIBRADOR PARA CONCRETO	Bosch	Potencia (Hp): 3	Lloró-Chocó	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4												
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3.6	91%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0.0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0.4	9%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LEIDI QUINCHIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: MP: 05202-270799 ANT

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO #7. SEGURIDAD SOCIAL OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901769054	7	CONSORCIO YUTO 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	ATRATO	atrato yuto	ATRATO-CHOCO	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	20240809111256530228	9471136954	E	2024/07/12	2024/08/09	BANCO AV VILLAS	28	$603,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ATRATO (4 Afiliados)						$1,906,668	$305,200			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$132,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ATRATO (4 Afiliados)						$1,906,668	$305,200			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$132,800		$0	$0
Ciudad: ATRATO Depto: CHOCO (4 Afiliados)						$1,906,668	$305,200			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$132,800		$0	$0
1	CC	1078917216	MATURANA ASTERIO	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
2	CC	4850748	MORENO JOSE	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
3	CC	1076383006	MOSQUERA DANIEL	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
4	CC	1133669413	RENTERIA ARISTIDES	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$1,906,668	$305,200			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$76,400			$1,906,668	$132,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901769054	7	CONSORCIO YUTO 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	ATRATO	atrato yuto	ATRATO-CHOCO	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	20240809111256530228	9471136954	E	2024/07/12	2024/08/09	BANCO AV VILLAS	28	$603,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$305,200	$6,400	$0	$311,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$228,900	$4,800	$0	$233,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,300	$1,600	$0	$77,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$132,800	$2,800	$0	$135,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$132,800	$2,800	$0	$135,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$76,400	$1,700	$0	$78,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$76,400	$1,700	$0	$78,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$76,400	$1,800	$0	$78,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$38,200	$900	$0	$39,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$38,200	$900	$0	$39,100
TOTAL				**4**	**$590,800**	**$12,700**	**$0**	**$603,500**
