Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

INFORME MENSUAL No. 3

CONTRATO No. 3033 DE 2023: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.**".**

PERIODO: 1 al 31 de diciembre de 2023

Ocaña, enero de 2024



CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No. 2570 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato M. rutinario No. 3033-2023 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

Contrato de Interventoría No. 2570 de 2023 **Interventoría:** JOYCO S.A.S. BIC

Objeto Contrato de Obra:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000"

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 al 31 de diciembre de 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	25
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		12
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	38
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	32
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	28
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	30
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	34
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		14
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		14
5.3	Informes especialistas y profesionales		15
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		15
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	54
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	58
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	56
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	60
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		24
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		18
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		21
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 Localización 6
2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía 7
2.3 Características Técnicas del Proyecto 8
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 8
3.1 Información General del Contrato 8
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 9
3.3 Seguimiento ítems no previstos 9
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la administración vial 9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 10
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 10
4.3 Personal Contrato de Obra 10
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 10
4.5 Estado General del Tiempo 10
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 10
4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 10
4.8 Informe Avance Físico-Financiero 11
4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 11
4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 11
4.11 Otros documentos seguimiento mensual: 11
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.1 Información general del contrato 12
5.2 Descripción de las actividades realizadas por la administración vial. 12
5.3 Informes especialistas 13
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 13
5.5 Información otros programas y aplicativo 13
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL 14
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 14
6.2 Personal Contrato de Interventoría 14
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 14

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 14
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 14
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 14
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
8. ANEXOS 16
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 16
8.2 Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario (Anexo 11) 17
8.4 Registro fotográfico del avance de las obras. 17
LIMPIEZA DESCOLES 2023-12-06-RUTA -7007-PR 09+0611 18
LIMPIEZA ENCOLE 2023-12-05-RUTA -7007-PR 10+0785 18
PODA DE ARBOLES 2023-12-04-RUTA-7007-PR 18+0750 18
RECOLECCION BASURAS 2023-12-12-RUTA -7007-PR 06+0250 18
ARREGLOS EN LA VIA PARCHEO 2023-12-01-RUTA -7007-PR 31+0365 19
LIMPIEZA ALCANTARILLAS 2023-12-12-RUTA -7007-PR 35+0602 19
LIMPIEZA CUNETAS 2023-12-06-RUTA-7007-PR 34+0350 19
LIMPIEZA DERRUMBES 2023-12-11-RUTA -7007-PR 35+0270 19
INSPECCION VIAL 20
CAPACITACION 20
RECORRIDO VIAL 20
8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales 20

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Anexo 2	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Anexo 3	Estado General del Tiempo
Anexo 4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Anexo 6	Informes semanales
Anexo7	Equipo Contrato de Interventoría
Anexo 8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Anexo 9	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Anexo 11	Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario
Anexo 12	Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo
Anexo 13	Actas de comité
Anexo 14	Bitácora correspondiente al periodo evaluado

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto nacional de vías - Invias con el fin de contribuir efectivamente en el proceso de mejoramiento socio-económico de Colombia y el propósito específico de alcanzar la satisfacción de los usuarios de las vías, llevo a desarrollar el programa de Mantenimiento Vial, para adelantar todas las gestiones y acciones tendientes a conservar y valorar el patrimonio vial y, por ende, brindar la atención adecuada que demandan permanentemente los diferentes sectores de la población que utiliza las carreteras.

Es por ello que el INVIAS destinó la suma doscientos ochenta y tres millones setecientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($ 283.776.853,00) M/Cte., para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11, que se ejecuta a través del contrato 2570 del 2023 y en igual sentido destinó la suma de ciento noventa y ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos un pesos M/Cte. ($198.499.801,00) para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000 por medio del contrato 3033 del 2023, con el fin de que a través de los citados contratos se mantenga las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía del sector vial comprendido entre el PR0+0000 al PR43+0000 de la vía código 7007, carretera Aguaclara – Ocaña.

Ahora bien, regional y localmente esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña y la capital del departamento con la región costera del país desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios.

Durante la ejecución de este proyecto se busca generar bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

El presente documento resume el avance de las actividades y desarrollo del contrato 2570 de 2023, por parte del JOYCO SAS BIS como administrador vial del contrato de mantenimiento rutinario No.3033 de 2023, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Cesar, en la vía: Aguaclara – Ocaña desde el PR 00+0000 al PR 43+0000, corredor vial ruta 70 tramo 07, sector Aguaclara – Rio de Oro, que une a Ocaña, la frontera Colombo Venezolana y la región del Catatumbo con el interior del país, el valle del Magdalena, y la costa Caribe colombiana utilizando la troncal del magdalena medio,

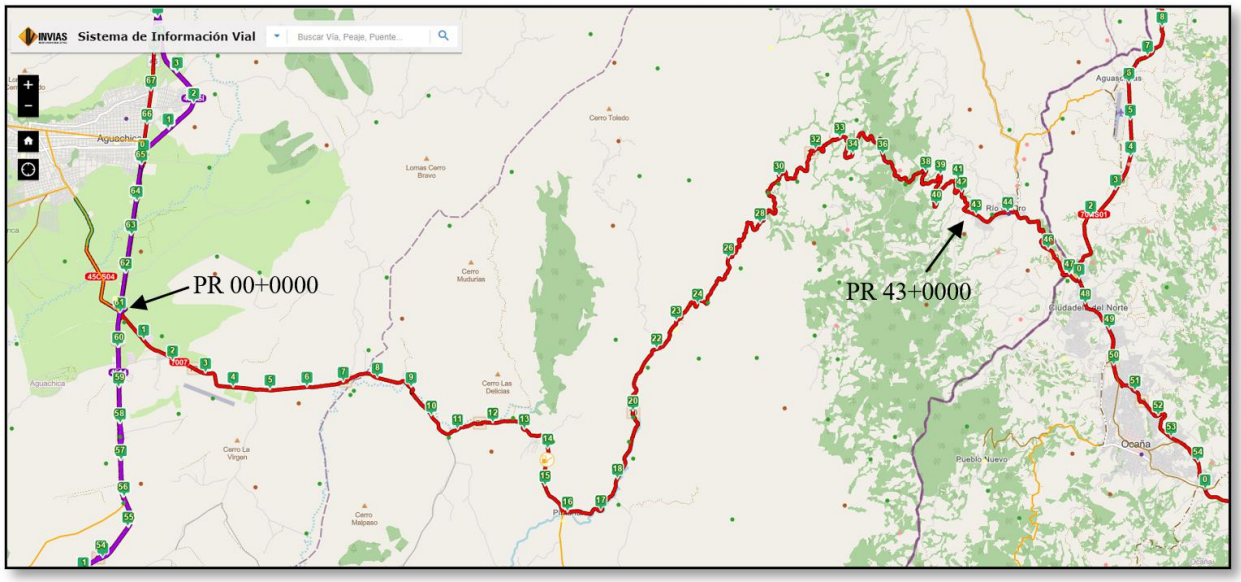


Figura: 1 Localización carretera Aguaclara - Ocaña, vía nacional 7007, sector del PR 00+0000 al PR 43+0000

El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento del Cesar. Como referencia histórica este corredor fue revertido al Instituto Nacional de Vías INVIAS el 17 de octubre de 2017 por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, como consecuencia de una terminación unilateral de la Concesionaria Ruta del Sol Tramo II; lo que generó obras civiles y de infraestructura vial inconclusas.

En el cuadro 1 se observa la localización del corredor vial donde se ejecuta la actividad de mantenimiento rutinario, y se describen las características generales del mismo:

Cuadro 1 Datos corredor vial.

TERRITORIAL	COD. VIA	NOMBRE DE LA VÍA	SECTOR	PR INICIAL	PR FINAL	LONG. (Km)
OCAÑA	7007	Aguaclara - Ocaña	Aguaclara - Rio de Oro	00+000	43+000	42,994

Fuente: INVIAS



Figura: 2 Mapa sector vial PR 00+0000 al PR 43+0000 sitios importantes

Fuente: Google Earth

2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en condiciones de transitabilidad normales, aunque hay sectores en los cuales la carpeta presenta características de falla; piel de cocodrilo, escamas, fisuras y desprendimientos, adicionalmente hay sectores con derrumbes (PR 21+000 hasta el PR 39+900) los cuales han sido despuntados y acomodados en la cuneta por el personal de mantenimiento rutinario. La territorial viene realizando gestiones para realizar inversiones que brinden seguridad y mejoras en la transitabilidad del corredor vial, el INVIAS realizo durante las vigencias anteriores una gran inversión con el contrato No 1180 del 2018 para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías, al igual que el contrato 1634 del 2022.

A continuación, se resumen del estado actual del corredor vial objeto de los contratos 2570 y 3033 del 2023, de acuerdo a los parámetros de evaluación de Criterio Técnico:

Cuadro 2 información estado con criterio técnico actual de la vía.

Condición	Longitud km	Bueno		Regular		Malo	
		Longitud	Porcentaje	Longitud	Porcentaje	Longitud	Porcentaje
Pavimentado	42,99	29,015	67,49%	9,944	23,13%	4,035	9,38%

Es relevante tener en cuenta que se hace necesario contar con las actividades del contrato de mantenimiento rutinario, mediante el cual se mantiene en condiciones de transitabilidad y seguridad para el usuario del corredor vial.

2.3 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar el seguimiento y control del personal para el servicio de Mantenimiento rutinario, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA, en pro de garantizar que el sector vial comprendido entre el PR0+0000 al PR43+0000 de la vía código 7007, carretera Aguaclara – Ocaña, se encuentre en condiciones apropiadas de transitabilidad.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3033 DE 2023
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
FECHA DE INICIACIÓN	01/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 1	HASTA 31/01/2024
VALOR DEL CONTRATO	$198.499.801,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

1. Limpieza de cunetas.
2. Rocería.
4. Limpieza de alcantarillas.
5. Limpieza de calzada.
6. Recolección de residuos sólidos.
7. Atención de emergencias PR 00+0000 al PR 43+0000, despunte de derrumbes.
8. Atención de emergencias por accidentes.
9. Vigilancia diaria al corredor vial.
10. Siembra de plantas ornamentales.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la administración vial

Durante el periodo evaluado el contrato de servicio de mantenimiento rutinario se ejecuta con normalidad en las programaciones semanales, aunque debido a la temporada de invierno latente en la región se han generado emergencias por deslizamientos de material proveniente del talud superior sobre la vía, los cuales han sido orillados sobre la cuneta.

La Administración vial viene realizando el seguimiento al único contrato en ejecución en el corredor vial, el cual corresponde al de servicio de mantenimiento rutinario contrato 3033 del

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

2023, efectuando recorridos y visitas periódicas a la vía para verificar el estado e identificación de sus necesidades, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS, verificando el empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal Contrato de Obra

No Aplica

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 2)

4.5 Estado General del Tiempo

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 3)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6(Anexo 4)

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

(**No Aplica**)

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.11 Otros documentos seguimiento mensual:

- Programa de Inversiones y seguimiento Programa de inversiones

(**No Aplica**)

- Actas de comité de obra

Ver anexos

- Acta de reunión

No Aplica

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 6)

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2570 del 2023.
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11
AMINISTRADOR	JOYCO S.A.S. BIC con NIT. 860067561-9
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES.
FECHA INICIACIÓN	8/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	8/12/2023
PRÓRROGA 1	HASTA 31/12/2023
PRÓRROGA 2	HASTA 31/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 283.776.853,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 122,969,969.00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 406,746,822.00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la administración vial.

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las actividades para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, verificando que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas por el INVIAS en el anexo técnico del proceso de contratación que originó el contrato 3033 del 2023.

- Seguimiento sobre la programación semanal de actividades contractuales.

- Capacitación al personal de mantenimiento rutinario, encaminada a mejorar su percepción sobre la ejecución de actividades.

- Recorrido y presencia diaria en la ejecución de las actividades sobre la vía para el control técnico de los trabajos realizados.

- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Requerimiento al contratista para la señalización de sitios que generasen riesgo para el usuario.

- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

6.1 Equipo Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5(Anexo 7)

6.2 Personal Contrato de Interventoría

(No Aplica)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 9)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 10)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

• Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dada las precipitaciones latentes en el sector vial objeto del contrato, y aunado al periodo en el que la vía no contó con el servicio de mantenimiento, corredor cuenta con una serie de atrasos para poner en condiciones óptimas el corredor vial

- En el corredor vial se presenta sitios críticos identificados en la plataforma HERMES, ubicado en el PR 30+0377, el PR 22+0835, PR 28 +0231, el PR 30+0420 y el PR 32+0220, en los que se presentan hundimiento de la calzada y perdida parcial de banca, los cuales serán atendidos tan pronto exista asignado un contrato que contemple dentro de su alcance la atención del sitio.

- Es relevante e importante contar con personal para mantenimiento rutinario, que garantice las condiciones de transitabilidad y seguridad del usuario del corredor vial Aguaclara-Ocaña.

- Se sugiere contar con un contrato de obra, con el cual se pueda atender el retiro de derrumbes y las obras civiles que representan riesgo para el usuario del corredor vial.

- Es necesario se realice actividades de mantenimiento periódico, como reparcheo, bacheo y suministro de mezcla asfáltica.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	5	2	24

Contrato de servicio	**3033 DE 2023**
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
Conformación:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1
Fecha de Inicio:	01/10/2023
Valor Inicial:	$ 198,499,801.00
Adición 1:	$ 0.00
Adición 2:	$ 0.00
Valor Actual:	$ 198,499,801.00
Plazo Inicial:	2 meses
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Plazo Inicial:	2 meses
Plazo Actualizado:	2 meses
Fecha de Iniciación:	01-oct
Fecha de Vencimiento:	miércoles, 31 de enero de 2024

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2023

CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
AMVO-48	01/12/2023 00:00	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta a oficio 2023S-VOCA-021870 de fecha 21/11/2023	RESPUESTA
AMVO-49	05/12/2023 00:00	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ	Aval Prorroga No.1 Contrato 3033 de 2023	SOLICITUD
AMVO-50	05/12/2023 00:00	Mayor Wilmer Álvarez Rincón Jefe Seccional Transito y Transporte del Cesar	Solicitud de informe Policial de accidentes ocurridos en el mes de noviembre del 2023.	SOLICITUD
AMVO-51	05/12/2023 00:00	CORPORACIÓN AUTONOMA DEL CESAR	Solicitud de erradicación de árbol ubicado en el PR 17+300 y poda generalizada en el Tramo vial RN 7007 del PR 3+000 al PR 35+000 vía	SOLICITUD
AMVO-52	09/12/2023 00:00	Instituto Nacional de Vías - Dirección Territorial Ocaña	ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD	INFORMATIVA
AMVO-53	18/12/2023 00:00	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Solicitud de Prorroga 2	SOLICITUD
AMVO-54	30/12/2023 00:00	Instituto Nacional de Vías - Dirección Territorial Ocaña	Entrega informe de accidentalidad	INFORMATIVA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No. OFICIO	FECHA	REMITE	ASUNTO	
2023S-VOCA-026364	05-dic-23	INVIAS	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-033667	RESPUESTA
2023S-VOCA-027235	11-dic-23	INVIAS	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-031293	RESPUESTA
2023S-VOCA-031539	22-dic-23	INVIAS	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-039161	RESPUESTA
2023S-VOCA-031459	22-dic-23	INVIAS	Observaciones a la Publicación APU regionalizados periodo 2023_2	INFORMATIVA
2023S-VOCA-027611	12-dic-23	INVIAS	Socialización Memorando No 2023I-VBOG-028790	INFORMATIVA

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

8.2 Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario (Anexo 11)


8.4 Registro fotográfico del avance de las obras.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

CONTRATO N.º 3033 DE 2023.

CARRETERA: 7007 AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+0000 - PR 43+0000


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS– DICIEMBRE DE 2023

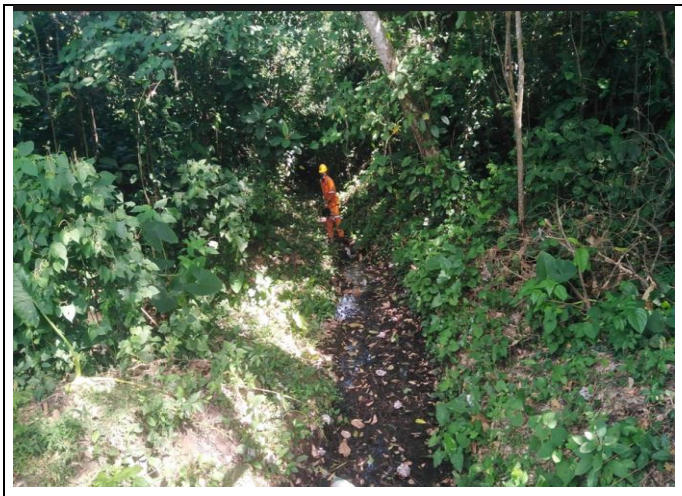	
LIMPIEZA DESCOLES 2023-12-06-RUTA -7007-PR 09+0611	LIMPIEZA ENCOLE 2023-12-05-RUTA -7007-PR 10+0785
	
PODA DE ARBOLES 2023-12-04-RUTA-7007-PR 18+0750	RECOLECCION BASURAS 2023-12-12-RUTA -7007-PR 06+0250

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

	
ARREGLOS EN LA VIA PARCHEO 2023-12-01-RUTA -7007-PR 31+0365	LIMPIEZA ALCANTARILLAS 2023-12-12-RUTA -7007-PR 35+0602
	
LIMPIEZA CUNETAS 2023-12-06-RUTA-7007-PR 34+0350	LIMPIEZA DERRUMBES 2023-12-11-RUTA -7007-PR 35+0270

CONTRATO N.º 2570 DE 2023: CARRETERA: 7007
AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+000 - PR 43+0000
JOYCO S.A.S. BIC – DICIEMBRE DEL 2023

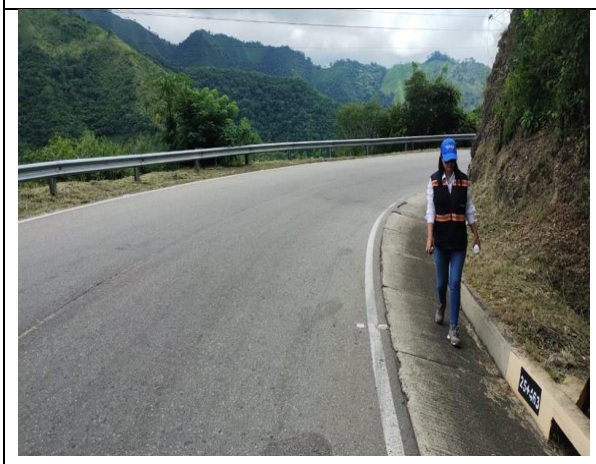	
INSPECCION VIAL	CAPACITACION
	
RECORRIDO VIAL	

8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

(No Aplica)

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

ANEXOS

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5 1 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3033 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

PLAZO INICIAL: 4 MESES O HASTA EL 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 01/10/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,499,801.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,499,801.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO - NO APLICA

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 166,806,555.46	$ 31,693,246.00	$ 198,499,801.00
SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 166,806,555.46	$ 31,693,246.00	$ 198,499,801.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 48,782,346.00	$ 842,604.00	$ 49,624,950.00	**$ 49,624,950.00**
SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)				**$** -
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 48,782,346.00	$ 842,604.00	$ 49,624,950.00	$ 49,624,950.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 5 1 2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198,499,801.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148,874,850.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	75.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**16**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



(ANTES - DURANTE - DESPUES) LIMPIEZA DE DERRUMBES EN EL PR 35+0270



(ANTES- DURANTES - DESPUES) LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN EL PR 35+0602

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 2

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SEVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

PERIODO: Diciembre 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 3033 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA CÓD.7007

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.: 2570 DE 2023 **CONSULTOR** ADMINISTRACION VIAL JOYCO SAS BIC

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1032823	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	Contrato principal 3033-2023	$ 198.499.801,00	$ 99.249.901,00
				/12/2023			
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 198.499.801,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 198.499.801,00	$ 198.499.801,00				CONTRATO PRINCIPAL
1	Servicio	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	$ 48.782.346,00	$ 842.604,00	$ 49.624.950,00				1032823 de fecha 2023-09-18	$ 148.874.851,00	$ 148.874.851,00	85448 DEL 22/NOVIEMBRE/2023	X		
2	Servicio	1 AL 30 DE NOCIEMBRE DE 2023	$ 48.782.346,00	$ 842.604,00	$ 49.624.950,00				1032823 de fecha 2023-09-18	$ 99.249.901,00	$ 99.249.901,00				PRESENTE ACTA
3	Servicio	DICIEMBRE DE 2023	$ 48.782.346,00	$ 842.604,00	$ 49.624.950,00				1032823 de fecha 2023-09-18	-$ 49.624.950,00	-$ 49.624.950,00				PRESENTE ACTA
TOTALES			$ 146.347.038,00	$ 2.527.812,00	$ 148.874.850,00					-$ 49.624.950,00	-$ 49.624.950,00				

Todas las Actas aprobadas por la consultoria y la supervisión deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 146.347.038,00	$ 2.527.812,00	$ 148.874.850,00
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 146.347.038,00**	**$ 2.527.812,00**	**$ 148.874.850,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma
Nombre: LUIS FANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
C.C. No.: 13.373.720 DE CONVENCION (NTS)

Firma
Nombre: WILSON ANTONIO JAIME BARBOSA
Matrícula No. 25202-24862 NTS
Resolucion 39 del 8 de noviembre de 2023.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Original: Informe mensual de Consultoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3033 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: AGUACLARA – OCAÑA PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2570 del 2023

INTERVENTOR: JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	22	24	24	740
Lluvias moderadas																1												1	2			4
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Luis F Rincon T

Nombre: LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Cooperativa de trabajo asociado CALISERVICIOS
13.373.720 DE CONVENCION (NTS)

Firma D. Yca.

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	01/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	02/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	03/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	04/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	05/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	06/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	07/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	08/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	09/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	10/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	11/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	12/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	13/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	14/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	15/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	16/12/2023 00:00	0.2	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	17/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	18/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	19/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	20/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	21/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	22/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	23/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	24/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	25/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	26/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	27/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	28/12/2023 00:00	0.9	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	29/12/2023 00:00	2.4	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	30/12/2023 00:00	0	50		900
16055010	AEROPUERTO AGUAS CLARAS [16055010]	31/12/2023 00:00	0	50		900

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 4

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SEVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO

VERSIÓN 1

PÁGINA

PERIODO Diciembre 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 3033 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA COD.7007

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 2570 DE 2023 **CONSULTOR** ADMINISTRACION VIAL JOYCO SAS BIC

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingresos base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALFONSO HOYA LUIS REYES	1,003,089,297	OBRERO	$ 1,160,000.00	2/20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	ASMETSALUD	4529337861	$ 46,400.00	PORVENIR	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
2	TARAZONA CHINCHILLA JOSE LUIS	1,064,840,831	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
3	CHINCHILLA RANGEL WILFRAN	1,091,671,902	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	PORVENIR	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
4	JIMENEZ PACHECO LEONARDO FABIO	10,916,613,204	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	PORVENIR	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
5	BECERRA PACHECO LEONARDO FABIO	1,091,661,106	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
6	RINCON TORRADO LUIS FANCISCO	13,373,720	JEFE DE PERSONAL	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
7	GARCIA IBANEZ LUIS ALBERTO	88,137,870	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	PORVENIR	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
8	ARDILA QUINTANA JAIRO	13,167,964	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	COOSALUD	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
9	SERNA LUIS ARMANDO	88,279,844	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
10	NAVARRO GONZALES ELIBERIO	88,285,854	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
11	GUTIERREZ PEÑARANDA ALEXANDER	88,276,925	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	COMFAORIENTE	4529337861	$ 46,400.00	PORVENIR	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	
12	AREVALO JIMENEZ JESUS MANUEL	88,285,187	OBRERO	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 80,800.00	V	COMFAORIENTE	4529337861	$ 46,400.00	COLPENSIONES	4529337861	$ 185,000.00	$ 46,400.00	$ -	$ -	

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

OBSERVACIONES DE LA CONSULTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha .....

Firma
Nombre: LUIS FANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICOS
C.C. No.: 13.373.720 DE CONVENCION (NTS)

Firma
Nombre: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
INGENIERA RESIDENTE DE ADM. VIAL
Matrícula No: 54220-259147 NTS

Original. Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	5 (Día)	1 (Mes)	22 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 3033 DE 2023 **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 01/10/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES O HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198,499,801.00

VALOR ACUMULADO: $ 198,499,801.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE ADM. VIAL No. 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 19,849,980.10	**31**	**8**	**2023**	**1**	**7**	**2024**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 39,699,960.20	**31**	**8**	**2023**	**31**	**12**	**2026**
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Servicio	10%	$ 19,849,980.10	**31**	**8**	**2023**	**1**	**7**	**2024**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **56-44-101006334**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	31	8	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002839 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 19,849,980.10	31	8	2023	1	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 39,699,960.20	31	8	2023	31	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 19,849,980.10	31	8	2023	1	8	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-40-101002839

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 05/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	31	8	2023	31	1	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002839 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 05/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 6

INFORMES SEMANALES

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11 / 12 / 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 10 del 01/12/2023 al 07/12/2023 (Numeración consecutiva) — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**
INTEGRANTES: LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO
CONTRATO No. 3033 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 198,499,801.00
FECHA DE INICIO: 01/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198,499,801.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

CONSULTOR: JOYCO S.A.S. BIC
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
CONTRATO No. 2570 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 283,776,853.00
FECHA DE INICIO: 08/08/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 08/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 283,776,853.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 08/12/2023 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 112,483,220.57			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
AMINISTRACION VIAL	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283,776,853.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 212,478,411.91			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283,776,853.00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 166,806,555.46	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94,523,714.76	56.67%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 94,523,714.76	56.67%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 112,483,220.57	56.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112,483,220.57	56.67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,730,382.40	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,730,382.40	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 85448 DEL 22/NOVIEMBRE/2023
PERIODO FACTURADO: oct-23
VALOR FACTURA: 49,624,950.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 286,141,660.11	100.83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 212,478,411.91	74.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,553,649.76	5.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,292,139.53	5.83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 85742 DEL 25NOVIEMBRE2023
PERIODO FACTURADO: oct-23
VALOR FACTURA: 44,987,594.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
* PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
* ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
* ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI N/A NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI N/A NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI N/A NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI N/A NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11 12 2023
(Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Antes - Limpieza de descoles - PR09+0611- VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza de descoles - PR09+0611- VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza de descoles - PR09+0611- VÍA CÓDIGO 7007



Antes - Limpieza de cunetas PR34+0350 -VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza de cunetas PR34+0350 -VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza de cunetas PR34+0350 -VÍA CÓDIGO 7007



Antes - Limpieza de encole en el PR 10+0785 - VÍA CODIGO 7007



Antes - Limpieza de encole en el PR 10+0785 - VÍA CODIGO 7007



Antes - Limpieza de encole en el PR 10+0785 - VÍA CODIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad

RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL

FIRMA
NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 11 del 08/12/2023 al 14/12/2023 (Numeración consecutiva) — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**
INTEGRANTES: LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO
CONTRATO No. 3033 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 198,499,801.00
FECHA DE INICIO: 01/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198,499,801.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

CONSULTOR: JOYCO S.A.S. BIC
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
CONTRATO No. 2570 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 283,776,853.00
FECHA DE INICIO: 08/08/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 08/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 283,776,853.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 08/12/2023 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 124,062,375.63			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
AMINISTRACION VIAL	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283,776,853.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 225,125,538.75			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283,776,853.00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 166,806,555.46	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 104,254,097.16	62.50%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 104,254,097.16	62.50%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124,062,375.63	62.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124,062,375.63	62.50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,730,382.40	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,730,382.40	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 87613 DEL 12DICIEMBRE23MBRE/2023
PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: 49,624,950.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 302,695,309.87	106.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225,125,538.75	79.33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,553,649.76	5.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,311,552.90	5.83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 87198 EN DICIEMBRE 2023
PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: 53,409,318.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	CUMPLE
* PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
* ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
* ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI N/A NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI N/A NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI N/A NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI N/A NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Antes - Limpieza de descoles - PR09+0611- VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza de descoles - PR09+0611- VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza de descoles - PR09+0611- VÍA CÓDIGO 7007



Antes - Limpieza de cunetas PR34+0350 -VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza de cunetas PR34+0350 -VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza de cunetas PR34+0350 -VÍA CÓDIGO 7007



Antes - Limpieza de encole en el PR 10+0785 - VÍA CODIGO 7007



Antes - Limpieza de encole en el PR 10+0785 - VÍA CODIGO 7007



Antes - Limpieza de encole en el PR 10+0785 - VÍA CODIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad

RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL

FIRMA
NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 12 del 15/12/2023 al 21/12/2023 (Numeración consecutiva) — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,499,801.00
FECHA DE INICIO:	01/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,499,801.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283,776,853.00
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	VALOR ADICIONES:	$ 122,969,969.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 406,746,822.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 135,641,530.68			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
AMINISTRACION VIAL	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283,776,853.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 237,214,999.43			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283,776,853.00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 166,806,555.46	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 113,984,479.57	68.33%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113,984,479.57	68.33%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 135,641,530.68	68.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135,641,530.68	68.33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,730,382.40	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,730,382.40	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 87613 DEL 12DICIEMBRE23MBRE/2023
PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: 49,624,950.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 319,248,959.63	112.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 237,214,999.43	83.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,553,649.76	5.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,300,037.01	5.83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 87198 EN DICIEMBRE 2023
PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: 53,409,318.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	CUMPLE
* PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
* ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
* ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N/A		DISPONIBLE		
		PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	
UBICACIÓN:	N/A				
		PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2023 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Antes - Roceria y desmonte - PR33+0920- VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Roceria y desmonte - PR33+0920- VÍA CÓDIGO 7007



Después - Roceria y desmonte - PR33+0920- VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	
	FIRMA
	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 13 del 22/12/2023 al 28/12/2023 (Numeración consecutiva) — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,499,801.00
FECHA DE INICIO:	01/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,499,801.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283,776,853.00
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 122,969,969.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 406,746,822.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 147,220,685.74			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,499,801.00			
AMINISTRACION VIAL	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283,776,853.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 249,365,864.11			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283,776,853.00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 166,806,555.46	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 123,714,861.97	74.17%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 123,714,861.97	74.17%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 147,220,685.74	74.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 147,220,685.74	74.17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19,460,764.80	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19,460,764.80	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 87613 DEL 12DICIEMBRE23MBRE/2023
PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: 49,624,950.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 333,668,681.25	82.03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 249,365,864.11	61.31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,448,456.12	5.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,292,683.44	5.80%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 87198 EN DICIEMBRE 2023
PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: 53,409,318.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL - DEL PR11+0000 AL PR15+0000 Y DEL PR37+0000 AL PR43+0000 - CANTIDAD EJECUTADA = **15.100 MT2**
2.LIMPIEZA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RÍGIDO (CALZADA) - PR11+0000 AL PR15+0000 Y DEL PR37+0000 AL PR43+0000 - CANTIDAD EJECUTADA = **17.200 ML**
3.LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS - DELPR11+0000 AL PR15+0000 Y DEL PR37+0000 AL PR43+0000 = CANTIDAD EJECUTADA = **28.200 ML**
4.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA PARC - EN EL PR11+0000 AL PR15+0000 Y DEL PR37+0000 AL PR43+0000 - CANTIDAD EJECUTADA = **268 ML**
5.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR11+0000 AL PR15+0000 Y DEL PR37+0000 AL PR43+0000 - CANTIDAD EJECUTADA = **30 UND**
6.LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR3+000 AL PR5+0000 - CANTIDAD EJECUTADA = **15 UND**
7.INSPECION Y VIJILANCIA LIM CALZADA - **DEL PR00+0000 AL PR43+0000**

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL DEL PR22+0000 AL PR28+0000 Y DEL PR17+0000 AL PR21+0000
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS - PR22+0000 AL PR28+0000 Y DEL PR17+0000 AL PR21+0000
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES - PR22+0000 AL PR28+0000 Y DEL PR17+0000 AL PR21+0000
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE - PR22+0000 AL PR28+0000 Y DEL PR17+0000 AL PR21+0000
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA - PR22+0000 AL PR28+0000 Y DEL PR17+0000 AL PR21+0000
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO - DEL PR00+0000 AL PR43+0000

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Antes - Limpieza de cuneta - PR42+0740- VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza de cuneta - PR42+0740- VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza de cuneta - PR42+0740- VÍA CÓDIGO 7007



Antes - Limpieza alcantarillas PR18+0600 -VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza alcantarillas PR18+0600 -VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza alcantarillas PR18+0600 -VÍA CÓDIGO 7007



Antes - Limpieza de calzada PR18+0098 - VÍA CÓDIGO 7007



Durante - Limpieza de calzada PR18+0098 - VÍA CÓDIGO 7007



Después - Limpieza de calzada PR18+0098 - VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	
	FIRMA
	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 7

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 / 1 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROYECTO: Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grand

CONTRATO INTERVENTORÍA No 2570 del 2023

INTERVENTORÍA: JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

CONTRATO DE OBRA No. 0

CONTRATISTA: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO	NISSAN, Doble cabina, modelo 2015 de Placas ZXX651	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
CAMIONETA PLACA ZXX651 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contamientes 29/06/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2570 de 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRE 2570 DE 2023 **CONTRATISTA:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	$283.776.853,00	$ 207.851.065,00
						$122.969.969,00	
			TOTAL			$ 406.746.822,00	$ 207.851.065,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 406.746.822,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								916723 de 2023-08-04		$ 406.746.822,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$ 32.623.933,00	$ 6.198.547,00	$ 38.822.480,00				916723 de 2023-08-04	38.822.480,00	$ 367.924.342,00	81755 DEL 22SEPTIEMBRE2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 44.645.985,00	$ 8.482.737,00	$ 53.128.722,00				916723 de 2023-08-04	91.951.202,00	$ 314.795.620,00	83366 DEL 20OCTUBRE2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	$ 44.987.594,00	$ 8.547.643,00	$ 53.535.237,00				916723 de 2023-08-04	145.486.439,00	$ 261.260.383,00	85742 DEL 25 NOVIEMBRE 2023	
4	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 44.881.780,00	$ 8.527.538,00	$ 53.409.318,00				916723 de 2023-08-04	198.895.757,00	$ 207.851.065,00		EN TRAMITE
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 44.926.745,00	$ 8.536.082,00	$ 53.462.827,00				916723 de 2023-08-04	252.358.584,00	$ 154.388.238,00		EN TRAMITE
	TOTALES	$ 212.066.037,00	$ 40.292.547,00	$ 252.358.584,00					$ 252.358.584,00	$ 154.388.238,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 171.538.627,00	$ 32.592.339,00	$ 204.130.965,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 40.527.411,00	$ 7.700.208,00	$ 48.227.619,00
*			
VALOR TOTAL	$ 212.066.037,00	$ 40.292.547,00	$ 252.358.584,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor re
2. Este formato se diligencia por año.

Firmado digitalmente por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Fecha: 2023.12.06 15:57:47 -05'00'

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 9

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2570 de 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** Aguadara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 2570 DE 2023 **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR, COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																																	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUCÍLA TERESA CABRERA JIMENEZ	1.091.659.224,00	Ingeniera Residente	$ 6.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	JOYCO SAS	$ 6.600.000,00	$ 459.400,0	V	NUEVA EPS	9458792832	$ 264.000,00	PORVENIR	9458792832	$ 1.056.000,00	$ 264.000,00			
2	JOAN ARLEY PACHECO JIMENEZ	1.091.682.174,00	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	JOYCO SAS	$ 4.200.000,00	$ 292.400,0	V	NUEVA EPS	9458792832	$ 168.000,00	COLPENSIONES	9458792832	$ 672.000,00	$ 168.000,00			
4	ELSY GUTIERREZ OJEDA	49.663.101,00	Inspector SISO	$ 1.075.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			50%	JOYCO SAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800,0	V	SANITAS	9458792832	$ 46.400,00	COLPENSIONES	9456113979	$ 185.600,00	$ 43.000,00			
5	FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS	1.091.653.811,00	Inspector Vial	$ 1.820.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	JOYCO SAS	$ 1.820.000,00	$ 126.700	V	NUEVA EPS	9458792832	$ 72.800	COLFONDOS	9458792832	$ 291.200	$ 72.800			
6	YEISON BENJAMIN OSORIO DURAN	18.903.843,00	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	JOYCO SAS	$ 1.413.600,00	$ 98.400	V	SALUD TOTAL	9458792832	$ 56.600	COLPENSIONES	9458792832	$ 226.200	$ 56.600			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 15.108.600,00																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha diciembre de 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato, Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firmado digitalmente por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Fecha: 2023.12.06 15:58:04 -05'00'

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 5 (Día) 2 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 11

FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DEL 2023

PLAZO INICIAL: 4 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE ENERO DEL 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 283.776.853,00

VALOR ACUMULADO: $ 406.746.822,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 28.377.685,30	24	7	2023	24	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 56.755.370,60	24	7	2023	24	11	2026
Calidad del servicio	30%	$ 85.133.055,90	24	11	2023	24	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 152715

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **02/08/2023**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 40.674.682,20	8	8	2023	31	07	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 81.349.364,40	8	8	2023	31	01	2027
Calidad del servicio		$ 122.024.046,60	31	12	2023	30	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 152715

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 11

INFORME CAPACITACIÓN DE PERSONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

INFORME DE CAPACITACION

DICIEMBRE 28 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No 2570 del 2023

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO: ORACION	PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO: CAPACITACION: TRABAJO EN EQUIPO
	

"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

.

INSPECTOR SST:

ELSY GUTIERREZ OJEDA

CONTRATO DE OBRA No 2570 del 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
2.1. Generales
2.2. Específicos
3. TEMÁTICA
4. DESARROLLO
5. ASISTENCIA
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías a través de la, “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11 busca mejorar, las capacidades interactivas y de manera integral, complementar la experiencia del personal que conforma la organización de mantenimiento rutinario las cuales prestan su servicio a la DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA; este mejoramiento encaminado a los aspectos personales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo.

Se programan capacitaciones para que se abra el espacio y la oportunidad de mantener una comunicación laboral y personal con los colaboradores de las empresas de mantenimiento rutinario, en busca de generar el bienestar de los colaboradores de las empresas de tal forma que se garantice una operación segura en las carreteras a cargo de la Territorial Ocaña y en completo engranaje con la Administración Vial grupo AMV 2 lote 11

2. OBJETIVOS

2.1. Generales

- ✓ Ampliar el panorama en los miembros de las empresas de, mantenimiento rutinario sobre aspectos contractuales de la actividad.
- ✓ Dar cumplimiento a los aspectos contractuales para la administración vial.
- ✓ Reiterar los objetivos del Instituto Nacional de Vías.

2.2. Específicos.

Trabajo en equipo, hacen que los colaboradores tengan un mejor entorno laboral, sea más responsables y velen por la coordinación y comunicación para un buen trabajo en equipo por las tareas de cada integrante para que todos trabajemos de forma alineada.

- ✓ Enfatizar el objetivo del Mantenimiento Rutinario vial.

3. TEMÁTICA.

Trabajo en equipo,

es tener un objetivo común. ...

Establecer roles dentro del **equipo** que velen por la coordinación y desarrollo de este.

Definir las responsabilidades y tareas de cada integrante para que todos trabajemos de forma alineada.

Y de esta manera, fomentar la comunicación y participación.

trabajar juntos" o "colaborar". En esencia, será útil para conectarte, comunicarte y colaborar de manera efectiva con los colaboradores que cumplen otras funciones.

4. DESARROLLO

Se inicia la presentación inspeccionando el sitio donde se evaluara el tema de la capacitación, indicándole al personal sobre las salidas de emergencia, y la presentación del grupo de la administración vial; seguidamente el INSPECTOR DE SST de la administración vial, realiza su presentación y expone los alcances de cómo actuar ante una emergencia, de la normatividad actual que regulan el tema de Bio seguridad aplicada a las actividades de Mantenimiento Rutinario y se le realiza el análisis aterrizado en el escenario laboral y personal de las empresas de mantenimiento rutinario. otras personas. Para contribuir a cultivar la empatía, la confianza propia y la disposición para actuar. Durante la presentación se hace un receso de la programación, se inicia la capacitación de todos los colaboradores de la empresa de las administraciones vial grupo AMV 2 lote 11, en total se contó con la participación de 16 trabajadores, iniciando con el tema principal **Trabajo en equipo,** para de esta forma preparar a los colaboradores a ser más proactivos y colaboradores desarrollen aun mas su comunicación donde se demuestre el respeto para ellos y las demás personas, desarrollando sus tareas y responsabilidades en la ejecución de sus actividades dentro de la seguridad vial

con el objetivo de APOYAR EL PROCESO, MOTIVAR AL CUIDADO TANTO FÍSICO, COMO MENTAL DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO** la representante de seguridad y salud en el trabajo busca mediante la realización de la capacitación orientar a los trabajadores de mantenimiento rutinario en un buen equipo de trabajo sobre el tema del estrés y la comunicación asertiva, en las actividades de mantenimiento rutinario reuniendo de esta forma el buen entorno laboral para que así ellos se encuentren, tranquilos y estén proactivos reuniendo las acciones que se deben realizar ante la ocurrencia de una accidente e incidentes, en sus labore de ejecución diarias, y salvar vidas Así mismo, se habló sobre las actividades que se llevan a cabo dentro de los objetivos de mantenimiento rutinario, la importancia de los elementos de protección personal y su uso adecuado, para así garantizarle a todo el personal una seguridad integra, esto con el fin de evitar y contrarrestar los posibles accidentes laborales que se puedan presentar de los cuales los trabajadores deben estar muy alertas, se agradece su participación activa, se hace un compartir para de esta manera se dé por terminada la capacitación

5. ASISTENCIA

CONTRATO No.	2570 del 2023
OBJETO	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11, código 7007, Aguaclara - Ocaña; sector PR 00+0000 al PR 43 + 0000.
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
MIEMBROS	12


6.REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO	PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO
	

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO	PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO
	

El personal de mantenimiento rutinario de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO, viene cumpliendo a cabalidad con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en la normatividad vigente, y se complementa con un tema como es el estrés y la comunicación asertiva para que su entorno sea mas tolerante y armonioso en sus ejecuciones de actividades.

Atentamente:



ELSY GUTIERREZ OJEDA.

C.C. N.º 49.663.101 de Aguachica Cesar.

Inspectora SST.

Interventoría: JOYCO SAS BIC.

JOYCO

LISTA DE ASISTENCIA

VERSIÓN 4	5/10/2022			F-DS-01		
TEMA:	Trabajo en equipo			Hora I 09 am	Hora F	10 am
FECHA:	DIC 08/23	PROCESO/PROYECTO:				
SITIO DE REUNIÓN:	Instalaciones de Inmas			Mecanismo		

No	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FIRMA	RESULTADO EVALUACIÓN	EVALUACIÓN CAPACITADOR
1	Rincón Toorado	Luis Francisco	Representante	Luis Rincón T	5.0	✓
2	Arevalo	Jesus	Colaborador	Jesus	5.0	✓
3	Ardila	Jairo	Colaborador	Jairo Ardila	5.0	✓
4	Serna	Luis Amado	Colaborador	Luis Serna	5.0	✓
5	Chinchilla Ramos	William	Colaborador	William	5.0	✓
6	Becerra Navarro	Luis Fernando	Colaborador	Luis Fernando B	5.0	✓
7	García	Luis Alberto	Colaborador	Luis García	5.0	✓
8	Jaramillo	Jose Luis	Obrero		5.0	✓
9	Gutierrez Peñaranda	Alexander	Colaborador		5.0	✓
10	Ardila	Eduardo	obrero		5.0	✓
11	Alfonso	Luis Reyes	Colaborador	Luis Reyes	5.0	✓
12	Navarro.	Eliverio	Colaborador.	Eliverio.	5.0	✓
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Elsy Gutierrez
NOMBRE DE CAPACITADOR

FIRMA DE CAPACITADOR

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 12

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

INFORME MENSUAL Nº01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No 2570 del 2023

CONTRATO DE OBRA No 2570 del 2023

OBJETO:

“ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE TERMINACION 30 DE ENERO DE 2024

INFORME COMPRENDIDO DEL 05 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2024

AGUACHICA – CESAR

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA 3
2. PRESENTACIÓN..... 3
3. ALCANCE..... 4
4. OBJETIVO 4
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 4
6. ABREVIATURAS Y GUÍAS..... 6
7. ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 7
a. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 7
b. Actividades De Seguridad..... 7
c. Actividades De Medicina Preventiva Del Trabajo 8
d. Señalización De Obra..... 8
e. Recursos Para Implementación De SG-SST 9
f. Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias..... 10
b. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION.....¡Error! Marcador no definido.
9. INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL..... 11
a. INGRESO PERSONAL INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC..... 11
11. PERSONAL DE INTERVENTORIA .....¡Error! Marcador no definido.
12. INDICADORES DE GESTION..... 13
13. REGISTRO FOTOGRAFICO..... 14
14. ANEXOS 20
a. FORMATOS DE CHARLAS..... 20
d. SEGURIDAD SOCIAL JOYCO SAS BIC 2023. .....¡Error! Marcador no definido.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA

1.1. Descripción general de interventoría JOYCO SAS BIC

Razón social:
NIT:860.067.561-9
Dirección: calle 4 # 23-5
Correo: joyco.com.co

2. PRESENTACIÓN

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, lo cual refleja el progreso socioeconómico, así un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

La salud y seguridad en el trabajo está definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Artículo 1, Ley 1562 de 2012.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción y sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un **SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** al interior del personal adscrito al contrato de interventoría 2570 de 2023 y el contrato de obra 2570 de 2023**,** que oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todo el personal.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

El personal SST contratado por parte de la interventoría **JOYCO SAS BIC** y la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO** se compromete a divulgar, motivar y propiciar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la promoción y la prevención, con el fin de mantener ambientes sanos para los que aquí trabajan. Se implementa medidas de seguridad acordes con la normatividad vigente y las prioridades establecidas, teniendo en cuenta acciones de mejora continua.

3. ALCANCE

Evidenciar la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de todos los procesos que se ejecuten en la interventoría JOYCO SAS BIC, contratista y subcontratistas en la ejecución de la **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11.**

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención del personal, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguro.

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Seguridad y salud en el trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ley 1562/2012.

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en Seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra situación potencial no deseable. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

Enfermedad laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012 Artículo 4.

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007).

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

5. ABREVIATURAS Y GUÍAS

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas:

- **SG-SST:** Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- **SST:** Seguridad y salud en el trabajo
- **EPP:** Elemento de protección personal
- **ATS:** Análisis de trabajo seguro
- **PTS:** Permiso de trabajo seguro
- **AT:** Accidente de trabajo
- **EL:** Enfermedad laboral

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

6. ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoria JOYCO SAS BIC, es una organizacion dedicada a realizar procesos de construccion e interventoria de obras civiles, mantenimiento y mejoramiento de vias; tiene como razon fundamental, velar por la prevencion de los accidentes y enfermedades laborales mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la proteccion del medio ambiente.

Por lo aterior la empresa se apoya en los siguientes principios:

- Cumplimineto de los requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales.
- Protejer la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Destinar los recursos humanos, fisicos y financieros necesarios para la gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Desarrollar programas orientados al formato de una cultura preventiva.

Todo el personal adcrito a la interventoria, contratista, subcontratistas y demas partes interesadas tienen la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los trabajadores y la empresa.

b. Actividades De Seguridad

Dentro de las actividades de seguridad industrial se realizan las siguientes:

- Inspección elemento de protección personal.
- Charla de seguridad.
- Inspección de EPP.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

c. Actividades De Medicina Preventiva Del Trabajo

Dentro de las actividades de medicina preventiva se realizan las siguientes:

- Planilla de seguridad social.

d. Señalización De Obra

La señalización del proyecto se presenta bajo el esquema de invias utilizando señales transitorias que Pueden ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes reglamentarios, preventivos o informativos. Ambas se caracterizan por entregar mensajes que tienen aplicación acotada en el tiempo, siendo las segundas –también denominadas señales de mensaje variable– capaces de entregarlo en tiempo real.

La señalización y medidas de seguridad para obras en la vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito, con la mínima alteración posible de las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de los trabajos, así mismo se tiene en cuanta los siguientes puntos que nos permite tener una mayor prevención dentro de la zona de ejecución.

- La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.
- La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible.
- Los conductores, ciclistas y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante dispositivos, cuando se aproximan y cuando atraviesan la zona de las obras.
- La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo es esencial en la ejecución de obras. Los elementos orientados al control de tránsito como señales verticales, señales horizontales, elementos de canalización, entre otros, representan un costo y su correcta aplicación debe ser compensada como cualquier otro elemento de trabajo.

El buen manejo de la señalización nos permitirá garantizar una mejor movilidad y prevención a los conductores, peatones, y trabajadores de la obra.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Actividades realizadas

- Se realizo pausas activas en los frentes de mantenimiento rutinario.
- Charla de prevención en vía critica
- Capacitación: tema: estrés y comunicación asertiva.
- Teniendo en cuenta los principios de la señalización preventiva se realiza por parte de personal idóneo que hacen parte del equipo y se encargan de ejecutar, **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO**, las labores de controladores viales, para brindar un apoyo esencial en la emergencia.

e. Recursos Para Implementación De SG-SST

La empresa de construcciones e interventorías **JOYCO SAS BIC** y la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO,** asignan los recursos económicos para la implementación de la gestión y seguridad en el trabajo los cuales se describen a continuación:

- Elemento de protección personal
- Camilla de primero auxilio
- Botiquín de primero auxilio
- Extintor multipropósito ABC
- Señalización tubular con reflectivos
- Barreras plásticas
- Pare y siga reflectivo
- Chaleco reflectivo (indumentaria reflectiva)
- Conos de 90cm reflectivos
- Punto de hidratación por frente
- De igual manera el recurso humano para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Recursos brindados para este mes

- En la oficina se cuenta con:
  - Elemento de protección personal
  - Camilla de primero auxilio
  - Botiquín de primero auxilio
  - Extintor multipropósito ABC
  - Punto de hidratación

f. Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias

La interventoría y contratista implementan y mantienen las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos:

- Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
- Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas en la empresa.
- Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización evaluación de simulacros de emergencias.

Cada uno de los trabajadores pertenecientes a la empresa JOYCO SAS BIC y al contratista----, es capacitado al momento de ingresar y durante el transcurso del proyecto se realizan las diferentes capacitaciones para que estén preparados ante cualquier emergencia y prevención de los accidentes laborales.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

7. INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL

a. INGRESO PERSONAL INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC

8. DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2023, SE REALIZO INGRESO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.

NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	INGRESO
LUCILA TERESA	CABRERA JIMENEZ	1.091.659.224	RESIDENTE INTERVENTORIA	AGOSTO-09-2023
JOAN ARLEY	PACHECO JIMENEZ	1.091.682.174	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	AGOSTO-09-2023
FABRIANY MAURICIO	ASCANIO CONTRERAS	1.091.653.811	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	AGOSTO-09-2023
ELSY	GUTIERREZ OJEDA	49.663.101	INSPECTOR SST	AGOSTO-09-2023
YEISON BENJAMIN	OSORIO DURAN	18.903.843	CONDUCTOR	AGOSTO-09-2023

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

9. **ESTE MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE REALIZO INSPECCION DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO**

ITEM	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	INGRESO
1	LUIS FRANCISCO	RINCON TORRADO	13.373.720	REPRESENTANTE	OCTUBRE 01-2023
2	JAIRO	ARDILA	13.167.964	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
3	LUIS ALBERTO	GARCIA IBAÑEZ	88.137.870	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
4	MANUEL JESUS	AREVALO JIMENEZ	88.285.187	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
5	JOSE LUIS	TARAZONA CHINCHILLA	1.064.840.831	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
6	ELIBERIO	NAVARRO GONZALEZ	88.285.854	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
7	LUIS AMADO	SERNA	88.279.844	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
8	LUIS FERNANDO	BECERRA NAVARRO	1.091.661.106	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
9	LEONARDO FABIO	JIMENEZ PACHECO	1.091.661.320	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
10	WILFRAN	CHINCHILLA RANGEL	1.091.671.902	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
11	LUIS ALFONZO	REYES HOYOS	1.003.089.097	AUXILIAR DE OBRA	OCTUBRE 01-2023
12	ALEXANDER	GUTIERREZ	88.276.925	AUX DE OBRA	OCT-01

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

10. INDICADORES DE GESTION

TABLA N°10 INDICADORES DE GESTION			
No	**INDICADORES**		**RESULTADO**
1	Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta como número de AT ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	0
2	Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	0
3	Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período	0
4	Índice de Frecuencia de Ausentismo	Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud.	3
5	Cobertura de la inducción	Muestra el porcentaje de personas que reciben la inducción	100%
6	% CubrimientoEPP	Proporción de trabajadores que reciben los EPP	100%
7	% uso EPP	Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP	100%
8	Charlas de seguridad	Numero de charla de seguridad	3
9	Trabajadores en el mes contratista	Número total de trabajadores	12
11	Trabajadores en el mes - interventoría	Número total de trabajadores	5

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico que evidencia el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG-SST -mes de diciembre -2023

FOTO N.º 1 - ACTIVIDADES SG-SST









DESCRIPCIÓN: ORDEN Y LIMPIEZA EN GENERAL EN LA VIA EXISTENTE

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

FOTO N.º 2 ACTIVIDADES SG-SST









DESCRIPCIÓN: CAPACITACION DE ESTRESS Y COMUNICACION ASERTIVA A TODO EL PERSONAL ADMIN Y RUT

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

FOTO N.º 3 INSPECCIONES DE EJECUCION DE OBRA EN ORDEN Y LIMPIEZA.

LIMPIEZA DE VIA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA





LIMPIEZA DE VIA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA





DESCRIPCIÓN: ORDEN Y LIMPIEZA.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

FOTO N.º 4 INSPECCION DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE SEÑALIZACION DE LA VIA

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN LA VIA	SEÑALIZACION DE DERRUMBE









DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA DE VIAS Y SEÑALIZACION DE VIA.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

FOTO N.º 5 INSPECCION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

TRABAJO EN EQUIPO	TRABAJO EN EQUIPO









DESCRIPCIÓN: EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

FOTO N.º 6 INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS Y PUNTO ECOLOGICO.

PRIMEROS AUXILIOS	PRIMEROS AUXILIOS







DESCRIPCIÓN: INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS Y PUNTO ECOLOGICO.


Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia


(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

Atentamente;



ELSY GUTIERREZ OJEDA.
C.C. N.º 49.663.101 de Aguachica Cesar.
Inspectora SST.
Interventoría JOYCO SAS BIC.



LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ.
CC. N.º 1.091.659.224
Residente de Interventoría.
Interventoría JOYCO SAS BIC.

12. ANEXOS

a. **SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC-DEL MES DE DICIEMBRE – 2023.**

b. **SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI SERVICIO - MES DE DICIEMBRE DE - 2023.**

c. **FORMATOS DE CHARLAS.**

d. **DOCUMENTOS DE EQUIPO LIVIANO.**

Dentro de las actividades de seguridad industrial no se han realizado las inspecciones requeridas en este proyecto, ya que se ha presentado suspensiones en la plataforma de Muraby, estoy a la espera de información, del ingeniero Víctor Manuel. Ya que el me comenta que muraby no permite inscribir el nombre del proyecto que ejecutamos, de no ser así, aun no se podrá hacer inspecciones,

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS identificado(a) con CC 1091653811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	267336761	9458792832	E	2023-11-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,820,000	$291,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,820,000	$126,700
CCF	COMFANORTE	30	4%	$1,820,000	$72,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,820,000	$72,800

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 08:52.

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1091659224 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	267336761	9458792832	E	2023-11-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,600,000	$1,056,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,600,000	$33,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,600,000	$33,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,600,000	$459,400
CCF	COMFACESAR	30	4%	$6,600,000	$264,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$6,600,000	$264,000

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 08:52.

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ELSY GUTIERREZ OJEDA identificado(a) con CC 49663101 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	267336761	9458792832	E	2023-11-09									X								

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COMFACESAR	30	4%	$1,075,000	$43,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 08:52.

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOAN ARLEY PACHECO JIMENEZ identificado(a) con CC 1091682174 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	267336761	9458792832	E	2023-11-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$4,200,000	$672,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,200,000	$292,400
CCF	COMFANORTE	30	4%	$4,200,000	$168,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,200,000	$168,000


Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 08:52.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503


Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

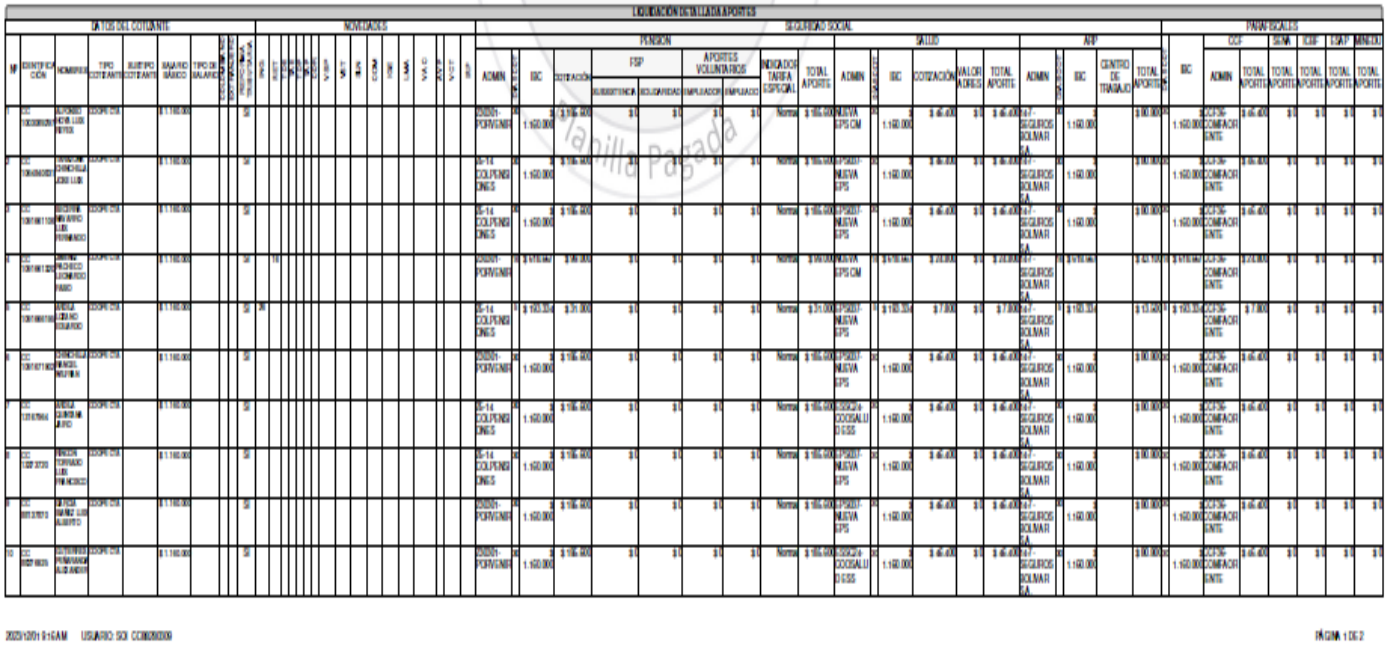

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

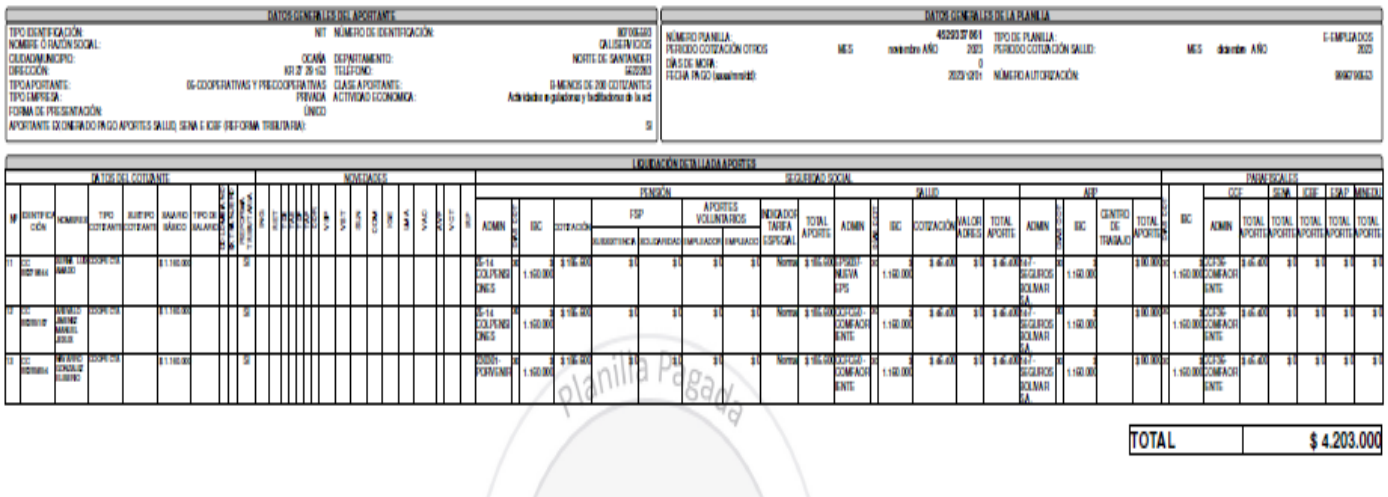

TOTAL	$ 4.203.000

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 13

ACTAS DE COMITÉ

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 14

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

1 de diciembre 2023	En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	Actividades: Se realiza jornada de reparcheo en el PR 35+0850, en el PR 35+0300, en el PR 33+0070, en el PR 31+0365, en el PR 31+0100.
	En la tarde: Tiempo soleado, tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.
	Actividades: Se presentó un accidente de tracto camión en el PR 02+0745.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N.º y/at: 54202 – 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

2 Diciembre 2023 Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007.

En la mañana: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
N.º y/at: 54202 – 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

3 Diciembre 2023 Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N.º y/at: 54202 – 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

4 Diciembre 2023 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 32+0950 al PR 32+0970, limpieza de zacería y desmonte del PR 33+0365 al PR 33+0375, del PR 12+0185 al PR 12+0200, poda de árbol en el PR 18+0750.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 34+0030, en el PR 11+0795, limpieza de zacería y desmonte del PR 33+0920 al PR 33+0935

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N: Hab: 54202 - 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Red Vial.

5 Diciembre 2023.

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza jornada de instalación de tachas reflectivas en el PR 03+0700 al PR 03+0750, en el PR 19+0391 al PR 19+0480, limpieza de cunetas revestidas. en el PR 11+0450 al PR 11+0465.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 10+0630, en el PR 10+0785, limpieza de zacería y desmonte del PR 33+0920 al PR 33+0935.

Sucla Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202 - 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

6 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza mantenimiento rutinario de puentes en el PR 28+0556, limpieza de rocería y desmonte del PR 34+0060 al PR 34+0080, del PR 10+0144 al PR 10+0164, limpieza de alcantarillas en el PR 34+0146, en el PR 10+0144, limpieza de cunetas revestidas en el PR 34+0350 al PR 34+0370, limpieza de encoles y descoles en el PR 09+0611

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza jornada de instalación de tachas reflectivas en el PR 25+0000 al PR 25+0200, limpieza de cunetas revestidas en el PR 09+0935 al PR 09+0945

Sucla Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202 - 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

7 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realizó la capacitación con la cooperativa CALISERVICIOS sobre el tema del estrés en las jornadas laborales.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR

	43+0000
	Lucila Teresa Cabrera Jimenez No. Mat: 54202-259147 NTS. Ingeniera Residente de la Adm Vial.
8 de Diciembre 2023	Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007
	En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.
	En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000
	Lucila Teresa Cabrera Jimenez No. Mat: 54202-259147 NTS. Ingeniera Residente de la Adm Vial.
9 Diciembre 2023	Se realizo vigilancia en el corredor vial 7007.
	En la mañana: Tiempo despejados; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.
	En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.
	Lucila Teresa Cabrera Jimenez No. Mat: 54202-259147 NTS. Ingeniera Residente de la Adm Vial.

10 Diciembre 2023

Se realizo vigilancia en el corredor vial 7007.

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
N° Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

11 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 35+0056, limpieza de cunetas revestidas en el PR 35+0000 al PR 35+0020, en el PR 08+0670 al PR 08+0690, limpieza de roceria y desmonte del PR 34+0641 al PR 34+0651, del PR 07+0800 al PR 07+0820.

Actividades: Se realiza limpieza de remoción de derrumbes en el PR 35+0370, limpieza de alcantarillas en el PR 07+0129,

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N° Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

12 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 35+0602, en el PR 06+0960, limpieza de cunetas revestidas en el PR 35+0705 al PR 35+0715, en el PR 06+0960 al PR 06+0970, se realiza recolección y retiro de basura y desechos en el PR 06+0250 al PR 06+0255, limpieza de rocería y desmonte del PR 06+0145 al PR 06+0250.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de rocería y desmonte. del PR 36+0355 al PR 36+0375, accidente de tránsito en el PR 37+0970

Lucila Teresa Cabrera Jiménez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

13 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de rocería y desmonte. del PR 36+0700 al PR 36+0725, del PR 04+0300 al PR 04+0325, limpieza de alcantarillas en el PR 37+0286, limpieza de cunetas revestidas en el PR 37+0000 al PR 37+0020

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal PR 00

0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 03+0845 al PR 03+0825, limpieza de alcantarillas en el PR 04+0825

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat. 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

14 Diciembre 2023 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de rocería y desmonte del PR 37+0600 al PR 37+0625, del PR 02+0900 al PR 02+0915, poda de árbol PR 18+0350, limpieza de alcantarillas en el PR 03+0460, limpieza de cunetas revestidas en el PR 03+0140 al PR 03+0160

En la tarde: Tiempo soleado, tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza recolección y retiro de basura y desechos en el PR 38+0030 al PR 38+0035, limpieza de cunetas revestidas en el PR 38+0050 al PR 38+0065, limpieza de alcantarillas en el PR 38+0183.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

15 Diciembre 2023 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza siembra de arboles en el PR 28+0556, limpieza de alcantarillas en el PR 01+0130 limpieza de cunetas revestidas en el PR 01+0500 al PR 01+0525, limpieza de rocería y desmonte del PR 00+0320 al PR 00+0330.

En la tarde: Tiempo soleado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza mantenimiento rutinario de puentes en el PR 00+0090

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NIS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

16 Diciembre 2023 — Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007.

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

En la tarde: Tiempo nublado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202 - 259147 NIS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

17 Diciembre 2023 — Se realizo vigilancia en el corredor vial 7007

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

18 Diciembre 2023 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de roceña y desmonte del PR 38+0393 al PR 38+0405, del PR 21+0000 al PR 21+0020, del PR 38+0343 al PR 38+0353, limpieza de alcantarillas en el PR 38+0611, en el PR 20+0891, limpieza de cunetas revestidas en el PR 21+0000 al PR 21+0020

En la tarde: Tiempo Soleado; tráficonomal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 20+0495.

Lucila Teresa, Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

19 Diciembre 2023 En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 39+0560 al PR 39+0575 en el PR 20+0495 al PR 20+0510, limpieza de roceña y desmonte del PR 39+0975 al PR 39+

0985, limpieza de alcantarillas en el PR 19 + 0935
e

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00 + 0000 al PR 43 + 0000

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 40 + 0266, en el PR 19 + 0990, poda de árboles PR 19 + 0715

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202 - 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

20 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00 + 0000 al PR 43 + 0000

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 41 + 0000 al PR 41 + 0025, limpieza de alcantarillas en el PR 40 + 0706, en el PR 19 + 0391, limpieza de roceria y desmonte del PR 40 + 0706 al PR 40 + 0716, limpieza de disipador en el PR 41 + 0083.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00 + 0000 al PR 43 + 0000.

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 19 + 0115 al PR 19 + 0125

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat 54202 - 259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial

21 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 42+0030 al PR 42+0045, en el PR 18+0528 al PR 18+0538, limpieza de alcantarillas en el PR 42+0011, en el PR 18+0600

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de rocería y desmonte del PR 18+0300 al PR 18+0325

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Hab: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

22 Dbre 2023

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realizó por parte de la territorial Ocaña, una integración para celebrar el último día de la novena con el acompañamiento de las administraciones viales y las cooperativas, y demás funcionarios del INVIAS.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Hab: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

23 Diciembre. 2023	Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007
	En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	Lcda. Teresa Cabrera Jimenez.
	Nº Mat: 54202-259147 NTS.
	Ingeniera Residente de la Adm Vial.
24 Diciembre. 2023.	Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007
	En la mañana; Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.
	Lcda Teresa Cabrera Jimenez.
	Nº Mat: 54202-259147 NTS.
	Ingeniera Residente de la Adm Vial.
25 Diciembre 2023	Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007
	En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N° Hat. 54202 - 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

26 Dic 2023 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 34+0800 al PR 34+0820, en el PR 28+0600 al PR 28+0620

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de pavimento asfáltico o rígido (calzada) en el PR 18+0098 al PR 18+0100, poda de árboles y PR 18+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N° Hat: 54202 - 259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

27 Dic 2023 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza remoción de derrumbes en el PR 42+0340, en el PR 42+0470, limpieza de roceña y desmonte del PR 17+0495 al PR 17+0505, limpieza de cunetas revestidas en el PR 17+0900 al PR 17+0920

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza remoción de derrombes en el PR 42+0740, limpieza de cunetas revestidas en el PR 17+0213 al PR 17+0223

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial

28 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza siembra de árbol en el PR 28+0556, limpieza de cunetas revestidas en el PR 17+0100 al PR 17+0120, limpieza de alcantarillas en el PR 16+0830, en el PR 16+0690, limpieza de encoles y descoles en el PR 16+0830, limpieza de rocería y desmonte del PR 16+0520 al PR 16+0530

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza poda de árbol en el PR 17+0320

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

29 Diciembre 2023

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarilla en el PR 21+0120, limpieza de cunetas revestidas en el PR 21+0000 al PR 21+0020, limpieza de roceria y desmonte del PR 21+0030 al PR 21+0050.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

30 Dbre 2023 Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

31 Dbre 2023 Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.
