1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	30,68%	28,24%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	1,00%	1,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	31,7%	29,2%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	70,8%	68,3%	2,4%
Durante el periodo	29,2%	31,7%	-2,4%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	31,7%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 40.669.171,94	$ 128.375.163,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	29,2%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 37.535.263,03	$ 128.369.572,62

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

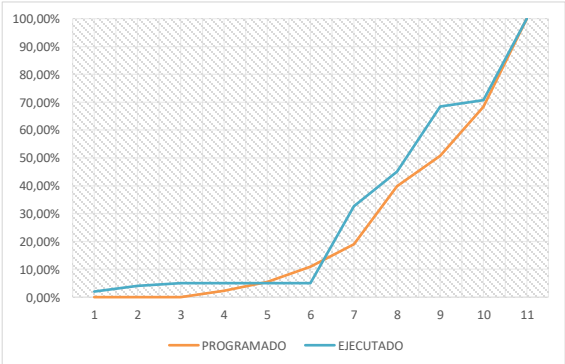

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la aplicación de pintura de vinilo tipo 1.
Se realiza actiiadades de aseo general.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la aplicación de pintura de vinilo tipo 1.
Se realiza actiiadades de aseo general.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:15/02/2025
Descripción: Pintura en muro de fachada.



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura de guardaescoba.



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura en fachada interna.



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura en muros interiores.





Fecha:21/02/25
Descripción: Mantenimiento y pintura de pujertas y ventanas.



Fecha:181/02/25
Descripción: Remate de muro en fachada.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETES Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	12,6%	9,5%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	1,0%	1,0%	N/A	N/A
TOTAL	13,6%	10,5%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	89,6%	86,4%	3,2%
Durante el periodo	10,4%	13,6%	-3,2%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	13,6%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 19.773.847,63	$ 144.929.048,44

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	10,4%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.145.085,56	$ 144.929.048,44

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

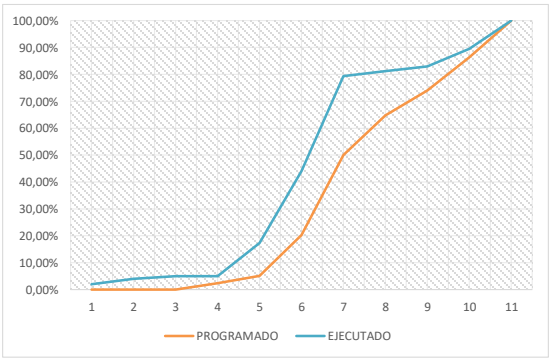

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con las actividades de instalacion de estreuctura metalica y cubierta del patio.
Se realiza actividades de aseo general en la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con las actividades de instalacion de estreuctura metalica y cubierta del patio.
Se realiza actividades de aseo general en la sede.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura fachada.



Fecha:21/02/2025
Descripción: Instalación flanche metalico.



Fecha:20/02/2025
Descripción: Pintura en corredores.



Fecha:20/02/2025
Descripción: Pintura Koraza en zona de lavanderia.



Fecha:21/02/2025
Descripción: Pintura muros interiores.



Fecha:18/02/2025
Descripción: Instalación de teja en zona de colchonetas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	3,02%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	9,55%	8,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	9,6%	11,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	65,3%	61,6%	3,7%
Durante el periodo	34,7%	38,4%	-3,7%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	38,4%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 44.250.944,05	$ 115.316.883,81

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	34,7%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 40.014.958,68	$ 115.316.883,81

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

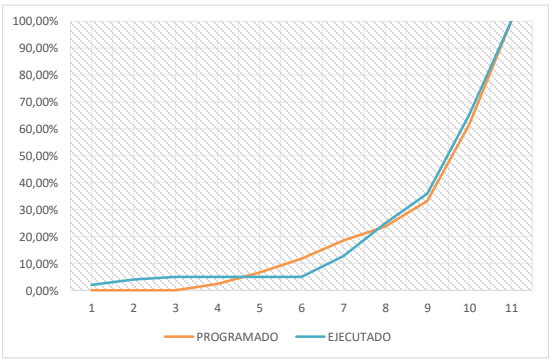

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la instalacion de manto asfaltico en la cubierta.
Se culmina con la aplicación de pintura Koraza en fachada.
Se realiza aseo general.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la instalacion de manto asfaltico en la cubierta.
Se culmina con la aplicación de pintura Koraza en fachada.
Se realiza aseo general.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 15/02/2025
Descripción: Resane de fachada costado norte.



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en cubierta.



Fecha: 20/02/2025
Descripción: Remta de manto impermeable en muros.



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en cubierta.





Fecha: 20/02/2025
Descripción: Pintura de fachada.



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Media caña en mortero impermeabilizado.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24 / 2 / 25		2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA		5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024		7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24		10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025		13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024		18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24		21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025		24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	Demolicion de carcamo existente.
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTA	10,20%	1,30%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	1,00%	N/A	N/A
TOTAL	10,20%	2,30%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	65,5%	70,1%	-4,6%
Durante el periodo	34,5%	29,9%	4,6%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	29,9%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 35.932.821,90	$ 119.999.940,59

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	34,52%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 41.423.979,49	$ 119.999.940,59

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

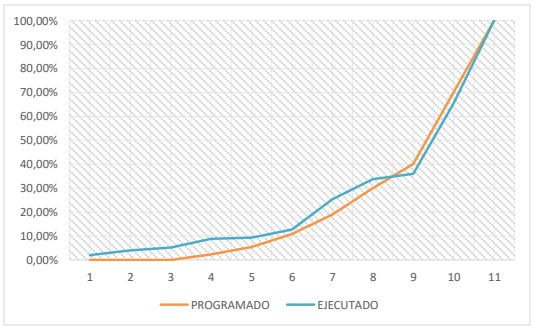

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	2				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 .
Se culmina con la construccion de media caña.
Se realiza aseo general en la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 .
Se culmina con la construccion de media caña.
Se realiza aseo general en la sede.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Cambio de cubierta en punto fijo del cuarto piso.





Fecha: 10/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en placas del punto fijo.



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Demolición, reconstrucción, enchape y pintura de cuarto de basuras.





Fecha: 21/02/2025
Descripción: Instalación de mediacaña en PVC, fundida y pulido de guardaescoba en granito.





Fecha: 21/02/2025
Descripción: Resane y Pintura en muros y techos.





Fecha:20/02/2025
Descripción: Suministro e instalación de luminarias.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%		
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	89,3%	10,7%
Durante el periodo	0,0%	10,7%	-10,7%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,7%	100,0%
Valor de la Obra Programada	631642103,11%	$ 58.993.941,48

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 58.996.104,27

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

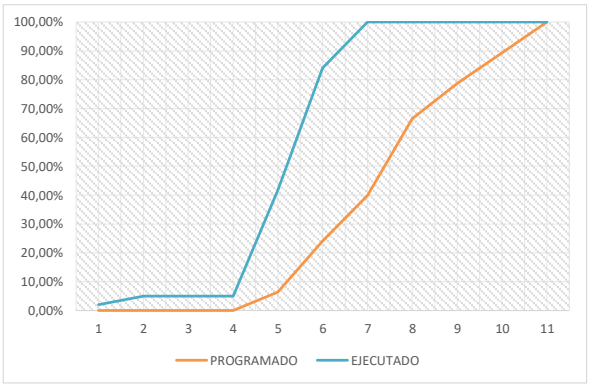

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR SST	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se entregan espacios intervenidos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se entregan espacios intervenidos.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 25/01/25
Descripción: Trabajos finales en la sede.



Fecha: 25/01/25
Descripción: Trabajos finales en la sede.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE LUMINARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	74,0%	26,0%
Durante el periodo	0,0%	26,0%	-26,0%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	26,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 4.417.567,88	$ 17.008.151,05

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 17.008.151,05

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

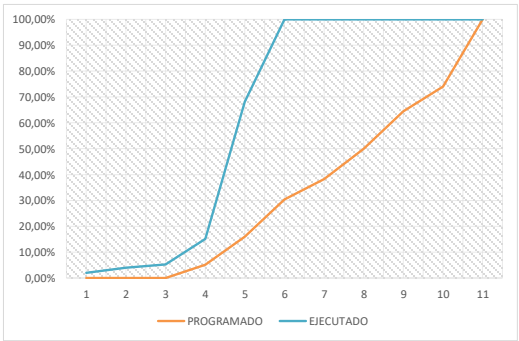

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	0			JUEVES	S
AYUDANTES	0			VIERNES	S
OFICIALES	0			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se entregan los espacios intervenidos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se entregan los espacios intervenidos.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha:18/01/25
Descripción: Estado final del comedor.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	100,0%	0,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 160.904.588,39

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 160.904.588,39

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

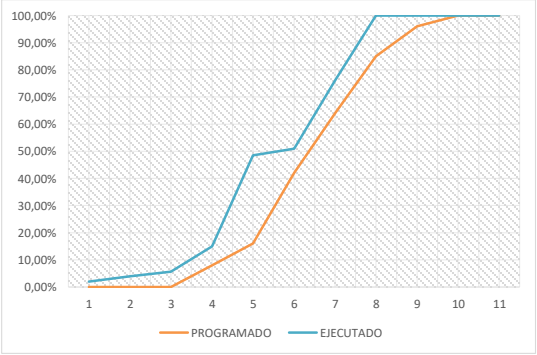

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	F
OFICIALES	2			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la construccion de mediacaña en mortero.
Se realiza la impermeabilizacion con manto asfaltico.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la construccion de mediacaña en mortero.
Se realiza la impermeabilizacion con manto asfaltico.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:16/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Elaboracion en media caña en mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE SANITARIOS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	100,0%	0,0%
Durante el periodo	0,0%	5,9%	-5,9%
Acumulado Actual	100,0%	105,9%	-5,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,9%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 5.520.621,65	$ 93.951.780,52

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 93.954.224,10

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

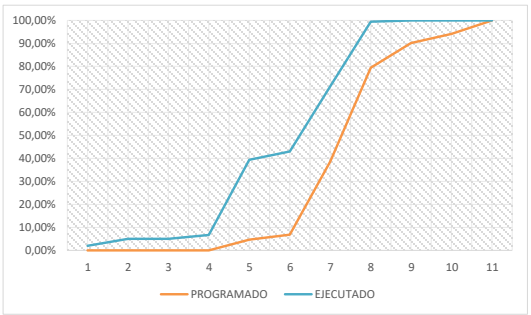

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza reparacion del piso donde se instalaron los lava colas.
Se realiza retiro de granito, para realizar la respectiva reparacion del mismo.
Se instala tele duchas en lava colas.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza reparacion del piso donde se instalaron los lava colas.
Se realiza retiro de granito, para realizar la respectiva reparacion del mismo.
Se instala tele duchas en lava colas.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Resane y pintura de aula.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Resane y pintura de aula.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Resane y pintura de aula.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	96,7%	63,4%	33,2%
Durante el periodo	3,3%	36,6%	-33,2%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	36,6%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 65.852.676,54	$ 180.063.738,56

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,3%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.996.122,49	$ 180.063.738,56

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

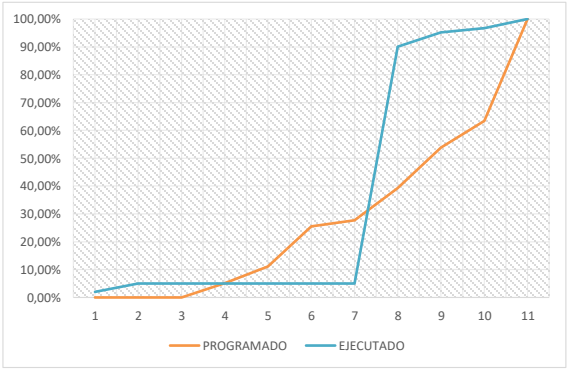

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la instalación de la cubierta en policarbonado.
Se realiza visita.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la instalación de la cubierta en policarbonado.
Se realiza visita.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato




Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato



Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato



Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato

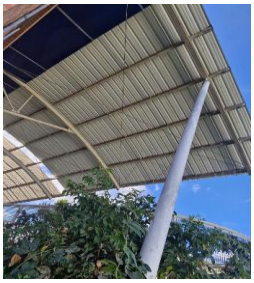

Fecha:24/02/2025
Descripción: Cubierta ecoroof.



Fecha:24/02/2025
Descripción: Cubierta ecoroof.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11		3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY				5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV										
12. PRORROGAS:	23/02/2025		13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025		24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	61,4%	25,3%	36,1%
Durante el periodo	38,6%	74,7%	-36,1%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	74,7%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 23.369.330,72	$ 31.265.276,36

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	38,6%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 12.080.902,79	$ 31.265.276,36

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

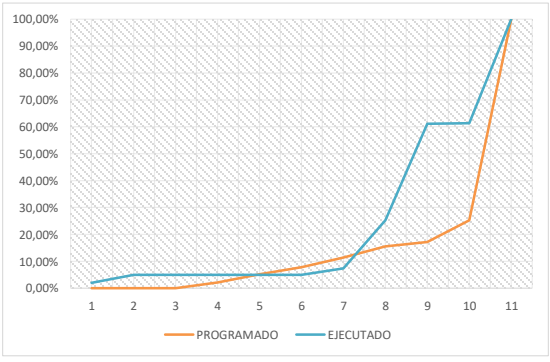

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza visita de obra.
Se evidencia que del colegio están arrogando basura la cual esta obstruyendo las canales y bajantes del jardín.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de obra.
Se evidencia que del colegio están arrogando basura la cual esta obstruyendo las canales y bajantes del jardín.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:24/02/2025
Descripción: Visita de obra




Fecha:24/02/2025
Descripción: Visita de obra




Fecha:24/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:24/02/2025
Descripción: Limpieza de canales



Fecha:24/02/2025
Descripción: Limpieza de canales



Fecha:24/02/2025
Descripción: Limpieza de canales

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	39,8%	100,0%	-60,2%
Durante el periodo	60,2%	0,0%	60,2%
Acumulado Actual	100,00%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 106.655.052,39

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	60,2%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 64.196.486,52	$ 106.656.398,94

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

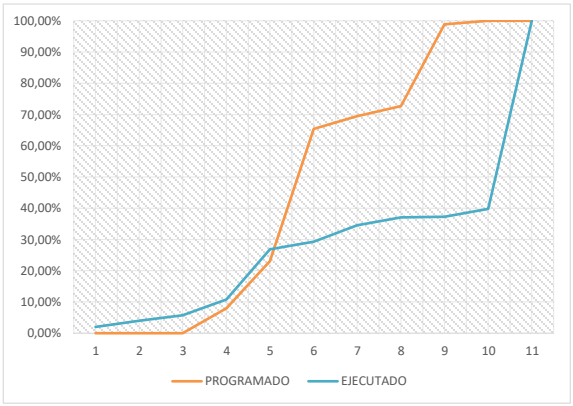

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza instalacion del piso de caucho.
Se realiza instalacion de vidrios con su respectiva pelicula de seguridad.
Se realiza limpieza de aulas y corredores intervenidos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza instalacion del piso de caucho.
Se realiza instalacion de vidrios con su respectiva pelicula de seguridad.
Se realiza limpieza de aulas y corredores intervenidos.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de esquinerios.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Aseo y limpieza



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de vidrios.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de esquinerios.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	61,7%	86,9%	-25,1%
Durante el periodo	38,3%	13,1%	25,1%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	13,1%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 8.208.931,43	$ 62.439.107,62

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	38,3%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 23.907.934,31	$ 62.439.107,62

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

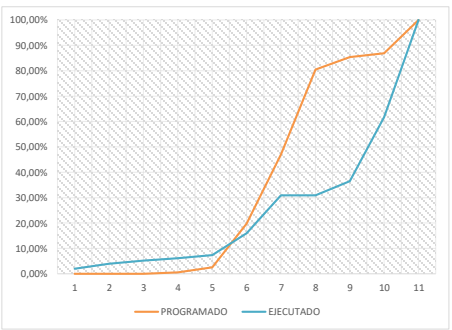

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	F
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
				VIERNES	L
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en los muros de las tres aulas intervenidas.
Se realizan observaciones en zonas especificas de los muros, los cuales seran atendidas por el consorcio.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en los muros de las tres aulas intervenidas.
Se realizan observaciones en zonas especificas de los muros, los cuales seran atendidas por el consorcio.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	80,9%	96,5%	-15,6%
Durante el periodo	19,1%	3,5%	15,6%
Acumulado Actual	100,00%	100,0%	0,00%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,5%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 2.817.639,27	$ 79.853.122,35

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	19,1%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.284.168,16	$ 79.856.821,61

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

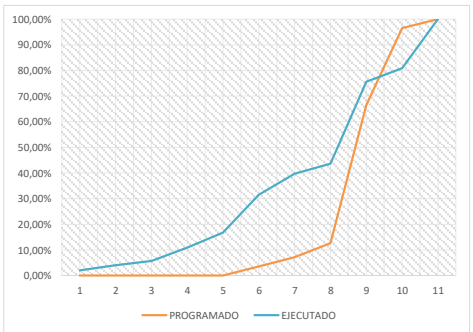

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	F
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	F
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza visita de obra.
Se realiza aseo general en la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de obra.
Se realiza aseo general en la sede.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de cinta antideslizante.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.
