
SEGUIMIENTO PLAN DE CHOQUE PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA, AMAZONAS

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

				VALOR PLANEADO									VALOR EJECUTADO						
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	18-oct	23-oct	31-oct	7-nov	15-nov	23-nov	30-nov	7-dic	18-dic	18-oct	23-oct	31-oct	7-nov	15-nov	23-nov	30-nov
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS				70,39%	71,38%	72,08%	73,99%	78,53%	84,20%	90,16%	100,00%	100,00%	70,39%	71,38%	71,78%	73,25%	75,09%	76,84%	76,92%
1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2.1.A	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,83%	3,85%	4,05%	4,05%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
2.2.A	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,53%	0,75%	0,75%	0,75%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
2.03	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,58%	0,82%	0,82%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
2.04	GRABADORA DE VOZ	UND	1	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,01%	1,44%	1,44%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
2.05	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UND	1	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,01%	1,44%	1,44%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
2.06	LICENCIA ORACLE	UND	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,37%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.07	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,20%	0,28%	0,28%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
2.08	SWITCH KVM	UND	1	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,10%	0,10%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
2.09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,99%	1,41%	1,41%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
2.13	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,36%	0,36%	0,52%	0,52%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
2.01.B	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,94%	1,28%	1,35%	1,35%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
2.02.B	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,18%	0,25%	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
3.01	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	8,59%	8,59%	8,73%	9,67%	10,84%	11,65%	11,65%	12,27%	12,27%	8,59%	8,59%	8,59%	9,37%	9,37%	11,04%	11,04%
3.02	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	2,38%	2,38%	2,43%	2,69%	2,99%	3,23%	3,23%	3,40%	3,40%	2,38%	2,38%	2,38%	2,60%	3,06%	3,06%	3,06%
3.03	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	14,64%	15,03%	15,44%	15,44%	15,46%	15,48%	16,29%	16,29%	16,29%	14,64%	15,03%	15,44%	15,44%	15,44%	15,44%	15,44%
3.04	SWITCH TIPO 1	UN	50	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,43%	3,29%	3,47%	3,47%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
3.05	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,36%	0,36%	0,52%	0,52%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
3.06	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,86%	0,86%	1,23%	1,23%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
3.07	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,86%	2,86%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
3.08	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,35%	0,35%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
3.09	UPS DE 2KVA	UND	50	2,63%	2,63%	2,67%	2,96%	3,32%	3,57%	3,76%	3,76%	3,76%	2,63%	2,63%	2,63%	2,73%	3,38%	3,38%	3,38%
3.10	UPS DE 15KVA	UND	1	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,85%	0,85%	0,85%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	9,39%	9,39%	13,41%	13,41%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
3.12	SERVIDOR VMS	UND	1	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,44%	1,44%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,49%	0,49%	0,70%	0,70%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,17%	0,17%	0,19%	0,19%	0,19%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%	0,26%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
4.01	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	1,85%	1,85%	1,90%	2,20%	2,58%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	1,85%	1,85%	1,85%	2,11%	2,65%	2,65%	2,65%
4.02	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,21%	0,21%	0,21%	0,25%	0,29%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,21%	0,21%	0,21%	0,26%	0,30%	0,30%	0,30%
4.03	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,67%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
4.04	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,28%	0,28%	0,29%	0,33%	0,39%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,28%	0,28%	0,28%	0,32%	0,40%	0,40%	0,40%
4.05	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,99%	2,57%	2,68%	2,68%	2,68%	1,61%	1,61%	1,61%	1,63%	1,64%	1,67%	1,72%
4.06	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	2,13%	2,57%	2,63%	2,63%	2,63%	1,89%	1,89%	1,89%	1,92%	1,95%	2,00%	2,02%
4.07	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	0,12%	0,12%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,12%	0,12%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
4.08	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,25%	0,30%	0,35%	0,35%	0,35%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
4.09	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,50%	0,53%	0,53%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,18%	0,19%	0,19%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,31%	0,31%	0,43%	0,45%	0,45%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
5.01	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	0,17%	0,76%	0,76%	0,76%	1,03%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,17%	0,76%	0,76%	0,77%	0,80%	0,80%	0,80%
6.01	**KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA**	**KIT**	3	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,41%	1,47%	1,73%	1,73%	1,73%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,13%
7.01	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	1,45%	1,53%	1,53%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%
7.02	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,69%	0,69%	0,76%	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
7.03	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,27%	5,37%	5,37%	5,37%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
7.04	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,99%	0,99%	0,69%	0,69%	0,69%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%

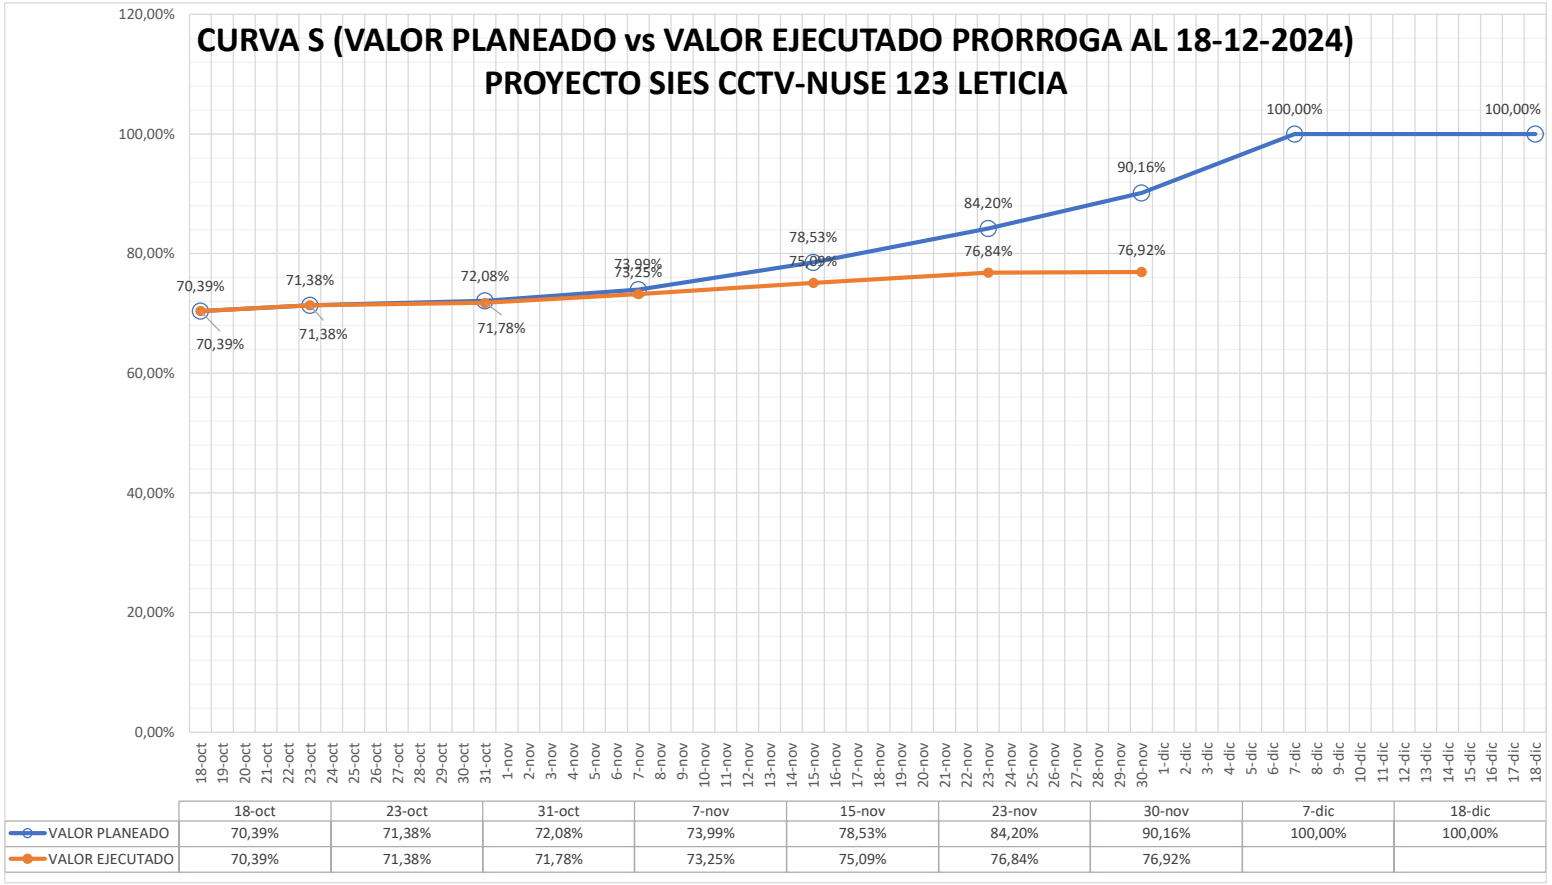

	18-oct	23-oct	31-oct	7-nov	15-nov	23-nov	30-nov	7-dic	18-dic
VALOR PLANEADO	70,39%	71,38%	72,08%	73,99%	78,53%	84,20%	90,16%	100,00%	100,00%
VALOR EJECUTADO	70,39%	71,38%	71,78%	73,25%	75,09%	76,84%	76,92%		

	18-oct	23-oct	31-oct	7-nov	15-nov	23-nov	30-nov	7-dic	18-dic
VALOR	70,39%	71,38%	72,08%	73,99%	78,53%	84,20%	90,16%	100,00%	100,00%
VALOR	70,39%	71,38%	71,78%	73,25%	75,09%	76,84%	76,92%		

JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ
GERENTE DE PROYECTO
DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
