MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO No. 3

PERÍODO: 26 A 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO No. 1956 DE 2024

CARRETERAS:

1002 TUQUERRES - PEDREGAL
PR95+0000 – PR127+0600

1702 TUQUERRES - SAMANIEGO
PR 0+0000 – PR44+0000

2501B CEBADAL- SANDONÁ – SANTA BARBARA
PR0+0000-PR60+0000

CONTRATISTA: CONSORCIO AMV MACA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

Agosto 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

- ✓ 2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario
- ✓ 2.2 Relación de Interventorías de obras menores
- ✓ 2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
- ✓ 2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
- ✓ 2.5 Relación de correspondencia enviada
- ✓ 2.6 Relación de correspondencia recibida
- ✓ 2.7 Relación de recorridos de inspección de las vías a cargo.


3. Actividades de la Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato No.:		1956 de 2024
Objeto del Contrato:		ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3.
Supervisor Contrato Interventoría	:	Ing. UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Contratista:	:	CONSORCIO AMV MACA
Nit	:	901838895-0
Valor Contrato Inicial	:	$ 4.049.944.374
Adicionales	:	sin adicionales a la fecha.
Prórrogas	:	Sin prórrogas a la fecha.
Valor total	:	$ 4.049.944.374
Orden de Iniciación	:	26 de julio de 2024 con oficio 2024S-VNAR-050602.
Plazo Inicial del Contrato	:	Veintinueve (29) meses
Fecha de terminación	:	31 de julio de 2026.

VIAS A CARGO DE LA AMV GRUPO 3

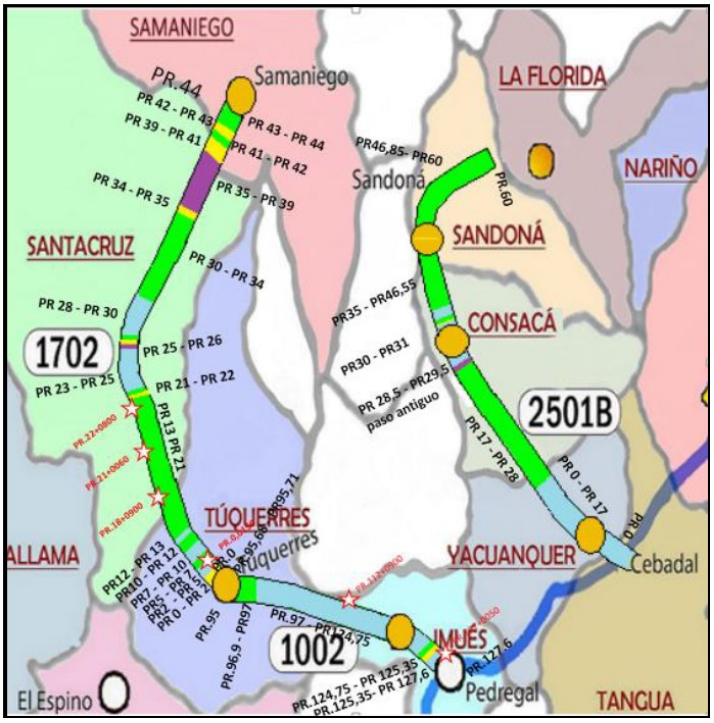

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario.

Los procesos de contratación de mantenimiento rutinario que realiza el instituto Nacional de Vías - INVIAS, en el presente periodo se encuentran en desarrollo, por lo cual no se realizó interventoría a este tipo de contratos.

2.2 Relación de Interventorías de obras menores.

En el presente periodo la Administración Vial Grupo 3 no cuenta con contratos de obras menores en ejecución.

2.3 Recolección de Información sobre accidentalidad

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante las secretarias de Tránsito y Transporte, seccionales de tránsito e inspecciones de Policía de los municipios con jurisdicción dentro de las vías a cargo, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de julio del año 2024, y al respecto se informa lo siguiente:

Vía 1002 Tuquerres - Pedregal PR 95+0000 – 127+0600: Mediante oficios AMV-L3-CTO-1956-2024-006, remitido al a la secretaria de Tránsito de Tuquerres; AMV-L3-CTO-1956-2024-008 al a la secretaria de Tránsito de Imues.

Vía 1702 Tuquerres - Samaniego PR 0+0000 – PR 44+0000: Mediante oficios AMV-L3-CTO-1956-2024-006, remitido al a la secretaria de Tránsito de Tuquerres; AMV-L3-CTO-1956-2024-0 al a la secretaria de Tránsito de Samaniego.

Vía 2501B Cebadal – Sandona -Santa Barbara PR 28+0000 – PR 60+0000: Mediante oficios AMV-L3-CTO-1956-2024-012, remitido al a la secretaria de Tránsito de Tangua; AMV-L3-CTO-1956-2024-009 al a la secretaria de Tránsito de Yacuanquer; AMV-L3-CTO-1956-2024-010 al a la secretaria de Tránsito de Consacá; AMV-L3-CTO-1956-2024-011 al a la secretaria de Tránsito de Sandona.

Se radicó el oficio AMV-L3-CTO-1956-2024-013 del 06/08/2024, remitido a la Policía de Tránsito y Transporte seccional Nariño SETRA-DENAR, solicitando información de accidentalidad en las rutas:1002, 1702 y 2501B.

FECHA	CÓDIGO DE VÍA	HORA	PR	CLASE	CAUSA POSIBLE	ELEMENTOS INVOLUCRADOS	VÍCTIMAS	REPORTE DE POLICÍA
01/07/2024	2501B	17:20	39+0450	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad	Motocicleta/ Automóvil	1 muerto 1 herido	Sin reporte
17/07/2024	2501B	20:19	30+0450	01 - Choque	141 - Vehículo mal estacionado	Bicicleta/ Camioneta	1 herido	Sin reporte

29/07/2024	2501B	04:00	30+0762	02 - Atropellamiento	114 - Embriaguez aparente	Automóvil	1 heridos	Sin reporte

2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes.

Al inicio de actividades de la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 3, con fecha del 26 de julio de 2023, se identificó los siguientes derrumbes menores en las vías a cargo.

Vía 1702 Tuquerres – Samaniego

Los deslizamientos de material de los taludes superiores debido a lluvias, tipo de suelo, pendiente de las laderas, entre otros factores; tienen volúmenes de menor y mediano tamaño, que se localizan en las zonas laterales de la vía, cunetas y en algunos sitios ocupando parcialmente parte del carril, estos corresponden a las abscisas PR19+0430, PR27+0700, PR33+0680.

El personal de la AMV ha señalizado estos sitios con cinta preventiva y algunos con barricadas para prevenir a los usuarios de la presencia de los obstáculos sobre la calzada, y de esta forma adopten las medidas de reducir la velocidad y realizar la maniobra adecuada para salvar el material de derrumbe con precaución y que no se genere un posible accidente.

Considerando que actualmente no se cuenta con personal de mantenimiento rutinario para la remoción, esta administración continuará realizando la señalización de los sitios, sin embargo, es importante la evaluación de la entidad para la atención de los sitios y realizar el despeje total de la calzada, ya que el material de derrumbe representa un riesgo de posible incidente o accidente de tránsito.

Relación de derrumbes menores ocupando carril izquierdo de la vía

Municipio	Codigo	Nombre del Corredor	PR. Inicial	Distancia P.R. Inicial	Margen	Coordenadas	Tipo material	Seccion afectada	Volumen (m3)
Santacruz	1702	Tuquerres-Samaniego	19	430	I	1°10'32"N 77°39'36"W	Material granular fino	Media ladera izquierda	21,00
Observaciones:	Derrumbes conformados por material granular fino y fragmentos de roca pequeña que ocupan la mitad del carril, obstruyendo el sistema de drenaje y comprometiendo la seguridad vial.								
Registro fotografico									



Municipio	Codigo	Nombre del Corredor	PR. Inicial	Distancia P.R. Inicial	Margen	Coordenadas	Tipo material	Seccion afectada	Volumen
Santacruz	1702	Tuquerres-Samaniego	27	700	I	1°13'34"N 77°39'40"W	Material granular	Media ladera izquierda	18,90
Observaciones:	Derrumbe conformado por material granular fino y fragmentos de roca pequeña que ocupan la totalidad del carril, obstruyendo el sistema de drenaje y comprometiendo la seguridad vial.								

Registro fotografico



Municipio	Codigo	Nombre del Corredor	PR. Inicial	Distancia P.R. Inicial	Margen	Coordenadas	Tipo material	Seccion afectada	Volumen (m3)
Santacruz	1702	Tuquerres-Samaniego	33	680	I	1°15'58"N 77°38'17"W	Material rocoso	Media ladera izquierda	1,40
Observaciones:	Material rocoso situado en la zona lateral de la vía y en la cuneta, comprometiendo el sistema de drenaje y la seguridad via								

Registro fotografico



Vía 2501B CEBADAL – SANDONÁ – SANTA BARBARA

De igual forma, en esta vía se identifican derrumbes menores que ocupan zonas laterales y cuneta; y los de mediano volumen que se localizan en el carril derecho obstaculizando el adecuado flujo vehicular, están en las abscisas PR38+0810, PR39+0037, PR41+0180.

La Administración Vial realizó la señalización por medio de barricadas y cinta preventiva de peligro, para advertir a los conductores de los obstáculos en la vía.

Municipio	Codigo	Nombre del Corredor	PR. Inicial	Distancia P.R. Inicial	Margen	Coordenadas	Tipo material	Seccion afectada	Volumen (m3)
Consaca	2501B	Cebadal - Santa Barbara	38	810	D	1°14'39"N 77°29'28"W	Material rocoso	Media ladera derecha	14,00
Observaciones:	Desprendimiento de detritos, material arenoso y fragmentos rocosos de gran tamaño que está obstruyendo carril derecho, afectando el flujo vehicular y la seguridad vial.								


Registro fotografico





Municipio	Codigo	Nombre del Corredor	PR. Inicial	Distancia P.R. Inicial	Margen	Coordenadas	Tipo material	Seccion afectada	Volumen (m3)
Consaca	2501B	Cebadal - Santa Barbara	39	37	D	1°14'40"N 77°29'35"W	Material rocoso	Media ladera derecha	18,75
Observaciones:	Desprendimiento de detritos, material arenoso y fragmentos rocosos de gran tamaño que está obstruyendo carril derecho, afectando el flujo vehicular y la seguridad vial.								

Registro fotografico

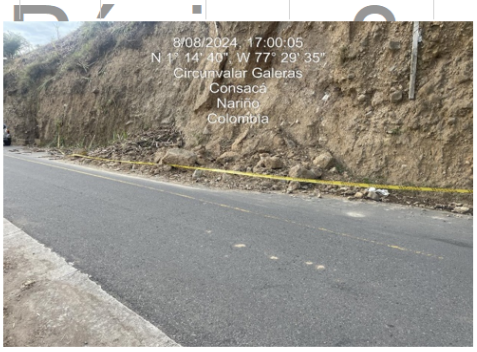

Municipio	Codigo	Nombre del Corredor	PR. Inicial	Distancia P.R. Inicial	Margen	Coordenadas	Tipo material	Seccion afectada	Volumen (m3)
Consaca	2501B	Cebadal - Santa Barbara	41	180	D	1°15'16"N 77°29'1"W	Material mixto	Media ladera derecha	15,8
Observaciones:	Suelos mixtos compuesto arcillosos, material rocoso y vegetación situados en la zona lateral de la vía que obstruyen carril derecho, comprometiendo el sistema de drenaje y la seguridad vial.								

Registro fotografico





2.5 Relación de correspondencia enviada

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	CARGO	ASUNTO
27/06/2024	AMV-L3-CTO-1956-2024-001	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	HOJAS DE VIDA INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO
5/07/2024	AMV-L3-CTO-1956-2024-002	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	LOGISTICA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3.
10/07/2024	AMV-L3-CTO-1956-2024-003	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	HOJAS DE VIDA PERSONAL AUXILIAR
18/07/2024	AMV-L3-CTO-1956-2024-004	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

2.6 Relación de correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	CARGO	ASUNTO	TEMA
27/06/2024	CORREO ELECTRONICO	ENVIO RESPUESTAS INVIAS	Grupo Atención al Ciudadano	Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-058195 REMISION HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO	LOGISTICA
5/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ENVIO RESPUESTAS INVIAS	Grupo Atención al Ciudadano	Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-060888 LOGISTICA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3	LOGISTICA
10/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ENVIO RESPUESTAS INVIAS	Grupo Atención al Ciudadano	Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-062561 HOJAS DE VIDA PERSONAL AUXILIAR	LOGISTICA
18/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ENVIO RESPUESTAS INVIAS	Grupo Atención al Ciudadano	Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-065427 HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	LOGISTICA
24/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	2024S-VNAR-049348 RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-065427 HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CTO 1956-2024	LOGISTICA
26/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	2024S-VNAR-050602 ORDEN DE INICIO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3 NO 1956 DE 2024. FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-1	LOGISTICA
26/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	2024S-VNAR-050599 RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-058195 DE 18 DE JUNIO DE 2024. SOLICITUD APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN INGRESO DE PERSONAL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 1956 DE 2024.	LOGISTICA
26/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. MARIA DEL PILAR CERON	Directora Territorial Nariño	2024S-VNAR-052216 OBSERVACIONES LOGÍSTICA CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 1956 DE 2023 GRUPO 3	LOGISTICA
29/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Supervisor INVIAS	RV: UT-INV-HSEQ 048 LISTADO DE PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN PUNTOS TERRITORIAL NARIÑO	SOLICITUD
30/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA	Supervisor INVIAS	RV: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - HALLAZGO 119R14 MEMORANDO 2024I-VBOG-031640 DE 23-07-2024 ESTADO DE PREDIOS TRANSFERIDOS A INVÍAS	SOLICITUD
30/07/2024	CORREO ELECTRONICO	ING. JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA	Supervisor INVIAS	MEMORANDO 2024I-VBOG-052637 - SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO "SEGUIMIENTO SEMANAL A SITIOS CRITICOS	MEMORANDO

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial Grupo No. 3

- Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- Participación en comités virtuales y presenciales de administradores viales, en coordinación con directora territorial y supervisores.

- Recorrido periódico e inspección vía 1002 sector Tuquerres - Pedregal PR 95+0000 -PR127+0600.

- Recorrido periódico e inspección vía 1702 sector Tuquerres – Samaniego PR 0+0000 – PR 44+0000.

- Recorrido periódico e inspección vía 2501B Cebadal – Sandoná - Santa Barbara PR 0+0000 – PR 60+0000.

- Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- Atención derechos de petición de usuarios de las vías a cargo.

- Reporte de invasiones en las vías a cargo.

VIGILANCIA

- Se elabora el informe mensual No.1 del periodo comprendido entre el 26 al 31 de julio de 2024 de actividades de la administración vial.

RESPUESTA A SOLICITUDES

- Para dar respuesta al Memorando No SPA 53748 de 14/09/2020, el cual tiene como referencia "*Dando alcance a nuestro memorando SPA 48800 del 25 de agosto de 2020 - Seguimiento Semanal a Sitios Críticos*". - se envió la información solicitada semanalmente al grupo de AMV designado para consolidar la información (Incluido grupo No.2, en la semana correspondiente), posteriormente se organiza y envía al correo jquinones@invias.gov.co – Ing Juan Carlos Quiñones, funcionario de INVIAS- Territorial Nariño.

INTERVENTORÍAS

VARIOS

3.1 Actividades con Insumos y peajes de recorrido.

En el presente periodo no se llevaron a cabo actividades con recursos de insumos.

En cuanto a peajes para recorrido de la vía 2501B Cebadal – Sandona – Santa Barbara, se realizó los siguientes recorridos de reconocimiento del estado de la vía, en cuanto derrumbes y sitios críticos.

Lunes 29 de Julio de 2024: Recorrido revisión de sitios inestables para plantilla de sitios críticos e invasiones en la zona de exclusión.
Miércoles 31 de julio de 2024: Recorrido para relación de derrumbes en la vía, y revisión de sitio de solicitud de concepto para Estación de Servicio de Combustible en PR36+0960 margen derecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ACTIVIDAD REVISIÓN DE SITIO DE CONSETRUCCIÓN DE EDS EN MARGEN DERECHA PR36+0960.
