INFORME DE MENSUAL AMV N°08

CONTRATO N°1535 - 2024

CONTRATO N°1528 – 2024

PERIODO: PRIMERO (01) AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 01 – LOTE 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
CONTRATO N°1994 DE 2024

SANTIAGO DE TOLÚ,
2025

INGENIEROS & CIUDADANOS

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.setec-gca.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1. LOCALIZACIÓN 6
2.2 ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 11
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 12
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 12
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 15
3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 20
3.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 22
3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 23
4.3 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 24
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26
5. ANEXOS 28
6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 29
COOTRAVIAT 30
ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ 31
6.2 PROGRAMACION DEL MES DE FEBRERO 2025 32
COOTRAVIAT 33
ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ 34
6.3 FORMATO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO FEBRERO 2025 35
COOTRAVIAT 36
ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ 37
6.4 FORMATO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION SEMANAL FEBRERO 2025 38
COOTRAVIAT 39
ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ 40

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.setec-gca.com

TABLAS

Tabla 1: Longitud en kilómetros y descripción de rutas a cargo de AMV. 8
Tabla 2: Información general del contrato 1535 de 2024. 12
Tabla 3: Información general de las pólizas 1535 de 2024. 13
Tabla 4: Información general del contrato 1528 de 2024. 14
Tabla 5: Información general de las pólizas 1528 de 2024. 15
Tabla 6: Información general del contrato 1994 de 2024 22
Tabla 7: Información de correspondencia enviada, mes de febrero. 24

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.setec-gca.com

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE**, con **NIT. 901.839.178 - 2**, representado legalmente por **ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ**, identificado con cédula **N° 79.868.594**, el Contrato **N° 1994 de 2024**, cuyo objeto es la: **" ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 1 – LOTE 2"**. Con orden de inicio a partir del **veintiocho (28) de junio de 2024**, con fecha de finalización inicial a **treinta y uno (31) de julio de 2026.**

El valor inicial del contrato de consultoría No. **1994-2024** es de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($3.089´425.878,00) incluido IVA, los cuáles serán destinados a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la red vial nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. La vía del objeto contractual corresponde a la **Carretera Coveñas – Sabaneta, Código 90SC02, Sector Coveñas – Sabaneta, PR 0+0000 – PR16+0000 y Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004, Sector Coveñas – Tolú, PR30+0000 – PR35+0000 y Sector Toluviejo – San Onofre, PR65+0937 – PR93+0683**.

Estos corredores viales comunican las cabeceras de los municipios de Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre en el departamento de Sucre y al municipio de Coveñas con varios corregimientos de Momil y Purísima en el departamento de Córdoba, permitiendo el desarrollo de actividades agropecuarias y por ende el desarrollo económico del país.

En el marco de las responsabilidades contractuales, La Administración Vial, en los recorridos que se hacen rutinarios, se realizan inspecciones, seguimiento y control a las actividades de mantenimiento rutinario de las cuadrillas del corredor vial 9004 y 90SC02, dentro de los cuales, se encuentra, rocería, limpieza de cunetas, limpieza bermas y calzada, limpieza de obras de arte y limpieza de señales verticales, defensas metálicas y puentes. Las actividades se desarrollan dentro de la normalidad y sin contratiempos, salvo las de tipo atención de emergencias, en este mes que se atendió el volcamiento de un vehículo tipo volqueta y el retiro de ramas que estaban en calzada, atendidos con personal mantenimiento rutinario.

El presente documento, corresponde al Informe **MENSUAL DE SEGUIMIETNO DE AMV No.08** y relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento realizadas por CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE a los Contratos de Mantenimiento Rutinario No. 1535 de 2024 y No. 1528 de 2024, suscritos entre LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE–INVIAS con “COOTRAVIAT” y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ respectivamente,

correspondientes al periodo comprendido del primero (01) al veintiocho (28) de febrero de 2025.

También se adjuntan en el documento, temas relacionados con el seguimiento, evaluación y supervisión de la Administración Vial del corredor, haciendo énfasis en temas puntuales de carácter técnico, operativo y funcional de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en la Dirección Territorial Sucre.

En el marco de estas actividades, basadas en recorridos periódicos en las vías a cargo, se evalúan las necesidades de cada corredor, haciendo seguimiento de primera mano, a las necesidades de operación, seguridad y comodidad de los usuarios y vecinos de las vías.

De igual forma en estos mismos recorridos, se hacen inspecciones a las obras de drenaje, revisión de señalización entre otros, como también se hace el levantamiento de información para suministrar datos para alimentar la base compilada de aplicativos como Sukubun, de fauna silvestre atropellada en las vías. Se revisa de manera diaria las posibles infracciones al derecho de vía según la Ley 1228 de 2008 y mediante el Decreto 2976 de 2010, y en los casos que se evidencian dichas infracciones se ofician a las administraciones municipales.

En el mes de febrero, se realizan labores de oficina desde los reportes diarios consignados en los grupos de reportes de la DT Sucre, reporte diarios de las actividades de mantenimiento rutinario, estado del clima en bitácora, elaboración de informes mensuales de interventoría, actas, evaluación de indicadores de mantenimiento rutinario, informes trimestrales, informes de accidentalidad, informes técnicos, informes de avance entre otros formatos, visitas técnicas y acompañamientos que soliciten desde la Dirección Territorial Sucre, durante el mes de febrero, se ha participado de manera activa en las distintas mesas de trabajo, específicamente en las convocadas por el Municipio de Tolú en el marco de los temas de seguridad vial, donde se definieron puntos en concreto para articular estrategias y mejorar la señalización en ciertos puntos de las rutas de INVIAS en el departamento de Sucre.

Las actividades de la administración vial continúan con la elaboración de informes de oficina y la realización, compilación, programación y demás temas en el marco de actividades a desarrollar de mantenimiento rutinario en la semana, en el plazo definido por la entidad.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

La Administración vial, Grupo 1, lote 2, a cargo del Consorcio Administradores GAE, ejecuta actividades en los departamentos de Sucre y Córdoba, en las Carreteras Coveñas – Sabaneta, Código 90SC02, Sector Coveñas – Sabaneta, del PR 0+0000 al PR16+0000 y Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004, Sector Coveñas – Tolú, del PR30+0000 al PR35+0000 y Sector Toluviejo – San Onofre, PR65+0937 – PR93+0683.

Corredores viales que unen al departamento de Córdoba y Sucre, y a la región Caribe con el Interior del país respectivamente.

Fotografía 1: Vista general de los corredores cargo de INVIAS, DT Sucre.

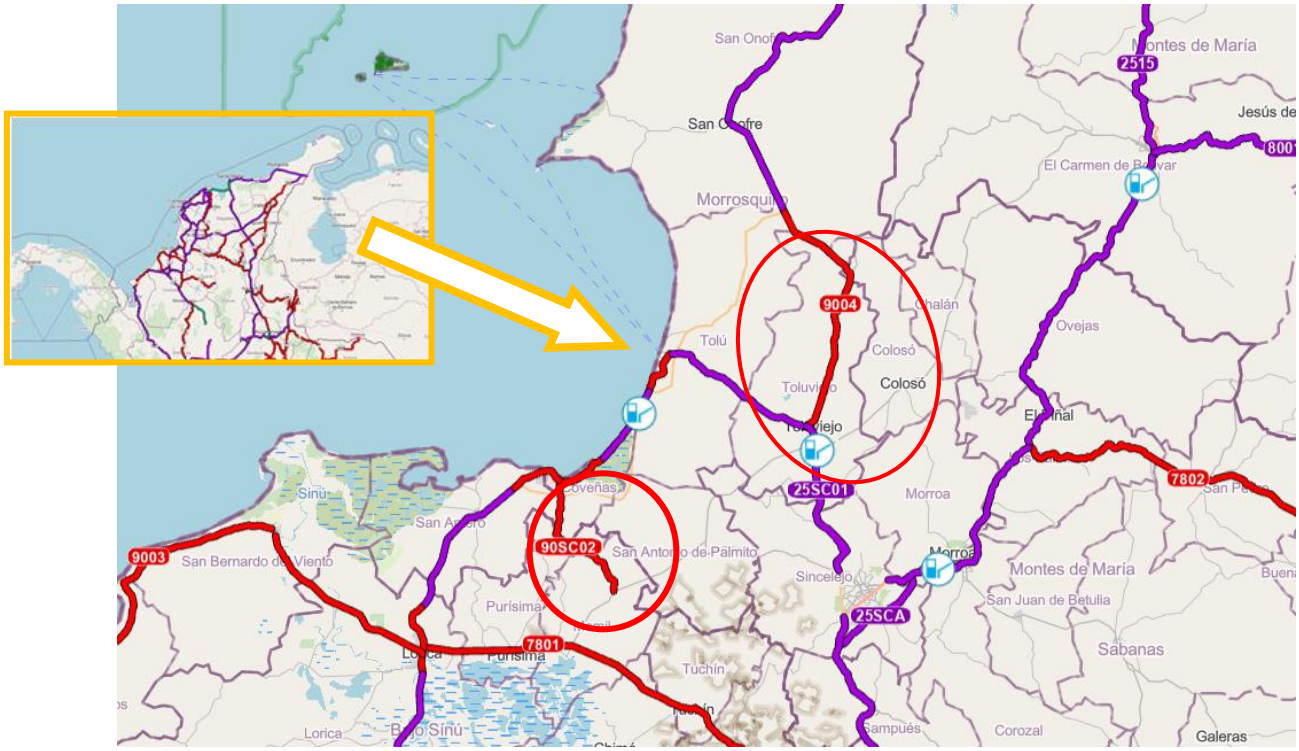


Fuente: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/

Ruta 9004

1. Transversal Caribe, sector Coveñas - San Onofre (Incluye pasos Nacionales por Toluviejo y El Pueblito), ruta vecina de importantes zonas de sector agrícola y minero, actividades de carácter doméstico y pancoger.

Fotografía 2: Vista general del corredor 9004, sector Toluviejo – San Onofre.

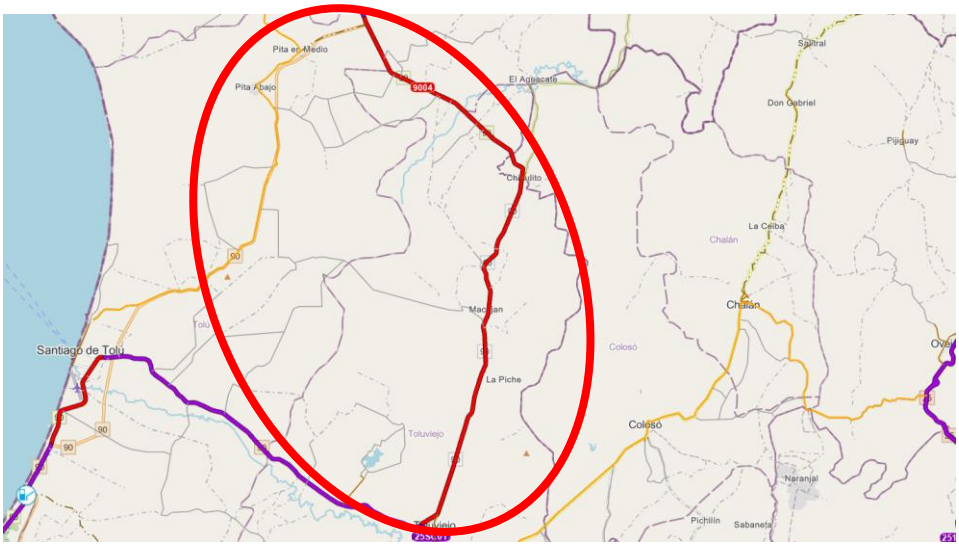

Fuente: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/

2. Transversal Caribe, sector Coveñas - San Onofre (Incluye paso por Coveñas), ruta vecina de importantes zonas de sector turístico y conexión al puerto de Tolú y bases de armadas ubicadas en Coveñas.

Fotografía 3: Vista general del corredor 9004, sector Coveñas - Tolú.




Fuente: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/

Ruta 90SC02

Alternas de la Transversal Caribe, sector Coveñas - Sabaneta, ruta vecina de importantes zonas de sector agropecuario y de conexión entre los departamentos de Córdoba y Sucre, actividades de cultivos de maíz, yuca, plátano entre otros, y actividad de ganadería.

Fotografía 4: Vista general del corredor 90SC02, ruta Coveñas – Sabaneta

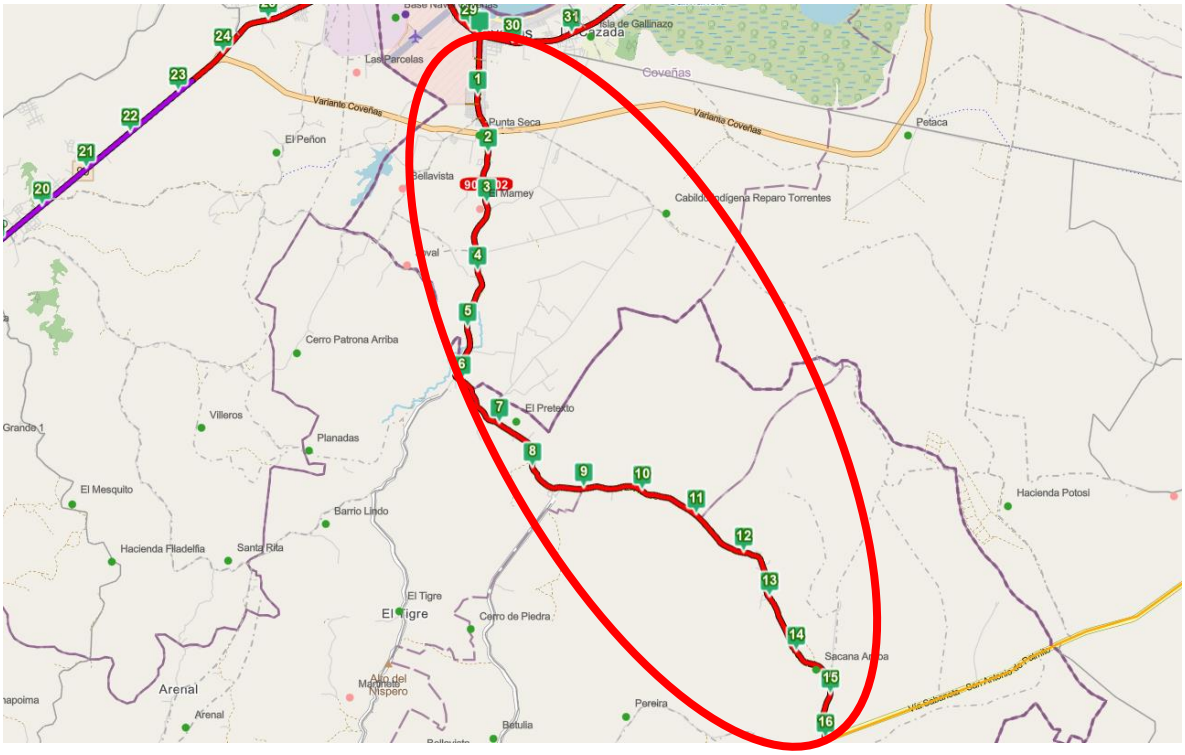

Fuente: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/

Tabla 1: Longitud en kilómetros y descripción de rutas a cargo de AMV.

CÓDIGO DE RUTA	VÍA	SECTOR	Pri	Prf	LONGITUD (Km)
9004	Lorica - San Onofre	Coveñas - San Onofre	30+0000	35+0000	**5**
9004	Lorica - San Onofre	Coveñas - San Onofre (Incluye paso por Toluviejo)	65+0937	93+0683	**27,72**
90SC02	Coveñas - Sabaneta	Coveñas - Sabaneta	0+00000	16+00000	**15,73**
				Subtotal	***48,45***

FUENTE PROPIA

2.2 ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En el marco de las actividades de la Administración vial, y los seguimientos a los corredores viales a nuestro cargo, ubicados entre los municipios de Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre en el departamento de Sucre; Momil y Purísima en el departamento de Córdoba.

Los corredores viales están divididos así:

1. Carretera Coveñas – Sabaneta, Código 90SC02, Sector Coveñas – Sabaneta. Del Pr0+0000 al Pr16+0000.

   El corredor vial, es una calzada sencilla bidireccional a lo largo del corredor, en pavimento rígido desde el Pr0+0000 a Pr01+0250 y pavimento asfáltico Pr01+0250 a Pr 16+0000.

   Para el pavimento rígido, se encuentra en buenas condiciones, es un tramo vial que se caracteriza por atravesar gran parte del perímetro urbano del municipio de Coveñas, con presencia en laterales de establecimientos comerciales, centros educativos e intersecciones.

   En el tramo con pavimento asfáltico, tenemos algunos sectores con problemas en la capa de rodadura con pérdida de agregados, como el caso del Pr03+0400, baches de menor dimensión y fisuras a lo largo del corredor.

   Se reitera la socavación en lateral izquierdo en el pontón Pr06+0150, con señalización preventiva instalada en el sitio, a esperas que se inicien actividades de recuperación de la zona, el sitio de la falla reportada, se hace continuo monitoreo en aras de evaluar el estado de esta, y así mismo alertar al Instituto de cambios significativos que puedan originar un cierre que comprometa la operatividad y funcionalidad del corredor.

   Continuando con la falla del acceso del puente el sol, Pr03+0050, donde se reportó un deterioro la falla persiste y hasta donde se ha evidenciado, hay exposición de acero de refuerzo, por el momento se le aplica material de la zona para evitar cualquier incidente. También se hace seguimiento al disipador del descole ubicado en el Pr06+0995, donde hay pérdida del elemento, que no ha aumentado hasta la fecha, pero debe ser un tema importante para atender.

   Puentes El Reparo, Pr04+0430 y puente El Mamey Pr05+0300, ambos presentan afectaciones a considerar, como exposición de acero para el primero y afectaciones en elementos de descole en el segundo, se hace monitoreo y seguimiento del avance de esta exposición para evitar avances significativos.

Existe señalización vertical y horizontal en buenas condiciones, pero con algunos tramos con deficiencias en la demarcación horizontal.

2. Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004:

Pr30+0000 al Pr35+0000 se encuentra en regular estado, el tramo en general presenta deterioro de la capa de rodadura, con fallas de tipo pulimiento, fisuras, desgaste y baches.

En los recorridos e inspecciones realizadas en el sitio, se pudo evidenciar que el Puente Amansaguapos, ubicado en el Pr30+0260, continúa con exposición de acero de refuerzo en la placa y fisuras en las vigas, se hace monitoreo al avance de esta exposición y seguimiento para mantener actualizado el estado al INVIAS.

Existen deficiencias en la señalización horizontal principalmente y la vertical en algunos tramos hay que mejorarla.

Entre el Pr65+0937 al Pr93+0683 el sector está con un deterioro considerable y progresivo, dado a la gran cantidad de fallas, hay tramos donde la circulación se reduce a la mínima velocidad dado a la cantidad de baches y daños en la calzada, y así evitar accidentes y daños en los vehículos, también obliga a la invasión.

En temas de seguridad vial, en los recorridos e inspecciones visuales realizadas por nuestros profesionales en campo, es importante mencionar la falta de señalización horizontal y mal estado de la vertical en algunos sitios, el corredor vial presenta en su longitud, algunos comunidades que son vecinas del tramo y por ende hay flujo vehicular de veredas y corregimientos de la zona que utilizan el corredor para sacar sus cosechas y para llevar insumos agrícolas, de ganadería, construcción entre otros.

En temas de puentes, existen algunas afectaciones en el Puente Macaján Pr76+0093 y Puente Chinulito Pr82+0767, que deben ser evaluadas, debido a observar algunas fisuras, desprendimiento de concreto y exposición de acero de refuerzo.

En el mes de febrero se dio inicio al contrato N° 4089-2024, que tiene por objetivo “MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS EL VIAJANO - ACHI; SABANETA – COVEÑAS; NECOCLI – ARBOLETES; LORICA – SAN ONOFRE; MOÑITOS – LORICA – CHINU EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE.”, el cual tendrá un alcance inicial de 2 kilómetros, comprendidos del PR 66+0000 al PR 68+0000.

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar la administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 1, lote 2, Carretera Coveñas – Sabaneta, Código 90SC02, Sector Coveñas – Sabaneta, PR 0+0000 – PR16+0000 y Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004, Sector Coveñas – Tolú, PR30+0000 – PR35+0000 y Sector Toluviejo – San Onofre, PR65+0937 – PR93+0683.

Dentro de las distintas funciones de tiene la Administración vial, de administrar, gestionar, planeación operativa y técnica, control y seguimiento de actividades de mantenimiento rutinario, información oportuna con respaldo de hallazgos para la atención oportuna de eventos y planteamiento de necesidades, están también las descritas en el anexo técnico del contrato.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

- Cooperativa de trabajo asociado cta. de trabajadores vial de Toluviejo "COOTRAVIAT"

CONTRATO No.:	1535 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIASA CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIASDIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES90SC02 Coveñas Sabaneta, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004COVEÑAS - TOLUPR30+0000 - PR35+0000 LOTE 4.
VALOR INICIAL:	$ 576.063.235 (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	COOTRAVIAT
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	CONCORCIO ADMINISTRADORES GAE
SUPERVISOR:	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
NIT:	901.839.178-2
ANTICIPO (20%)	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 DE JULIO DE 2026
PRORROGA N°1	N.A.
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	N.A.
ADICION N°1	N.A.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	N.A.
PORCENTAJE DE AVANCE	100%
PORCENTAJE DE AVANCE	30.7%
VALOR EJECUTADO ACTA N° 9	$ 19.977.201,83
SALDO CONTRATO	$ 399.191.721,34

Tabla 2: Información general del contrato 1535 de 2024.

- PÓLIZAS

ASEGURADORA	Nombre del Amparo	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	Póliza No
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$57.606.323,50	DESDE 03/05/2024 HASTA 31/01/2027	CRC-100018092
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$115.212.647,00	DESDE 03/05/2024 HASTA 31/07/2029	
	CALIDAD DEL SERVICIO	$172.818.970,50	DESDE 31/07/2026 HASTA 31/01/2027	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260’000.000,00	DESDE 03/05/2024 HASTA 31/07/2026	CRC-100005607

Tabla 3: Información general de las pólizas 1535 de 2024.

- ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ

CONTRATO No.:	1528 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, PR65+0937 - PR93+0683 LOTE 3.
VALOR INICIAL:	$ 1.125.982.760,00 (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024
INTERVENTOR:	CONCORCIO ADMINISTRADORES GAE
SUPERVISOR:	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
C.C.:	901.839.178-2
ANTICIPO (20%)	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 DE JULIO DE 2026
PRORROGA N°1	N.A.
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	N.A.
ADICION N°1	N.A.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	N.A.
PORCENTAJE DE AVANCE	100%
PORCENTAJE DE AVANCE	30.7%
VALOR EJECUTADO ACTA N° 8	$ 39.043.900,00
SALDO CONTRATO	$ 780.248.093,73

Tabla 4: Información general del contrato 1528 de 2024.

- PÓLIZAS

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	Póliza No
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$112.598.276.00	DESDE 03/05/2024 HASTA 31/01/2027	CRC-100018086
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$225.196.552,00	DESDE 03/05/2024 HASTA 31/07/2029	
	CALIDAD DEL SERVICIO	$337.794.828,0	DESDE 31/07/2026 HASTA 31/01/2027	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260’000.000,00	DESDE 03/05/2024 HASTA 31/07/2026	CRC-100005603

Tabla 5: Información general de las pólizas 1528 de 2024.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- **Contrato N° 1535 de 2024 (COOTRAVIAT)**

Objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, Pr0+0000 AL Pr16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU, Pr30+0000 AL Pr35+0000 LOTE 4.”

- Semana #1 del primero (01) al ocho (08) de febrero de 2025.

Entre el Pr 5+0000 al Pr 0+0000; de la carretera COVEÑAS - SABANETA, código 90SC02; se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra (Del Pr 5+0000 al Pr 0+0000)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 5+0000 al Pr 0+0000)
- ✓ Limpieza de obras (Del Pr 5+0000 al Pr 0+0000)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 5+0000 al Pr 0+0000)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 5+0000 al Pr 0+0000)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 5+0000 al Pr 0+0000)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 5+0000 al Pr 2+0000)

- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 16+0000 al Pr 0+0000, del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)

- Semana #2 del nueve (09) al quince (15) de febrero de 2025.

Entre el Pr 30+0000 y el Pr 35+0000 de la carretera LORICA – SAN ONOFRE, código 9004, se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)
- ✓ Limpieza de obras (Del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 30+0000 al Pr 31+0000 y del Pr 34+0000 al Pr 35+0000)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 16+0000 al Pr 0+0000, del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)

- Semana #3 del dieciséis (16) al veintidós (22) de febrero de 2025.

Entre el Pr 16+0000 y el Pr 11+0000 de la carretera COVEÑAS – SABANETA, código 90SC02, se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra (Del Pr 16+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 16+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Limpieza de obras (Del Pr 16+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 16+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 16+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 16+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 13+0000 al Pr 11+0000)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 16+0000 al Pr 0+0000, del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)

El día viernes 21 de febrero de 2025, se dictó en las instalaciones de la AMV, en el municipio de Tolú, la capacitación mensual a los trabajadores de mantenimiento rutinario en: Riesgo mecánico y manejo de herramientas.

- Semana #4 del veintitrés (23) al veintiocho (28) de febrero de 2025.

Entre el Pr 11+0000 y el Pr 6+0000 de la carretera COVEÑAS – SABANETA, código 90SC02, se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Limpieza de obras (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 11+0000 al Pr 6+0000)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 16+0000 al Pr 0+0000, del Pr 30+0000 al Pr 35+0000)

- **Contrato N° 1528 de 2024 (ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ)**

Objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, PR65+0937 AL PR93+0683, LOTE 3.”

- Semana #1 del primero (01) al ocho (08) de febrero de 2025.

Entre el Pr 69+0000 al Pr 76+0500 Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004, se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza de bermas (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Limpieza de obras (alcantarillas y box) (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Mantenimiento rutinario de puentes (Del Pr 70+0500 al Pr 76+0500)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 69+0000 al Pr 76+0500)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 70+0500 al Pr 72+0000 y del Pr 73+0500 al Pr 75+0000)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 65+0937 al Pr 93+0683)

- Semana #2 del nueve (09) al quince (15) de febrero de 2025.

Entre el Pr 76+0500 al Pr 84+0000 de la Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004, se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza de bermas (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Limpieza de obras (alcantarillas y box) (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Mantenimiento rutinario de puentes (Del Pr 76+0500 al Pr 81+0000 y del Pr 82+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 76+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 78+0000 al Pr 81+0000 y del Pr 82+0500 al Pr 84+0000)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 65+0937 al Pr 93+0683)

- Semana #3 del dieciséis (16) al veintidós (22) de febrero del 2025.

Entre el Pr 84+0000 al Pr 91+0500 de la Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004, se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza de bermas (Del Pr 84+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 84+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Limpieza de obras (alcantarillas y box) (Del Pr 84+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Mantenimiento rutinario de puentes (Del Pr 84+0000 al Pr 85+0500 y del Pr 87+0000 al Pr 88+0500)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 84+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 84+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 84+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 84+0000 al Pr 85+0500 y del Pr 90+0000 al Pr 91+0500)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 65+0937 al Pr 93+0683)

- Semana #4 del veintitrés (23) al veintiocho (28) de febrero de 2025.

Entre el Pr 91+0500 al Pr 93+0683 de la Carretera Lorica – San Onofre, Código 9004 y entre el Pr 65+0937 al Pr 70+0500 de la misma carretera se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza de bermas (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Limpieza de obras (alcantarillas y box) (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Mantenimiento rutinario de puentes (Del Pr 93+0000 al Pr 93+0683)
- ✓ Limpieza de calzada (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Rocería y desmonte manual (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Limpieza de señales y mojones (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0683 y del Pr 65+0937 al Pr 70+0500)
- ✓ Limpieza de defensas metálicas (Del Pr 91+0500 al Pr 93+0000 y del Pr 65+0937 al Pr 67+0500)
- ✓ Vigilancia de la vía en el tramo a cargo (Del Pr 65+0937 al Pr 93+0683)

El día viernes 21 de febrero de 2025, se dictó en las instalaciones de la AMV, en el municipio de Tolú, la capacitación mensual a los trabajadores de mantenimiento rutinario en: Riesgo mecánico y manejo de herramientas.

3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades de supervisión, seguimiento y planeación del contrato vigente de la Administración Vial, 1994 de 2024, suscrito con el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, se evalúan las tareas de desempeño al avance de los indicadores de los contratos de mantenimiento Rutinario en las rutas 9004 y 90SC02. Se ejecutan las actividades de inspección en los corredores, atención de emergencias, toma de datos para informes y reportes, acompañamiento a reuniones y visitas técnicas, levantamiento de información de accidentes entre otros pertinentes, todo ello relacionado con el tramo en jurisdicción a cargo. En estas tareas cabe mencionar que adelantan las programaciones de las actividades de mantenimiento rutinario, identificación de necesidades, seguimiento de sitios críticos entre otros.

Otro tema relevante en este contrato es la seguridad vial de nuestros usuarios y vecinos de los corredores a cargo, para garantizar seguridad, comodidad y eficiencia, por ello se adelantan inspecciones del estado de la capa de rodadura, estado de la demarcación horizontal y señales verticales y demás elementos que hacen parte del corredor.

Es importante para esta Administración Vial, todo lo que enmarque la seguridad e integridad de los usuarios de nuestros corredores viales a cargo, por ello dentro de los informes que se entregan a la Dirección Territorial Sucre, se informan de los hallazgos que se encuentran en los corredores, fallas en el pavimento, baches, fisuras, piel de cocodrilo, entre otros, también se ha informado de algunos fallos por socavación en pontones y perdidas de algunos elementos de descole.

Dentro de las actividades que competen al seguimiento, programación y evaluación de las actividades de Mantenimiento Rutinario, para el mes de enero, se hicieron las respectivas programaciones para cada cooperativa, con el fin de direccionar las actividades en el marco de tareas desempañadas para mantener un corredor óptimo, limpio y seguro.

Dentro de las actividades programadas, encontramos rocería, limpieza de cunetas, señales verticales, defensas metálicas, limpieza de obras de drenaje entre otras, tareas programadas y socializadas con cada cooperativa.

De igual forma, se hacen charlas y capacitaciones con nuestro personal SST y personal externo para temas específicos, dentro de estas charlas se abordaron temas como:

1. Riesgo mecánico y manejo de herramientas.

Dentro de estas actividades, también están el seguimiento de los elementos de protección personal, revisión de vehículos, inspección de herramientas, como también seguimiento al pago oportuno de planillas, formatos e informes de esta área.

En el presente mes, se hicieron los respectivos reportes a la DT Sucre, informando a diario del estado del clima, operación y funcionalidad de los corredores a cargo, 9004 y 90SC02. De igual forma se está al pendiente de la operatividad de los corredores mediante la vigilancia permanente con el personal de las cuadrillas y en los recorridos de inspección que se realizan por el personal de Administración Vial, para estar atentos a cualquier novedad y emergencia presentada.

Los contratos de Mantenimiento Rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Hasta la fecha la microempresa **COOTRAVIAT** presenta un avance ejecutado del 30.7% del contrato, equivalente a $176,871,513,66 de un valor total de $ 576,063,235.00. Por su parte el ingeniero **ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ** presenta un avance acumulado ejecutado del 30.7% equivalente a $345,734,666.27 de un valor total de $1,125,982,760.00 según el acta **N°10** de febrero de 2025.

La AMV continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1994 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 1 LOTE 2.
VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00 (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026.
PRORROGA N°1	N.A
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	N.A.
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISOR:	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
NIT:	901.839.178-2
ANTICIPO (20%)	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	N.A.
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	N.A.
ADICIONAL N°1	N.A.
VALOR ACTUAL	N.A
PORCENTAJE DE AVANCE	18.2%
VALOR EJECUTADO ACTA N° 9	$ 86,763,911.50
SALDO CONTRATO	$ 2,527,331,981.96

Tabla 6: Información general del contrato 1994 de 2024.

3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario. Durante las visitas rutinarias programadas se estableció contactos con las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario de cada sector a nuestro cargo.

- Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico.

- Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida.

- Seguimiento a los contratistas sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal. La microempresa COOTRAVIAT realizó sus pagos y aportes a través de la planilla 8635032978 y el contratista O.E.J.G. a través de la planilla 84485927.

- Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los contratistas.

- Control y seguimiento a los trabajos de mantenimiento rutinario que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra. De acuerdo con el formato de medición de indicadores de mantenimiento rutinario adjunto al presente informe las microempresas COOTRAVIAT y O.E.J.G cumplieron en un 100% con sus actividades de M.R.

- Recorrido y presencia diaria, nuestro personal de AMV realizan a diario recorridos de inspección en los corredores a cargo, al igual que se adelantan labores de oficina, relacionados con informes, reportes y temas administrativos del contrato.

- Capacitar a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario de las vías a nuestro cargo en temas relacionados.

- Atender todo lo relacionado al objeto contractual y lo solicitado por la Dirección Territorial Sucre.

4.3 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO
5/02/2025	57606-CE-0116	Acta No.9 enero de 2025 Contrato 1535 de 2024
5/02/2025	57606-CE-0117	Acta No.9 enero de 2025 Contrato 1528 de 2024
6/02/2025	57606-CE-0118	Robo de Defensas Metálicas PR 90+0980, ruta 9004.
19/02/2025	57606-CE-0119	Autorización para trámite de Aprovechamiento Forestal ante la Corporación Autónoma Regional De Sucre (CAR-SUCRE).
19/02/2025	57606-CE-0120	Acta No.8 enero de 2025 Contrato 1994 de 2024
24/02/2025	57606-CE-0121	Entrega de Informe de AMV y área SST, periodo de enero de 2025.
24/02/2025	57606-CE-0122	Envío Informe Ornato y Embellecimiento enero de 2025.
25/02/2025	57606-CE-0123	Reporte sitio critico Puente El Sol, PR 3+0050 Ruta 90SC02
27/02/2025	57606-CE-0124	Aprobación Especialista Ambiental 2

Tabla 7: Información de correspondencia enviada, mes de febrero.

RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
FECHA	N° RADICADO	ASUNTO
4/02/2025	Correo	Solicitud de FACTURA Contrato 1994-2024_CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
4/02/2025	2025I-VBOG-002198	REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV
5/02/2025	Correo	Solicitud de Respuesta ALCALDIA DE SANTIAGO DE TOLU
6/02/2025	Correo	CONVOCATORIA PRIMERA SESIÓN COMITÉ LOCAL DE SEGURID
6/02/2025	2025I-VBOG-006018	Solicitud información para estructuración proceso selección obras de señalización y seguridad vial - Zona Norte
7/02/2025	Correo	Reunión cierre vía 9004 -Ampliación Aeropuerto Golfo de Morisquillo Convenio 29…
7/02/2025	Correo	CONVOCATORIA PRIMERA SESIÓN COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD VIAL
10/02/2025	Correo	CONVOCATORIA PRIMERA SESIÓN COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD VIAL
11/02/2025	Correo	57606-CE-0118 Robo de Defensas Metálicas PR 90+0980, ruta 9004

14/02/2025	Correo	CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ LOCAL SEGURIDAD VIAL
17/02/2025	Correo	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO_TOMA DE COORDENADAS TRAMOS DT SUCRE_
17/02/2025	Correo	Solicitud de visita técnica al sector intervenido por la empresa COMPAS. PR 43+869
18/02/2025	Correo	TRASLADO POR COMPETENCIAS
18/02/2025	Correo	CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ LOCAL SEGURIDAD VIAL
19/02/2025	Correo	2025-02-13 CIRCULAR INVITACION PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA CLSV VIGENCIA 2025
24/02/2025	Correo	Oficio apoyo plan Basura O Tolú
25/02/2025	2025S-VSUC-011163	Respuesta a oficio 57606-CE-0119
27/02/2025	2025S-VSUC-011779	Solicitud de poda exprés árbol Pr 69+800 Ruta 9004 Toluviejo-San Onofre
28/02/2025	Correo	DERECHO PETICION EDEL BELLO CASTILLO

Tabla 8: Información de correspondencia recibida, mes de febrero.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En las actividades de la Administración Vial, se han adelantado todo lo relacionado con las obligaciones contractuales que ameritan, desde los requerimientos por parte de la DT, hasta los compromisos administrativos que dieran a lugar.


- Las cooperativas COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO “COOTRAVIAT” Y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ cumplieron satisfactoriamente las actividades programadas presentando un rendimiento equilibrado de acuerdo a la programación, ajustada a lo que se establece en la misma, sin presentarse percance alguno en la libre realización de las actividades programadas y atendiendo de manera oportuna el accionar de las precipitaciones dadas en este periodo y accidentalidad o información de actividades no permitidas en inmediaciones a las vías a cargo; no obstante, la Interventoría ha formulado a los Contratistas de mantenimiento rutinario, las siguientes recomendaciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo del proyecto: garantizar la señalización en cada uno de los sectores intervenidos, garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente, enviar soporte fotográfico por cada indicador contratado y/o cualquier novedad recurrente en la vía.

- Se han realizado las inspecciones a los corredores, reportes y toma de información en aras de mantener actualizado el estado de estos, lo cual se traduce en el envío de información detallada al Invias.

- Se hace seguimiento a los posibles casos de invasión de faja de reserva en las vías y adelantar los trámites respectivos desde la DT Sucre y darle alcance desde los entes territoriales encargados de este tema, de igual forma se tramitan las solicitudes en temas de accidentalidad en los tramos correspondientes, aunque la recolección de esta información es algo lenta y casi no existen reportes suministrados por las entidades encargadas, para el mes de noviembre.

- En el mes de febrero se adelantaron como es de costumbre las actividades de mantenimiento rutinario evaluados según la programación previamente enviada a las cooperativas.

- Las charlas desde el área SST, han sido muy importantes ya que llevó a cabo visitas de inspección rutinaria en todos los frentes de trabajo, detectando uso parcial de: botas de seguridad y ropa de dotación, por ello, toda vez ocurrida esta No Conformidad, fueron elevados llamados de atención verbal al área correspondiente, recomendando a continuación, realizar labores de supervisión respecto al uso adecuado de los elementos de protección personal, con la intención de orientar a miembros del cuerpo de trabajo contratista que por descuido u omisión no portaban debidamente los EPP y ropa de dotación. Finalmente, la identificación constante de peligros y valoración de los riesgos es una actividad que se debe realizar de manera continua, desde el inicio hasta la finalización del proyecto, esto así, debido a que los riesgos pueden ser cambiantes y/o variables en el desarrollo de las actividades. Para este mes no se presentaron nuevos hallazgos ni accidentes de trabajo.



EDWIN FONSECA SALAMANCA
Ingeniero Residente A.M.V. G-01 DT SUC
Consorcio Administradores GAE.

5. ANEXOS

6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

COOTRAVIAT



SEMANA 1: SEMANA DEL PRIMERO (01) DE FEBRERO AL NUEVE (09) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 1. Pr 4+0250, Limpieza de puentes.	*Imagen 2. Pr 3+0020, Roceria.*
	
Imagen 3. Pr 1+0400, Limpieza de cunetas.	*Imagen 4.Pr 0+0350, Limpieza de cunetas.*

SEMANA 2: SEMANA DEL DIEZ (10) DE FEBRERO AL DIECISEIS (16) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 5. Pr 30+0100, Roceria.	*Imagen 6. Pr 33+0850, Lavando señales verticales.*
	
magen 7. Pr 33+0850, Limpieza de boxculvert y alcantarilla	*Imagen 8. Pr 33+0700, Enderezando señales verticales.*



SEMANA 3: SEMANA DEL DIECISIETE (17) DE FEBRERO AL VEINTITRES (23) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 9. Pr 15+0050, Limíeza de cunetas.	*Imagen 10. Pr 14+0400, Roceria.*
	
Imagen 11. Pr 13+0400, Limpieza de boxculvert.	*Imagen 12. Oficinas AMV, Capacitacion.*


SEMANA 4: SEMANA DEL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 13. Pr 11+0200, Roceria.	*Imagen 14. Pr 09+0250, Limpieza de calzada y defensas.*
	
15. Pr 2+0350, Atencion por fueretes lluvias, limpieza de c	*Imagen 16. Pr 9+0800 , Limpieza de cunetas.*

ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ

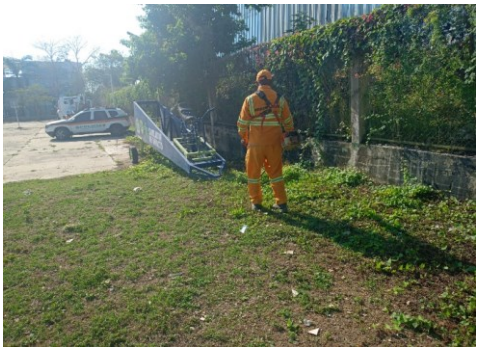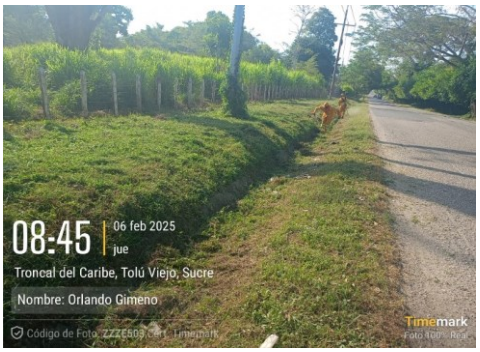SEMANA 1: SEMANA DEL PRIMERO (01) DE FEBRERO AL NUEVE (09) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 1. DT SUCRE, Roceria y limpieza de instalaciones.	*Imagen 2. Pr 7+0370, Limpieza de defensas metalicas.*
	
Imagen 3. Pr 75+0000, Limpieza de cunetas.	*Imagen 4. Pr 75+0000, Roceria.*

SEMANA 2: SEMANA DEL DIEZ (10) DE FEBRERO AL DIECISEIS (16) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 5. Pr 77+0600, Limpieza de boxculvert.	*Imagen 6.Pr 79+0450, Pintura a postes de referencia.*
	
Imagen 7.Pr 81+0050, Limpieza de cunetas.	*Imagen 8. Pr 83+0400, Limpieza de alcantarilla.*

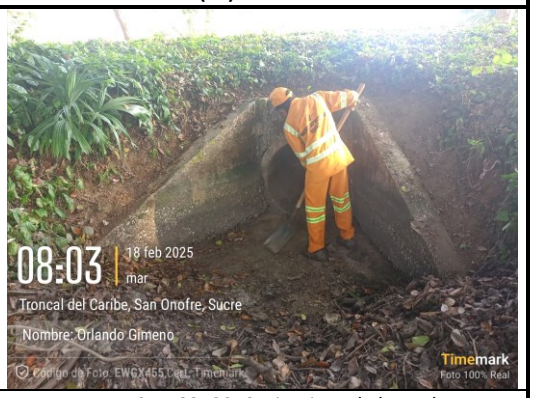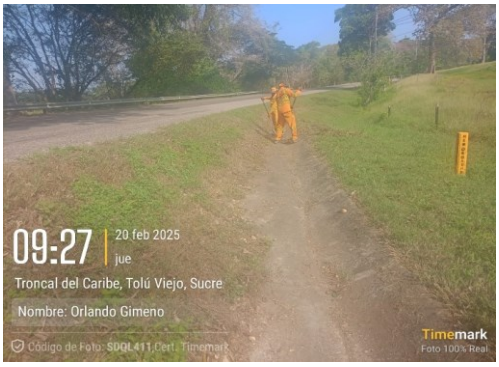SEMANA 3: SEMANA DEL DIECISIETE (17) DE FEBRERO AL VEINTITRES (23) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 9. Pr82+0800, Limpieza de señales.	*Imagen 10. Pr89+0050, Limpieza de boxculvert.*
	
Imagen 11. Pr 78+0300, Limpieza de cunetas.	*Imagen 12. Oficina AMV, Capacitacion mensual.*

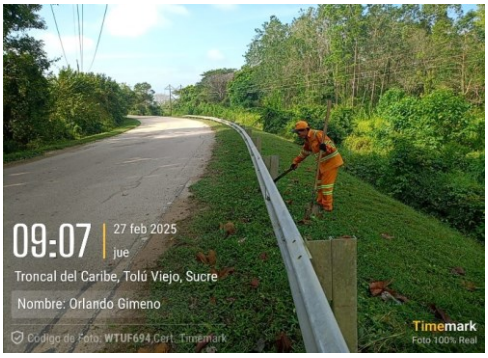SEMANA 4: SEMANA DEL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DEL 2025	
	
Imagen 13. Pr 67+0800, Limpieza de señales.	*Imagen 14. Pr 68+0000, Roceria.*
	
Imagen 15. Pr 70+0250, Limpieza de boxculvert.	*Imagen 16. Pr 71+0550, Roceria y limpieza de defensas.*

6.2 PROGRAMACION DEL MES DE FEBRERO 2025

COOTRAVIAT

OBRA PROGRAMADA COOTRAVIAT
01 DE FEBRERO DE 2025 - 28 DE FEBRERO DE 2025

FECHA		PR		ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (CÓDIGO)														
		INICIAL	FINAL	229 (m3)	340 (m)	425 (m)	434 (m)	497 (U)	515 (U)	545 (m)	547 (m)	625 (m3)	630 (m2)	636 (Ha)	639 (U)	678 (U)	686 (m)	694 (Gl)
1/02/2024	S																	
2/02/2024	D																	
3/02/2024	L	4+0000	5+0000		0	0	40	4	1				10,200	1.05		18	0	
4/02/2024	M	3+0000	4+0000		0	0	20	2	1				10,200	1.05		13	0	
5/02/2024	C	2+0000	3+0000		0	0	10	1	0				10,200	1.05		23	83	
6/02/2024	J	1+0000	2+0000		0	0	20	2	0				10,200	1.05		10	0	
7/02/2024	V	+0	1+0000		0	0	40	4	0				10,200	1.05		27	64	
8/02/2024	S																	
9/02/2024	D																	
10/02/2024	L	30+0000	31+0000		0	0	10	1	1				10,200	1.05		7	0	
11/02/2024	M	31+0000	32+0000		0	0	40	4	0				10,200	1.20		12	205	
12/02/2024	C	32+0000	33+0000		0	0	10	1	0				11,900	1.34		7	0	
13/02/2024	J	33+0000	34+0000		0	0	60	6	0				12,578	1.34		21	0	
14/02/2024	V	34+0000	35+0000		0	0	60	6	0				12,578	1.34		21	0	
15/02/2024	S																	
16/02/2024	D																	
17/02/2024	L	15+0000	16+0000		0	1005	0	0	0				6,750	0.90		12	0	
18/02/2024	M	14+0000	15+0000		0	1006	40	4	0				6,750	0.90		13	0	
19/02/2024	C	13+0000	14+0000		0	1006	40	4	0				6,750	0.90		13	0	
20/02/2024	J	12+0000	13+0000		0	1257	40	4	0				6,750	0.90		12	103	
21/02/2024	V	11+0000	12+0000		0	1257	40	4	0				6,750	0.90		12	103	
22/02/2024	S																	
23/02/2024	D																	
24/02/2024	L	10+0000	11+0000		0	1110	10	1	0				8,250	0.90		21	118	
25/02/2024	M	9+0000	10+0000		0	1463	30	3	0				9,000	0.90		24	118	
26/02/2024	C	8+0000	9+0000		0	1464	40	4	0				9,000	0.90		31	265	
27/02/2024	J	7+0000	8+0000		0	1358	20	2	0				9,000	0.90		28	199	
28/02/2024	V	6+0000	7+0000		0	1359	10	1	0				9,000	0.90		29	0	

CONVENCIONES	
	FESTIVO
	VIGILANCIA *
	LIMPIEZA ***

CÓDIGO	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD
	A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS	
229	BACHEO	m3
	D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS	
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m
	F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)	
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VIA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	H. PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

NOTAS	
*	VIGILANCIA TODOS LOS DIAS Y DE TODA LA CARRETERA
**	DISPONIBILIDAD DE ATENCION ANTE CUALQUIER EMERGENCIA LOS FINES DE SEMANA
***	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

EDWIN FONSECA SALAMANCA
ING. RESIDENTE A.M.V. G-01 DT SUC

FRED GARCIA
COORDINADOR DE CAMPO - COOTRAVIAT

ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ

OBRA PROGRAMADA ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ
01 DE FEBRERO DE 2025 - 28 DE FEBRERO DE 2025

FECHA		PR		ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (CÓDIGO)														
		INICIAL	FINAL	229 (m3)	340 (m)	425 (m)	434 (m)	497 (U)	515 (U)	545 (m)	547 (m)	625 (m3)	630 (m2)	636 (Ha)	639 (U)	678 (U)	686 (m)	694 (Gl)
1/02/2024	S																	
2/02/2024	D																	
3/02/2024	L	69+0000	70+0500		3000	50	70	7	0				10,800	2.40		11	0	
4/02/2024	M	70+0500	72+0000		3000	756	70	7	1				10,800	2.40		13	0	
5/02/2024	C	72+0000	73+0500		3000	756	60	6	1				10,800	2.40		15	0	
6/02/2024	J	73+0500	75+0000		3000	1746	100	10	2				10,800	2.70		15	0	
7/02/2024	V	75+0000	76+0500		3000	677	80	8	2				10,800	2.70		22	0	
8/02/2024	S																	
9/02/2024	D																	
10/02/2024	L	76+0500	78+0000		3000	678	50	5	1				10,800	2.70		21	0	
11/02/2024	M	78+0000	79+0500		3000	636	60	6	1				10,800	2.70		15	125	
12/02/2024	C	79+0500	81+0000		3000	637	30	3	1				10,800	2.70		19	28	
13/02/2024	J	81+0000	82+0500		3000	319	120	12	0				10,800	2.4		11	0	
14/02/2024	V	82+0500	84+0000		3000	0	60	6	1				10,800	2.40		25	193	
15/02/2024	S																	
16/02/2024	D																	
17/02/2024	L	84+0000	85+0500		3000	0	40	4	1				10,800	2.40		11	69	
18/02/2024	M	85+0500	87+0000		3000	0	70	7	0				10,800	3.00		19	0	
19/02/2024	C	87+0000	88+0500		3000	0	70	7	1				10,800	3.00		13	0	
20/02/2024	J	88+0500	90+0000		3000	0	40	4	0				10,800	3.00		9	0	
21/02/2024	V	90+0000	91+0500		3000	0	40	4	1				10,800	3.00		7	186	
22/02/2024	S																	
23/02/2024	D																	
24/02/2024	L	91+0500	93+0000		3000	0	80	8	0				10,800	3.00		13	182	
25/02/2024	M	93+0000	93+0683		1366	1366	30	3	1				4,918	1.37		13	0	
26/02/2024	C	65+0937	67+0500		3126	0	40	4	0				11,254	1.88		27	262	
27/02/2024	J	67+0500	69+0000		3000	0	60	6	0				10,800	2.40		11	0	
28/02/2024	V	69+0000	70+0500		3000	50	70	7	0				10,800	2.40		11	0	

CÓDIGO	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD
	A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS	
229	BACHEO	m3
	D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS	
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m
	F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)	
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	H. PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

CONVENCIONES	
	FESTIVO
	VIGILANCIA *

NOTAS	
*	VIGILANCIA TODOS LOS DIAS Y DE TODA LA CARRETERA
**	DISPONIBILIDAD DE ATENCION ANTE CUALQUIER EMERGENCIA LOS FINES DE SEMANA

EDWIN FONSECA SALAMANCA
ING. RESIDENTE A.M.V. G-01 DT SUC

Javier Florez

JAVIER FLOREZ
COORDINADOR DE CAMPO - ORLANDO JIMENO GÓMEZ

6.3 FORMATO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO FEBRERO 2025

COOTRAVIAT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: COOTRAVIAT
CONTRATO N° N° 1535 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG (KM)	CANT. (HA)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.					
5+0000	6+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
4+0000	5+0000	2.80	2.75	1.00	0.56	5	0.11	
3+0000	4+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
2+0000	3+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
1+0000	2+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
+0	1+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
30+0000	31+0000	4.00	3.83	1.00	0.78	5	0.16	
31+0000	32+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
32+0000	33+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
33+0000	34+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
34+0000	35+0000	0.00	0.00	1.00	0.00	5	0.00	
15+0000	16+0000	4.00	3.83	1.00	0.78	5	0.16	
14+0000	15+0000	2.45	2.05	1.00	0.45	5	0.09	
13+0000	14+0000	2.45	2.05	1.00	0.45	5	0.09	
12+0000	13+0000	1.55	3.35	1.00	0.49	5	0.10	
11+0000	12+0000	2.20	1.88	1.00	0.41	5	0.08	
10+0000	11+0000	2.20	1.88	1.00	0.41	5	0.08	
9+0000	10+0000	2.10	1.95	1.00	0.41	5	0.08	
8+0000	9+0000	2.60	2.50	1.00	0.51	5	0.10	
7+0000	8+0000	2.60	2.50	1.00	0.51	5	0.10	
6+0000	7+0000	2.20	2.50	1.00	0.47	5	0.09	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
5+0000	6+0000	X		V	1,464	3	488.00	
4+0000	5+0000	X		V	1,464	3	488.00	
3+0000	4+0000	X		V	1,000	3	333.33	
2+0000	3+0000	X		V	1,000	3	333.33	
1+0000	2+0000	X		V	1,359	3	453.00	
+0	1+0000	X		V	1,000	3	333.33	
15+0000	16+0000	X		V	1,005	3	335.00	
14+0000	15+0000	X		V	1,006	3	335.33	
13+0000	14+0000	X		V	1,006	3	335.33	
12+0000	13+0000	X		V	1,256	3	418.67	
11+0000	12+0000	X		V	1,257	3	419.00	
10+0000	11+0000	X		V	1,257	3	419.00	
9+0000	10+0000	X		V	1,109	3	369.67	
8+0000	9+0000	X		V	1,110	3	370.00	
7+0000	8+0000	X		V	1,110	3	370.00	
6+0000	7+0000	X		V	1,463	3	487.67	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
-	-		-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
5+0000	6+0000	4	20	20	3	1.33	
4+0000	5+0000	4	20	20	3	1.33	
3+0000	4+0000	2	10	10	3	0.67	
2+0000	3+0000	1	5	5	3	0.33	
1+0000	2+0000	1	5	5	3	0.33	
+0	1+0000	0	0	0	3	0.00	
30+0000	31+0000	0	0	0	3	0.00	
31+0000	32+0000	4	20	20	3	1.33	
32+0000	33+0000	2	10	10	3	0.67	
33+0000	34+0000	2	10	10	3	0.67	
34+0000	35+0000	1	5	5	3	0.33	
15+0000	16+0000	0	0	0	3	0.00	
14+0000	15+0000	4	20	20	3	1.33	
13+0000	14+0000	4	20	20	3	1.33	
12+0000	13+0000	4	20	20	3	1.33	
11+0000	12+0000	4	20	20	3	1.33	
10+0000	11+0000	4	0	20	3	1.33	
9+0000	10+0000	4	20	20	3	1.33	
8+0000	9+0000	1	5	5	3	0.33	
7+0000	8+0000	1	5	5	3	0.33	
6+0000	7+0000	3	15	15	3	1.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: COOTRAVIAT
CONTRATO N° N° 1535 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	UNIDAD (U)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
6+0150	PONTÓN N°1	1.00	3	0.33	
5+0300	EL MAMEY	1.00	3	0.33	
4+0430	EL REPARO	1.00	3	0.33	
3+0050	EL SOL	1.00	3	0.33	
30+0263	AMANSAGUAPOS	1.00	3	0.33	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
5+0000	6+0000	31	2	15.50	
4+0000	5+0000	31	2	15.50	
3+0000	4+0000	28	2	14.00	
2+0000	3+0000	29	2	14.50	
1+0000	2+0000	29	2	14.50	
+0	1+0000	28	2	14.00	
30+0000	31+0000	12	2	6.00	
31+0000	32+0000	18	2	9.00	
32+0000	33+0000	13	2	6.50	
33+0000	34+0000	13	2	6.50	
34+0000	35+0000	23	2	11.50	
15+0000	16+0000	12	2	6.00	
14+0000	15+0000	13	2	6.50	
13+0000	14+0000	13	2	6.50	
12+0000	13+0000	17	2	8.50	
11+0000	12+0000	12	2	6.00	
10+0000	11+0000	12	2	6.00	
9+0000	10+0000	28	2	14.00	
8+0000	9+0000	21	2	10.50	
7+0000	8+0000	21			
6+0000	7+0000	24	2	12.00	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CÓDIGO 90SC02, PR0+0000 - PR16+0000
CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR30+0000 - PR35+0000,

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
11+000	12+000	95	2	47.50	
10+0000	11+0000	95	2	47.50	
6+0000	7+0000	265	2	132.50	
8+0000	9+0000	118	2	59.00	
7+0000	8+0000	118	2	59.00	
6+0000	7+0000	265	2	132.50	
3+0000	4+0000	199	2	99.50	
30+000	31+000	95	2	47.50	
34+000	35+000	95	2	47.50	
13+000	14+000	95	2	47.50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: COOTRAVIAT
CONTRATO N° N° 1535 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	6.22	4.0	1.56	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	18,866	3.0	6,288.67	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	0	1.0	0.00	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	50	3.0	16.67	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	5.00	3.0	1.67	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	428	2.0	214.00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1,440	2.0	720.00	100%

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRAVIAT CUMPLIO CON LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA EL MES DE FEBRERO DE 2025

V.B.

FIRMA:
RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
R.L. COOTRAVIAT

ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ
CONTRATO N°: 1528 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
69+0000	70+0500	6.00	5.00	1.50	1.65	4	0.41	
70+0500	72+0000	7.10	7.10	1.50	2.13	4	0.53	
72+0000	73+0500	6.50	7.00	1.50	2.03	4	0.51	
73+0500	75+0000	5.00	6.00	1.50	1.65	4	0.41	
75+0000	76+0500	6.00	6.20	1.50	1.83	4	0.46	
76+0500	78+0000	5.80	5.00	1.50	1.62	4	0.41	
78+0000	79+0500	5.00	7.00	1.50	1.80	4	0.45	
79+0500	81+0000	6.70	6.40	1.50	1.97	4	0.49	
81+0000	82+0500	6.00	7.10	1.50	1.97	4	0.49	
82+0500	84+0000	8.00	5.00	1.50	1.95	4	0.49	
84+0000	85+0500	6.00	7.20	1.50	1.98	4	0.50	
85+0500	87+0000	6.00	7.00	1.50	1.95	4	0.49	
87+0000	88+0500	8.00	6.00	1.50	2.10	4	0.53	
88+0500	90+0000	8.00	6.00	1.50	2.10	4	0.53	
90+0000	91+0500	7.00	8.00	1.50	2.25	4	0.56	
91+0500	93+0000	6.40	6.00	1.50	1.86	4	0.47	
93+0000	93+0683	5.00	6.00	0.68	0.75	4	0.19	
65+0937	67+0500	4.10	4.00	1.56	1.27	4	0.32	
67+0500	69+0000	5.30	4.40	1.50	1.46	4	0.36	
69+0000	70+0500	6.00	5.00	1.50	1.65	4	0.41	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
70+0500	72+0000	X		TRIANGULAR	756	3	252.00	
72+0000	73+0500	X		TRIANGULAR	756	3	252.00	
75+0000	76+0500	X		TRIANGULAR	677	3	225.67	
76+0500	78+0000	X		TRIANGULAR	678	3	226.00	
78+0000	79+0500	X		TRIANGULAR	636	3	212.00	
79+0500	81+0000	X		TRIANGULAR	637	3	212.33	
81+0000	82+0500	X		TRIANGULAR	319	3	106.33	
93+0000	93+0683	X		TRIANGULAR	1,366	3	455.33	
69+0000	70+0500	X		TRIANGULAR	50	3	16.67	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
69+0000	70+0500	X		-	3,000	2	1500	
70+0500	72+0000	X		-	3,000	2	1500	
72+0000	73+0500	X		-	3,000	2	1500	
73+0500	75+0000	X		-	3,000	2	1500	
75+0000	76+0500	X		-	3,000	2	1500	
76+0500	78+0000	X		-	3,000	2	1500	
78+0000	79+0500	X		-	3,000	2	1500	
79+0500	81+0000	X		-	3,000	2	1500	
81+0000	82+0500	X		-	3,000	2	1500	
82+0500	84+0000	X		-	3,000	2	1500	
84+0000	85+0500	X		-	3,000	2	1500	
85+0500	87+0000	X		-	3,000	2	1500	
87+0000	88+0500	X		-	3,000	2	1500	
88+0500	90+0000	X		-	3,000	2	1500	
90+0000	91+0500	X		-	3,000	2	1500	
91+0500	93+0000	X		-	3,000	2	1500	
93+0000	93+0683	X		-	1,366	2	683	
65+0937	67+0500	X		-	3,126	2	1563	
67+0500	69+0000	X			3,000	2	1500	
69+0000	70+0500	X			3,000	2	1500	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ
CONTRATO N°: 1528 - 2024

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
69+0000	70+0500	7	35	35	3	2.33	
70+0500	72+0000	7	35	35	3	2.33	
72+0000	73+0500	6	30	30	3	2.00	
73+0500	75+0000	10	50	50	3	3.33	
75+0000	76+0500	8	40	40	3	2.67	
76+0500	78+0000	5	25	25	3	1.67	
78+0000	79+0500	6	30	30	3	2.00	
79+0500	81+0000	3	15	15	3	1.00	
81+0000	82+0500	12	60	60	3	4.00	
82+0500	84+0000	6	30	30	3	2.00	
84+0000	85+0500	10	50	50	3	3.33	
85+0500	87+0000	7	35	35	3	2.33	
87+0000	88+0500	7	35	35	3	2.33	
88+0500	90+0000	4	20	20	3	1.33	
90+0000	91+0500	4	20	20	3	1.33	
91+0500	93+0000	8	40	40	3	2.67	
93+0000	93+0683	3	15	15	3	1.00	
65+0937	67+0500	4	20	20	3	1.33	
67+0500	69+0000	6	30	30	3	2.00	
69+0000	70+0500	7	35	35	3	2.33	

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	UNIDAD (U)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
75+0110	PONTÓN N°4	1.00	3	0.33	
76+0093	MACAJAN	1.00	3	0.33	
76+0754	CAMARÓN	1.00	3	0.33	
79+0415	EL BOBO	1.00	3	0.33	
80+0816	MERMEJA	1.00	3	0.33	
82+0767	CHINULITO	1.00	3	0.33	
84+0210	CAMARON	1.00	3	0.33	
87+0150	PALENQUILLO	1.00	3	0.33	
91+0106	ARROYO LAS MELENAS	1.00	3	0.33	
93+0050	PITA BAJO	1.00	3	0.33	
71+0570	ARROYO SECO	1.00	3	0.33	
73+0148	MACUMBA	1.00	3	0.33	
74+0470	PONTÓN N°2	1.00	3	0.33	
74+0780	PONTÓN N°3	1.00	3	0.33	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ
CONTRATO N°: 1528 - 2024

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)			
69+0000	70+0500	11	2	5.50	
70+0500	72+0000	13	2	6.50	
72+0000	73+0500	15	2	7.50	
73+0500	75+0000	15	2	7.50	
75+0000	76+0500	18	2	9.00	
76+0500	78+0000	5	2	2.50	
78+0000	79+0500	15	2	7.50	
79+0500	81+0000	15	2	7.50	
81+0000	82+0500	11	2	5.50	
82+0500	84+0000	20	2	10.00	
84+0000	85+0500	15	2	7.50	
85+0500	87+0000	19	2	9.50	
87+0000	88+0500	13	2	6.50	
88+0500	90+0000	9	2	4.50	
90+0000	91+0500	7	2	3.50	
91+0500	93+0000	13	2	6.50	
93+0000	93+0683	13	2	6.50	
65+0937	67+0500	20	2	10.00	
67+0500	69+0000	11	2	5.50	
69+0000	70+0500	11	2	5.50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(ML)			
78+0000	79+0500	125	2	62.50	
79+0500	81+0000	28	2	96.50	
82+0500	84+0000	193	2	34.50	
84+0000	85+0500	69	2	93.00	
90+0000	91+0500	186	2	91.00	
91+0500	93+0000	182	2	91.00	
65+0937	67+0500	262	2	131.00	

9. ACTIVIDAD: **PODA DE ARBOLES**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR	CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

10. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CALZADA**

VÍA: CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, PR65+0937 - PR93+0683

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(M2)			
69+0000	70+0500	10,800	2	5,400.00	
70+0500	72+0000	10,800	2	5,400.00	
72+0000	73+0500	10,800	2	5,400.00	
73+0500	75+0000	10,800	2	5,400.00	
75+0000	76+0500	10,800	2	5,400.00	
76+0500	78+0000	10,800	2	5,400.00	
78+0000	79+0500	10,800	2	5,400.00	
79+0500	81+0000	10,800	2	5,400.00	
81+0000	82+0500	10,800	2	5,400.00	
82+0500	84+0000	10,800	2	5,400.00	
84+0000	85+0500	10,800	2	5,400.00	
85+0500	87+0000	10,800	2	5,400.00	
87+0000	88+0500	10,800	2	5,400.00	
88+0500	90+0000	10,800	2	5,400.00	
90+0000	91+0500	10,800	2	5,400.00	
91+0500	93+0000	10,800	2	5,400.00	
93+0000	93+0683	4,918	2	2,458.80	
65+0937	67+0500	11,254	2	5,626.80	
67+0500	69+0000	10,800	2	5,400.00	
69+0000	70+0500	10,800	2	5,400.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ
CONTRATO N°: 1528 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	35.95	4.0	8.99	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	5,875	3.0	1,958.33	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	58,492	2.0	29,246.00	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	130	3.0	43.33	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	14.00	3.0	4.67	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	269	2.0	134.50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1,045	2.0	522.50	100%
9	PODA DE ARBOLES	-	U	-	-	-	-
10	LIMPIEZA DE CALZADA	DIARIA	M2	210,571	2	105285.6	100%

OBSERVACIONES
LA EMPRESA O.E.J.G. CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VIA A CARGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025

V.B.

FIRMA: Javier Florez

JAVIER FLOREZ
Coordinador de Campo de ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ

6.4 FORMATO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION SEMANAL FEBRERO 2025

COOTRAVIAT

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

CONTRATO 1994 DE 2024	OBJETO: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 1 - LOTE 2"

CONTRATO DE OBRA No. 1535 - 2024	**SECTOR:**	Coveñas - Sabaneta, Ruta 90SC02 / Coveñas - San Onofre, Ruta 9004							**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1994-2024**
CONTRATISTA: COOTRAVIAT	**CUADRILLA:**	COOTRAVIAT							
	TRAMO:	PR 0+0000 - PR 16+0000, RUTA 90SC02 / Pr 30+0000 - Pr 35+0000, RUTA 9004							**CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE**
	KM-SECTOR (ES) :	20.73	SEMANA No.	1	2	3	4	5	
	No. DÍAS/MES: FEBRERO	28	No. DÍAS	2	7	7	7	5	ADMINISTRADOR VIAL: EDWIN FONSECA SALAMANCA

6

INDICADOR				SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS			CUMPLIMIENTO
ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL		PR INICIAL	PR FINAL	PROGRAMADO (Km.)	PR INICIAL	PR FINAL	EJECUTADO (Km.)	
1	229	Bacheo (vía pavimentada)	m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Bacheo (vía pavimentada)							
4	340 - 380	Limpieza bermas	ml	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Limpieza bermas	30+000	35+000	5	30+000	35+000	5	CUMPLE
5	425	Limpieza de Cunetas	ml	+	+	5+000	0+000	+	+	16+000	11+000	11+000	6+000	Limpieza de Cunetas	0+000	16+000	15.73	0+000	16+000	15.73	CUMPLE
7	434	Limp. de Encoles y Descoles	ml	+	+	5+000	0+000	30+000	35+000	16+000	11+000	11+000	6+000	Limp. de Encoles y Descoles							
8	497	Limp. Obras de Arte	un	+	+	5+000	0+000	30+000	35+000	16+000	11+000	11+000	6+000	Limp. Obras de Arte	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	CUMPLE
9	498	Limp. (zanjas , canales)	ml	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Limp. (zanjas , canales)							
10	515	Limpieza de Puentes y Pontones	un	+	+	5+000	3+000	30+000	31+000	+	+	+	+	Limpieza de Puentes y Pontones	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	CUMPLE
13	548	Limp. y pintura barandas	ml	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Limp. y pintura barandas							
14	625	Despeje de derrumbes	m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Despeje de derrumbes							
15	625	Limp. de Calzada	m2	+	+	5+000	0+000	30+000	35+000	16+000	11+000	11+000	6+000	Limp. de Calzada	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	CUMPLE
16	636	Rocería	m2	+	+	5+000	0+000	30+000	35+000	16+000	11+000	11+000	6+000	Rocería	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	CUMPLE
17	639	Poda y/o retiro de árboles	un	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Poda y/o retiro de árboles							
22	678	Limpieza de Señales y Mojones	un	+	+	5+000	0+000	30+000	35+000	16+000	11+000	11+000	6+000	Limpieza de Señales y Mojones	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	CUMPLE
23	686	Limpieza de Defensas	ml	+	+	5+000	2+000	30+000 34+0000	31+000 35+000	14+000	11+000	11+000	6+000	Limpieza de Defensas							
24	694	Vigilancia de la vía	km	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	Vigilancia de la vía	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	0+0000 30+0000	16+0000 35+0000	20.73	CUMPLE
18	***	PERSONAL	Jor											***Personal**, Incumplir - descuento 10%							
19	***	HERRAMIENTA	Gb											**Herramienta**, Incumplir - descuento 5%							

REGISTRO FOTOGRAFICO









ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE


CONTRATO 1994 DE 2024	OBJETO: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 1 - LOTE 2"

CONTRATO DE OBRA No. 1528 - 2024	**SECTOR:**	Toluviejo - San Onofre, Ruta 9004							**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1994-2024**
CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ	**CUADRILLA:**	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ							
	TRAMO:	Pr 65+0937 - Pr 93+0683, RUTA 9004							**CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE**
	KM-SECTOR (ES) :		27.72	SEMANA No.	1	2	3	4	5	ADMINISTRADOR VIAL: EDWIN FONSECA SALAMANCA
	No. DÍAS/MES: FEBRERO		28	No. DÍAS	2	7	7	7	5	

INDICADOR				SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS			CUMPLIMIENTO
ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL		PR INICIAL	PR FINAL	PROGRAMADO (Km.)	PR INICIAL	PR FINAL	EJECUTADO (Km.)	
1	229	Bacheo (vía pavimentada)	m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Bacheo (vía pavimentada)							
4	340 - 380	Limpieza bermas	ml	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	91+500 65+937	93+683 70+500	Limpieza bermas	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
5	425	Limpieza de Cunetas	ml	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	69+000	70+500	Limpieza de Cunetas	69+000	82+500	13.50	69+000	82+500	13.50	CUMPLE
7	434	Limp. de Encoles y Descoles	ml	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	91+500 65+937	93+683 70+500	Limp. de Encoles y Descoles							
8	497	Limp. Obras de Arte	un	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	91+500 65+937	93+683 70+500	Limp. Obras de Arte	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
9	498	Limp. (zanjas , canales)	ml	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Limp. (zanjas , canales)							
10	515	Limpieza de Puentes y Pontones	un	+	+	70+500	76+500	76+500 82+500	81+000 84+000	82+500 87+000	85+500 88+500	93+000	93+683	Limpieza de Puentes y Pontones	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
13	548	Limp. y pintura barandas	ml	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Limp. y pintura barandas							
14	625	Despeje de derrumbes	m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Despeje de derrumbes							
15	625	Limp. de Calzada	m2	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	91+500 65+937	93+683 70+500	Limp. de Calzada	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
16	636	Rocería	m2	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	91+500 65+937	93+683 70+500	Rocería	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
17	639	Poda y/o retiro de árboles	un	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Poda y/o retiro de árboles							
22	678	Limpieza de Señales y Mojones	un	+	+	69+000	76+500	76+500	84+000	84+000	91+500	91+500 65+937	93+683 70+500	Limpieza de Señales y Mojones	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
23	686	Limpieza de Defensas	ml	+	+	+	+	78+000 82+500	81+000 84+000	84+000 90+000	85+500 91+500	65+937	67+500	Limpieza de Defensas							
24	694	Vigilancia de la vía	km	+	+	65+937	93+683	65+937	93+683	65+937	93+683	65+937	93+683	Vigilancia de la vía	65+937	93+683	27.72	65+937	93+683	27.72	CUMPLE
18	***	PERSONAL	Jor											***Personal**, Incumplir - descuento 10%							
19	***	HERRAMIENTA	Gb											**Herramienta**, Incumplir - descuento 5%							

REGISTRO FOTOGRAFICO



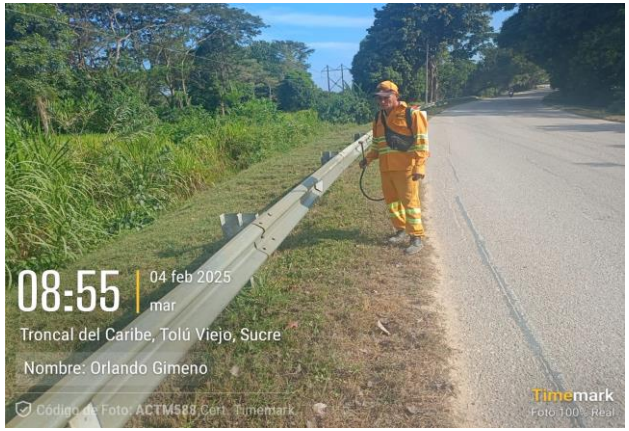





INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°8

CONTRATO 1994 DE 2024 PERIODO: PRIMERO (1) AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO1 - LOTE 2

CONSORCIO
ADMINISTRADORES GAE
CONTRATO N° 1994 DE 2024

SANTIAGO DE TOLÚ
2025

1. INTRODUCCIÓN

Este documento, corresponde al INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°8 y relaciona las actividades de control y seguimiento realizadas por CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE a los Contratos de Mantenimiento Rutinario No. 1528 de 2024 y No.1535 de 2024, suscritos entre LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE– INVIAS con ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ y “COOTRAVIAT” respectivamente, correspondientes al periodo comprendido del (01) primero al veintiocho (28) de febrero de 2025.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar por parte de CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE a los Contratos de Mantenimiento Rutinario No.1528 de 2024 y No.1535 de 2025, suscritos entre LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE–INVIAS con ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ y “COOTRAVIAT” las actividades de control, seguimiento y evaluación, como las medidas definidas por la empresa en pro de la seguridad y salud en el trabajo, definiendo medidas de intervención de acuerdo con los hallazgos encontrados con el fin de minimizar los riesgos inherentes al cargo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión efectiva de planes de mejoramiento.

- Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes.

- Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la Organización, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, que mejore la productividad de la misma.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA. DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT".**

CONTRATO No.:	1535 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS-SABANETA, PR0+0000 - PR16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 - PR35+0000, LOTE 4.
VALOR INICIAL:	$ 576.063.235 (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	COOTRAVIAT
PLAZO INICIAL:	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
SUPERVISOR:	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
NIT:	901839178 – 2
ANTICIPO (20%)	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE MAYO DEL 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	N.A.
PRORROGA No1.	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026.

- **ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ**

CONTRATO No.:	1528 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 9004 TOLUVIEJO – SAN ONOFRE, PR 65+0937 – PR93+0683 LOTE 3.
VALOR INICIAL:	$ 1,125,982,760 (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
SUPERVISOR:	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
NIT:	901839178 – 2
ANTICIPO (20%)	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE MAYO DEL 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	N.A.
PRORROGA No1.	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL PRESENTE MES

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT".**

PERIODO*:* 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS – SABANETA (PR 4+0000 AL PR 1+0000)	N° TRABAJADORES	**5**
FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 1 **(03/02/2025)** **(07/02/2025)**	• Se inician las actividades con una revisión de seguridad las cuales son: • Día 1, se realiza inspección de elementos de protección personal (EPP) para garantizar la seguridad en las actividades. • Se inspecciona las herramientas y equipos de trabajo. • Se inspecciona el vehículo de apoyo.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos Ver anexos.

PERIODO: 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 9004 CARRETERA COVEÑAS- TOLU, (PR 30+0000 – 35+0000)	N° TRABAJADORES	5
FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 2 **(10/02/2025) -** **(14/02/2025)**	• Inicio de semana con recomendaciones de seguridad para cumplimiento de cronograma de actividades. • Se inicia con la inspección de elementos de protección personal correspondientes al cargo para garantizar actividades seguras. • Inspección de herramientas y equipos de trabajo. • Inspección a vehículo de apoyo. • 10/02/2025 Visita de inspección por parte del equipo de administración vial (ingenieros y siso). Se desarrolla charla de seguridad y por último pausas activas.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos Ver anexos.

PERIODO: 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS – SABANETA 15+0000 AL PR 12+0000	N° TRABAJADORES	5

FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 3 (17/02/2025) - (21/02/2025)	• Inicio de semana con recomendaciones de seguridad para cumplimiento de cronograma de actividades. • Se inicia con la inspección de elementos de protección personal correspondientes al cargo para garantizar actividades seguras. • Inspección de herramientas y equipos de trabajo. • Inspección a vehículo de apoyo. • El día 21 de febrero se realizó la séptima capacitación con énfasis en Riesgo mecánico y manejo de Herramientas en la oficina principal de Tolú.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos -Formatos de Asistencia a charla -Formatos de inspección de vehículos -Formatos de inspección de herramientas de trabajo. Ver anexos.

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

PERIODO: 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS, SABANETA 10+0000 AL PR 07+0000	N° TRABAJADORES	5

FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 4 **(24/002/2025) -** **(28/02/2025)**	• Inicio de semana con recomendaciones de seguridad para cumplimiento de cronograma de actividades. • Se inicia con la inspección de elementos de protección personal correspondientes al cargo para garantizar actividades seguras. • Inspección de herramientas y equipos de trabajo. • El 24/02/2025 se realizó inspección a vehículo de apoyo.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos -Formatos de Asistencia a charla Ver anexos.

- **ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ**

PERIODO: 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 9004 CARRETERA, SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRE DEL PR 69+0000 AL PR 76+0500	N° TRABAJADORES	8
FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 1 **(03/02/2025) -** **(07/02/2025)**	• Se inician las actividades con una revisión de seguridad las cuales son: • Día 1, se realiza inspección de elementos de protección personal (EPP) para garantizar la seguridad en las actividades. • Se inspecciona las herramientas y equipos de trabajo. • Se inspecciona el vehículo de apoyo.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos Ver anexos.

PERIODO: 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 9004 CARRETERA SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFREDEL PR 76+0500 AL PR 84+0000	**N° DE TRABAJADORES**	8
FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 2 **(10/02/2025) -** **(14/02/2025)**	• Inicio de semana con recomendaciones de seguridad para cumplimiento de cronograma de actividades. • Se inicia con la inspección de elementos de protección personal correspondientes al cargo para garantizar actividades seguras. • Inspección de herramientas y equipos de trabajo. • Inspección a vehículo de apoyo.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos -Incapacidad Ver anexos.

PERIODO: 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 9004 CARRETERA SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFREDEL PR 84+0000 AL PR 91+0500	**N° DE TRABAJADORES**	8

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
SEMANA 3 (17/02/2025) - (21/02/2025)	• Inicio de semana con recomendaciones de seguridad para cumplimiento de cronograma de actividades. • Se inicia con la inspección de elementos de protección personal correspondientes al cargo para garantizar actividades seguras. • Inspección de herramientas y equipos de trabajo. • El día 21 de febrero se realizó la séptima capacitación con énfasis en Riesgo mecánico y manejo de herramientas en la oficina principal de Tolú.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos -Formatos de Asistencia a charla -Formato de inspección de vehículos -Formato de inspección de herramientas de trabajo. Ver anexos.

PERIODO: 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		
UBICACIÓN: CÓDIGO 9004 CARRETERA SECTOR TOLUVIEJO - SAN ONOFRED	**N° DE TRABAJADORES**	8
FECHA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES**
SEMANA 4 **(24/02/2025) - (28/02/2025)**	• Inicio de semana con recomendaciones de seguridad para cumplimiento de cronograma de actividades. • Se iniciaron la inspección de elementos de protección personal correspondientes al cargo para garantizar actividades seguras. • Inspección de herramientas y equipos de trabajo.	En la hoja de anexos se agregarán los registros: -Fotográficos -Formatos de Asistencia a charla Ver anexos.

4 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 CONTAMINACIÓN AUDITIVA

Tema: CONTAMINACIÓN AUDITIVA EN EL AMBIENTE LABORAL

Objetivo general:

- Sensibilizar a los participantes sobre los efectos negativos de la contaminación acústica en la salud y el medio ambiente.

Objetivos específicos:

- Definir la contaminación acústica y sus principales fuentes.
- Explicar los efectos de la contaminación acústica en la salud física y mental.
- Identificar las medidas preventivas y correctivas para reducir la contaminación acústica.
- Promover la participación activa de los asistentes en la creación de entornos sonoros más saludables.
- Informar sobre las normativas vigentes relacionadas con la contaminación acústica.
- Promover el uso responsable de dispositivos generadores de ruido.
- Incentivar la creación de espacios de dialogo para la solución de problemas relacionados con la contaminación auditiva.

Desarrollo:

La exposición al ruido, especialmente a niveles altos y de forma prolongada, puede tener diversos efectos perjudiciales para la salud de las personas, tanto a nivel físico como psicológico.

Efectos auditivos:

- **Pérdida de audición:** La exposición a ruidos fuertes puede dañar las células ciliadas del oído interno, lo que lleva a la pérdida de audición. Esta pérdida puede ser temporal o permanente, dependiendo de la intensidad y duración del ruido.
- **Tinnitus:** Es la percepción de zumbidos, pitidos u otros ruidos en los oídos, incluso en ausencia de una fuente externa. El ruido fuerte es una de las principales causas del tinnitus.
- **Hiperacusia:** Es una mayor sensibilidad a los sonidos cotidianos, que pueden percibirse como molestos o dolorosos.

Efectos no auditivos:

- **Problemas cardiovasculares:** El ruido puede aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de hormonas del estrés, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.
- **Trastornos del sueño:** El ruido puede dificultar conciliar el sueño, interrumpir el sueño y reducir su calidad, lo que lleva a fatiga, irritabilidad y problemas de concentración.
- **Estrés y ansiedad:** La exposición crónica al ruido puede aumentar los niveles de estrés, ansiedad e irritabilidad, y contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad.
- **Problemas cognitivos:** El ruido puede afectar la capacidad de concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo, especialmente en niños.
- **Efectos psicológicos:** El ruido puede generar irritabilidad, cambios de humor, depresión y aumento de la fatiga.

Conclusión:

La contaminación auditiva, un problema silencioso pero perjudicial, afecta nuestra salud y bienestar de múltiples formas, desde la pérdida de audición hasta el estrés crónico. Sin embargo, mediante acciones individuales y colectivas, como el uso responsable de dispositivos, la implementación de normativas y el fomento de la conciencia, podemos construir un futuro más silencioso y saludable para todos.

4 INTEGRACIÓN Y PAUSAS ACTIVAS COOPERATIVAS

El Ministerio de Protección Social reglamentará mecanismos para que todas las empresas del país promuevan durante la jornada laboral pausas activas para todos sus empleados, es por ello que estamos comprometidos en crear el hábito en nuestro equipo de trabajo.
Iniciamos sensibilizando al grupo acerca de la importancia de las mismas dentro de la jornada laboral.
Las pausas activas consisten en la utilización de variadas técnicas en períodos cortos de tiempo, máximo 10 minutos, durante la jornada laboral, que ayudarán a recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por posturas.
La actividad se lleva a cabo haciendo una pequeña rutina de

estiramientos y ejercicios físicos, que involucraran todo el cuerpo, en el que los trabajadores se mostraron muy emotivos, energéticos y atentos.

¿Por qué realizar pausas activas?
En el entorno laboral, la gran mayoría de trabajadores permanecen varias horas del día y dependiendo del trabajo con un nivel de actividad física mínimo. Esto favorece que las personas se desacondicionen físicamente, lo cual promueve una actitud sedentaria relacionada directamente con cambios metabólicos y estructurales en el cuerpo humano. El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables. El contenido de esas pausas activas, será encaminado a mejorar la condición física de los trabajadores y por lo tanto se deben trabajar las capacidades que constituyen la condición física. Al mejorar la condición física de los trabajadores, se tenderá a disminuir el sedentarismo como base fundamental de numerosas ENT y también se podrá disminuir el riesgo de aparición de patologías relacionadas con el sobreuso en el sistema osteomuscular.

Ejercicios durante la pausa activa:

- Estiramiento de brazos por encima de la cabeza
- Extensión de músculos de hombros
- Extensión y flexión de muñecas
- Sentadillas

5 VISITA RUTINARIA A LA VÍA

En la visita rutinaria a cada uno de los puestos de trabajo de las microempresas, se hace énfasis en la importancia del uso de los elementos de protección personal como mecanismo de protección ante accidentes e incidentes laborales, promoviendo así el autocuidado tanto personal como grupal.

Se dan recomendaciones de verificación de área de trabajo e inspección de herramientas y equipos de trabajo, incluyendo la supervisión de estado y condiciones del vehículo de apoyo.
En nuestra visita recordamos el compromiso de responsabilidad que cada una de las microempresas adquiere para el cumplimiento de las metas propuestas en los cronogramas de trabajo.

DESCRIPCIÓN

Los grupos de mantenimiento rutinario están compuestos por dos cooperativas, y el área administrativa distribuidos de la siguiente manera:

- **COOTRAVIAT**: 5 trabajadores
- **ORLANDO JIMENO GÓMEZ**: 8 trabajadores
- **TRABAJADORES GRUPO ADMINISTRADORES GAE**: 5 trabajadores

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1994 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 LOTE 2.
VALOR INICIAL:	$3.89.425.878 (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	ADMINISTRADORES GAE
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISOR:	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
NIT:	901839178 - 2
ANTICIPO (20%)	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	PRIMERO 28 DE JUNIO DEL 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	N.A.
PRORROGA No1.	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En compromiso con nuestra labor continuamos sugiriendo a las cooperativas a mantener las medidas de orden y aseo, orientando esfuerzos a la consecución de espacios limpios y libres de desechos, lo anterior propendiendo por la instauración de medidas tendientes a la creación de buenos hábitos de higiene en los espacios de trabajo, mantenimiento del medio ambiente, y cultura del autocuidado.

El área SST de esta Interventoría, llevó a cabo visitas de inspección rutinaria en todos los frentes de trabajo, detectando uso parcial de: botas de seguridad y ropa de dotación, por ello, toda vez ocurrida esta No Conformidad, fueron elevados llamados de atención verbal al área correspondiente, recomendando a continuación, realizar labores de supervisión respecto al uso adecuado de los elementos de protección personal, con la intención de orientar a miembros del cuerpo de trabajo contratista que por descuido u omisión no portaban debidamente los EPP y ropa de dotación.

Finalmente, la identificación constante de peligros y valoración de los riesgos es una actividad que se debe realizar de manera continua, desde el inicio hasta la finalización del proyecto, esto así, debido a que los riesgos pueden ser cambiantes y/o variables en el desarrollo de las actividades. Para este mes no se presentaron nuevos hallazgos ni accidentes de trabajo.

- ✓ Continuar con el seguimiento e inspección en áreas de trabajo por cada firma contratista.

- ✓ Concientizar a los trabajadores sobre la importancia del uso adecuado y obligatorio de los elementos de protección personal.

- ✓ Capacitar a todo nuestro personal en temas enfocados a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo

- ✓ Fortalecer en nuestros trabajadores el trabajo en equipo como incentivo para un ambiente de trabajo eficaz y saludable.

- ✓ Implementar en todas las áreas de la empresa las charlas encaminadas a fortalecerla seguridad y salud en el trabajo, en temas de interés, y acordes a las necesidades de cada grupo de trabajo.

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
Ingeniero Residente

Carmen Soraya H B.

CARMEN SORAYA HERNANDEZ BATISTA
Inspector SISO.

6. ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO “COOTRAVIAT

<table>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>FOTOGRAFÍA N°: 1</td><td>FECHA: 21/02/2025</td><td>FOTOGRAFÍA N°: 2</td><td>FECHA: 21/02/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN</td><td colspan="2">ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN</td></tr>
<tr><td>FOTOGRAFIA N°: 3</td><td>FECHA: 21/02/2025</td><td>FOTOGRAFÍA N°:4</td><td>FECHA: 21/02/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

</td><td colspan="2">ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CONTRATISTA ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ

<table>
<tr>
<td colspan="2">
</td>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
<td>FOTOGRAFÍA N°: 9</td>
<td>FECHA: 24/02/2025</td>
<td>FOTOGRAFÍA N°: 10</td>
<td>FECHA: 24/02/2025</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">ACTIVIDAD: INSPECCIÓN Y CHARLA</td>
<td colspan="2">ACTIVIDAD: INSPECCIÓN Y CHARLA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
</td>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
<td>FOTOGRAFÍA N°: 19</td>
<td>FECHA: 21/02/2024</td>
<td>FOTOGRAFÍA N°: 20</td>
<td>FECHA: 21/02/2024</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">ACTIVIDAD: INSPECCIÓN Y CHARLA</td>
<td colspan="2">ACTIVIDAD: INSPECCIÓN Y CHARLA</td>
</tr>
</table>

CONSORCIO ADMINISTRADOR GAE	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	CODIGO: CSST 019 Fecha creación: 18/07/2024 Fecha Actualización:

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SUCRE

NOMBRE DE CAPACITADOR:	Carmen Sosaya Hernandez	CARGO:	
CHARLAS:	X 21-02-2025	CAPACITACIONES:	CAPACITACIÓN:

Temas: Contaminación Auditiva.

HORA DE INICIO: | HORA DE TERMINACIÓN:

ÍTEM	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Silvio Flores	92446673	obrero	olobo	Silvio Flor
2	Adolfo Julio	Ha8766051	Obrero	orlando	Adolfo J
3	Sello	136717464	obrero	olobo	Sello
4	Raul Hernandez	1792780688	Obrero	Orlando	
5	Manuel Acosta	92229950	Obrero	orlando	Manuel
6	Antonio	92698018	Obrero	orlando	Antonio
7	Javier Flores	19596770	Cordinador	orlando	Javier Flores
8	Carmelo Jones	98727353.	Obrero.	Orlando	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ACCIONES PREVENTIVAS

1. Examen medico ocupacional de ingreso y periódico según profesiograma de la organización
2. Cumplir y promocionar la Politica No alcohol y drogas, Politica No tabaco, Politica SST, Prevencion de Acoso laboral
3. Recuerde mantener el área de trabajo ordenada y aseada, esto evita accidentes de trabajo
4. No fume dentro del proyecto/áreas de trabajo
5. Reporte oportunamente los Incidentes y accidentes de trabajo
6. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro del proyecto/sede. Incluidas la señalización de rutas de evacuación (Emergencia)

He sido notificado sobre los riesgos de mi cargo y de las actividades, y me comprometo a cumplir con los controles definidos por la empresa, por mi bienestar, mi salud y mi seguridad

FIRMA DEL TRABAJADOR

Carmen Sosaya H.

FIRMA DE RESPONSABLE SST

CONSORCIO ADMINISTRADORES SAE	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	CODIGO: CSST 019 Fecha creacion: 18/07/2024 Fecha Actualizacion:

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SUCRE

NOMBRE DE CAPACITADOR:	Eidy Hernandez L	CARGO:	

MARQUE CON UNA X SEGÚN INDIQUE

CHARLAS:		CAPACITACIONES:		CAPACITACIÓN:	X 21-02-25

Temas: Riesgo Mecánico y Manejo de Herramientas

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

ÍTEM	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Adolfo Javier Julio H	1108766051	obrero	orlando	Adolfo Julio
2	Eveliohernande	13677044	Odeto	Orlando	Eveliohernande
3	Robert Leal	1192780688	Obrero	Orlando	
4	Silvio Florez	92446673	Odevo	orlodo	Silvio Flor
5	Miguel Acosta	92229910	Obrero	orlando	Miguel
6	Carmelo Flores	78727353	obrero	orlando	
7	Antonio Pero	92698012	Olando	obrero	Antonio Pe
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ACCIONES PREVENTIVAS

1. Examen medico ocupacional de ingreso y periódico según profesiograma de la organización
2. Cumplir y promocionar la Política No alcohol y drogas, Política No tabaco, Política SST, Prevencion de Acoso laboral
3. Recuerde mantener el área de trabajo ordenada y aseada, esto evita accidentes de trabajo
4. No fume dentro del proyecto/áreas de trabajo
5. Reporte oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo
6. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro del proyecto/sede. Incluidas la señalización de rutas de evacuación (Emergencia)

He sido notificado sobre los riesgos de mi cargo y de las actividades, y me comprometo a cumplir con los controles definidos por la empresa, por mi bienestar, mi salud y mi seguridad

Eidy Hernandez
FIRMA DEL CAPACITADOR

Carmen Soraya Hdz.
FIRMA DE RESPONSABLE SST

CONSORCIO ADMINISTRADORES SAE	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	CODIGO: CSST 019 Fecha creacion: 18/07/2024 Fecha Actualizacion:

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SUCRE

NOMBRE DE CAPACITADOR:	Eldy Hernandez	CARGO:	

MARQUE CON UNA X SEGÚN INDIQUE

CHARLAS:		CAPACITACIONES:		CAPACITACIÓN:	X 21-02-25

Temas: Riesgo Mecánico y Manejo de Herramientas

HORA DE INICIO:		HORA DE TERMINACIÓN:	

ÍTEM	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Rafael Andrés Hernandez	3.823775	Regal	COOTRAVIAT	
2	Omar cardenas	92.600370	Obrero	Cootrad	
3	FRED CARLOS CORREA	92277.022	coordinador	COOTRAVIAT	
4	Oscar Bertel	92277337	obrero	COOTRAVIA	
5	Nicolas Zapata	87920 75	obrero	COOTRAVIA	
6	ADRIAN CARDENAS	1005 989 659	CONDUCTOR	COOTRAVIA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ACCIONES PREVENTIVAS

1. Examen medico ocupacional de ingreso y periódico según profesiograma de la organización
2. Cumplir y promocionar la Política No alcohol y drogas, Política No tabaco, Política SST, Prevencion de Acoso laboral
3. Recuerde mantener el área de trabajo ordenada y aseada, esto evita accidentes de trabajo
4. No fume dentro del proyecto/áreas de trabajo
5. Reporte oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo
6. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro del proyecto/sede. Incluidas la señalización de rutas de evacuación (Emergencia)

He sido notificado sobre los riesgos de mi cargo y de las actividades, y me comprometo a cumplir con los controles definidos por la empresa, por mi bienestar, mi salud y mi seguridad

Eldy Hernandez

FIRMA DEL CAPACITADOR

FIRMA DE RESPONSABLE SST
