“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” CONTRATO 4821 DE 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°12

Período de 1 al 15 de Noviembre de 2024

CONSORCIO NRT&IG 2023

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
nicolasredondom@live.com

Valledupar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3767-2023 Y 3925-2023 **Contratista:** JAC PAPELES Y JAC BARRIALES

Contrato de Interventoría No. 4821-2023 **Interventoría:** CONSORCIO NRT&IG 2023

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 12 **MES O PERIODO:** 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3 y 4
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		8 y
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9 y
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9 y
2.4	Características técnicas del proyecto		9 y
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		10 y
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11 y
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		11 y
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11 y
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	56
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	65
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	56 Y 64
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	54 Y 62
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	65
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	54
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		22
5.3	Informes especialistas y profesionales		23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	31
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	33
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	30
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	33
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	36
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	36
7	**Conclusiones y recomendaciones**		25
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		25
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		26
8.3	informe de Topografia		41
8.4	Inf. Laboratorios		48

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.___ de fecha ___

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** NOVIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC LOS BARRIALES NUEVAS ID EAS -EL MOLINO-GUAJIRA

PLAZO INICIAL: 0,17 MESE
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,35

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.389.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.389.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E):** JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	180
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	180
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	135.154.029,00		135.154.029,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.054.621,00		4.054.621,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.180.776,00		49.180.776,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			189.389.426,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	45.084.636,77		45.084.636,77	147.040.139,77
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.262.369,00		7.262.369,00	42.349.286,23
VALOR EJECUTADO	52.347.005,77		52.347.005,77	189.389.426,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 188.389.426,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.389.426,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** NOVIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3767-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES -EL MOLINO-GUAJIRA

PLAZO INICIAL: 0,17 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,35

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.671.431,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.671.431,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E):** JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	117
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		117
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	135.426.761,00		135.426.761,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.062.803,00		4.062.803,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.181.867,00		49.181.867,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			189.671.431,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00		0,00	143.671.024,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	46.000.407,00
VALOR EJECUTADO	0,00		0,00	189.671.431,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 189.671.431,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.671.431,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLOACION DE SUBBASE

Firma

Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Mediante convenio No. 3767 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL PAPELES DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor $189.671.431 y un plazo de 3 meses.

Mediante convenio No. 3925 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor $189.389.420 y un plazo de 3 meses.

Y que Mediante el Concurso de Menor Cuantía No. IP-DT-GUA-009-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.” fue adjudicado al CONSORCIO NRT&IG 2023 Representado legalmente por el Ing. ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO , y perfeccionado mediante Contrato 4821-2023, con el fin de ejercer Para el control técnico, administrativo y socio ambiental y financiero del contrato de obra.

El supervisor de interventoría es el ing. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ.

2. CONVENIO SOLIDARIO No. 3767-2023 VEREDA LOS PAPELES

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 Localización del Proyecto


El municipio del Molino se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.
Latitud: 10.65
Longitud: -72.917
Latitud: 10° 39' 0'' Norte
Longitud: 72° 55' 1'' Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda los Papeles

VIA EL MOLINO-VEREDA LOS PAPELES

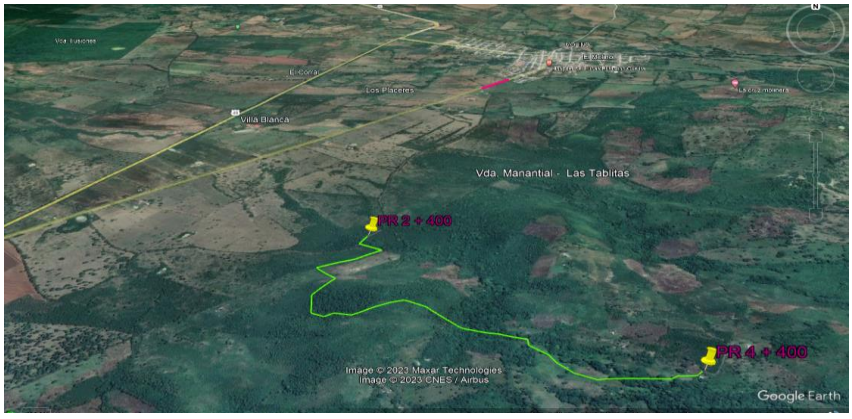

2.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda Los Papeles ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

2.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Los papeles se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió una cuesta que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

2.1.4. Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 117 metros lineales de placa huella.

2.2.1 INFORMACION CONVENIO 3767-2023

Convenio solidario No.	3767-2023
Suscripción de convenio	5 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS PAPELES EL MOLINO
Nit	901.726.638-3
Valor Inicial	189.671.431,00
Valor Total	189.671.431,00
Orden de Inicio	15 DE DICEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Prorroga No. 3	31 DE JULIO DE 2024
Prorroga No. 4	31 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación	31 DE AGOSTO DE 2024

2.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se finaliza construccion de placa huella desde el PR 3+739 al PR 3+856, 117 ml, completa con piedra pegada, cuneta y bordillos.

- Seejecuto Proyecto PIS, Con la siembra de 1500 arboles nativo en nacederos de la veread

- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 17 de noviembrebre de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	$ 138.515.557,00	N/A	0.00	$ 138.515.557,00
APORTE OAC	$ 1.000.000,00	N/A	0.00	1.000.0000,00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.155.467,00	N/A	0.00	$ 4.155.467,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.000.000,00	N/A	0.00	$ 46.000.000,00
TOTAL	**$ 189.671.024,00**		**0,00**	**$ $ 189.671.024,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 100,00%.

2.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha no se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento de Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

No se anexan los formatos Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

2.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

2.3.1 Informe Semanal.

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe semanal:

No se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

2.3.2 Maquinaria y Equipo

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de maquinaria y equipo
No se anexan los formatos Maquinaria y Equipo

2.3.3 Personal, control legales y segridad social contrato de obra

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.

2.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

No se anexa Formato Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.
.

2.3.5 Estado General del tiempo

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Estado General del tiempo.

No se anexa Formato Estado General del tiempo.

2.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Ensayos de Laboratorios

No se anexa Formato Ensayos de Laboratorios

2.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Seguimiento garantias y seguros contrato obra

No se anexa el formato Seguimiento garantias y seguros contrato obra

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se ejecutaron cumplieron con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaiones Generales de construccion para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Como el proyecto finalizo el 18 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

- Seguimiento al programa de ejecucion e inversiones de la obra, a corte de 30 de octubre de 2024. No APLICA
- Las Actas de comité de obra y actas de reunion se llevaran de acuerdo a los formatos asignados. No APLICA
- Los comité operativos tambien no seran presentados en sus formatos. No APLICA

3. CONVENIO SOLIDARIO No. 3925-2023 VEREDA BARRIELES NUEVAS IDEAS

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.1 Localización del Proyecto

El municipio del Molino se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.
Latitud: 10.65
Longitud: -72.917
Latitud: 10° 39' 0'' Norte
Longitud: 72° 55' 1'' Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda Barriales Nuevas Ideas.

VIA EL MOLINO-VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS



3.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda barriales nuevas ideas ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

3.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Barriales nuevas ideas se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió dos Tramos que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

3.1.4 Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 180 metros lineales de placa huella.

3.2.1 INFORMACION CONVENIO 3925-2023

Convenio solidario No.	3925-2023
Suscripción de convenio	13 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS BARRAILES- EL MOLINO
Nit	901.674.548-4
Valor Inicial	189.389.426,00
Valor Total	189.389.426,00
Orden de Inicio	28 DE DIDICEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Suspensión No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Reinicio No. 1	17 DE ENERO DE 2024
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Prorroga No.3	31 DE JULIO DE 2024
Prorroga No.4	31 DE AGOSTO DE 2024
Suspension No. 2	28 DE AGOSTO DE 2024
Reinicio No. 2	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Prorroga No. 5	15 DE OCTUBRE DE 2024
Suspension No. 3	11 DE OCTUBRE DE 2024
Reinicio No. 3	25 DE OCTUBRE DE 2024
Prorroga No. 6	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

3.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se recibe el Proyecto PIS,suministro y colocacion demangueras a parcelas desde el acueducto veredal.
- Se realizaron 3 tramos de placa huella (153ml) y 1 un tramo de placa de concreto rigido (27m)
- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte de 28 noviembre de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	$ 142.790.382,00	N/A	$ 19.988.084,00	$ 147.524.093,00
APORTE OAC	$ 1.000.000,00	N/A	0.00	$ 1.000.000,00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.283.711,00	N/A	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.315.302,00	N/A	0.00	$ 41.315.302,00
TOTAL	**$ 189.389.395,00**		**$ 29.329.134,00**	**$ 189.839.395,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 100%.

3.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto, RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

Como el proyecto finalizo el 28 de septiembre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

No se anexa Formato Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

3.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

3.3.1 Informe Semanal.

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Informe Semanal.

Se anexan los formatos: Informe Semanal.

3.3.2 Maquinaria y Equipo

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de maquinaria y equipo.

No se anexan los formatos Maquinaria y Equipo

3.3.3 Personal, control legales y segridad social contrato de obra

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No se anexa Formato Personal, control legales y segridad social contrato de obra

3.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra

No se anexa Formato Personal, Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra

3.3.5 Estado General del tiempo

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Estado General del tiempo.

No se anexa Formato Estado General del tiempo.

3.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de pruebas a cilindros de concreto.

No se anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

3.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del informe de Seguimiento garantias y seguros contrato obra

No se anexa el formato Seguimiento garantias y seguros contrato obra

3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se ejecutaron cumplieron con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaiones Generales de construccion para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 o la normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del :

- Seguimiento al programa de ejecucion e inversiones de la obra, a corte de 30 de octubre de 2024. No APLICA
- Las Actas de comité de obra y actas de reunion se llevaran de acuerdo a los formatos asignados. No APLICA
- Los comité operativos tambien no seran presentados en sus formatos. No APLICA

4.0 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE SELECCION	IP-DT-GUA-009-2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4821 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	11 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
CONTRATISTA	CONSORCIO NRT&IG 2023
NIT	901781662-4
VALOR INICIAL	$60.632.761
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR TOTAL	$60.632.761
ORDEN DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTAEL 31 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSION No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	17 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	30 DE ABRIL DEL 2024
PRORROGA No. 2	30 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA No. 3	31 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No. 4	31 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSION No. 2	29 DE AGOSTO DE 2024
REINICIO No. 2	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 5	15 DE OCTUBRE DE 2024
SUSPENSION No. 3	11 DE OCTBRE DE 2024
REINICIO No. 3	25 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA No. 6	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIRECCION	CALLE 14 No. 17-46 Interior 15
NUMERO DE CELULAR	315 5751982
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

4.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Las actividades realizadas durante la construcción de la placa huella por esta interventoría fueron.

- Controlar, supervisar y medir la construcción de placa huella instalada en los dos proyectos en Barriales Nuevas Ideas y en Papeles.

4.2 Informe de especialistas y profesionales

Como el proyecto finalizo el 18 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del : informe de Los especialistas

- No se presentó informe de Los especialistas

4.3 Informacion otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoria.

En la ejecucion del proyecto se realizo seguimeinto a la ejecucion de placa huella JAC barriales requeridos para la ejecucion de los proyectos, se verifico el uso de la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras Viales de Invias, las especificaciones generales de construccion de carreteras y el Programa PIS.

4.4 REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.4.1 Equipo y vehículo contrato de Interventoría

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del : informe de Los especialistas

No se anexa el formato Equipo y Vehiculo

4.4.2 Informe de especialistas y profesionales

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del : informe de Los especialistas

- ∞ No se presentó informe de Los especialistas

4.4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social

Aunque el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, se efectua el deligenciamiento del Personal, control aportes legales y seguridad social.

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	TIPO DE CONTRATO
1	NICOLAS REDONDO MOLINA	Director Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
2	JANIO TAPIAS HERRERA	Residente de Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

4.4.4 Seguimiento a garantías y seguros contrato de interventoría

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024,no se efectua el deligenciamiento del Personal, control aportes legales y seguridad social.

No se anexa formato MEPI-MN1-IN15-FR-13

4.4.5 Otros documentos seguimiento mensual

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el Otros documentos seguimiento mensual.

- **Seguimiento al Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de** Cargas después de prorroga 3

No se anexa MEPI-MN1-IN-9-FR-2

- **Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría**

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento del Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, esta interventoria inicia la liquidacion de los Convenios y el contrato de interventoria.

6.0 ANEXOS

6.0.1 Relación Correspondencia:

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento correspondencia

6.0.2 Registro fotográfico

Como el proyecto finalizo el 28 de octubre de 2024, no se efectua el deligenciamiento registro fotográfico.
