	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3041 - 2023 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

Contrato de Interventoría No. 2656-2023 **Interventoría:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 70NS01: LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN, PR 00+0000 - PR 33+0000.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** 01 AL 23 DE MARZO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCION**		8
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		13
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	36
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	38
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	40
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		14
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		15
5.3	Informes especialistas y profesionales		16
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		16
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		16
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	49
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	55
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		20
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		60
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		64

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 24 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** 01 AL 23 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3041 - 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 01/10/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/5/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 174.085.373,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 87.042.686,50
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 261.128.059,50
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2656 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ**

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			$ 261.128.059,50
SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 261.128.059,50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 35,509,371.22	$ 613,343.68	$ 36,122,714.90	**$ 36,122,714.90**
SUBTOTAL BÁSICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)				$ -
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 35,509,371.22	$ 613,343.68	$ 36,122,714.90	$ 36,122,714.90

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 261.128.059,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 210.353.159,04
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 80,55%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 13
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5

CONTRATO No. 3041 DE 2023: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 - PR 69+0000 LOTE 4.



PERIODO: 01 AL 23 de marzo de 2024
Ocaña, 24 de marzo de 2024

CONTRATO No. 2656 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1 LOTE 10.

CONTENIDO

Anexo 1 Informe Semanal....4
Anexo 3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra....4
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8....4
Anexo 4 Estado General del Tiempo....4
Anexo 5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra....4
Anexo 6 Actas de comité....4
Anexo 7 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría....4
Anexo 8 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría....4
Anexo 9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría....4
Anexo 10 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría....4
Anexo 11 Relación de la correspondencia generada....4
1. INTRODUCCIÓN....5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....6
2.1 Localización....6
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto....7
2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía....7
2.4 Características Técnicas del Proyecto....7
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA....8
3.1 Información General del Contrato....8
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes....8
3.3 Seguimiento ítems no previstos....9
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría....9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....9
4.1 Informe Semanal....9
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra....10
4.3 Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra....10
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra....10
4.5 Estado General del Tiempo....10
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio....10
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra....10
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra....10
4.9 Otros documentos seguimiento mensual:....10
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA....11
5.1 Información general del contrato....11
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor....11
5.3 Informes especialistas y Profesionales....12
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC....12
5.5 Informe Matriz de Riesgos....12
5.6 Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría....12
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....12
6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría....12
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 12
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría....12
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría....13
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría....13
6.6 Otros documentos seguimiento mensual....13
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....13

8. ANEXOS 13
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 13
8.2 Registro fotográfico del avance de las obras. 14
LIMPIEZA DE CUNETAS REVSTIDAS 14
PR 66+0300 14
LIMPIEZA Y REMOCIÓN DESLIAMIENTOS DE TIERRA 14
PR 64+0690 14
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA 14
PR 59+0400 14
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales 15
8.4 Copia de la Bitácora del mes Correspondiente 15
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 8
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8 8
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 9
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 10
ACTAS DE COMITE 11
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO 16

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Informe Semanal Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3
Anexo 2	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8
Anexo 4	Estado General del Tiempo Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Anexo 6	Actas de comité
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada
Anexo 12	Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías ha destinado $ 565.789.728,00 acumulados para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODULO 1, GRUPO 1 y $261.128.059,50 para ejecutar OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la vía objeto del alcance: Vía 7008, carretera Ocaña - Alto del Pozo desde el PR 38+0000 al PR 69+0000 lote 4.

Esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña con el oriente del país y la frontera colombo venezolana, desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del país.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 2656 de 2023, por parte del CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 3041 de 2023, en el periodo comprendido entre el 01 al 23 de marzo de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización


El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en la vía: Ocaña – Alto del Pozo, en el tramo que va desde el PR 00+0000 al PR 69+0000, en el corredor vial ruta 70 tramo 08 que une la frontera Colombo Venezolana, en el puente internacional Simón Bolívar.



El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento Norte de Santander y cesar.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

a) Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscritas las vías del proyecto en mención.
b) Códigos de las vías.
c) Límites de las vías, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud de cada una de ellas.

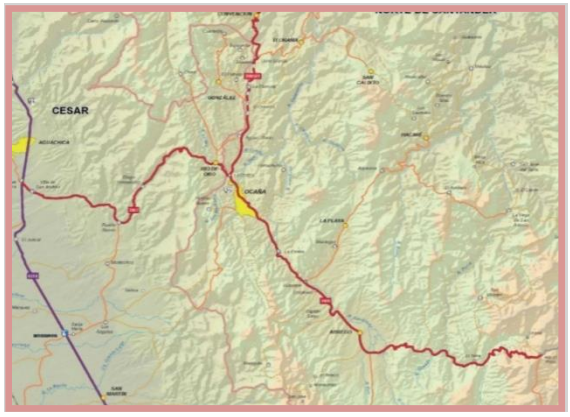

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

No.	TERRITORIAL	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULADO PARCIAL (Km)
1	OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	7008	OCAÑA - ALTO DEL POZO	PR 38+0000	PR 69+0000	31,00	31,00
TOTAL DE KILÓMETROS							**31,00**

2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que benefician u optimizan aún más estos corredores viales.

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3041 DE 2023
OBJETO	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vias a cargo del instituto Nacional de Vias Dirección Territorial Ocaña Carretera 7008: Ocaña – Alto del Pozo, PR 38+0000 - PR 69+0000 lote 4.
CONTRATISTA	Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA
REPRESENTANTE LEGAL	CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	31 DE ENERO DE 2024
PRORROGA 2	06 DE MAYO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	HASTA 06 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$174.085.373,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 1	$ 87.042.686,50 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$261.128.059,50 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

SEMANA 18. DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2024

Se realiza limpieza de cunetas en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Rocería en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Limpieza de alcantarilla en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Limpieza de calzada en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Recolección de residuos sólidos en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Arreglo de defensas del pr 69+0000 al pr 65+0000; Como medida de mitigación hacer muralla de contención alrededor del borde del talud en el sitio critico pr 68+0530; Como medida de mitigación, en el pr 56+0096, incrementar con sacos de arena la barrera de contención tanto a la entrada de la alcantarilla como en el cabezote de salida taponando la cuneta en tierra existente; Atención de emergencias del pr 38+0000 al pr 69+0000; Mantenimiento de la capa de rodadura del pr 38+0000 al pr 69+0000; Atención de emergencias por ola invernal del pr 38+0000 al pr 69+0000; Atención de emergencias por accidentes pr 38+0000 al pr 69+0000; Vigilancia diaria al corredor vial.

SEMANA 19. DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2024:

Se realiza limpieza de cunetas en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Rocería en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Limpieza de alcantarilla en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Limpieza de calzada en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Recolección de residuos sólidos

en el pr 69+0000 al pr 65+0000; Arreglo de defensas del pr 69+0000 al pr 65+0000; Como medida de mitigación hacer muralla de contención alrededor del borde del talud en el sitio critico pr 68+0530; Como medida de mitigación, en el pr 56+0096, incrementar con sacos de arena la barrera de contención tanto a la entrada de la alcantarilla como en el cabezote de salida taponando la cuneta en tierra existente; Atención de emergencias del pr 38+0000 al pr 69+0000; Mantenimiento de la capa de rodadura del pr 38+0000 al pr 69+0000; Atención de emergencias por ola invernal del pr 38+0000 al pr 69+0000; Atención de emergencias por accidentes pr 38+0000 al pr 69+0000; Vigilancia diaria al corredor vial.

SEMANA 20. DEL 15 AL 23 DE MARZO DEL 2024:

Se realiza limpieza de cunetas en el pr 60+0000 al pr 55+0000; Rocería en el pr 60+0000 al pr 55+0000; Limpieza de alcantarilla en el pr 60+0000 al pr 55+0000; Limpieza de calzada en el pr 60+0000 al pr 55+0000; Recolección de residuos sólidos en el pr 60+0000 al pr 55+0000; Arreglo de defensas del pr 60+0000 al pr 55+0000; Atención de emergencias del pr 38+0000 al pr 69+0000; Atención de emergencias por ola invernal del pr 38+0000 al pr 69+0000; Atención de emergencias por accidentes pr 38+0000 al pr 69+0000; Vigilancia diaria al corredor vial.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas por la microempresa, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Ocaña.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión al contrato mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la microempresa, empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo 2)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 3)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 4)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento Programa de Obra
  (No Aplica)

- Acta de Comité de Obra

Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 **No Aplica**

- Actas de Reunión

Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 **No Aplica**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2656 de 2023
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA
GESTOR DEL PROYECTO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2	31 DE ENERO DE 2024
PRORROGA 3	01 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 4	12 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 5	23 DE MARZO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	06 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 375.843.799,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 1	$ 162.865.647,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 2	$ 87.042.686,50 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 538.709.446,00 (incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.
- Controles diarios de cantidades de obras ejecutados.
- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.

- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.
- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.
- Realización de comités técnicos de obra con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.
- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.
- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas y Profesionales

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Informe Matriz de Riesgos

(No aplica)

5.6 Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría

- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 6)

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 7)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 9)

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
  Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**
  Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 **No Aplica**

- Plan de Cargas o reprogramación al plan de Cargas aprobado
  Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento al Plan de Cargas
  Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 **No Aplica**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene realizando todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, por parte de la Dirección Territorial quien venía realizando la supervisión de los contratos de mantenimiento rutinario.
- La principal actividad ejecutada por la microempresa de mantenimiento rutinario fue realizar las actividades de mantenimiento periódico de las vías en jurisdicción de la territorial Ocaña.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías continuar realizando el mantenimiento rutinario de la vía, especialmente lo relacionado con la limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar el drenaje de la vía. Así mismo, estos mantenimientos mantienen en óptimas condiciones la vía evitando así su pronto deterioro.
- El inspector SISO de la administración vial semanalmente realiza la supervisión al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El estado de salud de los asociados es bueno. Se confirma que vienen desarrollando actividades en la vía los asociados contratados.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.
(Ver anexo 11)

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

CONTRATO No. 3041 DE 2019: CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 - PR 69+0000 LOTE 4.

COOPERATIVA EL TARRA – MARZO DE 2024

	
LIMPIEZA DE CUNETAS REVSTIDAS PR 66+0300	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DESLIAMIENTOS DE TIERRA PR 64+0690
	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 59+0400	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR58+0650

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

(No Aplica)

8.4 Copia de la Bitácora del mes Correspondiente

(Ver anexo 12)

ANEXOS

Anexo 1

INFORME SEMANAL
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 8 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 18 del 01/03/2024 al 07/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVIIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVIIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT.807.001.492-2		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174,085,373.00
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 87,042,686.50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 261,128,059.50
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	06/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	N.A		
CONTRATO No.	2656-2023	VALOR INICIAL:	$ 375,843,799.00
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	VALOR ADICIONES:	$ 189,945,929.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 565,789,728.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 174,085,373.00	$ 87,042,686.50			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 174,085,373.00	$ 1,450,711.44			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 85,591,975			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 565,789,728.00				$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					$ -
	SALDO DE VIGENCIA		$ -			$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 256,694,249.59	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 172,555,578.89	67.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172,555,578.89	67.22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 175,536,084.44	67.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 175,536,084.44	67.22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,704,268.65	3.33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,704,268.65	3.33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 709 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2024
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 36,267,786.04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: La Admnistracion Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervision a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 565,789,728.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 557,501,635.95	98.54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,792,189.95	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,792,189.95	5.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 88058 DE DICIEMBRE 2023
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 71,619,868.47

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL(NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
2. ROCERÍA EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
7. COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN HACER MURALLA DE CONTENCIÓN ALREDEDOR DEL BORDE DEL TALUD EN EL SITIO CRITICO PR 68+0530.
8. COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN, EN EL PR 56+0096, INCREMENTAR CON SACOS DE ARENA LA BARRERA DE CONTENCIÓN TANTO A LA ENTRADA DE LA ALCANTARILLA COMO EN EL CABEZOTE DE SALIDA TAPONANDO LA CUNETA EN TIERRA EXISTENTE.
9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
10. MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
11. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
12. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.
13. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MEJORAMIENTO PUNTO CRITICO
PR 68+0530



LIMPIEZA DE CUNETAS REVSTIDAS
PR 66+0300



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
PR65+0400

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administracion vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tarra
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE:
No. MAT:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
ADMINISTRACION VIAL – INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 18 DEL 01/03/**2024** AL **07/03/2024**

FECHA: 07 (Día) | 03 (Mes) | 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)

TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 3041 DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: ONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A

CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO **ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.**

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS


LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.


3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCION

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO **REGISTRO DE CHARLAS.**


EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Entrenamiento de trabajador nuevo , un alfiler para desinflar el globo del panico , nunca es demasiado sabio o demasiado viejo , los trabajadores que piensan evitan accidentes.

II. REGISTRO FOTOGARAFICO

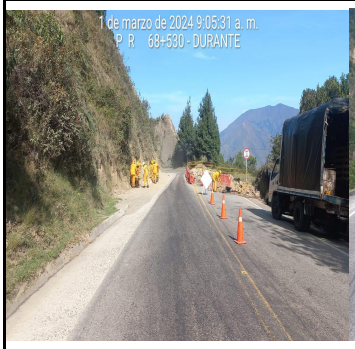

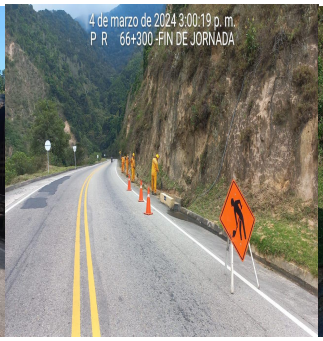



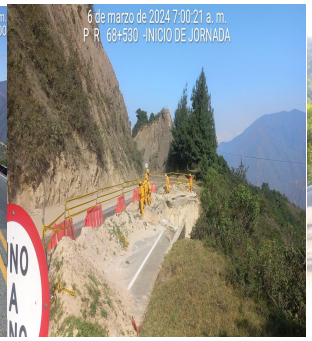



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN

REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X	
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON

No. MAT:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES

No. MAT: 08202-31751 ATL

	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA	
	REGISTRO DE CHARLAS	
Versión: 1.0	Fecha: Mayo 08 de 2020	Código: F-032

No	Fecha:	MARZO 01 DE 2024 VIERNES	MARZO 04 DE 2024 LUNES	MARZO 05 DE 2024 MARTES	MARZO 06 DE 2024 MIERCOLES	MARZO 07 DE 2024 JUEVES
	Tema:	CADENA DE HABITOS	ENTRENAMIENTO DEL TRABAJADOR NUEVO	LOS TRABAJADORES QUE PEINSAN EVITAN ACCIDENTES	NUNCA ES DEMASIADO SABIO O DEMASIADO VIEJO	UN ALFILER PARA DESINFLAR EL GLOBO DEL PANICO
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME					
2	SIXTO JACOME BECERRA	Sixto JAcome	Sixto JAcome	Sixto JAcome	Sixto JAcome	Sixto JAcome
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge omar Sepulveda	Jorge omar Sepulveda	Jorge omar Sepulveda		Jorge omar sepulveda
5	LUIS E PACHECO	Luis Evelio Pacheco	Luis Evelio Pacheco	Luis Evelio Pacheco	Luis Evelio Pacheco	Luis Evelio Pacheco
6	IVAN ORTIZ	Ivan ortiz	Ivan ortiz	Ivan ortiz	Ivan ortiz	Ivan ortiz
7	WILLIAN GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez		William Gomez
8	ELEISON TARAZON					
9	HENRY ORTIZ BECERRA	Henrry Ortiz	Henrry Ortiz	Henrry Ortiz	Henrry Ortiz	Henrry Ortiz
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 15 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 19 del 08/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVIIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVIIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT.807.001.492-2		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174,085,373.00
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 87,042,686.50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 261,128,059.50
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	06/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	N.A		
CONTRATO No.	2656-2023	VALOR INICIAL:	$ 375,843,799.00
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	VALOR ADICIONES:	$ 189,945,929.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 565,789,728.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 174,085,373.00	$ 87,042,686.50			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 174,085,373.00	$ 11,605,691.53			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 75,436,995			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 565,789,728.00				$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					$ -
	SALDO DE VIGENCIA		$ -			$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 256,694,249.59	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 182,538,133.04	71.11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 182,538,133.04	71.11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 185,691,064.53	71.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185,691,064.53	71.11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,154,980.09	3.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,154,980.09	3.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 709 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2024
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 36,267,786.04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: La Admnistracion Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervision a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 565,789,728.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 557,501,635.95	98.54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18,792,189.95	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,792,189.95	5.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 88058 DE DICIEMBRE 2023
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 71,619,868.47

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL(NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
2. ROCERÍA EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 69+0000 AL PR 65+0000.
7. COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN HACER MURALLA DE CONTENCIÓN ALREDEDOR DEL BORDE DEL TALUD EN EL SITIO CRITICO PR 68+0530.
8. COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN, EN EL PR 56+0096, INCREMENTAR CON SACOS DE ARENA LA BARRERA DE CONTENCIÓN TANTO A LA ENTRADA DE LA ALCANTARILLA COMO EN EL CABEZOTE DE SALIDA TAPONANDO LA CUNETA EN TIERRA EXISTENTE.
9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
10. MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
11. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
12. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.
13. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
2. ROCERÍA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.
10. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7008



RUTA No. 7008

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA
PR 64+0604



LIMPIEZA Y REMOCIÓN DESLIAMIENTOS DE TIERRA
PR 64+0690



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
PR61+0600

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administracion vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tarra
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE:
No. MAT:

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
ADMINISTRACION VIAL – INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 19 DEL 08/03/**2024** AL **14/03/2024**

FECHA | 14 (Día) | 03 (Mes) | 2024 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)

TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 3041 DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: ONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A

CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO **ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.**

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS


LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCION

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO **REGISTRO DE CHARLAS.**

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: El Reciclaje , Relleno sanitario , Residuos metalicos , Destino de los residuos solidos , Destino de los residuos solidos , Plantas de reciclajes.

II. REGISTRO FOTOGARAFICO

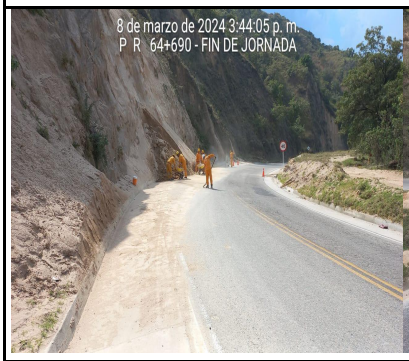







OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIMIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN

REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X	
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X	
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X	

INSPECTOR SISO

FIRMA

NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON

No. MAT:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES

No. MAT: 08202-31751 ATL

	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA	
	REGISTRO DE CHARLAS	
Versión: 1.0	Fecha: Mayo 08 de 2020	Código: F-032

No	Fecha:	MARZO 08 DE 2024 VIERNES	MARZO 11 DE 2024 LUNES	MARZO 12 DE 2024 MARTES	MARZO 13 DE 2024 MIERCOLES	MARZO 14 DE 2024 JUEVES
	Tema:	RECICLAJE	RELLENO SANITARIO	RESIDUOS METALICOS	DESTINO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	PLANTAS DE RECICLAJE
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME					
2	SIXTO JACOME BECERRA					
3	ROSMIRO JACOME					
4	JORGE OMAR SEPULVEDA					
5	LUIS E PACHECO					
6	IVAN ORTIZ					
7	WILLIAN GOMEZ					
8	ELEISON TARAZON					
9	HENRY ORTIZ BECERRA					
10	MAURICIO BECERRA JACOME					
11	CIRO ALFONSO BECERRA					

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 26 / 03 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 20 del 15/03/2024 al 23/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVIIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVIIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT.807.001.492-2		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174,085,373.00
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 87,042,686.50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 261,128,059.50
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	06/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	N.A		
CONTRATO No.	2656-2023	VALOR INICIAL:	$ 375,843,799.00
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	VALOR ADICIONES:	$ 189,945,929.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 565,789,728.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 174,085,373.00	$ 87,042,686.50			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 174,085,373.00	$ 24,662,094.51			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 62,380,592			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 565,789,728.00				$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					$ -
	SALDO DE VIGENCIA		$ -			$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 256,694,249.59	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 195,372,845.52	76.11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 195,372,845.52	76.11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 198,747,467.51	76.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 198,747,467.51	76.11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,154,980.09	3.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,154,980.09	3.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 709 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2024
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 36,267,786.04

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: La Admnistracion Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervision a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 565,789,728.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 565,789,728.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1188 DE ENERO 2024
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 71,035,694.71

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL(NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
2. ROCERÍA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.
10. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
2. ROCERÍA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 60+0000 AL PR 55+0000.
7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.
9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.
10. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA
PR 59+0400



MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA
PR 61+0950



LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES
PR58+0650

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administracion vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tarra
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE:
No. MAT:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 2

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	10/04/2024 (Dia/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MTO RUTINARIO No. 3041 DE 2023 **CONTRATISTA:** Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000. LOTE 4.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **CONSULTOR:**

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ORTIZ BECERRA HENRY	1.005.076.180	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
2	BECERRA JACOME MAURICIO	1.094.578.037	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	PORVENIR	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
3	BECERRA ROPERO CIRO ALFONSO	13.363.532	REPRESENTANTE LEGAL - OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
4	GOMEZ WILLIAM	13.364.454	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
5	ORTIZ GOMEZ IVAN	13.364.767	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
6	PACHECO ASCANIO LUIS EVELIO	2.845.209	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	PORVENIR	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
7	JACOME AREVALO LUIS ALFREDO	5.407.629	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
8	JACOME JACOME ALEXANDER	5.470.538	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	PORVENIR	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
9	TARAZONA ORTIZ ELEISON ANTONIO	88.050.029	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
10	JACOME BECERRA MIGUEL ANGEL	88.141.784	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
11	JACOME BECERRA ROSMIRO	88.149.057	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
12	SEPULVEDA JACOME JORGE OMAR	88.149.104	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
13	JACOME BECERRA SIXTO	88.277.435	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	$ 1.160.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	7920951291	$ 52.000,00	COLPENSIONES	7920951291	$ 208.000,00	$ 52.000,00			

OBSERVACIONES DE LA CONSULTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 01/04/2024

Firma
Nombre: CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
Representante legal
C.C. N° 13.363.532 de Ocaña

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor Administracion vial, Dirección Territorial.

Anexo 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 10/04/2024 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MTO RUTINARIO No. 3041 DE 2023 **CONTRATISTA:** Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **CONSULTOR:** 0

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1034523	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	3041-2023	$ 42.782.375,00	
2023	1034523	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	3041-2023	$ 88.520.623,00	
2023	1034523	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	NACION	3041-2023	$ 42.782.375,00	
2024	23724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	ADICION 1	$ 87.042.686,50	$ 94.296.243,71
						$ 261.128.059,50	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 261.128.059,50**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									1034523	**$ 261.128.059,50**	**$ 261.128.059,50**				**CONTRATO PRINCIPAL**
1	Servicio	01-31 OCT 2023	$ 42.782.374,96	$ 738.968,29	$ 43.521.343,25				1034523 del 2023	$ 217.606.716,25	$ 217.606.716,25	84860 DE FECHA 15NOV2023	X		
2	Servicio	01-30 NOV 2023	$ 42.782.374,96	$ 738.968,29	$ 43.521.343,25				1034523 del 2023	$ 174.085.373,00	$ 174.085.373,00	87151 DE FECHA 07DIC2023	X		
3	Servicio	DICIEMBRE 2023	$ 42.782.374,96	$ 738.968,29	$ 43.521.343,25				1034523 del 2023	$ 130.564.029,75	$ 130.564.029,75	88900 DE FECHA 17DIC2023	X		
4	Servicio	01-25 ENE 2024	$ 35.651.979,13	$ 615.806,91	$ 36.267.786,04				1034523 del 2023	$ 94.296.243,71	$ 94.296.243,71	709 DE FECHA 24FEB2024		X	
5	Servicio	1-31 MAR 2024	$ 42.782.374,96	$ 738.968,29	$ 43.521.343,25				1034523 del 2023 23724 del 2024	$ 50.774.900,46	$ 50.774.900,46			X	**PRESENTE ACTA**
TOTALES			**$ 206.781.478,97**	**$ 3.571.680,07**	**$ 210.353.159,04**					**$ 50.774.900,46**	**$ 50.774.900,46**				

Todas las Actas aprobadas por la Suoervisión deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO	$ 206.781.478,97	$ 3.571.680,07	**$ 210.353.159,04**
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 206.781.478,97	$ 3.571.680,07	**$ 210.353.159,04**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma

Nombre: CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
Representante legal
C.C. N° 13.363.532 de Ocaña

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor administracion vial y Dirección Territorial.

Anexo 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	25	03	24
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3041 - 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 al 23 de marzo del 2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2656 -2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24							735
Lluvias moderadas																					1									9
Lluvias intensas																														0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24							

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
Representante Legal Cooperativa Trabajo Asociado El Tarra
C.C. N° 13.363.532 de Ocaña

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 3041 - 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 01/10/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE ENERO DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 174,085,373.00

VALOR ACUMULADO: $ 174,085,373.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2656-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 17,408,537.30	31	8	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 34,817,074.60	31	8	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-44-101006349

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	31	8	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002843 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 17,408,537.30	31	8	23	1	8	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 34,817,074.60	31	8	23	31	1	27
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **56-44-101006349**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	31	8	23	31	1	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **56-40-101002843** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 7

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24 3 24
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787: Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000: La Ondina - Llano Grand

CONTRATO INTERVENTORÍA N(2656 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 0 **CONTRATISTA:** N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMPERO PLACA KFN242	RENAULT modelo 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
CAMIONETA PLACA HPK295	VOLKSWAGEN modelo 2014	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
CAMPERO PLACA KFN242 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contamientes 2024/07/31
CAMIONETA PLACA HPK295 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contamientes 2024/01/27

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 8

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2656 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 23 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grande - Convencion Ruta 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000

CONTRATO DE OBRA No.: 0 **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	RAFAEL DAVID REYES	13.363.313	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								100%	COINZA S.A.S	23	$ 459.400,0	V	NUEVA EPS	7921078832	$ 264.000,00	PORVENIR	7921078832	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	$ -	
2	RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ	1.091.669.176	Ingeniero Auxiliar II	$ 4.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								100%	COINZA S.A.S	23	$ 292.400,0	V	SANITAS S.A	7921078832	$ 168.000,00	COLFONDOS	7921078832	$ 672.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ -	
3	MONICA ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA	1.007.391.647	Ingeniero Auxiliar I	$ 2.900.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								100%	COINZA S.A.S	23	$ 201.900,0	V	NUEVA EPS	7921078832	$ 116.000,00	COLPENSIONES	7921078832	$ 464.000,00	$ 116.000,00	$ -	$ -	
4	ANYITH TORCOROMA RINCON ALBA	1.091.667.949	Inspectora SISO	$ 1.075.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								50%	COINZA S.A.S	23	$ 80.800,0	V	COOSALUD	7921078832	$ 46.400,00	COLPENSIONES	7921078832	$ 185.600,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
5	TATIANA CARVAJALINO CARRANZA	1.091.534.538	Secretaria	$ 1.356.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								100%	COINZA S.A.S	23	$ 94.400	V	NUEVA EPS	7921078832	$ 54.300	PROTECCION	7921078832	$ 217.000	$ 54.300,00	$ -	$ -	
6	CARLOS FELIPE BACCA MANZANO	5.469.776	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								100%	COINZA S.A.S	23	$ 98.400	V	NUEVA EPS	7921078832	$ 56.600	COLPENSIONES	7921078832	$ 226.200	$ 56.600,00	$ -	$ -	
7	JOSE ANGARITA CLAVIJO	13.359.990	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								100%	COINZA S.A.S	23	$ 98.400	V	NUEVA EPS	7921078832	$ 56.600	COLPENSIONES	7921078832	$ 226.200	$ 56.600,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 14.408.232,00																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 09/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 2656 de 2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 23 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grande - Convencion Ruta 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000

CONTRATO DE OBRA No: 0

CONTRATISTA: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	$375.843.799,00	
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Propios	Adición y prórroga 1	$162.865.647,00	$ 28.626.734,95
2024	160224	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Adición 2 y prórroga 5	$27.080.282,00	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 565.789.728,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								919123 de 2023-08-08		$ 375.843.799,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$ 42.270.894,79	$ 8.031.470,01	$ 50.302.364,80				919123 de 2023-08-08	$ 50.302.364,80	$ 325.541.434,20	81755 de fecha 18/09/2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 60.653.237,55	$ 11.524.115,13	$ 72.177.352,68				919123 de 2023-08-08	$ 122.479.717,48	$ 253.364.081,52	83725 de fecha 26/10/2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	$ 60.184.763,42	$ 11.435.105,05	$ 71.619.868,47				919123 de 2023-08-08	$ 194.099.585,95	$ 181.744.213,05	85740 de fecha 25/11/2023	
4	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 63.595.357,05	$ 12.083.117,84	$ 75.678.474,89				919123 de 2023-08-08	$ 269.778.060,84	$ 106.065.738,16	87181 de fecha 09/12/2023	
								919123 de 2023-08-08	**$ 162.865.647,00**	**$ 268.931.385,16**		**ADICIÓN Y PRÓRROGA 1**
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 82.407.641,43	$ 15.657.451,87	$ 98.065.093,30				919123 de 2023-08-08	$ 367.843.154,14	$ 170.866.291,86	88058 de fecha diciembre 2023	
6	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ 59.693.861,10	$ 11.341.833,61	$ 71.035.694,71				919123 de 2023-08-08	$ 438.878.848,85	$ 99.830.597,15	1188 de fecha 08/03/2024	
7	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 59.835.178,32	$ 11.368.683,88	$ 71.203.862,20				919123 de 2023-08-08	$ 510.082.711,05	$ 28.626.734,95	2051 de fecha 04/04/2024	
								160224 de 2024-03-08	**$ 27.080.282,00**	**$ 55.707.016,95**		**ADICIÓN 2 Y PRÓRROGA 5**
8	01 AL 23 DE MARZO DE 2024	$ 46.521.695,07	$ 8.839.122,06	$ 55.360.817,13				919123 de 2023-08-08 y 160224 de 2024-03-08	$ 565.443.528,18	$ 346.199,82		PRESENTE ACTA
TOTALES		**$ 475.162.628,73**	**$ 90.280.899,45**	**$ 565.443.528,18**					**$ 565.443.528,18**	**$ 346.199,82**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 342.638.390,00	$ 65.101.294,10	$ 407.739.684,10
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 132.524.238,73	$ 25.179.605,35	$ 157.703.844,08
*			
VALOR TOTAL	$ 475.162.628,73	$ 90.280.899,45	$ 565.443.528,18

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 15 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2656-2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 10.

FECHA DE INICIO: 08/08/2023

PLAZO INICIAL: 08/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375,843,799.00

VALOR ACUMULADO: $ 538,709,446.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37,584,379.90	3	8	2023	8	06	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 75,168,759.80	3	8	2023	8	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112,753,139.70	3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223482

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **08/08/2023**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .....

OTRAS PÓLIZAS No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 53,870,944.60	3	8	2023	1	09	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 107,741,889.20	3	8	2023	1	03	2027
Calidad del servicio		$ 161,612,833.80	3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223482

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 05/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Anexo 12

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

24/Feb/24	Contrato suspendido, Mantenimiento Rutinario.
25/Feb/24.	Contrato suspendido, Mantenimiento Rutinario.
26/Feb/24.	Contrato suspendido, Mantenimiento Rutinario.
	Seguimiento e inspección visual por parte de la administración vial, Ruta 7008 Ocaña – Alto del pozo.
	Firmo: =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo: = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL
27/Febrero/24.	Contrato suspendido, Mantenimiento Rutinario.
28/Febrero/24	Contrato suspendido, Mantenimiento Rutinario.
	Seguimiento e inspección visual por parte de la administración vial, Ruta 7008 Ocaña – Alto del pozo.
	Firmo. =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL.
29/Febrero/24.	Contrato suspendido, Mantenimiento Rutinario.
01/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500; y PR68+530.
	Actividades = Reanudación del contrato; se realizan labores en el PR69+0000 como punto inicial de labores hasta el PR67+0800; limpieza de cunetas Revestidas; Mantenimiento punto critico 68+530.; Roceria y desmonte.; limpieza de calzada.
	En la Tarde = Tiempo Seco; transito Normal del PR38+0000.

líder=

Powered by CamScanner

	al PR 69+0000 ; puntos criticos PR49+528 ; PR51+500 y PR 68+530.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202-31751 ATL.
02/Marzo/24	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 -
	al PR69+0000 ; puntos criticos PR49+528 ; PR51+500 y
	PR68+530.
	En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000
	al PR69+000 ; puntos criticos PR49+528 ; PR51+500 y PR68+530.
	Firma = 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202-31751 ATL.
03/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000
	al PR69+0000; puntos criticos PR 49+528 ; PR51+500 y
	PR 68+530.
	En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000.
	al PR69+0000 ; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y
	PR68+530.
	Firma = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No. HAT = 08202-31751 ATL.
04/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo Soleado ; Transito Normal del PR38+000 al
	PR 69.

Powered by CamScanner

	Actividades= Se Realizan actividadel del PR67+300 al pR 66+300 con Adecuacion con barrenos; limpieza de .defensas metalicas; limpieza ole cunetas Revestidas y Roceria.
	En la Tarde= Tiempo Seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000.
	Firma. =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	cargo. = Ingeniero Residente.
	No Hat = 08202-31751 ATL.
05/Mar/24.	En la mañana= Tiempo Soleado; Transito normall del PR38+000 al PR69+000; pasos criticos PR49+0528; PR51+500 y PR68+530.
	Actividades= Se Realizan actiobades del PR66+0000 al PR67+300 con limpieza de alcantarilla; limpieza senales Verticales; limpieza de cunetas Revestidas;
	En la Tarde = Tiempo soleado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; pasos criticos PR49+0528; PR51+500 y PR68+530.
	Firma. =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No Hat = 08202-31751 ATL.
06/Mar/24	En la mañana= Tiempo soleado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; pasos criticos PR49+0528; PR51+500 y PR68+530.
	Actividades= se Realizan actividades del PR66+0000 al PR68+530 con adecuacion punto critico PR68+530; limpieza ole cunetas Revestidas; limpieza ole ole oletensas.
	En la Tarde= Tiempo soleado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; pasos criticos PR49+0528; PR51+500 y PR68+530.

líder=

Powered by CamScanner




	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL.
7/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.
	Actividades = Se Realiza limpieza de señales verticales, limpieza alcantarilla; limpieza obras de arte; atencion y adecuacion punto critico PR68+530; Alineglo de señales verticales; del PR 6470610 a PR69+0000.
	En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL.
08/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+000 puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.
	Actividades = se realiza limpieza de la via, removiendo materia a causa de deslizamientos de Tierra PR64+690; limpieza alcantarilla.
	En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000 puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL.
09/Marzo/24	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal.

Powered by CamScanner

	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202-31751 ATL.
10/Marzo/24	En la mañana= Tiempo Tiempo Soleado ; Transito Normal.
	En la tarde = Tiempo Soleado ; Transito Normal.
	Firma. =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202-31751 ATL.
11/Marzo/24.	En la mañana= Tiempo Seco ; Transito Normal del PR38+0000 al PR 64+0000.
	Actividades= Se realiza limpieza de cunetas ; Alcantarilla; Remoción de deslizamientos de tierra ; Se laboró del PR 64+690 al PR PR64+690.
	En la tarde = Tiempo Seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR 64+0000
	Firma. =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202-31751 ATL.
12/Marzo/24.	En la mañana= Tiempo Seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR64+0000.
	Actividades= Se realiza limpieza de cunetas Revestidas; limpieza Alcantarilla; limpieza de señales Verticales ; Se iniciaron labores del PR63+0800 al PR 62+0700.
	En la tarde= Tiempo Seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR64+0000.

líder=

Powered by CamScanner

	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-81751 ATL.
13/Marzo/2024.	En la mañana= Tiempo seco; Transito Normal del PR33+0000 al PR69+0000.
	Actividades= se Realizan actividades de limpieza de cunetas Revestidas; limpieza alcantarilla; Remoción deslizamiento de Tierra; se laboró del PR63+500 al PR62+0700.
	En la tarde= Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-81751 ATL.
14/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.
	Actividades= se Realiza limpieza alcantarilla; limpieza de cunetas Revestidas; limpieza de detensos metalicos; se laboró del PR62+027a al PR 61+100.
	En la tarde= Tiempo seco; Transito Normal.
	Firma = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-81751 ATL.
15/Marzo/24.	En la mañana= Tiempo seco; Transito Normal.
	Actividades= se Realiza Remoción de deslizamiento de Tierra; limpieza de calzada; limpieza de Alcantarillas; del PR57+500 al PR55+150.

líder=

Powered by CamScanner

	En la Tarde= Tiempo Seco ; Transito Normal.
	Firma. =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202 - 31751 ATL.
16/Mar20/24	En la mañana = Tiempo seco ; Transito Normal
	En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal.
	Firma =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202 - 31751 ATL.
17/Mar20/24.	En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202 - 31751 ATL.
18/Mar20/24	En la mañana= Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Actividades= Se Realiza mejoramiento a la capa de Rodadura
	del PR63+000 al PR43+180
	En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No HAT = 08202-31751 ATL.

líder=

Powered by CamScanner

19/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.
	Actividades = se Realiza limpieza de cunetas Revestidas limpieza alcantarillas; limpieza señales Verticales y limpieza obras de arte; del PR 61+0150 al PR 58+650.
	En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL.
20/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; Pasos Criticos PR49+528.; PR51+500 y PR68+520
	Actividades = se Realizan Actividades para el mejoramiento de la capa de Rodadura (Paicheo). del PR 54+100 al PR 43+320.
	En la Tarde = Tiempo soleado; y lluvias leves; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+000.
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No MAT = 08202-31751 ATL.
21/Marzo/24.	En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos Criticos PR49+528 y PR51+500; PR68+530.
	Actividades = se Realizan Actividades, de limpieza de cunetas Revestidas y en Tierra, limpieza alcantarilla; limpieza de defensas Metalicas; del PR 58+300 al PR 58+250.
	En la Tarde = Tiempo Seco; Transito Normal del PR 38+0000 al PR69+0000.
	Firma =
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

líder=

Powered by CamScanner

22/Mar20/24	En la mañana= Tiempo Nublado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; Puntos criticos PR 49+528; PR51+500 y PR68+520. Actividades= se Realiza mejoramiento a la capa de Rodadura (Parcheo). del PR 51+350 al PR51+350.
	En la Tarde= Tiempo Nublado; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000.
	Firma =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
23/Mar20/24	En la mañana= Tiempo Nublado; Transito Normal. del PR38+0000 al PR69+0000; Puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+520.
	En la Tarde = Tiempo Seco; Transito Normal del PR 38+0000 al PR69+0000.
	Firma. =
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.

Powered by CamScanner
