REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 5.

Consorcio Inter Eco

INFORME MENSUAL N° 4

PERÍODO:

01 AL 31 DE ENERO DE 2025

Contrato de Interventoría N°: 3697 de 2024.

CONVENIOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA, BARAYA, AIPE, HOBO, TELLO, ALGECIRAS, ISNOS, ACEVEDO, SALADOBLANCO, GARZÓN, AGRADO, LA PLATA Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Contenido

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS CONVENIOS ***4***

INTRODUCCIÓN ***6***

INFORMACION CONVENIOS ***9***

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2139 DE 2024, JAC VEREDA LA TROJA **9**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9

1.1.1 Localización 9

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de laejecución del proyecto 9

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 10

1.1.4 Características técnicas del proyecto 10

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11

1.2.1 Información general del contrato 11

1.2.2 Descripción de las actividades 11

1.2.3 Etapa de alistamiento 11

1.2.4 Etapa obras de mejoramiento 11

1.2.5 Seguimiento Ítems no previstos 13

1.2.6 Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría 13

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13

1.3.1 Informe semanal 13

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 14

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contratode obra 14

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 14

1.3.5 Estado general del tiempo 15

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 15

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 15

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 15

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 15

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **17**

2.1 Información general del contrato 17

2.1.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 17

2.1.2 Informes Especialistas y Profesionales 18

2.1.3 Componente ambiental 19

Zona Norte 19

Zona Sur 20

2.1.4 Componente Social 24

Zona Norte 24

Zona Sur 25

2.1.5 Componente SST 28

2.2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33

2.2.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 33

2.2.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría 33

2.2.3 Información financiera y presupuestal contrato de Interventoría 34

2.2.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 35

2.2.5 Otros documentos seguimiento mensual 35

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **35**

4. ANEXOS **38**

4.1 Relación de correspondencia 38

4.2 Registro Fotográfico 54

4.3 Bitácora 55
4.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios 56

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS CONVENIOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/1/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** ENERO 2025

CONVENIO No.: 2139 - 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 2/9/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/3/2025
PLAZO ACUMULADO: 31/3/2025

VALOR INICIAL : $ 201,320,555.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201,320,555.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3697 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER ECO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSÉ MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento construcción placa huella	ML	138
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	1
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento construcción placa huella	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	0	0
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
BASICO DE OBRAS	151,622,742.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4,548,682.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,149,131.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200,320,555.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
BASICO DE OBRAS	39,060,228.80	39,060,228.80
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	39,060,228.80	39,060,228.80

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 151,622,742.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 39,060,228.80
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 25.76%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMPACTACIÓN SUBBASE - TOMA DE DENSIDADES





FUNDICIÓN DE PLACA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NO APLICA EN EL PERIODO REPORTADO

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-59752 CA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se profundiza en la comprensión desde el territorio sobre las dinámicas económicas, sociales y culturales, donde se pone en primer plano la interacción entre el campo y la ciudad. Gracias a los diálogos regionales, los objetivos del PND se han definido de manera colectiva, respetando las diversidades territoriales, étnicas y culturales.

Que en el documento bases del Plan Nacional de Desarrollo, numeral 5. Convergencia Regional: se destaca como objetivo la construcción y mejoramiento de vías regionales que generen interconexión para el intercambio de productos agrícolas.

Que con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado *“**CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**”* a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Por tal razón, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes Convenios Solidarios con los Organismos de Acción Comunal del Departamento del Huila:

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
COLOMBIA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VERSALLES	2708-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL HORIZONTE	2190-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTANA	2752-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL PARAISO	2269-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL ESPERANZA	2433-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION	2138-2024

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
	JUNTA DE ACCION COMUNAL ANTILLAS	2151-2024
BARAYA	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TROJA	2139-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL HOTEL	2150-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA SIRIA	2110-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO	2423-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PARADA	2105-2024
AIPE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CALLE REAL	3609-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL PRAGA	3768-2024
HOBO	JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA FRIA	2060-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BATAN	2108-2024
TELLO	JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTA DEL SOL	2318-2024
ALGECIRAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL PARAISO PUEBLO VIEJO	2234-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL COLON	2692-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL NARANJOS BAJOS	2130-2024
ISNOS	JUNTA DE ACCION COMUNAL SALTOS DE BORDONES	2087-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SINAI	2170-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA MURALLLA	2084-2024
ACEVEDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PRIMAVERA	2788-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE RIECITO	2639-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VERSALLES	2338-2024
SALADOBLANCO	JUNTA DE ACCION COMUNAL MORELIA	2109-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CABAÑA	2280-2024
GARZÓN	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MESÓN	2063-2024
AGRADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GALDA	3776-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAÑADA	4020-2024
LA PLATA	JUNTA DE ACCION COMUNAL GALLEGO	2799-2024

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
NÁTAGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YARUMAL	2064-2024
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNA CASCAJOSA	2111-2024

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024 efectuó el contrato No. 3697 de 2023 con orden de inicio 2024S-VBOG-071700 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. José Miguel Ortega Ortiz.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenidode la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con laconstrucción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2025.

INFORMACION CONVENIOS

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2139 DE 2024, JAC VEREDA LA TROJA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Localización

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel – La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tutumito y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Huila del Instituto Nacional de Vías.

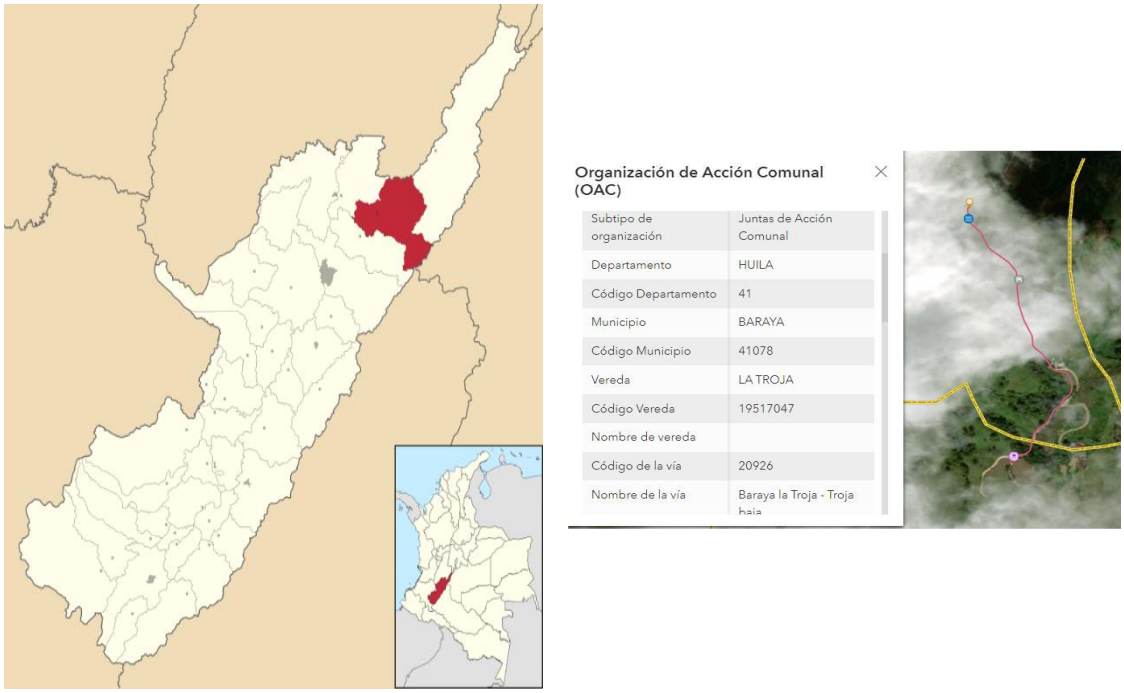


Ilustración 8. Localización General Municipio de Baraya – Vereda La Troja Sitio de obra del Convenio 2139 de 2024

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de laejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto, la población de las Veredas ubicadas en la zona de influencia y que se verán beneficiadas por el mejoramiento del corredor vial son Begonia, Totumito, San Pablo, Manzanares, Miaramar, Montellano y San Juan, Veredas productoras y comercializadoras de café, productos agrícolas, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al Municipio de Baraya.

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 138 m de material de afirmado en regular estado, puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que a lo largo del corredor existe presencia de baches.



Foto 7. Estado inicial de la vía Vereda La Troja



Foto 8. Estado inicial de la vía Vereda La Troja

1.1.4 Características técnicas del proyecto

Las actividades u obras a ejecutar consisten en el mejoramiento vial mediante la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta el levantamiento de la información realizada por los profesionales de la Dirección Territorial Huila, permitiendo priorizar las necesidades básicas de la comunidad para mejorar las condiciones la transitabilidad en el tramo de área de influencia del Organismo de Acción Comunal de la vereda La Troja las cuales se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR DE INTERVENCIÓN	UBICACIÓN	OBRA PREVISTA DE MEJORAMIENTO	
				PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
Huila	Baraya	Hotel – La Troja	PR 00+000 PR 00+138	138	-
Huila	Baraya	Hotel – La Troja	PR 00+200	-	1
TOTAL DE INTERVENCIÓN				**138**	**1**

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERISTICAS
VEREDA LA TROJA – MUNICIPIO DE BARAYA	Construcción de Placa Huella	• Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) – Placa, VR, Cuneta y Bordillos • Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 Mpa 60% concreto – 40% agregado ciclópeo) • Subbase Granular Clase C • Espesor de Subbase Granular = 0,15 m • Longitud de Placa Huella = 138 m • Longitud Huella = 3,0 m • Ancho de Placa Huella = 5,0 m • Espesor de Placa Huella = 0,15 m • Longitud Viga Riostra = 5,0 m

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERISTICAS
		• Ancho de Viga Riostra = 0,20 m • Alto de Viga Riostra = 0,25 m • Sobreancho Promedio Ciclopeo = 0,90 m • Longitud de Cuneta = 276 m • Ancho de Cuneta = 0,55 m • Espesor de Cuneta = 0,15 m • Longitud de Bordillo = 276 m • Ancho de Bordillo = 0,15 m • Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
	Construcción de alcantarillas	• Cantidad de Alcantarillas = 1 Und • Longitud de Alcantarilla = 5,0 m • Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa – Mezcla in situ • Concreto reforzado de resistencia 14 Mpa – Mezcla in situ • Tubería de concreto Ø = 36"= 5 Und • Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	2139 DE 2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
RUT	891.102.335-3
VALOR INICIAL	$201.320.555
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$201.320.555
ORDEN DE INICIO	02/09/2024
PLAZO INICIAL	31/12/2024
PRÓRROGA N°1	31/03/2025

1.2.2 Descripción de las actividades

1.2.3 Etapa de alistamiento

- Mediante oficio 211-1-399 de fecha 03 de enero de 2025, la Interventoría le realiza a la JAC de la Vereda La troja, la entrega de los diseños de mezcla.

1.2.4 Etapa obras de mejoramiento

- Mediante correo electrónico de fecha 15 de enero de 2025, el Ing. Luis Miguel Caquimbo Gómez – Residente de Obra de la JAC de la Vereda La Troja, entrega a la interventoría

el presupuesto ajustado, cronograma de obra ajustado y plan de compras N°2, para su respectiva revisión y aprobación.

- Mediante oficio 211-1-472 de fecha 17 de enero de 2025, la Interventoría le realiza a la JAC de la Vereda La Troja el requerimiento en la entrega oportuna de los informes financieros y sus anexos, en responsabilidad del Contador.
- Mediante oficio 211-1-478 de fecha 17 de enero de 2025, la Interventoría le realiza a la JAC de la Vereda La Troja el requerimiento en la entrega oportuna de los informes técnicos y sus anexos, en responsabilidad del Ingeniero Residente.
- Mediante comité operativo N°003 de fecha 20 de enero de 2025, se da aprobación al plan de compras N°2 y al cambio de proveedores de maquinaria, transporte, lo mismo que al cambio de precios de los materiales de cantera.
- Mediante correo electrónico de fecha 30 de enero de 2025, el Ing. Luis Miguel Caquimbo Gómez – Residente de Obra de la JAC de la Vereda La Troja, solicita a la interventoría el cambio de Maestro de Obra y envía la hoja de vida del nuevo Maestro.
- Mediante oficio 211-1-567 de fecha 30 de enero de 2025, la Interventoría le informa a la JAC de la Vereda La Troja, cuales son los documentos financieros que se requieren para la liquidación del convenio.
- Mediante oficio 211-1-570 de fecha 31 de enero de 2025, la Interventoría envía a la JAC de la Vereda La Troja, el estado de aprobación para el siguiente personal:
  MAESTRO DE OBRA: LIBARDO FIGUEROA MURCIA
  ESTADO DE REVISIÓN DE EXPERIENCIA SOLICITADA: CUMPLE
- Se realizó la excavación mecánica para la construcción de alcantarilla.
- Se realizó la instalación de tubería en concreto reforzado de Ø=36”.
- Se realizó el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realizó visita técnica al sitio de las obras.
- Se realizó la fundición de solado de limpieza para instalación de tubería en concreto reforzado de Ø=36”.
- Se realizó la instalación de tubería en concreto reforzado de ø=36”.
- Se realizó la instalación y compactación de material de subbase granular.
- Se realizó excavaciones, instalación y compactación de sub-base, figurado de acero de refuerzo, vaciado de concreto obras drenaje,instalación de formaleta para fundición de losas de concreto, toma de muestras de densidad, instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta obras drenaje.
- Se realizó la instalación de tubería de 36”, instalación de acero de refuerzo para caja de encole cabezal de la alcantarilla.
- Se realizó la inspección de los materiales allegados a obra y que su debido almacenamiento.
- En decisión conjunta la JAC solicitaron el cambio de placa huella a pavimento rígido quedando parcialmente en una longitud de 109 ml.
- Se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados correspondientes al mes de enero de 2025, obteniendo un porcentaje de avance ejecutado del proyecto para el periodo reportado es del 25.76%.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BASICO DE OBRA	$ 151,622,742.00	N/A	$ 39,060,228.80	$ 39,060,228.80	$ 112,562,513.20
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4,548,682.00	N/A	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,548,682.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,149,131.00	N/A	$ 0.00	$ 0.00	$ 44,149,131.00

1.2.5 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.6 Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio.

Mediante oficio 211-1-472 de fecha 17 de enero de 2025, la Interventoría le realiza a la JAC de la Vereda La Troja el requerimiento en la entrega oportuna de los informes financieros y sus anexos, en responsabilidad del Contador.

Mediante oficio 211-1-478 de fecha 17 de enero de 2025, la Interventoría le realiza a la JAC de la Vereda La Troja el requerimiento en la entrega oportuna de los informes técnicos y sus anexos, en responsabilidad del Ingeniero Residente.

Mediante comité operativo N°003 de fecha 20 de enero de 2025, se da aprobación al plan de compras y al cambio de proveedores de maquinaria, transporte, lo mismo que al cambio de precios de los materiales de cantera.

Mediante oficio 211-1-570 de fecha 31 de enero de 2025, la Interventoría envía a la JAC de la Vereda La Troja, el estado de aprobación para el siguiente personal:
MAESTRO DE OBRA: LIBARDO FIGUEROA MURCIA
ESTADO DE REVISIÓN DE EXPERIENCIA SOLICITADA: CUMPLE

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

La interventoría en la etapa de ejecución de obras de mejoramiento realiza el apoyo y acompañamiento a la JAC.

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 13: Desde el 30 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025.
- Semana 14: Desde el 06 de enero de 2025 al 12 de enero de 2025.
- Semana 15: Desde el 13 de enero de 2025 al 19 de enero de 2025.
- Semana 16: Desde el 20 de enero de 2025 al 26 de enero de 2025.
- Semana 17: Desde el 27 de enero de 2025 al 02 de febrero de 2025.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

Las obras se iniciaron el 08 de enero, y durante ese periodo se utilizó maquinaria como retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador para ejecutar labores de excavación y conformación de la vía, por lo cual se relaciona la maquinaria utilizada.

Se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contratode obra

El día 08 de enero se iniciaron las actividades de obra del convenio y se realizó la vinculación e inicio del personal relacionado a continuación:

N°	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	LUIS MIGUEL CAQUIMBO GÓMEZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	08/01/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2	LUIS FERNANDO CASTRO AVILES	CONTADOR	08/01/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3	LIBARDO FIGUEROA	MAESTRO DE OBRA	08/01/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4	ANGEL ALBERTO CAVIEDES	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025	OBRA O LABOR
5	HAMINTON JAIR AVILES	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025	OBRA O LABOR
6	WILSON EFREN AGUILAR	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025	OBRA O LABOR
7	MIGUEL ANTONIO MEJÍA	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025	OBRA O LABOR
8	HELI PERDOMO	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025	OBRA O LABOR
9	JESUS ANTONIO CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025	OBRA O LABOR

Se anexa el formato “PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”.

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 2139 de 2024, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2024”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 86124 de fecha 2024-05-07 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-51102ª-2402041-02 por valor $ 200,320,555.00.

Con el fin de realizar un control sobre el desembolso entregado por parte de la entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”, ya que no se modifica.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

1.3.5 Estado general del tiempo

El clima registrado en obra fue tomado desde el 08 de enero que iniciaron las labores en campo, teniendo en la mayoría de días tiempo seco y en algunos periodos lluvias moderadas, que no causaron inconvenientes en la ejecución de las actividades.

Se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”.

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la toma de densidades al material sub-base granular. Por lo anterior, se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”.

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el Convenio inicial y prórroga No.1:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 1 de fecha 27/09/2024 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 1 de fecha 27/09/2024.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/9/2024	31/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5%	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/9/2024	31/12/2027
TOTAL	20%	$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/12/2024

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”.

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías – Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:
  Teniendo en cuenta la programación No. 1 presentada por el ingeniero residente de obra, a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 25.05%.

  De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizará la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-actas y acta de recibo parcial de obra para convenios. Para el periodo reportado no se anexa el formato “ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO”.

- Actas de reunión y comités de obra:
  Durante el periodo reportado se realizó un comité operativo.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024
FECHA DE PUBLICACIÓN	7/06/2024
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.6698942
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	3697 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER ECO
NIT	901.865.515-1
VALOR INICIAL	$ 1.546.789.418,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.546.789.418,00
ORDEN DE INICIO	02/10/2024
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	-
REANUDACIÓN No. 1	-
PRÓRROGA No. 1	Hasta el 31/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 31/03/2025
DIRECCIÓN	Calle 17 # 7a-37, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3108827068
SUPERVISOR	JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ

2.1.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones de la JAC de cada convenio.
- Revisión de cotizaciones
- Realización de comités operativos para la aprobación de cotizaciones de materiales, maquinaria, transporte, plan de compras.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por la JAC de cada convenio
- Realización y entrega para su debido trámite del acta de costo del mes de diciembre de 2024.

- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato
- Archivo actualizado de la Interventoría
- Comunicados dirigidos al contratista
- Comunicados dirigidos al INVIAS
- Reuniones con las JAC
- Asistir a las reuniones y comités de seguimiento programados por el INVIAS
- Visitas técnicas a los sitios de ejecución de las obras
- Elaboración de informes semanales
- Elaboración de informes mensuales
- Apoyo y acompañamiento técnico en la construcción de obras
- Revisión y aprobación de diseños por parte del Especialista en Geotecnia y pavimentos de la Interventoría

Lo anterior, mediante la realización de comités operativos para aprobación de cotización de materiales, suministros, transporte y maquinaria, plan de compras con el fin de evaluar costo/beneficio y trámite de transferencia de recursos que permite la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Por otra parte, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños de las obras ejecutadas en los convenios solidarios en ejecución.

2.1.2 Informes Especialistas y Profesionales

Durante el mes de enero de 2025, las labores del Director y Residente de interventoría consistieron en requerir a los presidentes de las JAC las cotizaciones de materiales, maquinaria, equipos, transporte de material, revisarlas y realizar los comités técnicos para su respectiva aprobación, la entrega de los diseños de pavimento para la respectiva revisión y aprobación por parte del Especialista y el apoyo y acompañamiento técnico y administrativo en la construcción de las obras y entrega de informes.

Igualmente, se acompañaron las labores administrativas que permitieron la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos.

Así mismo, se requiere al residente del proyecto, atender los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, como también atender las observaciones realizadas por el Especialista en Geotecnia y pavimentos de la Interventoría.

Se requiere al residente y contador el diligenciamiento de los formatos entregados por el INVIAS adoptados a los convenios solidarios, los cuales permiten llevar un seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, jurídico del convenio.

Se informa a las JAC de los documentos financieros que deben entregar para la liquidación de los convenios.

2.1.3 Componente ambiental

Zona Norte

- **Apoyo a Comités de aprobación PLAN DE COMPRAS.**

Durante este periodo, se realiza apoyo en los comités para aprobación de plan de compras No 3 Y 4 de los siguientes convenios:
- 20 enero de 2025, vereda EL HOTEL
- 20 enero de 2025, vereda LA TROJA
- 22 enero de 2025, vereda EL PROGRESO

- **Recepción y Evaluación de la documentación ambiental inicial**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación ambiental inicial del convenio 2110 de 2024, en donde se recibe la siguiente documentación:
- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS.
- MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.
- ANEXOS:

Planos de localización.
Registro fotográfico inicial.
Permisos autorizaciones, Concesiones: Manejo Agua Superficial
Manejo Material de Excavación (Solicitud para aprobación de reutilización del material de excavación, con su respectiva aprobación por parte de interventoría)
Materiales de Cantera (Licencia Ambiental y RUCOM).
Manejo de vertimientos y Residuos Sólidos.
Certificado interventoría de NO PAGA.
Plan de Gestión Ambiental – PGA (cuentan con su respectiva aprobación por parte de interventoría).

- **Remisión documentación ambiental inicial aprobada a la SS del INVIAS**

Se realiza la respectiva radicación de la documentación ambiental inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, de la siguiente manera: convenio 2110 de 2024, radicado 2025E-VUVRAZ-002046.

- **SOLICITUD CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO CAM**

Se envían comunicados a la CAM, solicitando el certificado de NO PROCESOS EN CURSO, para los siguientes convenios:
- 2269 de 2024
- 2108 de 2024
- 2318 de 2024
- 2708 de 2024

OBTENCIÓN CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO POR PARTE DE LA CAM de los convenios:

- 2269 de 2024
- 2108 de 2024

- **VISITAS A CAMPO CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGA de los convenios 2708 DE 2024, 2105 DE 2024 y 2318 DE 2024.**

Zona Sur

- **Municipio Algeciras:**

Convenio 2234 – 2024: Paraíso Pueblo Viejo
El día 24 de enero de 2025, una vez revisada y ajustada la documentación ambiental inicial, se remitió a la sub dirección de sostenibilidad del INVIAS para la No Objeción.

Convenio 2692 – 2024: Colon
El día 10 de enero de 2025, se realizó comité operativo de aprobación de cotizaciones para el plan de compras. Se revisó los elementos ambientales que debe adquirir la JAC para la ejecución de la obra. Se reiteró la entrega de la documentación ambiental inicial, ya que hicieron una entrega parcial de lo requerido.

Convenio 2130 – 2024: Naranjos Bajos
Se hizo seguimiento telefónico al residente de obra, con el fin de que haga entrega de la documentación ambiental inicial completa, conforme a lo requerido desde el mes de noviembre de 2024. A la fecha se ha realizado entrega incompleta de la documentación.

- **Municipio de Isnos:**

Convenio 2087-2024: Salto de Bordones
El 16 de enero de 2025, se realizó visita en obra para hacer seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó uso del punto ecológico, manejo de materiales de obra, cubrimiento de materiales con plástico, manejo de bolsas de cemento vacías.

El 21 de enero de 2025, se presentó una solicitud a la CAM de que nos certifiquen que el convenio no presenta procesos activos con la Corporación, teniendo en cuenta que ya se encuentran finalizando la obra. (Anexo 2. Oficio No procesos Bordones).

El 27 de enero de 2025, La CAM hizo entrega del certificado de NO PROCESOS en curso del convenio. (Anexo 3. Certificado CAM Bordones)

- **Convenio 2170-2024: Sinaí**

El 10 de enero de 2025, se realizó comité operativo de seguimiento al convenio, se hizo la solicitud de hacer entrega del informe mensual ambiental. (Anexo 4. Comité operativo Sinaí).

El 16 de enero de 2025, se realizó visita en obra para hacer seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó uso del punto ecológico, manejo de materiales de obra, cubrimiento de materiales con plástico. Se solicitó hacer entrega del informe mensual ambiental. Se hizo la

recomendación de hacer un correcto manejo de bolsas de cemento vacías, acopiarlas dentro del campamento de obra y disponerlas con el carro recolector de residuos de la vereda.

El 21 de enero de 2025, se presentó una solicitud a la CAM de que nos certifiquen que el convenio no presenta procesos activos con la Corporación, teniendo en cuenta que ya se encuentran finalizando la obra. (Anexo 5. Oficio No Procesos Sinaí).

El 23 de enero de 2025, Se apoyó con el envió de las observaciones del especialista en geotecnia. (Anexo 6. Correo especialista Sinaí).

El 27 de enero de 2025, La CAM hizo entrega del certificado de NO PROCESOS en curso del convenio. (Anexo 7. Certificado CAM Sinaí).

- **Convenio 2084-2024: La Muralla**

El 16 de enero de 2025, se realizó visita en obra para hacer seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó uso del punto ecológico, manejo de materiales de obra, cubrimiento de materiales con plástico, manejo de bolsas de cemento vacías. Se solicitó hacer entrega del informe mensual ambiental.

El 21 de enero de 2025, se presentó una solicitud a la CAM de que nos certifiquen que el convenio no presenta procesos activos con la Corporación, teniendo en cuenta que ya se encuentran finalizando la obra. (Anexo 8. Oficio No Procesos Muralla).

El 27 de enero de 2025, la CAM dio respuesta acerca de los NO PROCESOS en ejecución del convenio. (Anexo 9. Certificado CAM Muralla).

- **Municipio de Acevedo:**

Convenio 2788-2024: La Primavera

El día 7 de enero de 2025, se hizo entrega de la documentación ambiental inicial a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS mediante el oficio 211-1-407. (Anexo 10. Oficio Entrega Documentación inicial Primavera).

El 23 de enero de 2025, Se apoyo dando respuesta a las observaciones del especialista en geotecnia. (Anexo 11. Correo especialista).

- **Convenio 2639-2024: San José de Riecito**

El día 8 de enero de 2025, se hizo la entrega de la documentación ambiental inicial a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS mediante el oficio 211-1-415.

- **Convenio 2338-2024: Versalles**

El 27 de enero de 2025, apoyé la realización del comité operativo para aprobación de la hoja de vida del contador y para dar reinicio a la ejecución del convenio. Se hace solicitud de entrega de la revisión del diseño del pavimento y alcantarillas, así como la documentación ambiental inicial.

- **Municipio de Saladoblanco:**

- **Convenio 2109-2024: Morelia**

El día 15 de enero de 2025, apoyé la realización del comité operativo de seguimiento al convenio, debido a que a la fecha no se ha recibido las cotizaciones del plan de compras, le que no ha permitido avanzar en el convenio. Dicho comité tuvo participación la territorial sur, en cabeza del ingeniero José Miguel Ortega. Se dejaron compromisos por parte del residente de obra.

- **Convenio 2280-2024: La Cabaña**

El 24 de enero de 2025, apoyé la revisión de las cotizaciones presentadas por los convenios de La Cabaña y Morelia para el plan de compras. Se realizó por llamada telefónica la revisión de las mismas y se solicitó realizar ajustes debido a que algunos elementos solo presentan 1 cotización.

- **Municipio de Garzón:**

- **Convenio 2063-2024: El Mesón**

El día 9 de enero de 2025, se llevó a cabo el comité operativo No. 6 en el cual se reitera la entrega de la documentación ambiental inicial completa, ya que solo se hizo parte de la misma. Así mismo, se informa al residente de obra cuales son los documentos necesarios para el proceso de liquidación del convenio. (Anexo 13. Comité Operativo 6 El Mesón).

El día 14 de enero de 2025: Se realizó visita de seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó en campo la implementación de las medidas ambientales (cubrimiento con plástico de los materiales, punto ecológico, campamento de obra, manejo de bolsas de cemento vacías). Se realizó charla socio ambiental con el personal del convenio y adicionalmente se realizó comité operativo de seguimiento. (Anexo 14. Comité Operativo 7 El Mesón, Anexo 15. Charla socio ambiental Mesón).

El día 21 de enero de 2025, con el propósito de llevar a cabo los trámites de liquidación del convenio, se solicitó a la CAM se nos informe si a la fecha se han presentado procesos sancionatorios relacionados al contrato de obra correspondiente. (Anexo 16. Oficio No Procesos Mesón).

El día 22 de enero de 2025, después de haber revisado y ajustado la documentación ambiental inicial del convenio se remitió la documentación ambiental inicial a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS con el fin de la no objeción. (Anexo 17. Oficio entrega documentación ambiental inicial El Mesón).

El día 23 de enero de 2025, se realizó comité de seguimiento. Se solicitó la entrega de los informes ambientales mensuales. (Anexo 18. Comité Operativo 8 El Mesón).

El día 29 de enero de 2025, se recibe por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, el certificado de NO PROCESOS en curso, donde ratifican que a la fecha no se adelanta ningún tipo de proceso sancionatorio. Dicho documento es requisito para el proceso de liquidación. (Anexo 19. Certificado CAM El Mesón).

- **Municipio La Plata:**

- **Convenio 2799-2024: Gallego**

El 23 de enero de 2025, se realizó visita a campo, con el fin de hacer seguimiento al convenio y verificar las medidas ambientales que están implementando en obra. Se realizó charla socio ambiental.

El 24 de enero de 2025, se realizó comité operativo de seguimiento. Se hizo nuevamente la solicitud de hacer entrega de la documentación que se encuentra pendiente del área ambiental. Se hizo recomendaciones para el manejo de las bolsas de cemento y del material de excavación.

- **Municipio Nátaga:**

- **Convenio 2064-2024: Yarumal**

El día 17 de enero de 2025, se realizó visita al sitio donde se ejecutarán las obras del convenio. Se verificó el correcto acopio de materiales.

El día 18 de enero de 2025, se realizó comité operativo de seguimiento al convenio, definiendo fecha de inicio de obra. Y suministro de los demás materiales necesarios para la ejecución de la obra. Se solicitó hacer entrega de la documentación ambiental inicial. Y presentar las tres cotizaciones para la compra del punto ecológico.

El 31 de enero de 2025, se realizó comité operativo para aprobación de compra del punto ecológico, y aprobación de pago de nómina, EPP para 2 trabajadores que ingresarán a la obra como MONC. Se solicitó hacer entrega de la documentación ambiental inicial.

- **Convenio 2111-2024: Cascajosa**

El 13 de enero de 2025, apoye en el comité de aprobación de cotizaciones del plan de compras, se revisaron costos de elementos ambientales para compra (plástico negro, punto ecológico). Adicionalmente, se hizo de nuevo la solicitud de entrega de los documentos ambientales iniciales.

2.1.4 Componente Social

Zona Norte

- Se realizó cargue de información de convenios faltantes en el drive
- Se recibió documentación para inversión del rubro social asignado a la JAC santana.
- Se realizó oficio de reiteración entrega de documentación social para radicación ante subdirección de sostenibilidad del convenio 2151- 2024 Antillas.
- Se realizó oficio de reiteración entrega de documentación social para radicación ante subdirección de sostenibilidad del convenio 2433 - 2024 Esperanza.
- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica de interventoría en la vereda Puerta del sol Tello, para hacer seguimiento y orientaciones sobre avances en la obra social.
- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica de interventoría en la vereda Versalles Colombia, para hacer seguimiento y orientaciones sobre avances en la obra social.
- Se realizó comité en conjunto con la parte técnica para dar aprobación al plan de inversión social presentada por la JAC y radicado ante sostenibilidad del convenio 2752-2024 Santana.
- Se realizó comité en conjunto con la parte técnica para dar aprobación al plan de inversión social presentada por la JAC y radicado ante sostenibilidad del convenio 2269-2024 Paraíso.
- **Interacción con presidentes de Juntas de Acción**
- Se realizó mediante llamada telefónica solicitud a los presidentes de JAC de las veredas Antillas y esperanza, apoyo para que los ingenieros residentes de sus convenios alleguen la información social que se les ha solicitado hace 4 meses, esto en el fin de realizar radicación en sostenibilidad antes de terminar vigencia y así puedan iniciar ejecución de dichas obras.
- **Interacción con residentes de obra**
- Durante este periodo se realizó orientación vía WhatsApp a las inquietudes de los residentes frente al diligenciamiento de los formatos sociales solicitados para la inversión social:
- **MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL**

INFORME SOCIAL

- se realizó visita social en la vereda Puertas del sol Tello, para ejecutar charla temática sobre inclusión de género.
- se realizó visita social en la vereda Versalles Colombia, para ejecutar charla temática sobre inclusión de género.

- Se remite acta de entrega de materiales, orden de aceptación y compromiso a las JAC que ya tienen aprobada el plan de inversión social.

- **Remisión documentación social inicial a la SS**

- Se recibió documentación del Plan de Inversión social de la vereda Troja de Baraya, y posterior a su revisión, se indicó al ingeniero residente que debía allegar la información faltante, una vez se tiene la documentación completa se procede a radicar el Plan de Inversión Social ante subdirección de sostenibilidad los cuales emiten el radico 2025E-VUVRAZ-001723.

- Se recibió documentación del Plan de Inversión social de la vereda Santana de Colombia, y posterior a su revisión, se indicó al ingeniero residente que debía allegar la información faltante, una vez se tiene la documentación completa se procede a radicar el Plan de Inversión Social ante subdirección de sostenibilidad los cuales emiten el radico 2025E-VUVRAZ-005381.

- Se recibió documentación del Plan de Inversión social de la vereda Paraíso de Colombia, y posterior a su revisión, se indicó al ingeniero residente que debía allegar la información faltante, una vez se tiene la documentación completa se procede a radicar el Plan de Inversión Social ante subdirección de sostenibilidad los cuales emiten el radico 2025E-VUVRAZ-003198.

- **Otras actividades**

- Se realizó apoyo social a la parte técnica para dialogar con la comunidad y concertar los posibles cambios que plantean de los puntos establecidos para otros más críticos y que se encuentran dentro del tramo definido.

Zona Sur

- **Asistencia a Comités Operativos de Seguimiento.**

Durante este periodo, se asistió a los comités operativos desarrollados para los siguientes convenios:
2063 – 2024 El Mesón – Garzón (09/01/2025): Se realizó comité operativo de seguimiento al convenio con el fin de revisar los avances a la fecha y así mismo revisar el estado actual de la documentación del Plan de Inversión Social. Se dejan compromisos para la entrega de la misma.

2692 – 2024 Colon – Algeciras (10/01/2025): Se realizó comité operativo de aprobación de cotizaciones para el plan de compras. Se realiza la verificación del Plan de Inversión Social; en donde hace falta el documento que expide la alcaldía para la Obra de Participación Comunitaria que va a realizar la JAC.

2111 – 2024 La Cascajosa - Nátaga (13/01/2025): Se realizó comité operativo de aprobación de cotizaciones. Se reiteró la importancia de realizar el envío del Plan de Inversión Social con el fin de que este sea radicado a la Subdirección de Sostenibilidad y así mismo aprobar las compras de los materiales para que den inicio a la OPC.

2692 – 2025 Colon – Algeciras (15/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de

aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Construcción e instalación de cubierta para la caseta comunal de la vereda Colon".

2130 – 2025 Los Naranjos Bajos – Algeciras (22/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Construcción de Placa de Contrapiso en el comedor de la I.E. Paraíso".

2063 – 2024 El Mesón – Garzón (23/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Embellecimiento a la I.E. Agropecuario del Huila Vereda El Mesón".

2799 – 2024 Gallego – La Plata (24/01/2025): Se realiza comité operativo en el cual se solicita las correcciones al Plan de Inversión Social.

2234 – 2024 Paraíso Pueblo Viejo – Algeciras (25/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: “Mejoramiento del parque infantil para el sector de Pueblo Viejo de la Inspección de Policía de Paraíso”

2338 – 2024 Versalles – Acevedo (27/01/2025): Se realiza comité operativo, en el cual se explica la documentación inicial que se debe entregar para el Plan de Inversión Social.

2799 – 2025 Gallego – La Plata (29/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Construcción de placa contra piso en concreto e instalación de cubierta".

2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (30/01/2025): Se realizó comité operativo, en el cual se reiteró la importancia de realizar el envío del Plan de Inversión Social con el fin de que este sea radicado a la Subdirección de Sostenibilidad y así mismo aprobar las compras de los materiales para que den inicio a la OPC.

2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (30/01/2025): Se realizó comité operativo para aprobación de pagos; adicionalmente se manifiesta la importancia de iniciar con la OPC; el residente manifiesta que la próxima semana llevarán los materiales para la obra social.

2109 – 2024 Morelia – Saladoblanco (31/01/2025): Se realizó comité operativo con el fin de dar aprobación a las cotizaciones de la obra civil. Así mismo se reitera la importancia de enviar el Informe Social que hace parte de la documentación del Plan de Inversión Social.

- **Recepción y evaluación de Plan de Inversión Social:**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación del Plan de Inversión Social:
2063 - 2024: El Mesón – Garzón.
2799 – 2024: Gallego – La Plata.
De los cuales se recibió la siguiente documentación:

- MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL.
- INFORME SOCIAL.
- ANEXO (3 Cotizaciones).
- CERTIFICADO DE INTERVENCION (donación o posesión del predio donde se va a realizar la inversión).

Así mismo, se recibió información parcial de otros convenios, la cual está en proceso de revisión.
2109 – 2024: Morelia – Saladoblanco.
2280 – 2024: La Cabaña – Saladoblanco.

Estos Planes de Inversión se encuentra en ajustes por parte de la JAC y el residente de obra, ya que no allegaron el Informe Social y el certificado de intervención.

- **Remisión documentación social inicial enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez se revisó y se realizaron los ajustes correspondientes a los documentos entregados por parte de los contratistas de obra, se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:
- Oficio 211-1-448, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2692 – 2024 JAC Colon – Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-003949.
- Oficio 211-1-512, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2063 – 2024 JAC El Mesón – Garzón, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-006973.
- Oficio 211-1-536, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2234 – 2024 JAC Paraíso Pueblo Viejo - Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-007650.
- Oficio 211-1-558, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2799 – 2024 JAC Gallego – La Plata, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-009123.

- **Otras actividades:**

Durante el presente periodo realicé las siguientes actividades:

El día 07 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda Sinaí del municipio de Isnos.

El día 10 de enero del 2025 se realiza reunión de seguimiento al convenio N°2170 – 2024, se reiteró la importancia de dar inicio a la Obra de Participación Comunitaria.

El día 13 de enero del 2025 se realiza reunión de seguimiento al convenio N°2170 – 2024, En donde la JAC junto con el residente de obra manifestaron que se realizará la OPC del 27 de enero al 01 de febrero del 2025.

El día 14 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda El Mesón del municipio de Garzón.

El día 15 de enero del 2025 se remitieron los siguientes oficios 211-1-455 Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social La Cabaña y 211-1-456 Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social Morelia.

El día 15 de enero del 2025 se realizó reunión de seguimiento a los convenios con el fin de

revisar las dificultades que se han presentado, ya que a la fecha no han enviado información y así mismo revisar el estado actual de la documentación del Plan de Inversión Social. Se dejan compromisos para la entrega de la misma.

El día 16 de enero del 2025 se realizó visita de seguimiento a las veredas La Muralla, Sinaí y Salto de Bordones del municipio de Isnos, para realizar seguimiento a la OPC.

El día 17 de enero del 2025 se realizó visita de seguimiento a la vereda Yarumal del municipio de Nátaga para realizar seguimiento a la OPC.

La JAC de la vereda La Muralla – Isnos finaliza la Obra de Participación, la cual realizó: “Cambio de cubierta y embellecimiento de la caseta comunal”.

El día 23 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda Gallego del municipio de La Plata.

El día 27 de enero del 2025 se remitió el siguiente oficio 211-1-548 Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social La Cascajosa.

El día 29 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda La Cascajosa del municipio de Nátaga.

2084 – 2025 La Muralla – Isnos (31/01/2025): Se realiza reunión de seguimiento mensual con el convenio 2084 – 2024, con el fin de revisar la documentación final del convenio. Desde la parte social se solicita ir adelantando las gestiones pertinentes para llevar a cabo la socialización final.

2087 – 2024 Salto de Bordones – Isnos (31/01/2025): La comunidad dio inicio a la Obra de Participación Comunitaria: “Embellecimiento y mejoramiento del escenario deportivo - cancha deportiva de la vereda Salto de Bordones”.

2788 – 2024 La Primavera – Acevedo (31/01/2025): La comunidad dio inicio a la Obra de Participación Comunitaria: “Mejoramiento de la caseta deportiva, cancha deportiva y sus alrededores”.

2.1.5 Componente SST

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SINAÍ – MUNICIPIO DE ISNOS – CONVENIO 2170-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 31 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda SINAI, convenio número 2170 realizó las siguientes actividades:

- Planilla seguridad social mes de enero 2025
- Desistimiento de exámenes de egreso
- Paz y salvo del personal de obra.
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MURALLA – ISNOS – CONVENIO 2084-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 31 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda MURALLA, convenio número 2084 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social enero 2025
- Desistimiento de exámenes de egreso
- Paz y salvos personal de obra
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SALTO DE BORDONES – ISNOS – CONVENIO 2087-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda SALTO DE BORDONES, convenio número 2087 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social enero 2025
- Desistimiento de exámenes de egreso
- Paz y salvos personal de obra
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESON – GARZÓN – CONVENIO 2063 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda EL MESON, convenio número 2063 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social enero 2025
- Desistimiento de exámenes de egreso
- Paz y salvos personal de obra
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAISO – COLOMBIA – CONVENIO 2269 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda EL PARAISO, convenio número 2269 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-6

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERSALLES – COLOMBIA – CONVENIO 2708-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda VERSALLES, convenio número 2708 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL BATAN – HOBO – CONVENIO 2108-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda BATAN, convenio número 2108 realizó las siguientes actividades:

- Planilla seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (ver anexo 51)
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (ver anexo 52)

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTA DEL SOL – TELLO – CONVENIO 2318-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TROJA – BARAYA – CONVENIO 2139-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HOTEL – BARAYA – CONVENIO 2150-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SIRIA – BARAYA – CONVENIO 2150-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO – BARAYA – CONVENIO 2423-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PARADA – BARAYA – CONVENIO 2105-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUEBLO VIEJO – ALGECIRAS – CONVENIO 2234-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se
- anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLON – ALGECIRAS – CONVENIO 2692-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GALLEGO – LA PLATA – CONVENIO 2799-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CASCAJOSA – NÁTAGA – CONVENIO 2111-2024

Durante el período comprendido desde 01 de enero al 30 de enero de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso al personal nuevo
- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Soportes de entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Soporte de evaluación de la inducción y notificación al riesgo.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

2.2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.2.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) camionetas para el Director de interventoría, residentes de interventoría, profesionales ambientales, sociales, SST y financieros, permitiendo realizar las visitas técnicas; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

2.2.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de

Interventoría

Durante el mes de diciembre de 2024 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

N°	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	GULLIERMO ALBERTO ROJAS	ING AMBIENTAL	10/10/2024	OBRA O LABOR
2	WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONZO	ING AMBIENTAL	10/10/2024	OBRA O LABOR
3	NATALIA ANDREA MELENDEZ MONTENEGRO	PROFESIONAL SOCIAL	3/10/2024	OBRA O LABOR
4	DANER FERNEY MALES GOLONDRINO	INSPECTOR DE OBRA	30/10/2024	OBRA O LABOR
5	KELLY JOHANA HENAO	INSPECTOR DE OBRA	31/10/2024	OBRA O LABOR
6	PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE	PROFESIONAL SOCIAL NORTE	3/10/2024	OBRA O LABOR
7	JULIAN DAVID ORTIZ HENAO	ING RESIDENTE	9/10/2024	OBRA O LABOR
8	MARIA CAROLINA SALAZAR PLAZA	INGENIERA AUXILIAR	16/10/2024	OBRA O LABOR
9	ANDRES FELIPE BENAVIDEZ POLANIA	TECNICO ADMINISTRATIVO	7/10/2024	OBRA O LABOR
10	DIEGO ANDRES PLAZAS CABRERA	FINANCIERO	7/11/2024	OBRA O LABOR
11	CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	16/10/2024	OBRA O LABOR
12	DIANA MARCELA RAMIREZ DIAZ	INSPECTOR SST	13/11/2024	OBRA O LABOR
13	MAGALY YULIETH LASSO CERON	INSPECTOR	19/11/2024	OBRA O LABOR
14	MARIA JOSE PEÑA BUYUCUE	INSPECTORA	19/11/2024	OBRA O LABOR
15	WILMER ERNESTO PUESTES	CONDUCTOR	28/11/2024	OBRA O LABOR
16	EDWIN FERNEY IQUIRA RAMOS	INSPECTOR	6/12/2024	OBRA O LABOR
17	LAURA VALENTINA PERDOMO FIERRO	INSPECTORA	11/12/2024	OBRA O LABOR
18	YONATHAN GAITAN GOMEZ	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
19	JOSE MANUEL GASCA CUELLAR	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
20	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MONJE	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
21	DARWIN ANDRES MORALES	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
22	JHON ALEX TAMAYO MONTEALEGRE	INSPECTOR	17/12/2024	OBRA O LABOR
23	DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA	ESPECIALISTA	1/12/2024	OBRA O LABOR
24	CRISTIAN CAMILO CHALA	FINANCIERO	9/1/2025	OBRA O LABOR
25	MARIO FERNANDO CASTILLO	ING RESIDENTE	9/1/2025	OBRA O LABOR
26	JESÚS DAVID JIMÉNEZ TIERRADENTRO	CONDUCTOR	13/1/2025	OBRA O LABOR
27	FREDY MEDINA RAMÍREZ	ESPECIALISTA	22/1/2025	OBRA O LABOR

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

2.2.3 Información financiera y presupuestal contrato de Interventoría

Con base en el CDP No. 125424 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal No. 956924 con vigencia fiscal 2024 por valor 1.546.789.418,00 para el contrato principal. Lo

anterior, sin adiciones a la fecha.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

2.2.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

• Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 2

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	19/09/2024	30/06/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/06/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/09/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

2.2.5 Otros documentos seguimiento mensual

- El seguimiento a la inversión del anticipo no aplica formato ya que hasta el momento no se ha realizado desembolso del mismo por parte de INVIAS.
- Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de cargas: De acuerdo a la prórroga otorgada al contrato de interventoría para el mes de diciembre con plazo de vencimiento actual a 31 de marzo de 2025, el plan de cargas fue aprobado hasta el 31 de marzo de 2025.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **CONVENIOS SUSPENDIDOS**

Se tienen cuatro convenios suspendidos, situación derivada por la falta de desembolsos del recurso por parte del gobierno nacional.

CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	NUEVA FECHA VENCIMIENTO
3609 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL SECTOR RURAL CALLE REAL	01/11/2024	12/11/2024	4/03/2025
4020 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	01/11/2024	15/11/2024	2/03/2025
3776 DE 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GALDA DEL MUNICIPIO DE AGRADO, DEL	06/11/2024	21/11/2024	09/03/2025

CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	NUEVA FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO DEL HUILA			
3768 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL REGIONAL DE PRAGA DEL MUNICIPIO DE AIPE	01/11/2024	13/11/2024	3/03/2025

APROBACIÓN DE DISEÑOS

Los convenios que cuentan con diseños aprobados por la interventoría a través del Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara – Esp. En Geotecnia y Pavimentos, el cual entregó el concepto técnico de No Objeción para su implementación son los siguientes:

JAC LA TROJA DE BARAYA.
JAC EL HOTEL DE BARAYA.
JAC LA SIRIA DE BARAYA.
JAC EL PROGRESO DE BARAYA.
JAC PARAISO DE COLOMBIA
JAC EL BATÁN DE HOBO.
JAC NARANJOS BAJOS DE ALGECIRAS.
JAC LA PARADA DE BARAYA.
JAC LA UNION DE COLOMBIA.
JAC ANTILLAS DE COLOMBIA.
JAC AGUA FRÍA DE HOBO.
JAC COLÓN ALGECIRAS
JAC LA CASCAJOSA NÁTAGA
JAC PUERTA DEL SOL TELLO
JAC PARAISO PUEBLO VIEJO ALGECIRAS
JAC LA PRIMAVERA ACEVEDO
JAC MORELIA SALADOBLANCO
JAC GALLEGO LA PLATA
JAC HORIZONTE COLOMBIA

Los convenios cuyos diseños se encuentran en revisión por parte del Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara – Esp. En Geotecnia y Pavimentos, son los siguientes:

JAC SANTANA COLOMBIA
JAC SINAI ISNOS
JAC LA CABAÑA SALADOBLANCO
JAC EL MESÓN GARZÓN
JAC LA MURALLA ISNOS
JAC LA ESPERANZA COLOMBIA
JAC SAN JOSÉ DE RIECITO ACEVEDO
JAC SALTO DE BORDONES ISNOS

Los convenios que no han entregado diseños para revisión por parte del Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara – Esp. En Geotecnia y Pavimentos, son los siguientes:

JAC VERSALLES ACEVEDO

CONVENIOS CON OBRA FINALIZADA – PENDIENTE DE CIERRE FINANCIERO

JAC SINAI ISNOS
JAC LA MURALLA ISNOS
JAC EL MESÓN GARZÓN

EN EJECUCIÓN PRÓXIMOS A TERMINAR OBRAS

JAC SALTO DE BORDONES ISNOS

CONVENIOS EN EJECUCIÓN

Los convenios que se encuentran ejecución y no terminan en el mes de enero las obras son las siguientes:

JAC VERSALLES COLOMBIA
JAC PARAISO DE COLOMBIA
JAC LA TROJA DE BARAYA
JAC EL HOTEL DE BARAYA
JAC LA SIRIA DE BARAYA
JAC EL PROGRESO DE BARAYA
JAC LA PARADA DE BARAYA
JAC EL BATÁN DE HOBO
JAC PUERTA DEL SOL TELLO
JAC GALLEGO LA PLATA
JAC YARUMAL NÁTAGA
JAC LA CASCAJOSA NÁTAGA
JAC PARAISO PUEBLO VIEJO ALGECIRAS
JAC COLÓN ALGECIRAS
JAC NARANJOS BAJOS ALGECIRAS

Los Convenios que se encuentran en revisión de cotizaciones y aprobación de plan de compras:

JAC LA UNION COLOMBIA
JAC LA ESPERANZA COLOMBIA
JAC SANTANA COLOMBIA
JAC LA CABAÑA SALADOBLANCO
JAC MORELIA SALADOBLANCO
JAC LA PRIMAVERA ACEVEDO

Los convenios que se les ha requerido la entrega de cotizaciones correspondientes a los materiales, suministros, maquinaria, entre otros, para avanzar con la revisión y cumplimiento de las fases previstas son los siguientes:

JAC AGUA FRÍA HOBO
JAC ANTILLAS COLOMBIA
JAC HORIZONTE COLOMBIA
JAC SAN JOSÉ DE RIECITO ACEVEDO
JAC VERSALLES ACEVEDO
JAC MORELIA SALADOBLANCO
JAC CABAÑA SALADOBLANCO

4. ANEXOS

4.1 Relación de correspondencia

Durante el mes de enero de 2025 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría – correspondencia enviada

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-386	2-ene-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Documentación técnica faltante para revisión de la interventoría.
211-1-387	2-ene-25	JAC VEREDA LA CASCAJOSA NATAGA-HUILA	Luz Lucero Mondragon Lozada	Presidente de la JAC vereda La Cascajosa Nataga-Huila	Observaciones N°1 al INFORME DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA VEREDA DE LA CASCAJOSA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, Convenio 2111 de 2024.
211-1-388	2-ene-25	JAC VEREDA NARANJOS BAJOS ALGECIRAS-HUILA	Maria Deyi Zamora Ramirez	Presidente de la JAC vereda Naranjos Bajos Algeciras-Huila	Observaciones N°1 al INFORME DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DIAMANTE – EL NARANJO, TRAMO PR 00+000 PR 00+162, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, convenio 2130 de 2024
211-1-389	2-ene-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Nohemi Cardenas Benavides	Presidente de la JAC vereda La Primavera Acevedo-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-390	2-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-391	3-ene-25	JAC VEREDA EL MESÓN GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrero	Presidente de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-392	3-ene-25	JAC VEREDA EL BATAN HOBO-HUILA	Adolfo Vargas Sanchez	Presidente de la JAC vereda El Batan Hobo-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-393	3-ene-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquivel	Presidente de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-394	3-ene-25	JAC VEREDA VERSALLES COLOMBIA-HUILA	Victor Camero Vargas	Presidente de la JAC vereda Versalles Colombia-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-395	3-ene-25	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del sol Tello-Huila	Entrega de diseños de mezclas

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-396	3-ene-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-397	3-ene-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Síria Baraya-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-398	3-ene-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-399	3-ene-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-400	3-ene-25	JAC VEREDA EL PARAISO BARAYA-HUILA	Marisol Galindo Lozada	Presidente de la JAC vereda El Paraiso Baraya-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-401	3-ene-25	JAC VEREDA LA CASCAJOSA NATAGA-HUILA	Luz Lucero Mondragon Lozada	Presidente de la JAC vereda La Cascajosa Nataga-Huila	Observaciones N°2 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA VEREDA DE LA CASCAJOSA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, Convenio No. 2111 de 2024
211-1-402	3-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud aclaración a los diseños de mezclas.
211-1-403	3-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°12
211-1-404	7-ene-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Nohemi Cardenas Benavides	Presidente de la JAC vereda La Primavera Acevedo-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2788 de 2024
211-1-405	7-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2788 de 2024 – NO PAGA.
211-1-406	7-ene-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Nohemi Cardenas Benavides	Presidente de la JAC vereda La Primavera Acevedo-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2788 de 2024.
211-1-407	7-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2788 de 2024.
211-1-408	7-ene-25	JAC VEREDA PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Pueblo Viejo Algeciras-Huila	Entrega de diseños de mezclas
211-1-409	7-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud aclaración a los diseños de mezclas.
211-1-410	8-ene-25	JAC VEREDA EL MESÓN GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrero	Presidente de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Observaciones N°1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, Convenio No. 2063 de 2024.
211-1-411	8-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Observaciones al Diseño de Mezcla – San Alfonso

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-412	8-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2639 de 2024
211-1-413	8-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2639 de 2024 – NO PAGA.
211-1-414	8-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2639 de 2024.
211-1-415	8-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2639 de 2024.
211-1-416	8-ene-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Observaciones N° 1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA LA PARADA, TRAMO EL SALERO - LA BATALLA - LA PARADA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, Convenio N° 2105 de 2024.
211-1-417	8-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 13
211-1-418	8-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud de ingreso de Inspector de Interventoría Pueblo Viejo
211-1-419	8-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del plan de gestión social inicial del convenio solidario N°2139 de 2024 JAC Troja – Baraya
211-1-420	9-ene-25	JAC VEREDA SANTA ANA COLOMBIA-HUILA	Luz Mery Florez Garzon	Presidente de la JAC vereda Santa Ana Colombia-Huila	Respuesta a oficio “Solicitud de cambio de estructura de Pavimento Placa Huella a Pavimento Rígido” Convenio 2752-2024
211-1-421	9-ene-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2110 de 2024.
211-1-422	9-ene-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2110 de 2024
211-1-423	9-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2110 de 2024 – NO PAGA.
211-1-424	9-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2110 de 2024.
211-1-425	10-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2105 de 2024 periodo julio a octubre y noviembre de 2024.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-426	10-ene-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLANCO-HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	Solicitud de envió de cotizaciones para el plan de compras convenio 2109 de 2024 Morelia – Saladoblanco.
211-1-427	10-ene-25	JAC VEREDA MURALLA ISNOS-HUILA	Dier Augusto Velasco Quisoboni	Presidente de la JAC vereda Muralla Isnos-Huilla	Observaciones N° 1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA LA MURALLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, Convenio 2084 de 2024.
211-1-428	10-ene-25	JAC VEREDA LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda La Caabaña Saladoblanco-Huila	Reiteración entrega de cotizaciones para el plan de compras del Convenio Solidario N°2280 de 2024 JAC de la Inspección Departamental de Policía de la Cabaña - Saladoblanco.
211-1-429	10-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°13
211-1-430	13-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2060 de 2024 Periodo noviembre de 2024
211-1-431	13-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2108 de 2024 Periodo agosto a octubre y noviembre de 2024
211-1-432	13-ene-25	JAC VEREDA LA UNIÓN COLOMBIA-HUILA	Alirio Lozano	Presidente de la JAC vereda La Unión Colombia-Huila	Observaciones N°2 DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA, TRAMO VEREDA SAN MARCOS – LA UNION, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA-HUILA, Convenio N° 2138 de 2024.
211-1-433	13-ene-25	JAC VEREDA NARANJOS BAJOS ALGECIRAS-HUILA	Maria Deyi Zamora Ramirez	Presidente de la JAC vereda Naranjos Bajos Algeciras-Huila	Observaciones N°2 al INFORME DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DIAMANTE – EL NARANJO, TRAMO PR 00+000 PR 00+162, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, convenio 2130 de 2024
211-1-434	13-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del plan de gestión social inicial del convenio solidario N°2269 de 2024 JAC Paraiso – Colombia
211-1-435	14-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Relación de pagos convenios solidarios juntas de acción comunal programa caminos comunitarios de la paz total.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-436	14-ene-25	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA-HUILA	Ana Belen Rodriguez	Presidente de la JAC vereda Horizonte Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto Convenio No. 2190 de 2024
211-1-437	14-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO No. 2639 de 2024.
211-1-438	14-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Entrega acta de costos No 3 de interventoría mes de diciembre de 2024.
211-1-439	14-ene-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Observaciones N° 2 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA LA PARADA, TRAMO EL SALERO - LA BATALLA - LA PARADA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, Convenio N° 2105 de 2024.
211-1-440	14-ene-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Observaciones N°1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL ANTILLAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, Convenio N° 2151 de 2024.
211-1-441	14-ene-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Noel Herrera Lozada	Gerente Banco Agrario de Colombia Sede Colombia	solicitud extractos bancarios septiembre a diciembre de 2024
211-1-442	14-ene-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Noel Herrera Lozada	Gerente Banco Agrario de Colombia Sede Colombia	solicitud extractos bancarios septiembre a diciembre de 2024
211-1-443	14-ene-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Noel Herrera Lozada	Gerente Banco Agrario de Colombia Sede Colombia	solicitud extractos bancarios septiembre a diciembre de 2024
211-1-444	14-ene-25	JAC VEREDA LA UNIÓN COLOMBIA-HUILA	Alirio Lozano	Presidente de la JAC vereda La Unión Colombia-Huila	Observaciones N°3 DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TERCIARIA, TRAMO VEREDA SAN MARCOS – LA UNION, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA-HUILA, Convenio N° 2138 de 2024.
211-1-445	14-ene-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Noel Herrera Lozada	Gerente Banco Agrario de Colombia Sede Colombia	solicitud extractos bancarios septiembre a diciembre de 2024
211-1-446	14-ene-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Noel Herrera Lozada	Gerente Banco Agrario de Colombia Sede Colombia	solicitud extractos bancarios septiembre a diciembre de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-447	14-ene-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Observaciones N°1 DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA EL PORVENIR – VEREDA GALLEGO, TRAMO K0+000 A K0+158, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA, Convenio N° 2799 de 2024
211-1-448	15-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del Plan de Gestión Social Inicial del Convenio Solidario N°2692 de 2024 JAC Colon – Algeciras
211-1-449	15-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Observaciones N°1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VEREDA AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE HOBO, Convenio N° 2060 de 2024.
211-1-450	15-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Aprobación Residente de obra CONVENIO SOLIDARIO No. 2639 de 2024.
211-1-451	15-ene-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Entrega del plan de gestión social inicial del convenio solidario N°2151 de 2024 JAC Antillas – Colombia
211-1-452	15-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2060 de 2024 Periodo septiembre y octubre de 2024.
211-1-453	15-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2060 de 2024 Periodo diciembre de 2024
211-1-454	15-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2108 de 2024 Periodo diciembre de 2024.
211-1-455	15-ene-25	JAC VEREDA LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda La Caabaña Saladoblanco-Huila	Entrega del Plan de Inversión Social del Convenio Solidario N°2280 de 2024 JAC de la Inspección Departamental de Policía de La Cabaña – Saladoblanco
211-1-456	15-ene-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLANCO-HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	Reiteración Entrega del Plan de Inversión Social del Convenio Solidario N°2109 de 2024 JAC Morelia – Saladoblanco
211-1-457	16-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 14
211-1-458	16-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud de ingreso de Inspectores de Interventoría Baraya, Nataga y La Plata

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-459	17-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2060 DE 2024
211-1-460	17-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°14
211-1-461	17-ene-25	JAC VEREDA SALTO DE BORDONES ISNOS-HUILA	Roberiro Salazar Muñoz	Presidente de la JAC vereda Salto de Bordones Isnos-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-462	17-ene-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-463	17-ene-25	JAC VEREDA EL MESÓN GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrero	Presidente de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-464	17-ene-25	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franco Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-465	17-ene-25	JAC VEREDA EL BATAN HOBO-HUILA	Adolfo Vargas	Presidente de la JAC vereda El Batan	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-466	17-ene-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-467	17-ene-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-468	17-ene-25	JAC VEREDA EL PARAISO COLOMBIA-HUILA	Marisol Galindo Lozada	Presidente de la JAC vereda El Paraiso Colombia-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-469	17-ene-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-470	17-ene-25	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del Sol Tello-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-471	17-ene-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-472	17-ene-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-473	17-ene-25	JAC VEREDA VERSALLES COLOMBIA-HUILA	Victor Camero Vargas	Presidente de la JAC vereda Versalles Colombia-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-474	17-ene-25	JAC VEREDA YARUMAL NATAGA-HUILA	John Helbert Gonzalez Gonzalez	Presidente de la JAC vereda Yarumal Nataga-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-475	17-ene-25	JAC VEREDA LA CASCAJOSA NATAGA-HUILA	Luz Lucero Mondragon Lozada	Presidente de la JAC vereda La Cascajosa Nataga-Huila	Requerimiento entrega oportuna de informes
211-1-476	17-ene-25	JAC VEREDA EL BATAN HOBO-HUILA	Adolfo Vargas	Presidente de la JAC vereda El Batan	Requerimiento entrega de informes.
211-1-477	17-ene-25	JAC VEREDA PARAISO COLOMBIA-HUILA	Marisol Galindo Lozada	Presidente de la JAC vereda Paraiso Colombia-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-478	17-ene-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-479	17-ene-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-480	17-ene-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-481	17-ene-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-482	17-ene-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-483	17-ene-25	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del Sol Tello-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-484	17-ene-25	JAC VEREDA SALTO DE BORDONES ISNOS-HUILA	Robeiro Salazar Muñoz	Presidente de la JAC vereda Saltos de Bordones Isnos-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-485	17-ene-25	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franxo Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-486	17-ene-25	JAC VEREDA EL MESON GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrera	Presidenten de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-487	17-ene-25	JAC VERERDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-488	17-ene-25	JAC VEREDA YARUMAL NATAGA-HUILA	John Helbert Gonzalez Gonzalez	Presidente de la JAC vereda Yarumal Nataga-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-489	17-ene-25	JAC VERSALLES COLOMBIA-HUILA	Victor Henry Camero Vargas	Presidente de la JAC vereda Versalles Colombia- Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-490	17-ene-25	JAC LA MURALLA ISNOS-HUILA	Diver Augusto Velasco Quisoboni	Presidente de la JAC veredaLa Muralla Isnos-Huila	Requerimiento entrega de informes.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-491	17-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe mensual de actividades de contrato 3697 de 2024_DICIEMBRE
211-1-492	17-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del plan de gestión social inicial del convenio solidario N°2752 de 2024 JAC Santana – Colombia
211-1-493	21-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2269 de 2024 JAC El Paraíso – Colombia.
211-1-494	21-ene-25	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Noel Herrera Lozada	Gerente Banco Agrario de Colombia Sede Colombia	solicitud de extractos bancarios JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAISO CONVENIO 2269-2024
211-1-495	21-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2108 de 2024 JAC El Batán– Hobo.
211-1-496	21-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2063 de 2024 JAC El Mesón – Garzón.
211-1-497	21-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2087 de 2024 JAC Salto de Bordones – Isnos.
211-1-498	21-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2170 de 2024 JAC Sinaí – Isnos.
211-1-499	21-ene-25	JAC VEREDA LA ESPERANZA COLOMBIA-HUILA	Fener Guerrero Benavidez	Presidente de la JAC vereda La Esperanza Colombia-Huila	Entrega del plan de gestión social inicial del convenio solidario N°2433 de 2024 JAC Esperanza – Colombia
211-1-500	21-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2084 de 2024 JAC La Muralla – Isnos.
211-1-501	21-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 15
211-1-502	21-ene-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2151 DE 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-503	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2150 de 2024 Periodo agosto a octubre de 2024.
211-1-504	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2139 de 2024 Periodo agosto a octubre de 2024.
211-1-505	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2423 de 2024 Periodo agosto a octubre de 2024.
211-1-506	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2110 de 2024 Periodo Julio a octubre de 2024.
211-1-507	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Entrega Acta de Reinicio de convenio Versalles Acevedo.
211-1-508	22-ene-25	JAC VEREDA EL MESÓN GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrero	Presidente de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2063 de 2024
211-1-509	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2063 de 2024 – NO PAGA.
211-1-510	22-ene-25	JAC VEREDA EL MESÓN GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrero	Presidente de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2063 de 2024.
211-1-511	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2063 de 2024.
211-1-512	22-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del Plan de Gestión Social Inicial del Convenio Solidario N°2063 de 2024 JAC El Mesón – Garzón.
211-1-513	23-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Respuesta al radicado 2025S-VHUI-001946 Acta de recibo No. 3
211-1-514	23-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Reiteración Solicitud de envió de diseños y cotizaciones convenio 2639 de 2024
211-1-515	23-ene-25	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA-HUILA	Ana Belen Rodriguez	Presidente de la JAC vereda Horizonte Colombia-Huila	Reiteración solicitud de envió del diseño y cotizaciones convenio 2190 de 2024
211-1-516	23-ene-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Reiteración solicitud de envió de cotizaciones convenio 2151 de 2024
211-1-517	23-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Reiteración de solicitud de envió de cotizaciones convenio 2060 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-518	23-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Observaciones N°2 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VEREDA AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE HOBO, Convenio N° 2060 de 2024.
211-1-519	23-ene-25	JAC VEREDA EL PARAISO COLOMBIA-HUILA	Marisol Galindo Lozada	Presidente de la JAC vereda El Paraiso Colombia-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-520	23-ene-25	JAC VERSALLES COLOMBIA - HUILA	Victor Henry Camero Vargas	Presidente de la JAC vereda Versalles Colombia-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-521	23-ene-25	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del Sol Tello-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-522	23-ene-25	JAC VEREDA EL BATAN HOBO-HUILA	Adolfo Vargas	Presidente de la JAC vereda El Batan Hobo-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-523	23-ene-25	JAC VEREDA EL MESON GARZÓN-HUILA	Alix Ordonñez Barrera	Presidenten de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-524	23-ene-25	JAC LA MURALLA ISNOS-HUILA	Diver Augusto Velasco Quisoboni	Presidente de la JAC veredaLa Muralla Isnos-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-525	23-ene-25	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franxo Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	Requerimiento entrega de informes.
211-1-526	23-ene-25	JAC VEREDA EL MESÓN GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrero	Presidente de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Observaciones N°1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, Convenio No. 2063 de 2024.
211-1-527	23-ene-25	JAC VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda Inspeccion Departamental de Policia de la Cabaña Saladoblanco-Huila	Observaciones N° 1 a la CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO SOBRE EL TRAMO LA CABAÑA - LA MORELIA / VEREDA LA CABAÑA / MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA, Convenio N° 2280 de 2024
211-1-528	23-ene-25	JAC MORELIA SALADOBLANCO - HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	Observaciones N° 1 a la CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO SOBRE EL TRAMO LA MORELIA MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA, Convenio N° 2109 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-529	23-ene-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Nohemi Cardenas Benavides	Presidente de la JAC vereda La Primavera Acevedo-Huila	Observaciones N°3 al INFORME DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA VEREDA LA PRIMAVERA, TRAMO MARTICAS – LABARNISA – LA CABAÑA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO, Convenio 2788 de 2024
211-1-530	23-ene-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Observaciones N°2 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL ANTILLAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, Convenio N° 2151 de 2024.
211-1-531	23-ene-25	JAC VEREDA SANTANA COLOMBIA-HUILA	Luz Mery Florez Garzon	Presidente de la JAC vereda Santana Colombia-Huila	Observaciones N°2 al DISEÑO PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA SAN MARCOS - SANTANA, TRAMO PR 00+000 PUENTE EL PITAY SOBRE EL RIO CABRERA Y PR 00+200, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, Convenio N° 2752 de 2024.
211-1-532	23-ene-25	JAC VEREDA MURALLA ISNOS-HUILA	Dier Augusto Velasco Quisoboni	Presidente de la JAC vereda Muralla Isnos-Huilla	Observaciones N° 1 al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA LA MURALLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, Convenio 2084 de 2024.
211-1-533	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2139 de 2024 Periodo noviembre a diciembre de 2024.
211-1-534	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2423 de 2024 Periodo noviembre a diciembre de 2024.
211-1-535	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2110 de 2024 Periodo noviembre a diciembre de 2024.
211-1-536	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del Plan de Gestión Social Inicial del Convenio Solidario N°2234 de 2024 JAC Sector Pueblo Viejo Inspección de Policía de Paraíso – Algeciras.
211-1-537	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°15
211-1-538	24-ene-25	JAC VEREDA SECTOR PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Sector Pueblo Viejo Algeciras-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2234 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-539	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2234 de 2024 – NO PAGA.
211-1-540	24-ene-25	JAC VEREDA SECTOR PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Sector Pueblo Viejo Algeciras-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2234 de 2024.
211-1-541	24-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2234 de 2024.
211-1-542	27-ene-25	JAC VEREDA SANTANA COLOMBIA-HUILA	Luz Mery Florez Garzon	Presidente de la JAC vereda Santana Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2752 DE 2024
211-1-543	27-ene-25	JAC VEREDA EL BATAN HOBO-HUILA	Adolfo Vargas	Presidente de la JAC vereda El Batan Hobo-Huila	Documentos financieros para proceso de liquidación Convenio Nro. 2108-2024
211-1-544	27-ene-25	JAC LA MURALLA ISNOS-HUILA	Diver Augusto Velasco Quisoboni	Presidente de la JAC veredaLa Muralla Isnos-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de Liquidación.
211-1-545	27-ene-25	JAC VEREDA SALTO DE BORDONES ISNOS-HUILA	Robeiro Salazar Muñoz	Presidente de la JAC vereda Saltos de Bordones Isnos-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de Liquidación.
211-1-546	27-ene-25	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franxo Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de Liquidación.
211-1-547	27-ene-25	JAC VEREDA EL MESON GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrera	Presidenten de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de Liquidación.
211-1-548	27-ene-25	JAC VEREDA LA CASCAJOSA NATAGA-HUILA	Luz Lucero Mondragon Lozada	Presidente de la JAC vereda La Cascajosa Nataga-Huila	Reiteración Entrega del Plan de Inversión Social del Convenio Solidario N°2111 de 2024 JAC La Cascajosa – Nátaga
211-1-549	27-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	211-1-549 Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2708 de 2024, vereda Versalles, Colombia.
211-1-550	27-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	211-1-550 Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2318 de 2024, vereda Puertas del sol, Tello.
211-1-551	27-ene-25	JAC VEREDA EL PARAISO COLOMBIA-HUILA	Marisol Galindo Lozada	Presidente de la JAC vereda El Paraiso Colombia-Huila	Documentos financieros para proceso de liquidación Convenio Nro. 2269-2024
211-1-552	27-ene-25	JAC VERSALLES COLOMBIA - HUILA	Victor Henry Camero Vargas	Presidente de la JAC vereda Versalles Colombia-Huila	Documentos financieros para proceso de liquidación Convenio Nro. 2708-2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-553	28-ene-25	JAC VEREDA SECTOR PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Sector Pueblo Viejo Algeciras-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2692 de 2024
211-1-554	28-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2692 de 2024 – NO PAGA.
211-1-555	28-ene-25	JAC VEREDA SECTOR PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Sector Pueblo Viejo Algeciras-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2692 de 2024.
211-1-556	28-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2692 de 2024.
211-1-557	28-ene-25	JAC VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda Inspeccion Departamental de Policia de la Cabaña Saladoblanco-Huila	Observaciones N° 2 a la CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO SOBRE EL TRAMO LA CABAÑA - LA MORELIA / VEREDA LA CABAÑA / MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA, Convenio N° 2280 de 2024
211-1-558	28-ene-25	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega del Plan de Gestión Social Inicial del Convenio Solidario N°2799 de 2024 JAC Gallego – La Plata
211-1-559	29-ene-25	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del Sol Tello-Huila	Documentos financieros para proceso de liquidación Convenio Nro. 2318-2024
211-1-560	29-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 16
211-1-561	29-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud aclaración certificado NO PROCESOS EN CURSO recibido el 29 de enero de 2025 con consecutivo 2222 2025-S y reiteración solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio citado en la referencia del presente.
211-1-562	30-ene-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2708 de 2024 Periodo Agosto a diciembre de 2024.
211-1-563	30-ene-25	JAC VEREDA LA UNIÓN COLOMBIA-HUILA	Alirio Lozano	Presidente de la JAC vereda La Unión Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2138 DE 2024
211-1-564	30-ene-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de liquidación convenio 2105-2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-565	30-ene-25	JAC VEREDA LA ESPERANZA COLOMBIA-HUILA	Fener Guerrero	Presidente de la JAC vereda La Esperanza Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2433 DE 2024
211-1-566	30-ene-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de liquidación convenio 2110-2024.
211-1-567	30-ene-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de liquidación convenio 2139-2024.
211-1-568	30-ene-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de liquidación convenio 2150-2024.
211-1-569	30-ene-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Solicitud Documentos Financieros para el Proceso de liquidación convenio 2423-2024.
211-1-570	31-ene-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Aprobación cambio maestro de obra para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2139 DE 2024.
211-1-571	31-ene-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	Aprobación cambio maestro de obra para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2150 DE 2024.
211-1-572	31-ene-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Aprobación cambio maestro de obra para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2423 DE 2024.
211-1-573	31-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe para reinicio del convenio 2338 de 2024.
211-1-574	31-ene-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Reiteración solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2269 de 2024, vereda El Paraiso, Colombia
211-1-575	31-ene-25	JAC VEREDA LA ESPERANZA COLOMBIA-HUILA	Fener Guerrero	Presidente de la JAC vereda La Esperanza Colombia-Huila	Observaciones al DISEÑO PAVIMENTO RIGIDO, CONVENIO 2433 DE 2024
211-1-576	31-ene-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°16

- Interventoría – correspondencia recibida

FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO (Código, consecutivo o referencia con que se emitió el oficio)
2-ene-25	2-ene-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-134245 Aprobación de personal	2025S-VHUI-000060
7-ene-25	7-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Remitir con aprobación y sin observaciones pertinentes el Diseño de Placa Huella para el Sector a Intervenir.	AG-OF-002
8-ene-25	8-ene-25	JAC VEREDA SANTANA COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud de cambio de placa huella a pavimento rígido	N/A
10-ene-25	13-ene-25	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Terminanción de contrato por prestación de servicios profesionales número 002	N/A
13-ene-25	13-ene-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Carta de renuncia al proyecto	N/A
14-ene-25	14-ene-25	JAC VEREDA LA MURALLA ISNOS-HUILA	Consorcio Inter Eco	Respuesta a Observaciones N° 1 al Diseño de Pavimento en Placa Huella de la Vía La Muralla, Municipio de Isnos, Convenio 2084 de 2024	N/A
15-ene-25	15-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Subsanación a observaciones manifestadas en el oficio DRAV-014-211-2025	AG-OF-002
15-ene-25	15-ene-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-001870 Ingreso inspectores Algeciras y Nataga	2025S-VHUI-001750
16-ene-25	16-ene-25	JAC VEREDA COLON ALGECIRAS-HUILA	Consorcio Inter Eco	Cambio de estructura de canastilla soporte dovelas	N/A
16-ene-25	16-ene-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-003402 recibo del Acta 3 del Contrato 3697 de 2024	2025S-VHUI-001946
17-ene-25	17-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Notificación de renuncia Residente de obra	AG-OF-005
17-ene-25	17-ene-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-004672 Ingreso de inspectores de Interventoria Baraya, Nataga	2025S-VHUI-002215

FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO (Código, consecutivo o referencia con que se emitió el oficio)
29-ene-25	29-ene-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a solicitud presentada bajo los radicados CAM No. 1132 2025-E de fecha 21 de enero de 2025	2222 2025-S
30-ene-25	30-ene-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud cambio de Mestro de Obra	N/A
30-ene-25	30-ene-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud cambio de Mestro de Obra	N/A
30-ene-25	30-ene-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud cambio de Mestro de Obra	N/A
31-ene-25	31-ene-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Concepto Técnico sobre la Construcción de Alcantarillas	OF-003
31-ene-25	31-ene-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta oficio con radicado CAM No. 2025-E 1132 de fecha 21 de enero de 2025	2478 2025-S
31-ene-25	31-ene-25	JAC PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Aprobación diseño valla informativa	JACPSOL-008

4.2 Registro Fotográfico

Vereda La Troja	
	
Instalación tubería en concreto reforzado Ø=36” para construcción de alcantarilla	Instalación tubería en concreto reforzado Ø=36” para construcción de alcantarilla
	
Corte y figurado de acero de refuerzo	Fundición solado de limpieza

	
Fundición solado de limpieza	Instalación y compactación de subbase granular
	
Compactación de subbase granular	Recolección de muestras para toma de densidades
	
Instalación de formaleta para fundición de placas en concreto	Fundición de placas en concreto

4.3 Bitácora

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, se presentan las bitácoras de obra de los proyectos que se encuentran en ejecución de obras.

4.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios

En el desarrollo de los convenios se entregan formatos de maquinaria y equipos, estado general del tiempo, garantías del convenio, resumen mensual estado general del convenio, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal, garantías y seguro de obra, acta mensual de pagos convenio, informe inversión buen manejo de desembolso, plan inversión desembolso mensual.

Cordialmente;



CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTER ECO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA LA TROJA

- Informes semanales
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado General del Tiempo
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR11 Resumen Ensayos de Laboratorio
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 6/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: 2139 DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA SEMANA No.: 13 del 30/12/2024 al 5/1/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALONSO ALBERTO SALINAS VEGA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En la Vereda La troja, zona rural del Municipio de Baraya se realizarán una (1) alcantarilla y 138 metros de placa huella, obras de baja complejidad en los sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel - La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tutumito y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, en este sector se ejecutaran 138 ml de placa huella y 1 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
INTEGRANTES:	ARBEY TROCHEZ MACIAS
CONTRATO No.	2139 DE 2024
FECHA DE INICIO:	7/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/3/2025
VALOR INICIAL:	$ 201.320.555,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201.320.555,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEREICO
INTEGRANTES:	ECOVIAS SAS - ECOING PROYECTOS SAS
CONTRATO No.	3667 DE 2024
FECHA DE INICIO:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/3/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.546.789.418,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.546.789.418,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.320.555	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.320.555	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.546.789.418	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.546.789.418	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.320.555,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201.320.555,00	#¡DIV/0!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	#¡DIV/0!
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	%	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	#¡DIV/0!
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.320.555,00	100,000%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	#¡DIV/0!
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	%	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.546.789.418,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 216.121.354,59	13,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % $ 201.320.555,00 Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Construccion Placa Huella	ml	138,00
Construccion de alcantarilla	und.	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1	%
Prog	138	100
Ejec		
Prog	1	100
Ejec		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PETROTEC SAS RUCOM 20150320204233 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIAL PRESENTADA FUE APROBADA YA QUE CUENTA CON PERMISO MINERO RUCOM 20150320204233 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025 Y LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X	

OBSERVACIONES: EL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES SERÁ REUTILIZADO EN OBRA, SE CONTARÁ CON PERMISO DE PRESTAMO DE BAÑOS Y LAVAMANOS POR PARTE DE UN HABITANTE DEL SECTOR. EL AGUA A UTILIZAR EN OBRA SERÁ DONADA POR UN HABITANTE DEL SECTOR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA Y CUENTA CON NO OBJECIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL INVIAS CON RADICADO 2024S-VBOG-089283

OBSERVACIONES: EN ESTADO DE SEGUIMIENTO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		23
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: EN ESTADO DE SEGUIMIENTO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE HACE ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLA MEDIANTE OFICIO 211-1-399 .

SE SOLICITA ACLARACIÓN A LOS INFORMES DE ENSAYO ENTREGADOS POR EL LABORATORIO INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S., DEBIDO A QUE EXISTEN ERRORES EN CUANTO AL TAMAÑO DE LOS AGREGADOS MEDIANTE OFICIO 211-1-402.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE ESPERA RECIBIR ACLARACIONES POR PARTE DE EL LABORATORIO INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Matrícula Profesional No.: 15202-59752 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MNZ-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 13/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: 2139 DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA SEMANA No.: 14 del 6/1/2025 al 12/1/2025 ¿Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALONSO ALBERTO SAUNAS VEGA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En la Vereda La troja, zona rural del Municipio de Baraya se realizarán una (1) alcantarilla y 138 metros de placa huella, obras de baja complejidad en los sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel - La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tutumito y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, en este sector se ejecutaran 138 ml de placa huella y 1 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
INTEGRANTES:	ARBEY TROCHEZ MACIAS
CONTRATO No.	2139 DE 2024
FECHA DE INICIO:	29/8/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/1/2025
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/3/2025
VALOR INICIAL:	$ 201.320.555,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201.320.555,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERECO
INTEGRANTES:	ECOVIAS SAS - ECOING PROYECTOS SAS
CONTRATO No.	3667 DE 2024
FECHA DE INICIO:	31/1/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/3/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.546.789.418,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.546.789.418,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.320.555			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.320.555			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.546.789.418			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.546.789.418	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	201.320.555,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	201.320.555,00	#¡DIV/0!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	#¡DIV/0!
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	#¡DIV/0!
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	201.320.555,00	100,000%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	#¡DIV/0!
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,000%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	#¡DIV/0!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	1.546.789.418,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	216.121.354,59	13,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % $ 201.320.555,00 Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % $ -

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Construccion Placa Huella	ml	138,00
Construccion de alcantarilla	und.	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1	%
Prog	138	100
Ejec		
Prog	1	100
Ejec		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PETROTEC SAS RUCOM 20150320423 3 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIAL PRESENTADA FUE APROBADA YA QUE CUENTA CON PERMISO MINERO RUCOM 20150320423 3 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025 Y LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES SERÁ REUTILIZADO EN OBRA, SE CONTARÁ CON PERMISO DE PRESTAMO DE BAÑOS Y LAVAMANOS POR PARTE DE UN HABITANTE DEL SECTOR. EL AGUA A UTILIZAR EN OBRA SERÁ DONADA POR UN HABITANTE DEL SECTOR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA Y CUENTA CON NO OBJECIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL INVIAS CON RADICADO 2024S-VBOG-089283

OBSERVACIONES: EN ESTADO DE SEGUIMIENTO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		24
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		24
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ REVISIÓN DE LOS AJUSTES SOLICITADOS DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL CONVENIO 2139-2024 TROJA DE BARAYA Y SE PIDE ALLEGAR EL CERTIFICADO DE INTERVENCIÓN DEL PREDIO.
SE REALIZÓ RADICACIÓN A SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL SOLICITADA PARA EL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DE LA VEREDA TROJA BARAYA MEDIANTE OFICIO 211-1-419 CUAL CUENTA CON RADICADO 2024E-VUVRAZ-001723

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ESTUVO A LA ESPERA DE LAS ACLARACIONES POR PARTE DEL LABORATORIO INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE ESPERA RECIBIR ACLARACIONES POR PARTE DE EL LABORATORIO INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNZ-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Matrícula Profesional No.: 19202-59752 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 20/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: 2139 DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA SEMANA No.: 15 del 13/1/2025 al 19/1/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALONSO ALBERTO SALINAS VEGA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En la Vereda La troja, zona rural del Municipio de Baraya se realizarán una (1) alcantarilla y 138 metros de placa huella, obras de baja complejidad en los sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel - La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tutumito y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, en este sector se ejecutaran 138 ml de placa huella y 1 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DE HUILA
INTEGRANTES: ANDREY TRIGUEROS MACIAS

CONTRATO No.	2139 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.320.555,00
FECHA DE INICIO:	2/9/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.320.555,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/3/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERSECO
INTEGRANTES: INTERVIAL SAS - ECOING PROYECTOS SAS

CONTRATO No.	3697 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.546.789.418,00
FECHA DE INICIO:	2/9/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1.546.789.418,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/3/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.320.555	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.320.555	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.546.789.418	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.546.789.418	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.320.555,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.003.205,55	1,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.003.205,55	1,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.320.555,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.003.205,55	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.003.205,55	1,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.546.789.418,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 216.101.954,59	13,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % $ 2.003.205,55 Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % $

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Construccion Placa Huella	ml	138,00
Construccion de alcantarilla	und	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1	%
Prog	1,00	100
Fac	0	0
Prog	1	100
Fac	0	0

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	X	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PETROTEC SAS — PERMISO MINERO: SI X NO — DISPONIBLE
RUCOM 2015032042331 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025
LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040 — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACION: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIAL PRESENTADA FUE APROBADA YA QUE CUENTA CON PERMISO MINERO RUCOM 2015032042331 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025 Y LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS.	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES SERÁ REUTILIZADO EN OBRA. SE CONTARÁ CON PERMISO DE PRESTAMO DE BAÑOS Y LAVAMANOS POR PARTE DE UN HABITANTE DEL SECTOR. EL AGUA A UTILIZAR EN OBRA SERÁ DONADA POR UN HABITANTE DEL SECTOR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA Y CUENTA CON NO OBJECIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL INVIAS CON RADICADO 20245-VBOG-089283

OBSERVACIONES: EN ESTADO DE SEGUIMIENTO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		24
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		24
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ ENTREGA DE FORMATOS SOCIALES DE ACEPTACIÓN, COMPROMISO Y ENTREGA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE DIO INICIO DE OBRA Y HASTA LA FECHA SE HA ESTADO EN COMPRA DE MATERIALES, AMARRE DE HIERRO, LA CONSECUSION DE MAQUINARIA PARA CONFORMAR EL TERRENO, INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO.

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CON ASUNTO "Entrega de documentación técnica CONVENIO 2139 - 2024" SE ALLEGAN LOS DOCUMENTOS; PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESUPUESTO AJUSTADO Y COTIZACIÓN ECONÓMICA APROBADA EN COMITÉ.

SE LE SOLICITA AL CONTADOR LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO 211-1-472.

SE LE SOLICITA AL RESIDENTE LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES MEDIANTE OFICIO 211-1-478.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIGURADO Y AMARRE DE HIERRO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNG-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE TUBERIA.



INSTALACION DE TUBERIA.



FIJRADO Y AMARRE DE HIERRO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Matrícula Profesional No.: 19202-59752 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO: 2139 DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA SEMANA No.: 16 del 20/01/2025 al 26/01/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALONSO ALBERTO SALINAS VEGA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En la Vereda La troja, zona rural del Municipio de Baraya se realizarán una (1) alcantarilla y 138 metros de placa huella, obras de baja complejidad en los sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel - La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tuluminto y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, en este sector se ejecutaran 138 ml de placa huella y 1 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERECO	
INTEGRANTES:	ARBEY TROCHEZ MACIAS		INTEGRANTES:	ECOVIAS SAS - ECOING PROYECTOS SAS	
CONTRATO No.	2139 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 201.320.555,00	CONTRATO No.	3697 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 1.546.789.418,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	2/10/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 201.320.555,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 1.546.789.418,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.320.555	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.320.555	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.546.789.418	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.546.789.418	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 151.622.742,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.300.000,00	8,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.173.908,80	8,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 126.091,20	0,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	#¡DIV/0!
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.320.555,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.173.908,80	6,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.100.000,00	1,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.170.703,25	6,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.546.789.418,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 216.121.354,59	13,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % $ 12.300.000,00 Avance o Atraso Físico % 99%
Meta Física Ejecutada % $ 12.173.908,80

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Construccion Placa Huella	ml	138,00
Construccion de alcantarilla	und.	1,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1	%
Prog.	138	100
Ejec.	0	0
Prog.	1	100
Ejec.	5	5

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	X	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACION:	PETROTEC SAS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	RUCOM 2015032042333 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040					
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIAL PRESENTADA FUE APROBADA. YA QUE CUENTA CON PERMISO MINERO RUCOM 2015032042333 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025 Y LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: EL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES SERÁ REUTILIZADO EN OBRA. SE CONTARÁ CON PERMISO DE PRESTAMO DE BAÑOS Y LAVAMANOS POR PARTE DE UN HABITANTE DEL SECTOR. EL AGUA A UTILIZAR EN OBRA SERÁ DONADA POR UN HABITANTE DEL SECTOR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA Y CUENTA CON NO OBJECIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL INVIAS CON RADICADO 20245-VBOG-089283

OBSERVACIONES: EN ESTADO DE SEGUIMIENTO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		25
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ ENTREGA DE FORMATOS SOCIALES DE ACEPTACIÓN, COMPROMISO Y ENTREGA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MEDIANTE ACTA DE COMITE No.003 CON FECHA EL 20 DE ENERO DE 2025 SE DA APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS 2 Y APROBACIÓN CAMBIO PROVEEDORES MAQUINARIA Y TRANSPORTE, AL IGUAL QUE CAMBIO DE PRECIOS ARENA Y GRAVA CANTERA.

RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE EJECUTA:
INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA COLOCACION DE LA TUBERIA EN LA ALCANTARILLA.
INSTALACION DE TUBERIAS EN LA ALCANTARILLA.
INSTALACION DE LA SUBBASE Y COMPACTACION.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIGURADO Y AMARRE DE HIERRO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MINI-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOLADO DE LIMPIEZA.



INSTALACION ACERO DE REFUERZO.



INSTALACION DE SUBBBASE.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CARLOS EDUARDO PALAVECINO
Matrícula Profesional No.: 76600-39736 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO 2139 DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA SEMANA No.: 17 del 27/01/2025 al 2/02/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALONSO ALBERTO SALINAS VEGA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En la Vereda La troja, zona rural del Municipio de Baraya se realizarán una (1) alcantarilla y 109 metros de pavimento rígido, obras de baja complejidad en los sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel - La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tuluminto y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, en este sector se ejecutaran 109 ml de pavimento rígido y 1 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
INTEGRANTES: ARBEY TROCHEZ MACIAS

CONTRATO No.	2139 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 201,320,555.00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201,320,555.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERECO
INTEGRANTES: ECOVIAS SAS - ECOING PROYECTOS SAS

CONTRATO No.	3697 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,546,789,418.00
FECHA DE INICIO:	2/10/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1,546,789,418.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,320,555	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,320,555	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,546,789,418	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,546,789,418	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 155,911,186.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 43,172,190.00	27.69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 39,060,228.80	25.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4,111,961.20	2.64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	#¡DIV/0!
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,320,555.00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39,060,228.80	19.40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30,872,190.00	19.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,886,320.00	17.24%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,546,789,418.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 216,121,354.59	13.97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % $ 1.00
Meta Física Ejecutada % $ 0.50
Avance o Atraso Físico % 50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Construccion pavimento rigido	ml	109.00
Construccion de alcantarilla	und.	1.00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1 (ML)	%
Prog	109	100%
Ejec	.01	0.01%
Prog	1	100%
Ejec	1.00	100.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	X	1
MOTONIVELADORA	X	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PETROTEC SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	RUCOM 2015032042333 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040				
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIAL PRESENTADA FUE APROBADA YA QUE CUENTA CON PERMISO MINERO RUCOM 2015032042333 CON FECHA DE VENCIMIENTO A JULIO 31 DE 2025 Y LICENCIA AMBIENTAL 0947 15 DE ABRIL DE 2010 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 3 DE MARZO DE 2040.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: EL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES SERÁ REUTILIZADO EN OBRA. SE CONTARÁ CON PERMISO DE PRESTAMO DE BAÑOS Y LAVAMANOS POR PARTE DE UN HABITANTE DEL SECTOR. EL AGUA A UTILIZAR EN OBRA SERÁ DONADA POR UN HABITANTE DEL SECTOR.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA Y CUENTA CON NO OBJECIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL INVIAS CON RADICADO 20245-VBOG-089283

OBSERVACIONES: EN ESTADO DE SEGUIMIENTO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		25
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	31	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZA VERIFICACIÓN SOCIAL EN CONJUNTO CON EL ÁREA CONTABLE DE LA INVERSIÓN DEL RECURSO SOCIAL.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ALLEGA LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES DE LA SUBBASE GRANULAR POR ENCIMA DEL 97.8%.

CAMBIO MAESTRO DE OBRA SE APRUEBA.

EXCAVACIONES , COLOCACIÓN DE SUB-BASE , CONFORMACIÓN MOTONIVELADORA , COMPACTACIÓN VIBROCOMPACTADOR , FIGURADO DE REFUERZO , VACIADO DE CONCRETO OBRAS DRENAJE , FORMALETEO PAVIMENTO RIGIDO , TOMA DE MUESTRAS CONTROL CALIDAD , INSTALACIÓN DE REFUERZO , FORMALETEO DE CONCRETO OBRAS DRENAJE .

INSTALACIÓN DE LA ALCANTARILLA EVIDENCIÁNDOSE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36", CON COLOCACION PARA EL ACERO PARA ENCOLE Y EL CABEZAL DE LA ALCANTARILLA. TAMBIÉN SE REVISARON LOS MATERIALES ALLEGADOS A OBRA Y QUE FUERAN DEBIDAMENTE ALMACENADOS, COMO LO REQUIERE EL CEMENTO O ACERO Y EVIDENCIARON CANASTILLAS LISTAS PARA LA INSTALACIÓN.

EN DESICION CONJUNTA LA J.A.C SOLICITARON EL CAMBIO DE PLACA HUELLA A PAVIMENTO RIGIDO QUEDANDO PARCIALEMENTE EN 109 ML.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIGURADO Y AMARRE DE HIERRO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MINI-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPACTADO DE SUBBASE.



RECOLECCION MUESTRA PARA TOMA DE DENSIDADES.



FUNDICION DE 7 PLACAS DE CONCRETO DIMENSIONES (2.5M*3M)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CARLOS EDUARDO PALLA VALDERAS
Matrícula Profesional No.: 19202-39732 CHO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **HUILA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TROJA MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 2139

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL LA VEREDA LA TROJA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3697

INTERVENTORÍA: INTERECO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CATERPILAR	216	LA TROJA																A	A														
MOTONIVELADORA	CATERPILAR	215 HP	LA TROJA																				A	A	A	A	A							
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA S5S	LA TROJA																				A	A	A	A	A							
																			1	1			2	2	2	2	2							
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																			1	1			2	2	2	2	2							
TOTAL ACTIVO																			0	0			0	0	0	0	0							
TOTAL EN REPARACIÓN																			0	0			0	0	0	0	0							
TOTAL INACTIVO																			0	0			0	0	0	0	0							

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	12	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0516348 TLM

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-59752 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 2139 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TROJA MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3697 **INTERVENTOR:** INTERECO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco								22	23	24	21		24	24	21	20	24	22		24	24	22	21	24	22		22	24	24	22	23	477
Lluvias moderadas								2	1	0	3		0	0	3	4	0	2		0	0	2	3	0	2		2	0	0	2	1	27
Lluvias intensas								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas								24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	576

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL QUIMBO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0516348 TLM

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-59752 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No.: 2139 DE 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: enero de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3697 DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE LA BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT. 891.102.335-3

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ECO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
8	27/01/2025	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DE LA SUBBASE POR METODO DEL CONO Y ARENA.	INV - 22 - E - 161	VEREDA LA TROJA	1	95%	97,9%	SI	K 0 + 010 EJE
8	27/01/2025	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DE LA SUBBASE POR METODO DEL CONO Y ARENA.	INV - 22 - E - 161	VEREDA LA TROJA	2	95%	99,2%	SI	K 0 + 040 DERECHO
8	27/01/2025	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DE LA SUBBASE POR METODO DEL CONO Y ARENA.	INV - 22 - E - 161	VEREDA LA TROJA	3	95%	97,9%	SI	K 0 + 075 EJE
8	27/01/2025	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DE LA SUBBASE POR METODO DEL CONO Y ARENA.	INV - 22 - E - 161	VEREDA LA TROJA	4	95%	98,1%	SI	K 0 + 105 IZQUIERDO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Luis Miguel Caquimbo Gomez
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:161037-0516348 TLM

Firma
Nombre: Carlos Eduardo Falla Villegas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:1920259752 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DENSIDAD DEL TERRENO METODO CONO Y ARENA CORREGIDO POR PORCENTAJE DE GRAVAS

OBRA:	CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 5. CONVENIO 2139 DE 2024			**FECHA DE TOMA:**	27/01/2025
DESCRIPCION:	SUB BASE GRANULAR - FUENTE PETROTEC SAS	**MUESTRA:**	SUB BASE GRANULAR - FUENTE PETROTEC SAS	**FECHA DE REPORTE:**	28/01/2025
LOCALIZACION:	VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA.	**SOLICITO:**	CONSORCIO INTER ECO	**NORMA/ ENSAYO:**	INV-22-E - 161

DENSIDAD IN SITU						
Localización	EJE	MARGEN DER	EJE	MARGEN IZQ		
Abscisa	K0+010	K0+040	K0+75	K0+105		
Peso arena + Recipiente antes Ensayo, gr	6658	6618	6594	6586		
Peso arena + Recipiente despues Ensayo,gr	2850	2446	2624	2791		
Peso arena total Usada, gr	3808	4172	3970	3795		
Constante del cono, gr	1652	1652	1652	1652		
Peso arena en el Hueco, gr	2156	2520	2318	2143		
Peso unitario Arena, gr/cc	1,426	1,426	1,426	1,426		
Volumen del Hueco, cc	1512	1767	1626	1503		
Peso total del Suelo Extraido Húmedo Pasa 3/4" gr	2769	3220	3171	2694		
Contenido de Humedad, %	7,1	7,0	7,3	7,5		
Peso total del suelo Extraido Seco Pasa 3/4" gr	2585	3009	2955	2506		
Peso Humedo de Gravas en gr	661	851	491	745		
Contenido de Humedad, o Absorción en %	2,00	2,00	2,00	2,00		
Peso de Gravas secas en gr	648	834	481	730		
Peso Total Muestra Seca en gr	3233	3844	3437	3236		
% de gravas	20,0	21,7	14,0	22,6		
% de Finos	80,0	78,3	86,0	77,4		
Peso Total del Suelo extraido Humedo gr	3.430	4.071	3.662	3.439		
Densidad Humeda gr/cc	2,269	2,304	2,253	2,288		
Humedad Corregida en %	6,1	5,9	6,6	6,3		
Densidad seca Total grs/cc E-228 (T224)	2,139	2,175	2,114	2,154		
Peso especifico de Gravas gr/cc	2,600	2,600	2,600	2,600		
Densidad Max del Laboratorio, gr/cc	2,101	2,101	2,101	2,101		
Densidad Max del Laboratorio corregida por % de grava E-228 (T224	2,185	2,192	2,159	2,196		
% Compactación	97,9%	99,2%	97,9%	98,1%		
CONTENIDO DE HUMEDAD						
Material pasa 3/4	80,0	78,3	86,0	77,4		
Peso del material humedo pasa 3/4	229,6	209,7	231,2	254,5		
Peso del recipiente y del suelo seco, gr	219,3	201,1	219,5	241,7		
Peso del agua, gr (P)	10,3	8,6	11,7	12,8		
Peso del recipiente, gr (Q)	73,6	78,9	59,0	69,9		
Peso del suelo Seco, gr (R)	145,7	122,2	160,5	171,8		
Contenido de Humedad, % (S)	7,1	7,0	7,3	7,5		
% de grava	20,0	21,7	14,0	22,6		

OBSERVACIONES

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.
NIT. 901.797.104-8
LUZ DIVIA QUIMBAYA CUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 2139 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 2/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,320,555.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,320,555.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3697 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER ECO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 20,132,056.00	2/07/2024	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10,066,028.00	2/07/2024	31/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330951

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260,000,000.00	2/07/2024	31/12/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083419 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 20,132,056.00	2/09/2024	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10,066,028.00	2/09/2024	31/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100330951

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260,000,000.00	2/07/2024	31/12/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100083419 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Nombre: CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-59757 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS INTERVENTORÍA

- Informes especialistas y profesionales

Neiva, 4 de febrero de 2025

INFORME ACTIVIDADES DIRECTOR INTERVENTORÍA
PERIODO: ENERO DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de enero de 2025 del Ing. CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS –Director de Interventoría en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

ENTREGA DE INFORMES

Remisión de informe de avance semanal según modelo de la matriz de seguimiento técnico mediante oficio numerado con las siguientes fechas:

- 211-1-417 del 8 de enero, informe 13
- 211-1-457 del 16 de enero. Informe 14
- 211-1-501 del 21 de enero. Informe 15
- 211-1-560 del 29 de enero. Informe 16

Igualmente se presentaron los informes semanales de interventoría para los convenios en ejecución.

TRÁMITE DE ACTAS Y SOLICITUDES

Supervisión y seguimiento de los procesos relacionados con la ejecución de los convenios establecidos.

Realización y entrega para su debido trámite del acta de costos del mes de diciembre de 2024.

Persiste la falta de entrega oportuna de información relacionada con documentos pertinentes a la etapa de ejecución de los convenios. Adicionalmente, los convenios que se encuentran en ejecución también presentan atraso en la entrega de

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

información tanto técnica como financiera para lo cual se han efectuado requerimientos a las JAC. Conforme a lo indicado en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA numeral XXII del convenio *"Presentar los informes detallados semanales y mensuales, de los periodos ya cursados, respecto a las labores realizadas, que incluyan aspectos financieros, técnicos y administrativos*", se les ha solicitado principalmente lo siguiente:

INFORMES SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS

Programa de inversiones
Cronograma de obra
Acta recibo parcial de obra convenio
MEPI-MN1-IN-7-FR-1 Acta de modificación de cantidades de obra
MEPI-MN-1-IN-15-FR4 Formato de maquinaria y equipo
MEPI-MN-1-IN-15-FR10 Formato estado general del tiempo

ENTREGA DE INFORME MENSUAL: El informe respectivo de los residentes de obra, con periodicidad mensual debe tener al menos el siguiente contenido:

1. Información general del convenio
2. Localización
3. Resumen de las actividades ejecutadas en el periodo
4. Diseño aprobado de las obras (revisión de diseños geométricos y estructurales, tránsito de diseño)
5. Estado de las pólizas del convenio
6. Alcance inicial del convenio
7. Alcance final u obras ejecutadas
8. Avance de obra (cuadro de cantidades y costos – presupuesto original) memorias de cálculo
9. Relación de comités operativos realizados
10. Actividades de topografía y replanteo
11. Entrega de dotación – relación de personal en obra
12. Control de materiales en obra (fotocopia de los tiquetes o recibos de suministro de agregados, remisiones de materiales de construcción, etc.)
13. Registro fotográfico (antes, durante y después)
14. Fotocopia de bitácora de obra (debidamente refrendada por el inspector de interventoría)
15. Conclusiones y recomendaciones.

INFORMES SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS

Ahora bien, a los profesionales financieros de las OAC, también se les ha requerido para la entrega de los informes mensuales sobre la gestión de manejo del desembolso (CLÁUSULA OCTAVA numeral XII), presentar los informes detallados

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

semanales y mensuales, de los periodos ya cursados, respecto a las labores realizadas, que incluyan aspectos financieros, técnicos y administrativos (CLÁUSULA DECIMA PRIMERA numeral XXII), llevar el libro auxiliar detallado de seguimiento contable (CLÁUSULA DECIMA PRIMERA numeral XXVI).

Los formatos de seguimiento financiero a entregar previo diligenciamiento y trámite son:

Acta Mensual de Pagos Convenio
Formato Auxiliar Detallado
Informe inversión buen manejo desembolso
Plan Inversión Desembolso Mensual

Adicionalmente, se les ha indicado en comités operativos la obligatoriedad de entrega mensual de los siguientes informes:

MEPI-MN-1-IN-15-FR-8 informe financiero y presupuestal contrato de obra
MEPI-MN-1-IN-15-FR-12 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
MEPI-MN-1-IN-15-FR-6 Personal control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Se ha requerido también tener anexo los soportes de toda la información contable para efectos de liquidación de la siguiente manera:

1. Acta de aprobación de compras o comité operativo de aprobación de plan de compras,
2. Cotizaciones,
3. Comprobantes de egreso,
4. Cuentas de cobro y/o facturas,
5. Paz y salvo de proveedores y trabajadores
6. Exámenes de egreso de trabajadores.

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS

En cuanto a los recorridos o visitas a los sitios de las obras de los convenios se presenta el siguiente informe:

El 10 de enero se realizó visita social en conjunto con la parte técnica a las obras del convenio 2708.2024 de la JAC VERSALLES Colombia, para resolver inquietudes de la comunidad referente a los puntos donde quedaron establecidas las alcantarillas y poder concertar cambios de acuerdo a la necesidad de la comunidad y evaluando los puntos más críticos.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

El 21 de enero se realizó visita para seguimiento de la obra y comité de evaluación de saldo para el convenio 2087-2024 ISNOS SALTO DE BORDONLES con lo cual se estimó un remanente con el cual se va a realizar un filtro requerido según diseño. En esa misma visita se realizó seguimiento de los convenios, mediante reunión con los presidentes de las JAC SINAI convenio 2170-2024 y JAC MURALLA convenio 2084-2024. Se gestionó la solicitud de una nueva chequera en el banco Agrario del municipio de Isnos con los presidentes de SINAI Y BORDONES.

El 24 de enero se realizó visita de seguimiento de la obra del convenio 2234-2024 DE JAC PUEBLO VIEJO al sitio de la obra donde se encuentra personal de obra fundiendo placas del pavimento rígido por un carril. Se efectuó visita para verificación del sitio de la obra y localización de filtro de las obras del convenio 2692-2024 DE JAC COLON, ambos convenios del municipio de Algeciras.

El 29 de enero se realizó gestión en el banco Agrario del municipio de Nátaga para la solicitud de una chequera nueva del convenio 2111-2024 JAC CASCAJOSA en compañía de la presidente de la JAC. Se practicó visita a la obra en compañía de inspectora SST, ingeniera ambiental y residente de la interventoría. Se realizaron capacitaciones en área SST y ambiental a los trabajadores y se determinaron aspectos de la obra con presencia del residente de obra y la contadora de la JAC. En atención a la necesidad de tramitar una chequera nueva, también se realizó gestión en el banco Agrario de La Plata para el convenio 2799-2024 de la JAC Gallego y se efectuó reunión con la contadora de la JAC para firma de cheques.

OTROS

Asistencia a comités de seguimiento convocados por el INVIAS.

Igualmente; se hace acompañamiento a los comités operativos que se realizan conjuntamente con los miembros de las JAC, ingenieros residentes de obra y contadores; programados por cada uno de los ingenieros residentes, personal social y ambiental de la interventoría.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER ECO

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Neiva, 5 de enero de 2025

Informe del Ingeniero Residente de Interventoría – Zona Norte (Mes de Enero)

Contrato N.º 3697 de 2024 – Consorcio Inter Eco

Programa: Caminos Comunitarios para la Paz Total en el Departamento del Huila

Introducción

El presente informe resume las actividades realizadas durante el mes de enero de 2025, en el marco del Contrato N.º 3697 de 2024, ejecutado por el Consorcio Inter Eco bajo el programa "Caminos Comunitarios para la Paz Total" en el departamento del Huila. Estas actividades se llevaron a cabo en diferentes municipios y veredas de la Zona Norte, y abarcaron desde reuniones comunitarias hasta inspecciones técnicas y de control de calidad en la construcción de infraestructuras viales.

Cuerpo del Documento

10 de enero de 2025 – Visita al municipio de Colombia, vereda Versalles: Se realizó una reunión con la comunidad para aclarar dudas y definir nuevos puntos para la ejecución de alcantarillas, atendiendo solicitudes de la comunidad y buscando optimizar las facilidades constructivas.

14 de enero de 2025 – Visita al municipio de Colombia, vereda El Paraíso: Asistieron el ingeniero residente de interventoría y el laboratorista, quienes realizaron una inspección de obra y tomaron densidades de la subbase

instalada, obteniendo porcentajes óptimos de compactación en dos puntos; los otros dos requirieron recompactación hasta alcanzar el 95% requerido.

16 de enero de 2025 – Visita al municipio de Tello, vereda Puertas del Sol:

Asistieron el ingeniero residente de interventoría, el ingeniero residente ambiental, la trabajadora social y la residente SST. Se evidenció el acopio de materiales granulares y trabajos de topografía, además de la instalación de una caseta comunal prefabricada con mano de obra aportada por el convenio.

17 de enero de 2025 – Visita al municipio de Nátaga, vereda Yarumal:

La visita tuvo como objetivo definir la ejecución del box culvert y obras complementarias. Asistieron los dos ingenieros residentes, la ingeniera ambiental y la trabajadora social.

21 de enero de 2025 – Visita al municipio de Isnos, vereda Salto de Bordones:

Se revisaron los aspectos relacionados con la construcción de la placa huella, constatando que las obras están próximas a culminar, en buen estado, y sin fisuras, cumpliendo con los diseños aprobados.

27 de enero de 2025 – Visita al municipio de Baraya, vereda La Troja:

Se verificó que la subbase está instalada y que los materiales aprobados han sido adquiridos. Se realizó la toma de densidades con resultados de compactación superiores al 95%, autorizándose la fundición de las losas de pavimento rígido.

29 de enero de 2025 – Visita al municipio de Colombia, vereda El Paraíso:

Se verificaron las buenas prácticas constructivas en las losas de pavimento,

sin evidencia de fisuras. Se recogieron 8 muestras tipo viguetas para ensayos de laboratorio.

30 de enero de 2025 – Visita al municipio de Baraya, veredas La Siria y ElHotel:

En La Siria se estaba fundiendo una alcantarilla y se tomaron muestras tipo cilindros. En El Hotel, por problemas con la topografía del terreno, se debió recompactar material debido al daño causado por la maquinaria pesada.

31 de enero de 2025 – Visita al municipio de Tello, vereda Puertas del Sol:

Revisión de losas y métodos constructivos, sin daños ni malas prácticas. Se recogieron 8 muestras tipo viguetas del costado izquierdo para laboratorio.

Conclusiones

Durante el mes de enero de 2025, se evidenció un avance significativo en las obras previstas en el marco del contrato, con una adecuada coordinación entre el personal técnico y las comunidades beneficiadas. Los problemas identificados fueron resueltos oportunamente, garantizando la calidad y seguridad en la ejecución de las obras.

Recomendaciones

Continuar con la supervisión constante para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en las próximas fases del proyecto.
Fortalecer la comunicación con las comunidades para anticipar y mitigar posibles inconvenientes durante la ejecución.
Implementar medidas adicionales para manejar el tránsito de maquinaria en terrenos de alta pendiente, evitando daños en la infraestructura ya construida.

ANEXOS

COLOMBIA - VERSALLES





COLOMBIA- PARAISO





TELLO - PUERTAS DEL SOL





NATAGA – YARUMAL



ISNOS – SALTO DE BORDONES



BARAYA – LA TROJA





Consorcio Inter Eco

COLOMBIA- PARAISO



BARAYA – LA SIRIA





BARAYA – EL HOTEL





TELLO - PUERTAS DEL SOL





Neiva, 6 de febrero de 2025

INFORME ACTIVIDADES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ZONA SUR

PERIODO: ENERO DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de enero de 2025 del Ing. Mario Fernando Castillo Rojas Residente de Interventoría de la zona sur en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Durante el presente periodo se realizó comité operativo con las siguientes juntas de acción comunal:

Comité operativo No.10 Vereda Sinaí de enero de 2025

Comité operativo No. 6 Vereda Mesón 09/01/2025

Comité operativo No.7 Vereda Mesón 14/01/2025

Comité operativo No. 8 Vereda Mesón 23/01/2025

Comité operativo No. 5 Vereda Yarumal 18 de enero de 2025

Comité operativo No. 6 Vereda Yarumal 30 de enero de 2025

Comité operativo No. 3 Vereda Cascajosa 13 de enero de 2025.

Comité operativo No. 6 Vereda Yarumal 30 de enero de 2025

Comité operativo No. 5 Vereda pueblo viejo 28 de enero de 2025

Comité operativo No. 3 Vereda Naranjos Bajos 22 de enero de 2025

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS

En cuanto a los recorridos o visitas a los sitios de las obras de los convenios se presenta el siguiente informe:

El 14 de enero se realizó visita de obra a la Vereda el Mesón de Garzón, con el fin de

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

conocer el avance de obra, donde se logró evidenciar un avance físico del 90 % en reunión con el residente de obra se estableció la necesidad de solicitar varilla de 3/8 debido a que se requería para la terminación de la obra, adicionalmente se le informo la necesidad de hacer entrega de toda la documentación necesaria para la liquidación del convenio, acta de recibo, bitácora, memorias de cálculo, formatos financieros, entrega de paz y salvo de todos los proveedores, así mismo se le requirió realizar el relleno en la parte posterior de los bordillos de la placa huella.

El 16 de enero se realizó visita para seguimiento de obra a la vereda Salto de Bordones con el fin de verificar el avance de obra. Donde se logro evidenciar un avance del 75%, faltando la construcción de cunetas y bordillos en la totalidad del tramo de placa huella, se le informo al residente de obra la necesidad de hacer entrega de toda la documentación necesaria para la liquidación del convenio, acta de recibo, bitácora, memorias de cálculo, formatos financieros, entrega de paz y salvo de todos los proveedores, igualmente se le informo que debido a la caracterización geotécnica del diseño de placa huella era necesario la construcción del filtro lateral, para la cual se le solicito hacer la proyección de las cantidades necesarias para la ejecución de dicho filtro, y realizar el balance financiero.

El 16 de enero se realizó visita para seguimiento de obra a la vereda La muralla con el fin de verificar el avance de obra. Donde se logró evidenciar un avance del 90%, faltando la construcción de cunetas y bordillos en la totalidad del tramo de placa huella, se le informo al residente de obra la necesidad de hacer entrega de toda la documentación necesaria para la liquidación del convenio, acta de recibo, bitácora, memorias de cálculo, formatos financieros, entrega de paz y salvo de todos los proveedores.

El 16 de enero se realizó visita para seguimiento de obra a la vereda Sinaí con el fin de verificar el avance de obra. Donde se logró evidenciar un avance del 90%, faltando la construcción 30 ml con sus cunetas y bordillos en la totalidad del tramo de placa huella, se le informo al residente de obra la necesidad de hacer entrega de toda la documentación necesaria para la liquidación del convenio, acta de recibo, bitácora, memorias de cálculo, formatos financieros, entrega de paz y salvo de todos los proveedores.

El 17 de enero se realizó visita para seguimiento de obra a la vereda Yarumal, se realizó la localización de las obras a realizar en compañía de residentes de la vereda, se logro evidenciar que el cemento, la formaleta ya se encontraban en obra, y en comunicación con el residente de obra, se daría inicio el día lunes, y en el transcurso de la semana siguiente terminaría de llegar los materiales faltantes.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

El 24 de enero se realizó visita de seguimiento de la obra a la vereda Pueblo Viejo donde se logra evidenciar el avance en la construcción de aproximadamente 22 ml de placas del pavimento rígido por un carril, ese mismo día se realiza visita a la vereda Colon para verificación del sitio de la obra y localización de filtro de las obras del convenio, ambos convenios del municipio de Algeciras.

El 29 de enero se realizó visita de obra a la vereda la Cascajosa del municipio de Nátaga, en compañía de la presidente de la JAC. inspectora SST, ingeniera ambiental y director de la interventoría. Se realizaron capacitaciones en área SST y ambiental a los trabajadores y se determinaron aspectos de la obra con presencia del residente de obra y la contadora de la JAC.

El 29 de enero se realizó visita de obra a la vereda gallego del municipio de La Plata, en compañía de la inspectora SST, ingeniera ambiental. Se realizaron capacitaciones en área SST y ambiental a los trabajadores, se logró evidenciar el avance en la construcción de la cinta en concreto ciclópeo, se verifico el sitio donde se debe desarrollar el filtro.

El día 31 de enero se realizo visita de obra a la vereda Naranjos bajos con el fin de verificar la conformación de vía y el suministro de subbase con el fin de programar toma de densidades. Este mismo día se realizo visita a las obras de pavimentación de la Vereda Pueblo Viejo para hacer seguimiento a las labores de pavimentación y se realizó toma de viguetas para laboratorios de calidad. En la Vereda Colon se realizó seguimiento a las excavaciones para la construcción de filtro, y la excavación para el cabezote de la alcantarilla.

Atentamente,

MARIO FERNANDO CASTILLO ROJAS
Residente De Interventoría Zona Sur
CONSORCIO INTER ECO

Registro fotográfico

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Placa Huella Vereda El Mesón Garzón





Placa Huella Vereda El Mesón Garzón





Placa Huella Vereda Salto de Bordones – Isnos

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Placa Huella Vereda Salto de Bordones – Isnos





Placa Huella Vereda La Muralla – Isnos





Placa Huella Vereda La Muralla – Isnos

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Placa Huella Vereda Sinaí – Isnos





Placa Huella Vereda Sinaí – Isnos





Localización de box Colbert y material en obra de la vereda Yarumal.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Construcción de Pavimento rígido vereda Naranjos Bajos.





Conformación de vía para placa huella Vereda Cascajosa Nátaga.





Placa huella Vereda Gallego, Socialización ambiental y SST.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Conformación de la vía para Placa Huella Naranjos Bajos – Algeciras.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ZONA NORTE

Fecha: 1 al 31 de enero de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Territorial Huila.
Convenios: Zona Norte

- ## Apoyo a Comités de aprobación PLAN DE COMPRAS.

Durante este periodo, se realiza apoyo en los comités para aprobación de plan de compras No 3 Y 4 de los siguientes convenios:

- 20 enero de 2025, vereda EL HOTEL
- 20 enero de 2025, vereda LA TROJA
- 22 enero de 2025, vereda EL PROGRESO

- ## Recepción y Evaluación de la documentación ambiental inicial

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación ambiental inicial del convenio 2110 de 2024, en donde se recibe la siguiente documentación:

- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS.
- MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.
- ANEXOS:
  a) Planos de localización.
  b) Registro fotográfico inicial.
  c) Permisos autorizaciones, Concesiones:
     i. Manejo Agua Superficial
  d) Manejo Material de Excavación (Solicitud para aprobación de reutilización del material de excavación, con su respectiva aprobación por parte de interventoría.)
     ii. Materiales de Cantera (Licencia Ambiental y RUCOM).
     iii. Manejo de vertimientos y Residuos Sólidos.
  e) Certificado interventoría de NO PAGA.
  f) Plan de Gestión Ambiental – PGA (cuentan con su respectiva aprobación por parte de interventoría).

- **Remisión documentación ambiental inicial aprobada a la SS del INVIAS**

Se realiza la respectiva radicación de la documentación ambiental inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, de la siguiente manera: convenio 2110 de 2024, radicado 2025E-VUVRAZ-002046.

- **SOLICITUD CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO CAM**

Se envían comunicados a la CAM, solicitando el certificado de NO PROCESOS EN CURSO, para los siguientes convenios:

- 2269 de 2024
- 2108 de 2024
- 2318 de 2024
- 2708 de 2024

- OBTENCIÓN CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO POR PARTE DE LA CAM de los convenios:

- 2269 de 2024
- 2108 de 2024

- **VISITAS A CAMPO CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGA** de los convenios 2708 DE 2024, 2105 DE 2024 y 2318 DE 2024.



GUILLERMO ALBERTO ROJAS SANCHEZ
CC. 1.075.216.697
PROFESIONAL AMBIENTAL ZONA NORTE
CONSORCIO INTER ECOCEL. 3104421539

Informe de Actividades Ambientales Zona Sur

Fecha: 1 al 31 de enero de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invias), Territorial Huila.
Convenios: Zona Sur

- **Municipio Algeciras**:

✓ Convenio 2234 – 2024: Paraíso Pueblo Viejo

El día 24 de enero de 2025, una vez revisada y ajustada la documentación ambiental inicial, se remitió a la sub dirección de sostenibilidad del INVIAS para la No Objeción. (**Anexo 1.** Oficio entrega inicial)

✓ Convenio 2692 – 2024: Colon

El día 10 de enero de 2025, se realizó comité operativo de aprobación de cotizaciones para el plan de compras. Se revisó los elementos ambientales que debe adquirir la JAC para la ejecución de la obra. Se reiteró la entrega de la documentación ambiental inicial, ya que hicieron una entrega parcial de lo requerido.



✓ Convenio 2130 – 2024: Naranjos Bajos

Se hizo seguimiento telefónico al residente de obra, con el fin de que haga entrega de la documentación ambiental inicial completa, conforme a lo requerido desde el mes de noviembre de 2024. A la fecha se ha realizado entrega incompleta de la documentación.

❖ **Municipio de Isnos:**

✓ Convenio 2087-2024: Salto de Bordones

El 16 de enero de 2025, se realizó visita en obra para hacer seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó uso del punto ecológico, manejo de materiales de obra, cubrimiento de materiales con plástico, manejo de bolsas de cemento vacías.




El 21 de enero de 2025, se presentó una solicitud a la CAM de que nos certifiquen que el convenio no presenta procesos activos con la Corporación, teniendo en cuenta que ya se encuentran finalizando la obra. (**Anexo 2**. Oficio No procesos Bordones)

El 27 de enero de 2025, La CAM hizo entrega del certificado de NO PROCESOS en curso del convenio. (**Anexo 3.** Certificado CAM Bordones)

✓ Convenio 2170-2024: Sinaí

El 10 de enero de 2025, se realizó comité operativo de seguimiento al convenio, se hizo la solicitud de hacer entrega del informe mensual ambiental. (**Anexo 4.** Comité operativo Sinaí)



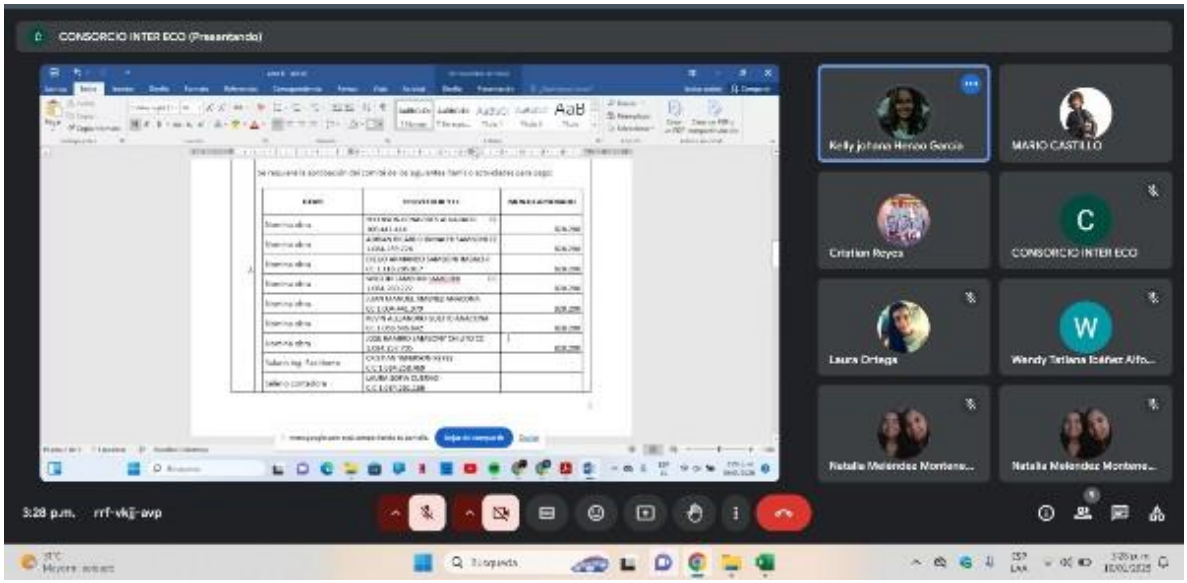

El 16 de enero de 2025, se realizó visita en obra para hacer seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó uso del punto ecológico, manejo de materiales de obra, cubrimiento de materiales con plástico. Se solicitó hacer entrega del informe mensual ambiental. Se hizo la recomendación de hacer un correcto manejo de bolsas de cemento vacías, acopiarlas dentro del campamento de obra y disponerlas con el carro recolector de residuos de la vereda.



El 21 de enero de 2025, se presentó una solicitud a la CAM de que nos certifiquen que el convenio no presenta procesos activos con la Corporación, teniendo en cuenta que ya se encuentran finalizando la obra. (**Anexo 5**. Oficio No Procesos Sinaí)

El 23 de enero de 2025, Se apoyo con el envio de las observaciones del especialista en geotecnia. (**Anexo 6.** Correo especialista Sinaí)

El 27 de enero de 2025, La CAM hizo entrega del certificado de NO PROCESOS en curso del convenio. (**Anexo 7.** Certificado CAM Sinaí)

- ✓ Convenio 2084-2024: La Muralla

El 16 de enero de 2025, se realizó visita en obra para hacer seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó uso del punto ecológico, manejo de materiales de obra, cubrimiento de materiales con plástico, manejo de bolsas de cemento vacías. Se solicitó hacer entrega del informe mensual ambiental.



El 21 de enero de 2025, se presentó una solicitud a la CAM de que nos certifiquen que el convenio no presenta procesos activos con la Corporación, teniendo en cuenta que ya se encuentran finalizando la obra. (**Anexo 8.** Oficio No Procesos Muralla)

El 27 de enero de 2025, la CAM dio respuesta acerca de los NO PROCESOS en ejecución del convenio. (**Anexo 9.** Certificado CAM Muralla)

- ❖ **Municipio de Acevedo:**

- ✓ Convenio 2788-2024: La Primavera

El dia 7 de enero de 2025, se hizo entrega de la documentación ambiental inicial a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS mediante el oficio 211-1-407. (**Anexo 10.** Oficio Entrega Documentación inicial Primavera)


El 23 de enero de 2025, Se apoyo dando respuesta a las observaciones del especialista en geotecnia. (**Anexo 11.** Correo especialista)

- ✓ Convenio 2639-2024: San José de Riecito

El día 8 de enero de 2025, se hizo la entrega de la documentación ambiental inicial a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS mediante el oficio 211-1-415. (**Anexo 12.** Oficio Oficio Entrega Documentación Inicial Riecito)

- ✓ Convenio 2338-2024: Versalles


El 27 de enero de 2025, apoyé la realización del comité operativo para aprobación de la hoja de vida del contador y para dar reinicio a la ejecución del convenio. Se hace solicitud de entrega de la revisión del diseño del pavimento y alcantarillas, así como la documentación ambiental inicial.

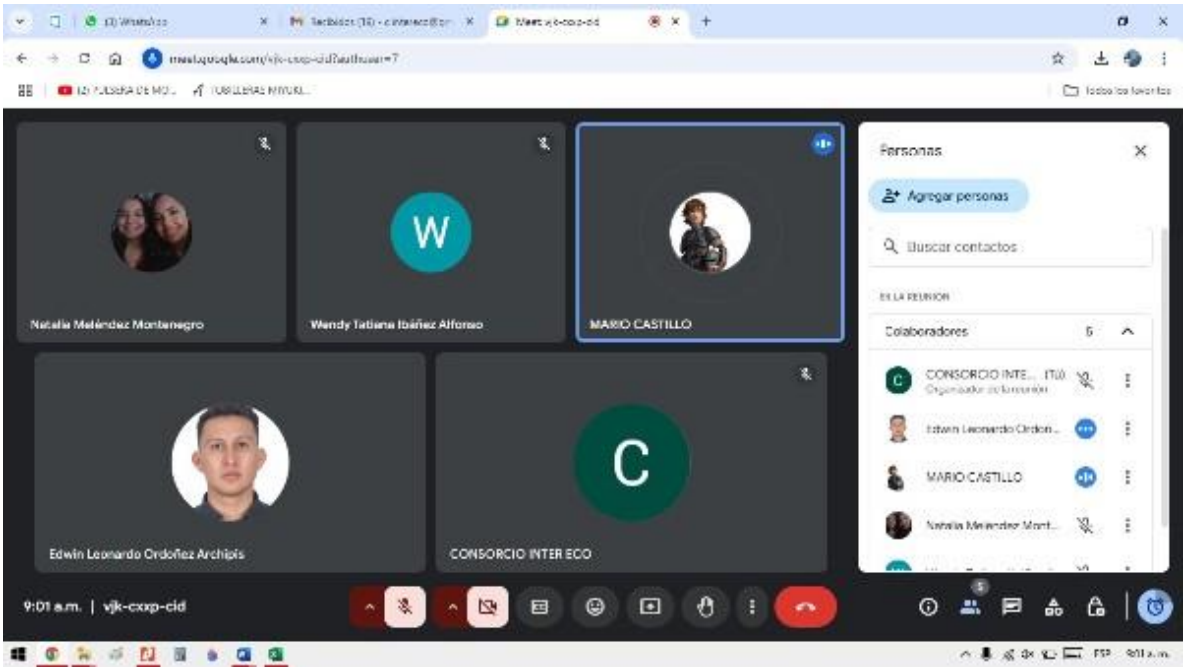

❖ **Municipio de Saladoblanco:**


✓ Convenio 2109-2024: Morelia

El dia 15 de enero de 2025, apoyé la realización del comité operativo de seguimiento al convenio, debido a que a la fecha no se ha recibido las cotizaciones del plan de compras, le que no ha permitido avanzar en el convenio. Dicho comité tuvo participación la territorial sur, en cabeza del ingeniero José Miguel Ortega. Se dejaron compromisos por parte del residente de obra.

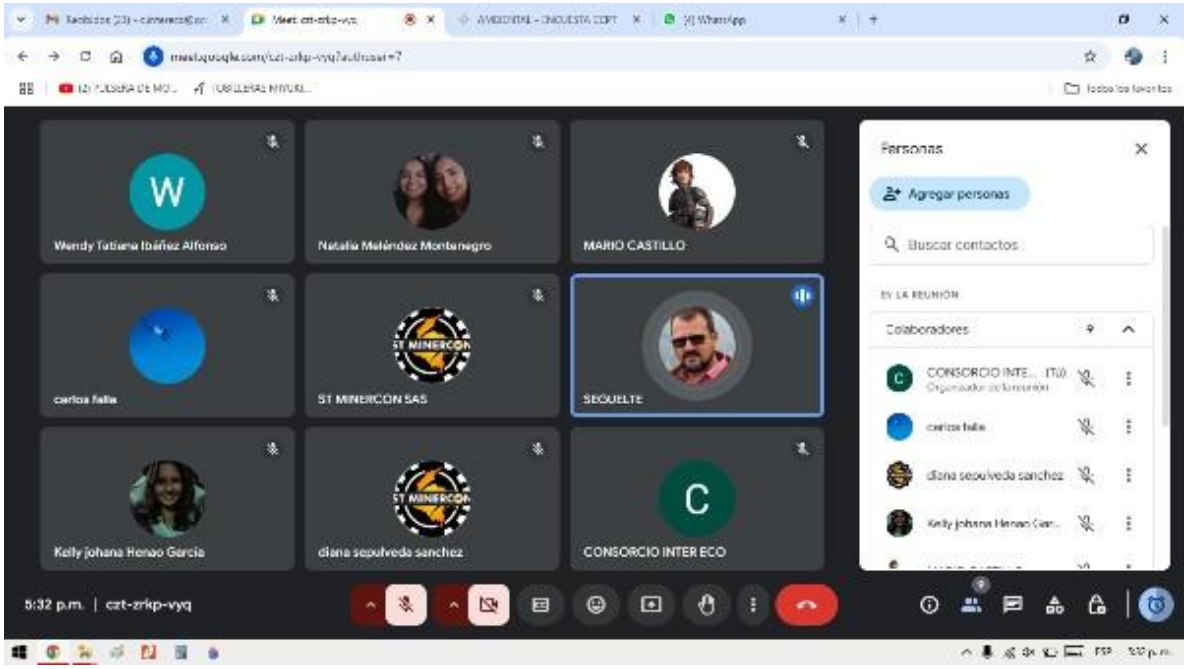

✓ Convenio 2280-2024: La Cabaña


El 24 de enero de 2025, apoyé la revisión de las cotizaciones presentadas por los convenios de La Cabaña y Morelia para el plan de compras. Se realizó por llamada telefónica la revisión de las mismas y se solicitó realizar ajustes debido a que algunos elementos solo presentan 1 cotización.

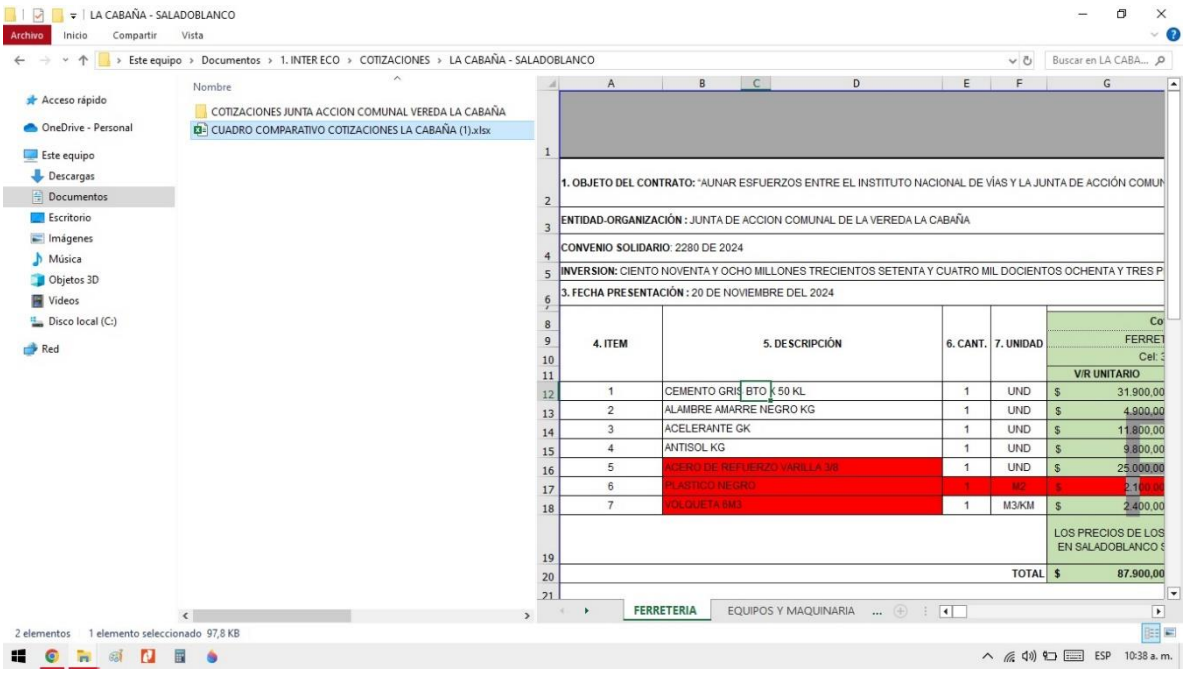

- ❖ **Municipio de Garzón:**

- ✓ Convenio 2063-2024: El Mesón

El día 9 de enero de 2025, se llevó a cabo el comité operativo No. 6 en el cual se reitera la entrega de la documentación ambiental inicial completa, ya que solo se hizo parte de la misma. Así mismo, se informa al residente de obra cuales son los documentos necesarios para el proceso de liquidación del convenio. (**Anexo 13.** Comité Operativo 6 El Mesón)

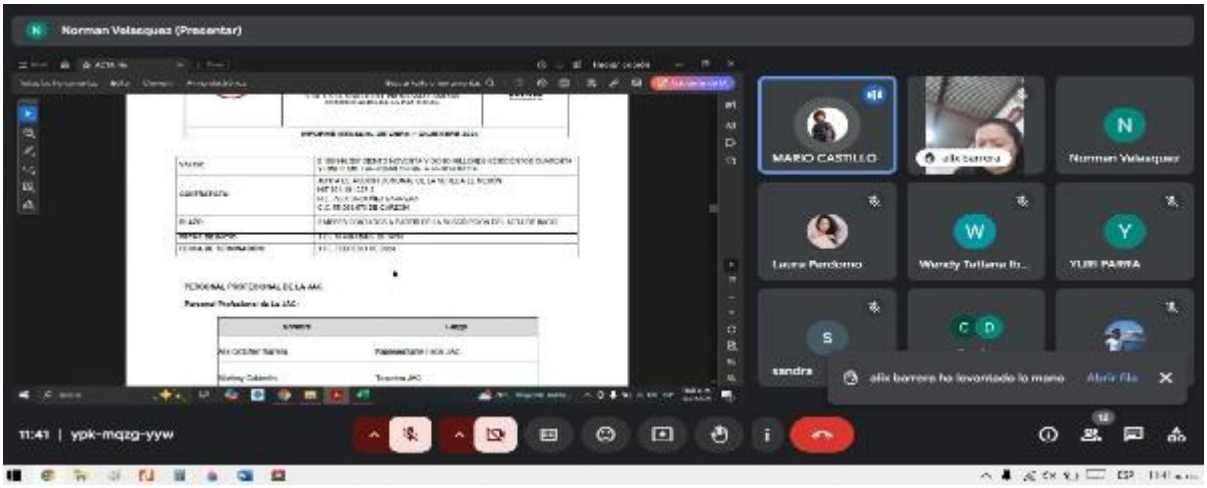

El día 14 de enero de 2025: Se realizó visita de seguimiento a la implementación del PGA. Se verificó en campo la implementación de las medidas ambientales (cubrimiento con plástico de los materiales, punto ecológico, campamento de obra, manejo de bolsas de cemento vacías). Se realizó charla socio ambiental con el personal del convenio y

adicionalmente se realizó comité operativo de seguimiento. (**Anexo 14.** Comité Operativo 7 El Mesón, **Anexo 15**. Charla socio ambiental Mesón)





El día 21 de enero de 2025, con el propósito de llevar a cabo los trámites de liquidación del convenio, se solicitó a la CAM se nos informe si a la fecha se han presentado procesos sancionatorios relacionados al contrato de obra correspondiente. (**Anexo 16**. Oficio No Procesos Mesón)

El día 22 de enero de 2025, después de haber revisado y ajustado la documentación ambiental inicial del convenio se remitió la documentación ambiental inicial a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS con el fin de la no objeción. (**Anexo 17.** Oficio entrega documentación ambiental inicial El Mesón)

El día 23 de enero de 2025, se realizó comité de seguimiento. Se solicito la entrega de los informes ambientales mensuales. (**Anexo 18.** Comité Operativo 8 El Mesón)



El día 29 de enero de 2025, se recibe por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, el certificado de NO PROCESOS en curso, donde ratifican que a la fecha no se adelanta ningún tipo de proceso sancionatorio. Dicho documento es requisito para el proceso de liquidación. (**Anexo 19**. Certificado CAM El Mesón)

❖ **Municipio La Plata:**

✓ Convenio 2799-2024: Gallego

El 23 de enero de 2025, se realizó visita a campo, con el fin de hacer seguimiento al convenio y verificar las medidas ambientales que están implementando en obra. Se realizó charla socio ambiental.



El 24 de enero de 2025, se realizó comité operativo de seguimiento. Se hizo nuevamente la solicitud de hacer entrega de la documentación que se encuentra pendiente del área ambiental. Se hizo recomendaciones para el manejo de las bolsas de cemento y del material de excavación.




❖ **Municipio Nátaga:**

✓ Convenio 2064-2024: Yarumal


El día 17 de enero de 2025, se realizó visita al sitio donde se ejecutarán las obras del convenio. Se verificó el correcto acopio de materiales.




El día 18 de enero de 2025, se realizó comité operativo de seguimiento al convenio, definiendo fecha de inicio de obra. Y suministro de los demás materiales necesarios para la ejecución de la obra. Se solicitó hacer entrega de la documentación ambiental inicial. Y presentar las tres cotizaciones para la compra del punto ecológico. (**Anexo 20.** Comité Operativo 5 Yarumal)

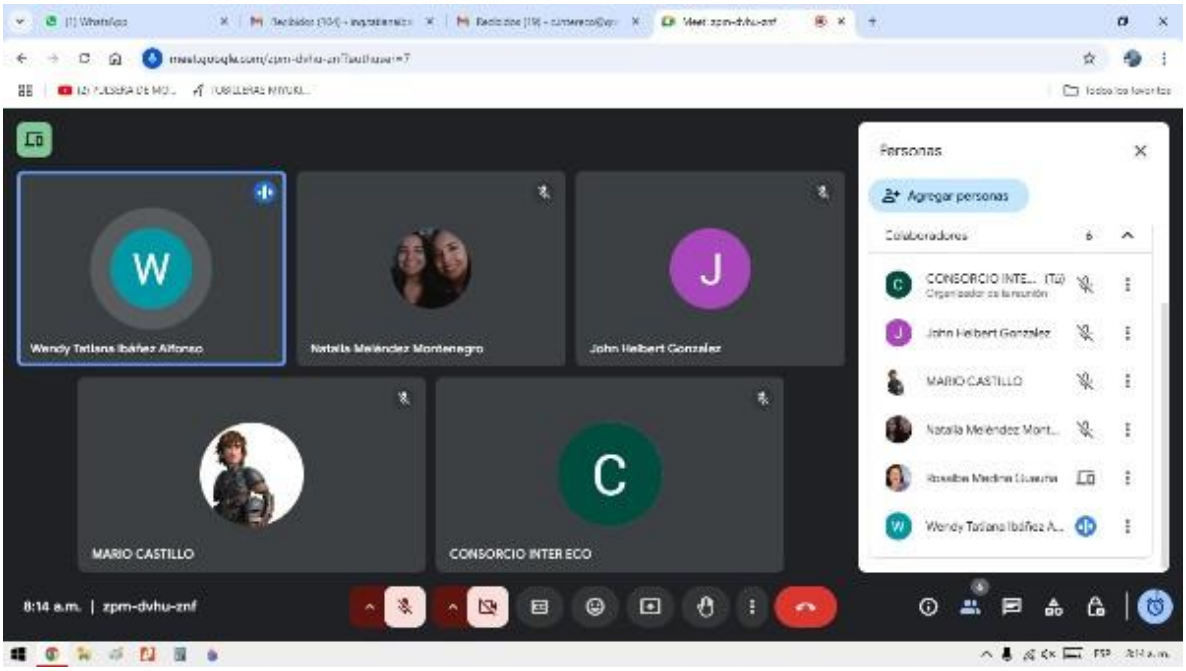

El 31 de enero de 2025, se realizó comité operativo para aprobación de compra del punto ecológico, y aprobación de pago de nómina, EPP para 2 trabajadores que ingresarán a la obra como MONC. Se solicito hacer entrega de la documentación ambiental inicial. (**Anexo 20.** Comité Operativo 6 Yarumal)

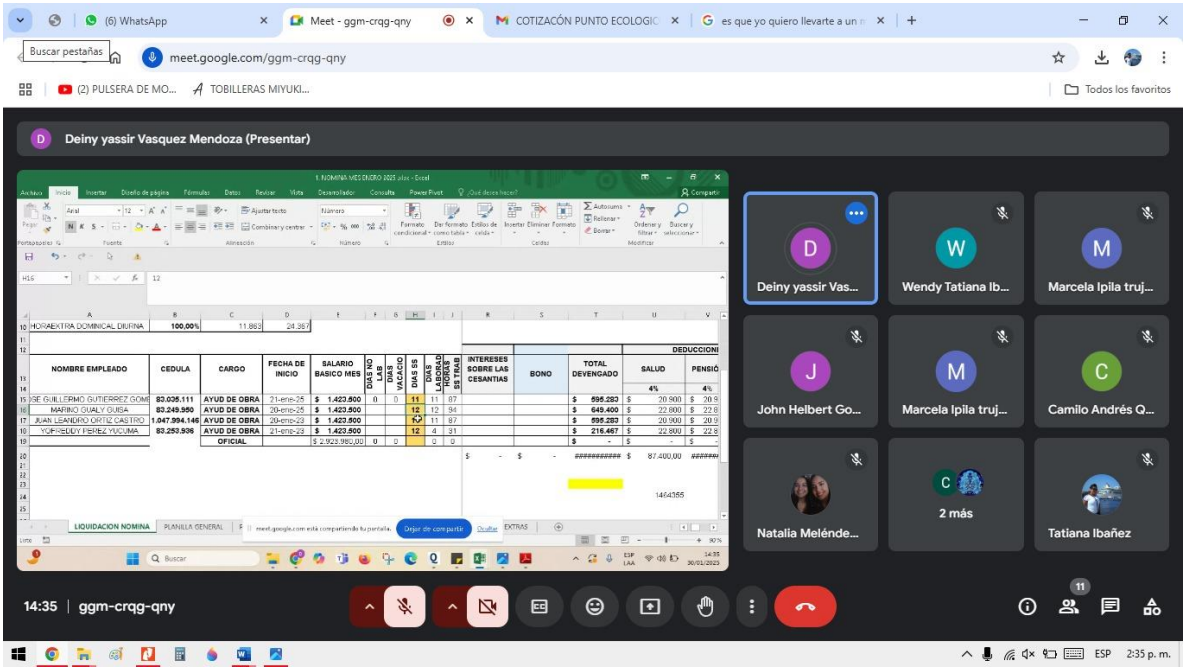

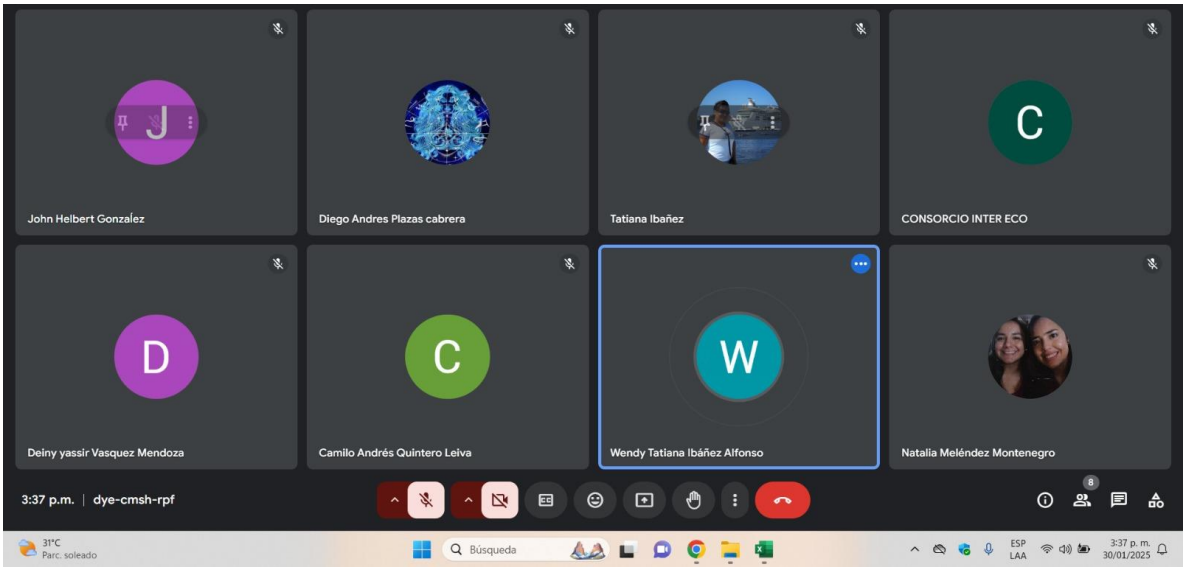

- ✓ Convenio 2111-2024: Cascajosa

El 13 de enero de 2025, apoye en el comité de aprobación de cotizaciones del plan de compras, se revisaron costos de elementos ambientales para compra (plástico negro, punto ecológico). Adicionalmente, se hizo de nuevo la solicitud de entrega de los documentos ambientales iniciales. (**Anexo 22.** Comité Operativo 3 La Cascajosa)






WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONSO
CC.: 1.075.227.174 de Neiva
PROFESIONAL AMBIENTAL ZONA SUR
CONSORCIO INTERECO
CEL: 3162410580

Informe de Actividades Sociales Zona Norte

Fecha: 1 de enero al 30 de enero
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invías), Territorial Huila.
Convenios: Zona Norte

- Se realizó cargue de información de convenios faltantes en el drive
- Se recibió documentación para inversión del rubro social asignado a la JAC santana.
- Se realizó oficio de reiteración entrega de documentación social para radicación ante subdirección de sostenibilidad del convenio 2151- 2024 Antillas.

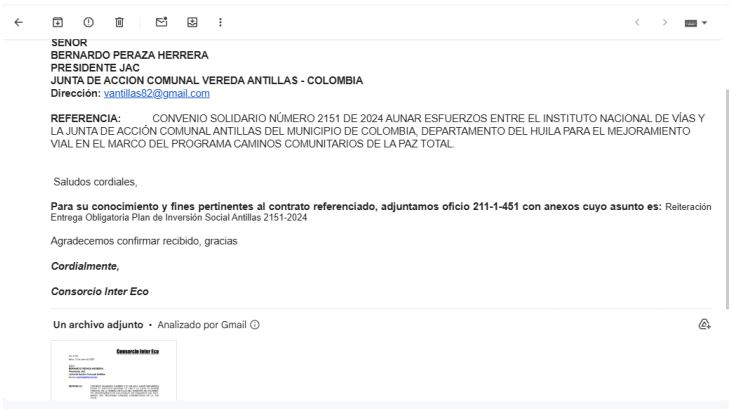

SENOR
BERNARDO PERAZA HERRERA
PRESIDENTE JAC
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANTILLAS - COLOMBIA
Dirección: vantillas82@gmail.com

REFERENCIA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2151 DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ANTILLAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-451 con anexos cuyo asunto es: Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social Antillas 2151-2024


Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

Consorcio Inter Eco

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

- Se realizó oficio de reiteración entrega de documentación social para radicación ante subdirección de sostenibilidad del convenio 2433 - 2024 Esperanza.

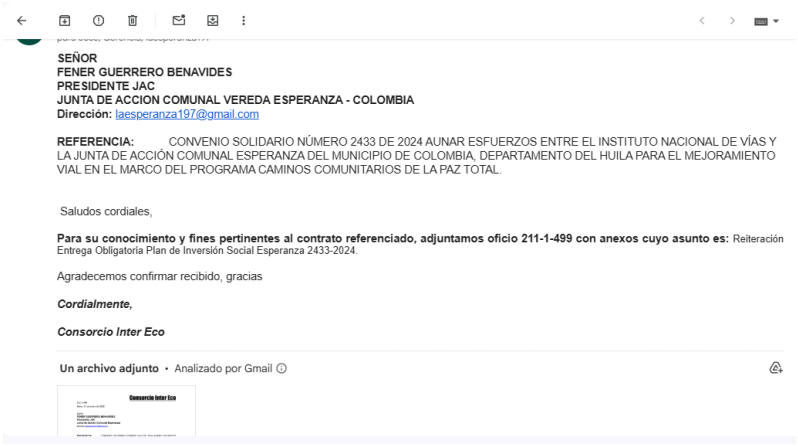

SEÑOR
FENER GUERRERO BENAVIDES
PRESIDENTE JAC
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ESPERANZA - COLOMBIA
Dirección: laesperanza197@gmail.com

REFERENCIA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2433 DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-499 con anexos cuyo asunto es: Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social Esperanza 2433-2024.

Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

Consorcio Inter Eco

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica de interventoría en la vereda Puerta del sol Tello, para hacer seguimiento y orientaciones sobre avances en la obra social.



- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica de interventoría en la vereda Versalles Colombia, para hacer seguimiento y orientaciones sobre avances en la obra social.



- Se realizó comité en conjunto con la parte técnica para dar aprobación al plan de inversión social presentada por la JAC y radicado ante sostenibilidad del convenio 2752-2024 Santana.

- Se realizó comité en conjunto con la parte técnica para dar aprobación al plan de inversión social presentada por la JAC y radicado ante sostenibilidad del convenio 2269-2024 Paraíso.

Interacción con presidentes de Juntas de Acción

- Se realizó mediante llamada telefónica solicitud a los presidentes de JAC de las veredas Antillas y esperanza, apoyo para que los ingenieros residentes de sus convenios alleguen la información social que se les ha solicitado hace 4 meses, esto en el fin de realizar radicación en sostenibilidad antes de terminar vigencia y así puedan iniciar ejecución de dichas obras.

Interacción con residentes de obra

- Durante este periodo se realizó orientación vía WhatsApp a las inquietudes de los residentes frente al diligenciamiento de los formatos sociales solicitados para la inversión social:

  MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL
  INFORME SOCIAL


- se realizó visita social en la vereda Puertas del sol Tello, para ejecutar charla temática sobre inclusión de género.



- se realizó visita social en la vereda Versalles Colombia, para ejecutar charla temática sobre inclusión de género.



- Se remite acta de entrega de materiales, orden de aceptación y compromiso a las JAC que ya tienen aprobada el plan de inversión social.

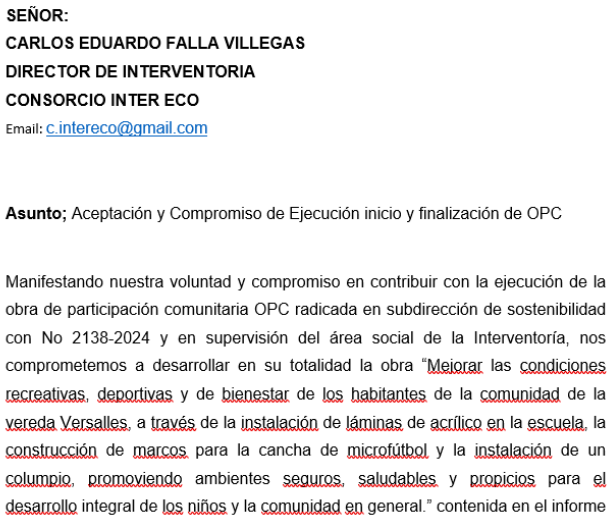

SEÑOR:
CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER ECO
Email: c.intereco@gmail.com

Asunto; Aceptación y Compromiso de Ejecución inicio y finalización de OPC

Manifestando nuestra voluntad y compromiso en contribuir con la ejecución de la obra de participación comunitaria OPC radicada en subdirección de sostenibilidad con No 2138-2024 y en supervisión del área social de la Interventoría, nos comprometemos a desarrollar en su totalidad la obra "Mejorar las condiciones recreativas, deportivas y de bienestar de los habitantes de la comunidad de la vereda Versalles, a través de la instalación de láminas de acrílico en la escuela, la construcción de marcos para la cancha de microfútbol y la instalación de un columpio, promoviendo ambientes seguros, saludables y propicios para el desarrollo integral de los niños y la comunidad en general." contenida en el informe

Remisión documentación social inicial a la SS

- Se recibió documentación del Plan de Inversión social de la vereda Troja de Baraya, y posterior a su revisión, se indicó al ingeniero residente que debía allegar la información faltante, una vez se tiene la documentación completa se procede a radicar el Plan de Inversión Social ante subdirección de sostenibilidad los cuales emiten el radico 2025E-VUVRAZ-001723.

- Se recibió documentación del Plan de Inversión social de la vereda Santana de Colombia, y posterior a su revisión, se indicó al ingeniero residente que debía allegar la información faltante, una vez se tiene la documentación completa se procede a radicar el Plan de Inversión Social ante subdirección de sostenibilidad los cuales emiten el radico 2025E-VUVRAZ-005381.

- Se recibió documentación del Plan de Inversión social de la vereda Paraíso de Colombia, y posterior a su revisión, se indicó al ingeniero residente que debía allegar la información faltante, una vez se tiene la documentación completa se procede a radicar el Plan de Inversión Social ante subdirección de sostenibilidad los cuales emiten el radico 2025E-VUVRAZ-003198.

Otras actividades

- Se realizó apoyo social a la parte técnica para dialogar con la comunidad y concertar los posibles cambios que plantean de los puntos establecidos para otros más críticos y que se encuentran dentro del tramo definido.



Paula Ximena Ramirez Monje

PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE
Profesional Social
T.P. 212367

Informe de Actividades Sociales Zona Sur:

Fecha: 1 al 31 de enero de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invias), Territorial Huila.
Convenios: Zona Sur


- **Asistencia a Comités Operativos de Seguimiento.**

Durante este periodo, se asistió a los comités operativos desarrollados para los siguientes convenios:


- ✓ 2063 – 2024 El Mesón – Garzón (09/01/2025): Se realizó comité operativo de seguimiento al convenio con el fin de revisar los avances a la fecha y así mismo revisar el estado actual de la documentación del Plan de Inversión Social. Se dejan compromisos para la entrega de la misma.




- ✓ 2692 – 2024 Colon – Algeciras (10/01/2025): Se realizó comité operativo de aprobación de cotizaciones para el plan de compras. Se realiza la verificación del Plan de Inversión Social; en donde hace falta el documento que expide la alcaldía para la Obra de Participación Comunitaria que va a realizar la JAC.

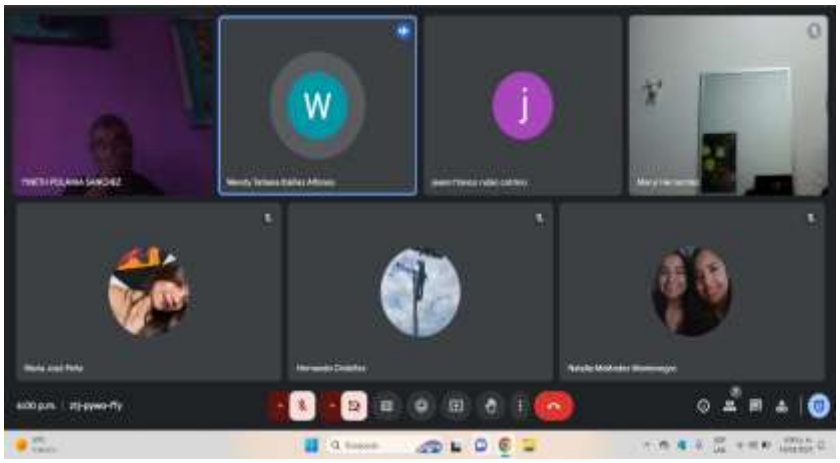


- ✓ 2111 – 2024 La Cascajosa - Nátaga (13/01/2025): Se realizó comité operativo de aprobación de cotizaciones. Se reiteró la importancia de realizar el envío del Plan de Inversión Social con el fin de que este sea radicado a la Subdirección de Sostenibilidad y así mismo aprobar las compras de los materiales para que den inicio a la OPC.

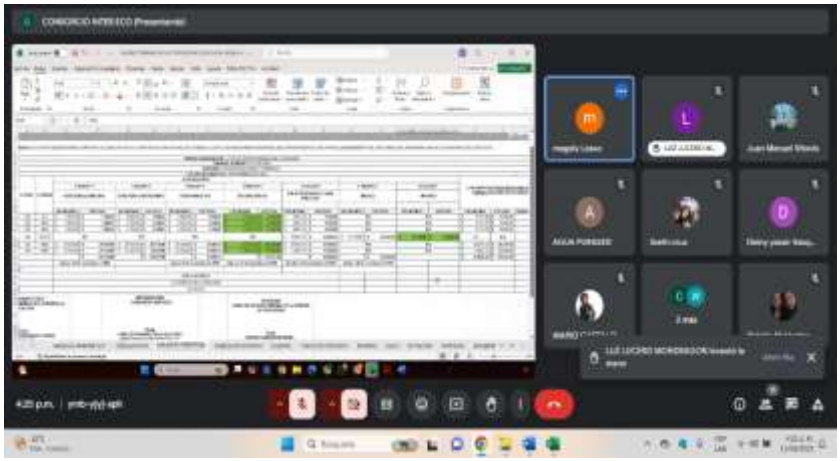


- ✓ 2692 – 2025 Colon – Algeciras (15/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Construcción e instalación de cubierta para la caseta comunal de la vereda Colon".

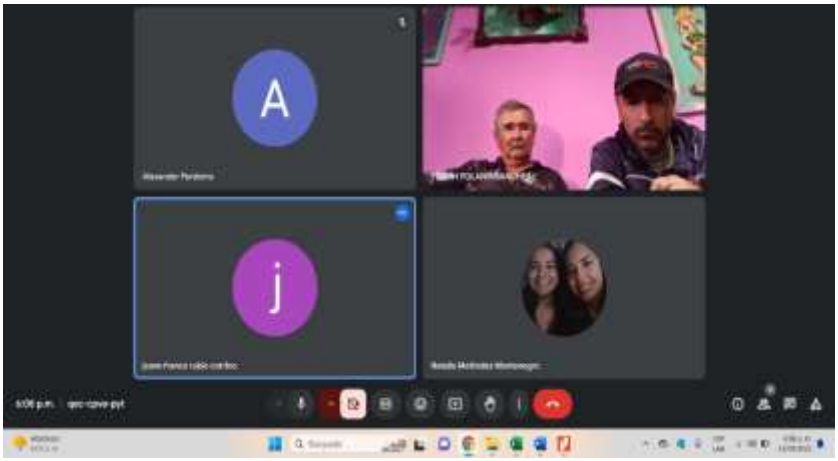


- ✓ 2130 – 2025 Los Naranjos Bajos – Algeciras (22/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Construcción de Placa de Contrapiso en el comedor de la I.E. Paraíso".

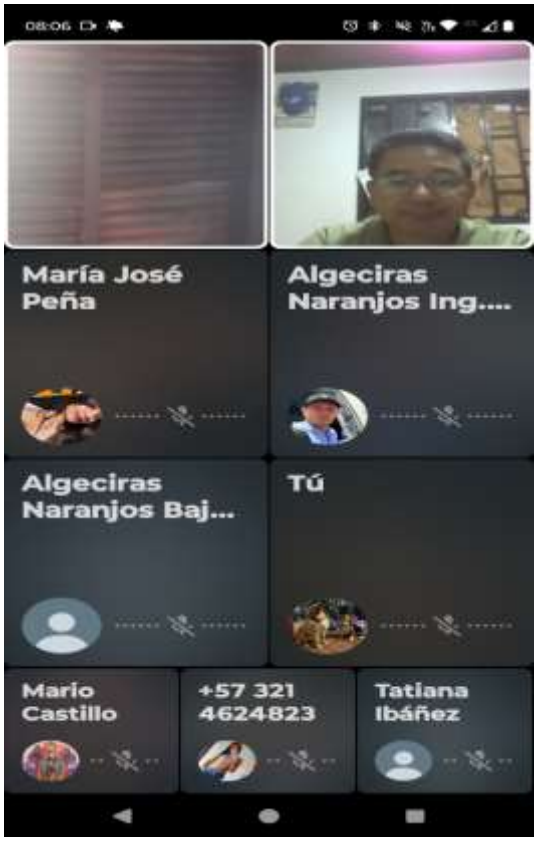

- ✓ 2063 – 2024 El Mesón – Garzón (23/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Embellecimiento a la I.E. Agropecuario del Huila Vereda El Mesón".

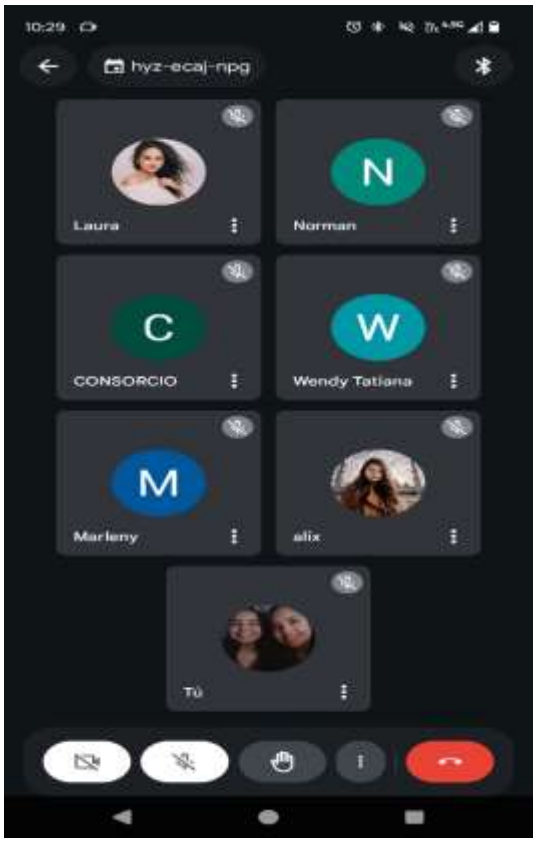


- ✓ 2799 – 2024 Gallego – La Plata (24/01/2025): Se realiza comité operativo en el cual se solicita las correcciones al Plan de Inversión Social.

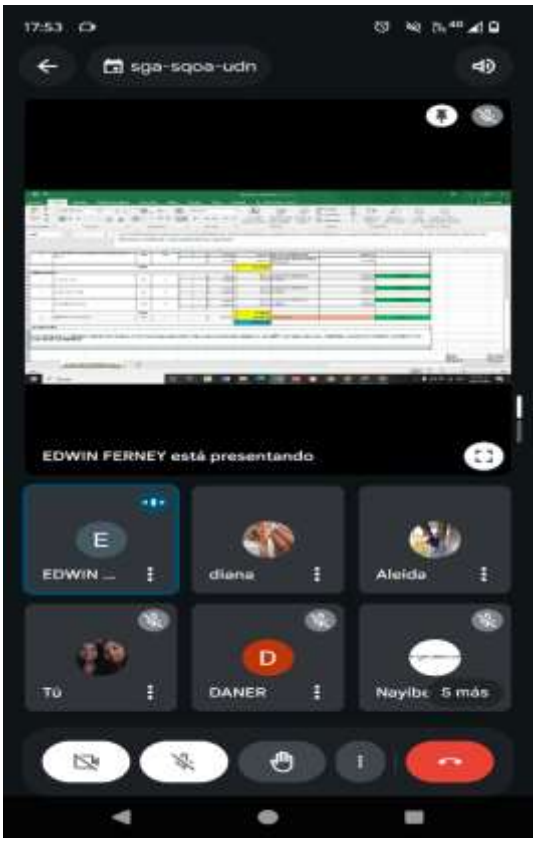


- ✓ 2234 – 2024 Paraíso Pueblo Viejo – Algeciras (25/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Mejoramiento del parque infantil para el sector de Pueblo Viejo de la Inspección de Policía de Paraíso"




- ✓ 2338 – 2024 Versalles – Acevedo (27/01/2025): Se realiza comité operativo, en el cual se explica la documentación inicial que se debe entregar para el Plan de Inversión Social.

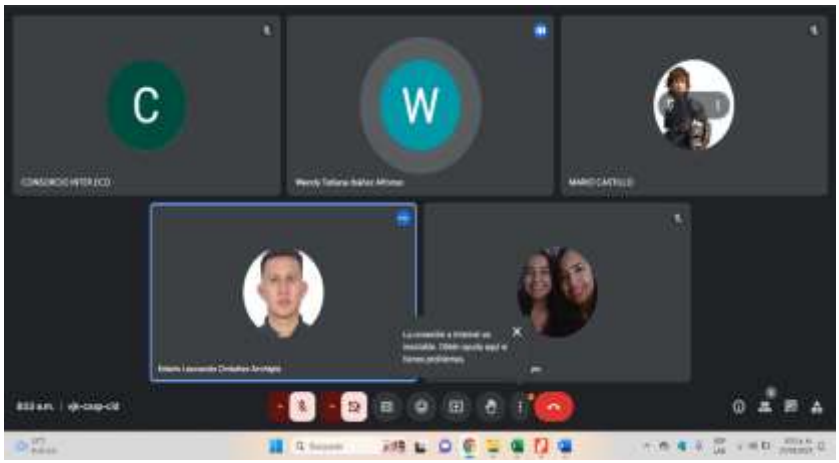


- ✓ 2799 – 2025 Gallego – La Plata (29/01/2025): Se lleva a cabo comité operativo con el fin de aprobar el Plan de Inversión Social, para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Construcción de placa contra piso en concreto e instalación de cubierta".

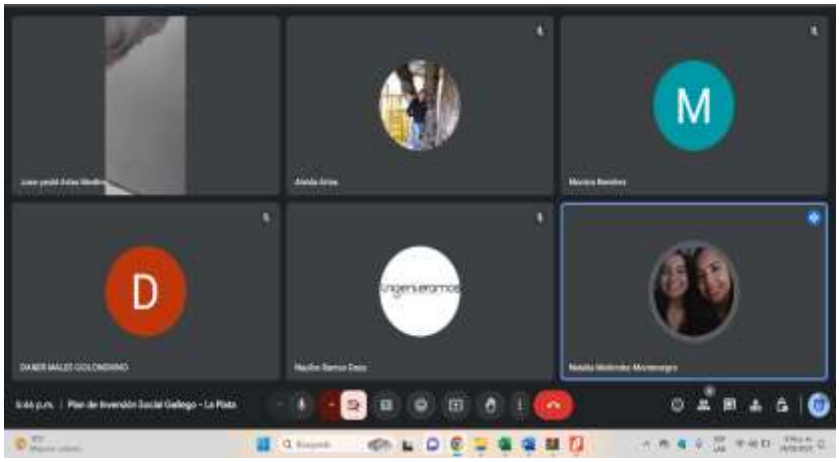


- ✓ 2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (30/01/2025): Se realizó comité operativo, en el cual se reiteró la importancia de realizar el envío del Plan de Inversión Social con el fin de que este sea radicado a la Subdirección de Sostenibilidad y así mismo aprobar las compras de los materiales para que den inicio a la OPC.

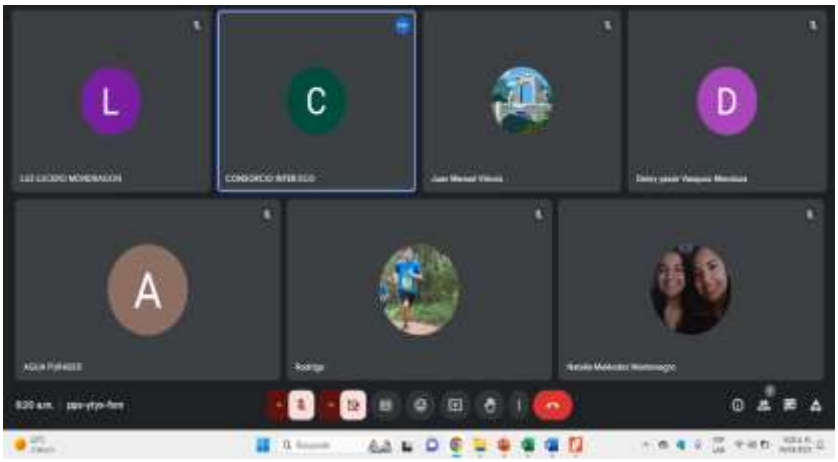

- ✓ 2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (30/01/2025): Se realizó comité operativo para aprobación de pagos; adicionalmente se manifiesta la importancia de iniciar con la OPC; el residente manifiesta que la próxima semana llevarán los materiales para la obra social.

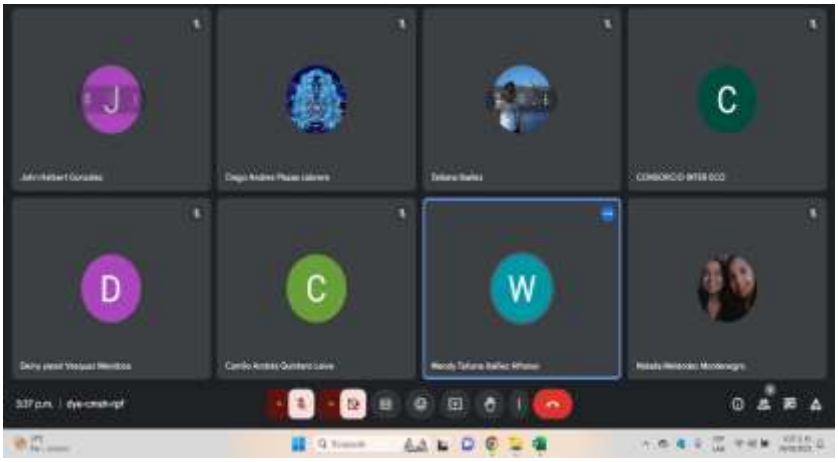

- ✓ 2109 – 2024 Morelia – Saladoblanco (31/01/2025): Se realizó comité operativo con el fin de dar aprobación a las cotizaciones de la obra civil. Así mismo se reitera la importancia de enviar el Informe Social que hace parte de la documentación del Plan de Inversión Social.

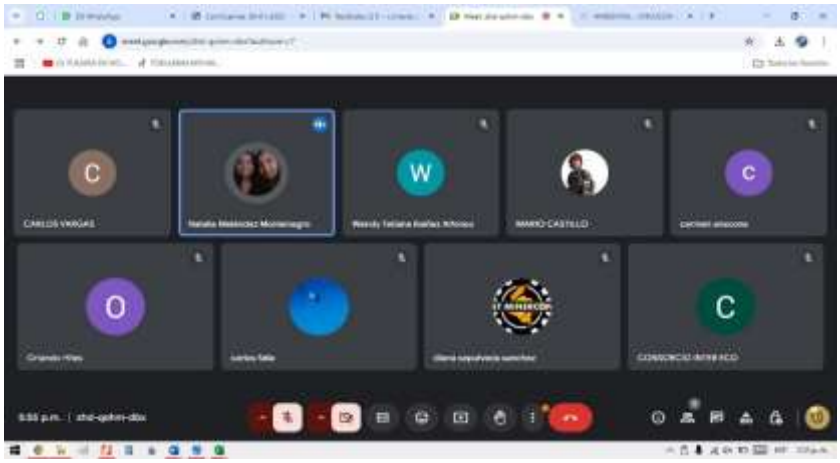

- **Recepción y evaluación de Plan de Inversión Social:**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación del Plan de Inversión Social:

- 2063 - 2024: El Mesón – Garzón.
- 2799 – 2024: Gallego – La Plata.

De los cuales se recibió la siguiente documentación:

1. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL.
2. INFORME SOCIAL.
3. ANEXO (3 Cotizaciones).
4. CERTIFICADO DE INTERVENCION (donación o posesión del predio donde se va a realizar la inversión).

Así mismo, se recibió información parcial de otros convenios, la cual está en proceso de revisión.

- 2109 – 2024: Morelia – Saladoblanco.
- 2280 – 2024: La Cabaña – Saladoblanco.

Estos Planes de Inversión se encuentra en ajustes por parte de la JAC y el residente de obra, ya que no allegaron el Informe Social y el certificado de intervención.

- **Remisión documentación social inicial enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez se revisó y se realizaron los ajustes correspondientes a los documentos entregados por parte de los contratistas de obra, se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-448, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2692 – 2024 JAC Colon – Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-003949.

- Oficio 211-1-512, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2063 – 2024 JAC El Mesón – Garzón, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-006973.

- Oficio 211-1-536, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2234 – 2024 JAC Paraíso Pueblo Viejo - Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-007650.

- Oficio 211-1-558, Entrega de Plan de Gestión Social Inicial del Convenio N°2799 – 2024 JAC Gallego – La Plata, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-009123.


- **Otras actividades:**

Durante el presente periodo realicé las siguientes actividades:

- El día 07 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda Sinaí del municipio de Isnos.



- El día 10 de enero del 2025 se realiza reunión de seguimiento al convenio N°2170 – 2024, se reiteró la importancia de dar inicio a la Obra de Participación Comunitaria.

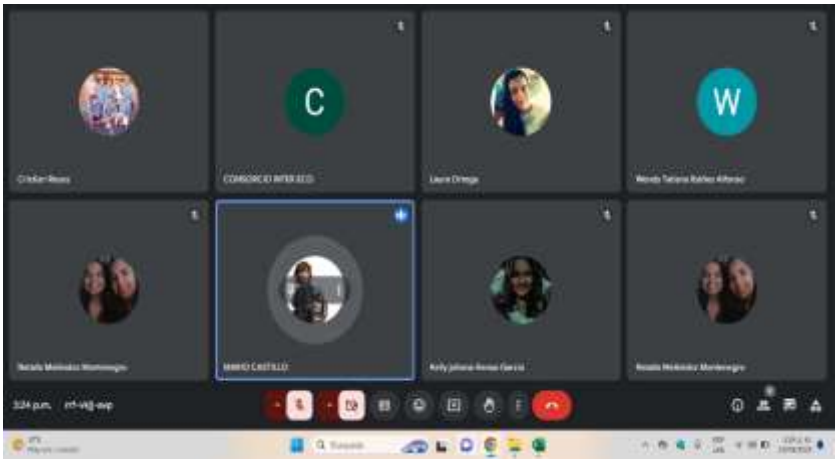

- El día 13 de enero del 2025 se realiza reunión de seguimiento al convenio N°2170 – 2024, En donde la JAC junto con el residente de obra manifestaron que se realizará la OPC del 27 de enero al 01 de febrero del 2025.



- El día 14 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda El Mesón del municipio de Garzón.



- El día 15 de enero del 2025 se remitieron los siguientes oficios 211-1-455 Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social La Cabaña y 211-1-456 Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social Morelia.

- El día 15 de enero del 2025 se realizó reunión de seguimiento a los convenios con el fin de revisar las dificultades que se han presentado, ya que a la fecha no han enviado información y así mismo revisar el estado actual de la documentación del Plan de Inversión Social. Se dejan compromisos para la entrega de la misma.



- El día 16 de enero del 2025 se realizó visita de seguimiento a las veredas La Muralla, Sinaí y Salto de Bordones del municipio de Isnos, para realizar seguimiento a la OPC.

- El día 17 de enero del 2025 se realizó visita de seguimiento a la vereda Yarumal del municipio de Nátaga para realizar seguimiento a la OPC.

- La JAC de la vereda La Muralla – Isnos finaliza la Obra de Participación, la cual realizó: “Cambio de cubierta y embellecimiento de la caseta comunal”.





- El día 23 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda Gallego del municipio de La Plata.



- El día 27 de enero del 2025 se remitió el siguiente oficio 211-1-548 Reiteración Entrega Obligatoria Plan de Inversión Social La Cascajosa.

- El día 29 de enero del 2025 se realiza capacitación de Inclusión Social con enfoque de Género a los trabajadores de mano de obra calificada y mano de obra no calificada de la vereda La Cascajosa del municipio de Nátaga.



- 2084 – 2025 La Muralla – Isnos (31/01/2025): Se realiza reunión de seguimiento mensual con el convenio 2084 – 2024, con el fin de revisar la documentación final del convenio. Desde la parte social se solicita ir adelantando las gestiones pertinentes para llevar a cabo la socialización final.



- 2087 – 2024 Salto de Bordones – Isnos (31/01/2025): La comunidad dio inicio a la Obra de Participación Comunitaria: “Embellecimiento y mejoramiento del escenario deportivo - cancha deportiva de la vereda Salto de Bordones”.



- 2788 – 2024 La Primavera – Acevedo (31/01/2025): La comunidad dio inicio a la Obra de Participación Comunitaria: “Mejoramiento de la caseta deportiva, cancha deportiva y sus alrededores”.



Natalia Andrea Meléndez Montenegro
Residente Social
