CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3 - FAC-MALAMBO ATLANTICO	**HORA:** 02:30 PM			
LUGAR: EDIFICIO GRUAL	**FECHA:**	07	02	2025
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
TE. Luis Armando Chamorro	FUERRZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Matías Moreno	FUERRZA AEREA COLOMBIANA	
William Guarín Ladino	GMZ CONSTRUCTORES	
Wilmar Yesid Zaraza Mora	GMZ CONSTRUCTORES	
Cristian Jaque Espitia	GMZ CONSTRUCTORES	
Luis Galvis Velasco	CONSORCIO 738	
Laura Triana Camacho	CONSORCIO 738	
Davian Cervantes Martínez	CONSORCIO 738	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Avance de obra: MY. Matías Moreno explica que al corte del 07 febrero 2025 un programado el 5,59% versus un ejecutado del 5,73% teniendo un avance del 0,14% las actividades que se encuentran en ejecución corresponden a los capítulos 3. Cimentación ítems 3.7 concreto de ciclópeo, 4. Estructura ítems 4.1.1 acero de refuerzo estructural, 4.1.7 zapata de concreto acelerado, capitulo 23 urbanismo ítems 23.2 nivelación, conformación y compactación de la subrasante para anden, 23.3 extendido y compactación de recebo común, capitulo 25 vías y pavimentos ítems 25.2 excavación mecánica, 25.5 extendido y compactación de recebo.

Anticipo: Dentro del anticipo se registran dos desembolsos 1 por el valor de $251.926.647,20 que corresponden al 11,01% del anticipo.
El saldo del anticipo es de $2.035.407.907,80 los rendimientos depositados a la fecha el último certificado que se ha pedido a la fiducia del banco de Bogotá el 31 diciembre 2024 corresponde a $24.818.258,88.

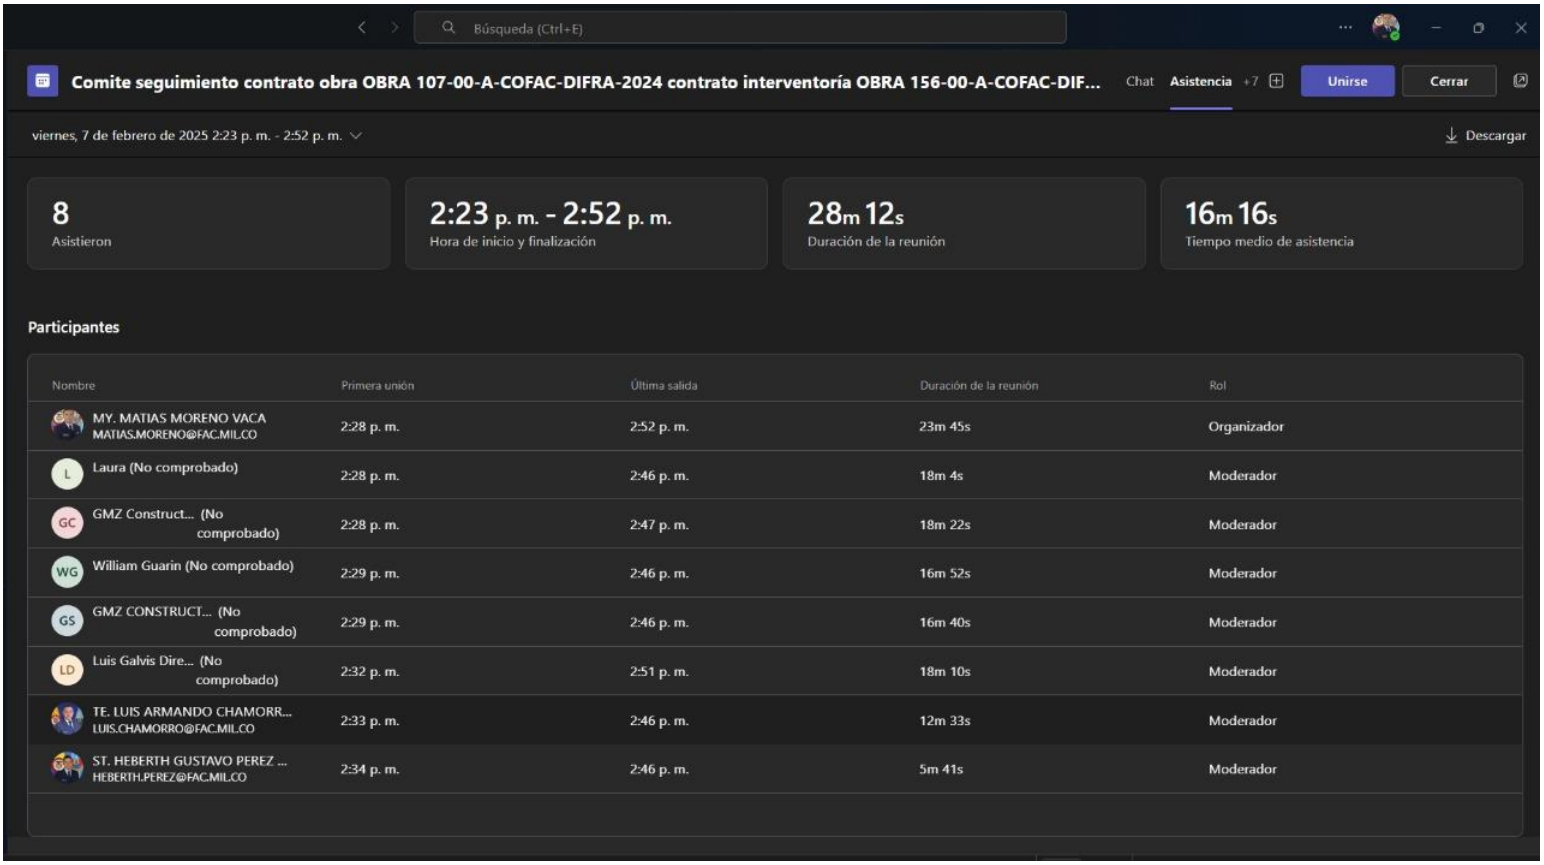
El contratista Gmz Constructores se compromete con el vaciado de las 16 zapatas faltantes.

TE. Chamorro recomienda, el rigor en la documentación que se está realizando ante un posible requerimiento de información ya sea por la FAC o un ente externo como la contraloría.
El supervisor de obra MY. Moreno comparte que la FAC está siendo auditada por la contraloría y recomienda al contratista a estar al día con la documentación que este pendiente, se recomienda el mantenimiento del cerramiento perimetral del proyecto, las bitácoras al día, cumplimiento de los requerimientos del área SST, registro vehicular y material que ingrese al proyecto.

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Proyectó: Ingeniero Residente Davian Cervantes

Próximo comité: 14 febrero 2025 2:30 PM


Búsqueda (Ctrl+E)
Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIF...
Chat
Asistencia
+7
Unirse
Cerrar
viernes, 7 de febrero de 2025 2:23 p. m. - 2:52 p. m.
Descargar
8
Asistieron
2:23 p. m. - 2:52 p. m.
Hora de inicio y finalización
28m 12s
Duración de la reunión
16m 16s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
MY. MATIAS MORENO VACA
MATIAS.MORENO@FAC.MIL.CO
2:28 p. m.
2:52 p. m.
23m 45s
Organizador
Laura (No comprobado)
2:28 p. m.
2:46 p. m.
18m 4s
Moderador
GMZ Construct... (No comprobado)
2:28 p. m.
2:47 p. m.
18m 22s
Moderador
William Guarin (No comprobado)
2:29 p. m.
2:46 p. m.
16m 52s
Moderador
GMZ CONSTRUCT... (No comprobado)
2:29 p. m.
2:46 p. m.
16m 40s
Moderador
Luis Galvis Dire... (No comprobado)
2:32 p. m.
2:51 p. m.
18m 10s
Moderador
TE. LUIS ARMANDO CHAMORR...
LUIS.CHAMORRO@FAC.MIL.CO
2:33 p. m.
2:46 p. m.
12m 33s
Moderador
ST. HEBERTH GUSTAVO PEREZ ...
HEBERTH.PEREZ@FAC.MIL.CO
2:34 p. m.
2:46 p. m.
5m 41s
Moderador
