CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3 - FAC-MALAMBO ATLANTICO	**HORA:** 02:30 PM			
LUGAR: EDIFICIO GRUAL	**FECHA:**	24	01	2025
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
TE. Luis Armando Chamorro	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Matías Moreno	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
TC. Fabio Robles Ramírez	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
William Guarín Ladino	GMZ CONSTRUCTORES	
Wilmar Yesid Zaraza Mora	GMZ CONSTRUCTORES	
Cristian Jaque Espitia	GMZ CONSTRUCTORES	
Luis Galvis Velasco	CONSORCIO 738	
Laura Triana Camacho	CONSORCIO 738	
Davian Cervantes Martínez	CONSORCIO 738	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

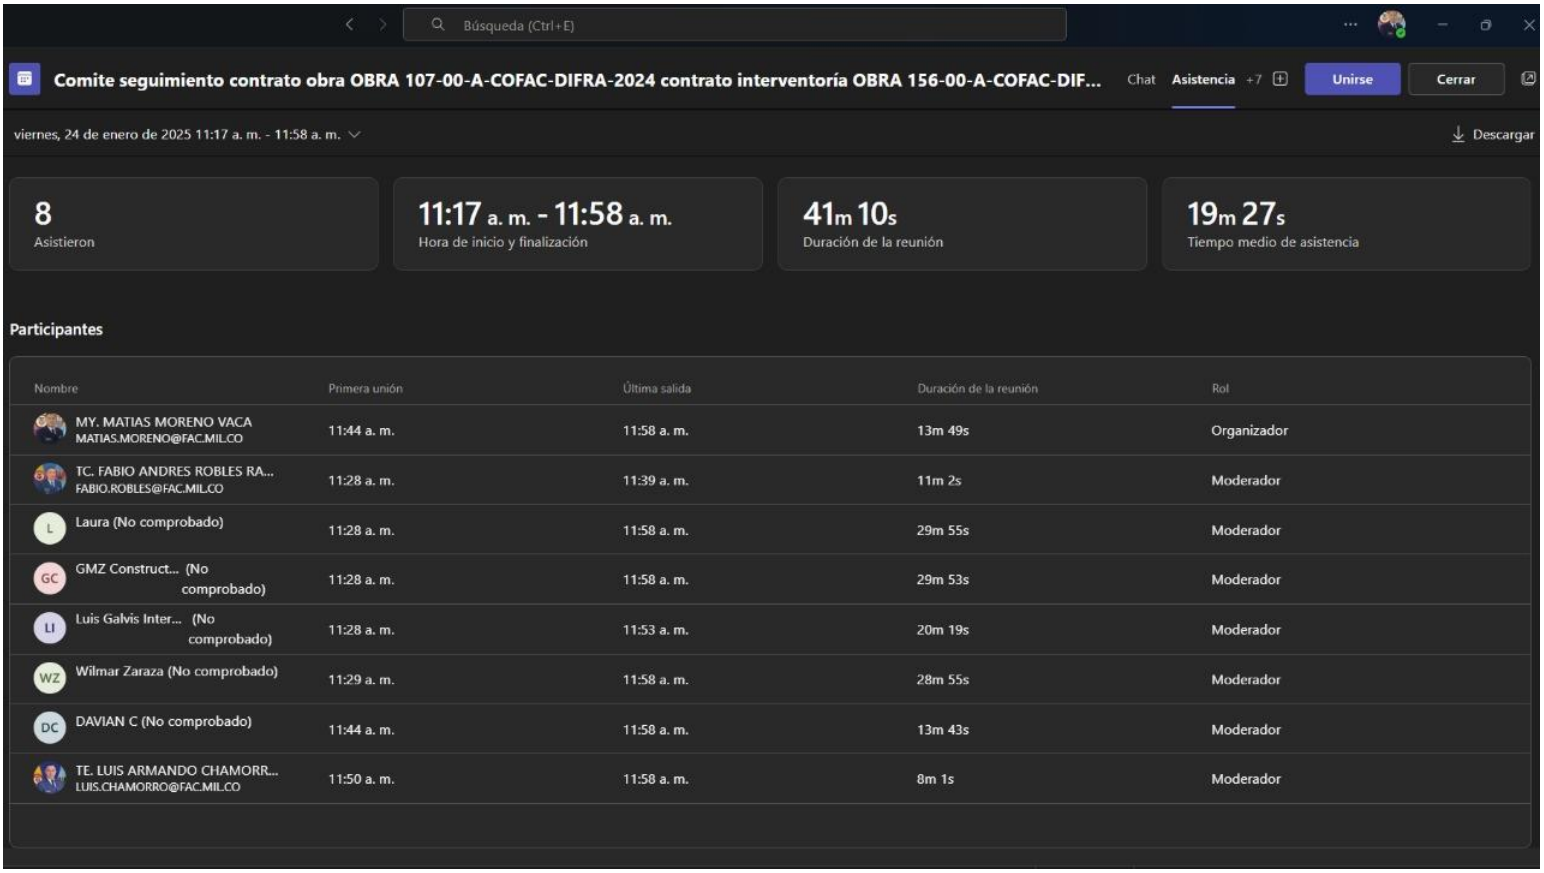
Avance de obra: MY. Matías Moreno explica que al corte del 24 enero 2025 un programado el 4,70% versus un ejecutado del 4,89% teniendo un avance del 0,19% las actividades que se encuentran en ejecución corresponden a los capítulos 3. Cimentación ítems 3.7 concreto de ciclópeo, 4. Estructura ítems 4.1.1 acero de refuerzo estructural, 4.1.7 zapata de concreto acelerado, capitulo 23 urbanismo ítems 23.2 nivelación, conformación y compactación de la subrasante para anden, 23.3 extendido y compactación de recebo común, capitulo 25 vías y pavimentos ítems 25.2 excavación mecánica, 25.5 extendido y compactación de recebo.
Dentro
Anticipo: Dentro del anticipo se registran dos desembolsos 1 por el valor de $251.926.647,20 que corresponden al 11,01% del anticipo, desglosado en compra de materiales, suministros y maquinaria. El saldo del anticipo es de $2.035.407.907,80 los rendimientos depositados a la fecha el último certificado que se ha pedido a la fiducia del banco de Bogotá el 31 diciembre 2024 corresponde a $24.818.258,88.

TE. Luis Chamorro recomienda ser muy meticulosos con las consignas de avances de obra, la elaboración de las memorias de obras como en bitácoras o en los documentos que se considere pertinentes para proceder con la documentación del proyecto.

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Proyectó: Ingeniero Residente Davian Cervantes

Próximo comité: 31 enero 2025 2:30 PM


Búsqueda (Ctrl+E)
Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIF...
Chat
Asistencia +7
Unirse
Cerrar
viernes, 24 de enero de 2025 11:17 a. m. - 11:58 a. m.
Descargar
8
Asistieron
11:17 a. m. - 11:58 a. m.
Hora de inicio y finalización
41m 10s
Duración de la reunión
19m 27s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
MY. MATIAS MORENO VACA
MATIAS.MORENO@FAC.MIL.CO
11:44 a. m.
11:58 a. m.
13m 49s
Organizador
TC. FABIO ANDRES ROBLES RA...
FABIO.ROBLES@FAC.MIL.CO
11:28 a. m.
11:39 a. m.
11m 2s
Moderador
Laura (No comprobado)
11:28 a. m.
11:58 a. m.
29m 55s
Moderador
GMZ Construct... (No comprobado)
11:28 a. m.
11:58 a. m.
29m 53s
Moderador
Luis Galvis Inter... (No comprobado)
11:28 a. m.
11:53 a. m.
20m 19s
Moderador
Wilmar Zaraza (No comprobado)
11:29 a. m.
11:58 a. m.
28m 55s
Moderador
DAVIAN C (No comprobado)
11:44 a. m.
11:58 a. m.
13m 43s
Moderador
TE. LUIS ARMANDO CHAMORR...
LUIS.CHAMORRO@FAC.MIL.CO
11:50 a. m.
11:58 a. m.
8m 1s
Moderador
