CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3 - FAC-MALAMBO ATLANTICO	**HORA:** 02:30 PM			
LUGAR: EDIFICIO GRUAL	**FECHA:**	31	01	2025
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
TE. Luis Armando Chamorro	FUERRZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Matías Moreno	FUERRZA AEREA COLOMBIANA	
William Guarín Ladino	GMZ CONSTRUCTORES	
Wilmar Yesid Zaraza Mora	GMZ CONSTRUCTORES	
Cristian Jaque Espitia	GMZ CONSTRUCTORES	
Luis Galvis Velasco	CONSORCIO 738	
Laura Triana Camacho	CONSORCIO 738	
Davian Cervantes Martínez	CONSORCIO 738	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

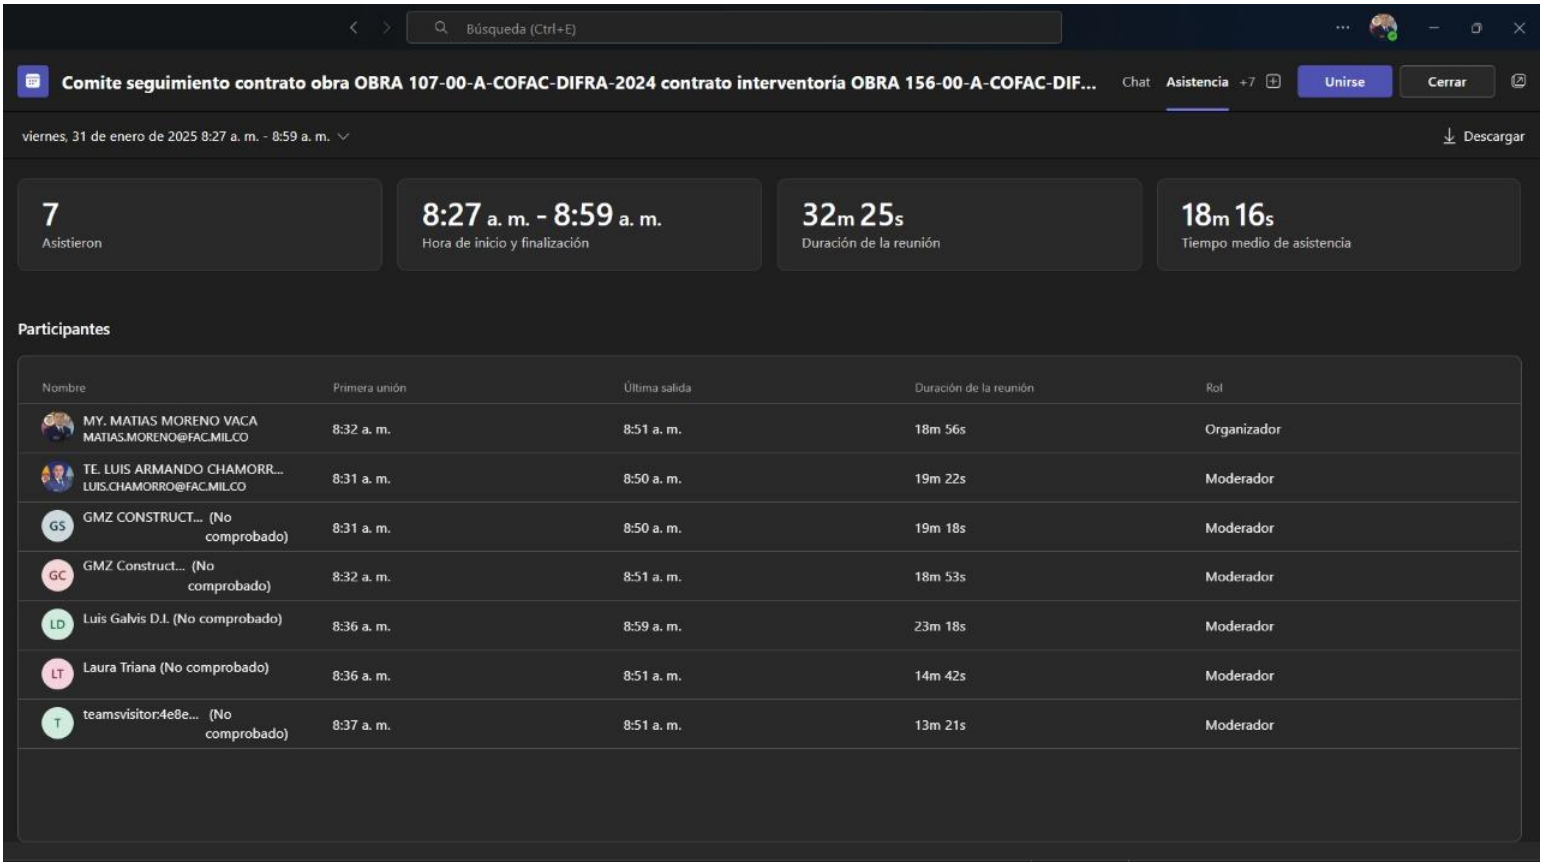
Avance de obra: MY. Matías Moreno explica que al corte del 31 enero 2025 un programado el 5,09% versus un ejecutado del 5,10% teniendo un avance del 0,01% las actividades que se encuentran en ejecución corresponden a los capítulos 3. Cimentación ítems 3.7 concreto de ciclópeo, 4. Estructura ítems 4.1.1 acero de refuerzo estructural, 4.1.7 zapata de concreto acelerado, capitulo 23 urbanismo ítems 23.2 nivelación, conformación y compactación de la subrasante para anden, 23.3 extendido y compactación de recebo común, capitulo 25 vías y pavimentos ítems 25.2 excavación mecánica, 25.5 extendido y compactación de recebo.
Dentro
Anticipo: Dentro del anticipo se registran dos desembolsos 1 por el valor de $251.926.647,20 que corresponden al 11,01% del anticipo.
El saldo del anticipo es de $2.035.407.907,80 los rendimientos depositados a la fecha el último certificado que se ha pedido a la fiducia del banco de Bogotá el 31 diciembre 2024 corresponde a $24.818.258,88.

TE Luis Chamorro recomienda tener en cuenta con la solicitud del acero, teniendo en cuenta que estos proveedores surten otros proyectos, evitar retrasos en los pedidos, tener al día la bitácora de obra y verificar que la información que contiene es la correcta, que las memorias de corte lleven plano descriptivo donde se especifiquen las áreas intervenidas con sus respectivas evidencias fotográficas.
Viernes 07 febrero 2025 el contratista debe pasar la información para proyección del primer corte de pago.

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Presentar proyección del primer corte de pago.	Contratista GMZ Constructores – Wilmar Zaraza – Cristian Jaque.	07 febrero 2025

Proyectó: Ingeniero Residente Davian Cervantes

Próximo comité: 07 febrero 2025 2:30 PM


Búsqueda (Ctrl+E)
Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIF...
Chat
Asistencia +7
Unirse
Cerrar
viernes, 31 de enero de 2025 8:27 a. m. - 8:59 a. m.
Descargar
7
Asistieron
8:27 a. m. - 8:59 a. m.
Hora de inicio y finalización
32m 25s
Duración de la reunión
18m 16s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
MY. MATIAS MORENO VACA
MATIAS.MORENO@FAC.MIL.CO
8:32 a. m.
8:51 a. m.
18m 56s
Organizador
TE. LUIS ARMANDO CHAMORR...
LUIS.CHAMORRO@FAC.MIL.CO
8:31 a. m.
8:50 a. m.
19m 22s
Moderador
GMZ CONSTRUCT... (No comprobado)
8:31 a. m.
8:50 a. m.
19m 18s
Moderador
GMZ Construct... (No comprobado)
8:32 a. m.
8:51 a. m.
18m 53s
Moderador
Luis Galvis D.I. (No comprobado)
8:36 a. m.
8:59 a. m.
23m 18s
Moderador
Laura Triana (No comprobado)
8:36 a. m.
8:51 a. m.
14m 42s
Moderador
teamsvisitor:4e8e... (No comprobado)
8:37 a. m.
8:51 a. m.
13m 21s
Moderador
