CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3 - FAC-MALAMBO ATLANTICO	**HORA:** 02:30 PM			
LUGAR: EDIFICIO GRUAL	**FECHA:**	13	12	2024
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
MY. Juan Cassiano	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Matías Moreno	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
MY. Víctor Caita	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
William Guarín Ladino	GMZ CONSTRUCTORES	
Wilmar Yesid Zaraza Mora	GMZ CONSTRUCTORES	
Cristian Jaque Espitia	GMZ CONSTRUCTORES	
Luis Galvis Velasco	CONSORCIO 738	
Laura Triana Camacho	CONSORCIO 738	
Davian Cervantes Martínez	CONSORCIO 738	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Avance de obra: MY. Matías Moreno explica que al corte del 13 diciembre 2024 un programado el 53,18% versus un ejecutado del 3,21% teniendo un avance del 0,03% las actividades que se encuentran en ejecución corresponden al capítulo de preliminares y cimentaciones - excavación, relleno con material seleccionado.
Atreves de comité de obra se pidió verificación al contratista Gmz Constructores minuciosamente referente al tema de estudio de suelo VS lo encontrado en sitio, lo cual el contratista manifiesta que no se encontraron incongruencia.

Aspectos críticos:

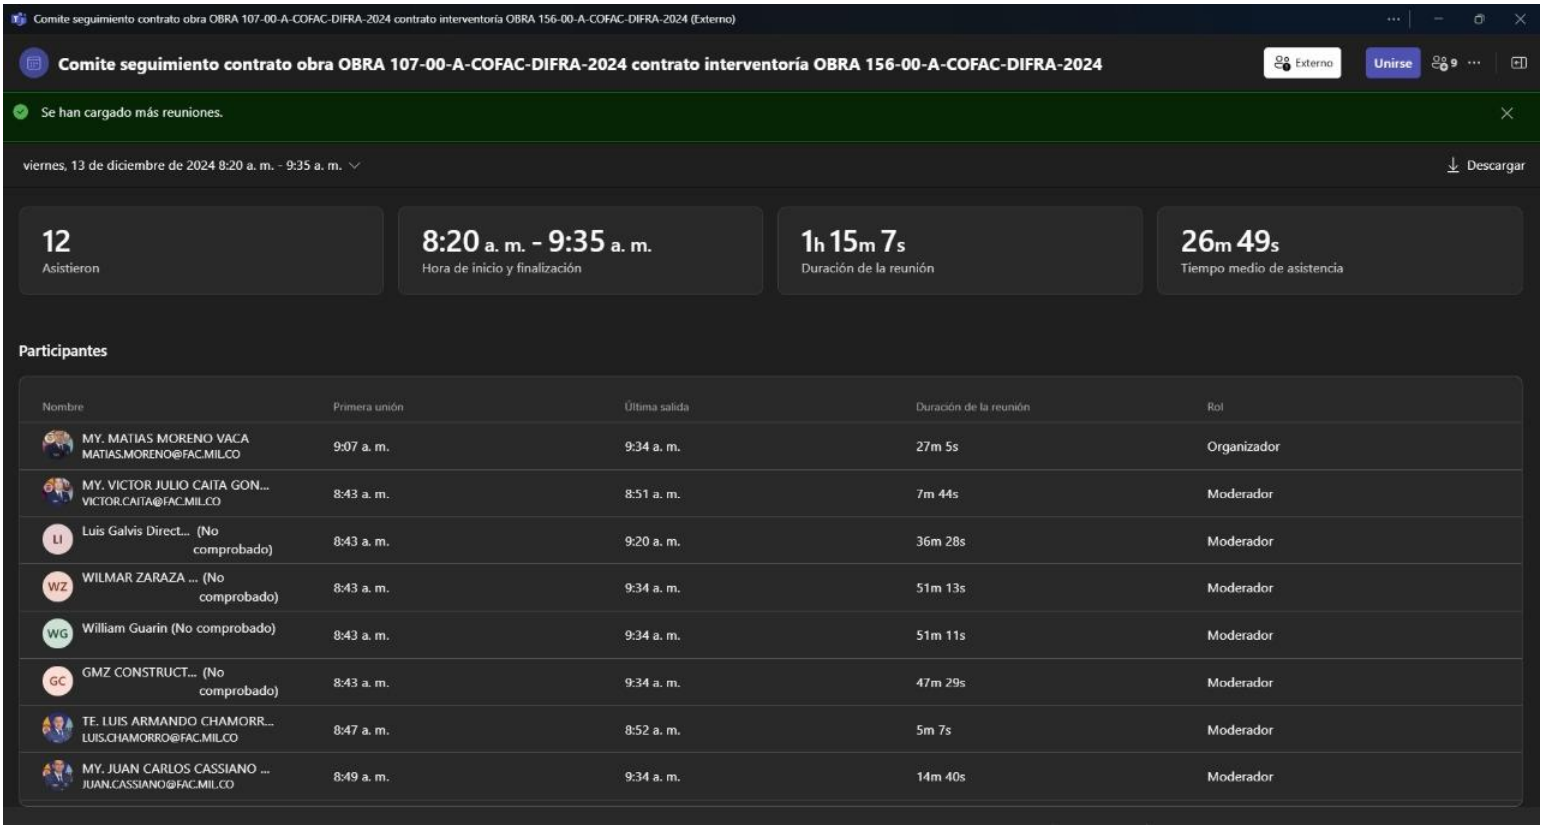
1. **Elaboración de documentos para solicitud de modificatorio:** El supervisor del contrato MY. Moreno menciona que estos documentos ya están perfeccionado a la fecha de hoy se realizara él envió para revisión a la dirección y hacer el radicado lunes 16 diciembre 2024 conforme a las instrucciones impartidas.
2. **Plan de inversión del anticipo:** No se han generado cobros por parte del contratista GMZ Constructores quien manifiesta similitud con la situación presentada con el tema de los suministros por parte de los proveedores y por las situaciones meteorológicas presentadas.

Anticipo: Dentro del anticipo se registran 1 desembolso por el valor de $2.287.334.555,00 que corresponden al 50% del anticipo.

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Entrega de documentación de solicitud de modificatorio	MY. Moreno Matías – Fuerza aérea colombiana	16 diciembre 2024

Proyectó: Ingeniero Residente Davian Cervantes

Próximo comité: 20 Diciembre 2024 2:30 PM


Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 (Externo)
Comite seguimiento contrato obra OBRA 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024 contrato interventoría OBRA 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Externo
Unirse
Se han cargado más reuniones.
viernes, 13 de diciembre de 2024 8:20 a. m. - 9:35 a. m.
Descargar
12
Asistieron
8:20 a. m. - 9:35 a. m.
Hora de inicio y finalización
1h 15m 7s
Duración de la reunión
26m 49s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
MY. MATIAS MORENO VACA
MATIAS.MORENO@FAC.MIL.CO
9:07 a. m.
9:34 a. m.
27m 5s
Organizador
MY. VICTOR JULIO CAITA GON...
VICTOR.CAITA@FAC.MIL.CO
8:43 a. m.
8:51 a. m.
7m 44s
Moderador
LI
Luis Galvis Direct... (No comprobado)
8:43 a. m.
9:20 a. m.
36m 28s
Moderador
WZ
WILMAR ZARAZA ... (No comprobado)
8:43 a. m.
9:34 a. m.
51m 13s
Moderador
WG
William Guarin (No comprobado)
8:43 a. m.
9:34 a. m.
51m 11s
Moderador
GC
GMZ CONSTRUCT... (No comprobado)
8:43 a. m.
9:34 a. m.
47m 29s
Moderador
TE. LUIS ARMANDO CHAMORR...
LUIS.CHAMORRO@FAC.MIL.CO
8:47 a. m.
8:52 a. m.
5m 7s
Moderador
MY. JUAN CARLOS CASSIANO ...
JUAN.CASSIANO@FAC.MIL.CO
8:49 a. m.
9:34 a. m.
14m 40s
Moderador
