	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4735-2023 **JAC:** VEREDA DE GUACANAS
4412-2023 VEREDA DE VICANENGA
4509-2023 VEREDA DE MIRADOR
4833-2023 VEREDA DE HONDA

Contrato de Interventoría No. 5005 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. **9** **MES O PERIODO:** Agosto

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		10
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		12
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		24
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		26
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		26
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		27
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	27
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	67
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	71
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	75
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	79
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	83
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	87
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	99
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		106
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	106
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	110
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	111
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		116
5.1	Información general del contrato		116
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		117
5.3	Informes especialistas y profesionales		117
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		118
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	118
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	119
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	120
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	123
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	126
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		128
8	**Anexos**		129
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		130
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** agosto

CONVENIO No.: 4735-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC VEREDA DE GUANACAS

PLAZO INICIAL: 0.3 MESES
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 9.47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,255,011.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	113.5
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	1
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		70	70
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	201,255,011.00		201,255,011.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201,255,011.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	74,464,354.07		$ -	112,702,806.16
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	112,702,806.16

112702806

112702806

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 149,431,845.67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 112,702,806.16
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 56.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION Llosa DE TRANSICIÓN



PLACA PARA FUNDIR BORDILLOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202227456 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** agosto

CONVENIO No.: 4412-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC VEREDA DE VICANENGA

PLAZO INICIAL:	0.3 MESES
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	-
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024
PLAZO ACUMULADO:	9.47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,459,927.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	116
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	1
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		51	116
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	1
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	199,459,927.00		199,459,927.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,459,927.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 81,778,570.07	$ -	$ -	$ 199,459,927.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	199,459,927.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199,459,927.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199,459,927.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202227456 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** agosto

CONVENIO No.: 4509-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC VEREDA DE MIRADOR

PLAZO INICIAL: 0.3 MESES
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 9.47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,041,993.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	113.5
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	UND	1
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		65	65
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	199,041,993.00		199,041,993.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,041,993.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 55,234,153.06	$ -	$ -	$ 119,425,195.80
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	119,425,195.80


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 147,788,679.80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 119,425,195.80
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 60.00%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

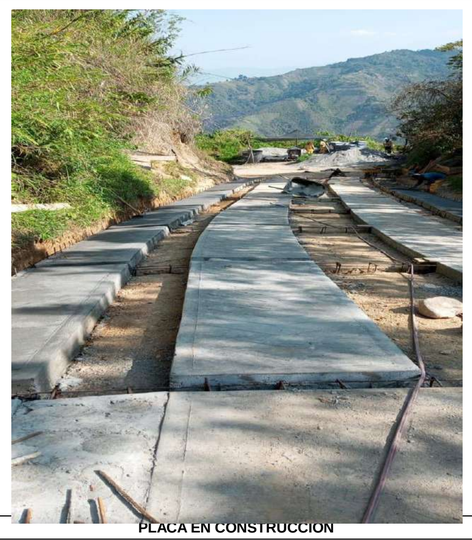

PLACA EN CONSTRUCCION

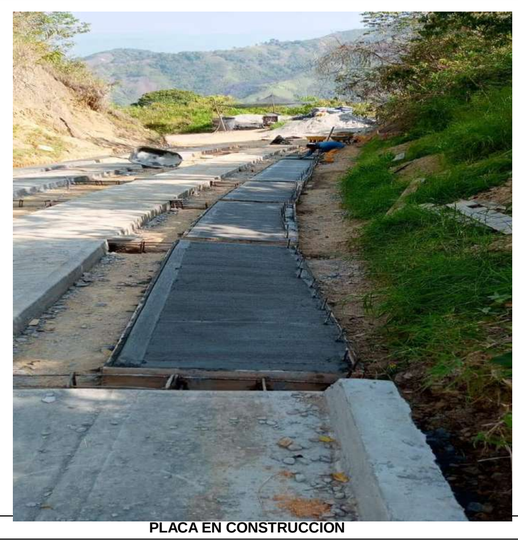

PLACA EN CONSTRUCCION

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202227456 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** agosto

CONVENIO No.: 4833-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC VEREDA DE HONDA

PLAZO INICIAL: 0.3 MESES
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 9.47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,513,019.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	64
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	UND	5
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	6
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	201,513,019.00		201,513,019.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201,513,019.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 6,045,390.57	$ -	$ -	$ 201,513,019.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	201,513,019.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 201,513,019.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 201,513,019.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENTREGA DE OBRA



ALCANTARILLA TERMINADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202227456 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
INTERVENTORÍA DE OBRA

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

INFORME MENSUAL No. 9 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
ADRIANA ORTIZ MENESES	Directora de interventoría	

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN....10

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS....12

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS....12
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS....15
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....15

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS....17

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS....17
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....24
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS....26
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA....26

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA....27

4.1 INFORME SEMANAL....27
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA....67
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA....71
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA....75
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....79
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO....83
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA....87
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA....99
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....106

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA....116

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....116
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR....117
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES....117

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....118

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....118
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....119
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....120
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....123
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA....126

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 128

8 ANEXOS 129

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 130

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Localización del proyecto, municipio de Inzá y Páez 13
Figura 2 Localización del proyecto, Vereda Guanacas 13
Figura 3 Localización del proyecto, Vereda Vicanenga.....14
Figura 4 Localización del proyecto, Vereda El mirador 14
Figura 5 Localización del proyecto, Vereda La Honda 15

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales de los municipios de Inzá y Páez, del Departamento de Cauca, cuyos objetos buscan "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" , "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL";** para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ.**

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CUATRO (4) Convenios Solidarios que se suscribieron entre INVIAS y las juntas de acción comunal de los municipios de Inzá y Páez:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VEREDA	VALOR CONVENIO	CONVENIO NO.
CAUCA	INZÁ	GUANACAS	$ 201,255,011	4735-2023
CAUCA	PÁEZ	VICANENGA	$ 199,459,927	4412-2023
CAUCA	PÁEZ	EL MIRADOR	$ 199,041,993	4509-2023
CAUCA	PÁEZ	LA HONDA	$ 201,513,019	4833-2023

Las principales actividades y obras para ejecutar son las siguientes:

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de cuatro (4) Convenios Solidarios que se suscribieron en el departamento del Cauca, como parte del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total:

CONVENIO	MUNICIPIO	LONG (M)	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	OBSERVACIONES
4735-2023	GUANACAS	105	2.5256, -76.0887.	2.5329, -76.0776	Construcción de 105m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas, mantenimiento periódico.
4412-2023	VICANENGA	116	2.6932, -76.0173	2.6858, -76.0179	Construcción de 116m de placa huella, construcción de 1 alcantarillas.
4509-2023	EL MIRADOR	113.5	2.5646, -75.8874	2.5649, -75.8844	Construcción de 113.5m de placa huella, construcción de 1

					alcantarilla.
4833-2023	LA HONDA	64	2.4792, -75.9313	2.4989, -75.9201	Construcción de 64m de placa huella, construcción de 5 alcantarillas.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato.



Figura 1 Localización del proyecto, municipio de Inzá y Páez



Figura 2 Localización del proyecto, Vereda Guanacas

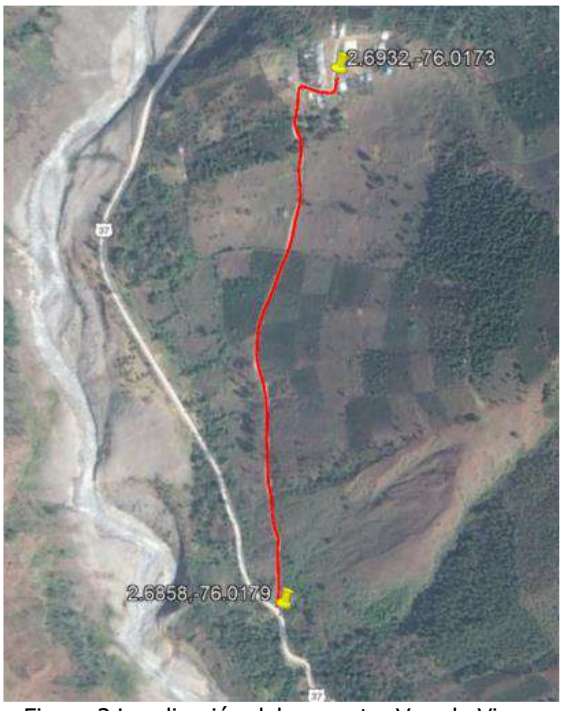


Figura 3 Localización del proyecto, Vereda Vicanenga



Figura 4 Localización del proyecto, Vereda El mirador



Figura 5 Localización del proyecto, Vereda La Honda

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

Las vías para intervenir son vías rurales, prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con las juntas de acción comunal de las veredas Ganacas, Vicanenga, El Mirador y La Honda; en el departamento del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las intervenciones en las vías regionales y caminos ancestrales que hacen parte del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total corresponden a mejoramientos y rehabilitación. A continuación, se describen las actividades que se incluyen dentro de la ejecución:

a) Mejoramiento: incluye la construcción de placa huella, obras de drenaje (filtros, cunetas y alcantarillas), construcción de bateas, obras de ingeniería verde, instalación de señalización vertical, entre otras.

Estas actividades buscan mejorar las condiciones de transitabilidad en la infraestructura vial regional y/o caminos ancestrales.

b) Rehabilitación: corresponden a actividades de reconstrucción de infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial para la cual fue construida, bacheo, etc.

Mediante esta intervención se busca:

- Mejorar el acceso en las zonas rurales de servicios primarios de salud, educación y alimentación.
- Consolidar territorios de paz con presencia del Estado en todo el país.
- Incrementar la comercialización de productos agrícolas.
- Potencializar la industria del turismo.
- Reducir impactos ambientales a través de la intervención de las vías regionales y caminos ancestrales con métodos constructivos no convencionales.
- Empoderar a la comunidad mediante la conformación de veedurías, la ejecución, vigilancia y calidad de obras en sus territorios.

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 INZÁ 4735 – CAUCA

Entidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio	4735-2023
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	$ 201,255,011.00
Nombre del representante legal	AMILCAR GERARDO ARIAS ORTEGA
Fecha suscripción del convenio	30/11/2023
Fecha de inicio	21/12/2023
Fecha de vencimiento inicial	31/12/2023
Prorroga 1	01/01/2024 – 30/04/2024
Prorroga 2	01/05/2024 – 30/06/2024
Prorroga 3	01/07/2024 – 31/07/2024
Prorroga 4	01/08/2024 – 31/08/2024
Prorroga 5	01/09/2024 – 30/09/2024
Fecha de vencimiento vigente	30/09/2024

3.1.1.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	89.66	$23,590.00	$ 2,115,079.00
2	320.3	Subbase Granular Clase C	M3	112.65	$278,754.00	$31,401,638.00
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	62.60	$807,791.00	$50,567,717.00

4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33.33	$509,361.00	$16,977,002.00
5	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2,905.56	$6,971.00	$20,254,659.00
					SUB-TOTAL	**$121,316,095.00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	$23,590.00	$ 1,096,935.00
7	600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	$51,385.00	$421,357.00
8	630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.50	$638,673.00	$319,337.00
9	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	12.10	$807,791.00	$ 9,774,271.00
10	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	736.50	$6,971.00	$ 5,134,142.00
11	610.2	Relleno para Estructuras con Recebo	M3	25.40	$251,364.00	$ 6,384,646.00
12	661.3	Tubería de Concreto Reforzado21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6.00	$ 1,067,425.00	$ 6,404,550.00
13	610.1P	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	28.00	$20,177.00	$564,956.00
					SUB-TOTAL	**$30,100,194.00**
					SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$151,416,289.00**
					PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,542,489.00**
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$44,296,233.00**
					VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$200,255,011.00**

3.1.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

Entidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio	4412-2023
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	$ 199,459,927.00
Nombre del representante legal	MARY LUZ QUISCUE PERDOMO
Fecha suscripción del convenio	16/11/2023
Fecha de inicio	22/12/2023
Fecha de vencimiento inicial	31/12/2023

Prorroga 1	01/01/2024 – 30/04/2024
Prorroga 2	01/05/2024 – 30/06/2024
Prorroga 3	01/07/2024 – 31/07/2024
Prorroga 4	01/08/2024 – 31/08/2024
Prorroga 5	01/09/2024 – 30/09/2024
Fecha de vencimiento vigente	30/09/2024

3.1.2.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	99.91	$23,590.00	$ 2,356,877.00
4	320.3	Subbase Granular Clase C	M3	125.65	$245,143.00	$30,802,218.00
5	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	68.39	$766,951.00	$52,451,779.00
6	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	36.35	$457,914.00	$16,645,174.00
7	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3,198.64	$6,941.00	$22,201,760.00
					SUB-TOTAL	**$124,457,808.00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
8	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	$23,590.00	$ 1,096,935.00
9	600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	$51,385.00	$421,357.00
10	201.7	Demolición de Estructuras	M3	0.00	$167,468.00	$-
11	630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.50	$594,657.00	$297,329.00
12	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.60	$766,951.00	$ 7,362,730.00
13	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	$6,941.00	$ 4,018,145.00
14	610.2	Relleno para Estructuras con Recebo	M3	25.40	$222,939.00	$ 5,662,651.00
15	661.3	Tubería de Concreto Reforzado21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6.00	$948,702.00	$ 5,692,212.00
16	610.1P	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	31.00	$20,177.00	$625,487.00
					SUB-TOTAL	**$25,176,846.00**
					SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$149,634,654.00**
					PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,489,040.00**

GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$44,336,233.00**
VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$198,459,927.00**

3.1.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

Entidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio	4509-2023
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	$ 199,041,993.00
Nombre del representante legal	YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO
Fecha suscripción del convenio	20/10/2023
Fecha de inicio	22/12/2023
Fecha de vencimiento inicial	31/12/2023
Prorroga 1	01/01/2024 – 30/04/2024
Prorroga 2	01/05/2024 – 30/06/2024
Prorroga 3	01/07/2024 – 31/07/2024
Prorroga 4	01/08/2024 – 31/08/2024
Prorroga 5	01/09/2024 – 30/09/2024
Fecha de vencimiento vigente	30/09/2024

3.1.3.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	97.73	$23,590.00	$ 2,305,451.00
4	320.3	Subbase Granular Clase C	M3	122.94	$255,199.00	$31,374,165.00
5	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	66.53	$777,501.00	$51,727,142.00

6	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	35.35	$467,660.00	$16,531,781.00
7	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3,119.11	$6,945.00	$21,662,219.00
					SUB-TOTAL	**$123,600,758.00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
8	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46.50	$23,590.00	$ 1,096,935.00
9	600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	8.20	$51,385.00	$421,357.00
10	201.7	Demolición de Estructuras	M3	0.00	$167,468.00	$-
11	630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0.50	$606,028.00	$303,014.00
12	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9.60	$777,501.00	$ 7,464,010.00
13	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	$6,945.00	$ 4,020,461.00
14	610.2	Relleno para Estructuras con Recebo	M3	25.40	$232,995.00	$ 5,918,073.00
15	661.3	Tubería de Concreto Reforzado21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6.00	$963,133.00	$ 5,778,798.00
16	610.1P	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	31.00	$20,177.00	$625,487.00
					SUB-TOTAL	**$25,628,135.00**
					SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$149,228,893.00**
					PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,476,867.00**
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$44,336,233.00**
					VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$198,041,993.00**

3.1.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

Entidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
No. del Convenio	4833-2023
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	$ 201,513,019.00
Nombre del representante legal	RAFAEL CUSCUE MUSE
Fecha suscripción del convenio	12/12/2023

Fecha de inicio	21/12/2023
Fecha de vencimiento inicial	31/12/2023
Prorroga 1	01/01/2024 – 30/04/2024
Prorroga 2	01/05/2024 – 30/06/2024
Prorroga 3	01/07/2024 – 31/07/2024
Prorroga 4	01/08/2024 – 31/08/2024
Prorroga 5	01/09/2024 – 30/09/2024
Fecha de vencimiento vigente	30/09/2024

3.1.4.1 Presupuesto

No	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	30.66	$23,590.00	$723,269.00
2	320.3	Subbase Granular Clase C	M3	41.12	$182,275.00	$ 7,495,148.00
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	25.42	$700,988.00	$17,819,115.00
4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	8.26	$396,981.00	$ 3,279,063.00
5	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	1,590.80	$6,912.00	$10,995,610.00
					SUB-TOTAL	**$40,312,205.00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	235.30	$23,590.00	$ 5,550,727.00
7	600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	41.50	$51,385.00	$ 2,132,478.00
8	201.7	Demolición de Estructuras	M3	3.58	$167,468.00	$599,535.00
9	630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	2.30	$523,568.00	$ 1,204,206.00
10	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	47.90	$700,988.00	$33,577,325.00
11	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2894.50	$6,912.00	$20,006,784.00
12	610.2	Relleno para Estructuras con Recebo	M3	129.60	$160,071.00	$20,745,202.00
13	661.3	Tubería de Concreto Reforzado21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	31.00	$858,477.00	$26,612,787.00
14	610.1P	Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	17.00	$20,177.00	$343,009.00

		excavación				
					SUB-TOTAL	**$110,772,053.00**
					SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$151,084,258.00**
					PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,532,528.00**
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$44,896,233.00**
					VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$200,513,019.00**

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El alcance del proyecto objeto consiste en realizar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS.** Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. En particular, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.2.1 Gestión Técnica

3.2.1.1 INZÁ 4735 – CAUCA

En el transcurso del mes de agosto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Con la ayuda de la maquinaria amarilla se conforma la subbase de un tramo aproximado de 100 metros.
- Se realiza la construcción de formaleta para la construcción de las huellas en concreto ciclópeo.
- Se realiza la fundición de concreto ciclópeo
- Se realiza la instalación de acero para las huellas y de igual manera se realiza la fundición de concreto para estas mismas.

3.2.1.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

En el transcurso del mes de agosto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se cuenta con aproximadamente 105 metros lineales de huellas reforzadas y riostras fundidas, además se cuenta con 100metros de placa huella completa
- Se encontró un inconveniente con el proveedor del cemento, ya qué al parecer se encuentra con un cemento qué no cumple con sus cualidades para ser utilizado en la placa huella.
- Se continua con la fundición de concreto reforzado y concreto ciclópeo.
- Se termina con la ejecución de obra en el marco del convenio suscrito entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de Vicanenga.

3.2.1.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

En el transcurso del mes de agosto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

*Se encuentran adelantando actividades de conformación y extensión de subbase en el tramo, también se cuenta con la formaleta para la posterior fundición de las placas

- Se realizan actividades de fundición de placa en concreto reforzado, se realiza la recomendación de qué a medida que avancen vayan completando la placa con cunetas y ciclópeos.
- Se realiza el armado del acero para las vigas riostras de la placa huella.
- Se recibe material en obra como es (acero, cemento y tablas) para continuar con la ejecución del convenio.

3.2.1.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

En el transcurso del mes de agosto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realiza la construcción de la alcantarilla número 6 después de corroborar qué en el balance si se cuenta con el recurso y la disponibilidad para su construcción.
- Se adelantan actividades en la 6 alcantarilla, como fundición de cabezal de entrada.

3.2.2 Gestión Ambiental

Mediante canales de comunicación como correo electrónico y WhatsApp, se envía el 15 de julio la segunda versión del PGA emitido por la subdirección de sostenibilidad para la elaboración del documento, esto, con base en la capacitación emitida por el INVIAS, el día 2 de mayo del 2024, donde se establecen unos nuevos criterio para la formulación del documento, toda vez que, los proyectos se catalogan de complejidad baja, según la nueva actualización de la guía ambiental en julio del 2022 – Modo carretero, justificando las razones por las que el proyecto no requiere de la elaboración de un Plan De Adaptación De La Guía Ambiental PAGA.

Con base en las particularidades descritas anteriormente y debido a que la temporalidad prevista para el desarrollo de los proyectos es inferior a seis (6) meses de ejecución de obra aproximadamente, se deberán cumplir dos etapas de seguimiento a la gestión ambiental:

Gestión inicial: Donde se deberá remitir el PGA ante la Subdirección de Sostenibilidad de IVIAS, acompañado de los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 y MASPS-MN1-IN-1-FR-2. Plan de inversión ambiental.

Gestión final: Para la finalización de los proyectos se deberá presentar ante la Subdirección de Sostenibilidad el Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la terminación del Contrato de obra según lo establecido en el Manual de Interventoría.

Por otro lado, se emite concepto favorable al documento PGA del convenio solidario mediante oficio CIVC-5005-023-2024 del 17 de julio del 2024, y se radica ante la

subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065191.

En cuanto al convenio solidario 4412 JAC Vicanenga, se emiten observaciones al documento PGA, el día 23 de julio.
Por último, se emite la séptima solicitud de documento PGA el día 13 de julio, toda vez que, a la fecha las JAC de Guanacas, y La Honda, no han remitido el documento.

3.2.3 Gestión Social

En cuanto al convenio 4833-2023 (La Honda) el día 9 de agosto se realiza socialización de entrega de obra contando con la asistencia de la comunidad de la vereda, presidente de la JAC, contador e interventoría, inicialmente se dio a conocer el proceso de la etapa constructiva la cual ya culmino informando acerca de las especificaciones con las cuales se construyeron las obras de arte. La contadora dio a conocer el informe detallado acerca de los gastos realizados en obra informando la comunidad que se ejecutó el 100% del presupuesto.

Finalmente, la comunidad recibió la obra con satisfacción por parte de los asistentes y se llevó a cabo la olla comunitaria propuesta inicialmente.
En esta reunión se realizó encuesta de satisfacción con el fin de realizar la entrega final del plan de gestión social.

con los convenios 4735-2023 (Guanacas), 4412-2023 (Vicanenga) y 4509-2023 (El Mirador) se realizan recorridos de obra, en ellos se informó a los presidentes de las JAC de cada convenio la importancia de establecer una fecha de entrega, dado que las obras están próximas a finalizar. También se discutió la necesidad de definir las actividades necesarias para el cierre y entrega formal de las obras.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el período correspondiente al informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas. Esto se debió a que las juntas de acción comunal, acreedoras de los convenios solidarios asociados al presente contrato de interventoría, se encontraban realizando las gestiones necesarias para los estudios previos y la elaboración de los documentos administrativos requeridos.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo 1 al 31 de agosto de 2024, referentes a los convenios solidarios en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, los cuales se listan a continuación:

- Informe Semanal 33 - 20240802 - 20240808
- Informe Semanal 34 - 20240809 - 20240815
- Informe Semanal 35 - 20240816 - 20240822
- Informe Semanal 36 - 20240823 - 20240829

4.1.1 INZÁ 4735 – CAUCA

- Informe Semanal 33 - 20240802 – 20240808

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 12/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 2/8/2024 al 8/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 105 m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Guanacas en el municipio de Inzá – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	AMILCAR GERARDO ARIAS ORTEGA		
CONVENIO No.	CONVENIO 4735	VALOR INICIAL:	$ 201.255.011,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.255.011,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MARUNCA CAVERA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106.219.389,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23.780.245,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129.999.634,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,255,011.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 62,389,053			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 138,865,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 111,581,335			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (5,361,946)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,255,011.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 163,519,696.44	81.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 62,389,053.41	31.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (101,130,643.03)	-50.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 163,519,696.44	81.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 62,389,053.41	31.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (101,130,643.03)	-50.25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,082,876.05	5.01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,150,601.32	12.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N4 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de agosto del 2024, se tiene un porcentaje programado del 91,25% un porcentaje ejecutado acumulado del 31%, un atraso del 50,25%

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.79
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 81.25%
Meta Física Ejecutada % 31.00%
Avance o Atraso Físico % 50.25%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	105			Prog				0	0%
					Ejec				0	0%
* Alcantarillas	UND	2			Prog				0	0%
					Ejec				0	0%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contemoladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda Guanacas — Programado: 105 metros lineales de placa huella y construcción de 2 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio,
* Se solicita un cambio de tramo para la ejecución de la vía, pues el tramo escogido en primer lugar es una vía alterna a la construcción del corredor El Libertador - TOTORÓ - INZÁ, pues cuando se realizan trabajos este sector, el tráfico se desvía por la vereda Guanacas para llegar al municipio de Inzá.
* La junta envía un borrador del informe qué se presentará a la supervisión para el cambio de tramo.
*Se entregan hojas de vida del ingeniero residente y contador, se continúa a la espera de la hoja de vida del maestro de obra.*No se realizan actividades en la semana en el frente de obra, se está a la espera de la decisión del cambio de tramo.
* Se está a la espera de las cotizaciones, actualización de presupuesto, plan de compras pero la junta de acción comunal no ha remitido nada de información.
*La junta de acción comunal, debido al invierno presente en la zona requiere al municipio para qué destine maquinaria para la remoción de derrumbes en la vía el libertador y de este modo, permitir el cierre del corredor el Carmen, Guanacas, Inzá
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invias Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se realizo labores de topografía, se instalan mojones y se procede con el postproceso de coordenadas.
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024
*Se está a la espera de la entrega de topografía por parte de la persona contratada para realizar las labores.
* Pese a qué los materiales están pagos la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores correspondientes

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Con la ayuda de la maquinaria amarilla se conforma la subbase de un tramo aproximado de 100 metros.
*Se realiza la construcción de formaleta para la construcción de las huellas en concreto ciclopeo.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Cotización de los materiales de obra para qué se actualice el presupuesto de obra
* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
* Informe de cambio de tramo.
* Se realiza comité virtual para solicitarle a la comunidad actualizar los precios del convenio, e iniciar con la ejecución de la obra.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

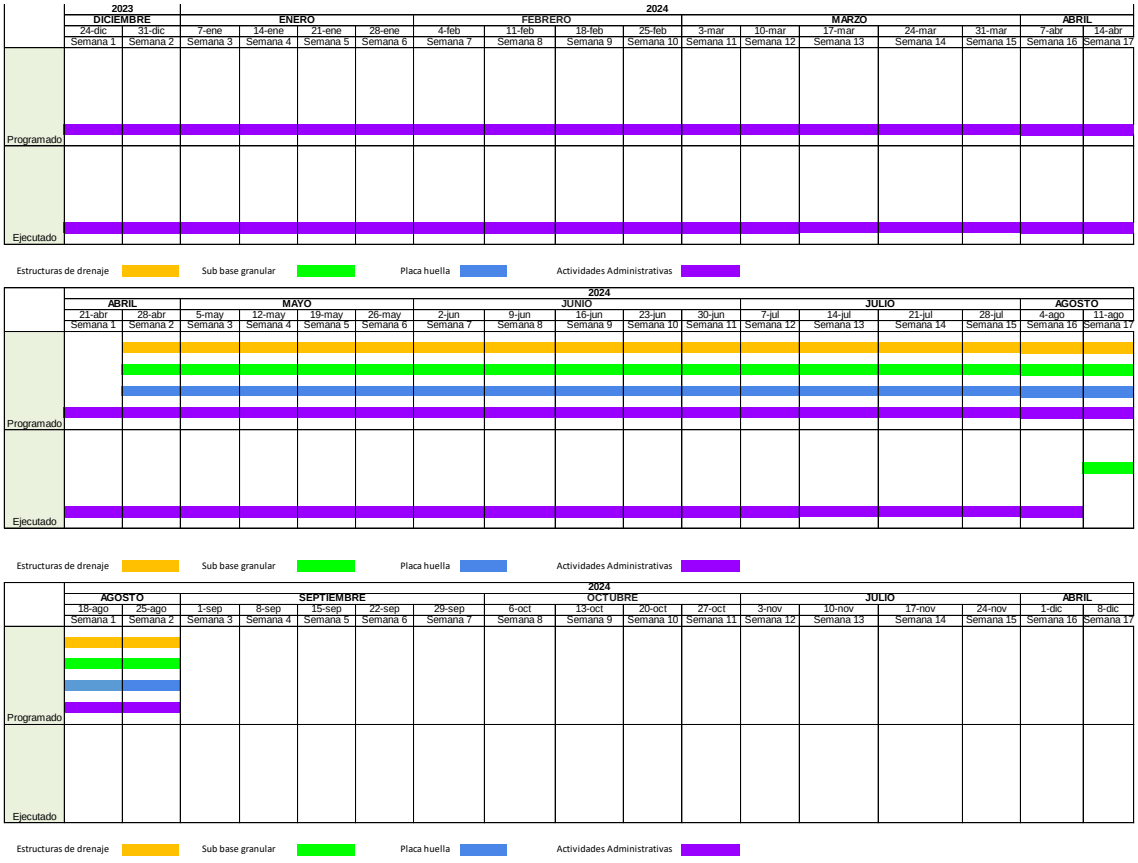

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAQUINARIA EN LA ZONA DE LA OBRA



FORMALETA PARA FUNDIR CICLÓPEO



FORMALETA PARA FUNDIR CICLÓPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se articula la reunión entre representantes de la junta con personal de Invías para evaluar la posibilidad de realizar el cambio de tramo a intervenir.
* Mediante comunicación verbal se solicita a la junta entregar la propuesta para el cambio de tramo escogido.
*Se programara comité virtual con el fin de agilizar el tema de la solicitud del cambio de tramo.
*Se realizan observaciones al informe preliminar para solicitar el cambio de tramo.
*Se reciben hojas de vida del ingeniero y contador para ser revisadas y aprobadas por la interventoría.
*Se recibe hoja de vida por parte de la JAC para el personal propuesto para maestro de obra.
*Ya se tiene aprobado el personal por parte de interventoría de las personas qué van a laborar en el convenio.
*Se reitera a la JAC la necesidad de arrancar con las actividades contractuales del convenio.
*Se realizan gestiones para qué la JAC, entregue la solicitud de PRÓRROGA del convenio.
* Pese a las reiteradas observaciones por parte de interventoría, la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores de ejecución.
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

- Informe Semanal 34 - 20240809 – 20240815

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 19/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 34 (Numeración consecutiva) del 9/8/2024 al 15/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 105 m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Guanacas en el municipio de Inzá – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	AMILCAR GERARDO ARIAS ORTEGA		
CONVENIO No.	CONVENIO 4735	VALOR INICIAL:	$ 201,255,011.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,255,011.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,255,011.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 78,489,454			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 122,765,557			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 117,720,768			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,501,379)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,255,011.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 179,942,105.34	89.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 78,489,454.29	39.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (101,452,651.05)	-50.41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,942,105.34	89.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78,489,454.29	39.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (101,452,651.05)	-50.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,422,408.90	8.16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,100,400.88	8.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N4 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de agosto del 2024, se tiene un porcentaje programado del 89,41% un porcentaje ejecutado acumulado del 39%, un atraso del 50,41%

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 117,720,768.00	90.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 117,720,768.00	90.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
8.16 INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.50
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89.41%
Meta Física Ejecutada % 39.00%
Avance o Atraso Físico % -50.41%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	105			Prog				105	100%
						Ejec				40	38%
*	Alcantarillas	UND	2			Prog				2	100%
						Ejec				0	0%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda Guanacas — Programado: 105 metros lineales de placa huella y construcción de 2 alcantarillas con tubería de 36 en concreto reforzado.
Ejecutado: Hasta el momento se cuenta con aproximadamente 40 metros lineales completos.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta que se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio,
* Se solicita un cambio de tramo para la ejecución de la vía, pues el tramo escogido en primer lugar es una vía alterna a la construcción del corredor El Libertador - TOTORÓ - INZÁ, pues cuando se realizan trabajos este sector, el tráfico se desvía por la vereda Guanacas para llegar al municipio de Inzá.
* La junta envía un borrador del informe qué se presentará a la supervisión para el cambio de tramo.
*Se entregan hojas de vida del ingeniero residente y contador, se continúa a la espera de la hoja de vida del maestro de obra.*No se realizan actividades en la semana en el frente de obra, se está a la espera de la decisión del cambio de tramo.
* Se está a la espera de las cotizaciones, actualización de presupuesto, plan de compras pero la junta de acción comunal no ha remitido nada de información.
*La junta de acción comunal, debido al invierno presente en la zona requiere al municipio para qué destine maquinaria para la remoción de derrumbes en la vía el libertador y de este modo, permitir el cierre del corredor el Carmen, Guanacas, Inzá
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se realizo labores de topografía, se instalan mojones y se procede con el postproceso de coordenadas.
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024
*Se está a la espera de la entrega de topografía por parte de la persona contratada para realizar las labores.
* Pese a qué los materiales están pagos la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores correspondientes


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Con la ayuda de la maquinaria amarilla se conforma la subbase de un tramo aproximado de 100 metros.
*Se realiza la construcción de formaleta para la construcción de las huellas en concreto ciclópeo.
*Se realiza la fundición de concreto ciclópeo
*Se realiza la instalación de acero para las huellas y de igual manera se realiza la fundición de concreto para estas mismas.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Cotización de los materiales de obra para qué se actualice el presupuesto de obra
* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
* Informe de cambio de tramo.
* Se realiza comité virtual para solicitarle a la comunidad actualizar los precios del convenio, e iniciar con la ejecución de la obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS




Estructuras de drenaje | Sub base granular | Placa huella | Actividades Administrativas



Estructuras de drenaje | Sub base granular | Placa huella | Actividades Administrativas

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

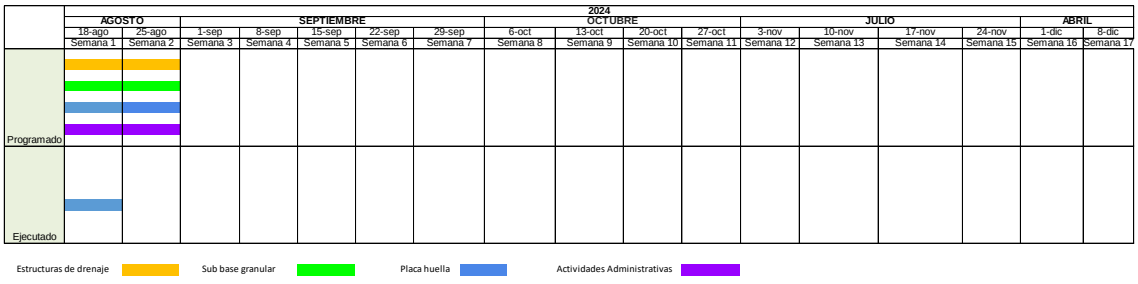

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO INSTALADO



ACERO INSTALADO



HUELLA FUNDIDA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se articula la reunión entre representantes de la junta con personal de Invías para evaluar la posibilidad de realizar el cambio de tramo a intervenir.
* Mediante comunicación verbal se solicita a la junta entregar la propuesta para el cambio de tramo escogido.
*Se programara comité virtual con el fin de agilizar el tema de la solicitud del cambio de tramo.
*Se realizan observaciones al informe preliminar para solicitar el cambio de tramo.
*Se reciben hojas de vida del ingeniero y contador para ser revisadas y aprobadas por la interventoría.
*Se recibe hoja de vida por parte de la JAC para el personal propuesto para maestro de obra.
*Ya se tiene aprobado el personal por parte de interventoría de las personas qué van a laborar en el convenio.
*Se reitera a la JAC la necesidad de arrancar con las actividades contractuales del convenio.
*Se realizan gestiones para qué la JAC, entregue la solicitud de PRÓRROGA del convenio.
* Pese a las reiteradas observaciones por parte de interventoría, la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores de ejecución.
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

- Informe Semanal 35 - 20240816 – 20240822

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1S-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 26/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 35 del 16/8/2024 al 22/8/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 105 m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Guanacas en el municipio de Inzá – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANEICAR GERARDO ARIAS ORTEGA		
CONVENIO No.	CONVENIO 4735	VALOR INICIAL:	$ 201,255,011.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,255,011.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANJONES OVIEDA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,255,011.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 102,640,056			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 98,614,955			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 123,860,201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (17,640,812)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,255,011.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189,461,467.36	94.14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 102,640,055.61	51.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (86,821,411.75)	-43.14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189,461,467.36	94.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 102,640,055.61	51.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (86,821,411.75)	-43.14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,519,362.02	4.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,150,601.32	12.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N4 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de agosto del 2024, se tiene un porcentaje programado del 94,14% un porcentaje ejecutado acumulado del 51%, un atraso del 43,14%

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123,860,201.00	95.28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123,860,201.00	95.28%
4.73 INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.21
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 94.14%
Meta Física Ejecutada % 51.00%
Avance o Atraso Físico % -43.14%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	105			Prog				105	100%
						Ejec				50	48%
*	Alcantarillas	UND	2			Prog				2	100%
						Ejec				0	0%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda Guanacas: Programado: 105 metros lineales de placa huella y construcción de 2 alcantarillas con tubería de 36 en concreto reforzado.
Ejecutado: Hasta el momento se cuenta con aproximadamente 50 metros lineales completos.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta que se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio,
* Se solicita un cambio de tramo para la ejecución de la vía, pues el tramo escogido en primer lugar es una vía alterna a la construcción del corredor El Libertador - TOTORÓ - INZÁ, pues cuando se realizan trabajos este sector, el tráfico se desvía por la vereda Guanacas para llegar al municipio de Inzá.
* La junta envía un borrador del informe qué se presentará a la supervisión para el cambio de tramo.
*Se entregan hojas de vida del ingeniero residente y contador, se continúa a la espera de la hoja de vida del maestro de obra.*No se realizan actividades en la semana en el frente de obra, se está a la espera de la decisión del cambio de tramo.
* Se está a la espera de las correcciones, actualización de presupuesto, plan de compras pero la junta de acción comunal no ha remitido nada de información.
*La junta de acción comunal, debido al invierno presente en la zona requiere al municipio para qué destine maquinaria para la remoción de derrumbes en la vía el libertador y de este modo, permitir el cierre del corredor el Carmen, Guanacas, Inzá
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se realizo labores de topografía, se instalan mojones y se procede con el postproceso de coordenadas.
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024
*Se está a la espera de la entrega de topografía por parte de la persona contratada para realizar las labores.
* Pese a qué los materiales están pagos la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores correspondientes

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Con la ayuda de la maquinaria amarilla se conforma la subbase de un tramo aproximado de 100 metros.
*Se realiza la construcción de formaleta para la construcción de las huellas en concreto ciclópeo.
*Se realiza la fundición de concreto ciclópeo
*Se realiza la instalación de acero para las huellas y de igual manera se realiza la fundición de concreto para estas mismas.


ADRIANA ORTIZ MENESES	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Cotización de los materiales de obra para qué se actualice el presupuesto de obra
* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
* Informe de cambio de tramo.
* Se realiza comité virtual para solicitarle a la comunidad actualizar los precios del convenio, e iniciar con la ejecución de la obra.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Estructuras de drenaje | Sub base granular | Placa huella | Actividades Administrativas



Estructuras de drenaje | Sub base granular | Placa huella | Actividades Administrativas



Estructuras de drenaje | Sub base granular | Placa huella | Actividades Administrativas

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION LOSA DE TRANSICIÓN



PLACA PARA FUNDIR BORDILLOS



ADECUACION K0+120

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se articula la reunión entre representantes de la junta con personal de Invías para evaluar la posibilidad de realizar el cambio de tramo a intervenir.
* Mediante comunicación verbal se solicita a la junta entregar la propuesta para el cambio de tramo escogido.
*Se programara comité virtual con el fin de agilizar el tema de la solicitud del cambio de tramo.
*Se realizan observaciones al informe preliminar para solicitar el cambio de tramo.
*Se reciben hojas de vida del ingeniero y contador para ser revisadas y aprobadas por la interventoría.
*Se recibe hoja de vida por parte de la JAC para el personal propuesto para maestro de obra.
*Ya se tiene aprobado el personal por parte de interventoría de las personas qué van a laborar en el convenio.
*Se reitera a la JAC la necesidad de arrancar con las actividades contractuales del convenio.
*Se realizan gestiones para qué la JAC, entregue la solicitud de PRÓRROGA del convenio.
* Pese a las reiteradas observaciones por parte de interventoría, la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores de ejecución.
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les plantéo qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

- Informe Semanal 36 - 20240823 - 20240829

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 2/9/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 36 (Numeración consecutiva) del 23/8/2024 al 29/8/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 105 m de placa huella, construcción de 2 alcantarillas, mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Guanacas en el municipio de Inzá – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS				
REPRESENTANTE LEGAL:	AMILCAR GERARDO ARIAS ORTEGA				
CONVENIO No.	CONVENIO 4735	VALOR INICIAL:	$ 201,255,011.00		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,255,011.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -		
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -		
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)				
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANJINGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 5	01/09/2024 - 30/09/2024 (1 mes)		

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,255,011.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 112,702,806			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88,552,205			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118,108,981			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,889,592)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,255,011.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149,431,845.67	74.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112,702,806.16	56.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (36,729,039.51)	-18.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 149,431,845.67	74.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112,702,806.16	56.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (36,729,039.51)	-18.25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,519,362.02	4.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,062,750.55	5.00%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N5 la cual adiciono tiempo hasta el 30 de septiembre del 2024, se tiene un porcentaje programado del 74,25% un porcentaje ejecutado acumulado del 51%, un atraso del 23,25%

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.05
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 74,25%
Meta Física Ejecutada % 56.00%
Avance o Atraso Físico % -18,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	105			Prog				105	100%
					Ejec				70	67%
* Alcantarillas	UND	2			Prog				2	100%
					Ejec				0	0%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda Guanacas: Programado: 105 metros lineales de placa huella y construcción de 2 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado.
Ejecutado: Hasta el momento se cuenta con aproximadamente 50 metros lineales completos.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta que se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
* Se está a la espera de las cotizaciones, actualización de presupuesto, plan de compras pero la junta de acción comunal no ha remitido nada de información.
*La junta de acción comunal, debido al invierno presente en la zona requiere al municipio para qué destine maquinaria para la remoción de derrumbes en la vía el libertador y de este modo, permitir el cierre del corredor el Carmen, Guanacas, Inzá
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se realizo labores de topografía, se instalan mojones y se procede con el postproceso de coordenadas.
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024
*Se está a la espera de la entrega de topografía por parte de la persona contratada para realizar las labores.
* Pese a qué los materiales están pagos la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores correspondientes
*Con la ayuda de la maquinaria amarilla se conforma la subbase de un tramo aproximado de 100 metros.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza la construcción de formaleta para la construcción de las huellas en concreto ciclópeo.
*Se realiza la fundición de concreto ciclópeo
*Se realiza la instalación de acero para las huellas y de igual manera se realiza la fundición de concreto para estas mismas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Cotización de los materiales de obra para qué se actualice el presupuesto de obra
* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
* Informe de cambio de tramo.
* Se realiza comité virtual para solicitarle a la comunidad actualizar los precios del convenio, e iniciar con la ejecución de la obra.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS



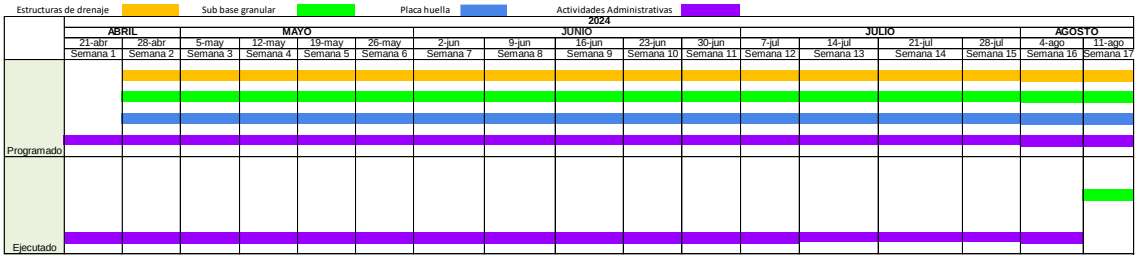

ADRIANA ORTIZ MENESES	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

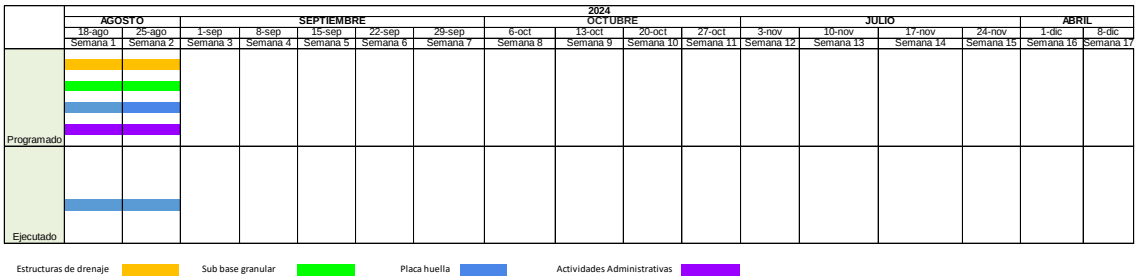

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION LOSA DE TRANSICIÓN



PLACA PARA FUNDIR BORDILLOS



ADECUACION K0+120

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se articula la reunión entre representantes de la junta con personal de Invías para evaluar la posibilidad de realizar el cambio de tramo a intervenir.
* Mediante comunicación verbal se solicita a la junta entregar la propuesta para el cambio de tramo escogido.
*Se programara comité virtual con el fin de agilizar el tema de la solicitud del cambio de tramo.
*Se realizan observaciones al informe preliminar para solicitar el cambio de tramo.
*Se reciben hojas de vida del ingeniero y contador para ser revisadas y aprobadas por la interventoría.
*Se recibe hoja de vida por parte de la JAC para el personal propuesto para maestro de obra.
*Ya se tiene aprobado el personal por parte de interventoría de las personas qué van a laborar en el convenio.
*Se reitera a la JAC la necesidad de arrancar con las actividades contractuales del convenio.
*Se realizan gestiones para qué la JAC, entregue la solicitud de PRÓRROGA del convenio.
* Pese a las reiteradas observaciones por parte de interventoría, la junta de acción comunal no ha iniciado con las labores de ejecución.
Inicialmente en la socialización realizada en febrero del presente año, la comunidad planteó cambiar el tramo postulado a uno cercano. Tanto Interventor como DT Territorial les planteó qué esto no era posible en reunión realizada en la oficina Invías Cauca; allí se definido qué la comunidad hacia una nueva propuesta. está concertación se demoró en definir aproximadamente 2 meses. El Representante Legal se demoró en entregar el primer plan de pagos (5 de junio de 2024), aunque no corresponde en forma a lo exigido por la Interventoría. Tienen aprobados el equipo Ing. residente, Contador y Maestro. La topografía ya está realizada, y de suelos están pendiente su realización, relacionada en el plan de pagos entregado.
Así mismo, debido a qué están interviniendo la vía principal Transversal del Libertador, el tramo a intervenir se encuentra en uso, como vía alterna. Por lo qué al parecer, la comunidad se abstiene de cerrar la vía para intervenir.
De igual manera arriba del tramo a intervenir, en la vereda Tierras Blancas, se va ha construir una placa huella por parte de la administración municipal, y el único acceso es por la vía a intervenir en CCPT, razón por la cual se podría estar retrasando el incido de la construcción de la placa.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

4.1.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

- Informe Semanal 33 - 20240802 – 20240808

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	12/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 2/8/2024 al 8/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 116m de placa huella, construcción de 1 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Vicanenga en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARY LUZ QUESQUE PERDOMO		
CONVENIO No.	CONVENIO 4412	VALOR INICIAL:	$ 199,459,927.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,459,927.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 - 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 - 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MADRIÑAN GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,459,927.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 137,627,350			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 61,832,577			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 111,581,335			
	SALDO DE VIGENCIA	($ 361,946)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,459,927.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 162,061,190.69	81.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 137,627,349.63	69.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24,433,841.06)	-12.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		81.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 137,627,349.63	69.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24,433,841.06)	-12.25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,992,942.34	5.01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19,945,992.70	10.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 76,24%, un 59% ejecutado, generando un atraso de 17,24%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 65 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR IIC	
En el mes:	0.81
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 81.25%
Meta Física Ejecutada % 69.00%
Avance o Atraso Físico % -12.25%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	116			Prog	116			116	0.00%
						Ejec	100			100	86.21%
*	Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.00%
						Ejec	1			1	100.0%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda Vicanenga — Programado: 116 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36' en concreto reforzado.
Ejecutado: 1 Alcantarilla de 36"

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 23 de julio, se emiten observaciones al documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 1 de febrero de 2024 la junta de acción comunal hace entrega de la hoja de vida del contador y residente.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar a cabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar acabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
*Ya se tienen las cotizaciones, se solicita al Ing. residente llevar a cabo el ajuste al presupuesto para revisión de interventoría.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación.
* Se realizan actividades de conformación en el sitio para garantizar el ancho de la placa huella.
*Se trata de conformar la subrasante pero con las fuertes lluvias se ocasionaron daños imposibilitando el acceso al sitio, por lo tanto se conseguirá material de afirmado para mejorar los tramos críticos y así proceder con la extensión, compactación de subbase.
*Se realizó la demolición de la estructura de la alcantarilla vieja qué se encontraba en mal estado.
*Se realiza La instalación de tubería, y se funde el cabezal de entrada de la alcantarilla.
* Se realiza la excavación de la subrasante a lo largo del todo el tramo.
*Se realiza aproximadamente 60ml de subbase para completar 100ml intervenidos
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prorroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se cuenta con aproximadamente 90 metros lineales de huellas reforzadas y riostras fundidas, además se cuenta con 80metros de placa huella completa
*Se encontró un inconveniente con el proveedor del cemento, ya qué al parecer se encuentra con un cemento qué no cumple con sus cualidades para ser utilizado en la placa huella.
*Se continua con la fundicion de concreto reforzado y concreto ciclopeo


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra

ADRIANA ORTIZ MENESES	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS

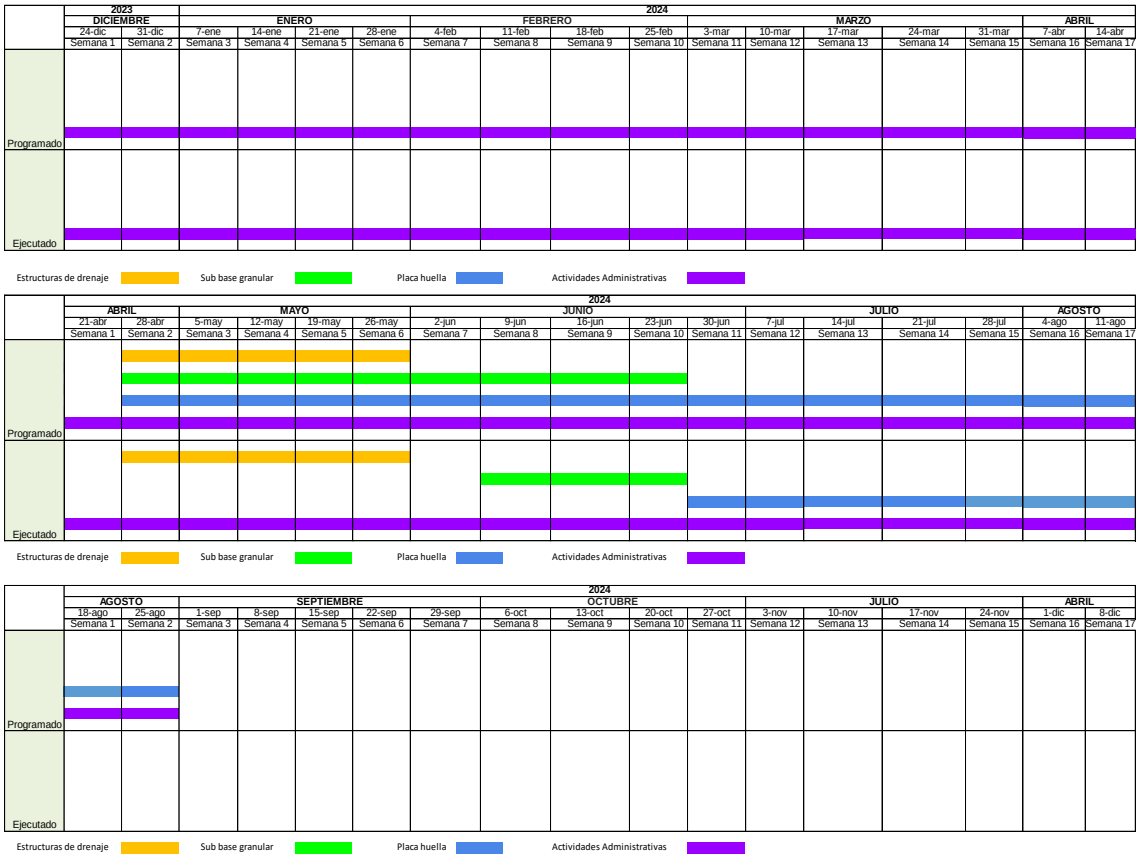

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO



HUELLA EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Revisión de las hojas de vida entregadas por la junta de acción comunal.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se comparten cotizaciones de las veredas de paz para agilizar el proceso de compras, pues la OAC tiene el recurso en la cuenta y se necesita iniciar de manera inmediata las labores.
* No se pudo realizar comité operativo por temas de conectividad en la zona.
*Se reprograma comité virtual para hacer seguimiento y ayudar a solucionar temas qué no se tengan claro por parte de la junta de acción comunal.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación por parte de la interventoría, se empieza con su revisión
*Se hicieron ajuste al plan de compras y se remite para su aprobación en comité operativo.
*Se está a la espera de qué la JAC entregue el plan de compras con las recomendaciones y correcciones qué se le desarrollaron en la reunión de comité virtual.
*Se realiza la revisión del plan de compras entregado para su posterior aval y transferencias a proveedores,
*Se requiere al contratista por la entrega de la dotación y afiliaciones del personal qué se encuentra realizando labores.
*Por tema invernal están suspendidas las labores de placa huella,
*Se solicita a la OAC los ensayos para la liberación de la subbase.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

- Informe Semanal 34 - 20240809 – 20240815

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 19/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 34 (Numeración consecutiva) del 9/8/2024 al 15/8/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 116m de placa huella, construcción de 1 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Vicanenga en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARY LUZ QUISCUE PERDOMO		
CONVENIO No.	CONVENIO 4412	VALOR INICIAL:	$ 199,459,927.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,459,927.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,459,927.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 173,530,136			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 25,929,791			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 117,720,768			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,501,379)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,459,927.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 178,337,120.73	89.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 173,530,136.49	87.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4,806,984.24)	-2.41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		89.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 173,530,136.49	87.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4,806,984.24)	-2.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,275,930.04	8.16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35,902,786.86	18.00%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 89,41%, un 87% ejecutado, generando un atraso de 2,41%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 100 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 117,720,768.00	90.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 117,720,768.00	90.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.68
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 89.41%
Meta Física Ejecutada % 87.00%
Avance o Atraso Físico % -2.41%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Fisico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	116			Prog	116			116	0.00%
						Ejec	100			100	86.21%
*	Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.00%
						Ejec	1			1	100.0%
*											
*											

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

Vereda Vicanenga: Programado: 116 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado: 1 Alcantarilla de 36"

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 23 de julio, se emiten observaciones al documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 1 de febrero de 2024 la junta de acción comunal hace entrega de la hoja de vida del contador y residente.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar a cabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar acabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
*Ya se tienen las cotizaciones, se solicita al Ing. residente llevar a cabo el ajuste al presupuesto para revisión de interventoría.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación.
* Se realizan actividades de conformación en el sitio para garantizar el ancho de la placa huella.
*Se trata de conformar la subrasante pero con las fuertes lluvias se ocasionaron daños imposibilitando el acceso al sitio, por lo tanto se conseguirá material de afirmado para mejorar los tramos críticos y así proceder con la extensión, compactación de subbase.
*Se realizó la demolición de la estructura de la alcantarilla vieja qué se encontraba en mal estado.
*Se realiza La instalación de tubería, y se funde el cabezal de entrada de la alcantarilla.
* Se realiza la excavación de la subrasante a lo largo del todo el tramo.
*Se realiza aproximadamente 60ml de subbase para completar 100ml intervenidos
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se cuenta con aproximadamente 105 metros lineales de huellas reforzadas y riostras fundidas, además se cuenta con 100metros de placa huella completa
*Se encontró un inconveniente con el proveedor del cemento, ya qué al parecer se encuentra con un cemento qué no cumple con sus cualidades para ser utilizado en la placa huella.
*Se continua con la fundición de concreto reforzado y concreto ciclópeo


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

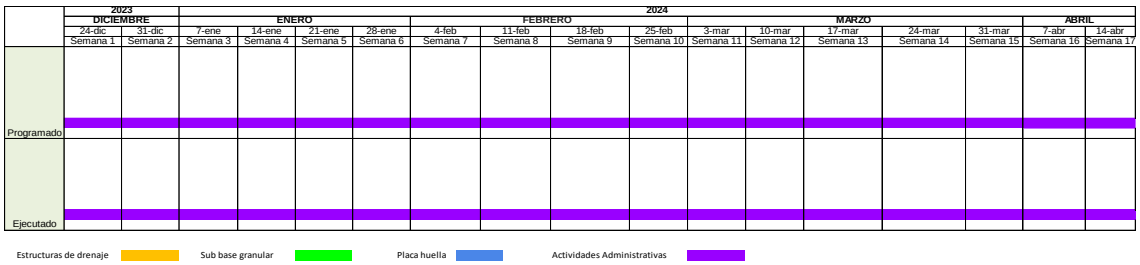

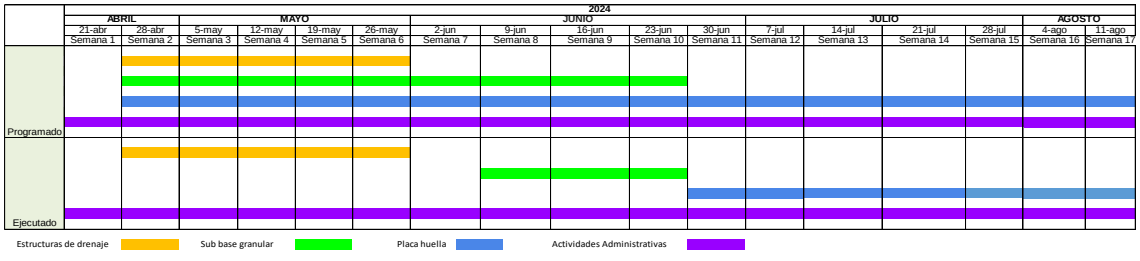

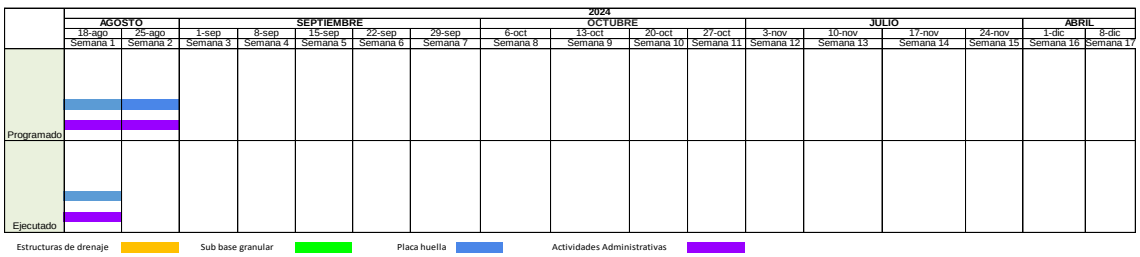

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO



HUELLA EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Revisión de las hojas de vida entregadas por la junta de acción comunal.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se comparten cotizaciones de las veredas de paz para agilizar el proceso de compras, pues la OAC tiene el recurso en la cuenta y se necesita iniciar de manera inmediata las labores.
* No se pudo realizar comité operativo por temas de conectividad en la zona.
*Se reprograma comité virtual para hacer seguimiento y ayudar a solucionar temas qué no se tengan claro por parte de la junta de acción comunal.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación por parte de la interventoría, se empieza con su revisión
*Se hicieron ajuste al plan de compras y se remite para su aprobación en comité operativo.
*Se está a la espera de qué la JAC entregue el plan de compras con las recomendaciones y correcciones qué se le desarrollaron en la reunión de comité virtual.
*Se realiza la revisión del plan de compras entregado para su posterior aval y transferencias a proveedores,
*Se requiere al contratista por la entrega de la dotación y afiliaciones del personal qué se encuentra realizando labores.
*Por tema invernal están suspendidas las labores de placa huella.
*Se solicita a la OAC los ensayos para la liberación de la subbase.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

- Informe Semanal 35 - 20240816 – 20240822

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 26/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 35 (Numeración consecutiva) del 16/8/2024 al 22/8/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 116m de placa huella, construcción de 1 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Vicanenga en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA
REPRESENTANTE LEGAL: MARY LUZ QUISCUE PERDOMO
CONVENIO No. CONVENIO 4412
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2024
PRÓRROGA N°1 01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)
PRÓRROGA N°2 1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)
PRÓRROGA N°3 1/7/2024 - 31/7/2024 (1 mes)
PRÓRROGA N°4 1/8/2024 - 31/8/2024 (1 mes)

VALOR INICIAL: $ 199.459.927,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.459.927,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
CONTRATO No. 5005-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2024
PRÓRROGA 1 01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)
PRÓRROGA 2 01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)
PRÓRROGA 3 01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)
PRÓRROGA 4 01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)

VALOR INICIAL: $ 106.219.389,00
VALOR ADICIONES: $ 23.780.245,00
VALOR ACUMULADO: $ 129.999.634,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.459.927,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 189.486.931			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 9.972.996			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106.219.389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 123.860.201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (17.640.812)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.459.927,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 187.771.575,28	94,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.486.930,65	95,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.715.355,37	0,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		94,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 189.486.930,65	95,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.715.355,37	0,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.434.454,55	4,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.956.794,16	8,00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 89,41%, un 87% ejecutado, generando un atraso de 2,41%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 100 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 123.860.201,00	95,28%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 123.860.201,00	95,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.139.433,00	4,72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.139.433,00	4,72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23.701.825,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR IIC	
En el mes:	0.65
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94.14%
Meta Física Ejecutada % 95.00%
Avance o Atraso Físico % 0.86%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Placa Huella	ML	116			Prog	116			116	0.00%
					Ejec	100			100	86.21%
Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.00%
					Ejec	1			1	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda Vicanenga — Programado: 116 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado: 1 Alcantarilla de 36"

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 23 de julio, se emiten observaciones al documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 1 de febrero de 2024 la junta de acción comunal hace entrega de la hoja de vida del contador y residente.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar a cabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar acabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
*Ya se tienen las cotizaciones, se solicita al Ing. residente llevar a cabo el ajuste al presupuesto para revisión de interventoría.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación.
* Se realizan actividades de conformación en el sitio para garantizar el ancho de la placa huella.
*Se trata de conformar la subrasante pero con las fuertes lluvias se ocasionaron daños imposibilitando el acceso al sitio, por lo tanto se conseguirá material de afirmado para mejorar los tramos críticos y así proceder con la extensión, compactación de subbase.
*Se realizó la demolición de la estructura de la alcantarilla vieja qué se encontraba en mal estado.
*Se realiza La instalación de tubería, y se funde el cabezal de entrada de la alcantarilla.
* Se realiza la excavación de la subrasante a lo largo del todo el tramo.
*Se realiza aproximadamente 60ml de subbase para completar 100ml intervenidos
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se cuenta con aproximadamente 105 metros lineales de huellas reforzadas y riostras fundidas, además se cuenta con 100metros de placa huella completa
*Se encontró un inconveniente con el proveedor del cemento, ya qué al parecer se encuentra con un cemento qué no cumple con sus cualidades para ser utilizado en la placa huella.
*Se continua con la fundición de concreto reforzado y concreto ciclópeo


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra


ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

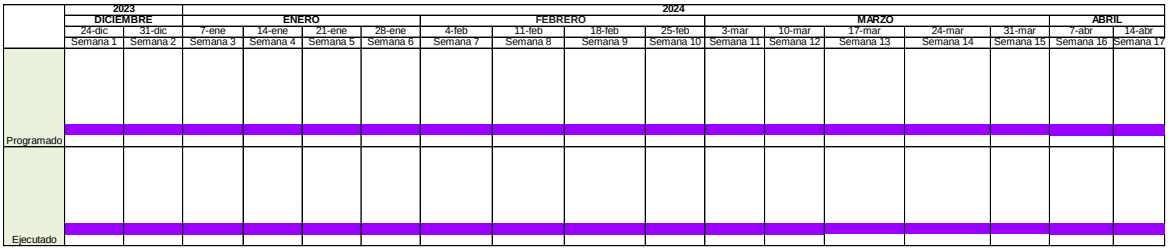

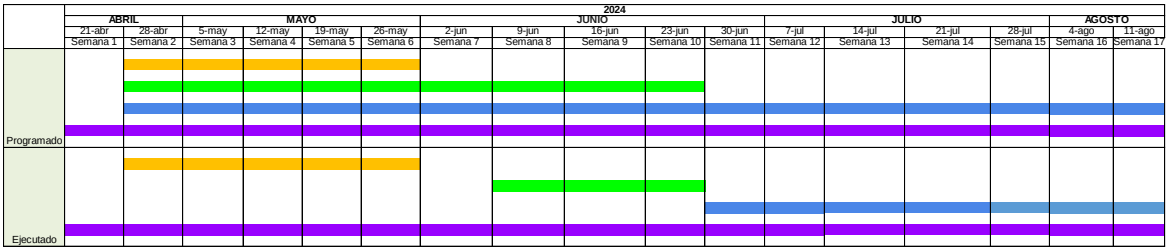

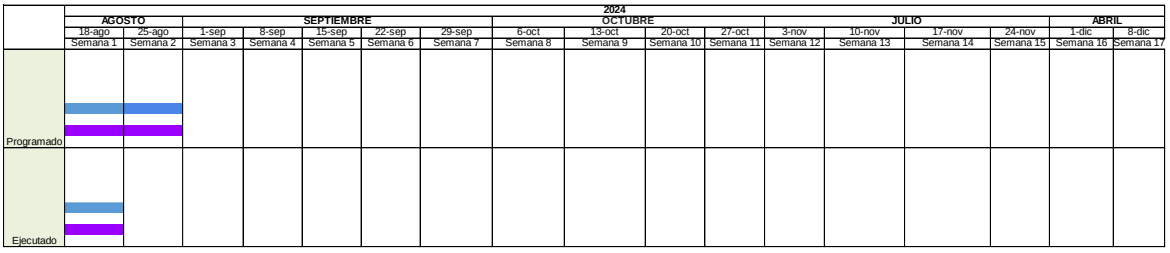

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO



HUELLA EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Revisión de las hojas de vida entregadas por la junta de acción comunal.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se comparten cotizaciones de las veredas de paz para agilizar el proceso de compras, pues la OAC tiene el recurso en la cuenta y se necesita iniciar de manera inmediata las labores.
* No se pudo realizar comité operativo por temas de conectividad en la zona.
*Se reprograma comité virtual para hacer seguimiento y ayudar a solucionar temas qué no se tengan claro por parte de la junta de acción comunal.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación por parte de la interventoría, se empieza con su revisión
*Se hicieron ajuste al plan de compras y se remite para su aprobación en comité operativo.
*Se está a la espera de qué la JAC entregue el plan de compras con las recomendaciones y correcciones qué se le desarrollaron en la reunión de comité virtual.
*Se realiza la revisión del plan de compras entregado para su posterior aval y transferencias a proveedores,
*Se requiere al contratista por la entrega de la dotación y afiliaciones del personal qué se encuentra realizando labores.
*Por tema invernal están suspendidas las labores de placa huella,
*Se solicita a la OAC los ensayos para la liberación de la subbase.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

- Informe Semanal 36 - 20240823 - 20240829

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 2/9/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 36 (Numeración consecutiva) del 23/8/2024 al 29/8/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 116m de placa huella, construcción de 1 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda Vicanenga en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VICANENGA
REPRESENTANTE LEGAL: MARYLUZ QUISCUE PERDOMO
CONVENIO No. CONVENIO 4412
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2024
PRÓRROGA N°1 01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)
PRÓRROGA N°2 1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)
PRÓRROGA N°3 1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)
PRÓRROGA N°4 1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)

VALOR INICIAL: $ 199,459,927.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199,459,927.00
VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ALEJANDRO MANDINGA CAVIRIA
CONTRATO No. 5005-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2024
PRÓRROGA 1 01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)
PRÓRROGA 2 01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)
PRÓRROGA 3 01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)
PRÓRROGA 4 01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)
PRÓRROGA 5 01/09/2024 - 30/09/2024 (1 mes)

VALOR INICIAL: $ 106,219,389.00
VALOR ADICIONES: $ 23,780,245.00
VALOR ACUMULADO: $ 129,999,634.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,459,927.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 199,459,927			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118,108,981			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,889,592)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,459,927.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199,459,927.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199,459,927.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199,459,927.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11,688,351.72	5.86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,972,996.35	5.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 89,41%, un 87% ejecutado, generando un atraso de 2,41%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 100 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
5.86 INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR IC	
En el mes:	0.59
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00%
Meta Física Ejecutada % 100.00%
Avance o Atraso Físico % 0.00%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	116			Prog	116			116	0.00%
						Ejec	116			116	100.00%
*	Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.00%
						Ejec	1			1	100.0%
*											
*											

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

Vereda Vicanenga — Programado: 116 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado.
Ejecutado: 1 Alcantarilla de 36" y 116metros de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: / Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: / Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 23 de julio, se emiten observaciones al documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 1 de febrero de 2024 la junta de acción comunal hace entrega de la hoja de vida del contador y residente.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar a cabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
* Se realizan reuniones virtuales con el fin de aclarar los procesos qué conlleva la ejecución del convenio, se solicita a la OAC adelantar la elaboración del plan de compras con el fin de iniciar labores.
* Por la zona de accesibilidad los profesionales encargados de realizar la topografía, suelos y estudio hidrológico solicita anticipo para llevar acabo sus labores, se programa comité operativo para poder realizar un pago parcial de este ítem.
*Ya se tienen las cotizaciones, se solicita al Ing. residente llevar a cabo el ajuste al presupuesto para revisión de interventoría.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación.
* Se realizan actividades de conformación en el sitio para garantizar el ancho de la placa huella.
*Se trata de conformar la subrasante pero con las fuertes lluvias se ocasionaron daños imposibilitando el acceso al sitio, por lo tanto se conseguirá material de afirmado para mejorar los tramos críticos y así proceder con la extensión, compactación de subbase.
*Se realizó la demolición de la estructura de la alcantarilla vieja qué se encontraba en mal estado.
*Se realiza La instalación de tubería, y se funde el cabezal de entrada de la alcantarilla.
* Se realiza la excavación de la subrasante a lo largo del todo el tramo.
*Se realiza aproximadamente 60ml de subbase para completar 100ml intervenidos
*Se están adelantando las labores para la elaboración para la prórroga del convenio hasta el 31 de julio de 2024
*Se cuenta con aproximadamente 105 metros lineales de huellas reforzadas y riostras fundidas, además se cuenta con 100metros de placa huella completa
*Se encontró un inconveniente con el proveedor del cemento, ya qué al parecer se encuentra con un cemento qué no cumple con sus cualidades para ser utilizado en la placa huella.
*Se continua con la fundición de concreto reforzado y concreto ciclópeo.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se termina con la ejecucion de obra en el marco del convenio suscrito entre el instituto nacioal de vias y la junta de accion comunal de vicanenga


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS



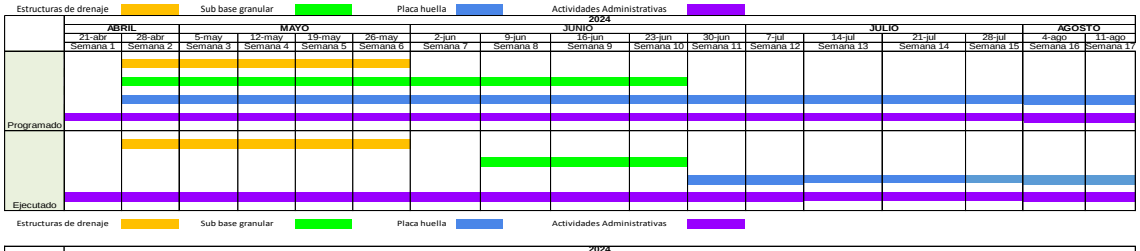



ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO



HUELLA EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
* Revisión de las hojas de vida entregadas por la junta de acción comunal.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se comparten cotizaciones de las veredas de paz para agilizar el proceso de compras, pues la OAC tiene el recurso en la cuenta y se necesita iniciar de manera inmediata las labores.
* No se pudo realizar comité operativo por temas de conectividad en la zona.
*Se reprograma comité virtual para hacer seguimiento y ayudar a solucionar temas qué no se tengan claro por parte de la junta de acción comunal.
*Se recibe el día jueves el plan de compras para revisión y aprobación por parte de la interventoría, se empieza con su revisión
*Se hicieron ajuste al plan de compras y se remite para su aprobación en comité operativo.
*Se está a la espera de qué la JAC entregue el plan de compras con las recomendaciones y correcciones qué se le desarrollaron en la reunión de comité virtual.
*Se realiza la revisión del plan de compras entregado para su posterior aval y transferencias a proveedores,
*Se requiere al contratista por la entrega de la dotación y afiliaciones del personal qué se encuentra realizando labores.
*Por tema invernal están suspendidas las labores de placa huella.
*Se solicita a la OAC los ensayos para la liberación de la subbase.
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

4.1.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

- Informe Semanal 33 - 20240802 – 20240808

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 12/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 2/8/2024 al 8/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 113.5m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Mirador en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR		
REPRESENTANTE LEGAL:	YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO		
CONVENIO No.	CONVENIO 4509	VALOR INICIAL:	$ 199.041.993,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.041.993,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 - 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 - 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANJINGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106.219.389,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23.780.245,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129.999.634,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,041,993.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 64,191,043			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 134,850,950			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 111,581,335			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (5,361,946)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,041,993.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 161,721,619.31	81.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 64,191,042.74	32.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (97,530,576.57)	-49.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 161,721,619.31	81.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64,191,042.74	32.25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (97,530,576.57)	-49.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,972,003.85	5.01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14,151,885.70	7.11%

-7.11

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 76,24%, un 32,25% ejecutado, generando un atraso de 43,99%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 65 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR IIC	
En el mes:	1.74
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 81.25%
Meta Física Ejecutada % 32.25%

Avance o Atraso Físico % -49.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Placa Huella	ML	113.5			Prog	113.5			113.5	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contemoladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda El Mirador — Programado: 113.5 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Paicol y tesalia, Huila	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental 0529 del 17 de marzo del 2015.Titulo minero FLV 082.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO: Mediante oficio CIVC-5005-023-2024 del 17 de julio del 2024, se da aval y se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065191

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guia, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se está a la espera del giro del recurso para iniciar con la parte de estudios y diseños del sector.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
*Se realizó reunión con el ingeniero encargado por parte de la junta de acción comunal con el fin de explicar el alcance del proyecto y solicitar todo lo qué este conlleva.
*Se explicó la conformación del convenio, el plan operativo y cómo se va a realizar los giros.
*Se recibe el plan de compras con cotizaciones para estudios de topografía y suelos.
*Se realizan observaciones y se aprueba por parte de la interventoría.
*Se realiza topografía y estudio de suelos en el frente de trabajo.
*Se entrega los estudios de topografía y suelos y se procede a realizar estudio geométrico e hidrológico.
*Se Aprueba plan de compras para la ejecución de la maquinaria y subbase
*Pese a qué se encuentra realizado el giro a los proveedores no han podido acceder al sitio de la obra, pues por el tema invernal no han podido entrar los transportes por el mal estado de la vía.
*Mediante oficio la junta de acción comunal manifiesta el mal estado de la vía, lo cual imposibilita el acceso de materiales pese a qué ya se encuentran comprados a los proveedores.
*Se encuentran adelantando actividades de conformación y extensión de subbase en el tramo, también se cuenta con la formaleta para la posterior fundición de las placas


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realizan actividades de fundición de placa en concreto reforzado, se realiza la recomendación de qué a medida qué avancen vayan completando la placa con cunetas y ciclópeos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
*Requerir a la junta por la entrega de los estudios y diseños tomados.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

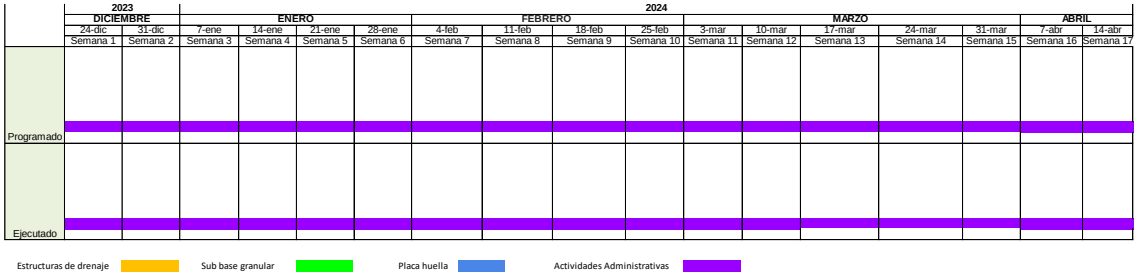


ADRIANA ORTIZ MENESES
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

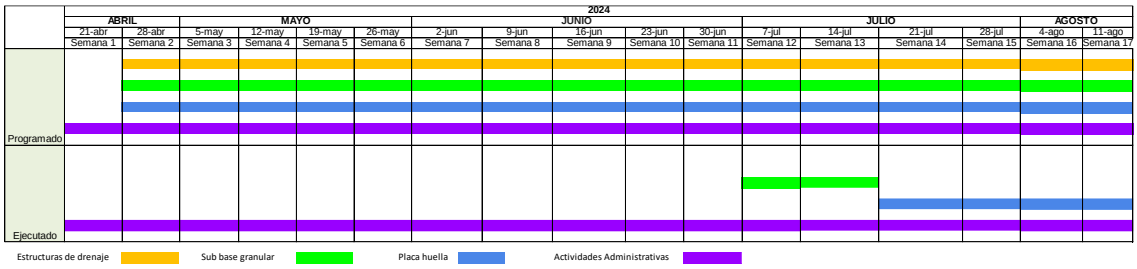



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VALLA INSTALADA EN EL TRAMO



CICLÓPEOS FUNDIDOS



LOSAS EN CONCRETO REFORZADO FUNDIDAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se informe al presidente qué de parte de Invías se realizó el giro del recurso y se está a la espera de la confirmación del banco para iniciar con el comité operativo para iniciar la ejecución de actividades.
*Se realiza reunión con el ingeniero residente de la junta de acción comunal en las instalaciones de la interventoría, con el fin de explicar y dar claridad al alcance del proyecto y actividades específicas del residente de obra.
*Se explica el diligenciamiento del plan de compras, las cotizaciones y la manera de realizar el giro de acuerdo al banco AV Villas.
*Se recibe el plan de compras para su revisión por parte de la interventoría.
*Se realizan observación y se aprueba el plan de compras 1, se programa comité operativo para avalar el plan de compras.
*Se está a la espera de los resultados de los estudios tomados en el tramo a ejecutar.
*Se está a la espera de los resultados de los estudios realizados en el tramo.
*Se realiza la aprobación del plan de compras número dos para realizar el pago de materiales, estudios y diseños para el inicio de la ejecución de las obras,
*Se solicita a la OAC qué se realicen reportes del estado de la vía para poder ingresar al tramo.
*En cuanto al orden público hay una gran coyuntura en el sitio, pues se encuentra la presencia de varios grupos al margen de la ley en el sector.
*Persisten las dificultades para el transporte de materiales debido a las constantes lluvias qué afectan las vías del municipio de Páez. Para acceder a la vereda, la única opción viable es a través de Belalcázar, una ruta en mal estado qué impide el acceso al sitio de la obra. La otra vía de acceso, por Nátaga, Huila, también presenta daños significativos, lo qué dificulta el ingreso de camiones y volquetas destinados al transporte de material.
*En inspección realizada por interventoría se puede corroborar el mal estado de la vía imposibilitando el acceso de vehículos livianos y por ende carga pesado es inconcebible el ingreso a la zona
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES

Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

- Informe Semanal 34 - 20240809 – 20240815

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	19/8/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 34 del 9/8/2024 al 15/8/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 113.5m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Mirador en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR		VALOR INICIAL:	$	199,041,993.00
REPRESENTANTE LEGAL:	YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO		VALOR ADICIONES:	$	-
CONVENIO No.	CONVENIO 4509		VALOR ACUMULADO:	$	199,041,993.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023		VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR AMORTIZADO:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024		SALDO POR AMORTIZAR	$	-
PRORROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)				
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)				
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 - 31/7/2024 (1 mes)				
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 - 31/8/2024 (1 mes)				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		VALOR INICIAL:	$	106,219,389.00
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANJINGA GAVIRIA		VALOR ADICIONES:	$	23,780,245.00
CONTRATO No.	5005-2023		VALOR ACUMULADO:	$	129,999,634.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023		VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR AMORTIZADO:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRORROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)				
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)				
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)				
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,041,993.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 82,642,235			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116,399,758			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 117,720,768			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,501,379)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,041,993.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 177,963,445.94	89.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 82,642,235.49	41.52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (95,321,210.45)	-47.89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177,963,445.94	89.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,642,235.49	41.52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (95,321,210.45)	-47.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,241,826.63	8.16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,451,192.75	9.27%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 76,24%, un 32,25% ejecutado, generando un atraso de 43,99%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 65 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 117,720,768.00	90.55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 117,720,768.00	90.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.42
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 89.41%
Meta Física Ejecutada % 41.52%
Avance o Atraso Físico % 47.89%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	113.5			Prog	113.5			113.5	100.0%
						Ejec	0			0	0.00%
*	Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
						Ejec	0			0	0.0%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda El Mirador — Programado: 113.5 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36´en concreto reforzado.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Paicol y tesalia, Huila	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental 0529 del 17 de marzo del 2015.Titulo minero FLV 082.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO: Mediante oficio CIVC-5005-023-2024 del 17 de julio del 2024, se da aval y se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065191

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adicna a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

ADRIANA ORTIZ MENESES
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se está a la espera del giro del recurso para iniciar con la parte de estudios y diseños del sector.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
*Se realizó reunión con el ingeniero encargado por parte de la junta de acción comunal con el fin de explicar el alcance del proyecto y solicitar todo lo qué este conlleva.
*Se explicó la conformación del convenio, el plan operativo y cómo se va a realizar los giros.
*Se recibe el plan de compras con cotizaciones para estudios de topografía y suelos.
*Se realizan observaciones y se aprueba por parte de la interventoría.
*Se realiza topografía y estudio de suelos en el frente de trabajo.
*Se entrega los estudios de topografía y suelos y se procede a realizar estudio geométrico e hidrológico.
*Se Aprueba plan de compras para la ejecución de la maquinaria y subbase
*Pese a qué se encuentra realizado el giro a los proveedores no han podido acceder al sitio de la obra, pues por el tema invernal no han podido entrar los transportes por el mal estado de la vía.
*Mediante oficio la junta de acción comunal manifiesta el mal estado de la vía, lo cual imposibilita el acceso de materiales pese a qué ya se encuentran comprados a los proveedores.
*Se encuentran adelantando actividades de conformación y extensión de subbase en el tramo, también se cuenta con la formaleta para la posterior fundición de las placas


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se realizan actividades de fundición de placa en concreto reforzado, se realiza la recomendación de qué a medida qué avancen vayan completando la placa con cunetas y ciclópeos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
*Requerir a la junta por la entrega de los estudios y diseños tomados.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

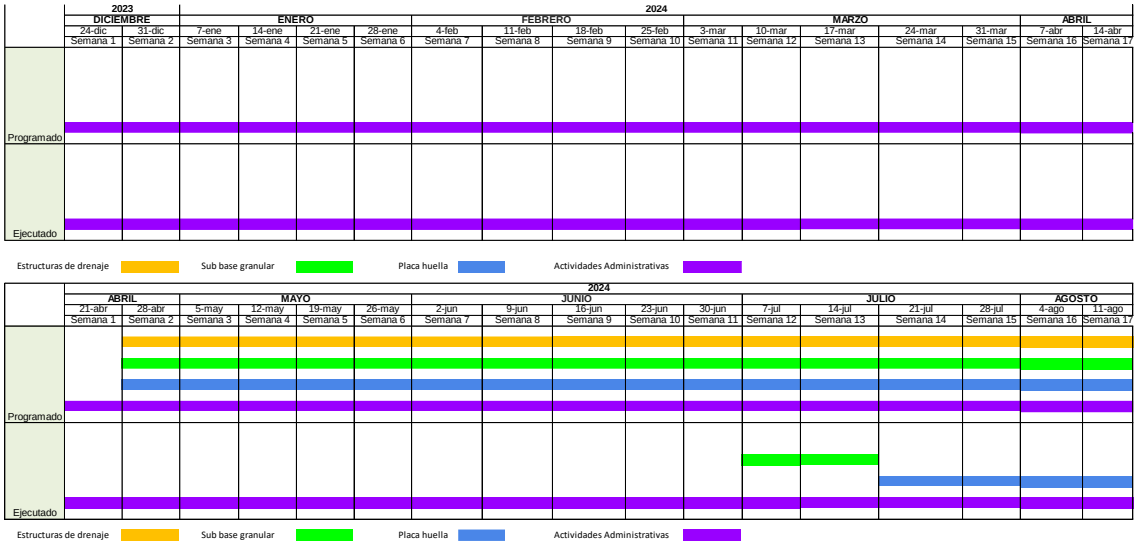

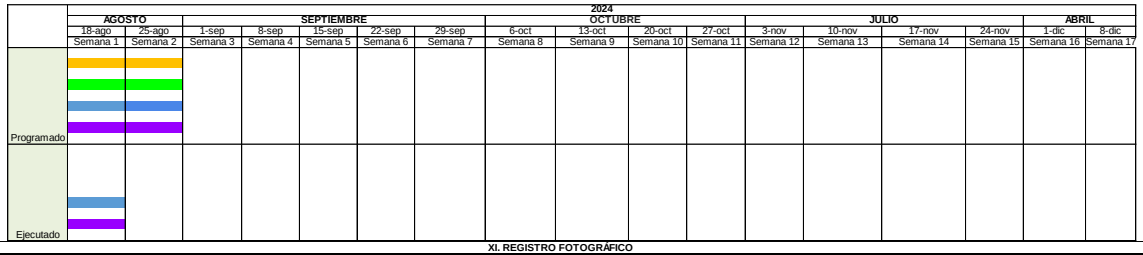

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA EN CONSTRUCCIÓN



PLACA EN CONSTRUCCIÓN



PLACA EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra. * Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales. * Revisión de la calidad de los materiales empleados. * Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. * Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual *Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo. * Se informe al presidente qué de parte de Invías se realizó el giro del recurso y se está a la espera de la confirmación del banco para iniciar con el comité operativo para iniciar la ejecución de actividades. *Se realiza reunión con el ingeniero residente de la junta de acción comunal en las instalaciones de la interventoría, con el fin de explicar y dar claridad al alcance del proyecto y actividades específicas del residente de obra. *Se explica el diligenciamiento del plan de compras, las cotizaciones y la manera de realizar el giro de acuerdo al banco AV Villas. *Se recibe el plan de compras para su revisión por parte de la interventoría. *Se realizan observación y se aprueba el plan de compras 1, se programa comité operativo para avalar el plan de compras. *Se está a la espera de los resultados de los estudios tomados en el tramo a ejecutar. *Se está a la espera de los resultados de los estudios realizados en el tramo. *Se realiza la aprobación del plan de compras número dos para realizar el pago de materiales, estudios y diseños para el inicio de la ejecución de las obras, *Se solicita a la OAC qué se realicen reportes del estado de la vía para poder ingresar al tramo. *En cuanto al orden público hay una gran coyuntura en el sitio, pues se encuentra la presencia de varios grupos al margen de la ley en el sector. *Persisten las dificultades para el transporte de materiales debido a las constantes lluvias qué afectan las vías del municipio de Páez. Para acceder a la vereda, la única opción viable es a través de Belalcázar, una ruta en mal estado qué impide el acceso al sitio de la obra. La otra vía de acceso, por Nátaga, Huila, también presenta daños significativos, lo qué dificulta el ingreso de camiones y volquetas destinados al transporte de material. *En inspección realizada por interventoría se puede corroborar el mal estado de la vía imposibilitando el acceso de vehículos livianos y por ende carga pesado es inconcebible el ingreso a la zona *Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.	FIRMA NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU *Invías - Gestión Pública con Calidad*

- Informe Semanal 35 - 20240816 – 20240822

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	26/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 35 del 16/8/2024 al 22/8/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 113.5m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Mirador en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR		
REPRESENTANTE LEGAL:	YENER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO		
CONVENIO No.	CONVENIO 4509	VALOR INICIAL:	$ 199,041,993.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,041,993.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,041,993.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 82,642,235			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116,399,758			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 123,860,201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (17,640,812)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 199,041,993.00**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 187,378,132.21	94.14%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 82,642,235.49	41.52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (104,735,896.72)	-52.62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 187,378,132.21	94.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,642,235.49	41.52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (104,735,896.72)	-52.62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,414,686.27	4.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,451,192.75	9.27%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 76,24%, un 32,25% ejecutado, generando un atraso de 43,99%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 65 metros lineales de placa huella.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 123,860,201.00	95.28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123,860,201.00	95.28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

	INDICADOR I/C
En el mes:	1.50
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 94.14%
Meta Física Ejecutada % 41.52%

Avance o Atraso Físico % -52.62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Placa Huella	ML	113.5			Prog	113.5			113.5	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda El Mirador — Programado: 113.5 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Paicol y tesalia, Huila	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental 0529 del 17 de marzo del 2015.Título minero FLV 082.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO: Mediante oficio CIVC-5005-023-2024 del 17 de julio del 2024, se da aval y se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065191

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se está a la espera del giro del recurso para iniciar con la parte de estudios y diseños del sector.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
*Se realizó reunión con el ingeniero encargado por parte de la junta de acción comunal con el fin de explicar el alcance del proyecto y solicitar todo lo qué este conlleva.
*Se explicó la conformación del convenio, el plan operativo y cómo se va a realizar los giros.
*Se recibe el plan de compras con cotizaciones para estudios de topografía y suelos.
*Se realizan observaciones y se aprueba por parte de la interventoría.
*Se realiza topografía y estudio de suelos en el frente de trabajo.
*Se entrega los estudios de topografía y suelos y se procede a realizar estudio geométrico e hidrológico.
*Se Aprueba plan de compras para la ejecución de la maquinaria y subbase
*Pese a qué se encuentra realizado el giro a los proveedores no han podido acceder al sitio de la obra, pues por el tema invernal no han podido entrar los transportes por el mal estado de la vía.
*Mediante oficio la junta de acción comunal manifiesta el mal estado de la vía, lo cual imposibilita el acceso de materiales pese a qué ya se encuentran comprados a los proveedores.
*Se encuentran adelantando actividades de conformación y extensión de subbase en el tramo, también se cuenta con la formaleta para la posterior fundición de las placas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se realizan actividades de fundición de placa en concreto reforzado, se realiza la recomendación de qué a medida qué avancen vayan completando la placa con cunetas y ciclópeos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
*Requerir a la junta por la entrega de los estudios y diseños tomados.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS


	2023		2024														
	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL	
	24-dic	31-dic	7-ene	14-ene	21-ene	28-ene	4-feb	11-feb	18-feb	25-feb	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar	7-abr	14-abr
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
Programado																	
Ejecutado																	



ADRIANA ORTIZ MENESES	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

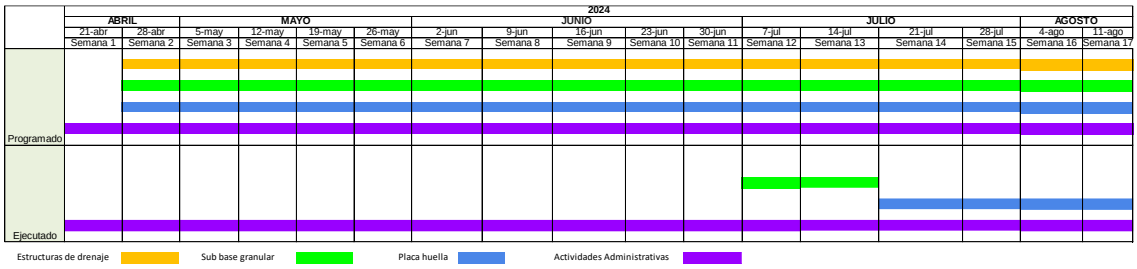



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA EN CONSTRUCCIÓN



PLACA EN CONSTRUCCIÓN



LOSA DE ACCESO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo.
* Se informe al presidente qué de parte de Invías se realizó el giro del recurso y se está a la espera de la confirmación del banco para iniciar con el comité operativo para iniciar la ejecución de actividades.
*Se realiza reunión con el ingeniero residente de la junta de acción comunal en las instalaciones de la interventoría, con el fin de explicar y dar claridad al alcance del proyecto y actividades específicas del residente de obra.
*Se explica el diligenciamiento del plan de compras, las cotizaciones y la manera de realizar el giro de acuerdo al banco AV Villas.
*Se recibe el plan de compras para su revisión por parte de la interventoría.
*Se realizan observación y se aprueba el plan de compras 1, se programa comité operativo para avalar el plan de compras.
*Se está a la espera de los resultados de los estudios tomados en el tramo a ejecutar.
*Se está a la espera de los resultados de los estudios realizados en el tramo.
*Se realiza la aprobación del plan de compras número dos para realizar el pago de materiales, estudios y diseños para el inicio de la ejecución de las obras,
*Se solicita a la OAC qué se realicen reportes del estado de la vía para poder ingresar al tramo.
*En cuanto al orden público hay una gran coyuntura en el sitio, pues se encuentra la presencia de varios grupos al margen de la ley en el sector.
*Persisten las dificultades para el transporte de materiales debido a las constantes lluvias qué afectan las vías del municipio de Páez. Para acceder a la vereda, la única opción viable es a través de Belalcázar, una ruta en mal estado qué impide el acceso al sitio de la obra. La otra vía de acceso, por Nátaga, Huila, también presenta daños significativos, lo qué dificulta el ingreso de camiones y volquetas destinados al transporte de material.
*En inspección realizada por interventoría se puede corroborar el mal estado de la vía imposibilitando el acceso de vehículos livianos y por ende carga pesado es inconcebible el ingreso a la zona
*Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES

Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

- Informe Semanal 36 - 20240823 - 20240829

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	2/9/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 36 del 23/8/2024 al 29/8/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 113.5m de placa huella, construcción de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda El Mirador en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR		
REPRESENTANTE LEGAL:	YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO		
CONVENIO No.	CONVENIO 4509	VALOR INICIAL:	$ 199,041,993.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,041,993.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 - 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 - 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANUNGA CAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 5	01/09/2024 - 30/09/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,041,993.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 119,425,196			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 79,616,797			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118,108,981			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,889,592)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,041,993.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 147,788,679.80	74.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 119,425,195.80	60.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28,363,484.00)	-14.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 147,788,679.80	74.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119,425,195.80	60.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28,363,484.00)	-14.25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,414,686.27	4.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36,786,960.31	18.48%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

Observaciones: Al momento de elaboración de informe se tiene un avance programado de 74,25%, un 60,00% ejecutado, generando un atraso de 14,25%.
Este porcentaje de avance se refleja en la construcción de una alcantarilla, la excavación para mejorar la subrasante y la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de subbase, y la fundición de 65 metros lineales de placa huella.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.99
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 74.25%
Meta Física Ejecutada % 60.00%
Avance o Atraso Físico % -14.25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Placa Huella	ML	113.5			Prog	113.5			113.5	100.0%
					Ejec	65			65	57.27%
Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

Vereda El Mirador: Programado: 113.5 metros lineales de placa huella y construcción de 1 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado.
Ejecutado: construccion de 65m lineales de placa huella completa

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Paicol y tesalia, Huila	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental 0529 del 17 de marzo del 2015.Titulo minero FLV 082.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO: Mediante oficio CIVC-5005-023-2024 del 17 de julio del 2024, se da aval y se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065191

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se emite entrega inicial a subdirección de sostenibilidad de información del plan de gestión social y sus diferentes matrices
Se recibe número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-044958 a la entrega inicial del plan de gestión social

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

ADRIANA ORTIZ MENESES
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Se está a la espera del giro del recurso para iniciar con la parte de estudios y diseños del sector.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
*Se realizó reunión con el ingeniero encargado por parte de la junta de acción comunal con el fin de explicar el alcance del proyecto y solicitar todo lo qué este conlleva.
*Se explicó la conformación del convenio, el plan operativo y cómo se va a realizar los giros.
*Se recibe el plan de compras con cotizaciones para estudios de topografía y suelos.
*Se realizan observaciones y se aprueba por parte de la interventoría.
*Se realiza topografía y estudio de suelos en el frente de trabajo.
*Se entrega los estudios de topografía y suelos y se procede a realizar estudio geométrico e hidrológico.
*Se Aprueba plan de compras para la ejecución de la maquinaria y subbase
*Pese a qué se encuentra realizado el giro a los proveedores no han podido acceder al sitio de la obra, pues por el tema invernal no han podido entrar los transportes por el mal estado de la vía.
*Mediante oficio la junta de acción comunal manifiesta el mal estado de la vía, lo cual imposibilita el acceso de materiales pese a qué ya se encuentran comprados a los proveedores.
*Se encuentran adelantando actividades de conformación y extensión de subbase en el tramo, también se cuenta con la formaleta para la posterior fundición de las placas


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realizan actividades de fundición de placa en concreto reforzado, se realiza la recomendación de qué a medida qué avancen vayan completando la placa con cunetas y ciclópeos.
*Se realiza el armado del acero para las vigas riostras de la placa huella.
*Se recibe material en obra como es (acero, cemento y tablas) para continuar con la ejecucion del convenio

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Actualización de los APUS teniendo en cuenta las cotizaciones de obra
*Requerir a la junta por la entrega de los estudios y diseños tomados.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

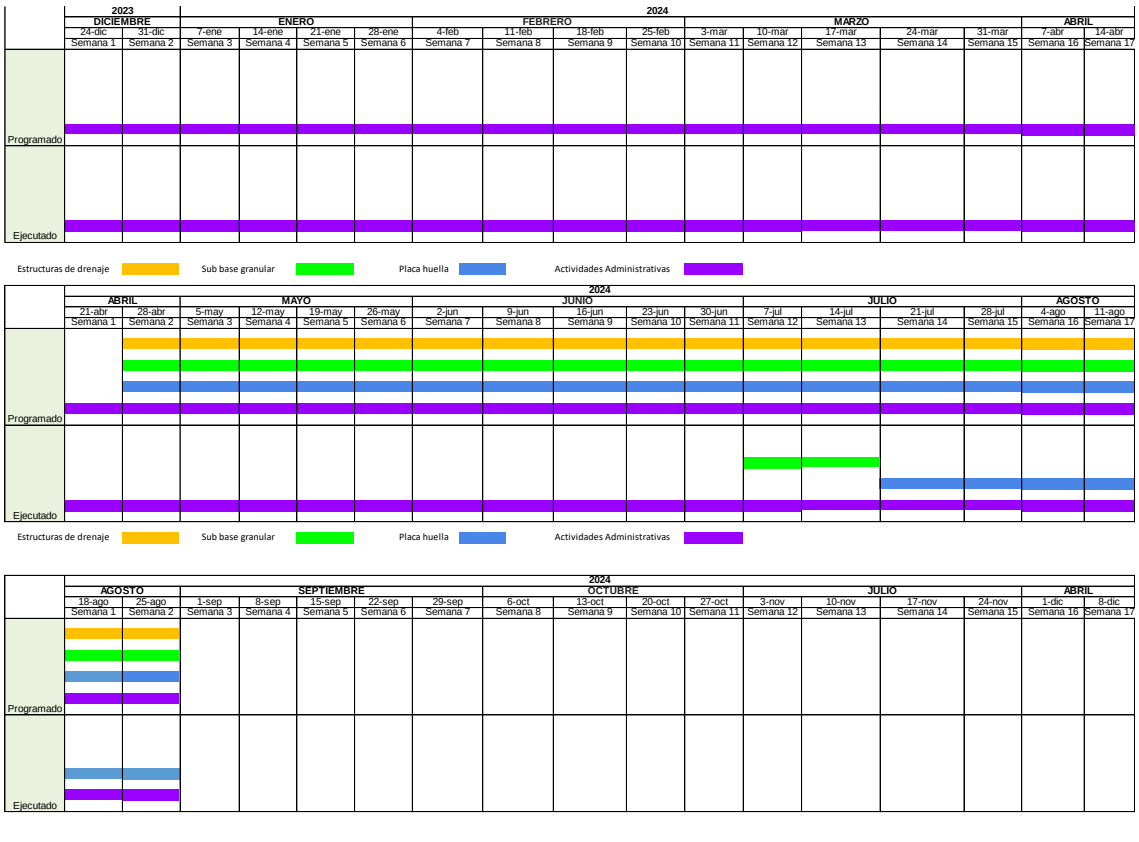

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA EN CONSTRUCCIÓN



PLACA EN CONSTRUCCIÓN



LOSA DE ACCESO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra. * Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales. * Revisión de la calidad de los materiales empleados. * Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. * Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual *Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo. * Se informe al presidente qué de parte de Invías se realizó el giro del recurso y se está a la espera de la confirmación del banco para iniciar con el comité operativo para iniciar la ejecución de actividades. *Se realiza reunión con el ingeniero residente de la junta de acción comunal en las instalaciones de la interventoría, con el fin de explicar y dar claridad al alcance del proyecto y actividades específicas del residente de obra. *Se explica el diligenciamiento del plan de compras, las cotizaciones y la manera de realizar el giro de acuerdo al banco AV Villas. *Se recibe el plan de compras para su revisión por parte de la interventoría. *Se realizan observación y se aprueba el plan de compras 1, se programa comité operativo para avalar el plan de compras. *Se está a la espera de los resultados de los estudios tomados en el tramo a ejecutar. *Se está a la espera de los resultados de los estudios realizados en el tramo. *Se realiza la aprobación del plan de compras número dos para realizar el pago de materiales, estudios y diseños para el inicio de la ejecución de las obras, *Se solicita a la OAC qué se realicen reportes del estado de la vía para poder ingresar al tramo. *En cuanto al orden público hay una gran coyuntura en el sitio, pues se encuentra la presencia de varios grupos al margen de la ley en el sector. *Persisten las dificultades para el transporte de materiales debido a las constantes lluvias qué afectan las vías del municipio de Páez. Para acceder a la vereda, la única opción viable es a través de Belalcázar, una ruta en mal estado qué impide el acceso al sitio de la obra. La otra vía de acceso, por Nátaga, Huila, también presenta daños significativos, lo qué dificulta el ingreso de camiones y volquetas destinados al transporte de material. *En inspección realizada por interventoría se puede corroborar el mal estado de la vía imposibilitando el acceso de vehículos livianos y por ende carga pesado es inconcebible el ingreso a la zona *Se encuentra en trámites administrativos para prorrogar el convenio y el contrato de interventoría.	FIRMA NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU *Invías - Gestión Pública con Calidad*

4.1.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

- Informe Semanal 33 - 20240802 – 20240808

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 12/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 2/8/2024 al 8/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 64m de placa huella, construcción de 5 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda La Honda en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL CUSCUE MUSE		
CONVENIO No.	CONVENIO 4833	VALOR INICIAL:	$ 201,513,019.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/1/2/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,513,019.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAF	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANUNGA CAVERIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,513,019.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,513,019			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 111,581,335			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (5,361,946)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,513,019.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 163,729,327.94	81.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,783,691.06	18.75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		81.25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,783,691.06	18.75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,095,802.25	5.01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,045,390.57	3.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha se cuenta con la instalación de la tubería para cinco alcantarillas, la estructura de salida y entrada de 5 alcantarillas, sin embargo se ha complicado, pues se encuentra mucha roca en el sitio de la excavación. Se encuentra con un porcentaje de ejecución programado de 76,24% y un ejecutado de 97%, generando un avance de 20,76% en la obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 111,581,335.00	85.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.55
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 81.25%
Meta Física Ejecutada % 100.00%

Avance o Atraso Físico % 18.75%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
* Placa Huella	ML	64			Prog	0			0	0.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	6			6	100.0%
					Ejec	6			6	100.00%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda La Honda — Programado: 64 metros lineales de placa huella y construcción de 5 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: escuela la Honda

OBSERVACIONES:
Se realiza entrega final de obra contando con la participación de la comunidad, contador e interventoria, allí se dio a conocer un informe los gastos de obra realizados como también del proceso constructivo. Con ello la comunidad expresó su satisfacción frente a las obras entregadas

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 26 de febrero se reciben hojas de vida por parte del presidente de la junta, las cuales se realiza la revisión por parte de la interventoría.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
* Se encuentra personal de consultoría con el fin de realizar los estudios y diseños para el tramo a intervenir
* Se realiza comité operativo para escoger la mejor oferta de los proveedores del sector.
*Se inicia con el acarreo de materiales hasta el sitio de la obra, pues para llegar a este toca atravesar un puente peatonal qué es el único acceso a la vereda.
*El contratista entrega balance de obra ajustando los precios a los del mercado, se revisará por parte de la interventoría.
*Se continua con la excavación de las alcantarillas, hasta el momento se encuentran 3 excavaciones terminadas para las alcantarillas diseñadas, se realiza la instalación de 15 metros de tubería de 36", el respectivo relleno y la fundición de un cabezal de salida.
*Se realizan las excavaciones para la instalación de tubería en las dos alcantarillas faltantes.
*Se instala la tubería de estas mismas, haciendo qué queden las 5 alcantarillado con tuberías.
*Se continúa con la fundición de las estructuras de salida, se tienen completas 3 alcantarillas completas.
*Se cuenta con 5 alcantarillas completas, y se están fundiendo las estructuras de entrada y salida de la 5 alcantarilla.
*Se realiza la construcción de la alcantarilla número 6 después de corroborar qué en el balance si se cuenta con el recurso y la disponibilidad para su construcción.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se adelantan actividades en la 6 alcantarilla, como fundición de cabezal de entrada

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar balance con el fin de determinar si alcanza para la 6ta alcantarilla en el proyecto

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

	2023		2024														
	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL	
	24-dic	31-dic	7-ene	14-ene	21-ene	28-ene	4-feb	11-feb	18-feb	25-feb	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar	7-abr	14-abr
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
Programado																	
Ejecutado																	


Estructuras de drenaje

Actividades Administrativas

ADRIANA ORTIZ MENESES
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

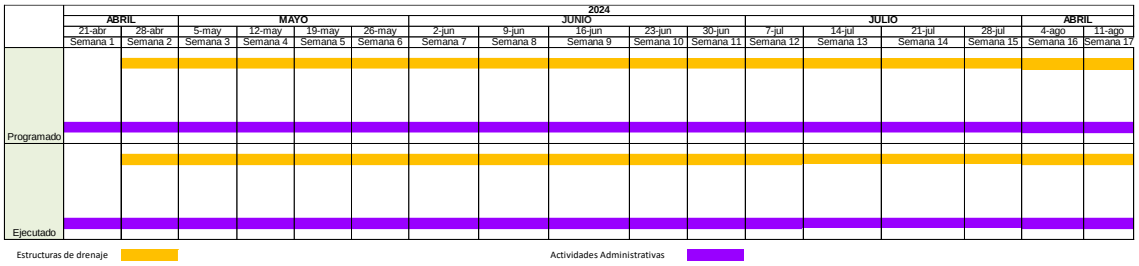

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLA TERMINADA



ACTIVIDAD DE ENTREGA DE OBRA



ENTREGA DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Revisar las hojas de vida para la ejecución del proyecto.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo
*Se realiza comité operativo con el fin de empezar a comprar material para la ejecución de la obra.
*Se empieza a realizar la revisión de documentos entregados, plan de compras, balance, solicitud de vinculación de cuentas y órdenes de giro a proveedores para empezar con el acopio de material.
*Se aprueban y se realizan giros de acuerdo al plan de compras 1 aprobado en el comité operativo 1.
*Se solicita al Ing. residente de obra entregar cronograma de obra ajustado.
*Se realiza la inspección verificando las medidas realizadas en campo.
*Se solicita al contratista un balance de cantidades con el fin de establecer meta física del proyecto.
*En conjunto con la OAC y su residente de obra la interventoría empieza a realizar la revisión del balance con el fin de determinar qué obras adicionales se pueden lograr con el recurso disponible del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 1920222456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

- Informe Semanal 34 - 20240809 – 20240815

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 19/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 34 (Numeración consecutiva) del 9/8/2024 al 15/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 64m de placa huella, construcción de 5 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda La Honda en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL CUSCUE MUSE		
CONVENIO No.	CONVENIO 4833	VALOR INICIAL:	$ 201,513,019.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,513,019.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAF	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,513,019.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,513,019			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 117,720,768			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,501,379)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	201,513,019.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	180,172,790.29	89.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	21,340,228.71	10.59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			89.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	21,340,228.71	10.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	16,443,462.35	8.16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	6,045,390.57	3.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha se cuenta con la instalación de la tubería para cinco alcantarillas, la estructura de salida y entrada de 5 alcantarillas, sin embargo se ha complicado, pues se encuentra mucha roca en el sitio de la excavación. Se encuentra con un porcentaje de ejecución programado de 76,24% y un ejecutado de 97%, generando un avance de 20,76% en la obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$	117,720,768.00	90.55%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	117,720,768.00	90.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR IIC	
En el mes:	0.58
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 89.41%
Meta Física Ejecutada % 100.00%
Avance o Atraso Físico % 10.59%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Placa Huella	ML	64			Prog	0			0	0.0%
					Ejec	0			0	0.00%
Alcantarillas	UND	5			Prog	6			6	100.0%
					Ejec	6			6	100.00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda La Honda — Programado: 64 metros lineales de placa huella y construcción de 5 alcantarillas con tubería de 36¨en concreto reforzado.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: escuela la Honda

OBSERVACIONES:
Se realiza entrega final de obra contando con la participación de la comunidad, contador e interventoría, allí se dio a conocer un informe los gastos de obra realizados como también del proceso constructivo. Con ello la comunidad expresó su satisfacción frente a las obras entregadas

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 26 de febrero se reciben hojas de vida por parte del presidente de la junta, las cuales se realiza la revisión por parte de la interventoría.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
* Se encuentra personal de consultoría con el fin de realizar los estudios y diseños para el tramo a intervenir
* Se realiza comité operativo para escoger la mejor oferta de los proveedores del sector.
*Se inicia con el acarreo de materiales hasta el sitio de la obra, pues para llegar a este toca atravesar un puente peatonal qué es el único acceso a la vereda.
*El contratista entrega balance de obra ajustando los precios a los del mercado, se revisará por parte de la interventoría.
*Se continua con la excavación de las alcantarillas, hasta el momento se encuentran 3 excavaciones terminadas para las alcantarillas diseñadas, se realiza la instalación de 15 metros de tubería de 36", el respectivo relleno y la fundición de un cabezal de salida.
*Se realizan las excavaciones para la instalación de tubería en las dos alcantarillas faltantes.
*Se instala la tubería de estas mismas, haciendo qué queden las 5 alcantarillado con tuberías.
*Se continúa con la fundición de las estructuras de salida, se tienen completas 3 alcantarillas completas.
*Se cuenta con 5 alcantarillas completas, y se están fundiendo las estructuras de entrada y salida de la 5 alcantarilla.
*Se realiza la construcción de la alcantarilla número 6 después de corroborar qué en el balance si se cuenta con el recurso y la disponibilidad para su construcción.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se adelantan actividades en la 6 alcantarilla, como fundición de cabezal de entrada


ADRIANA ORTIZ MENESES	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar balance con el fin de determinar si alcanza para la 6ta alcantarilla en el proyecto

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS

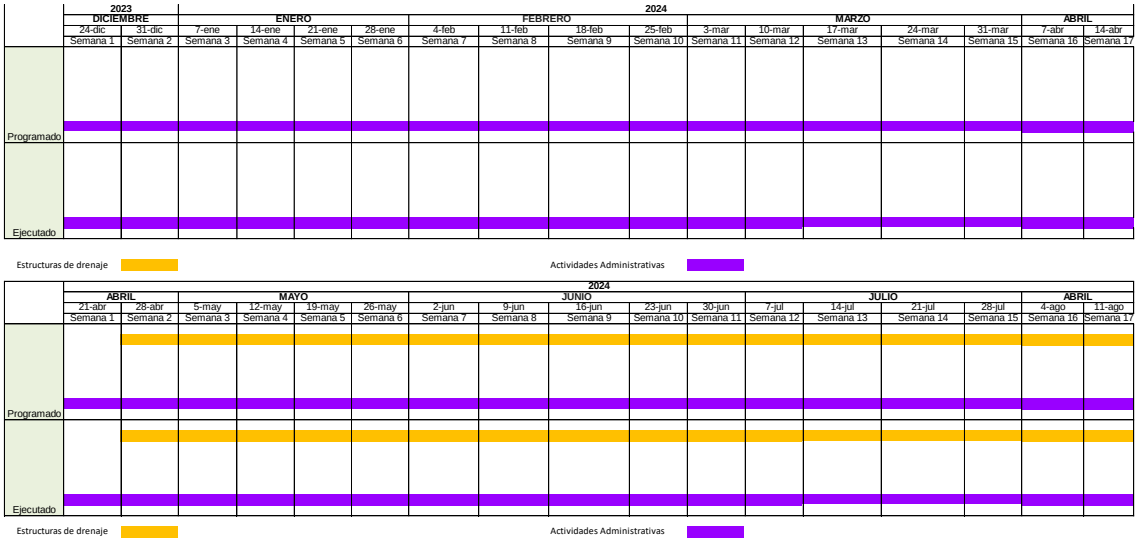

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLA TERMINADA



ACTIVIDAD DE ENTREGA DE OBRA



ENTREGA DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Revisar las hojas de vida para la ejecución del proyecto.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo
*Se realiza comité operativo con el fin de empezar a comprar material para la ejecución de la obra.
*Se empieza a realizar la revisión de documentos entregados, plan de compras, balance, solicitud de vinculación de cuentas y órdenes de giro a proveedores para empezar con el acopio de material.
*Se aprueban y se realizan giros de acuerdo al plan de compras 1 aprobado en el comité operativo 1.
*Se solicita al Ing. residente de obra entregar cronograma de obra ajustado.
*Se realiza la inspección verificando las medidas realizadas en campo.
*Se solicita al contratista un balance de cantidades con el fin de establecer meta física del proyecto.
*En conjunto con la OAC y su residente de obra la interventoría empieza a realizar la revisión del balance con el fin de determinar qué obras adicionales se pueden lograr con el recurso disponible del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES

Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

- Informe Semanal 35 - 20240816 – 20240822

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4
	FECHA	26/8/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 35 (Numeración consecutiva) del 16/8/2024 al 22/8/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 64m de placa huella, construcción de 5 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda La Honda en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL CUSCUE MUSE		
CONVENIO No.	CONVENIO 4833	VALOR INICIAL:	$ 201,513,019.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,513,019.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 - 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 - 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANRIQUE CAVIEDO		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL:	$ 106,719,389.00
FECHA DE INICIO:	4/1/2024	VALOR ADICIONES:	$ 22,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,513,019.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,513,019			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 123,860,201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (17,640,812)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,513,019.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189,704,356.09	94.14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 11,808,662.91	5.86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		94.14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11,808,662.91	5.86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,531,565.80	4.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,045,390.57	3.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha se cuenta con la instalación de la tubería para cinco alcantarillas, la estructura de salida y entrada de 5 alcantarillas, sin embargo se ha complicado, pues se encuentra mucha roca en el sitio de la excavación. Se encuentra con un porcentaje de ejecución programado de 76,24% y un ejecutado de 97%, generando un avance de 20,76% en la obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 123,860,201.00	95.28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123,860,201.00	95.28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,139,433.00	4.72%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.61
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 94.14%
Meta Física Ejecutada % 100.00%
Avance o Atraso Físico % 5.86%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	64			Prog	0			0	0.0%
						Ejec	0			0	0.00%
*	Alcantarillas	UND	5			Prog	6			6	100.0%
						Ejec	6			6	100.00%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda La Honda — Programado: 64 metros lineales de placa huella y construcción de 5 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: escuela la Honda

OBSERVACIONES:
Se realiza entrega final de obra contando con la participación de la comunidad, contador e interventoría, allí se dio a conocer un informe los gastos de obra realizados como también del proceso constructivo. Con ello la comunidad expresó su satisfacción frente a las obras entregadas

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

ADRIANA ORTIZ MENESES	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORÓ	APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 26 de febrero se reciben hojas de vida por parte del presidente de la junta, las cuales se realiza la revisión por parte de la interventoría.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
* Se encuentra personal de consultoría con el fin de realizar los estudios y diseños para el tramo a intervenir
* Se realiza comité operativo para escoger la mejor oferta de los proveedores del sector.
*Se inicia con el acarreo de materiales hasta el sitio de la obra, pues para llegar a este toca atravesar un puente peatonal qué es el único acceso a la vereda.
*El contratista entrega balance de obra ajustando los precios a los del mercado, se revisará por parte de la interventoría.
*Se continua con la excavación de las alcantarillas, hasta el momento se encuentran 3 excavaciones terminadas para las alcantarillas diseñadas, se realiza la instalación de 15 metros de tubería de 36", el respectivo relleno y la fundición de un cabezal de salida.
*Se realizan las excavaciones para la instalación de tubería en las dos alcantarillas faltantes.
*Se instala la tubería de estas mismas, haciendo qué queden las 5 alcantarillado con tuberías.
*Se continúa con la fundición de las estructuras de salida, se tienen completas 3 alcantarillas completas.
*Se cuenta con 5 alcantarillas completas, y se están fundiendo las estructuras de entrada y salida de la 5 alcantarilla.
*Se realiza la construcción de la alcantarilla número 6 después de corroborar qué en el balance si se cuenta con el recurso y la disponibilidad para su construcción.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se adelantan actividades en la 6 alcantarilla, como fundición de cabezal de entrada

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar balance con el fin de determinar si alcanza para la 6ta alcantarilla en el proyecto

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS

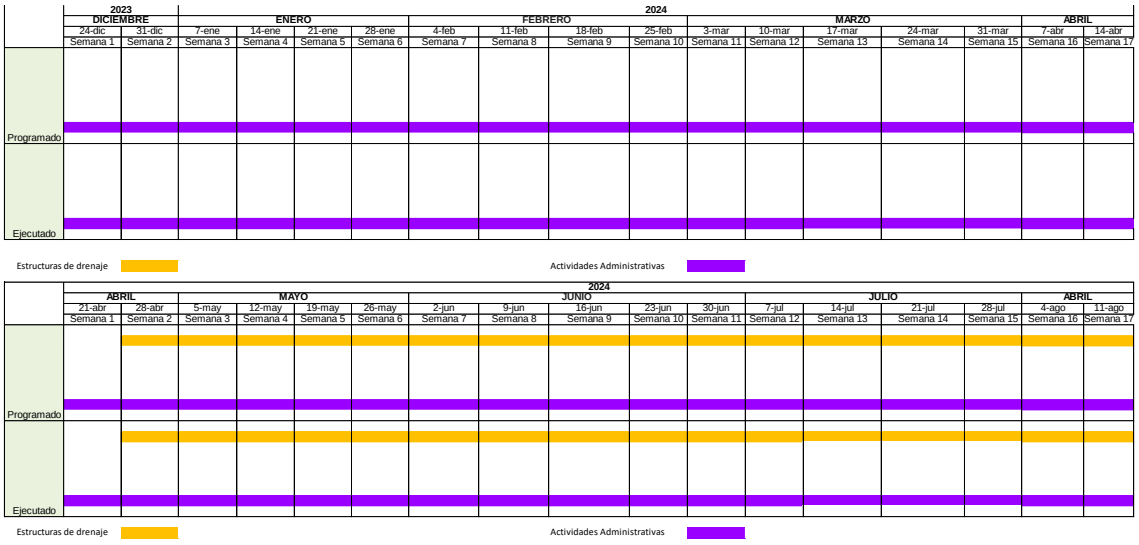

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLA TERMINADA



ACTIVIDAD DE ENTREGA DE OBRA



ENTREGA DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Revisar las hojas de vida para la ejecución del proyecto.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo
*Se realiza comité operativo con el fin de empezar a comprar material para la ejecución de la obra.
*Se empieza a realizar la revisión de documentos entregados, plan de compras, balance, solicitud de vinculación de cuentas y órdenes de giro a proveedores para empezar con el acopio de material.
*Se aprueban y se realizan giros de acuerdo al plan de compras 1 aprobado en el comité operativo 1.
*Se solicita al Ing. residente de obra entregar cronograma de obra ajustado.
*Se realiza la inspección verificando las medidas realizadas en campo.
*Se solicita al contratista un balance de cantidades con el fin de establecer meta física del proyecto.
*En conjunto con la OAC y su residente de obra la interventoría empieza a realizar la revisión del balance con el fin de determinar qué obras adicionales se pueden lograr con el recurso disponible del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

- Informe Semanal 36 - 20240823 - 20240829

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 2/9/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5005 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 36 del 23/8/2024 al 29/8/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 64m de placa huella, construcción de 5 alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía principal en la vereda La Honda en el municipio de Páez – Cauca, se construirá Placa Huella y alcantarillas de 36" tipo Invías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL CUSCUE MUSE		
CONVENIO No.	CONVENIO 4833	VALOR INICIAL:	$ 201,513,019.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,513,019.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA N°1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA N°2	1/05/2024 - 30/6/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA N°3	1/7/2024 31/7/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA N°4	1/8/2024 31/8/2024 (1 mes)		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MANUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5005-2023	VALOR INICIAL	$ 106,219,389.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 23,780,245.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,999,634.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA 1	01/1/2024 - 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA 2	01/05/2024 - 30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRÓRROGA 3	01/07/2024 - 31/07/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 4	01/08/2024 - 31/08/2024 (1 mes)		
PRÓRROGA 5	01/09/2024 - 30/09/2024 (1 mes)		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,513,019.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,513,019			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 106,219,389			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118,108,981			
	SALDO DE VIGENCIA	$ (11,889,592)			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201,513,019.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,513,019.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201,513,019.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11,808,662.91	5.86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones: A la fecha se cuenta con la instalación de la tubería para cinco alcantarillas, la estructura de salida y entrada de 5 alcantarillas, sin embargo se ha complicado, pues se encuentra mucha roca en el sitio de la excavación. Se encuentra con un porcentaje de ejecución programado de 76,24% y un ejecutado de 97%, generando un avance de 20,76% en la obra

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 118,108,981.00	90.85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,972,663.25	2.29%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 23,701,825.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico, Profesional ambiental, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra. Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de motocicletas 150CC, un campamento.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.59
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100.00%
Meta Física Ejecutada % 100.00%
Avance o Atraso Físico % 0.00%

	Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
*	Placa Huella	ML	64			Prog	0			0	0.0%
						Ejec	0			0	0.00%
*	Alcantarillas	UND	5			Prog	6			6	100.0%
						Ejec	6			6	100.00%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin Mecánico		
Trompo 2 sacos		
Volqueta 7 M3 (2 unidades)		
Retroexcavadora Rueda		
Rana mecánica		
Motoniveladora		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Vereda La Honda — Programado: 64 metros lineales de placa huella y construcción de 5 alcantarillas con tubería de 36´´en concreto reforzado.
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA

Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La JAC manifiesta qué se encuentra elaborando el documento.

*Mediante correo electrónico enviado el día 19 de julio, en envía la séptima solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 26 de junio, en envía la sexta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de mayo, en envía la quinta solicitud del documento PAGA
*Mediante correo electrónico enviado el día 6 de mayo, se envía la versión 2 (PAGA guía)
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de abril, en envía la cuarta solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo enviado el día 4 de abril, se envían los formatos MEPI, para radicar el documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 27 de marzo, en envía la tercera solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 18 de marzo, en envía la segunda solicitud del documento PAGA.
*Mediante correo electrónico enviado el día 13 de marzo, en envía la primera solicitud del documento PAGA.

OBSERVACIONES:
Con base en la última reunión con las subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS el día jueves 2 de mayo del 2024, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA , con base en la complejidad del proyecto, qué es catalogada cómo baja, mencionado lo anterior, se anexa dicha versión cómo guía, para la elaboración del documento.
Adiciona a esto, se anexan 3 formatos para el seguimiento de las actividades en obra cómo lo son:
Formato de registro fotográfico (fotos con fechador)
Listado de asistencia
Generación de residuos en obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: escuela la Honda

OBSERVACIONES:
Se realiza entrega final de obra contando con la participación de la comunidad, contador e interventoría, allí se dio a conocer un informe los gastos de obra realizados como también del proceso constructivo. Con ello la comunidad expresó su satisfacción frente a las obras entregadas

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 26 de febrero se reciben hojas de vida por parte del presidente de la junta, las cuales se realiza la revisión por parte de la interventoría.
*Se realiza la socialización del contrato. con la participación de la junta de acción comunal, comunidad e interventoría. entre los temas más relevantes se menciona: alcance aproximado del convenio, el corredor vial estipulado inicialmente en el contrato, el comité operativo de compras y la conformación del mismo, estudios previos, por último se conforma el comité de participación ciudadana.
* Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio
* Se encuentra personal de consultoría con el fin de realizar los estudios y diseños para el tramo a intervenir
* Se realiza comité operativo para escoger la mejor oferta de los proveedores del sector.
*Se inicia con el acarreo de materiales hasta el sitio de la obra, pues para llegar a este toca atravesar un puente peatonal qué es el único acceso a la vereda.
*El contratista entrega balance de obra ajustando los precios a los del mercado, se revisará por parte de la interventoría.
*Se continua con la excavación de las alcantarillas, hasta el momento se encuentran 3 excavaciones terminadas para las alcantarillas diseñadas, se realiza la instalación de 15 metros de tubería de 36", el respectivo relleno y la fundición de un cabezal de salida.
*Se realizan las excavaciones para la instalación de tubería en las dos alcantarillas faltantes.
*Se instala la tubería de estas mismas, haciendo qué queden las 5 alcantarillado con tuberías.
*Se continúa con la fundición de las estructuras de salida, se tienen completas 3 alcantarillas completas.
*Se cuenta con 5 alcantarillas completas, y se están fundiendo las estructuras de entrada y salida de la 5 alcantarilla.
*Se realiza la construcción de la alcantarilla número 6 después de corroborar qué en el balance si se cuenta con el recurso y la disponibilidad para su construcción.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se adelantan actividades en la 6 alcantarilla, como fundición de cabezal de entrada

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar balance con el fin de determinar si alcanza para la 6ta alcantarilla en el proyecto

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS





ADRIANA ORTIZ MENESES
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLA TERMINADA



ACTIVIDAD DE ENTREGA DE OBRA



ENTREGA DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA qué CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invías Cauca.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
* Revisión de la calidad de los materiales empleados.
* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales qué impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Revisar las hojas de vida para la ejecución del proyecto.
*Se realiza la socialización, dando a conocer a la comunidad el funcionamiento del convenio, se conforma el comité de participación ciudadana para conformar el último miembro del comité operativo
*Se realiza comité operativo con el fin de empezar a comprar material para la ejecución de la obra.
*Se empieza a realizar la revisión de documentos entregados, plan de compras, balance, solicitud de vinculación de cuentas y órdenes de giro a proveedores para empezar con el acopio de material.
*Se aprueban y se realizan giros de acuerdo al plan de compras 1 aprobado en el comité operativo 1.
*Se solicita al Ing. residente de obra entregar cronograma de obra ajustado.
*Se realiza la inspección verificando las medidas realizadas en campo.
*Se solicita al contratista un balance de cantidades con el fin de establecer meta física del proyecto.
*En conjunto con la OAC y su residente de obra la interventoría empieza a realizar la revisión del balance con el fin de determinar qué obras adicionales se pueden lograr con el recurso disponible del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA ORTIZ MENESES
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Invías - Gestión Pública con Calidad

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, no fue utilizada la maquinaria por lo cual no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 maquinaria y equipo cto obra para los municipios que se encuentran en ejecución.

4.2.1 INZÁ 4735 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4735-2023 **JAC:** VEREDA DE GUANACAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5005 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora			V. Guanacas																															
Vibrocompactador			V. Guanacas																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4412-2023 **JAC:** VEREDA DE VICANENGA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5005 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora			V. Vicanenga																														
Vibrocompactador			V. Vicanenga																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se registro maquinaria durante el mes.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4509-2023 **JAC:** VEREDA DE EL MIRADOR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5005 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora			V. El Mirador																														
Motoniveladora			V. El Mirador																														
Vibrocompactador			V. El Mirador																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4833-2023 **JAC:** VEREDA DE LA HONDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5005 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora			V. La Honda																														
Motoniveladora			V. La Honda																														
Vibrocompactador			V. La Honda																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se registro maquinaria durante el mes.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 personal control aportes leg y seg social obra para los convenios que se encuentran en ejecución.

4.3.1 INZÁ 4735 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4735-2023 **JAC:** VEREDA DE GUANACAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																																
2																																																			
3																																																			
4																																																			
5																																																			
6																																																			
7																																																			
8																																																			
9																																																			
10																																																			
N																																																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma No aplica
Nombre:
RL. Junta accion comunal de Vicanenga
Matricula Profesional No.: n/a

Firma No aplica
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

4.3.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4412-2023 **JAC:** VEREDA DE VICANENGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAPA DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIVER REINALDO APIO	1062089462	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
2	DUBER ARLEY INSECA	1062085749	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
3	JAIRO ALBERTO PERDOMO	1081396574	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
4	JEMES NORBEY PERSOMO	1062090070	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
5	JOSE SEBASTIAN PERDOMO	4726645	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	#¿NOMBRE?	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
6	YIMI ALEXANDER QUILCUE	1062092670	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
7	MARIN MAURICIO RAMOS	10307347	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	NUEVA EPS	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
8	JAIRO BED RIVERA	1061221089	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
9	ELISAURO QUILCUE PENCUE	76007916	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
10	BRAYAN STEVEN ALARCON	1108332153	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
11	YOAN ESTEBAN PERDOMO	1002980464	ayudante obra	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	JUNTA DE ACCION		$ 90,500	V	AIC	1066000452	$ 52,000	PORVENIR	1066000452	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
No.																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
NO ENVIARON PLANILLA

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Mary Luz Quiscue P.

Firma
Nombre: MARY LUZ QUISCUE PERDOMO
RL. Junta accion comunal de Vicanenga
Matrícula Profesional No.: n/a

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.3.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4509-2023 **JAC:** VEREDA DE EL MIRADOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CHACUE VELASCO SANTIAGO	1062082333	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X								JUNTA EL MIRADOR		$ 57,400	V	AIC		$ 103,000	PORVENIR		$ 131,800	$ 33,000	$ -	$ -	
2	PACHONGO PEDREROS LUIS	1062082010	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X								JUNTA EL MIRADOR		$ 62,700	V	AIC		$ 112,600	PORVENIR		$ 144,200	$ 36,100	$ -	$ -	
3	PAYA PENNA REINEL	4726338	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X						JUNTA EL MIRADOR		$ 68,800	V	NUEVA EPS		$ 123,500	PORVENIR		$ 158,000	$ 39,500	$ -	$ -	
4	PEDROZO ZAMBRANO JOSE	1004506515	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X					JUNTA EL MIRADOR		$ 68,801	V	AIC		$ 123,500	PORVENIR		$ 158,000	$ 39,500	$ -	$ -	
5	PEREZ PERDOMO ADRIAN	1062074288	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X					JUNTA EL MIRADOR		$ 68,802	V	AIC		$ 123,500	PORVENIR		$ 158,000	$ 39,500	$ -	$ -	
6	PEREZ PERDOMO MAURICIO	1084577692	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X					JUNTA EL MIRADOR		$ 68,803	V	AIC		$ 123,500	PORVENIR		$ 158,000	$ 39,500	$ -	$ -	
7	VERJAN RODRIGUEZ FERNANDO	14010650	AYUDANTE	$ 1,300,000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X					JUNTA EL MIRADOR		$ 68,804	V	AIC		$ 123,500	PORVENIR		$ 158,000	$ 39,500	$ -	$ -	
No.																																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

INGRESARON EN EL MES DE JULIO

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Yeiner Arbey Astudillo P.
Nombre: YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.3.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4833-2023 **JAC:** VEREDA DE LA HONDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 inf fin y presupuestal obra, donde se diligencia los planes de carga que han sido revisados y aprobados:

4.4.1 INZÁ 4735 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4735-2023 **JAC:** VEREDA DE GUANACAS

MES INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 201,255,011.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Plan de compra	jun-24	$ 47,677,500.00		$ 47,677,500	$ -	$ 47,677,500	$ -	-	-	$ 153,577,511				
2	Plan de compra	jun-24	$ 1,150,000.00		$ 1,150,000	$ -	$ 1,150,000	$ -	-	-	$ 152,427,511				
3	Plan de compra	jul-24	$ 1,679,950		$ 1,679,950		$ 1,679,950				$ 150,747,561				
4	Plan de compra	ago-24	$ 10,444,400		$ 10,444,400		$ 10,444,400				$ 140,303,161				
TOTALES			**$ 60,951,850**	**$ -**	**$ 60,951,850**	**$ -**	**$ 60,951,850**	**0**	**-**	**-**	**$ 140,303,161**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: AMILCAR GERARDO ARIAS ORTEGA
Presidente de JAC
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4412-2023 **JAC:** VEREDA DE VICANENGA

MES INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199,459,927.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Plan de compra	abr-24	$ 15,734,720		$ 15,734,720	$ -	$ 15,734,720	$ -	-	-	$ 183,725,207				
2	Plan de compra	abr-24	$ 9,422,200		$ 9,422,200	$ -	$ 9,422,200	$ -	-	-	$ 174,303,007				
3	Plan de compra	may-24	$ 40,569,538		$ 40,569,538		$ 40,569,538				$ 133,733,469				
5	Plan de compra	jul-24	$ 5,222,200		$ 5,222,200		$ 5,222,200				$ 128,511,269				
6	Plan de compra	jul-24	$ 30,587,140		$ 30,587,140		$ 30,587,140				$ 97,924,129				
7	Plan de compra	jul-24	$ 3,396,600		$ 3,396,600		$ 3,396,600				$ 94,527,529				
8	Plan de compra	jul-24	$ 8,471,600		$ 8,471,600		$ 8,471,600				$ 86,055,929				
9	Plan de compra	jul-24	$ 4,074,000		$ 4,074,000		$ 4,074,000				$ 81,981,929				
10	Plan de compra	ago-24	$ 20,630,255		$ 20,630,255		$ 20,630,255				$ 61,351,674				
TOTALES			**$ 138,108,253**	**$ -**	**$ 138,108,253**	**$ -**	**$ 138,108,253**	**$ -**	**-**	**-**	**$ 61,351,674**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARY LUZ QUISCUE PERDOMO
Presidente de JAC
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 5/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4509-2023 **JAC:** VEREDA DE EL MIRADOR

MES INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199,041,993.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Plan de compra	abr-24	$ 3,851,262		$ 3,851,262	$ -	$ 3,851,262	$ -	-	-	$ 195,190,731				
2	Plan de compra	may-24	$ 84,710,620		$ 84,710,620		$ 84,710,620		-	-	$ 110,480,111				
3	Plan de compra	ago-24	$ 19,494,346		$ 19,494,346		$ 19,494,346		-	-	$ 90,985,765				
4	Plan de compra	ago-24	$ 19,538,916		$ 19,538,916		$ 19,538,916		-	-	$ 71,446,849				
TOTALES			**$ 127,595,144**	**$ -**	**$ 127,595,144**	**$ -**	**$ 127,595,144**	**$ -**	**-**	**-**	**$ 71,446,849**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO
Presidente de JAC
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4833-2023 **JAC:** VEREDA DE LA HONDA

MES INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 201,513,019.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Plan de compra	mar-24	$ 42,080,000		$ 42,080,000	$ -	$ 42,080,000	$ -	-	-	$ 159,433,019				
2	Plan de compra	mar-24	$ 40,259,997		$ 82,339,997	$ -	$ 82,339,997	$ -	-	-	$ 119,173,022				
3	Plan de compra	abr-24	$ 15,933,800		$ 98,273,797	$ -	$ 98,273,797	$ -	-	-	$ 103,239,222				
4	Plan de compra	abr-24	$ 15,630,700		$ 113,904,497	$ -	$ 113,904,497	$ -	-	-	$ 87,608,522				
5	Plan de compra	may-24	$ 5,993,200		$ 119,897,697		$ 119,897,697				$ 81,615,322				
6	Plan de compra	may-24	$ 14,878,870		$ 134,776,567		$ 134,776,567				$ 66,736,452				
7	Plan de compra	jun-24	$ 28,350,905		$ 163,127,472		$ 163,127,472				$ 1,428,253				
8	Plan de compra	jul-24	$ 11,279,738		$ 174,407,210		$ 174,407,210				$ 1,428,253				
9	Plan de compra	ago-24	$ 4,912,246		$ 179,319,456		$ 179,319,456				$ 1,428,253				
10	Plan de compra	ago-24	$ 20,765,310		$ 200,084,766		$ 200,084,766				$ 1,428,253				
TOTALES			**$ 200,084,766**	**$ -**	**$ 200,084,766**	**$ -**	**$ 200,084,766**	**$ -**	**-**	**-**	**$ 1,428,253**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RAFAEL CUSCUE MUSE
Presidente de JAC
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 estado general del tiempo para los convenios.

4.5.1 INZÁ 4735 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4735-2023 **JAC:** VEREDA DE GUANACAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco				X					X	X							X	X	X		X		X				X	X				10
Lluvias moderadas	X	X	X					X			X	X				X				X		X				X			X	X		12
Lluvias intensas					X	X	X						X	X	X									X	X						X	9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: AMILCAR GERARDO ARIAS ORTEGA
Presidente de JAC

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SANJUAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-240625 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4412-2023 **JAC:** VEREDA DE VICANENGA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X									X	X					X				X	X		X	X					X	X	11
Lluvias moderadas			X	X		X	X			X			X		X	X		X	X				X			X			X			13
Lluvias intensas					X			X	X					X						X								X	X			7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma: Mary luz Quiscue P
Nombre: MARY LUZ QUISCUE PERDOMO
Presidente de JAC

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SANJUAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-240625 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4509-2023 **JAC:** VEREDA DE EL MIRADOR

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco						X	X		X	X				X	X	X				X					X	X						10
Lluvias moderadas	X	X		X				X			X		X				X	X	X		X			X			X		X	X		14
Lluvias intensas			X		X							X										X	X					X			X	7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Yeiner Arbey Astudillo P.
Nombre: YEINER ARBEY ASTUDILLO PACHONGO
Presidente de JAC

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SANJUAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-240625 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4833-2023 **JAC:** VEREDA DE LA HONDA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X		X									X	X	X			X						X	X			X	X				10
Lluvias moderadas		X		X				X			X				X	X		X			X	X			X	X			X			12
Lluvias intensas					X	X	X		X	X									X	X										X	X	9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Rafael Cuscue Muse
Nombre: RAFAEL CUSCUE MUSE
Presidente de JAC

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SANJUAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-240625 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, una vez alguno de los convenios a cargo de esta interventoría realice la entrega de los resultados de ensayos de laboratorio se diligenciará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 de INVÍAS con los ensayos realizados y los resultados obtenidos.

4.6.1 INZÁ 4735 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4735-2023 **JAC:** VEREDA DE GUANACAS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma No aplica
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4412-2023 **JAC:** VEREDA DE VICANENGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma No aplica
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4509-2023 **JAC:** VEREDA DE EL MIRADOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma No aplica
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4833-2023 **JAC:** VEREDA DE LA HONDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma No aplica
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No aplica
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

4.7.1 INZÁ 4735 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 29 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4735-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUANACAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE GUANACAS, DEL MUNICIPIO DE INZÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.255.011,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.255.011,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.251.004,00	30 / 11 / 2023	31/10/2024
prestaciones sociales	5%	$ 10.062.751,00	30 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.376.506,00	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026280

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005598 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 29 (DÍA) | 8 (MES) | 2024 (AÑO)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.251.004,00	30 / 12 / 2023	2/03/2025
prestaciones sociales	5%	$ 10.062.751,00	30 / 12 / 2023	30 / 4 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.376.506,00	30 / 4 / 2024	30 / 4 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026280

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Se fijará certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30 / 11 / 2023	30 / 4 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005598 OTRAS PÓLIZAS No. .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Se fijará certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No 2 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.251.004,00	30 / 12 / 2023	30/04/2025
prestaciones sociales	5%	$ 10.062.751,00	30 / 12 / 2023	30 / 6 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.376.506,00	30 / 4 / 2024	30 / 6 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026280

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Se fijará certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No 2 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30 / 11 / 2023	30 / 6 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005598 OTRAS PÓLIZAS No. .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Se fijará certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 29 (día) | 8 (mes) | 2024 (año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.281.004,00	30 / 8 / 2024	31/05/2025
prestaciones sociales	5%	$ 10.062.751,00	30 / 8 / 2024	31 / 7 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.376.506,00	30 / 7 / 2024	30 / 7 / 2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.: CCS-100026280

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Se debe anexar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30 / 11 / 2023	31 / 7 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: CCS-100005598 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Se debe anexar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.281.004,00	31 / 7 / 2024	30/06/2025
prestaciones sociales	5%	$ 10.062.751,00	31 / 7 / 2024	31 / 8 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.376.506,00	31 / 8 / 2024	31 / 8 / 2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.: CCS-100026280

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Se debe anexar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30 / 11 / 2023	31 / 8 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: CCS-100005598 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Se debe anexar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el instituto.
2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros.

Firma:
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19252-227456 CAU
Copia: Gerente Regional de Gerencia de Gestión del INVIAS
Copia: Interventor y Director Territorial

4.7.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4412-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VICANENGA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VICANENGA, DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/23

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.459.927,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.459.927,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.289.440,00	22 / 11 / 2023	31/102024
prestaciones sociales	5%	$ 10.072.360,00	22 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.434.160,00	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025884

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 21/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	16 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005441 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 21/12/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRORROGA No** 1 **MODIFICACION No.:** _____ **SUSPENSION No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 39.891.986,00	29 / 12 / 2023	2/03/25
prestaciones sociales	5%	$ 9.972.996,50	29 / 12 / 2023	30 / 4 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.837.979,00	30 / 4 / 2024	30 / 4 / 2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025719

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 22/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRORROGA No** 1 **MODIFICACION No.:** _____ **SUSPENSION No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	16 / 11 / 2023	30 / 4 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005441 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 22/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRORROGA No** 2 **MODIFICACION No.:** _____ **SUSPENSION No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 39.891.986,00	30 / 4 / 2024	30/04/25
prestaciones sociales	5%	$ 9.972.996,50	30 / 4 / 2024	30 / 6 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.837.979,00	30 / 6 / 2024	30 / 6 / 2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025719

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRORROGA No** 2 **MODIFICACION No.:** _____ **SUSPENSION No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	16 / 11 / 2023	30 / 6 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005441 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 28/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRORROGA No** 3 **MODIFICACION No.:** ..... **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 39.891.986,00	30 / 6 / 2024	31/05/25
prestaciones sociales	5%	$ 9.972.996,50	30 / 6 / 2024	31 / 7 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.837.979,00	31 / 7 / 2024	31 / 7 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025719

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 30/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRORROGA No** 3 **MODIFICACION No.:** ..... **SUSPENSION No.:** .....

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	16 / 11 / 2023	31 / 7 / 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005441 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Auto de Aprobación 30/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202227456 CAU
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4509-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MIRADOR

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.041.993,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.041.993,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.808.400,00	20 11 2023 (Día Mes Año)	31/10/2024
prestaciones sociales	5%	$ 9.952.100,00	20 11 2023 (Día Mes Año)	31 12 2026 (Día Mes Año)
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.712.600,00	31 12 2023 (Día Mes Año)	31 12 2028 (Día Mes Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025786

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20 11 2023 (Día Mes Año)	31 12 2023 (Día Mes Año)
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
						2/03/2025		
Cumplimiento	20%	$ 39.808.400,00	30	12	2023			
			Día	Mes	Año			
prestaciones sociales	5%	$ 9.952.100,00	30	12	2023	30	4	2027
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.712.600,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025786

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005458 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
						30/04/2025		
Cumplimiento	20%	$ 39.808.400,00	30	4	2024			
			Día	Mes	Año			
prestaciones sociales	5%	$ 9.952.100,00	30	4	2024	30	6	2027
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.712.600,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025786

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	11	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005458 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento	20%	$ 39.808.400,00	30	6	2024	31/05/2025		
prestaciones sociales	5%	$ 9.952.100,00	30	6	2024	31	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.712.600,00	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025786

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	11	2023	31	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005458 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento	20%	$ 39.808.400,00	31	7	2024	30/06/2025		
prestaciones sociales	5%	$ 9.952.100,00	31	7	2024	31	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.712.600,00	31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025786

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	11	2023	31	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005458 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma _____
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-227458 CAU
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4833-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA, DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/23

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.513.019,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.513.019,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 40.302.604,00	12 / 12 / 2023	31/10/24
prestaciones sociales	5%	$ 10.075.651,00	12 / 12 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.453.906,00	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026444

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/23

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	12 / 12 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005638 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/23

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRORROGA No 1 MODIFICACION No.: _____ SUSPENSION No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.302.604,00	28	12	2023	2/03/25		
			Día	Mes	Año			
prestaciones sociales	5%	$ 10.075.651,00	28	12	2023	30	4	2027
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.453.906,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026444

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/04/24

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRORROGA No 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	12	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005638 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/04/24

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.302.604,00	30	4	2024	30/04/25		
			Día	Mes	Año			
prestaciones sociales	5%	$ 10.075.651,00	30	4	2024	30	6	2027
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.453.906,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026444

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/24

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	12	12	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005638 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/24

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRORROGA No** 3 **MODIFICACION No.:** _____ **SUSPENSION No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.302.604,00	30	6	2024	31/05/25		
			Día	Mes	Año			
prestaciones sociales	5%	$ 10.075.651,00	30	6	2024	31	7	2027
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.453.906,00	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026444

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/07/24

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRORROGA No** 3 **MODIFICACION No.:** _____ **SUSPENSION No.:** _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	12	12	2023	31	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005638 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/07/24

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202227456 CAU
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.8.1 INZÁ 4735 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4735-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC: VEREDA DE GUANACAS

FECHA DE INICIO: 22/12/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO --X-- APROBADO: SI ------ N --X-- VERSIÓN No. - FECHA DE VERSIÓN: -

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ----X- APROBADO: SI ------ NO -----X FECHA DE APROBACIÓN: -

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	-	
IG2: Índice de gestión 2 =	-	
IG3: Índice de gestión 3 =	-	
IG4: Índice de gestión 4 =	-	
IG5: Índice de gestión 5 =	-	
IGn: Índice de gestión n =	-	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.2 PÁEZ 4412 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4412-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC: VEREDA DE VICANENGA

FECHA DE INICIO: 22/12/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ----- NO --X-- APROBADO: SI ----- N --X-- VERSIÓN No. - FECHA DE VERSIÓN: -

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO --------X----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----- NO ----X- APROBADO: SI ----- NO -----X FECHA DE APROBACIÓN: -

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ----- NO -----

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	-	
IG2: Índice de gestión 2 =	-	
IG3: Índice de gestión 3 =	-	
IG4: Índice de gestión 4 =	-	
IG5: Índice de gestión 5 =	-	
IGn: Índice de gestión n =	-	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.3 PÁEZ 4509 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4509-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

JAC: VEREDA DE EL MIRADOR

FECHA DE INICIO: 22/12/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ----- NO --X-- APROBADO: SI ----- N --X-- VERSIÓN No. - FECHA DE VERSIÓN: -

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO --------X----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----- NO ----X- APROBADO: SI ----- NO -----X FECHA DE APROBACIÓN: -

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ----- NO -----

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	-	
IG2: Índice de gestión 2 =	-	
IG3: Índice de gestión 3 =	-	
IG4: Índice de gestión 4 =	-	
IG5: Índice de gestión 5 =	-	
IGn: Índice de gestión n =	-	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.4 PÁEZ 4833 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4833-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

JAC: VEREDA DE LA HONDA

FECHA DE INICIO: 22/12/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5005-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ----- NO --X-- APROBADO: SI ----- N --X-- VERSIÓN No. - FECHA DE VERSIÓN: -

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO --------X----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----- NO ----X- APROBADO: SI ----- NO -----X FECHA DE APROBACIÓN: -

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **0** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ----- NO -----

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	-	
IG2: Índice de gestión 2 =	-	
IG3: Índice de gestión 3 =	-	
IG4: Índice de gestión 4 =	-	
IG5: Índice de gestión 5 =	-	
IGn: Índice de gestión n =	-	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

A la fecha del presente informe no se ha suministrado la programación de las obras asociadas.

4.9.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Así mismo, durante el periodo del presente informe no se ha suministrado el programa de inversión de las obras asociadas.

4.9.3 INZÁ 4735 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. 9 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No. 4735-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE GUANACAS DEL MUNICIPIO DE INZA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


JAC: VEREDA DE GUANACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 201.255.011,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 201.255.011,00

PLAZO ACUMULADO: 9,47 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P $ P $ E % E										
GPP2				% P $ P $ E % E										
GPP3				% P $ P $ E % E										
GPP4				% P $ P $ E % E										
GPP5				% P $ P $ E % E										
GPP6				% P $ P $ E % E										
GPP7				% P $ P $ E % E										
GPP8				% P $ P $ E % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P $ P $ E % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

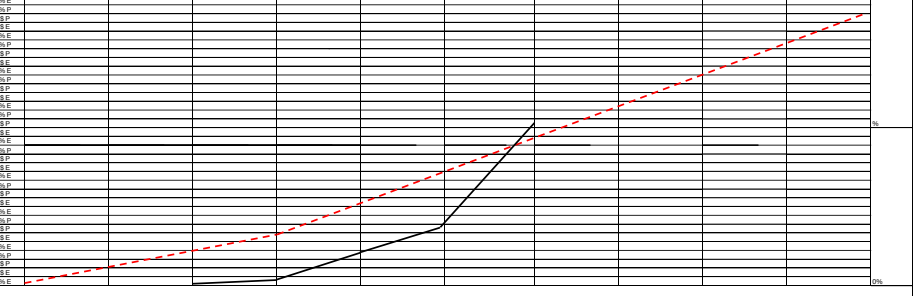

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

0,48%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4 PÁEZ 4412 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPIMN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** - **DE** - (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No. 4412-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE VICANENGA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


JAC: VEREDA DE VICANENGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,459,927.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 199,459,927.00

PLAZO ACUMULADO: 9.43 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

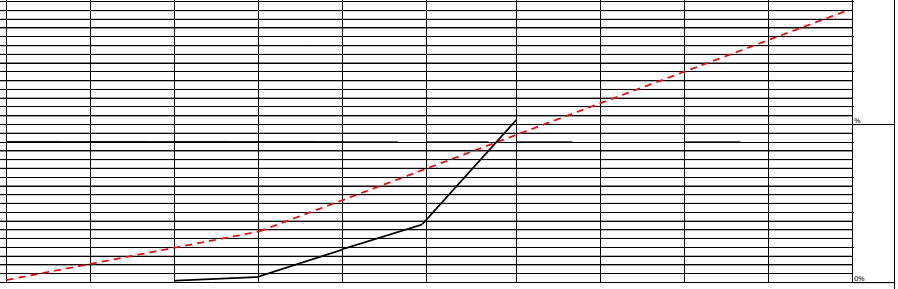

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.5 PÁEZ 4509 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** - **DE** - (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No. 4509-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


JAC: VEREDA DE EL MIRADOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,041,993.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 199,041,993.00

PLAZO ACUMULADO: 9.43 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

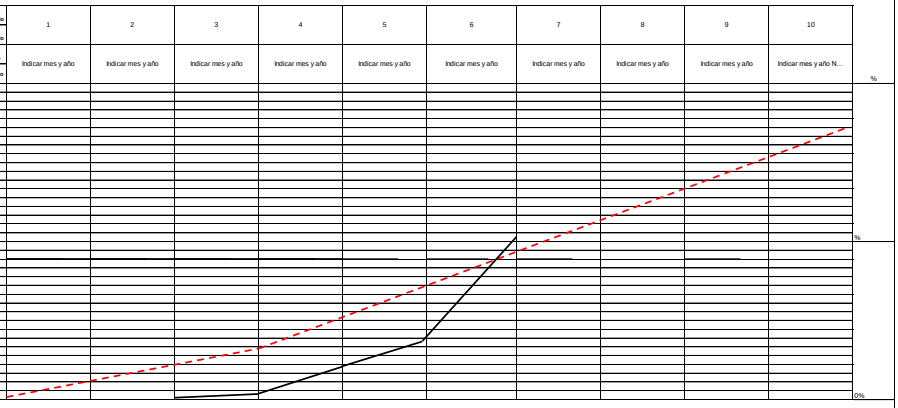

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

4.9.6 PÁEZ 4833 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPIMN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** - **DE** - (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 9 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONVENIO No. 4833-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

JAC: VEREDA DE LA HONDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 PAEZ 4833
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 201,513,019.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 201,513,019.00

PLAZO ACUMULADO: 9.47 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

%

%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: NO APLICA
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.7 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.8 ACTAS DE REUNIÓN

Durante este periodo, se desarrollan reuniones con las juntas de acción comunal asociados a los convenios:

4.9.8.1 PÁEZ 4833 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-M01-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09-05-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4833-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HONDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5005-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNION
Socialización de entrega de Obra

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
Se da inicio a la socialización de entrega de obra lle: ada acabo en la -scuela de la vereda la Honda del Municipio de Páez. contando co la paiticipacia de l piesident de la JAC, cantadaa y miembios de la comunidad ademas peiso. al de Jeiventoiia
- Oiden del dia
- Saludo y palabas del iesidente de la JAC
- Palabas de Inteiventoiia
- Socalizacion del alcance del conveniO, informe contable del conveniO
- Pieguntas e ingaetudes
- Desaiiollo de la ieunión.

Toma la palabia el gobeinadoi del iesguaido agiadece la piesencia y la gestion del iesidente de la JAC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09-08-24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-Se realiza la presentación de la interventoria se socializa el alcance final del convenio, la Construcción de 6 alcantarilla dos disipadores
- Se presenta la contadora y realiza la entrega de información en la parte contable de gastos y costos. Se informa a la comunidad todo el alcance ejecutado.
Se da a conocer cada gasto que se obtuvo en el Proceso constructivo como Materiales, transportes, alquiler de Maquinaria, nominas, gastos administrativos y bancarios generados pa el manejo de la cuenta bancaria de la JAC
-

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-PI-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09-08-24 (Día / Mes / Año)

Nombre del Participante	Cargo	Entidad	Firma
Rubiela Yisnel Tiriwbo E		1081395903	Rubiela Yisnel Tiriwbo E
Bertilda Achipiz		36150109	Bertilda A
Rafael Achipiz		1081397003	
Edwin Lorez A		1081414357	Edwin Lorez
Geldardo Ramirez		1115911417	Geldardo Ramirez
Hernán David Nigrinis		1062074096	
Gabriel Adolfo		1061227035	Gabriel
Vanessa Alexandra Mosquera		1004433325	Vanessa Mosquera
Elsa Midreth Cachumbe		1081421728	Elsa Midreth Ca
Yuna Pada T.	Concejal	55150633	
Yulieth Andrea Triana	Dinam. salud	[illegible]	Yulieth Triana
Alexander Gugi		1081396566	Alexander G.
Zulma Patricia V		1081403163	Zulma P
Olma N Muñoz		1081397870	Olma N.
NEIDER JEBAMITO		1081414785	
Ulmer Achipiz		76006882	Ulmer Achipiz
Dayier Abey		1007209308	
FLORENTINO YOJO		12282111	Florentino
Nancy Yenny		55131528	Nancy Yenny A
Leidy Mendez		1081418937	Leidy Mendez
Rosa María Cairas		25582262	Rosa Maria C

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-06-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09-08-24 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Daniel Moreno	R.L Interventoria	C. Intevias Cauca	
Leidy Noguera	Contador	JAC	
Claudia Patricia Cuellar	Docente	Vereda La Honda	Claudia Patricia Cuellar.
Sandra Milena Guaraca	Tesorera	Vereda la Honda	Sandra Guaraca
Maidy Yaneth M.		Vereda la Honda	Maidy Yaneth M.
Judy Marcela N.		Vereda la Honda	Marcela N. P.
Francined Achipis		Vereda la Honda	Francined Achipis
Floresmiro Cuesca		Vereda la Honda	F. C
Rodolfo Arcila		Vereda la Honda	R. A.
Luz Davy Gutierrez		Vereda La Honda	LUZ D G
Maria Edith Ditimbo		vereda la Honda	Maria Edith Ditimbo
Isidro Ditimbo		vereda la Honda	Isidro Ditimbo
Pablo Casanova		vereda la Honda	Pablo Casanova
Florinda muse		vereda la Honda	Florinda muse
Ana Isabel		Vereda La Honda	Ana Isabel
Luis Alfredo		vereda la Honda	Luis Alfredo Bravo
Faiber Vez Hoshicon		Vereda la Honda	Faiber Vez Hoshicon
Luz hermila Yogue		Vereda la Honda	Luz hermila Yogue
Edilberto Tome Tiven		La Honda	Edilberto Tome
Patrocinio [illegible]		la Honda	Patrocinio [illegible]
Bertulfo Gutierrez		la Honda	Bertulfo Gutierrez
Adonay [illegible]		La Honda	
Anibal Botina		La Honda	Anibal B.
María Elsa Ramos	comite Conciliador	La Honda	María Elsa Ramos

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09-08-24 (Día / Mes / Año)

Nombre Participante	Cargo	Entidad	Firma
Luz Clara Bardo V.		55.130.737	Luz clara P.
Florentina Ñiquinas		52249089 Bta	Florentina N.
Rodrigo Atiximbo		76007739	Rodrigo Atiximbo
olga Gtierrez		36383286	olga Gtierrez
Mari Luceina R		55730967	M. Luceina R
Alvaro Gamboa		5956389	Alvaro Gamboa
Saul Medina		4916487	Saul Medina
Maira Delgado	Prof. Social	Interventoria	Maira A D.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista. Interventor y Dirección Territorial

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	ING. DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA Representante Legal
No. del Contrato de Interventoría	5005 DE 2023
Objeto del Contrato de Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Contrato de Interventoría	$ 106,219,389.00
Fecha suscripción Contrato	16 de diciembre de 2023
Fecha Orden de Inicio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de diciembre De 2023
Prorroga 1	01/01/2024 – 30/04/2024
Prorroga 2	01/05/2024 – 30/06/2024
Prorroga 3	01/07/2024 – 31/07/2024
Prorroga 4	01/08/2024 – 31/08/2024
Prorroga 5	01/09/2024 – 30/09/2024
Fecha de terminación vigente	30 de septiembre de 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los documentos requeridos, además:

- Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Ítems contractuales.
- Revisión de la calidad de los materiales empleados.
- Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
- Revisión del cronograma programado para llevar trazabilidad de la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, no se realizaron informes de especialistas.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo, se hizo uso de vehículos para el desplazamiento de las actividades. De manera que, se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGO/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5005 - 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4735-2023, 4412-2023, 4509-2023, 4833-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VICANENGA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	AGO/2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta CVV96F	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Motocicleta AZH24E	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Motocicleta XBG34D	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)																															

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456CAU

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para este periodo, se presenta el control de aportes legales y seguridad social, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 - 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGO/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4735-2023, 4412-2023, 4509-2023, 4833-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE YICANENGA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

NOMBRE ARL: Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: Confacauca

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	AGO/2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ADRIANA ORTIZ MENESES	1.061.728.189	Director de Interventoría	$ 765,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 765,000	$ 53,244	V	Nueva E.P.S	31116508	$ 30,600	Porvenir	31116508	$ 122,400	$ 30,600	$ -	$ -	
2	ANDRES FELIPE ASTUDILLO SANJUAN	1.061.715.655	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,170,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	70%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 2,170,000	$ 151,032	V	Sanitas	31116508	$ 86,800	Porvenir	31116508	$ 347,200	$ 86,800	$ -	$ -	
3	HEINER JOHAN GUTIERREZ DIAZ	1.082.873.347	Profesional ambiental	$ 480,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	16%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 480,000	$ 33,408	V	Nueva E.P.S	31116508	$ 19,200	Porvenir	31116508	$ 76,800	$ 19,200	$ -	$ -	
4	MAIRA ALEXANDRA DELGADO	1.061.720.761	Profesional social	$ 450,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	15%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 450,000	$ 31,320	V	Sanitas	31116508	$ 18,000	Porvenir	31116508	$ 72,000	$ 18,000	$ -	$ -	
5	ANDRES FELIPE VALENCIA MEDINA	1.143.879.537	Inspector	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 1,300,000	$ 90,480	V	Sanitas	31116508	$ 52,000	Porvenir	31116508	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
7	ENNA ROCIO ESTELA ORDOÑEZ	1.061.783.243	Inspector SST	$ 1,079,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	83%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 1,079,000	$ 75,098	V	Sanitas	31116508	$ 43,160	Colpensiones	31116508	$ 172,640	$ 43,160	$ -	$ -	
8				$ -		0%		$ -	$ -				$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
7				$ -		0%		$ -	$ -				$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
8				$ -		0%		$ -	$ -				$ -		0	$ -	$ -	$ -	$ -	
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 6,244,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920227456CAU

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio, la oferta económica adjudicada es:

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
	(2)	**(3)**	**(4)**	((2)+(3))(4) = **(5)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	$5,100,000.00		1.00	$5,100,000.00
Ingeniero Residente de Interventoría	$3,100,000.00		3.00	$9,300,000.00
Profesional Ambiental	$3,000,000.00		0.45	$1,350,000.00
Profesional Social	$3,000,000.00		0.45	$1,350,000.00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los siguientes especialistas)				$4,678,598.00
Especialista en Pavimentos y/o vias	$5,000,000.00			
Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$5,000,000.00			
Especialista en Estructuras	$5,000,000.00			
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$5,000,000.00			
Especialista en Diseño Geométrico	$5,000,000.00			
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	$1,300,000.00		6.00	$7,800,000.00
Inspector SST	$1,300,000.00		3.00	$3,900,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				**$33,478,598.00**
FACTOR MULTIPLICADOR (6)				**2.36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(5) (6) = (A)				**$79,009,491.00**

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
		(7)	**(8)**	(7)(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS	-	-	-	-
VIÁTICOS				
Viaticos Director y/oEspecialistas	Dia	$80,000.00	10.00	$800,000.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	$350,000.00	12.00	$4,200,000.00
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	Según comprobante por mes	$1,800,000.00	2.00	$3,600,000.00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$250,000.00	3.00	$750,000.00

Oficina/Campamento (incluyedotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$100,000.00	3.00	$300,000.00
OTROS COSTOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$150,000.00	2.00	$300,000.00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$50,000.00	3.00	$150,000.00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$45,000.00	3.00	$135,000.00
Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$38,500.00	3.00	$115,500.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$ 10,250,500.00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 89,259,991.00**
IVA = 19% (C) = (E)				**$16,959,398.00**
COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$106,219,389.00**

Para este periodo, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT, con el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría.

CONSORCIO INTEVIALES CAUCA Cra 18N # 7-30 Popayan Cauca	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 9** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	 Fecha de realización: Septiembre 10 de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES INFORME MENSUAL: AGO/2024 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No:	**CONTRATISTA:**
4735-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUANACAS
4412-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VICANENGA
4509-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR
4833-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HONDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1398823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 106,219,389.00	$ 1,061
2024	714224	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIÓN N°1	$ 23,780,245.00	$ -
							$ -
							$ -
TOTAL						**$ 129,999,634.00**	**$ 1,061.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 129,999,634**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 106,219,389	**$ 106,219,389**	-	-
2	ENE/24	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 106,219,389	$ 106,219,389	-	-
3	FEB/24	$ 10,447,580.00	$ 1,985,040.00	**$ 12,432,620.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 93,786,769	$ 93,786,769	-	-
4	MAR/24	$ 9,465,670.00	$ 1,798,477.00	**$ 11,264,147.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 82,522,622	$ 82,522,622	-	-
5	ABR/24	$ 20,636,750.00	$ 3,920,982.00	**$ 24,557,732.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 57,964,890	$ 57,964,890	-	-
6	MAY/24	$ 18,607,700.00	$ 3,535,463.00	**$ 22,143,163.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 35,821,727	$ 35,821,727	-	-
7	JUN/24	$ 19,917,500.00	$ 3,784,325.00	**$ 23,701,825.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2024	$ 12,119,902	$ 12,119,902	-	-
8	JUL/24	$ 10,183,900.00	$ 1,934,941.00	**$ 12,118,841.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023	$ 1,061	$ 23,781,306	-	-
8	AGO/24	$ 15,899,790.00	$ 3,020,960.00	**$ 18,920,750.00**	$ -	$ -	$ -	1398823; 19/12/2023 y 714224; 5/08/2024	$ 4,860,556	$ 4,860,556	-	-
9		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
10		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
11		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
12		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
13		$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -				-	-
TOTALES		**$ 105,158,890.00**	**$ 19,980,188.00**	**$ 125,139,078.00**	$ -	$ -	$ -		**$ 4,860,556.00**	**$ 4,860,556.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 98,574,840	$ 18,729,219	$ 117,304,059
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6,584,050	$ 1,250,969	$ 7,835,019
VALOR TOTAL	$ 105,158,890	$ 19,980,188	**$ 125,139,078**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ADRIANA ORTIZ MENESES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202227456CAU

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como parte de los compromisos de esta Interventoría se relaciona el seguimiento de las garantías del contrato mismo:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAMINOS RURALES 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ E INZÁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 106.219.389,00

VALOR ACUMULADO: $ 129.999.634,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.621.938,90	16 12 2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31.865.816,70	16 12 2023	31 12 2026
Calidad del servicio	30%	$ 31.865.816,70	16 12 2023	16 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055936

Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.621.938,90	16 12 2023	30/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31.865.816,70	16 12 2023	30 4 2027
Calidad del servicio	30%	$ 31.865.816,70	16 12 2023	30 4 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055936

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.621.938,90	16	12	2023	31/12/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31.865.816,70	16	12	2023	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31.865.816,70	16	12	2023	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055936

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.621.938,90	16	12	2023	31/01/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31.865.816,70	16	12	2023	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31.865.816,70	16	7	2023	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055936

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 12.999.963,40	16	12	2023	2/03/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 38.999.890,20	16	12	2023	1	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 38.999.890,20	31	7	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055936

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/08/2029

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MANUNGA GAVIRIA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matrícula Profesional No. 19202-429638 CAU

Firma
Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, no se cuenta con este documento.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5005-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE INZÁ Y PAÉZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONVENIOS NO. 4735-2023; 4412-2023; 4509-2023; 4833-2023 (Indicar número y año)

JAC: VEREDA DE GUACANAS; VEREDA DE VICANENGA; VEREDA DE MIRADOR; VEREDA DE HONDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO __X__ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____X_____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____X_____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO __X__ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

ADRIANA ORTIZ MENESES DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	-	
IG2: Índice de gestión 2 =	-	
IG3: Índice de gestión 3 =	-	
IG4: Índice de gestión 4 =	-	
IG5: Índice de gestión 5 =	-	
IGn: Índice de gestión n =	-	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma NO APLICA	Firma NO APLICA	Firma NO APLICA
Nombre: Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.:	Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:	Nombre: Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes de agosto, se han realizado avances significativos en la conformación de subbases, fundición de concreto ciclópeo y construcción de huellas en los diferentes convenios. Esto demuestra un manejo eficiente de la maquinaria y los recursos disponibles, lo que es fundamental para cumplir con los cronogramas establecidos.
- En el convenio PÁEZ 4412 se identificó un problema con el proveedor de cemento, lo que resalta la importancia de mantener una comunicación constante y efectiva con los proveedores para garantizar que los materiales cumplan con los estándares necesarios. Esta situación requiere atención para evitar retrasos en la ejecución de las obras.
- La implementación de la nueva guía ambiental y la gestión de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental (PGA) evidencia un compromiso con la sostenibilidad y la correcta gestión ambiental de los proyectos. La identificación de que los proyectos tienen una complejidad baja permite una adecuada gestión y optimización de recursos, pero es crucial cumplir con los requisitos establecidos para evitar problemas futuros.
- Las actividades de socialización con la comunidad han demostrado ser efectivas, promoviendo la transparencia en la gestión de recursos y la satisfacción de los beneficiarios. La entrega de la obra en el convenio PÁEZ 4833 se realizó de manera exitosa, con una buena recepción por parte de la comunidad, lo que indica que se han establecido lazos de confianza entre los ejecutores del proyecto y los beneficiarios.
- Se está trabajando en la definición de las fechas de entrega y actividades de cierre para los convenios próximos a finalizar, lo que es esencial para asegurar una transición adecuada y la satisfacción de la comunidad. La planificación anticipada es clave para evitar contratiempos en la finalización de las obras.
- La realización de encuestas de satisfacción y la presentación de informes de gastos a la comunidad son prácticas que fomentan la transparencia y la confianza en la gestión. La implicación activa de la comunidad en estos procesos refuerza el sentido de pertenencia y participación en el desarrollo de sus infraestructuras.
- Se recomienda establecer un sistema de monitoreo de proveedores para asegurar que los materiales utilizados cumplan con los estándares requeridos; mantener canales de comunicación abiertos con la comunidad y los proveedores para abordar cualquier inconveniente de manera oportuna e implementar evaluaciones periódicas del avance y calidad de las obras para detectar y corregir desviaciones a tiempo.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

FECHA	OBJETO	MEDIO
30/08/2024	Aval Prórroga No. 4 Convenio Solidario No. 4509 de 2023 – Junta de Acción Comunal de la vereda el mirador del municipio de Páez (Belalcázar)	CORREO ELECTRONICO
30/08/2024	Aval Prórroga No. 4 Convenio Solidario No.4735 de 2023 – Junta de Acción Comunal Vereda Guanacas del municipio de Inzá.	CORREO ELECTRONICO
30/08/2024	SOLICITUD DE PRORROGA No 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5005 de 2023	CORREO ELECTRONICO
