INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
Período: 01 de Agosto al 31 Agosto de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATO NO. 4834 DE 2023

CONTRATISTA
G.V LTDA
Rep. legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual
E-mail: gelvanltda@outlook.com
Dirección: Calle 3 -10-04

SUPERVISOR
JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
E-mail: jceballos@invias.gov.co
Dirección: Cra 15 -7-18

Urumita, Agosto 2024

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	INFORME DE INTERVENTORIA No 9
JAC: VEREDA DE POTRERILLO- VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA -VEREDA REGION LAGUNA DEL PILAR.	GV LTDA	
CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3463 de 2023 No 3940 de 2023 No 3631 de 2023	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4834 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

Convenio Solidario No. 3463- 2023; 3940- 2023; 3631- 2023

Contratista: JAC de la Vereda Potrerillo; JAC de la Vereda Dudas Aguas Arriba; JAC de la Vereda Región Laguna del Pilar

Contrato de Interventoría No. 4834- 2023

Interventoría: G.V. LTDA

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Potrerillo del Municipio de Urumita, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Dudas Aguas Arriba del Municipio de Urumita, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Región Laguna del Pilar del Municipio de Urumita, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

INFORME MENSUAL No. 09 **MES O PERIODO:** Agoto 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		10
2.1	**Localización**		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		14
3.0	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		18
3.1	**Información general del contrato**		18
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		21
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		22
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		23
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	23
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	23
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	23
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23

4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		23
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		24
4.9	Otros documentos seguimiento mensual			24
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1		24
		MEPI-MN-IN-2-FR-2		24
	• Seguimiento Programa de Obra			24
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1		24
		MEPI-MN-IN-6-FR-2		24
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1		25
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2		25
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA**			27
5.1	Información general del contrato			27
5.2	Descripción de las actividades Realizadas por el Interventor			28
5.3	Informe Especialista y profesionales			28
5.4	Informe del programa Anual de Caja -PAC			28
5.6	Informe Matriz de Riesgos			29
	- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			29
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		29
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		29
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		30
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		31
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		31
6.6	Otros documentos seguimiento mensual			31
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1		31
		MEPI-MN-IN-3-FR-1		31
	. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		31
	• Seguimiento al plan de Carga	MEPI-MN-IN-9-FR-3		31
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**			31
8	**Anexos**			32
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo			32
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras			34
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			34
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			34

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

JHON CEBALLOS VEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0024 del 30 de enero de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría.
Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MER-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 3463-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

PLAZO INICIAL: 0,60
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 8,50

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.067.741,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.067.741,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4834-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	236
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	2,8	224,20
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	136.377.072,00		136.377.072,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.103.318,00		4.103.318,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.587.351,00		49.587.351,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.067.741,00		191.067.741,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	136.377.072,00		136.377.072,00	136.377.072,00
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.103.318,00		4.103.318,00	4.103.318,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.587.351,00		49.587.351,00	49.587.351,00
VALOR EJECUTADO	190.067.741,00	0,00	190.067.741,00	190.067.741,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 136.377.072,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 136.377.072,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO






PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 3631-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAPÍA

PLAZO INICIAL: 0,40
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 8,30

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 210.517.958,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 210.517.958,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4834-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JHON JAIRO CEBALLOS VEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	186
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	16,91	178,56
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	138.298.119,47		138.298.119,47
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.675.178,00		4.675.178,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.544.660,53		66.544.660,53
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	210.517.958,00		210.517.958,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	137.969.435,12			116.872.750,00
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.675.178,00			500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.544.660,53			33.737.762,00
VALOR EJECUTADO	209.189.273,65	0,00	209.189.273,65	151.110.512,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 137.969.435,12
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 137.969.435,12
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO






PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 3940-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

PLAZO INICIAL: 0,63
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 8,50

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 188.438.369,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 188.438.369,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4834-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JHON JAIRO CEBALLOS VEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	150
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	30,5	149,205
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	136.551.900,00		136.551.900,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.628.821,00		4.628.821,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.260.729,24		46.260.729,24
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	188.441.450,24		188.441.450,24

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	136.551.900,00		136.551.900,00	136.551.900,00
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.628.821,00		4.628.821,00	4.628.821,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.260.729,24		46.260.729,24	46.260.729,24
VALOR EJECUTADO	187.441.450,24	0,00	187.441.450,24	187.441.450,24

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 136.551.900,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 136.551.900,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO






PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN. 9

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 10

2.1. Localización. 10

2.1.1. Localización de los Convenios. 11

2.1.2. Localización del Campamento y fuentes de materiales. 12

2.2. Municipios en la Zona de Influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado. 12

2.3. Inventario y estado inicial de las vías. 12

2.3.1. Convenio 3463 de 2023. 12

2.3.2. Convenio 3940 de 2023. 13

2.3.3. Convenio No. 3631 de 2023. 13

2.4. Características Técnicas del Proyecto. 14

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 15

3.1. Información general del convenio. 15

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 18

3.3. Seguimiento a ítems no previstos. 18

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 18

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO. 19

4.1. Informe semanal. 19

4.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario. 20

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 21

4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 23

4.5. Estado general del tiempo. 24

4.6. Resumen ensayos de laboratorio. 25

4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 26

4.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra. 27

4.9. Otros documentos seguimiento mensual. 27

4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. 27

4.9.2. Seguimiento programa de obra. 27

4.9.3. Seguimiento programa de inversiones. 28

4.9.4. Actas de comité de obra. 28

4.9.5. Actas de reunión. 28

4.9.6. Comité Operativo. 29

4.9.6.1. Convenio No. 3463 de 2023. 29

4.9.6.2. Convenio No. 3940 de 2023. 29

4.9.6.3. Convenio No. 3631 de 2023. 30

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 31

5.1. Información del contrato. 31

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 32

5.2.1. Informe de especialistas. 32

5.3. Informe del programa anual de caja – PAC. 32

5.4. Informe matriz de riesgos. 32

5.5. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría. 32

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 32

6.1. Equipo contrato de interventoría. 32

6.2. Personal contrato de interventoría. 33

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 34

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría. 35

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 36

8. ANEXOS. 36

8.1. Anexo de correspondencia enviada y recibida. 36

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras. 37

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas. 37

8.4. Bitácora de obra. 37

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento contiene el informe mensual de interventoría No. 9 a los convenios 3463 de 2023, 3631 de 2023 y 3940 de 2023 suscrito entre las OAC vereda Potrerillo, vereda Dudas Aguas Arriba y Región Laguna del Pilar y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y corresponde a las actividades ejecutadas por la interventoría mediante contrato No. 4834 de 2023 con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024.

- Convenio Solidario No. 3463 de 2023 y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 3940 DE 2023 y cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 3631 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA REGION LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias del INVIAS de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna y su contenido es acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública - Versión adoptado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS mediante Resolución 319 del 26 de enero de 2022. A continuación, se presenta informe mensual de las actividades de control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental efectuados por la interventoría a los Convenios solidarios durante el mes de agosto de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto hace parte del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual ha sido estructurado con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, a través de la celebración de convenios solidarios, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Urumita, La Guajira.
Fuente: Anexo Tecnico

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3463 de 2023 suscrito con la OAC de la Vereda Potrerillo del municipio de Urumita, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $190.067.847,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

2.1. Localización.

Los convenios objeto de la interventoría No. 4834 de 2023, se encuentran localizados en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira, tal como se describe a continuación.



Mapa 2 Municipio de Urumita, la Guajira
Fuente: Especificaciones Técnicas

2.1.1. Localización de los Convenios.

2.1.1.1. Corredor a Intervenir del convenio No 3463 de 2023.

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Urumita del departamento de La Guajira, en la vereda de POTRERILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en el municipio de Urumita, se toma la vía La Sierrita – Potrerillo (sentido hacia la Sierra), se localiza el punto de referencia inicial, el PR Km0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR 2+600 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	10°33'8.26"N	73°0'12.89"O
FINAL	10°32'52.70"N	72°58'56.98"O

Tabla 1 Ubicación Geográfica, vereda de Potrerillo
Fuente: Documentos Técnicos

2.1.1.2. Corredor a Intervenir del convenio No 3940 de 2023.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Urumita del departamento de La Guajira, en la vereda de DUDAS AGUAS ARRIBA, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Urumita, se toma la vía La Sierrita – Potrerillo (sentido hacia la Sierra), avanzando 3.5 Km sobre la misma vía de la Sierrita Potrerillo, se localiza el punto de referencia inicial, el PR Km0+00 m. conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	10°32'41.42"N	72°58'44.61"O
FINAL	10°31'55.33"N	72°58'32.43"O

Tabla 2: Ubicación Geográfica, vereda Dudas Aguas Arriba
Fuente: Documentos Técnicos

2.1.1.3. Corredor a Intervenir del convenio No 3631 de 2023.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Urumita del departamento de La Guajira, en la vereda de LAGUNA DEL PILAR, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Urumita, se toma hacia la vía a Valledupar, en el Km 12 + 00m, se encuentra el acceso hacia la región de los Agustines, en dirección al Rio Cesar, se localiza el punto de referencia inicial, el PR Km0+00 m, a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	10°32'41.42"N	72°58'44.61"O
FINAL	10°31'55.33"N	72°58'32.43"O

Tabla 3: Ubicación Geográfica, vereda Región Laguna del Pilar
Fuente: Documentos Técnicos

2.1.2. Localización del Campamento y fuentes de materiales.

2.1.2.1. Convenio No 3463 de 2023.

El campamento por parte de la JAC está ubicado en Potrerillo, cercano a la obra y la fuente de Materiales es CALIZAS Y MARMOLES DE MANAURE S.A.S CALYMAN – NIT. 900.465.320-2**.**

2.1.2.2. Convenio No 3940 de 2023

El campamento por parte de la JAC está ubicado en Dudas Aguas Arriba, cercano a la obra y la fuente de Materiales es CALIZAS Y MARMOLES DE MANAURE S.A.S CALYMAN – NIT. 900.465.320-2**.**

2.1.2.3. Convenio No 3631 de 2023

El campamento por parte de la JAC está ubicado en la Vereda Región Laguna del Pilar, cercano a la obra y la fuente de Materiales es CALIZAS Y MARMOLES DE MANAURE S.A.S CALYMAN – NIT. 900.465.320-2**.**

2.2. Municipios en la Zona de Influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

El municipio cuenta en general con una malla que accede a la cabecera Municipal del departamento de la guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o áreas circundante, incluso en condiciones climáticas adversas como las lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsitos contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el transporte de sus residentes y visitantes; Así mismo se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenajes.

2.3. Inventario y estado inicial de las vías.

2.3.1. Convenio 3463 de 2023.

La vía actual del corredor presenta una vía con placa huella continua, pero, presenta algunos tramos donde el ancho de la calzada es de 2.70m y no cuenta con cunetas, a raíz de la necesidad de dicho elemento de drenaje, se han presentado erosiones laterales en dichos tramos. Lo que obligó a realizar este proyecto partiendo de la necesidad de la comunidad, complementar el ancho de los puntos críticos del corredor, para mitigar en gran medida las erosiones laterales de la placa huella de 2.70m



Foto 1 Estado Inicial
Fuente: Acta de Visita Tecnica INVIAS



Foto 2 Estado Inicial
Fuente: Acta de Visita Tecnica INVIAS

2.3.2. Convenio 3940 de 2023.

Las intervenciones sobre la Vereda Dudas Aguas Arriba corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (155 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.



Foto 3 Estado Inicial
Fuente: Acta de Visita Tecnica INVIAS



Foto 4 Estado Inicial
Fuente: Acta de Visita Tecnica INVIAS

2.3.3. Convenio No. 3631 de 2023.

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Vereda Región Laguna del Pilar del municipio de Urumita corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (184 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS**).**



Foto 5 Estado Inicial
Fuente: Acta de Visita Tecnica INVIAS



Foto 6 Estado Inicial
Fuente: Acta de Visita Tecnica INVIAS

2.4. Características Técnicas del Proyecto.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	URUMITA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA	2,00	0	0	155	0	0	0	0	0

Tabla 4: Características Técnicas del Convenio 3940 de 2023

Fuente: Balance presupuestal

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	URUMITA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERILLO	2,00	0	0	0	0	0	0	0	236

Tabla 5: Características Técnicas del Convenio 3463 de 2023

Fuente: Balance presupuestal

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	URUMITA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REGIÓN LAGUNA DEL PILAR	2,00	0	0	186	0	0	0	0	0

Tabla 6: Características Técnicas del Convenio 3631 de 2023

Fuente: Balance presupuestal

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

3.1. Información general del convenio.

Convenio No.	3463	**FECHA**	21/09/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Vereda Potrerillo						**NIT**	901.624.317-6
Rep. Legal	Elías Rafael Ramos Barros						**CC**	5.174.445
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Vereda Potrerillo del municipio de Urumita, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	John Jairo Ceballos Vega							
Plazo Inicial	18 días		**Acta de Inicio**	14/12/2023			**Valor Inicial**	191.067.741
Plazo Adicional	7.97 meses		**Fecha Finalización**	31/12/2023			**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	8.57 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**	20/01/2024			**Valor Total**	191.067.741
Tiempo Transcurrido	8.07 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**	30/04/2024			**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2	30/06/2024				
			Fecha finalización según prorroga 3	31/07/2024				
			Fecha finalización según prorroga 4	15/09/2024				

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**
	1	29/12/2023		1	17/0172024

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 7: Información general del convenio
Fuente: Convenio solidario No. 3463 de 2023

Convenio No.	3940	**FECHA**	17/10/2023		**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Vereda Dudas Aguas Arriba							**NIT**	901.724.636-1
Rep. Legal	Ángel Enrique Bello Raudales.							**CC**	5.174.836
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dudas Aguas Arriba del municipio Urumita, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.								
Interventoría	GV LTDA								
Supervisión	John Jairo Ceballos Vega								
Plazo Inicial	19 días		**Acta de Inicio**			15/12/2023		**Valor Inicial**	188.438.369
Plazo Adicional	7.97 meses		**Fecha Finalización**			31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	8.53 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**			20/0172024		**Valor Total**	188.438.369
Tiempo Transcurrido	8.03 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**			30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2			30/06/2024			
			Fecha finalización según prorroga 3			31/07/2024			
			Fecha finalización según prorroga 4			15/09/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 8: Información general del convenio
Fuente: Convenio solidario No. 3940 de 2023

Convenio No.	3940	**FECHA**	17/10/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Juntas de Acción Comunal Vereda Región Laguna del Pilar del Municipio de Urumita						**NIT**	901.605.821-6
Rep. Legal	Laureano Tomas Duran Pinto						**CC**	1.119.816.567
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Vereda Región laguna del pilar del municipio Urumita, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	John Jairo Ceballos Vega							
Plazo Inicial	18 días		**Acta de Inicio**		14/12/2023		**Valor Inicial**	209.517.958
Plazo Adicional	7.97 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	8.57 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	209.517.958
Tiempo Transcurrido	8.07 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			
			Fecha finalización según prorroga 3		31/07/2024			
			Fecha finalización según prorroga 4		15/09/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 9: Información general del convenio
Fuente: Convenio solidario No. 3631 de 2023

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Para el periodo que abarca el presente informe, se finaliza con la ejecución de obras de los convenios objeto de la presente interventoría, tal como se describe a continuación:

- *Convenio No. 3463 de 2023*

En el periodo que abarca el presente informe, la JAC de la Vereda de Potrerillo, se realizaron actividades de encofrado y vaciado de concreto para la construcción de los bordillos faltantes en el proyecto, a la fecha se alcanzó un avance del 95% con respecto a la meta física establecida.

- *Convenio No. 3631 de 2023*

En el periodo que abarca el presente informe, la JAC de la Vereda de Laguna del armado de parrillas en sitio para módulos de cunetas, excavaciones manuales para conformación de cunetas, vaciado de concreto clase d para cunetas, viga riostra y bordillos, a la fecha se alcanzó un avance del 96% con respecto a la meta física establecida.

- *Convenio No. 3940 de 2023*

En el periodo que abarca el presente informe, la JAC de la Vereda de Dudas Aguas Arriba, se realizaron actividades de vaciado de concreto clase D para losas de cunetas, retransporte de material hasta los puntos de trabajo del proyecto, armado de parrillas de cunetas en sitio, se realiza vaciado de concreto para bordillos, a la fecha se alcanzó un avance del 99.47% con respecto a la meta física establecida.

3.3. Seguimiento a ítems no previstos.

A la fecha (31 de agosto de 2024) el convenio solidario No. 3463 de 2023, 3631 de 2023 y 3940 de 2023 no han ejecutado ítems no previstos.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

A la fecha (31 de agosto de 2024) las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron al seguimiento de actividades en obra, aprobación de pagos, explicación a los presidentes de cada convenio, la necesidad de allegar todas las facturas y/o cuentas de cobro de cada uno de los pagos realizados, conforme a las exigencias del Instituto Nacional de Vías.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO.

4.1. Informe semanal

Durante este periodo se realizaron los siguientes informes semanales en cada uno de los convenios:

- Semana 19 del periodo comprendido del 02 al 08 de agosto de 2024
- Semana 20 del periodo comprendido del 09 al 15 de agosto de 2024
- Semana 21 del periodo comprendido del 16 al 22 de agosto de 2024
- Semana 22 del periodo comprendido del 23 al 29 de agosto de 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 19 del 2/08/2024 al 8/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 150 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA		
INTEGRANTES:	ANGEL ENRIQUE BELLO RAUDALES Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3940-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 188.438.369
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 184.575.082
	SALDO DE VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 3.863.287
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.207.506
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.657.959

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.035.532,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.035.532,00	100,0%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.035.532,00	100,0%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,0%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 49.539.550,24	26,3%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.575.082,24	97,9%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.575.082,24	97,9%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,0%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.464.395,00	3,43%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.250.000,00	3,8%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.207.506,50	95,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.207.506,50	95,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 75%
Meta Física Ejecutada %: 94,7%
Avance o Atraso Físico %: 20%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	150			Prog	112,02			112,02	74,7%
					Ejec	142,09			142,1	94,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador Manual	1	
Mezcladora de concreto	1	1
Cizalla manaual de 90 cm	1	
Compresor	1	
Camioneta D -300	1	
Vibrador	1	
Aspersor manual	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S - Manauere Cesar	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El convenio no requiere Programa de adaptación a la guia ambiental, sino un PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, el cual se encuentra aprobado en su etapa inicial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizan excavaciones manuales y conformación de cunetas
Se realizaron actividades de vaciado de concreto clase d para losas de cunetas
Se realizaron actividades de retransporte de material hasta los puntos de trabajo del proyecto
Se realiza armado de parrilas de cunetas en sitio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de excavación, cofnrimación de cuneta, armado de acero y fundida de concreto para cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

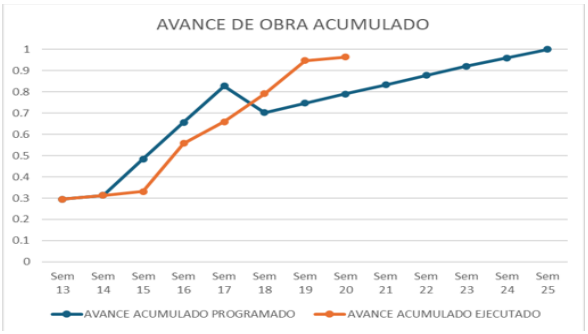

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 19 del 2/08/2024 al 9/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 186 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR		
INTEGRANTES:	LAUREANO TOMAS DURAN PINTO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3631-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 210.517.958,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 210.517.958,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 210.517.958	$ 210.517.958
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 205.356.180
	SALDO DE VIGENCIA			$ 210.517.958	$ 5.161.778
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.162.347
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.703.118

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.052.888,12	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.052.888,12	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136.052.888,12	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 69.303.291,53	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.748.647,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.327.965,00	5,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.162.346,52	95,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.162.346,52	95,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 85% Avance o Atraso Físico %: 2%
Meta Física Ejecutada %: 87,77%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	186			Prog	158,94			158,94	85,45%
					Ejec	163,25			163,25	87,77%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA MAJO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizan excavaciones manuales y conformación de cunetas
Se realizaron actividades de funidida de concreto para cunetas y vigas riostras
Se realiza armado de parrilas de cunetas en sitio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continar con las actividades de fundida de concreto

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

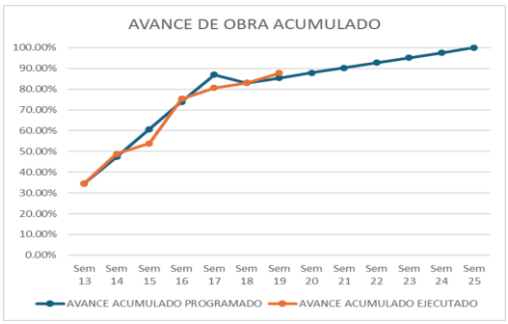

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 19 del 2/08/2024 al 9/08/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 236 ml de cuneta

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	ELIAS RAFAEL RAMOS BARROS Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3463-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 191.067.741,00	**CONTRATO No.**	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.067.741,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 191.067.741	$ 191.067.741
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 124.168.694
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.067.741	$ 66.899.047
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.162.347
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.703.118

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.729.072,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 126.421.429,00	93,1%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 124.168.693,77	91,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.252.735,23)	-1,7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		0,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.168.693,77	65,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.168.693,77	65,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.464.395,00	3,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.250.000,00	3,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.162.346,52	95,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.162.346,52	95,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 93,14%
Meta Física Ejecutada %: 91,48%
Avance o Atraso Físico %: -2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Gbl	1		
* CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	ML	236		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,00			1,00	100,0%
Ejec	1,00			1,00	100,0%
Prog	219,81			219,81	93,1%
Ejec	215,89			215,89	91,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	MANAURE, CESAR	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizaron actividades, debido a que la JAC no ha encontrado formaletas para los bordillos que tienen de altura 25cm.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar actividades de vaciado de concreto para bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

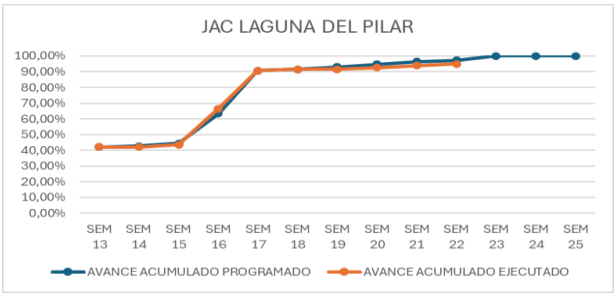

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 20 del 9/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 150 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA		
INTEGRANTES:	ANGEL ENRIQUE BELLO RAUDALES Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3940-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 188.438.369
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 184.575.082
	SALDO DE VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 3.863.287
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.478.466
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.386.999

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.035.532,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.035.532,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.035.532,00	100,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 49.539.550,24	26,3%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.575.082,24	97,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.575.082,24	97,9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.464.395,00	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.250.000,00	3,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.478.466,39	95,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.478.466,39	95,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79%
Meta Física Ejecutada %: 96,4%
Avance o Atraso Físico %: 17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	150			Prog	118,55			118,545	79,0%
					Ejec	144,60			144,6	96,4%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador Manual	1	
Mezcladora de concreto	1	1
Cizalla manaual de 90 cm	1	
Compresor	1	
Camioneta D -300	1	
Vibrador	1	
Aspersor manual	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S - Manauere Cesar	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El convenio no requiere Programa de adaptación a la guia ambiental, sino un PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, el cual se encuentra aprobado en su etapa inicial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizan excavaciones manuales y conformación de cunetas
Se realizaron actividades de vaciado de concreto clase d para losas de cunetas
Se realizaron actividades de retransporte de material hasta los puntos de trabajo del proyecto
Se realiza armado de parrilas de cunetas en sitio.
Se realiza vaciado de concreto para bordillos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de fundida de concreto para cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

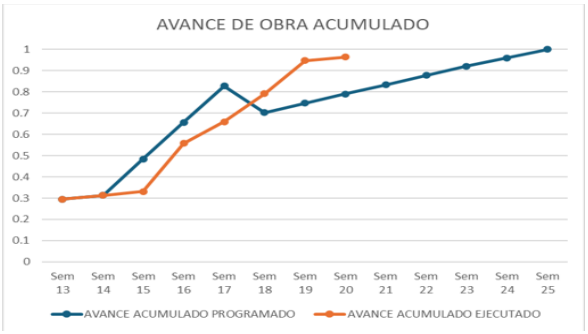

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 20 del 9/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 186 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR		
INTEGRANTES:	LAUREANO TOMAS DURAN PINTO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3631-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 210.517.958,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 210.517.958,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 210.517.958	$ 210.517.958
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 205.356.180
	SALDO DE VIGENCIA			$ 210.517.958	$ 5.161.778
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.478.466
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.386.999

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.052.888,12	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.052.888,12	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136.052.888,12	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 69.303.291,53	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.748.647,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.327.965,00	5,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.478.466,39	95,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.478.466,39	95,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 88%
Meta Física Ejecutada %: 92,00%
Avance o Atraso Físico %: 4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	186			Prog	163,46			163,46	87,88%
					Ejec	171,12			171,12	92,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CANTERA MAJO	PERMISO MINERO:	SI	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finalizan actividades de vaciado de concreto clase D para cunetas y viga riostra
Se realizaron actividades de fundida de concreto clase d para bordillos
se realiza actividades limpieza de vía en el tramo terminado con bordillos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continar con las actividades de fundida de concreto

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

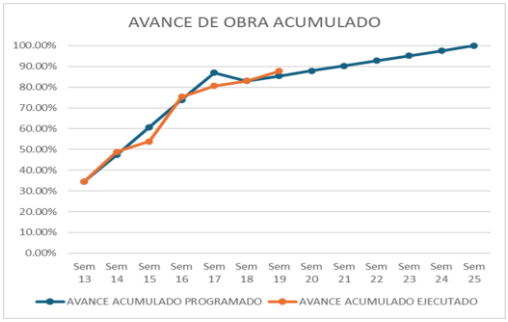

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 20 del 9/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 236 ml de cuneta

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO		
INTEGRANTES:	ELIAS RAFAEL RAMOS BARROS Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3463-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 191.067.741,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.067.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 191.067.741	$ 191.067.741
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 125.760.002
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.067.741	$ 65.307.739
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.478.466
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.386.999

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.729.072,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128.674.164,00	94,8%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 125.760.001,98	92,7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.914.162,02)	-2,1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.674.164,00	67,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 125.760.001,98	65,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.914.162,02)	-2,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.252.735,00	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.591.308,21	0,8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.478.466,39	95,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.478.466,39	95,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 95% Avance o Atraso Físico %: 2%
Meta Física Ejecutada %: 96,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	ML	236			Prog	223,78			223,78	94,8%
					Ejec	228,02			228,02	96,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	MANAURE, CESAR	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El día 13 de agosto, se llevaron las formaletas para bordillos a obra.
Se realizó vaciado de concreto clase D para bordillos en el tramo 2 del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de vaciado de concreto para bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

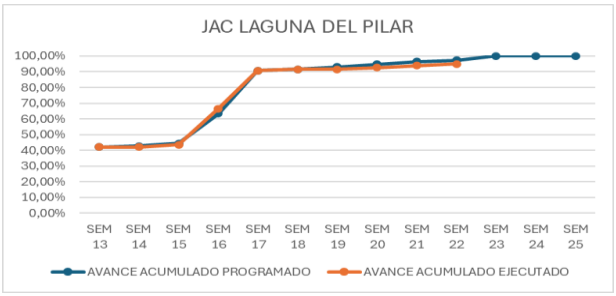

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 21 del 16/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 150 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA		
INTEGRANTES:	ANGEL ENRIQUE BELLO RAUDALES Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3940-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 188.438.369
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 184.575.082
	SALDO DE VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 3.863.287
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.794.586
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.070.879

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.035.532,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.035.532,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.035.532,00	100,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 49.539.550,24	26,3%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.575.082,24	97,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.575.082,24	97,9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.464.395,00	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.250.000,00	3,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.794.586,26	96,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.794.586,26	96,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 83%
Meta Física Ejecutada %: 97,9%
Avance o Atraso Físico %: 15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	150			Prog	125,09			125,085	83,4%
					Ejec	146,91			146,9	97,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador Manual	1	
Mezcladora de concreto	1	1
Cizalla manaual de 90 cm	1	
Compresor	1	
Camioneta D -300	1	
Vibrador	1	
Aspersor manual	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S - Manauere Cesar	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El convenio no requiere Programa de adaptación a la guia ambiental, sino un PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, el cual se encuentra aprobado en su etapa inicial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con las actiivdades de vaciado de concreto para bordillos, no se ha presentado un avance significativo por el bajo rendimientos de la mano de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Finalizar las actividades de fundida de concreto para bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

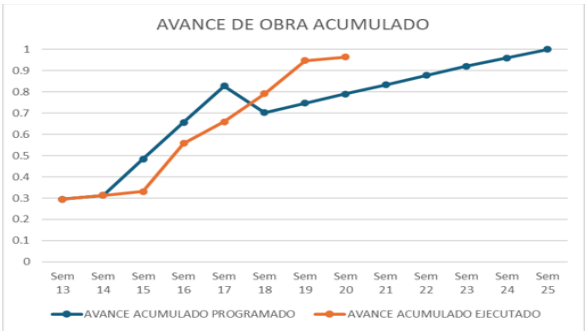

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



3,33333E+47





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 21 del 16/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 186 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR		
INTEGRANTES:	LAUREANO TOMAS DURAN PINTO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3631-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 210.517.958,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 210.517.958,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 210.517.958	$ 210.517.958
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 205.356.180
	SALDO DE VIGENCIA			$ 210.517.958	$ 5.161.778
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.478.466
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.386.999

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.052.888,12	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.052.888,12	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136.052.888,12	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 69.303.291,53	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.748.647,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.327.965,00	5,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.478.466,39	95,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.478.466,39	95,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 90%
Meta Física Ejecutada %: 94,00%
Avance o Atraso Físico %: 4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	186			Prog	167,96			167,96	90,30%
					Ejec	174,84			174,84	94,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA MAJO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se realizaron actividades vaciado clase D para bordillos
se realizaron actividades de limpieza de vía en el tramo terminado con bordillos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continar con las actividades de fundida de concreto

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

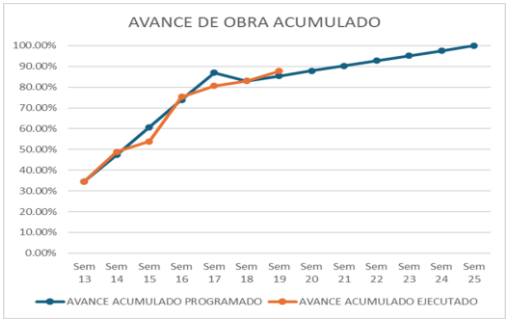

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 21 del 16/08/2024 al 22/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 236 ml de cuneta

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	ELIAS RAFAEL RAMOS BARROS Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3463-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 191.067.741,00	**CONTRATO No.**	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.067.741,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 191.067.741	$ 191.067.741
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 127.351.310
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.067.741	$ 63.716.431
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.794.586
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.070.879

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.729.072,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 130.926.899,00	96,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 127.351.310,19	93,8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.575.588,81)	-2,6%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130.926.899,00	68,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 127.351.310,19	66,7%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.575.588,81)	-2,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.252.735,00	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.591.306,21	0,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.794.586,26	96,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.794.586,26	96,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 96,5% Avance o Atraso Físico %: -3%
Meta Física Ejecutada %: 93,83%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	ML	236			Prog	227,64			227,64	96,5%
					Ejec	221,44			221,44	93,8%

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	MANAURE, CESAR	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El día 13 de agosto, se llevaron las formaletas para bordillos a obra.
Se realizó vaciado de concreto clase D para bordillos en el tramo 2 del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de vaciado de concreto para bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

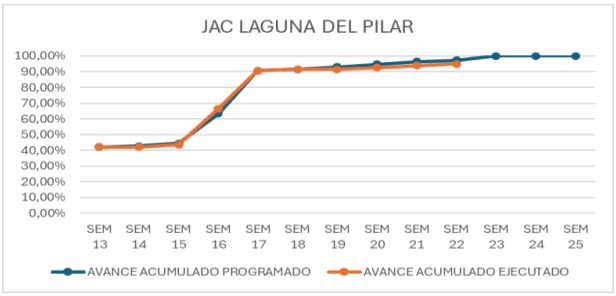

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 22 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 150 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA		
INTEGRANTES:	ANGEL ENRIQUE BELLO RAUDALES Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3940-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 188.438.369,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 188.438.369
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 184.575.082
	SALDO DE VIGENCIA			$ 188.438.369	$ 3.863.287
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 76.110.706
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 2.754.759

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.035.532,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.035.532,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.035.532,00	100,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 49.539.550,24	26,3%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.575.082,24	97,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.575.082,24	97,9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.464.395,00	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.250.000,00	3,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 76.110.706,13	96,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.110.706,13	96,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 88%
Meta Física Ejecutada %: 99,47%
Avance o Atraso Físico %: 12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	150			Prog	131,61			131,61	87,7%
					Ejec	149,21			149,2	99,47%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador Manual	1	
Mezcladora de concreto	1	1
Cizalla manaual de 90 cm	1	
Compresor	1	
Camioneta D -300	1	
Vibrador	1	
Aspersor manual	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S - Manauere Cesar	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El convenio no requiere Programa de adaptación a la guia ambiental, sino un PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, el cual se encuentra aprobado en su etapa inicial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con las actiivdades de vaciado de concreto para bordillos, no se ha presentado un avance significativo por el bajo rendimientos de la mano de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Finalizar las actividades de fundida de concreto para bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

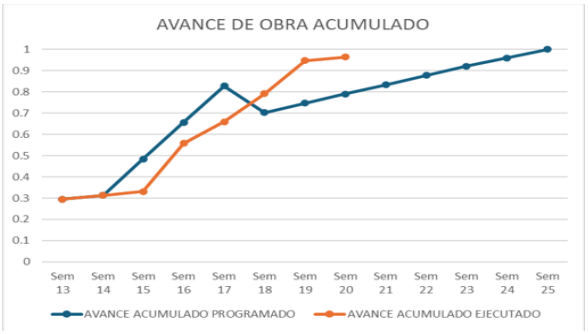

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 22 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 186 ml de placa huella

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	LAUREANO TOMAS DURAN PINTO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3631-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 210.517.958,00	**CONTRATO No.**	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 210.517.958,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 210.517.958	$ 210.517.958
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 205.356.180
	SALDO DE VIGENCIA			$ 210.517.958	$ 5.161.778
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 76.110.706
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 2.754.759

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.052.888,12	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.052.888,12	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136.052.888,12	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 69.303.291,53	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 205.356.179,65	150,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.748.647,00	2,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.327.965,00	5,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 76.110.706,13	96,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.110.706,13	96,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 93%
Meta Física Ejecutada %: 96,00%
Avance o Atraso Físico %: 3%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	186			Prog	172,48			172,48	92,73%
					Ejec	178,56			178,56	96,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA MAJO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se realizaron actividades vaciado clase D para bordillos
se realizaron actividades de limpieza de vía en el tramo terminado con bordillos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continar con las actividades de fundida de concreto

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

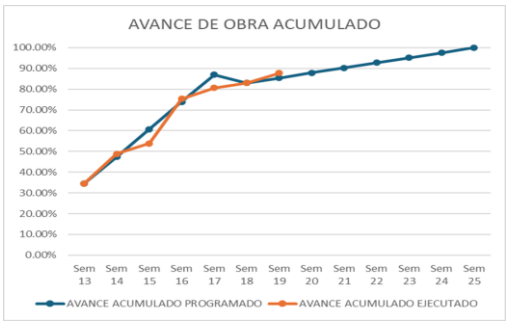

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 22 del 23/08/2024 al 29/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión y/o ajuste de estudios y diseños
Actividades de mantenmiento a traves de la construcción de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Las actividades de mejoramiento comprenden la construcción de 236 ml de cuneta

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO		
INTEGRANTES:	ELIAS RAFAEL RAMOS BARROS Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3463-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 191.067.741,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.067.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4834-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 78.865.465,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 191.067.741	$ 191.067.741
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 178.846.013
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.067.741	$ 12.221.728
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 78.865.465
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 75.794.586
	SALDO DE VIGENCIA			$ 78.865.465	$ 3.070.879

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 135.729.072,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 132.127.443,00	97,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.942.618,40	95,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.184.824,60)	-2,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 49.903.394,91	26,1%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 182.030.837,91	95,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 178.846.013,31	93,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.184.824,60)	-2,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.200.544,00	0,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.591.308,21	0,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.794.586,26	96,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 75.794.586,26	96,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 316.119,87	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de Julio
VALOR FACTURA: $ 14.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 97%
Meta Física Ejecutada %: 95,00%
Avance o Atraso Físico %: -2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	ML	236			Prog	229,75			229,75	97,4%
					Ejec	224,20			224,20	95,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
pulidora	1	
vibrador de concreto	1	
aspersor manual	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CALYMAN S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	MANAURE, CESAR	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la via a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantia de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En ejecución

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio y capacitaciones al personal de obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron actividades de encofrado y vaciado de concreto para la construcción de los bordillos faltantes en el proyecto.
Se han presentado atrasos debido a las lluvias y daño de la mezcladora en campo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de vaciado de concreto

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

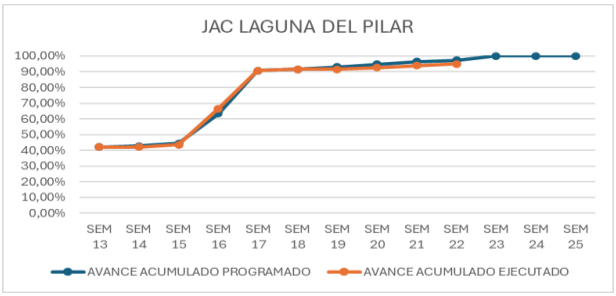

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del convenio y revisión de información allegada por la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

A la fecha (31 de agosto de 2024) se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos de cada uno de los convenios objetos del presente contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto 01 al 31 de 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3940-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4834-2023 **INTERVENTORÍA:** G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Edwin Ramirez
Nombre: Edwin Ramirez
Residente de Obra
Matricula Profesional : 44202-406125 GJA

Firma
Nombre: Yerlis Quintero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0599487 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto 01 al 31 de 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4834-2023 **INTERVENTORÍA:** G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Wilfredo Ramos Valdes
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0620251743 ATL

Firma
Nombre: Yerlis Quintero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0599487 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Agosto 01 al 31 de 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3463-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4834-2023

INTERVENTORÍA: G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora																A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL ACTIVO																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre:
Residente de Victor Gomez Molina
Matrícula Profesional No.: 44202-421676 GJA

Firma

Nombre: Yerlis Quintero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social por parte del OAC.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL EN EL CONVENIO	TIPO DE VINCULACIÓN
1	Edwin Ramírez Cuadrado	Residente de obra	Contrato por prestación de servicio
2	Vinnie Duran Ramos	Contador	Contrato por prestación de servicio
3	Alvaro Sanchez Bula	Maestro de obra	Contrato Laboral
4	Carlos Ariza Cantillo	Oficial	Contrato Laboral
5	Cristian Eduardo Relaes Saurith	Topografo	Contrato Laboral
5	Carlos Liñan Barros	Obrero	Contrato Laboral
6	Esteban Caceres Martinez	Obrero	Contrato Laboral
7	Isaias Parra Contreras	Obrero	Contrato Laboral
8	Jeiser Rojas Torres	Obrero	Contrato Laboral
9	Jose Anibal Calero Aponte	Obrero	Contrato Laboral
10	Jose Agustin Diaz Perdonomo	Obrero	Contrato Laboral
11	Jose Alfonso Mejia Torres	Obrero	Contrato Laboral
12	Jose Torres Rivadeneira	Obrero	Contrato Laboral

Tabla 10: Recurso humano del Convenio No. 3940 de 2023
Fuente: Planillas y/o informes

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL EN EL CONVENIO	TIPO DE VINCULACIÓN
1	Wilfredo Ramos	Residente de obra	Contrato por prestación de servicio
2	Indira Herrera	Contador	Contrato por prestación de servicio
3	José Olmedo	Maestro de obra	Contrato Laboral
4	Daniel Castro	Obrero	Contrato Laboral
5	Donaldo Daza	Obrero	Contrato Laboral
5	Yamin Duran	Obrero	Contrato Laboral
6	Jan Lobo	Obrero	Contrato Laboral
7	Lucas Lobo	Obrero	Contrato Laboral
8	Eneli Machado	Obrero	Contrato Laboral
9	Guillermo Martinez	Obrero	Contrato Laboral
10	Jose Mercado	Obrero	Contrato Laboral
	Jose Muegue	Obrero	Contrato Laboral
	Deivis Saurith	Obrero	Contrato Laboral

Tabla 11: Recurso humano del del Convenio No. 3631 de 2023
Fuente: Planillas y/o informes

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL EN EL CONVENIO	TIPO DE VINCULACIÓN
1	VICTOR GÓMEZ	RESIDENTE	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO
2	CRISTIAN EDUARDO REALES SAURITH	TOPOGRAFO	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO
3	JANER JONAS ALONSO MANAJARREZ	CONTADOR	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO
4	JIOVANNY ALFONSO OVALLE ROJAS	MAESTRO	CONTRATO LABORAL
5	JESUS ANDRES BARROS MAESTRE	OBRERO	CONTRATO LABORAL
5	ALFREDO LOPEZ ATENCIO	OBRERO	CONTRATO LABORAL
6	DEINER MENDEZ LAFAURIE	OBRERO	CONTRATO LABORAL
7	LUIS MIGUEL MORALES CELEDON	OBRERO	CONTRATO LABORAL
8	ISAIAS PARRA CONTRERAS	OBRERO	CONTRATO LABORAL
9	PUSHAINA JHOVANNY	OBRERO	CONTRATO LABORAL
10	DANIEL EDUARDO RAMIREZ MAESTRE	OBRERO	CONTRATO LABORAL
11	YOEL RIZO SERRANO	OBRERO	CONTRATO LABORAL
12	JOSE ENRIQUE ROMERO FRAGOZO	OBRERO	CONTRATO LABORAL
13	TOMAS FONTALVO VANEGAS	OBRERO	CONTRATO LABORAL
14	VICTOR GÓMEZ	RESIDENTE	CONTRATO LABORAL

Tabla 12: Recurso humano del Convenio No. 3463 de 2023
Fuente: Planillas y/o informes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3940-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDWIN RAMIREZ	1.118.851.975	RESIDENTE	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EDWIN RAMIREZ	1.400.000	$ 97.440	V		85624795	$ 175.000	PORVENIR	85624795	$ 224.000				
2	JOSE APONTE	1.193.599.003	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	CAJACOPI	85624796	$ 162.500	PORVENIR	85624796	$ 208.000	$ 162.500			
3	CARLOS LIÑAN	15.864.413	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	CAJACOPI	85624796	$ 162.500	PORVENIR	85624796	$ 208.000	$ 162.500			
4	JOSE MEJIA	7.573.890	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	85624796	$ 162.500	PORVENIR	85624796	$ 208.000	$ 162.500			
5	JEISER ROJAS	1.119.840.395	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	CAJACOPI	85624796	$ 162.500	PORVENIR	85624796	$ 208.000	$ 162.500			
6	ALVARO SANCHEZ	1.123.731.859	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	CAJACOPI	85624796	$ 162.500	PORVENIR	85624796	$ 208.000	$ 162.500			
7	JOSE TORRES	1.121.332.252	OBRERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	COMPENSAR	85624796	$ 162.500	PORVENIR	85624796	$ 208.000	$ 162.500			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

La JAC a la fecha cuenta con los profesionales del cargo de residente de obra y contador, sin embargo, no ha sido reportado las planilla de seguridad social del mes de julio

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Edwin Ramirez
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:44202-406125 GJA

Firma

Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEP-MNL-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	WILFREDO RAMOS	5.174.723	Residente	$ 3.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	WILFREDO RAMOS	1.400.000	$ 97.440	V											
2	OLMEDO JOSE	17.970.678	Mestro																																			V		9470552415								
3	DANIEL CASTRO	8.646.758	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
4	DONALDO DAZA	2.767.962	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
5	YAMIN DURAN	1.119.816.925	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
6	JIAN LOBO	1.041.895.631	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	COOSALUD EPS	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
7	ENELI MACHADO	1.041.901.878	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
8	GUILLERMO MARTINEZ	12.602.078	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
9	JOSE MERCADO	1.067.808.826	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
10	JOSE MUEGUE	1.063.952.392	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			
11	DEIVIS SAJARITH	1.006.653.105	Obrero	$ 1.300.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC	260.000	$ 18.100	V	CAJACOPI	9470552415	$ 32.500	PORVENIR	9470552415	$ 41.600	$ 32.500			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
La JAC a la fecha cuenta con los profesionales del cargo de residente de obra y contador, sin embargo, no ha sido reportado las planilla de seguridad social del mes de julio

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Wilfredo Ramos Valdes
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:0620251743 ATL

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3463-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	VICTOR GÓMEZ	77.170.362	RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VICTOR GÓMEZ	1.400.000		V	SALUD TOTAL	9468581173	$ 175.000	COLPENSIONES	9468581173	$ 224.000				
2	CRISTIAN EDUARDO REALES SAURITH	1.119.817.223	TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CRISTIAN EDUARDO REALES SAURITH	1.300.000		V	CAJACOPI EPS S.A.S	4560953805	$ 162.500	PORVENIR	4560953805	$ 208.000				
3	JANER JONAS ALONSO MANAJARREZ	84.101.328	CONTADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JANER JONAS ALONSO MANAJARREZ	1.300.000		V	NUEVA EPS	8631339643	$ 162.500	COLPENSIONES	8631339643	$ 208.000				
4	JIOVANNY ALFONSO OVALLE	84.101.423	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	2.320.000	$ 161.472	V	NUEVA EPS	9469782876	$ 290.000	PORVENIR	9469782876	$ 371.200				
5	JESUS ANDRES BARROS	1.006.653.487	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.083.334	$ 75.400	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 135.417	PORVENIR	9469897813	$ 173.333				
6	ALFREDO LOPEZ ATENCIO	5.174.716	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	346.667	$ 24.128	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 43.333	PORVENIR	9469897813	$ 55.467				
7	DEINER MENDEZ LAFAURIE	1.121.338.037	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	130.000	$ 9.048	V	CAJACOPI EPS S.A.S	9469897813	$ 16.250	PORVENIR	9469897813	$ 20.800				
8	LUIS MIGUEL MORALES	1.119.838.603	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.798.334	$ 125.164	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 224.792	PORVENIR	9469897813	$ 287.733				
9	ISAIAS PARRA CONTRERAS	1.119.839.136	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.083.334	$ 75.400	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 135.417	PORVENIR	9469897813	$ 173.333				
10	PUSHAINA JHOVANNY	1.147.948.353	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	CAJACOPI EPS S.A.S	9469897813	$ 162.500	PORVENIR	9469897813	$ 208.000				
11	DANIEL EDUARDO RAMIREZ	1.119.838.574	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 162.500	PORVENIR	9469897813	$ 208.000				
12	YOEL RIZO SERRANO	1.119.838.599	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 162.500	PORVENIR	9469897813	$ 208.000				
13	JOSE ENRIQUE ROMERO	84.101.587	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 162.500	PORVENIR	9469897813	$ 208.000				
14	TOMAS FONTALVO VANEGAS	77.141.823	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC	1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	9469897813	$ 162.500	PORVENIR	9469897813	$ 208.000				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
La JAC a la fecha cuenta con los profesionales del cargo de residente de obra y contador, sin embargo, no ha sido reportado las planilla de seguridad social del mes de julio

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Victor Gomez Molina
Residente de obra
Matrícula Profesional No.44202-421676 GJA

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

A continuación, se registra avance financiero correspondiente al mes de julio, donde se ejecutaron actividades y se desembolsaron recursos, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 correspondiente a informe financiero y presupuestal. Además, se relaciona los valores girados y saldos en banco en la fecha.

DECRIPCIÓN	EJECUTADO		
	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL
VALOR GIRADO	150.493.753.87	36.947.696.13	187.441.450
SALDO EN BANCO A 31/08/2024	36.947.696.13	0.00	0.00

Tabla 13: Saldos del Convenio No. 3940 de 2023
Fuente: Extractos bancario

DECRIPCIÓN	EJECUTADO		
	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL
VALOR GIRADO	142.740.369,99	66.448.903,65	209.189.273,64
SALDO EN BANCO A 31/08/2024	66.777.588.01	328.684,36	

Tabla 14: Saldos del Convenio No. 3631 de 2023
Fuente: Extracto bancario

DECRIPCIÓN	EJECUTADO		
	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL
VALOR GIRADO	144.617.106,5	34.540.086,32	179.157.192,82
SALDO EN BANCO A 31/08/2024	40.015.360,41	5.435.274,09	

Tabla 15: Saldos del convenio No. 3463 de 2023
Fuente: Extracto bancario

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3940-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
						$ 187.441.450	$ -
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 187.441.450,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		abr-24			$ 5.740.817						$ 181.700.633				
2		may-24			$ 82.831.779						$ 98.868.854				
3		jun-24			$ 22.814.526						$ 76.054.328				
4		jul-24			$ 39.149.754						$ 36.904.575				
5		ago-24			$ 36.904.575										
6															
7}															
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ 187.441.450**						$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 136.551.900		**$ 136.551.900**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.628.821		**$ 4.628.821**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.260.729		**$ 46.260.729**
VALOR TOTAL	$ 187.441.450		**$ 187.441.450**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Edwin Ramirez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-406125 GJA

Firma
Nombre: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4838-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
						$ 209.517.958	$ 328.684
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 209.517.958,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		may-24			$ 42.134.490						$ 167.383.468				
2		jun-24			$ 49.871.868						$ 117.511.600				
3		jul-24			$ 49.773.653						$ 67.737.947				
4		ago-24			$ 67.409.262						$ 328.684				
4															
			$ -	**$ -**	**$ 209.189.274**						$ 328.684				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 137.969.435		**$ 137.969.435**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.675.178		**$ 4.675.178**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 66.544.661		**$ 66.544.661**
VALOR TOTAL	$ 209.189.274		**$ 209.189.274**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Wilfredo Ramos Valdes
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0620251743 ATL

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3463-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
						$ 190.067.741	$ 5.435.274
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 190.067.741,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		jun-24			$ 6.908.292						$ 183.159.449				
2		jul-24			$ 62.517.793						$ 120.641.656				
3		ago-24			$ 45.248.706						$ 75.392.951				
4		sep-24			$ 36.287.014						$ 39.105.936				
4		oct-24			$ 33.670.662						$ 5.435.274				
4															
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ 184.632.467**						**$ 5.435.274**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 136.377.072		**$ 136.377.072**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.103.318		**$ 4.103.318**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.587.351		**$ 49.587.351**
VALOR TOTAL	**$ 190.067.741**	$ -	**$ 190.067.741**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Victor Gomez Molina
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-421676 GJA

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. Estado general del tiempo.

Durante el presente mes se presentaron precipitaciones en la zona del proyecto, a continuación, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 de los 3 convenios objeto de la presente interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3940-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		656
Lluvias moderadas	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		712
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Edwin Ramirez
Nombre: Edwin Ramirez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-406125 GJA

Firma
Nombre: Yerlis Quintero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0599487 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	21	24	20	20	24	24	24	24	24	23	21	24	24	24	24	24	24	24	22	725
Lluvias moderadas									1	1			3		4	4						1	3								2	19
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Wilfredo Ramos Valdes
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0620251743 GJA

Firma
Nombre: Yerlis Quintero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0599487 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3463-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	678
Lluvias moderadas	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	2	714
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Victor Gomez Molina
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-421676 GJA

Firma
Nombre: Yerlis Quintero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0599487 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. Resumen ensayos de laboratorio.

Para el periodo que abarca el presente mes, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Correspondiente a resultado de los ensayos de laboratorio efectuados durante el periodo, cabe resaltar que el a la fecha no se han remitido los resultados de los ensayos de laboratorios autorizados en comité operativo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3940-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Edwin Ramirez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-406125 GJA

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Wilfredo Ramos Valdes
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0620251743 GJA

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3463-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Victor Gomez Molina
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-421676 GJA

Firma
Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, de acuerdo con la última modificación de los convenios según la prórroga No. 4 suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3940-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.441.450,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.441.450,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.900.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.687.637,80	17	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.421.918,45	17	10	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.531.510,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291139

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071497 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.687.637,80	17	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.421.918,45	17	10	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.531.510,70	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291139

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	17	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071497 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.687.637,80	30	4	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.421.918,45	30	4	2024	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.531.510,70	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291139

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	12	10	2024	15	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071497 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	8	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.687.637,80	30	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.421.918,45	30	4	2024	15	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.531.510,70	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291139

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	12	10	2024	15	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071497 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Abel Soto Lagos

Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3631-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 210.517.958,00

VALOR ACUMULADO: $ 210.517.958,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4838-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.103.591,60	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.525.897,90	29	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.155.387,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290578

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071266 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.103.591,60	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.525.897,90	31	12	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.155.387,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290578

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071266 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.103.591,60	30	4	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.525.897,90	30	4	2024	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.155.387,40	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290578

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29	9	2023	30	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071266 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	8	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.103.591,60	17	1	2024	28	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.525.897,90	17	1	2024	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.155.387,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290578

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29	9	2024	30	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3463-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.067.741,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.067.741,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4834-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.213.548,20	21	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.553.387,05	21	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.320.322,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100292762

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	21	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-10072082 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.213.548,20	21	9	2023	1	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.553.387,05	21	9	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.320.322,30	30	4	2023	30	4	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100292762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-10072082 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.213.548,20	30	4	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.553.387,05	30	4	2024	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.320.322,30	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100292762

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21	9	2024	30	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-10072082 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.213.548,20	30	4	2024	15	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.553.387,05	30	4	2024	15	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.320.322,30	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100292762

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21	9	2023	15	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-10072082 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ABEL SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.


4.9. Otros documentos seguimiento mensual.


4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.


El convenio solidario no estipula la entrega de anticipo al Organismo de Acción Comunal.

4.9.2. Seguimiento programa de obra.

A la fecha (31 de agosto de 2024) se relaciona la comparación de lo programado vs ejecutado de los convenios objeto de la presente interventoría.

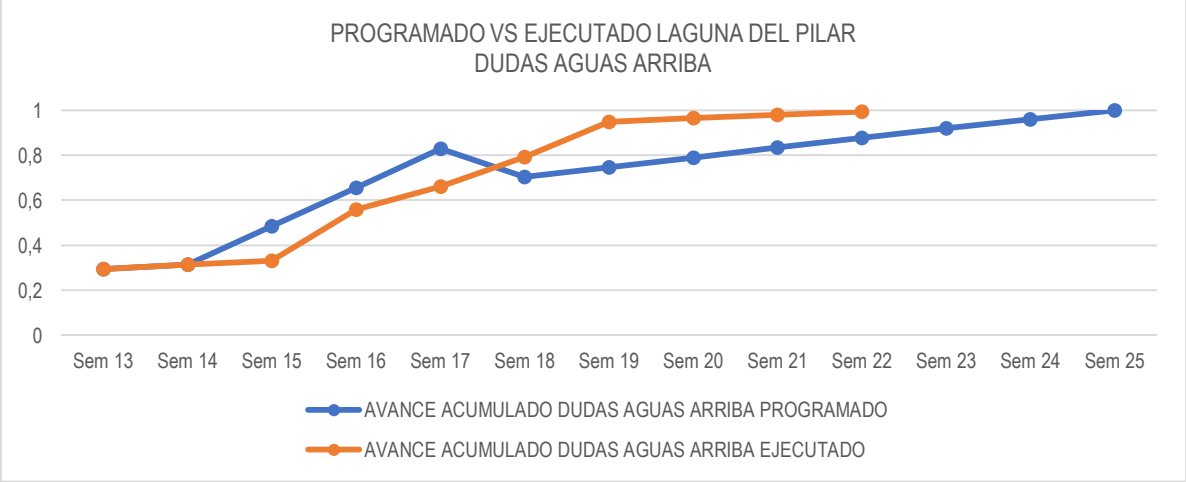

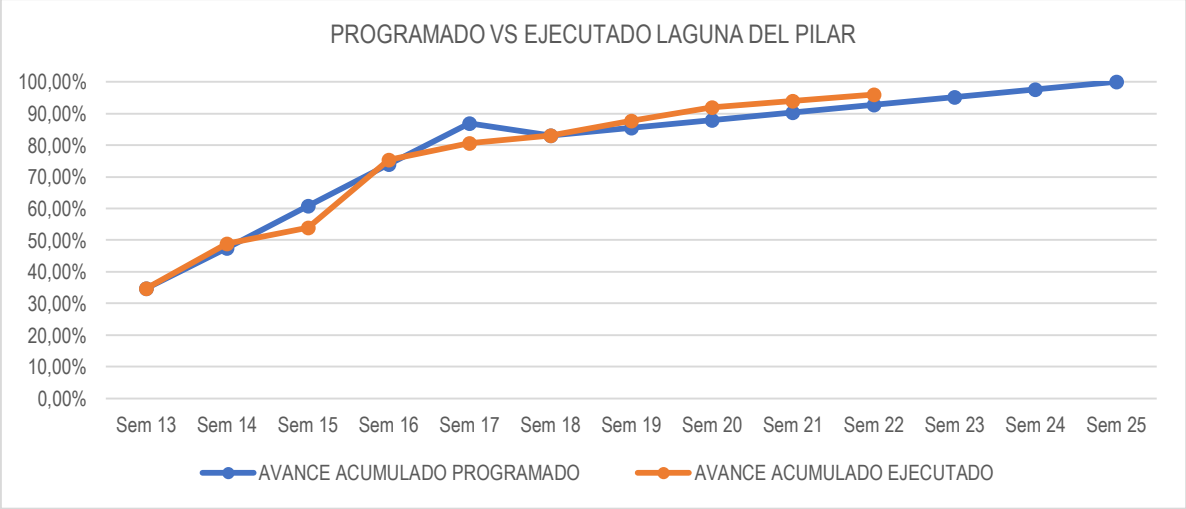

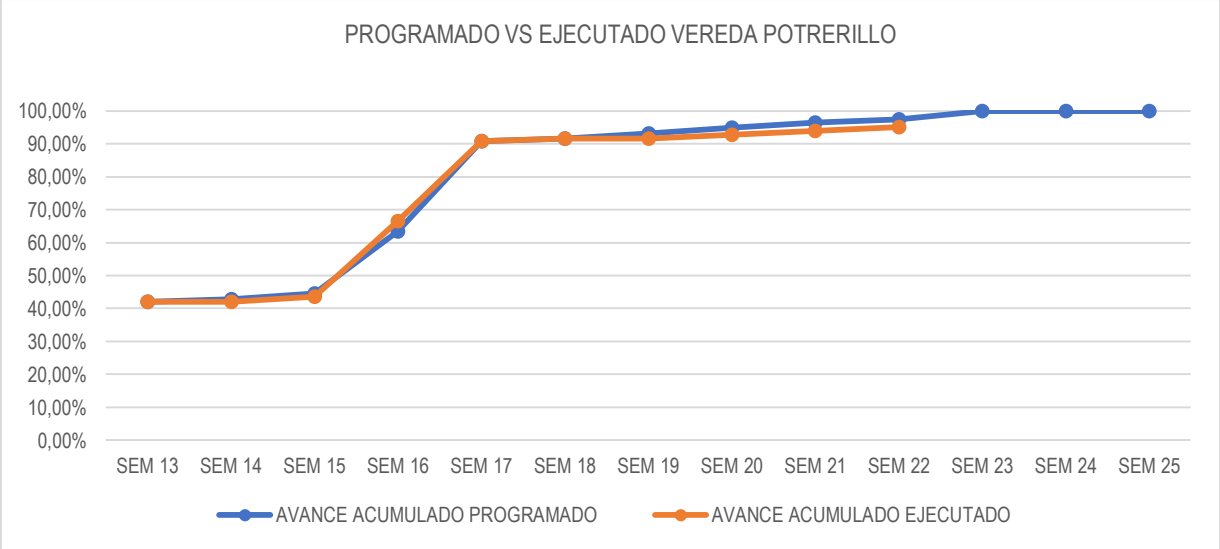

4.9.3. Seguimiento programa de inversiones.

A la fecha (31 de agosto de 2024) se relaciona el plan de inversiones de los convenios objeto de la presente interventoría.

4.9.4. Actas de comité de obra.

Para el periodo que abarca el presente informe no se llevaron a cabo comités de obra entre las partes.

4.9.5. Actas de reunión.

Para el periodo que abarca el presente informe no se llevaron a cabo reuniones entre las partes.

4.9.6. Comité Operativo.

4.9.6.1. Convenio No. 3463 de 2023.

El comité operativo del convenio se conformó el día 22 de marzo de 2024 y está integrado por:

- Representante legal de OAC: ELIAS RAFAEL RAMOS BARROS (Con voz y voto)
- Interventoría: ABEL DARIO SOTO LAGOS en calidad de director de interventoría (Con voz y voto)
- Representante de veeduría: OLEGARIO GARCÍA LIÑAN, en calidad de representante de la veeduría CAMINOS PARA LA VIDA, según resolución 01 del 19 de marzo de 2024 (Con voz y voto)
- Ingeniero Residente de obra: VICTOR MANUEL GÓMEZ MOLINA (Con voz y sin voto)
- Contador de la OAC: JANER JONAS MANJARREZ ALONSO (Con voz y sin voto)
- Tesorero de la OAC: OLMAR LÓPEZ (Con voz y sin voto)

Para el período que abarca el presente informe, se llevaron a cabo los siguientes comités operativos para desembolsos de recursos.

- Comité operativo No. 12 agosto de 2024 (Ver anexo)
- Comité operativo No. 13 del 20 de agosto de 2024 (Ver anexo)
- Comité operativo No. 14 del 23 de agosto de 2024 (Ver anexo)

4.9.6.2. Convenio No. 3940 de 2023.

El comité operativo del convenio se conformó el día 22 de marzo de 2024 y está integrado por:

- Representante legal de OAC: ANGEL ENRIQUE BELLO RAUDALES (Con voz y voto)
- Interventoría: ABEL DARIO SOTO LAGOS en calidad de director de interventoría (Con voz y voto).
- Representante de veeduría: NILSARI ESTHER RANGEL TORRES, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURÍA DE CONTROL CIUDADANO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA CAMINOS POR LA PAZ TOTAL, según resolución 02 del 19 de marzo de 2024 (Con voz y voto).
- Ingeniero Residente de obra: EWDIN RAMIREZ CUADRADO (Con voz y sin voto)
- Contador de la OAC: VINNIE RAFAEL DURAN RAMOS (Con voz y sin voto)

Para el período que abarca el presente informe, se llevaron a cabo los siguientes comités operativos para desembolsos de recursos.

- Comité operativo No. 11 del 01 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)

- Comité operativo No. 12 del 13 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)
- Comité operativo No. 13 del 18 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)
- Comité operativo No. 14 del 21 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)
- Comité operativo No. 15 del 29 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta

4.9.6.3. Convenio No. 3631 de 2023.

El comité operativo del convenio se conformó el día 01 de abril de 2024 y está integrado por:

- Representante legal de OAC: LAUREANO TOMAS DURAN PINTO (Con voz y voto)
- Interventoría: ABEL DARIO SOTO LAGOS en calidad de director de interventoría (Con voz y voto)
- Representante de veeduría: CARMEN CECILIA OSPINO ALVARADO, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURÍA DE OBRAS PILAR", según resolución 03 del 21 de marzo de 2024 (Con voz y voto)
- Ingeniero Residente de obra: WILFREDO RAMOS VALDES (Con voz y sin voto)
- Contadora de la OAC: INDIRA ELENA HERRERA DURAN (Con voz y sin voto)
- Tesorero de la OAC: CINDY LEONOR CABANA (Con voz y sin voto)

Para el período que abarca el presente informe, se llevaron a cabo los siguientes comités operativos para desembolsos de recursos:

- Comité operativo No. 12 del 06 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)
- Comité operativo No. 13 del 15 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)
- Comité operativo No. 14 del 29 de agosto de 2024 (Ver anexo Carpeta)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. Información del contrato.

Convenio No.	4834	**FECHA**	21/12/2023	**Modalidad de Contratación**	Menor Cuantía	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
Contratista	GV LTDA						**NIT**	825002653-1
Rep. Legal	Gelca Patricia Vanegas Mengual						**CC**	40.913.719
Objeto del Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de las vías rurales en el municipio de la Urumita, departamento de La Guajira del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total							
Interventoría								
Supervisión	John Jairo Ceballo Vega							
Plazo Inicial	5 días		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	$78.865.465
Plazo Adicional	7.97 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	8.13 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		29/12/2023		**Valor Total**	$78.865.465
Tiempo Transcurrido	7.63 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			
			Fecha finalización según prorroga 3		31/07/2024			
			Fecha finalización según prorroga 4		15/09/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**		**Número**	**Fecha**
	01	29/12/2023	**Actas de Reiniciación**	01	17/01/2024

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 16: Informacón del contrato de interventoría.
Fuente:Contrato de interventoría

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

5.2.1. Informe de especialistas.

A la fecha de corte del presente informe, no se presentan informes de especialistas teniendo en cuenta que, al iniciar la obra, los estudios fueron revisado y aprobados.

5.3. Informe del programa anual de caja – PAC.

A la fecha del presente informe no se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.4. Informe matriz de riesgos.

A la fecha del presente informe no se han registrado eventos que involucren la matriz de riesgos del proyecto.

5.5. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.

A la fecha del presente informe se cuenta con información del aplicativo que se debe gestionar, tales como informes mensuales, actas y demás, lo cual debe ser firmado por la supervisión para su posterior cargue a la plataforma secop II y estos no han sido remitidos a la empresa.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con el Manual de interventoría INVIAS, a continuación, se relacionan los formatos de información de equipos, personal, financiero entre otros del contrato de interventoría.

6.1. Equipo contrato de interventoría.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 correspondiente a equipos se relacionan los equipos vinculados en el desarrollo de las actividades de la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 01 AL 31

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4834-2023

INTERVENTORÍA: GV LTDA

CONTRATO DE OBRA No. 3463 DE 2023
3940 DE 2023
3631 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POTERILLO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA	PLACA YKKK21F - YAMAHA - MODELO 2022	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MOTOCICLETA	PLACA RW044G- BAJAJ PULSAR - MODELO 2024																															

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ABEL DARIO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma
Nombre: JOHN JAIRO CEBALLO VEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 08202-51742 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. Personal contrato de interventoría.

Se relaciona el formato MEPI-MN-IN-15-FR-7, con la información de los profesionales aprobados y activos en el periodo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGAVI INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3463 DE 2023, 3940 DE 2023, 3631 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POTERILLO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DUDAS AGUAS ARRIBA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA DEL PILAR

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
4	SOTO LAGOS ABEL DARIO	1119817279	DIRECTOR	$ 1.933.334,00	1: X; 4: X; 5: X; 6: X; 7: X; 8: X; 9: X; 10: X; 11: X; 12: X; 13: X; 14: X; 26: X; 27: X; 28: X; 29: X; 30: X	33	VIGAVI INTERVENTORES	$ 1.933.334,00	$101.000	V	SANITAS	9473766429	$58.000	COLPENSIONES	9473766429	$232.000	$449.000			

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES $ 1.933.334

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:ABEL DARIO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma
Nombre: JOHN JAIRO CEBALLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se consigna la información financiera del contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834

INTERVENTOR: GV LTDA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3463 - 3940 - 3631

CONTRATISTA: JAC POTRERILLO, DUDA AGUAS ARRIBA Y REGION LAGUNA DEL PILAR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1354423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 78.865.465,00	$ 4.064.398
TOTAL						$ 78.865.465	$ 4.064.398

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$78.865.465**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha 1449223 DE 29-12-2023	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICEMBRE 2023	$ -	$ -	**$ -**					$ -	**$ -**		
2	ENERO 2024	$ -	$ -	**$ -**					$ -	$ -		
3	FEBRERO 2024	$ -	$ -	**$ -**					$ -	$ -		
4	MARZO 2024	$ -	$ -	**$ -**					$ -	$ -		
5	ABRIL 2024	$ 11.121.333,33	$ 2.113.053,33	$ 13.234.386,67					$ -	$ 65.631.078,33	5/05/2024	
6	MAYO 2024	$ 17.248.000,00	$ 3.277.120,00	$ 20.525.120,00					$ -	$ 45.105.958,33	5/06/2024	
7	JUNIO 2024	$ 22.724.000,00	$ 4.317.560,00	$ 27.041.560,00						$ 18.064.398,33	5/07/2024	
8	JULIO 2024	$ 11.764.705,88	$ 2.235.294,12	$ 14.000.000,00						$ 4.064.398,33	5/08/2024	
9	AGOSTO 2024	$ 1.138.486,93	$ 216.312,52	$ 1.354.799,44						$ 2.709.598,89	13/11/2024	
TOTALES												

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 1**	$ -	$ -	$ -
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 2**	$ -	$ -	$ -
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 3**	$ -	$ -	$ -
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 4**	$ -	$ -	$ -
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 5**	$ 11.121.333,33	$ 2.113.053,33	$ 13.234.386,67
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 6**	$ 17.248.000,00	$ 3.277.120,00	$ 20.525.120,00
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 7**	$ 22.724.000,00	$ 4.317.560,00	$ 27.041.560,00
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 8**	$ 11.764.705,88	$ 2.235.294,12	$ 14.000.000,00
*** VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 9**	$ 1.138.486,93	$ 216.312,52	$ 1.354.799,44
VALOR TOTAL	**$ 63.996.526,14**	**$ 12.159.339,97**	**$ 76.155.866,11**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **ABEL DARÍO SOTO LAGOS**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Firma

Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 08202-51742 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se relaciona a continuación en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 correspondiente al seguimiento garantías contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4834-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,17

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 78.865.465,00

VALOR ACUMULADO: $ 78.865.465,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JHON JAIRO CEBALLOS VEGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.886.546,50	7	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.773.093,00	7	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.659.639,50	7	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214116 0

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECO 27/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.886.546,50	7	12	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.773.093,00	7	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 23.659.639,50	7	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214116 0

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/01/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	7	12	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	7	12	2023	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	7	12	2023	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214116 0

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	7	12	2023	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	7	12	2023	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	7	12	2023	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214116 0

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	7	12	2023	30	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	7	12	2023	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	7	12	2023	31	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101214116 0

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	7	12	2023	15	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	7	12	2023	15	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	7	12	2023	15	9	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.092.806,50	7	12	2023	15	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 20.185.613,00	7	12	2023	15	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 30.278.419,00	7	12	2023	15	11	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ABEL DARÍO SOTO LAGOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-398468 GJA

Firma

Nombre: JHON JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor (e) Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51742 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se elabora informe de interventoría No. 9 del periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto de 2024, en el cual se llevaron a cabo seguimiento a las actividades en campo, las actividades adelantadas por los convenios correspondieron principalmente a corte y figurado de acero para cunetas y bordillos, a la fecha del presente informe los convenios presentan un avance del 95%, 96% y 99,47% correspondiente a los convenios de Potrerillo, Laguna del Pilar y Dudas aguas arriba respectivamente. Finalmente, se estima que el objeto contractual de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" presenta un avance acumulado aproximado del 96.6% a 31 de agosto de la presente anualidad. G.V LTDA continúa tomando las medidas pertinentes para cumplir en el plazo contractual.

8. ANEXOS.

8.1. Anexo de correspondencia enviada y recibida.

Para el periodo que abarca el presente informe, se relaciona la correspondencia generada entre las partes.

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
30/08/2024	E-mail	Comité operativo No. 14	Interventoría	JAC Laguna del Pilar
26/08/2024	E-mail	Procedimiento para el Cierre de la Veeduría una vez Terminado el Contrato	Interventoría	JAC Dudas Aguas Arriba JAC Laguna del Pilar JAC Potrerillo
20/08/2024	E-mail	Solicitud de consignación de retenciones practicadas	Interventoría	JAC Vereda Dudas Aguas Arriba
20/08/2024	E-mail	aprobación del Plan del inversión Social	Interventoría	JAC Potrerillo
13/08/2024	E-mail	Entrega Inicial gestión social Convenio 3631 de 2023 Laguna del Pilar	Interventoría	Supervisión
10/08/2024	E-mail	Informe SST	Interventoría	Supervisión
08/08/2024	E-mail	Solicitud de documentación gestión social	Interventoría	JAC Potrerillo
06/08/2024	E-mail	Entrega Etapa Inicial SS - Convenio 3463 de 2023	Interventoría	Supervisión
05/08/2024	E-mail	Aprobación Gestión Social	Interventoría	JAC Vereda Dudas Aguas Arriba

Tabla 17: Relación de correspondencia.
Fuente:Propia

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras.

Para el periodo que abarca el presente informe, se anexan registros fotográficos, que se llevaron a cabo actividades técnicas.

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas.

Para el periodo que abarca el presente informe, no se anexan registros fotográficos de actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles, debido a que no se adelantaron acciones al respecto.

8.4. Bitácora de obra.

Para el periodo que abarca el presente informe, se relaciona la bitácora.
