SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN
LUIS JAIME DIAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4636 - 2023.
Periodo:	MARZO/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 180 ml aprox.

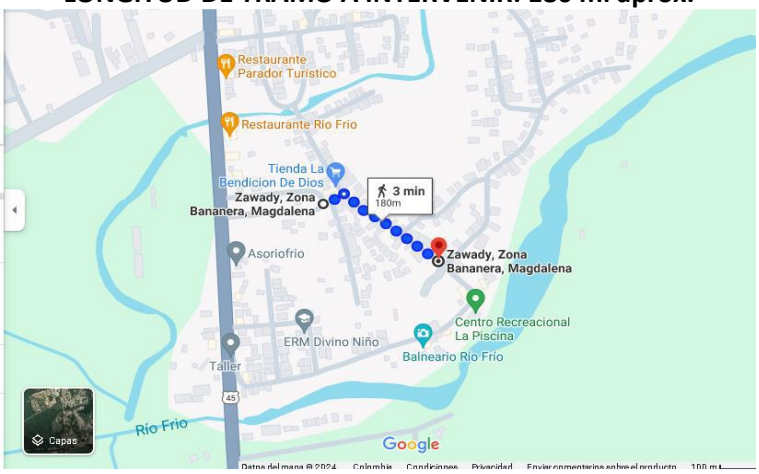


Ilustración 1.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BARRIO CENTRO DE GUACAMAYAL
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 150 – 170 ml aprox.



Ilustración 2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA TIERRA NUEVA
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 150 – 170 ml aprox.



Ilustración 3.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3587-2023		
OAC:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY	NIT:	901.736.964-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY MUNICIPIO ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 199.367.074.00		
VALOR ACTUAL:	$ 199.367.074.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA 1:	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4137 – 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL	NIT:	900.029.773-6
OAC:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023
PRORROGA 1:	30/04/24
SUSPENSIÓN 1:	28/12/2023
REINICIO SUSP 1:	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP 1:	21/01/24
VALOR INICIAL:	$ 198.565.568,00
VALOR ACTUAL:	$ 198.565.568,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
PRÓRROGA 1:	30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

VEREDA TIERRA NUEVA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3937 – 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO.	NIT:	901715667-1
OAC:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
REINICIO SUSP 1:	16/01/2024		
PRÓRROGA 1:	30/04/24		
VALOR INICIAL:	$ 198.142.876,00		
VALOR ACTUAL:	$ 198.142.876,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/24		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1225223	10	$ 199.367.074,00	$ 0	$ 199.367.074,00 -
1225223	10	$ 199.367.074,00	$ 0	$ 199.367.074,00 -
1225223	10	$ 199.367.074,00	$ 49.841.769,00	$ 149.525.306,00 -

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1385923	10	$ 198.565.568,00	$ 0	$ 198.565.568,00 -

VEREDA TIERRA NUEVA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1211023	10	$ 198.142.876,00	$ 0	$ 198.142.876,00 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de febrero, ya que no se han registrado avances en las obras.

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.4, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para los convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.162.692,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 78.384.216,10	53,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 52.466.496,48	35,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 52.466.496,48	35,65%

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.416.888,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

VEREDA TIERRA NUEVA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 145.978.749,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.4.2. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY
Meta física programada 53,26%
Meta física ejecutada 35,65%

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

VEREDA TIERRA NUEVA
Meta física programada 0%

Meta física ejecutada 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes no se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las JAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	1	…	28/12/23 – 16/01/24	17/01/24

VEREDA TIERRA NUEVA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	…	29/12/23 – 16/01/24	17/01/24

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	28/12/2023	29/12/2023	30/04/2024

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	28/12/2023	29/12/2023	30/04/2024

VEREDA TIERRA NUEVA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	19/01/2024	23/01/2024	30/04/2024

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS BOLIVAR Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.873.414,80	NB-100285733	28/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.968.353,70	NB-100285733	28/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.810.122,20	NB-100285733	31/12/2028	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-10069743	28/09/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.713.114,20	NB - 100295860	31/12/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.928.278,55	NB - 100295860	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.569.671,30	NB - 100295860	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100285733	20/11/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

VEREDA TIERRA NUEVA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.628.575,20	NB-100290326	18/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 9.907.143,80	NB-100290326	18/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 59.442.82,80	NB-100290326	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Labores Y Operaciones	$ 232.000.000,00	NB-100071275	18/10/2023	31/12/2023
Patronal	$ 232.000.000,00	NB-100071275	18/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 232.000.000,00	NB-100071275	18/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$ 232.000.000,00	NB-100071275	18/10/2023	31/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4636 - 2023		
CONTRATISTA:	G & G NGENIEROS SAS	NIT:	800208226-4
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 74.137.162,00		
VALOR ADICIONES:	$ 19,024,963,00		
ADICIÓN 1:	$ 19,024,963,00		
VALOR ACTUAL:	$ 93.162.125,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA 1:	15/03/2024		
PRORROGA 2:	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1294623	10	NACIÓN	$ 74.137.162,00	$ 26.729.383	$ 47.407.779,00
1294623	10	NACIÓN	$ 19,024,963,00	$ 0	$ 19,024,963,00
TOTAL	**…**	**…**	**$ 93.162.125,00**	**$ 26.729.383**	**$ 66.432.742,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta costos No.3	Feb-24	$ 8.925.000	$ 1.695.750	…	$ 10.620.750

Acta costos No.4	Mar-24	$ 13.536.667	$ 2.571.967	…	$ 16.108.633
TOTAL		**$ 22.461.667**	**$ 4.267.717**		**$ 26.729.383**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.4 para el período de marzo de 2024 el contrato reporta un avance de 28,69%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 0%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
1	28/12/2023	$ 19,024,963,00

PRORROGAS

	Fecha	Periodo

Convenio Adicional No.		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	28/12/23	01/01/2023	15/03/2024
2	15/03/2024	15/03/2024	30/04/2024

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 7.413.716,20	CG-1050212	23/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 14.827.432,40	CG-1050212	23/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 22.241.148,60	CG-1050212	23/11/2023	31/12/2024

PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.316.212,50	CG-1050212	14/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.632.425,00	CG-1050212	14/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 27.948.637,50	CG-1050212	14/12/2023	31/12/2024

PÓLIZA PRORROGA No.2

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.316.212,50	CG-1050212	14/12/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.632.425,00	CG-1050212	14/12/2023	31/04/2027
Calidad del Servicio	$ 27.948.637,50	CG-1050212	14/12/2023	30/04/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.

Cordialmente,

_____

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV
