INFORME FINAL



2467 - 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

PRESENTADO A:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDIFICACIÓN DICAC

14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE MARZO DEL 2024

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 4
2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
2.1 . Localización de la zona de influencia de la agrupación 4 5
3 INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO 6
3.1 Ficha técnica interventoría. 6
3.2 Ficha técnica del contratista. 7
4 ASPECTOS TECNICOS 8
4.1 Descripción del Avance general del contrato programado vs ejecutado, incluye plan de contingencia. 8
4.2 Gráfico resumen de la Programación de Obra 12
4.3 Relación de Informes semanales 12
4.4 Control y manejo de equipos y/o maquinaria 12
4.5 Relación de la Información climática 12
4.6 Relación de Certificados de calidad de materiales 24
4.7 Revisión de especificaciones técnicas contractuales 24
4.8 Control de personal 25
4.8.1 Contratista 25
4.8.2 Interventoría 26
4.9 Control de ensayos 27
4.10 Relación de comités de obra y/o visitas de obra. 27
4.11 Relación de APUS Ítems no previsto o complementario 27
4.12 Bitácora de obras 28
5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 29
5.1 Relación de solicitudes de prórroga 29
5.2 Relación de solicitudes de adiciones 29
5.3 Relación de solicitudes de suspensiones 30
5.4 Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato 30
5.5 Relación de correspondencia enviada y recibida 30
5.5.1 Correspondencia enviada 30
5.5.2 Correspondencia recibida 45
6 ASPECTOS FINANCIEROS CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACION 77
6.1 CONTRATISTA DE OBRA 77
6.1.1 Programación financiera, Programado vs ejecutado 77

6.1.2 Relación de pagos realizados 79
6.1.3 Equilibrio económico o financiero del contrato de obra 80
6.2 Relación de Actas de mayores y menores cantidades 87
6.3 Relación de actas de recibo parcial y/o final 87
6.4 Actas de justificación de cantidades mayores y menores 87
6.5 Memorias de cantidades de campo 87
6.6 INTERVENTORÍA 88
6.6.1 Relación de pagos realizados 88
7 ASPECTOS LEGALES 89
7.1 Actualización del estado de las pólizas 89
7.1.1 Pólizas contratista 89
7.1.2 Pólizas de la interventoría 90
7.2 Informe detallado de incumplimiento del contratista de obra en caso de que se aplique 91
7.3 Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de obra 91
7.4 Impactos generados 91
7.5 Tratamiento y manejo de RCD 92
7.6 Fichas ambientales 92
7.7 Control conservación materiales Orden y aseo 93
7.8 Otras actividades realizadas 93
7.8.1 Seguridad y salud en el trabajo 93
7.8.2 Relación de actividades de alto riesgo 94
7.8.3 Programa de capacitaciones, inducción y reinducción 97
7.8.4 Reunión COPASST 98
7.8.5 Personal del contrato y verificación de aportes SST 100
7.8.6 Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la ejecución del contrato 102
7.8.7 Registro de entrega EPP y dotación 102
7.8.8 Inspecciones planeadas 102
8 LISTADO DE TABLAS 103
9 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS 11 ORIP 104
10 ANEXOS 130
11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 136

1 INTRODUCCIÓN

Se pretende dotar a los funcionarios e instalaciones físicas donde se ejerce la función pública registral, de elementos que permitan una correcta, segura y eficiente prestación del servicio a su cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, así como instalaciones adecuadas para los usuarios del servicio.

Es prioridad de la SNR brindar a los usuarios y funcionarios toda la comodidad necesaria para utilizar los servicios que ofrecen las Oficinas de Registro, a través de espacios funcionales, adecuados y seguros, así mismo cubiertas en buen estado.

Así mismo, garantizar a los funcionarios un ambiente laboral agradable, cómodo y seguro por medio de espacios que permitan el buen desempeño de sus funciones, con el fin de lograr que la dependencia a la que pertenecen y por último la misma Superintendencia y Oficinas de Registro, se vean beneficiadas en los resultados obtenidos.

Actualmente, algunos inmuebles donde funcionan las oficinas de registro presentan inconvenientes en su infraestructura física tales como: filtraciones y goteras en la cubierta, humedades en cielorraso y paredes, taponamientos de tuberías de aguas lluvias, lámparas de iluminación en mal estado u obsoletos, problemas en los aparatos sanitarios, instalaciones hidráulicas con goteras, puertas y ventanas en mal estado presentando inseguridad en las edificaciones; lo que trae como consecuencia el deterioro paulatino del inmueble y mayores recursos para su mantenimiento.

Se presentará un informe al supervisor para su respectiva revisión y aprobación. En caso de presentarse observaciones por parte del supervisor se harán las correcciones pertinentes presentando finalmente un informe original para el contrato de interventoría.

La Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de dotar a los funcionarios de unas instalaciones apropiadas donde se ejerce la función pública, de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación del servicio a su cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, ha determinado desarrollar el proceso para ejecutar el mantenimiento y adecuación de las ORIP.

2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1 . Localización de la zona de influencia de la agrupación 4

CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 4				
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR OBRA
1	ANDINA	RISARALDA	SANTUARIO	Calle 6 No. 4 - 15
2		ANTIOQUIA	ITUANGO	Carrera 18 No. 18 – 42
3			TAMESIS	Calle 11 No. 9 - 46
4			TITIRIBI	Carrera 21 No. 18 - 51
				carrera 31 No. 28 - 22
6			AMALFI	Calle 20 No. 21 - 58
7			CAUCASIA	Calle 20 B No. 12 - 45, Centro Administrativo Municipal
8			SEGOVIA	Carrera 48 No. 48 - 47
9			YARUMAL	Carrera 21 N° 18-38, Bario Centro
10			JERICO	Calle 8 No. 3 - 02
11			ANDES	Carrera 50 No. 48 - 14

Ilustración 1 Municipios a intervenir

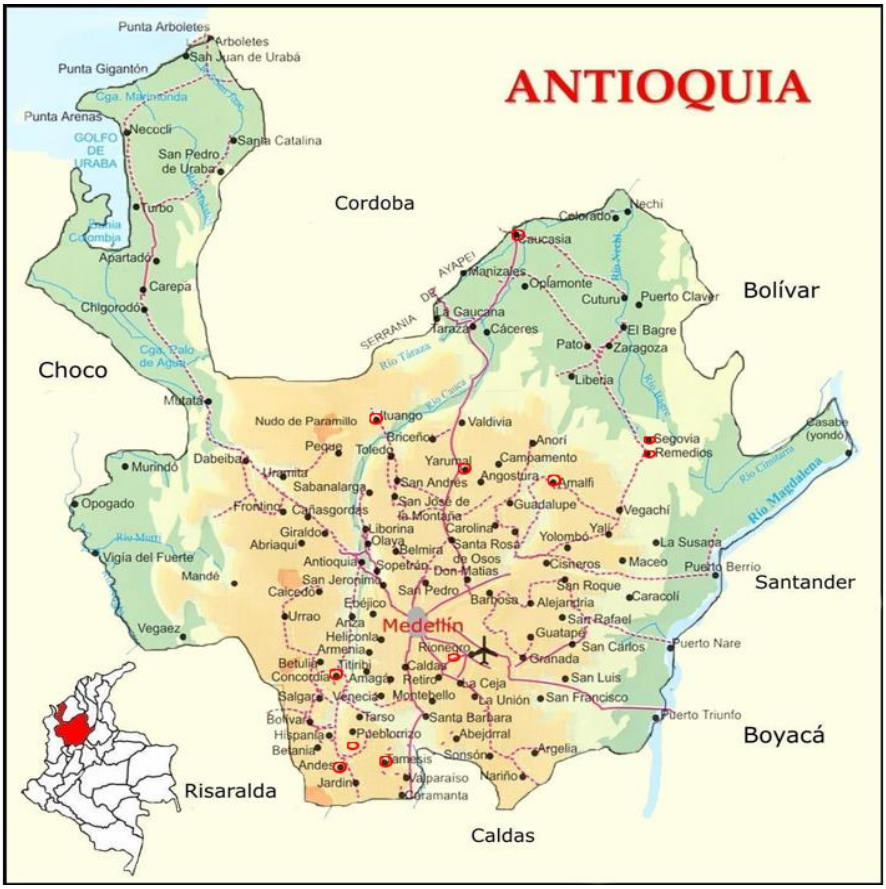


Ilustración 2 Contexto locativo de las ilustraciones



Ilustración 3 Contexto locativo - Risaralda

3 INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1 Ficha técnica interventoría.

FICHA TECNICA DEL CONTRATO INTERVENTORIA	
FECHA DE ELABORACION DE LA FICHA	15 DE MARZO DE 2024
CONTRATO N.º	2467 DE 2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE RESGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)". 4).
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIÓN DICAC
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 101.514.921
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 101.514.921
ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA	$ 0
TIEMPO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INICIAL	3 MESES
FECHA DE INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA # 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15 DE MARZO DEL 2024
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	0,00%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO CON EL ANTICIPO	0,00%
INFORMES ENTREGADOS	**PERIODO INTERVENIDO**
INFORME # 1	DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 16 DE DICIEMBRE 2023
INFORME # 2	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 16 DE ENERO 2024
INFORME # 3	DEL 16 DE ENERO 2024 AL 15 DE FEBRERO 2024
VALOR EJECUTADO (ACTAS BRUTAS)	$ 101.514.920,64
SALDO ANTICIPO (ANT. ENTRE. MENOS AMORTIZACIONES)	$ 0
SALDO CONTRATO	$ 0

Tabla 1 Ficha de interventoría

3.2 Ficha técnica del contratista.

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA		
FECHA DE ELABORACION DE LA FICHA		15 DE MARZO DE 2024
CONTRATO Nº		2392 DE 2023
OBJETO		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR		CONSORCIO EDIFICACIÓN DICAC
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 620.102.785
ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA, 30%		N/A
ADICIÓN		N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIÓN		$ 620.102.785
FECHA DE INICIO		16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL		31 DE DICIEMBRE DEL 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		2 MESES Y VEINTE DÍAS
PRORROGA # 1 EN TIEMPO		15 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA		
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		PARA EL CORTE DEL PRESENTE INFORME SE PRESENTA EL COBRO # 1 DEL CONTRATISTA, PERO A LA FECHA NO SE HA PAGADO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, POR LO TANTO, EL AVANCE ES 0%, PERO SE RELACIONA EL COBRO PRESENTADO.
COBRO Nº 1	VALOR BRUTO	$ 121.635.512
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
	VALOR ACTA	$ 121.635.512
COBRO Nº 2	VALOR BRUTO	$ 391.658.704
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
	VALOR ACTA	$ 391.658.704
COBRO Nº 3	VALOR BRUTO	$ 96.528.285,72
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
	VALOR ACTA	$ 96.528.285,72
VALOR EJECUTADO (ACTAS BRUTAS)		$ 609.822.501,80
SALDO ANTICIPO (ANT. ENTRE. MENOS AMORTIZACIONES)		N/A
SALDO CONTRATO		$ 10.280.283,68

Tabla 2 Ficha del Constructor

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 Descripción del Avance general del contrato programado vs ejecutado, incluye plan de contingencia.

Para el presente contrato la interventoría presta la supervisión a la intervención de mejoramientos locativos de 11 ORIP de las cuales 10 se encuentran en el departamento de Antioquia y 1 en el departamento de Risaralda así:

CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 4			
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	ANDINA	RISARALDA	SANTUARIO
2		ANTIOQUIA	ITUANGO
3			TAMESIS
4			TITIRIBI
5			MARINILLA
6			AMALFI
7			CAUCASIA
8			SEGOVIA
9			YARUMAL
10			JERICO
11			ANDES

Ilustración 4 Cuadro resumen agrupación No.4

Se realizaron visitas de Diagnóstico inicial a cada una de las ORIP, en esta visita se evalúo el presupuesto de cada ORIP y se ajustó a las necesidades de cada una de las oficinas, esto se dio en su mayoría porque algunas de las actividades que se contemplaban ya habían sido realizadas, para este informe se relacionan todos los balances iniciales con sus respectivas actas de justificación de cantidades mayores y menores ejecutadas.

Se presenta a continuación el cuadro con los avances de cada Orip según el seguimiento de la interventoría.

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PORCENTAJE EJECUTADO A CORTE 15/03/2024	PORCENTAJE PROYECTADO A EJECUTAR A CORTE 15/02/2024
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).	16/11/2023	31/12/2023	**100%**	**100%**
ORIP AMALFI	21/11/2023	9/12/2023	100%	100%
ORIP SEGOVIA	28/11/2023	30/12/2023	100%	100%
ORIP CAUCASIA	5/12/2023	30/12/2023	100%	100%
ORIP YARUMAL	11/12/2023	31/01/2024	100%	100%
ORIP ITUANGO	11/12/2023	30/12/2023	100%	100%
ORIP MARINILLA	28/11/2023	25/12/2023	100%	100%
ORIP TITIRIBI	7/12/2023	15/02/2024	100%	100%
ORIP ANDES	29/11/2023	20/12/2023	100%	100%
ORIP JERICO	28/11/2023	31/01/2024	100%	100%
ORIP TAMESIS	28/11/2023	29/12/2023	100%	100%
ORIP SANTUARIO RISARALDA	18/12/2023	31/01/2024	100%	100%

Tabla 3 Relación avance por ORIP

Se realizaron las respectivas visitas en campo, para el recibo de las obras realizadas en las orip mencionadas anteriormente, en compañía de la Supervisión, interventoría y contratista, en estas visitas se verificaron los acabados, cantidades de obra ejecutadas y los materiales utilizados en estas, se realizó el acta de recibo final con cada uno de los registradores.

En las ORIP de Ituango, Támesis, Marinilla y Segovia no se ejecutó la actividad de placas de señalización principalmente la braille, por falta especificaciones técnicas para su elaboración, por lo tanto, en el recibo final se acordó no ejecutar estas actividades y darse de baja en el presupuesto, saldo que queda a favor de la entidad.

Ver Carpeta de Liquidación Técnica - Anexo 32 Acta de entrega y recibo de las orip (con observaciones y recibo final de la obra por parte de la supervisión)

Los documentos entregados por el contratista para la liquidación son mencionados a continuación y su vez forman parte integral del presente informe final como anexos del mismo.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION.

ITEM	DESCRIPCIÓN LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS	OBSERVACIONES
1	Informes tecnicos final, mensuales y semanales.	ok
2	Convenio interadministrativo	EL ING. CEILER DEBE EMITIR EL ARCHIVO
3	Contrato de obra.	ok
4	Cronograma y flujo de inversión	ok
5	Pólizas del contrato y actualizadas al acta de terminacion.	ok
6	Propuesta inicial	ok
7	Presupuesto general del contrato (PDF Y EXCEL)	ok
8	Apus de ITEMS originales (PDF Y EXCEL)	ok
9	Aprobación de ítems no previstos	ok
10	Apus de Items no previstos (PDF Y EXCEL)	ok
11	Comparación y fijación de precios no previstos.	NO APLICA ESTA REPETIDO
12	Especificaciones técnicas ÍTEMS no previstos.	ok
13	Cotizaciones Items No previstos	ok
14	Acta de mayores y menores cantidades E items No previstos (PDF Y EXCEL) por cada orip	ok
15	Acta de recibo parcial por cada corte de la orip.	ok
16	Cobros realizados por cada orip.	ok
17	Especificaciones técnicas	ok
18	Fichas tecnicas de los materiales utilizados.	ok
19	Control equipos de medición (si aplica).	NO APLICA
20	Certificación de calibración de los equipos de medición (si aplica).	NO APLICA
21	Control de inspección y ensayos (si aplica).	NO APLICA
22	Resultados de ensayos de laboratorio (si aplica).	NO APLICA
23	Control de correspondencia (correos y oficios)	ok
24	Planos record, medio magnético (DWG), impreso y suscrito por el municipio, contratista e interventoría.	ok
25	Libro bitácora.	ok
26	Manual de USO y MANTENIMIENTO , con acta de entrega y socializacion de ese manual.	ok
27	Registro fotográfico. (Antes, durante y después).	ok
28	Acta de inicio de obra	ok
29	Actas de comité	ok
30	Solicitud de adición presupuestal o prórrogas.	ok
31	Acta de terminación de contrato de obra.	ok
32	Acta de entrega y recibo de las orip (con observaciones y recibo final de la obra por parte de la supervision)	ok
33	Acta de cambio de especificaciones	NO APLICA

LISTA DE DOCUMENTOS SST		
1	Informe final SST que contenga consolidado de indicadores de cumplimiento de planes de trabajo y programas ejecutados durante el proyecto.	ok
2	Paz y salvo y copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador.(Personal contractual)	ok
3	Paz y salvo mano de obra. Personal operativo relacionado en el control del personal, se hace enfasis en esta debido a quejas presentadas por los registradores, donde los oficiales presentan saldos pendientes por liquidar.)	ok
4	Paz y salvo proveedores, empresas de servicios públicos. (se hace enfasis en esta debido a quejas presentadas por los registradores, donde los proveedores presentan saldos pendientes por liquidar.)	NO APLICA
5	Directorio de contactos direcciones de subcontratistas proveedores.	NO APLICA
6	Control de personal (Listado de personal incorporado durante el periodo de ejecución y planillas de pago mes a mes)	ok
7	Pagos de FIC propios y de subcontratista.	ok
8	Registro fotográfico mes a mes de las actividades ejecutadas en materia SST separadas por carpeta.	ok
9	Paquete completo accidentes laborales (Incluye: Furat, lección aprendida, investigación, aplicación del plan de acción, seguimiento de recomendaciones y cierre del accidente.)	NO APLICA
10	Certificado de reincorporación laboral después de quince días de incapacidad	NO APLICA
11	Planillas de seguridad social propias y de subcontratistas, con su respectivo cuadro de seguimiento	ok
12	Copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador. (Relacionarlo con listado de personal con nombres, apellidos, número de cédula, cargo, fecha ingreso y fecha de retiro).	OK
13	Cartas de continuidad del personal que es trasladada para otro proyecto (Propios y de Subcontratistas, adjuntar adicional un listado del personal)	OK
14	Soportes de autorización de examen de egreso o renuncia del mismo, y si lo realizaron adjuntar dichos exámenes.	OK
15	Control de maquinaria y equipos (Certificados e inspeciones)	OK
16	Paz y salvo Ministerio de trabajo: Certificación de no reclamaciones, investigaciones y sanciones laborales de empresas expedido por dirección territorial de Ministerio del trabajo.	OK
19	Certificado de paz y salvo de parafiscales, nómina, seguridad social, SENA,ICBF, CCF emitido por contador(a) y/o revisor fiscal adjuntando copia de tarjeta profesional y cédula.	OK
LISTA DE DOCUMENTOS AMBIENTAL		
1	Informe final y consolidado de indicadores con registro fotográfico.	ok
2	Licencia Ambiental: Planes manejo ambiental, informes e inversión de PMA.	ok
3	Certificado de materiales petreos (Cantera).	NO APLICA
4	Licencia ambiental de la escombrera	NO APLICA
5	Certificado de paz y salvo canteras	NO APLICA
6	Fichas ambientales y las evidencias de su cumplimiento	ok
7	Certificacion sitio de disposición final de escombros	ok
8	Certificación de paz y salvo disposición de escombros	NO APLICA
9	Actas de vecindad (apertura y cierre).	ok
NOTA	Se debe montar la documentación en drive para su revisión, una vez aprobada se deben subir los documentos de liquidación al secop II.	

4.2 Gráfico resumen de la Programación de Obra

Se adjuntan los cronogramas de obra y las respectivas aprobaciones por parte de la interventoría

Ver Carpeta de Liquidación Técnica - Anexo 4 Cronograma y flujo de inversión

4.3 Relación de Informes semanales

Se anexan los informes mensuales y semanales tanto de obra como de interventoría.

Ver Carpeta de Liquidación Técnica - Anexo 1 - Informes técnicos final, mensuales y semanales.

4.4 Control y manejo de equipos y/o maquinaria

Para la fecha del presente informe ya se ha terminado el contrato de obra y no se realizan actividades en obra, se anexa las inspecciones realizadas en meses pasados.

Para este proyecto se realizan mejoramientos locativos en los cuales se hizo uso de herramienta menor, estos utensilios recibieron su respectiva inspección.

Se valida en conjunto con el constructor el diligenciamiento de las inspecciones programadas en la duración del proyecto y se concluye que se realizaron las siguientes:

- Inspecciones de estado de elementos de protección personal
- Inspecciones preoperacionales de los equipos empleados en los diferentes procesos constructivos (pulidora, taladro, Martillo demoledor, extensiones eléctricas)
- Inspección de herramientas manuales
- Inspección de orden y aseo

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL – Anexo 11 - INSPECCIONES PLANEADAS)


4.5 Relación de la Información climática

La simulación del archivo de historia proporciona acceso a simulaciones climáticas para cualquier lugar en el mundo. Usted puede ver información sobre el tiempo de


ayer o la historia meteorológica de los últimos años. Los diagramas del archivo meteorológico se dividen en tres gráficos:

- Temperatura, incluyendo la humedad relativa en intervalos de una hora.
- Nubes (fondo gris) y cielo claro (fondo amarillo). Cuanto más oscuro es el fondo gris, es más densa la cubierta de nubes.
- Velocidad y dirección del viento (en grados desde 0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur y 270° = Oeste). En el meteograma del archivo histórico, los puntos morados representan la dirección del viento, como se muestra en el eje derecho.


A continuación, se relaciona el comportamiento del clima en el periodo 16 de noviembre de 2023 al 15 de febrero de 2024 en los diferentes municipios donde se adelantaron las labores y fecha hasta la cual fue el contrato de obra.

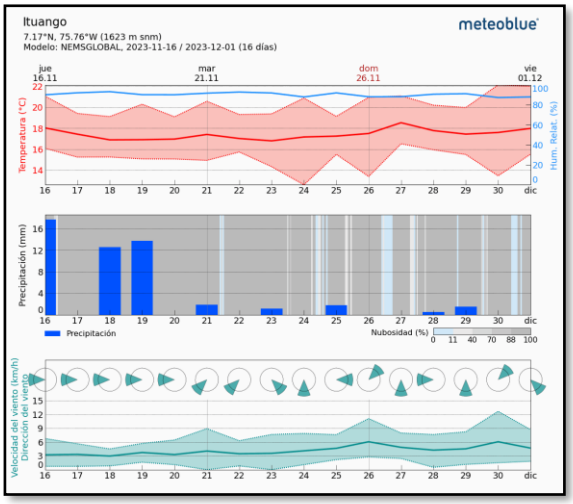


16 al 30 de noviembre de 2023

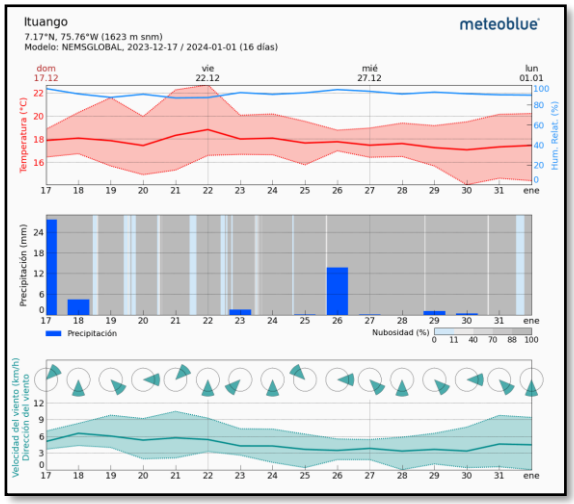

01 al 30 de diciembre de 2023

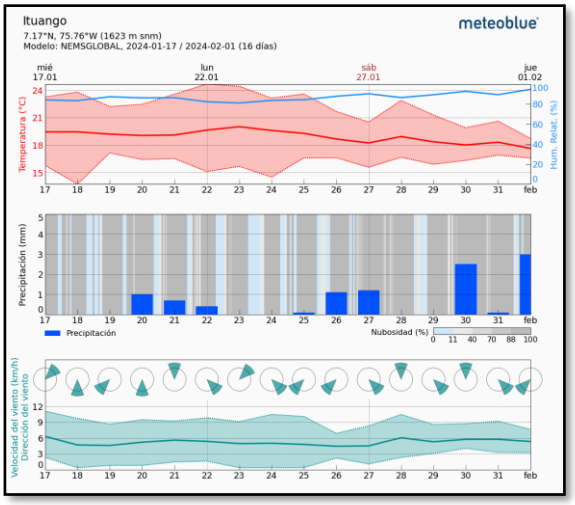


01 al 30 de enero de 2024

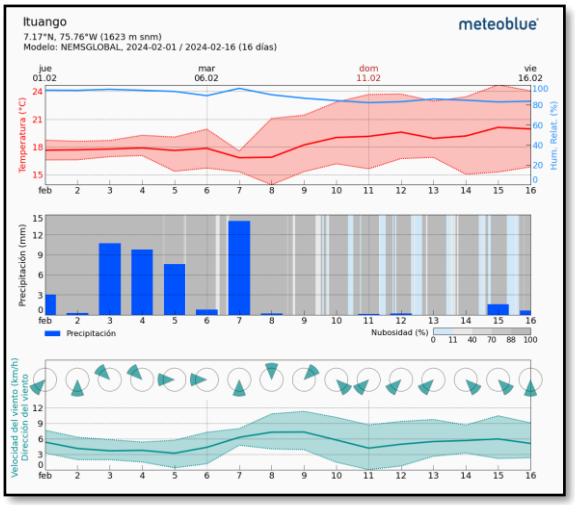


01 al 15 de febrero de 2024


Imagen No. 2 clima Municipio de ITUANGO, Tomada de información (info@meteoblue.com)

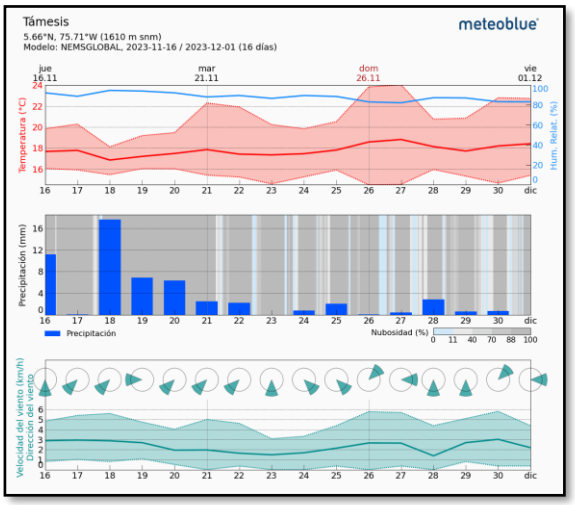


16 al 30 de noviembre de 2023

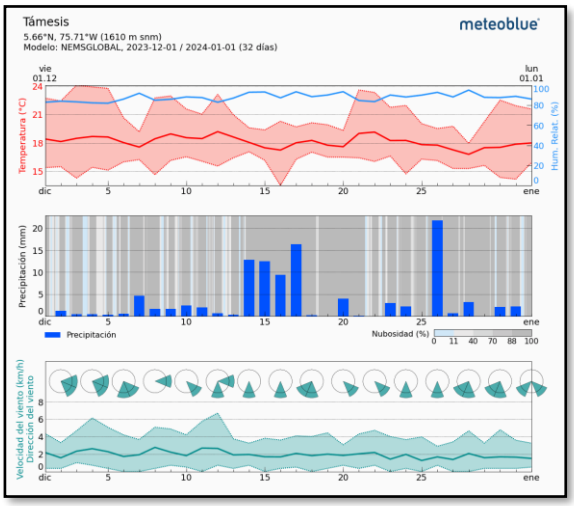

01 al 30 de diciembre de 2023

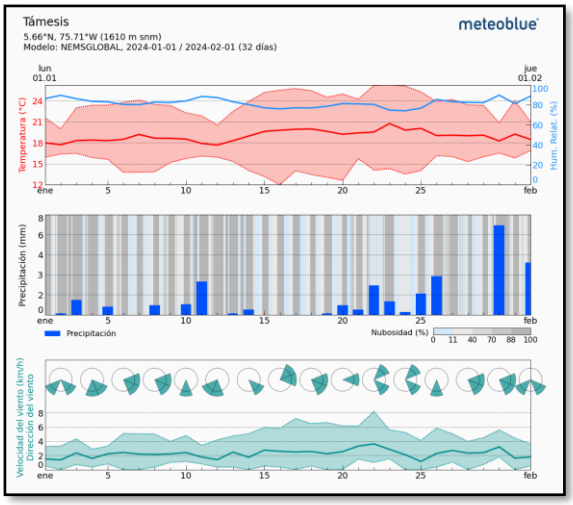


01 al 30 de enero de 2024

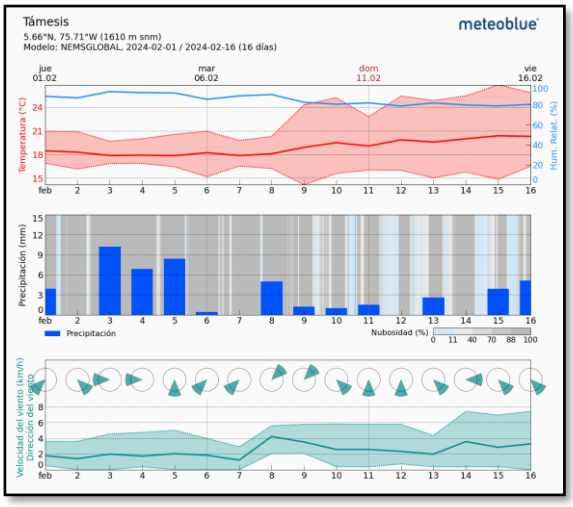


01 al 15 de febrero de 2024


Imagen No. 3 Tomada de información (info@meteoblue.com)

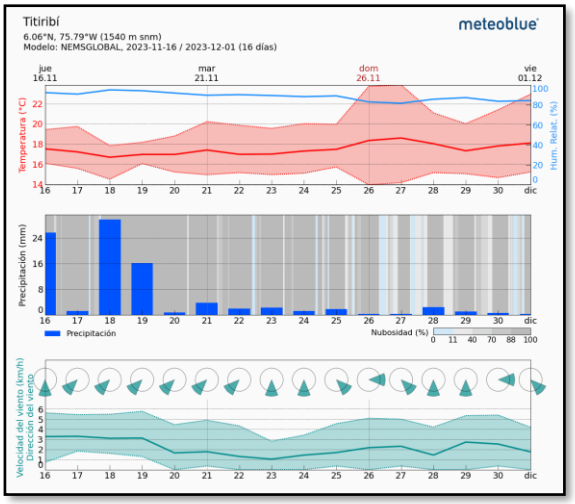


16 al 30 de noviembre de 2023

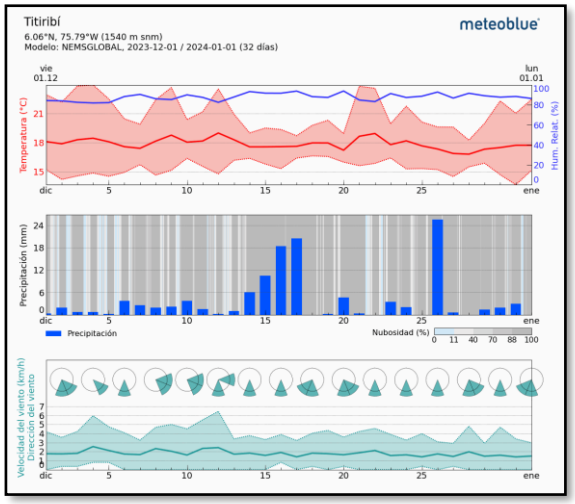

01 al 30 de diciembre de 2023

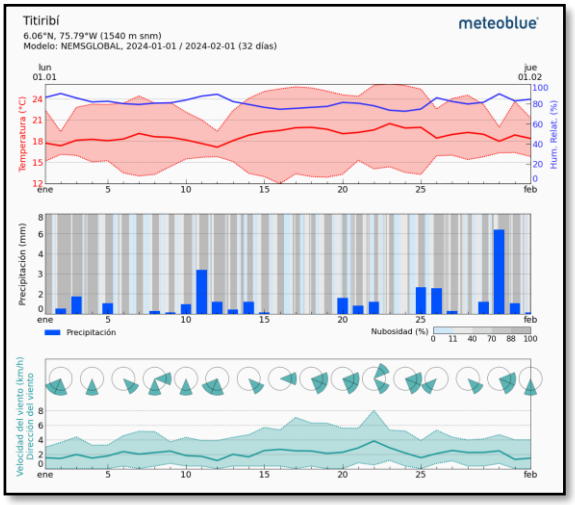


01 al 30 de enero de 2024

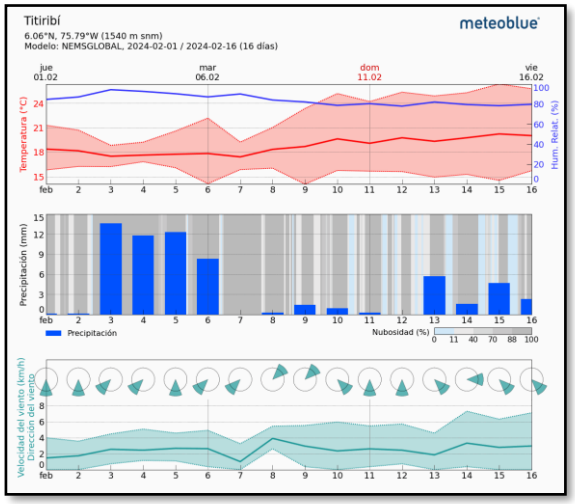


01 al 15 de febrero de 2024


Imagen No. 4 Tomada de información (info@meteoblue.com)

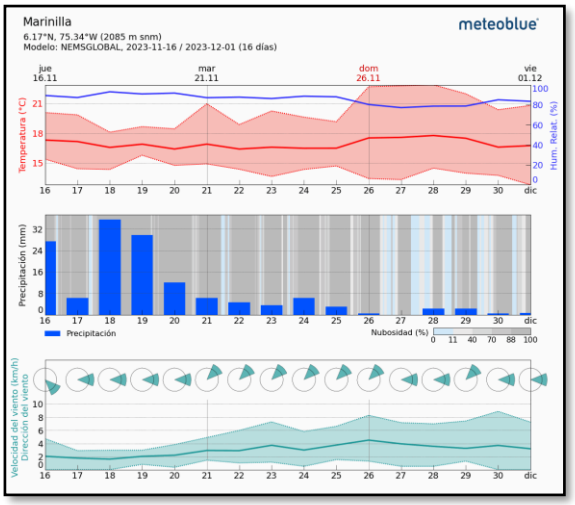


16 al 30 de noviembre de 2023

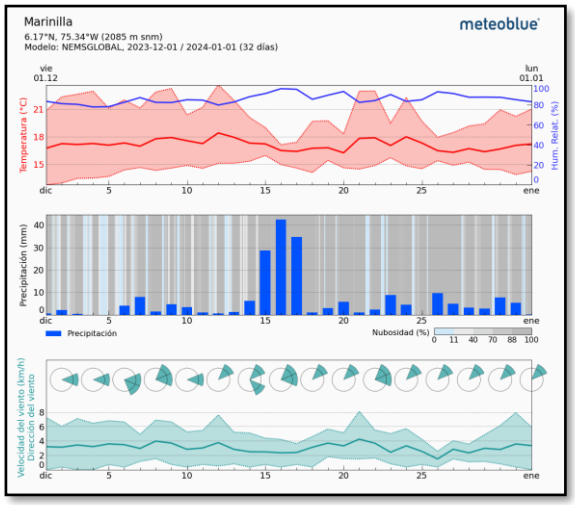

01 al 30 de diciembre de 2023

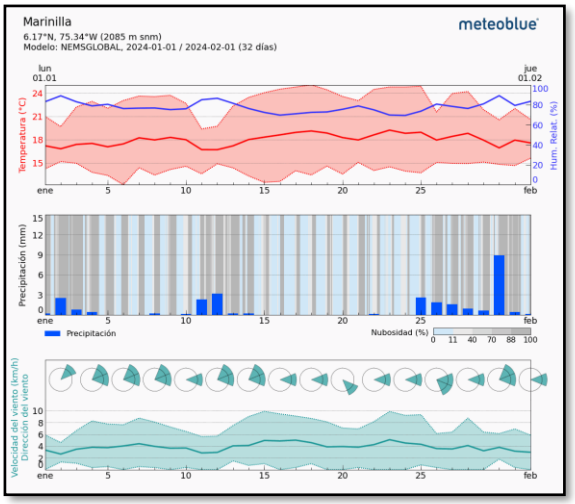


01 al 30 de enero de 2024

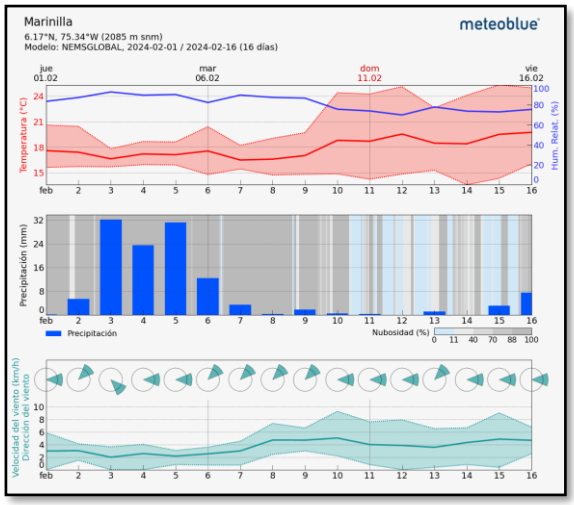


01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 5 Tomada de información

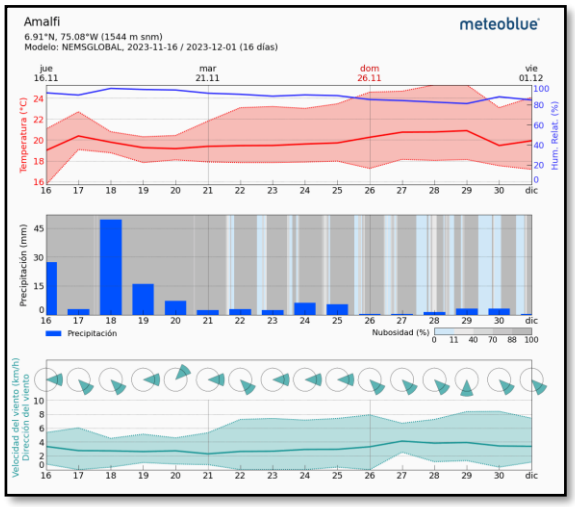


(info@meteoblue.com)


16 al 30 de noviembre de 2023

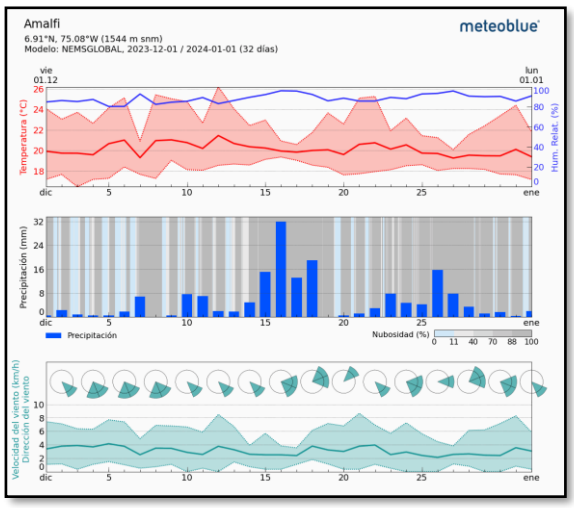

01 al 30 de diciembre de 2023

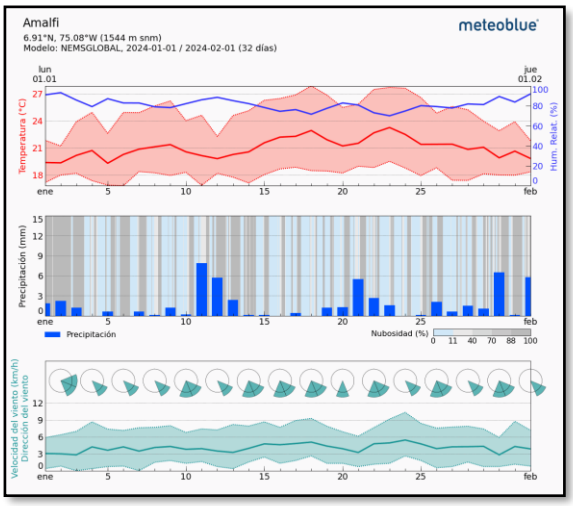


01 al 30 de enero de 2024

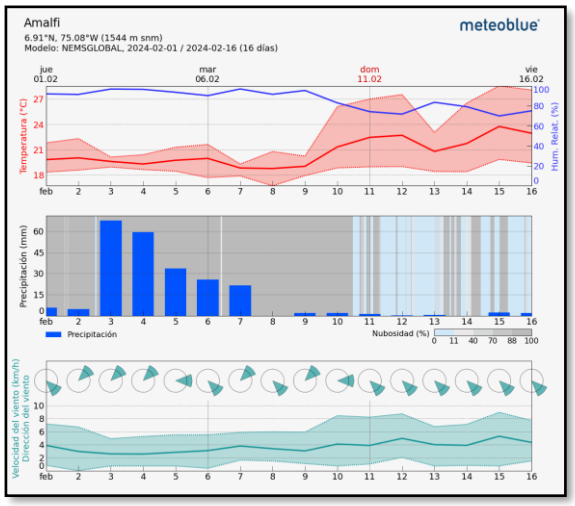


01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 6 Tomada de información

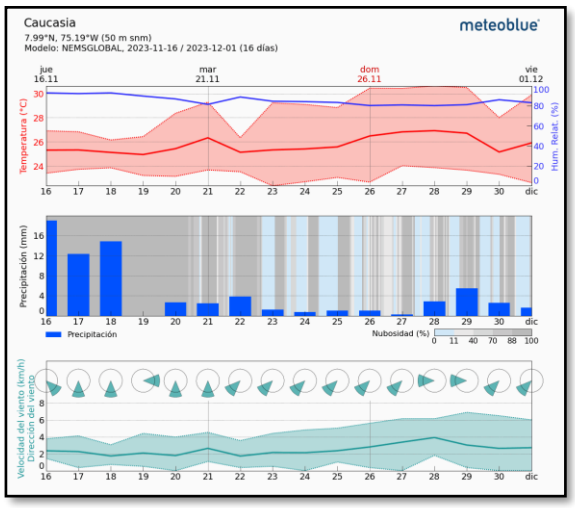


(info@meteoblue.com)


16 al 30 de noviembre de 2023

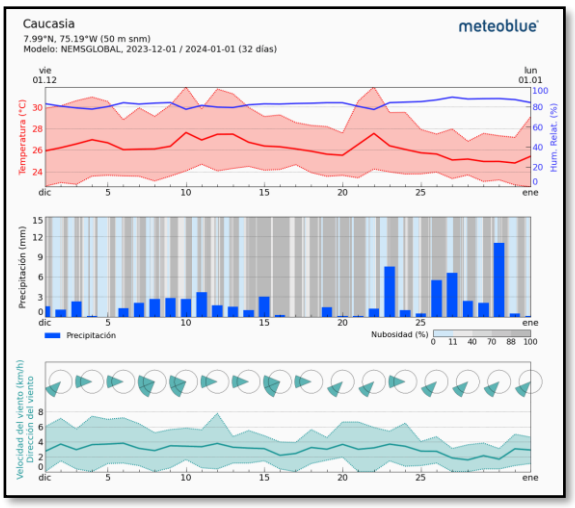

01 al 30 de diciembre de 2023

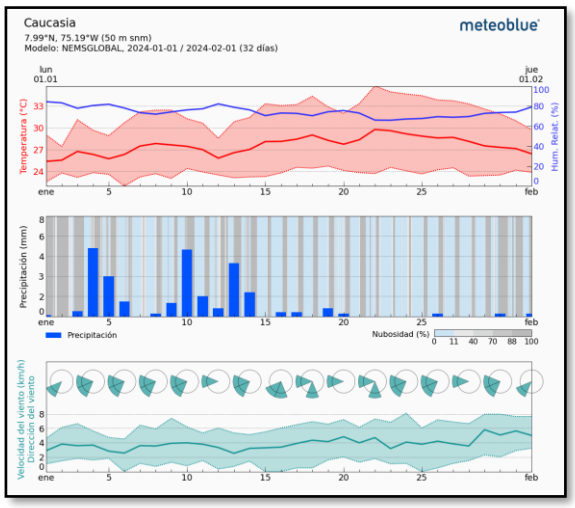


01 al 30 de enero de 2024

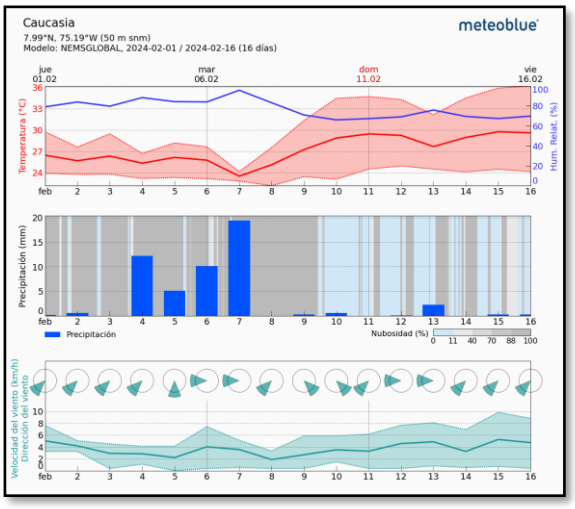


01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 7 Tomada de información

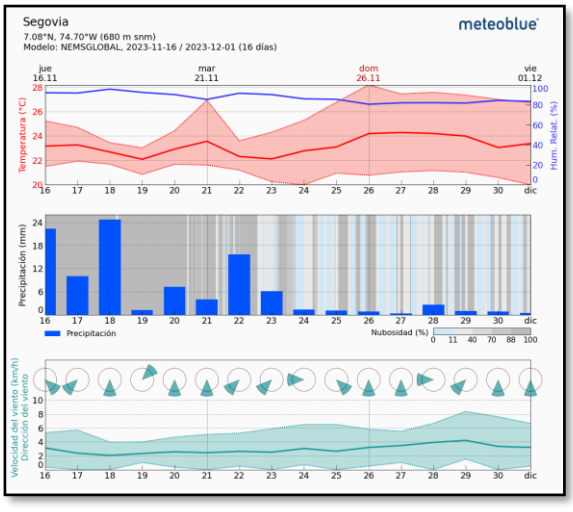


(info@meteoblue.com)


16 al 30 de noviembre de 2023

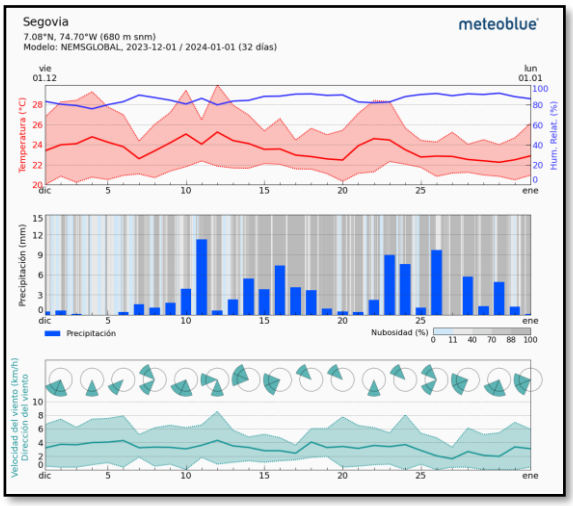

01 al 30 de diciembre de 2023

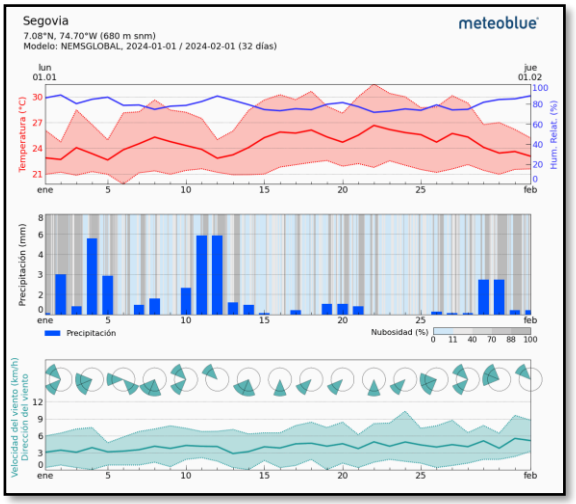


01 al 30 de enero de 2024

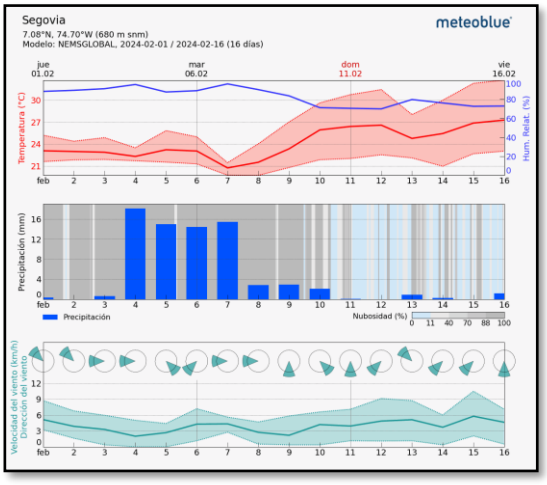


01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 8 Tomada de información

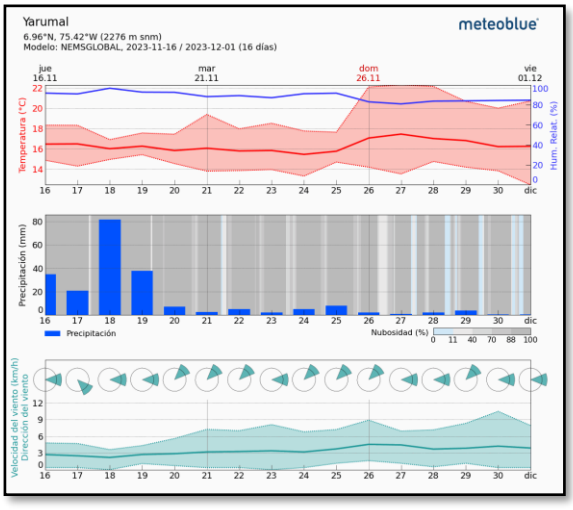


(info@meteoblue.com)


16 al 30 de noviembre de 2023

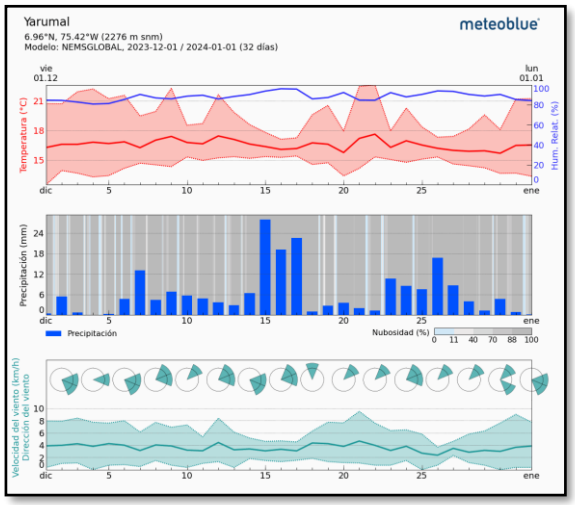

01 al 30 de diciembre de 2023

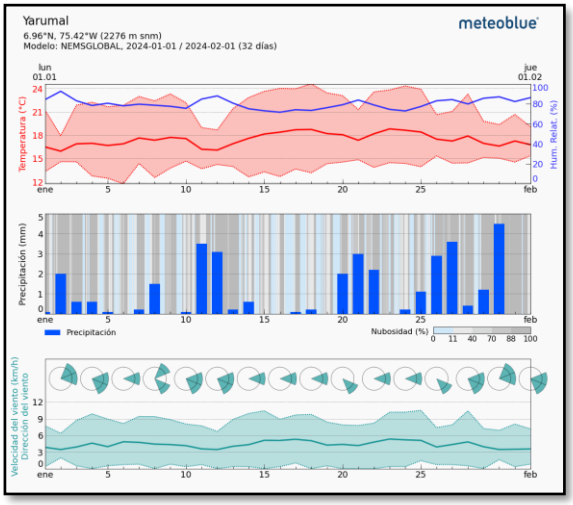


01 al 30 de enero de 2024

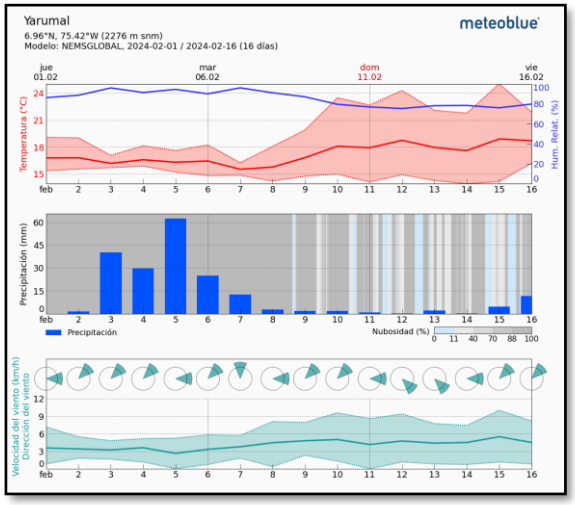


01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 9 Tomada de información

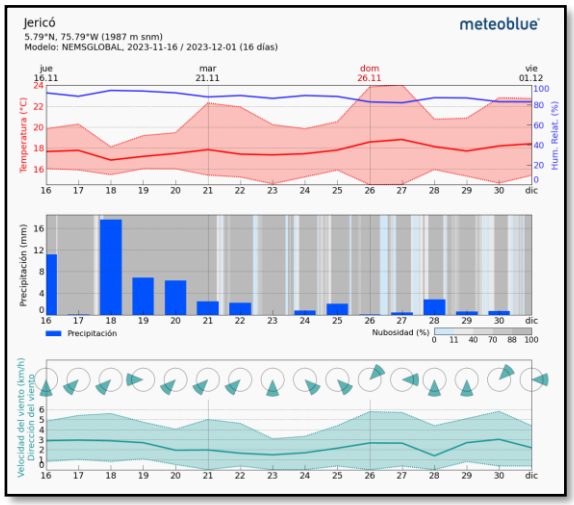


16 al 30 de noviembre de 2023

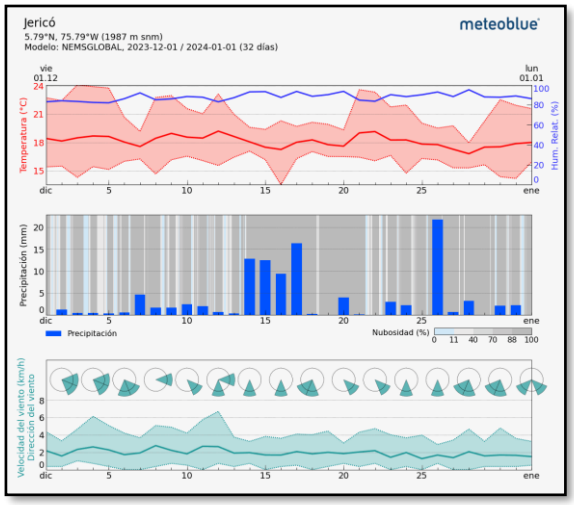


(info@meteoblue.com)

01 al 30 de diciembre de 2023

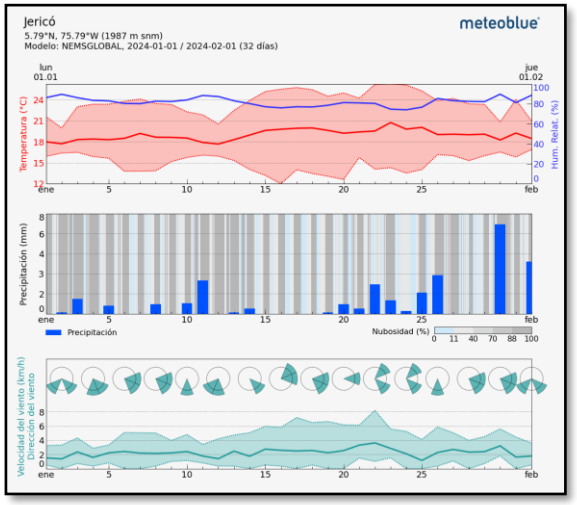


01 al 30 de enero de 2024

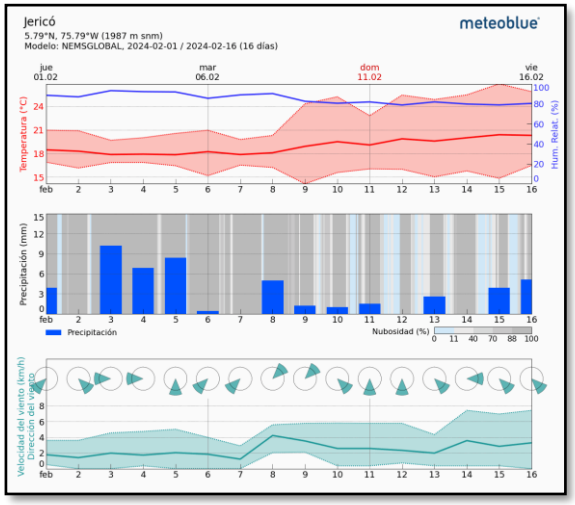


01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 10 Tomada de información

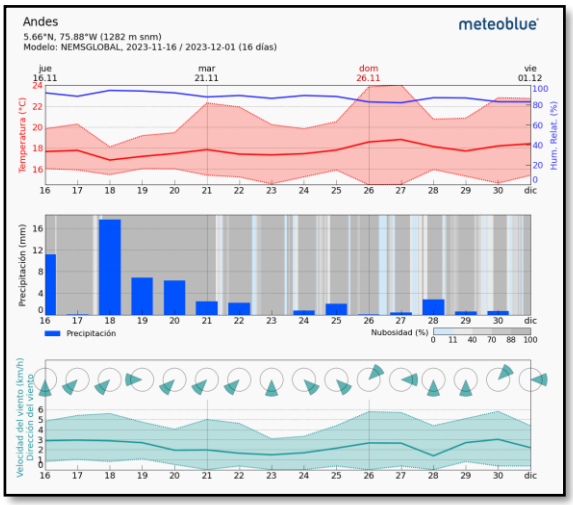


16 al 30 de noviembre de 2023

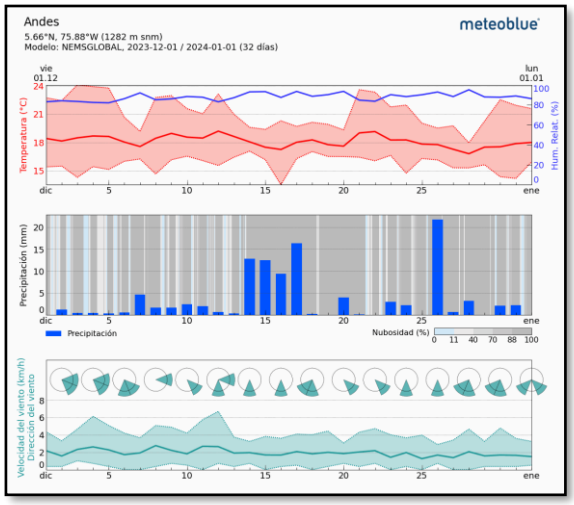


(info@meteoblue.com)

2023


01 al 30 de diciembre de

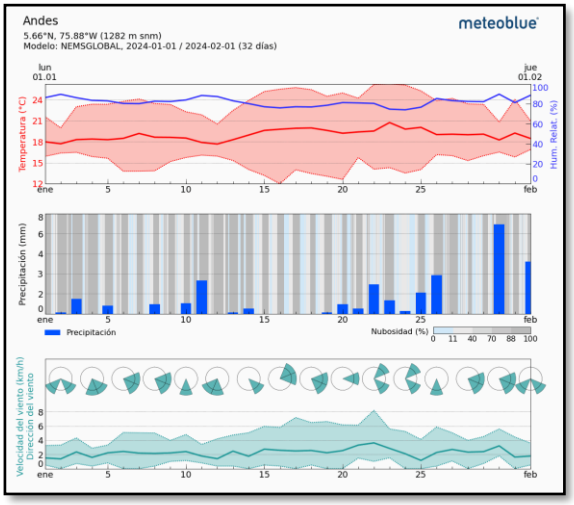


01 al 30 de enero de 2024

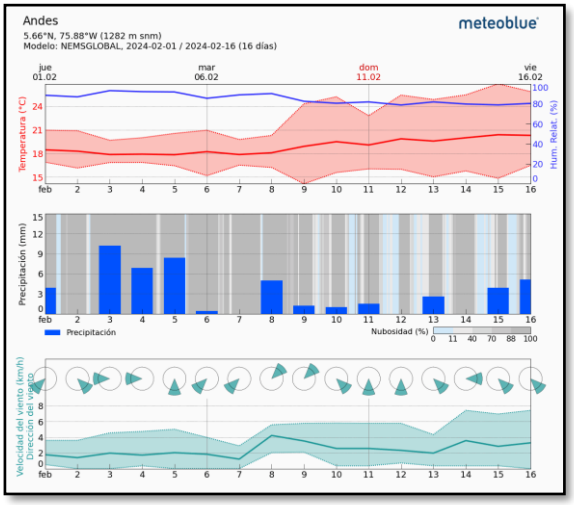

01 al 15 de febrero de 2024

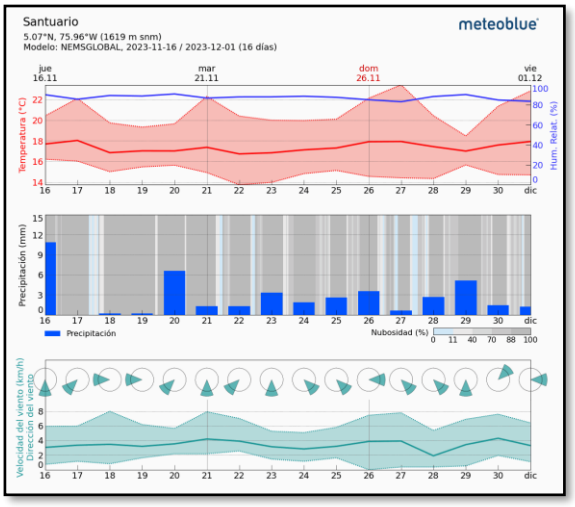


16 al 30 de noviembre de 2023

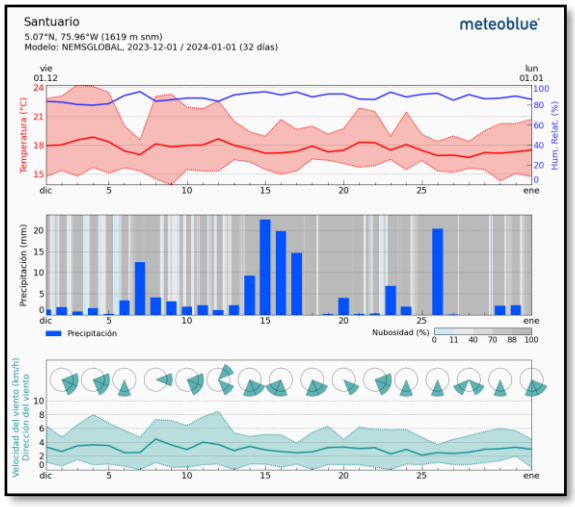


01 al 30 de diciembre de 2023

Imagen No. 11 Tomada de información (info@meteoblue.com)

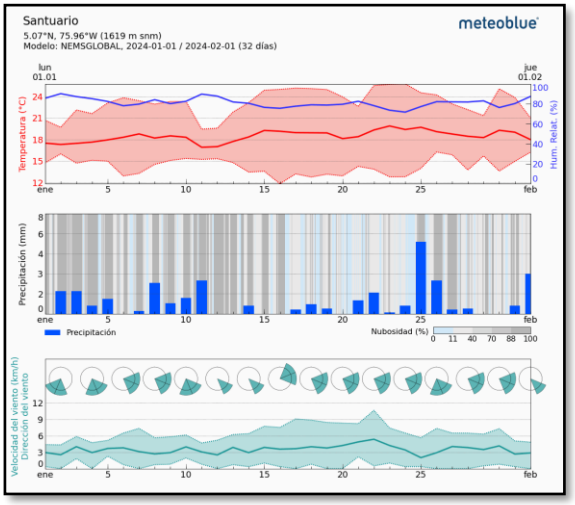

01 al 30 de enero de 2024

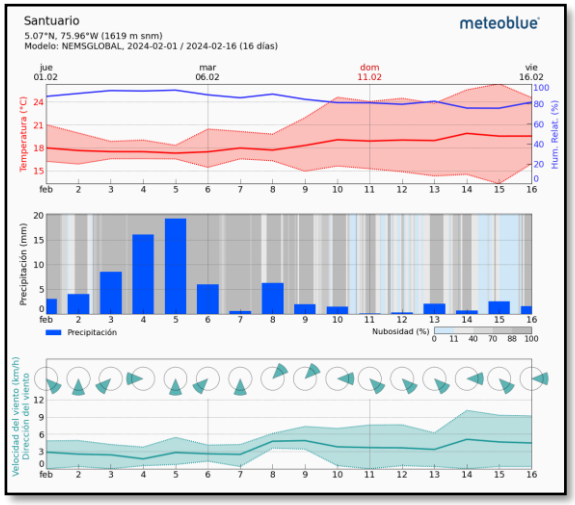

01 al 15 de febrero de 2024

Imagen No. 12 Tomada de información (info@meteoblue.com)

4.6 Relación de Certificados de calidad de materiales

Se le solicitan al contratista los certificados de los materiales, estos certificados son revisados por esta interventoría, y que estos cumplan con la normatividad y especificaciones de los materiales a utilizar.

Ver Carpeta de Liquidación Tecnica - Anexo 18 Fichas tecnicas de los materiales utilizados.

4.7 Revisión de especificaciones técnicas contractuales

La interventoría vela por la buena ejecución de las obras en desarrollo, por esto se revisan al detalle las especificaciones técnicas contractuales y se vela por la buena ejecución e implementación de estas en la obra.

Ver Carpeta de Liquidación Tecnica - Anexo 17 Especificaciones técnicas

4.8 Control de personal

4.8.1 Contratista

Teniendo en cuenta el periodo de duración del contrato, cuyo inicio fue el día 14 de noviembre del 2023 y finalizo el 15 de febrero 2024, para un total de 3 meses y un día de labores.

Los documentos de afiliaciones y control de seguridad social fueron relacionados en el numeral 8.5.6 Personal del contrato y verificación de aportes SST se llevaron a cabo de manera mensual sobre la duración del contrato, mediante controles efectivos de verificación desde el área de seguridad y salud en el trabajo de esta interventoría.

A continuación, se encontrará un consolidado del personal que hizo parte del proyecto, con su respectiva fecha de ingreso y egreso.

- Personal administrativo vinculado al proyecto

PERSONAL	CANT.	DEDICACIÓN	NOMBRE	TÍTULO	INGRESO	EGRESO
Director de obra	1	50%	Luis Domingo Herrera Guzmán	Ingeniero civil	22-11-2023	15-02-2024
Ingeniero residente 1	1	100%	Aníbal Carbajal Kalil	Arquitecto	22-11-2023	30-07-2024
Ingeniero residente 2	1	100%	Jonathan Guevara Soto	Ingeniero Civil	22-11-2023	15-02-2024
Residente SST	1	100%	Argenis López	Ingeniera ambiental	22-11-2023	15-12-2023
Residente SST	1	100%	Nanny Rocio Lizcano Castellanos	Ingeniera ambiental Especialista en SST	16-12-2023	15-03-2024

Tabla 4 Personal contractual constructor vinculado al proyecto

- Personal de mano de obra vinculado.

No	MUNICIPIO	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	INGRESO	EGRESO
1	Marinilla-Titiribí	1.077.711.933	Leiner Murillo Moreno	Oficial	12-11-2023	20-12-2024
2	Marinilla-Titiribí	1.003.914.326	Yeimer Murillo Córdoba	Ayudante	12-11-2023	20-12-2024
3	Marinilla-Titiribí	1.133.605.324	Leicer Martínez Valencia	Ayudante	12-11-2023	20-12-2024
4	Marinilla-Titiribí	1.077.423.866	Mauricio Asprilla Mosquera	Ayudante	12-11-2023	20-12-2024
5	Marinilla-Titiribí	1.007.825.351	Jonier Stiven Martínez Valencia	Oficial	12-11-2023	20-12-2024

6	Marinilla-Titiribí	1.077.600.714	Milton Hugo Valencia Palacios	Oficial	12-12-2023	20-12-2024
7	Amalfi-Caucasia	1.005.325.732	Édison Fabian Torres Rodríguez	Oficial	01-11-2023	Carta de continuidad
8	Amalfi-Caucasia	1.098.660.381	Isnardo Alexander Gutiérrez Quintero	Ayudante	01-11-2023	20-12-2024
9	Andes	1.027.885.119	Luis Albeiro Hernández Garzón	Oficial	24-11-2023	15-12-2023
10	Andes	1.193.034.295	Davinson De Jesús Hernández Garzón	Ayudante	27-11-2023	15-12-2023
11	Ituango	1.037.776.119	Andrés Fernando Yepes Zapata	Ayudante	05-12-2023	25-12-2023
12	Ituango	70.582.752	Dairo Fabian González	Ayudante	05-12-2023	25-12-2023
13	Ituango	1.001.398.669	Edil Alfonso Zapata Moreno	Ayudante	05-12-2023	25-12-2023
14	Jericó	71.878.391	Antonio José Sierra Henao	Oficial	24-11-2023	30-01-2024
15	Jericó	71.877.341	Ricardo De Jesús Zapata Hernández	Oficial	24-11-2023	15-02-2024
16	Jericó	71.875.849	Carlos Aníbal Bedoya Carmona	Ayudante	24-11-2023	01-12-2023
17	Santuario	10.987.487.796	Iván Darío Cardona Bermúdez	Ayudante	14-12-2023	26-12-2023
18	Santuario	16.055.428	Jhon Mario Pérez Otalvaro	Oficial	14-12-2023	26-12-2023
19	Santuario	1.087.995.854	Nolberto Santamaria Estrada	Ayudante	14-12-2023	26-12-2023
20	Segovia	13.720.260	Erwin Eduardo Ardila	Oficial	23-11-2023	Carta de continuidad
21	Segovia	1.098.753.573	Oscar Mauricio Quijano Ferreira	Ayudante	24-11-2023	20-12-2023
22	Támesis	70.852.926	Abel Antonio Tirado Bermúdez	Ayudante	24-11-2023	20-12-2023
23	Yarumal	70.577.265	Jesús Darío Toro Giraldo	Oficial	09-12-2023	30-01-2024
24	Yarumal	15.274.285	Elkin León Rendon Chavarría	Ayudante	09-12-2023	08-03-2024
25	Yarumal	15.328.476	Luis Eduardo Eusse Jiménez	Ayudante	09-12-2023	08-03-2024

Tabla 5 Personal vinculado durante la ejecución del proyecto

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL – Anexo 1 - DOCUMENTOS PERSONAL CONTRACTUAL Y OPERATIVO

4.8.2 Interventoría

De acuerdo al periodo de duración del contrato, cuyo inicio fue el día 14 de noviembre del 2023 y finalizo el 15 de marzo 2024, para un total de 4 meses y un día de labores.

Se relaciona el personal que formó parte integral del grupo de interventoría, con sus respectivas fechas de ingreso y egreso.

PERSONAL	CANT.	DEDICACIÓN	NOMBRE	TÍTULO	INGRESO	EGRESO
Director de interventoría	1	50%	Federico García Arbeláez	Ingeniero civil	14-11-2023	15-03-2024
Ingeniero residente de interventoría 1	1	100%	Nilce Gisel Perea Rentería	Ingeniera civil	14-11-2023	15-03-2024
Ingeniero residente de interventoría 2	1	100%	José Gregorio Pineda	Ingeniero Civil	14-11-2023	15-03-2024
Ingeniero residente de interventoría 3	1	100%	Darío Londoño González	Ingeniero Civil	14-11-2023	15-03-2024
Residente SST de interventoría	1	100%	María Lucia Ocampo Tabares	Ingeniera ambiental Especialista en SST	14-11-2023	15-03-2024
Apoyo técnico	1	No aplica	Juan Andrés Castaño Zapata	Ingeniero Civil	14-11-2023	15-03-2024
Apoyo técnico	1	No aplica	Yesica Estefanía Zuluaga Guevara	Tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo	14-11-2023	15-03-2024

Tabla 6 Personal contractual interventoría vinculado al proyecto

4.9 Control de ensayos

Debido a que la intervención realizada en las ORIP es locativa y no se hicieron afectaciones estructurales, para el presente informe no se hace necesario ningún tipo de ensayo técnico.

4.10 Relación de comités de obra y/o visitas de obra.

Se realizaron visitas de obra, de las cuales se cuentan los respectivos soportes y actas levantadas en campo que son anexos al presente informe.

Ver Carpeta de Liquidación Técnica - Anexo 29 Actas de comité

4.11 Relación de APUS Ítems no previsto o complementario

El contratista en común acuerdo con la supervisión y esta interventoría presenta 1 APU de ítem no previsto para la ORIP de Titiribí Ant. en esta oficina se hace necesario por temas de seguridad y solicitud de la registradora, el cambio de la puerta principal de acceso, esto porque la existente se encuentra en avanzado estado de deterioro y no fue contemplada en el presupuesto enviado inicialmente. Se anexa su respectivo APU y cotizaciones.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SNR

CAPITULO:	2, CARPINTERÍA EN MADERA - TITIRIBÍ

Item	Actividad	Unidad de Medida
O.N 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL ORIP	GL

I. Materiales

Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor
BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3PG PARA PUERTA DE PASO 2 X 76 X 76 MM	un	6	$ 11.950	$ 71.700
MARCO PARA PUERTA EN METÁLICA 8cmX3cmX253m	un	1	$ 466.500	$ 466.500
TORNILLO PARA METAL 1 N°6	un	0,15	$ 144	$ 22
PUNTILLA ACERADA 1	lb	0,05	$ 6.169,00	$ 308
PUERTA METÁLICA 2.53*1.65 METROS EN DOS ABRAS CAL 18 - PINTADA	un	1	$ 1.564.446,00	$ 1.564.446,00
CERRADURA YALE DE SEGURIDAD- INCLUYE TORNILLOS	un	1	$ 129.500,00	$ 129.500,00
SUB TOTAL				$ 2.232.476,05

II. EQUIPOS

Descripcion	Tipo	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor Unitario
HERRAMIENTA MENOR % M.O (5%-10%)	%	5,00%	$ 39.810	$ 1.990,50
ESCALERA DE TIJERA TIPO GATO	D	2,00%	$ 4.350,00	$ 87,00
SUB TOTAL				$ 2.077,50

III. TRANSPORTES

Material	Volumen o Peso o cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario
TRANSPORTE DE PUERTA			56,9	$ 1.956,82	$ 111.343,27
SUB TOTAL					$ 111.343,27

IV. MANO DE OBRA

Tipo de Cuadrilla o Trabajador	Jornal	prestaciones	Rendimiento	Jornal Total	Valor unitario
CUADRILLA HH METÁLICAS	hc		2,00	$ 50.932	$ 101.864,00
SUB TOTAL					$ 101.864,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2.447.760,82
Administracion	25,00%	$ 611.940,21
Imprevistos	1,00%	$ 24.477,61
Utilidades	5,00%	$ 122.388,04
Iva sobre Utilidad	19,00%	$ 23.253,73
VALOR TOTAL ITEM		$ 3.229.820,40

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REVISION INTERVENTORIA	SNR

CAPITULO:	2, CARPINTERÍA EN MADERA - TITIRIBÍ

Item	Actividad	Unidad de Medida
O.N 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL ORIP	GL

I. Materiales

Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor
BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3PG PARA PUERTA DE PASO 2 X 76 X 76 MM INCLUYE TORNILLOS	un	6	$ 11.950	$ 71.700
MARCO PARA PUERTA EN METÁLICA 8cmX3cmX253m	un	1	$ 466.500	$ 466.500
TORNILLO PARA METAL 1 N°6	un	0,15	$ 144	$ 22
PUNTILLA ACERADA 1	lb	0,05	$ 6.169,00	$ 308
PUERTA METÁLICA 2.53*1.65 METROS EN DOS ABRAS CAL 18 - PINTADA	un	1	$ 1.564.446,00	$ 1.564.446,00
CERRADURA YALE DE SEGURIDAD- INCLUYE TORNILLOS	un	1	$ 129.500,00	$ 129.500,00
SUB TOTAL				$ 2.232.476,05

II. EQUIPOS

Descripcion	Tipo	Rendimiento	Tarifa/Hora	Valor Unitario
HERRAMIENTA MENOR % M.O (5%-10%)	%	5,00%	$ 98.909,05	$ 4.945,45
ESCALERA DE TIJERA TIPO GATO	D	2,00%	$ 4.350,00	$ 87,00
SUB TOTAL				$ 5.032,45

III. TRANSPORTES

Material	Volumen o Peso o cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario
TRANSPORTE DE PUERTA METÁLICA			56,9	$ 1.956,82	$ 111.343,27
SUB TOTAL					$ 111.343,27

IV. MANO DE OBRA

Tipo de Cuadrilla o Trabajador	Jornal	prestaciones	Rendimiento	Jornal Total	Valor unitario
CUADRILLA HH METÁLICAS (HC)	hc		1,94	$ 50.932	$ 98.909,05
SUB TOTAL					$ 98.909,05

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2.447.760,82
Administracion	25,00%	$ 611.940,21
Imprevistos	1,00%	$ 24.477,61
Utilidades	5,00%	$ 122.388,04
Iva sobre Utilidad	19,00%	$ 23.253,73
VALOR TOTAL ITEM		$ 3.229.820,40

Ver Carpeta de Liquidación Técnica – Anexo 9 Aprobación de ítems no previstos.

Ver Carpeta de Liquidación Técnica – Anexo 10 Apus de Ítems no previstos (PDF Y EXCEL).

Ver Carpeta de Liquidación Técnica – Anexo 12 Especificaciones técnicas ÍTEMS no previstos.

Ver Carpeta de Liquidación Técnica – Anexo 13 Cotizaciones Ítems No previstos.

4.12 Bitácora de obras

Se anexa la bitácora de las 11 ORIP que manejan de manera independiente

Ver Carpeta de Liquidación Técnica – Anexo 25 Libro bitácora.

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Relación de solicitudes de prórroga

Se presentó una solicitud de prórroga por parte del contratista el día 19 de diciembre por medio del oficio CV-SNR-020-2023 anexo a este informe donde se solicitaba una prórroga bajo las siguientes justificaciones:

"El contrato fue adjudicado el 9 de octubre de 2023, y fue hasta el 7 de noviembre de 2023 cuando se puso en contacto la Supervisión por parte de la Entidad, teniendo en cuenta que la demora fue producto de la legalización de los contratos de interventoría considerando que en su mayoría fueron adjudicados a consorcios y se presentaron demoras en la expedición del RUT, lo cual dilató el inicio de las obras."

Respecto a lo anterior antes expuesto y teniendo en cuenta que la fecha de terminación no era acorde a al tiempo contractual estipulado la interventoría dio su visto bueno el día 21 de diciembre por medio del oficio INT- OF – 8 que se argumentaba en:

"Teniendo en cuenta todas las justificaciones expuestas por el consultor en el oficio antes mencionado, esta interventoría haciendo una evaluación al cronograma de cada ORIP ve viable una prórroga de un (1) mes y quince (15) días que iría hasta el 15 de febrero del 2024, para culminar en un 100% las actividades contractuales, esto con base al cronograma de entrega relacionado por el contratista, teniendo en cuenta las demoras en iniciar actividades por trámites administrativos.

Por consiguiente, para garantizar la adecuada supervisión del contratista y las actividades ejecutadas, se solicita un prorroga al contrato de interventoría de dos (2) meses y quince (15) días que iría hasta el 15 de marzo del 2024, esto para garantizar la adecuada terminación del contrato y su respectiva liquidación"

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la interventoría también solicito una prórroga hasta el 15 de marzo del 2024 y así poder realizar la adecuada interventoría de obras y su respectiva liquidación.

Ver Carpeta de Liquidación Técnica – Anexo 30 Solicitud de adición presupuestal o prórrogas.

5.2 Relación de solicitudes de adiciones

No se ha presentado ningún tipo de solicitud de adición a los contratos de interventoría, ni de obra.

5.3 Relación de solicitudes de suspensiones

No se ha presentado ningún tipo de solicitud o modificación a los contratos de interventoría, ni de obra.

5.4 Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato

El periodo de duración del contrato, cuyo inicio fue el día 14 de noviembre del 2023 y finalizo el 15 de febrero 2024, para un total de 3 meses y un día de labores.

5.5 Relación de correspondencia enviada y recibida

5.5.1 Correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA					
Correo	**Fecha**	**Origen**	**Destino**	**Asunto**	**Adjunto**
1	14 nov 2023, 9:23	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioedificaciondicac@gmail.com	Licitación Interventoría	1
2	14 nov 2023, 9:23	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioedificaciondicac@gmail.com	Documentos contrato Interventoría	8
3	14 nov 2023, 11:25	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioedificaciondicac@gmail.com	Documentos contrato contratista	11
4	14 nov 2023, 11:32	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioedificaciondicac@gmail.com	Licitación Interventoría	1
5	16 nov 2023, 11:29	consorcioedificaciondicac@gmail.com	dirandina@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	1
6	16 nov 2023, 11:32	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	OFICINAS REGISTRO - ACTA DE INICIO CONTRATISTA	1
7	14 de noviembre de 2023, 9:23	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioedificaciondicac@gmail.com	Documentos contrato Interventoría	8
8	16 nov 2023, 15:21	consorcioedificaciondicac@gmail.com	dirandina@supernotariado.gov.co, ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	1
9	6 nov 2023, 16:21	consorcioedificaciondicac@gmail.com	cesar.martinez@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co dirandina@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - INICIO DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES	0
10	17 nov 2023, 14:25	consorcioedificaciondicac@gmail.com	cesar.martinez@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co dirandina@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE FORMATOS	0
11	17 nov 2023, 16:43	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	OFICINAS REGISTRO - DIRECTRICES Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DEL CONTRATO	0
12	20 nov 2023, 11:09	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co dirandina@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - LISTADO DE PERSONAL AMALFI	0
13	20 nov 2023, 10:41	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE APU CONTRACTUAL	0

14	20 nov 2023, 11:57	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com, altavistacgsas@outlook.com	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE APU CONTRACTUAL	1
15	22 nov 2023, 12:46	consorcioedificaciondicac@gmail.com	gustavo.cano@supernotarado.gov.co	ACTA DE COMITÉ	1
16	28 nov 2023, 10:15	consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com, cesar.martinez@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co consorcioventura.snr@gmail.com	OFICINAS REGISTRO - FORMATO PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD	1
17	28 nov 2023, 14:43	consorcioedificaciondicac@gmail.com	cesar.martinez@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - INT - OF -01	2
18	28 nov 2023, 15:16	consorcioedificaciondicac@gmail.com	maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - INT - OF -01	2
19	29 nov 2023, 9:39	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	INFORMACION PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES SEMANALES	0
20	28 nov 2023, 5:34	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	CV-SNR-001-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP SEGOVIA	2
21	30 nov 2023, 9:36	consorcioedificaciondicac@gmail.com	maxiel.navarro@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co	Relación de personal por municipio	1
22	1 dic 2023, 16:38	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co max iel.navarro@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - INT - OF -02 - Actividades en la ORIP MARINILLA y se anexa oficio del contratista CV-SNR-003-2023	2
23	4 dic 2023, 15:38	consorcioedificaciondicac@gmail.com	<consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	Documentación de ingreso	1
24	4 dic 2023, 16:27	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com ingenierosoficina@gmail.com	Solicitud de documentación pendiente	1
25	4 dic 2023, 16:30	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com ingenierosoficina@gmail.com	Vencimientos de la seguridad social	0
26	5 dic 2023, 13:39	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO CONTRATISTA	1
27	6 dic 2023, 10:20	consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com ingenierosoficina@gmail.com	CV-SNR-005-2023- ASUNTO: OBSERVACIONES A LA EJECUCION CONTRACTUAL	0
28	6 dic 2023, 15:47	consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com consorcioventura.snr@gmail.com	Solicitud de actas de vecindad	0
29	5 dic 2023, 13:08	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	CV-SNR-006-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP CAUCASIA	0
30	7 dic 2023, 15:15	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com	CV-SNR-006-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP CAUCASIA	0
31	7 dic 2023, 15:18	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com	CV-SNR-008-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP ITUANGO	0
32	7 dic 2023, 15:20	consorcioedificaciondicac@gmail.com	maxiel.navarro@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co	Relación de personal por municipio	1

			ingenierosoficina@gmail.com altavistacgsas@outlook.com		
33	11 dic 2023, 8:50	consorcioedificaciondicac@gmail.com	maxiel.navarro@supernotariado.gov.co , ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co ingenierosoficina@gmail.com	Relación de personal por municipio - 11-12-2023	1
34	12 dic 2023, 9:47	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com ceiler.salazar@supernotariado.gov.co altavistacgsas@outlook.com>	Solicitud de planillas de seguridad social	0
35	12 dic 2023, 9:03	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ofiregisyarumal@supernotariado.gov.co , sonia.joya@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	Relación personal - Yarumal	1
36	12 dic 2023, 16:38	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ofiregisyarumal@supernotariado.gov.co , sonia.joya@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	Relación personal - Yarumal	1
37	13 dic 2023, 10:55	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co altavistacgsas@outlook.com	Presupuesto Santuario	1
38	13 dic 2023, 14:32	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com altavistacgsas@outlook.com	Programación de visitas ORIP para recibo de obras	0
39	jue, 14 dic 2023, 7:13	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com	Documentos Ingreso de personal-CONSORCIO VENTURA EJECUCIÓN DE OBRAS ORIP TITIRIBI	0
40	14 dic 2023, 7:11	consorcioedificaciondicac@gmail.com	consorcioventura.snr@gmail.com ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co altavistacgsas@outlook.com	Relación personal - Titiribí	1
41	14 dic 2023, 11:12	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ofiregisyarumal@supernotariado.gov.co sonia.joya@supernotariado.gov.co ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	Relación personal - Titiribí	0
42	14 dic 2023, 14:19	consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com	OFICINAS REGISTRO - FORMATOS PARA ACTAS DE COBRO Y MEMORIAS	3
43	14 dic 2023, 15:33	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	ALCANCE CORREO ANTERIOR SOLICITUD FORMATO	0
44	14 dic 2023, 15:40	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - BALANCE MARINILLA	4
45	14 dic 2023, 15:45	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - BALANCE ANDES	4
46	14 dic 2023, 16:58	consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com consorcioventura.snr@gmail.com	OFICINAS REGISTRO - FORMATOS DE ACTAS	6

47	15 dic 2023, 14:36	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co	OFICINAS REGISTRO - PORCENTAJES A COBRAR CORTE 1	1
48	15 dic 2023, 16:12	consorcioedificaciondicac@gmail.com	ceiler.salazar@supernotariado.gov.co cesar.martinez@supernotariado.gov.co maxiel.navarro@supernotariado.gov.co altavistacgsas@outlook.com consorcioventura.snr@gmail.com	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE PRORROGA	2
49	19 dic 2023, 9:01	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	Re: FICHAS TECNICAS DE SEÑALIZACIÓN	0
50	19 dic 2023, 9:04	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com	Fwd: FICHAS TECNICAS DE SEÑALIZACIÓN	1
51	19 dic 2023, 11:28	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co> Cc: ingenierosoficina@gmail.com	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE COBRO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	0
52	fecha: 19 dic 2023, 13:53	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 MARINILLA	1
53	19 dic 2023, 15:26	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 ANDES	1
54	19 dic 2023, 16:18	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Re: AFILIACION CONSORCIO VENTURA DICIEMBRE 18 DE 2023	0
55	19 dic 2023, 16:21	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Re: AFILIACION CONSORCIO VENTURA DICIEMBRE 18 DE 2023	0
56	12 dic 2023, 9:51	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>,	Solicitud de información	1

			Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com		
57	19 dic 2023, 16:34	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com	Re: Solicitud de información	1
58	19 dic 2023, 16:59	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com	Solicitud de seguridad social	1
59	20 dic 2023, 20:16	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 AMALFI	1
60	20 dic 2023, 20:44	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 CAUCASIA	1
61	20 dic 2023, 21:04	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 SEGOVIA	1
62	21 dic 2023, 8:40	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co> Cc: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE PRORROGA-INT-OF-08	2
63	21 dic 2023, 8:47	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>,	OFICINAS REGISTRO - SOLICITUD DE PRORROGA-INT-OF-08 - CORREGIDO	2

			Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>		
64	22 dic 2023, 11:58	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	Solicitud de informes mensuales	1
65	22 dic 2023, 14:06	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	OFICINAS REGISTRO - SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TITIRIBI- INT-OF-10	2
66	26 dic 2023, 9:07	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - PRIMER CORTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA	2
67	26 dic 2023, 16:26	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - PRIMER CORTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA- ZIP	2
68	28 dic 2023, 7:27	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA	Solicitud hoja de vida profesional SST	1

			<consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
69	28 dic 2023, 7:27	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co> Cc: ingenierosoficina@gmail.com	Actualización de hojas de vida	3
70	28 dic 2023, 11:05	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	Re: CV-SNR-023-2023 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	3
71	29 dic 2023, 15:18	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: juan.patino@supernotariado.gov.co, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - ACTA DE RECIBO ORIP TAMESIS ANT	1
CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENERO 2024					
72	2 ene 2024, 8:33	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	Re: CV-SNR-036-2023 REGISTRO DE EJECUCION DETALLES RECIBO ORIP AMALFI	0
73	2 ene 2024, 10:04	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com, ceileralbertos@gmail.com Cc: ingenierosoficina@gmail.com	OFICINAS REGISTRO - Cronograma y Avance de obras al 2-01-2024	1
74	2 ene 2024, 11:13	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com Cc: ingenierosoficina@gmail.com, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	OFICINAS REGISTRO - INFORMES SEMANALES DE LAS 11 ORIP INTERVENIDAS EN LA AGRUPACIÓN 4	1

75	3 ene 2024, 9:55	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	Notificación de fechas de informes mensuales	1
76	3 ene 2024, 9:35	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Re: AFILIACIONES CONSORCIO VENTURA DICIEMBRE 18 DE 2023	0
77	3 ene 2024, 10:39	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	AFILIACIONES CONSORCIO VENTURA DICIEMBRE 18 DE 2023	0
78	3 ene 2024, 12:05	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	Recordatorio vencimiento de seguridad social	0
79	9 ene 2024, 10:07	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	Re: CUADRO DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA A FECHA 09-01-2024	0
80	9 ene 2024, 10:09	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	Re: CV-SNR-038-2024 INFORME SEMANAL No. 3 ORIP ITUANGO	0
81	9 ene 2024, 16:05	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Re: HOJA DE VIDA PROFESIONAL SISO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023	0
82	16 ene 2024, 10:47	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernández <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso	asunto: Fwd: SOLICITUD INFORMACION PAGO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023- CONSORCIO VENTURA	0
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>,		

			maxielnavarro@gmail.com, ceileralbertos@gmail.com		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>		
83	16 ene 2024, 10:52	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Fwd: SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATOS 2023	1
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>,		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
84	18 ene 2024, 15:47	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: OFICINAS REGISTRO - ESTADO Y PORCENTAJE DE AVANCE	1
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>		
			fecha:		
85	23 ene 2024, 8:39	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: ingenierosoficina@gmail.com fecha:	asunto: PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON LA PRORROGA -- SUPER-	0
		<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		INTENDENCIA	
86	24 ene 2024, 8:16	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso	asunto: Re: RADICADO SNR2023ER158642	0
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Oscar Alberto Serna Valencia		
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, maxielnavarro@gmail.com		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>		

87	24 ene 2024, 8:23	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	asunto: Re: REENVIO DE INFORMACION DOCUMENTAL	0
		<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	CORRESPONDIENTE AL CORTE 1	
88	25 ene 2024, 12:14	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: Actualización hoja de vida SST contratista	2
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com		
			fecha:		
89	25 ene 2024, 12:23	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>,	asunto: Solicitud de seguridad social	0
		<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
90	25 ene 2024, 15:46	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	OFICINAS REGISTRO - PRIMER PAGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA- CORREGIDO	1
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, maxielnavarro@gmail.com		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com		
91	26 ene 2024, 11:07	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernández <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso	asunto: OFICINAS REGISTRO - ESTADO Y PORCENTAJE DE AVANCE	1
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, ingenierosoficina@gmail.com		
92	29 ene 2024, 9:28	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: Re: REITERACION PLANOS DE CADA ORIP	1
		<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez		

			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com		
			Cc: CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>		
93	29 ene 2024, 9:36	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@ gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA	asunto: Re: REITERACION CRONOGRAMA DE ENTREGA DE OBRAS ORIP CONTRATO 2392 DE 2023	0
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, ceileralbertos@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com		
			fecha:		
94	30 ene 2024, 10:22	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: gilberto.yepes@supernotariado.gov.co, ofiregisamalfi@supernotariado.gov.co	asunto: OFICINAS REGISTRO - ACTA DE RECIBO DE	2
		<consorcioedificaciondicac@ gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA	ACTIVIDADES AMALFI	
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com		
95	30 ene 2024, 13:40	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@ gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernández <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com, ceileralbertos@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: OFICINAS REGISTRO - RADICADO DE LAS FACTURAS DEL PRIMER PAGO CONTRATISTA VENTURA	1
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>		
96	31 ene 2024, 10:13	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: ceileralbertos@gmail.com	asunto: CORTE 1 ANDES CORREGIDO	1
		<consorcioedificaciondicac@ gmail.com>			
97	31 ene 2024, 10:48	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	Re: Remisión formato permiso TAR	0
		<consorcioedificaciondicac@ gmail.com>			

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO FEBRERO 2024					
98	6 feb 2024, 11:51	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Oficina de Registro Amalfi <ofiregisamalfi@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: Re: Imágenes de Hallazgos en oficina Amalfi	1
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com		
99	6 feb 2024, 12:00	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Hallazgos ORIP Yarumal y Santuario	1
			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar		
			Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar		
			Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
100	9 feb 2024, 11:22	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: mariae.zapata@supernotariado.gov.co	asunto: Documentos para impresión	2
101	12 feb 2024, 10:06	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	asunto: Hoja de vida SST interventoría	1
	12 feb 2024, 10:20	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Solicitud de informes mensuales	0
			Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández		
102			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ingenierosoficina@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, maxielnavarro@gmail.com		
	13 feb 2024, 4:32	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	asunto: Re: APU PUERTA TITIRIBÍ + COTIZACIÓN	2
103		<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
	13 feb 2024, 5:26	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: CONSORCIO VENTURA	asunto: OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES PAGO # 2	2
		<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>		
104			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez		

			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
105	16 feb 2024, 10:26	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: Hallazgo constructivo - Titiribí	1
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
106	fecha: 16 feb 2024, 10:26	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com	asunto: Hallazgo constructivo - Titiribí	1
107	fecha: 17 feb 2024, 9:48	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ingenierosoficina@gmail.com	asunto: INFORME 1 INTERVENTORIA	1
108	fecha: 19 feb 2024, 15:40	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com	asunto: OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES PARA RECIBO FINAL	1
109	fecha: 20 feb 2024, 5:03	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	asunto: Re: CV-SNR-047-2024 INFORME MENSUAL No. 2 PERIODO DEL 17 DE DIC 2023 AL 16 DE ENE DE 2024 CV	0
110	fecha: 19 feb 2024, 15:00	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Solicitud de seguridad social	2

111	fecha: 21 feb 2024, 10:29	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	asunto: FECHAS DE ENTREGA DE LAS SUBSANACIONES Y OBRAS TERMINADAS	0
112	fecha: 23 feb 2024, 14:36	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, maxielnavarro@gmail.com	asunto: ACTAS DE MAYORES Y MENORES INICIALES	0
113	fecha: 26 feb 2024, 12:01	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ceileralbertos@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com, ingenierosoficina@gmail.com	asunto: VISITAS DE RECIBO FINAL CON LA SUPERVISION	0
114	fecha: 27 feb 2024, 10:51	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com	asunto: ACTAS DE JUSTIFICACION DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES INICIALES	10
115	fecha: 28 feb 2024, 11:54	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	asunto: BALANCES Y PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS 11 ORIP	35
116	fecha: 28 feb 2024, 16:51	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez	asunto: INFORME 2 INTERVENTORIA	1

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com Cc: ingenierosoficina@gmail.com		
117	fecha: 29 feb 2024, 14:36	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ingenierosoficina@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, maxielnavarro@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: LISTA DE CHEQUEO PARA LA LIQUIDACION	3
CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO MARZO 2024					
118	fecha: 4 mar 2024, 9:54	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com, Oscar Alberto Serna Valencia <oscar.serna@supernotariado.gov.co> Cc: ingenierosoficina@gmail.com	asunto: RADICADOS DE LAS 9 FACTURAS ENVIADAS POR LA INTERVENTORÍA	0
119	fecha: 6 mar 2024, 11:01	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	asunto: ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA CORREGIDAS	9
120	fecha: 6 mar 2024, 14:28	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, altavistacgsas@aol.com	asunto: PLACAS DE SEÑALIZACION	0
121	fecha: 7 mar 2024, 13:15	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez	asunto: ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA DE OBRA	9

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com		
122	fecha: 14 mar 2024, 10:09	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, ceileralbertos@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com, ingenierosoficina@gmail.com, altavistacgsas@aol.com	asunto: ACTAS DE RECIBO FINAL 11 ORIP	11
123	fecha: 14 mar 2024, 10:22	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	asunto: ACTAS DE RECIBO FINAL 11 ORIP	1
124	fecha: 14 mar 2024, 16:03	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, maxielnavarro@gmail.com, ingenierosoficina@gmail.com, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, altavistacgsas@aol.com	asunto: ENTREGA FINAL DE OBRA - INT- OF -25	1

Tabla 7 Correspondencia enviada

5.5.2 Correspondencia recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
Correo	**Fecha**	**Origen**	**Destino**	**Asunto**	**Adjunto**
1	14 nov 2023, 16:53	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Fwd: DOCUMENTACION CONTRATO SUPERNOTARIADO	5

2	16 nov 2023, 8:36	de: Licitaciones y presupuestos <licitacionesfga@gmail.com>>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com	Fwd: Formato de acta de inicio de obra	2
	16 nov 2023, 10:40	de: <dirandina@supernotariado.gov.co>	para: "licitacionesfga@gmail.com" <licitacionesfga@gmail.com>, "ingenierosoficina@gmail.com" <ingenierosoficina@gmail.com>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	Fwd: Acta de inicio contrato 2467 de 2023	1
	16 nov 2023, 11:02	de: <dirandina@supernotariado.gov.co>	para: "licitacionesfga@gmail.com" <licitacionesfga@gmail.com>, "ingenierosoficina@gmail.com" <ingenierosoficina@gmail.com>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	Fwd: Acta de inicio contrato 2467 de 2023	1
3	16 nov 2023, 16:21	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ceiler.salazar@supernotariado.gov.co, dirandina@supernotariado.gov.co Cc: ingenierosoficina@gmail.com, consorcioventura.snr@gmail.com, altavistacgsas@outlook.com	Fwd: OFICINAS REGISTRO - INICIO DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES	0
	20 nov 2023, 13:20	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, "ceiler.salazar@supernotariado.gov.co" <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	Fwd: OFICINAS REGISTRO - INICIO DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES	0
	20 nov 2023, 16:18	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	Fwd: OFICINAS REGISTRO - INICIO DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES	0
4	21 nov 2023, 16:39	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com	Fwd: CV-SNR-001-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA	0
5	22 nov 2023, 6:51	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Fwd: Selección de color para fachadas ORIP	2
6	22 nov 2023, 14:25	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"	Fwd: HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO	0

			<consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS		
7	22 nov 2023, 15:01	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	"consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	Fwd: RV: AFILIACIONES CONSORCIO VENTURA NOVIEMBRE 21 DE 2023	5
8	27 nov 2023, 16:05	de: Oficina de Registro Amalfi <ofiregisamalfi@supernotariado.gov.co> x	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Gilberto Eliecer Yepes Puerta <gilberto.yepes@supernotariado.gov.co>	Fwd: ACTA DE VISITA	1
9	28 nov 2023, 5:34	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	Fwd: CV-SNR-001-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP SEGOVIA	2
10	29 nov 2023, 10:41 asunto:	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, maxiel.navarro@supernotariado.gov.co Cc: ingenierosoficina@gmail.com, altavistacgsas@outlook.com, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	Fwd: CV-SNR-001-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP SEGOVIA	2
11	28 nov 2023, 5:45	CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, maxiel.navarro@supernotariado.gov.co Cc: ingenierosoficina@gmail.com, altavistacgsas@outlook.com, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com	FORMATO PARA ELABORACION DE ACTAS DE VECINDAD	1
12	28 nov 2023, 6:26	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	INFORMACION PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES SEMANALES	0
13	28 nov 2023, 8:25	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Relación de personal zona sur	2
14	28 nov 2023, 11:14	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> >	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com	RV_ Cuadro de vigilancia agrup. 4.pdf	1
15	29 nov 2023, 8:13	CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Documentos para ingreso de personal	4
16	28 nov 2023, 14:43	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	OFICINAS REGISTRO - INT - OF -01	2
CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DICIEMBRE 2023					
17	1 dic 2023, 8:42	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	Re: OFICINAS REGISTRO - INT - OF -01	0

			<consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, ingenierosoficina@gmail.com, altavistacgsas@outlook.com		
18	1 dic 2023, 15:03	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	OBRA MARINILLA	1
19	1 dic 2023, 20:34	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO No. No. 2392 DE 2023	1
20	3 dic 2023, 20:15	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-004-2023 INFORME SEMANAL No. 1 ORIP AMALFI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023	3
21	3 dic 2023, 20:05	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> >	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co	CV-SNR-003-2023 ENTREGA DE APUS, PROGRAMACION DE EJECUCIONDE OBRA, BALANCE ORIP AMALFI	5
22	4 dic 2023, 10:28	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	Solicitud Plan de Contingencia	0
23	4 dic 2023, 11:26	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	Re: Solicitud Plan de Contingencia	1
24	4 dic 2023, 11:29	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com	Fwd: Marinilla	4
25	4 dic 2023, 11:31	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	Fwd: Andes	4

			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, altavistacgsas@outlook.com		
26	4 dic 2023, 12:34	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, altavistacgsas@outlook.com, luisdo.herreraguzman@gmail.com	Informes semanales municipios de Marinilla y Andes	4
27	4 dic 2023, 15:57	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co > Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, altavistacgsas@outlook.com	CESE DE ACTIVIDAES EN LAS OBRAS	0
28	4 dic 2023, 11:03	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, altavistacgsas@outlook.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	AVANCE PORCENTUAL POR MUNICIPIOS	2
29	5 dic 2023, 11:33	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >, altavistacgsas@outlook.com	Fwd: CV-SNR-003-2023 ENTREGA DE APUS, PROGRAMACION DE EJECUCIONDE OBRA, BALANCE	5
30	5 dic 2023, 11:45	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >, altavistacgsas@outlook.com	Fwd: CV-SNR-003-2023 ENTREGA DE APUS, PROGRAMACION DE EJECUCIONDE OBRA, BALANCE ORIP AMALFI	1
31	5 dic 2023, 19:28	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	CV-SNR-005-2023- ASUNTO: OBSERVACIONES A LA EJECUCION CONTRACTUAL	1
32	5 dic 2023, 13:28	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com, ingenierosoficina@gmail.com	Re: CV-SNR-006-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP CAUCASIA	0
33	5 dic 2023, 10:44	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >, altavistacgsas@outlook.com	CV-SNR-006-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP CAUCASIA	3

34	6 dic 2023, 17:36	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com	REENVIO DOCUMENTOS ORIP AMALFI	5
35	6 dic 2023, 20:44	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, altavistacgsas@outlook.com	Támesis	5
36	7 dic 2023, 9:21 asunto:	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com	CV-SNR-007-2023- ASUNTO: OBSERVACIONES A LA EJECUCION CONTRACTUAL	1
37	7 dic 2023, 11:39	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com	Fwd: CV-SNR-007-2023- ASUNTO: OBSERVACIONES A LA EJECUCION CONTRACTUAL	2
38	7 dic 2023, 12:49	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@outlook.com, ingenierosoficina@gmail.com	Re: CV-SNR-006-2023 RELACION PERSO	5
39	fecha: 7 dic 2023, 12:17	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ofiregisituango@supernotariado.gov.co	CV-SNR-008-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP ITUANGO	3
40	7 dic 2023, 13:00	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, altavistacgsas@outlook.com, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ofiregisituango@supernotariado.gov.co	Re: CV-SNR-008-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP ITUANGO	1
41	7 dic 2023, 15:25	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Re: CV-SNR-008-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP ITUANGO	0
42	7 dic 2023, 15:32	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Re: CV-SNR-008-2023 RELACION PERSONAL EN	0

			Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP ITUANGO	
43	7 dic 2023, 19:09	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cco: consorcioedificaciondicac@gmail.com	JERICO	3
44	8 dic 2023, 11:38	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Reenvío Cronograma de ejecución de obra ORIP Caucasia ajustado a fecha real de Inicio	2
45	8 dic 2023, 14:44	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Cronograma e informe semanal Jericó	2
46	11 dic 2023, 10:58	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA CONTRATO 2392 DE 2023	1
47	11 dic 2023, 12:25	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> ITIRIBI	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	RV: REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ORIP T	0
48	11 dic 2023, 14:42	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	ENTREGA DE INFORME SEMANAL 2 Y 3 ORIP AMALF	5
49	11 dic 2023, 17:18	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-012-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP YARUMAL	3

50	11 dic 2023, 17:53	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> asunto:	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	Fwd: CV-SNR-012-2023 RELACION PERSONAL EN OBRA CONSORCIO VENTURA ORIP YARUMAL, CORREGIDO OFICIO REMISORIO CON LA ORIP EN EJECUCION	3
51	11 dic 2023, 18:22	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	CV-SNR-013-2023 INFORME SEMANAL 1 Y 2 ORIP SEGOVIA	5
52	11 dic 2023, 19:34	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> CAUCASIA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	ENTREGA DE INFORME SEMANAL 1 ORIP CAUCASIA	3
53	12 dic 2023, 9:15	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Oficina de Registro Yarumal <ofiregisyarumal@supernotariado.gov.co >, Sonia Joya Santiago <sonia.joya@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co > Cc: "ingenierosoficina@gmail.com" <ingenierosoficina@gmail.com>	Re: Relación personal - Yarumal	1
54	12 dic 2023, 20:03	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com	Re: Solicitud de información	1
55	13 dic 2023, 7:13	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez	CV-SNR-016-2023 ENTREGA PROGRAMACION DE EJECUCIONDE OBRA, BALANCE ORIP ITUANGO	3

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
56	13 dic 2023, 9:20	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Santuario <ofiregissantuario@supernotariado.gov.co>, Adolfo Leon Zuluaga Giraldo <adolfo.zuluaga@supernotariado.gov.co>	Acta de visita orip Santuario	1
57	13 dic 2023, 9:30	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: luisdo.herreraguzman@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Presupuesto Santuario	0
58	13 dic 2023, 17:10	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, gpinal0101@gmail.com	CV-SNR-017-2023 ENTREGA PROGRAMACION DE EJECUCIONDE OBRA, BALANCE ORIP SEGOVIA	3
59	13 dic 2023, 17:13	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, gpinal0101@gmail.com	Fwd: CV-SNR-017-2023 ENTREGA PROGRAMACION DE EJECUCIONDE OBRA, BALANCE ORIP SEGOVIA	4
60	13 dic 2023, 19:23	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Documentos Ingreso de personal-CONSORCIO VENTURA EJECUCIÓN DE OBRAS ORIP TITIRIBI	4
61	14 dic 2023, 10:51	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	LINK DRIVE CARPETA ORIPS ZONA NORTE	1

62	14 dic 2023, 11:11	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	FORMATO DE MEMORIAS, CORTE PARCIAL Y/O FINAL DE OBRA Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	3
63	14 dic 2023, 13:11	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co > Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, luisdo.herreraguzman@gmail.com	Informes semanales ANDES	3
64	14 dic 2023, 15:16	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	SOLICITUD PLANOS RECORD	0
65	14 dic 2023, 15:17	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	SOLICITUD FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	0
66	14 dic 2023, 15:28	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> ATO	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	ALCANCE CORREO ANTERIOR SOLICITUD FORM	0
67	14 dic 2023, 17:37	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Reunión Acta de Recibo Parcia	0
68	14 dic 2023, 21:07	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	Reunión Aclaración información para corte	0
69	15 dic 2023, 7:41	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	OFICIO No. CV-SNR-018-2023 - ASUNTO: REITERACION SOLICTUD DE PRORROGA	1
70	15 dic 2023, 13:46	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	CORRECCION OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA	1
71	15 dic 2023, 14:18	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >,	Cuadro porcentaje de avance y valor corte	1

			Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>		
72	15 dic 2023, 22:21	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Corrección Balances	1
73	17 dic 2023, 12:44	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	DOCUMENTOS ORIPS AMALFI, SEGOVIA Y CAUCASIA PARA CORTE	1
74	18 dic 2023, 8:08	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	ARCHIVOS PARA FACTURACIÓN ANDES	1
75	18 dic 2023, 8:14	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	ARCHIVOS PARA FACTURAR MARINILLA	1
76	18 dic 2023, 9:18	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: Oficina de Registro Titiribí <ofiregistitiribi@supernotariado.gov.co>, Roosvelt Rodríguez Rengifo <roosvelt.rodriguez@supernotariado.gov.co>,Secretaria General SNR <secretariageneral@supernotariado.gov.co>, Proyectos Infraestructura SNR <proyectosinfraestructura@supernotariado.gov.co>, Asesores Apoyo Infraestructura <asesoresapoyoinfraestructura@supernotariado.gov.co>, Grupo de Infraestructura <grupodeinfraestructura@supernotariado.gov.co>, Magaly Caycedo Molano <magaly.caycedo@supernotariado.gov.co>, William Pérez Castañeda <william.perez@supernotariado.gov.co>, Dirección Regional Andina <dirandina@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co > Cc: Angela María Sañudo Correa <angela.sanudo@supernotariado.gov.co >, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	Re: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE REGISTRO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA	0
77	18 dic 2023, 11:14	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: Oficina de Registro Titiribí <ofiregistitiribi@supernotariado.gov.co>, Roosvelt Rodríguez Rengifo	Re: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE REGISTRO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA	0

			<roosvelt.rodriguez@supernotariado.gov.co>, Secretaria General SNR <secretariageneral@supernotariado.gov.co>, Proyectos Infraestructura SNR <proyectosinfraestructura@supernotariado.gov.co>, Asesores Apoyo Infraestructura <asesoresapoyoinfraestructura@supernotariado.gov.co>, Grupo de Infraestructura <grupodeinfraestructura@supernotariado.gov.co>, Magaly Caycedo Molano <magaly.caycedo@supernotariado.gov.co>, William Pérez Castañeda <william.perez@supernotariado.gov.co>, Dirección Regional Andina <dirandina@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Angela María Sañudo Correa <angela.sanudo@supernotariado.gov.co>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
78	18 dic 2023, 13:51	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Fwd: FICHAS TECNICAS DE SEÑALIZACIÓN	1
79	18 dic 2023, 23:39	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	REENVIO DOCUMENTOS ORIPS AMALFI, SEGOVIA Y CAUCASIA PARA CORTE Y FACTURACION	1
80	19 dic 2023, 10:23	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: Consorcio Dicac <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	AFILIACION CONSORCIO VENTURA DICIEMBRE 18 DE 2023	3
81	19 dic 2023, 13:52	de: Dirección Regional Andina <dirandina@supernotariado.gov.co>	Para: "CONSORCIOEDIFICACIONDICAC@GMAIL.COM" <CONSORCIOEDIFICACIONDICAC@gmail.com>, "CONSORCIOVENTURA.SNR@GMAIL.COM" <CONSORCIOVENTURA.SNR@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	Solicitud Prórroga Contrato Obra No. 2392 y Contrato Interventoría No. 2467 AGRUPACIÓN 4	1

82	19 dic 2023, 14:48	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	Para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	CORRECCION DOCUMENTOS SEGOVIA Y CAUCASIA PARA CORTE Y FACTURACION	6
83	19 dic 2023, 18:46	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	Re: OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 MARINILLA	3
84	19 dic 2023, 19:08	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	OFICIO No. CV-SNR-020-2023- SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023	1
85	20 dic 2023, 11:30	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-021-2023 INFORME SEMANAL No. 3 ORIP SEGOVIA	3
86	20 dic 2023, 16:18	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-022-2023 INFORME SEMANAL No. 2 ORIP CAUCASIA	3
87	20 dic 2023, 17:25	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-023-2023 INFORME SEMANAL No. 1 ORIP ITUANGO	3
88	20 dic 2023, 18:07	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-024-2023 INFORME SEMANAL No. 1 ORIP YARUMAL	3
89	20 dic 2023, 21:41	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com,	Re: OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 AMALFI	5

			Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
90	21 dic 2023, 0:04	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	Re: OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 CAUCASIA	6
91	21 dic 2023, 12:43	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	OFICIO No. CV-SNR-019-2023- ASUNTO: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	1
92	21 dic 2023, 16:06	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	OTRA TITITRIBI	1
93	22 dic 2023, 8:29	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co> Cc: luisdo.herreraguzman@gmail.com, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Documentación Andes	5
94	22 dic 2023, 11:04	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Fwd: Información Secop Licitación Obra 004 SNR	4
95	22 dic 2023, 13:47	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	INFORMES SEMANALES ORIP JERICÓ	3
96	22 dic 2023, 16:49	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>	Formato solicitud de reserva presupuestal	1
97	22 dic 2023, 19:53	de: WeTransfer <noreply@wetransfer.com> responder a: altavistacgsas@outlook.com	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com sent you DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 1 via WeTransfer	1
98	22 dic 2023, 19:57	de: WeTransfer <noreply@wetransfer.com> responder a: altavistacgsas@outlook.com	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	altavistacgsas@outlook.com sent you REGISTRO FOTOGRAFICO via WeTransfer	1
99	23 dic 2023, 15:15	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	PRESUPUESTO SANTUARIO -RISARALDA	2

			Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>		
100	24 dic 2023, 17:48	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	CV-SNR-029-2023 ENTREGA BALANCE AJUSTADO Y PRESUPUESTO ORIP YARUMAL	3
101	26 dic 2023, 15:07	de: Ceiler Alberto Salazar... (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: "Ceiler Alberto Salazar..." <ceileralbertos@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	Solicitud de compartir "DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 1.rar"	1
102	26 dic 2023, 15:14	de: luz estela Pérez (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: luz estela Pérez <estelaperez62@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	Solicitud de compartir "DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 1.rar"	1
103	26 dic 2023, 16:21	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	CV-SNR-030-2023 INFORME SEMANAL No. 3 ORIP CAUCASIA	3
104	26 dic 2023, 16:29	de: MAXIEL NAVARRO (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: MAXIEL NAVARRO <maxielnavarro@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	Solicitud de compartir "DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 1.zip"	1
105	26 dic 2023, 16:45	de: Ceiler Alberto Salazar... (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: "Ceiler Alberto Salazar..." <ceileralbertos@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	Solicitud de compartir "DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 1.zip"	1
106	26 dic 2023, 17:05	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >	CV-SNR-031-2023 INFORME SEMANAL No. 4 ORIP SEGOVIA	3
107	26 dic 2023, 18:06	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co >, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co >, "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	0
108	26 dic 2023, 19:16	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>,	o: CV-SNR-032-2023 INFORME SEMANAL No. 2 ORIP YARUMAL	3

			Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
109	26 dic 2023, 19:40	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	CV-SNR-033-2023 INFORME SEMANAL No. 2 ORIP ITUANGO	3
110	28 dic 2023, 2:04	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	RV: FICHAS TECNICAS DE SEÑALIZACIÓN	2
111	28 dic 2023, 9:19	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Fwd: Documentos acta parcial No. 1	0
112	28 dic 2023, 9:42	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceileralbertos@gmail.com>	para: "ingenierosoficina@gmail.com" <ingenierosoficina@gmail.com>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Documentos para firma	1
113	28 dic 2023, 14:06	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	FACTURA ELECTRONICA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CORREGIDA	1
114	28 dic 2023, 14:18	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "correspondencia@supernotariado.gov.co" <correspondencia@supernotariado.gov.co> Cc: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>	CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023- DOCUMENTOS PRIMER CORTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT. 901.550.907-2	3
115	29 dic 2023, 9:29	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	SOLICTUD RESPUESTA A MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023	0
116	29 dic 2023, 14:47	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-035-2023 RESPUESTA A SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD DE PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES	5
117	29 dic 2023, 16:11	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-036-2023 REGISTRO DE EJECUCION DETALLES RECIBO ORIP AMALFI	2
118	29 dic 2023, 18:07	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	INFORMES SEMANALES ZONA SUR	0

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENERO 2024					
120	2 ene 2024, 9:21	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Avances de ejecución de obra 02-01-2024	1
121	3 ene 2024, 9:15	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para:"consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	AFILIACIONES CONSORCIO VENTURA DICIEMBRE 18 DE 2023	3
122	23 dic 2023, 12:42	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	CV-SNR-023-2023 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	2
123	4 ene 2024, 2:49	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	Re: CV-SNR-023-2023 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	2
124	4 ene 2024, 2:53	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	Re: Recordatorio vencimiento de seguridad social	1
125	8 ene 2024, 19:16	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	DOCUMENTOS ORIPS AMALFI, CAUCASIA, ITUANGO YARUMAL Y SEGOVIA PARA CORTE No. 2	0
126	9 ene 2024, 7:47	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CUADRO DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA A FECHA 09-01-2024	1
127	9 ene 2024, 10:00	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CV-SNR-038-2024 INFORME SEMANAL No. 3 ORIP ITUANGO	4
128	9 ene 2024, 11:57	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	CV-SNR-039-2024 INFORME SEMANAL No. 3 y 4 ORIP YARUMAL	5

			Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
129	10 ene 2024, 17:45	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	fecha: asunto: CV-SNR-040-2024 INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO DEL 16 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2023 CV	1
130	13 ene 2024, 17:20	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, luisdo.herreraguzman@gmail.com	CORTE DE OBRA N° 2	1
131	15 ene 2024, 14:00	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	CUADRO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A 15-01-2024	1
132	16 ene 2024, 10:09	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	SOLICITUD INFORMACION PAGO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023-CONSORCIO VENTURA	0
133	3 ene 2024, 20:09	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	HOJA DE VIDA PROFESIONAL SISO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023	1
134	16 ene 2024, 18:01	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	RE: HOJA DE VIDA PROFESIONAL SISO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023	1
134	16 ene 2024, 18:01	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	RE: HOJA DE VIDA PROFESIONAL SISO	1
				CONTRATO DE OBRA No	
				2392 de 2023	
135	fecha: 16 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		0
	2024, 10:38	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, "ingenierosoficina@gmail.com"	asunto: SEGUIMIENTO	
			<ingenierosoficina@gmail.com>	EJECUCIÓN CONTRATOS	
			Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández	2023	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, "consorcioventura.snr@gmail.com"		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>		

136	fecha: 16 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		2
	2024, 19:54	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: Re: SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATOS 2023	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
137	fecha: 17 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: CONSORCIO VENTURA		0
	2024, 10:11	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RE: SEGUIMIENTO	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	EJECUCIÓN CONTRATOS	
			<altavistacgsas@outlook.com>, "ingenierosoficina@gmail.com"	2023	
			<ingenierosoficina@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
138	fecha: 17 ene	de: Altavista Construction Group SAS	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		23
	2024, 10:32	<altavistacgsas@outlook.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, "consorcioventura.snr@gmail.com"		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com"	asunto: CRONOGRAMAS ACTIALIZADOS PDF Y MPP	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
139	fecha: 17 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: "consorcioventura.snr@gmail.com"		0
	2024, 9:31	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, "altavistacgsas@outlook.com"		
			<altavistacgsas@outlook.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: Solicitud cargue de póliza actualizada	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Magaly Caycedo Molano		
			<magaly.caycedo@supernotariado.gov.co>, Felipe Andrés Ríos Franco		
			<felipe.rios@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Claudia Marnie Rodríguez Daza		
			<claudia.rodriguez@supernotariado.gov.co>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
140	fecha: 18 ene	de: Altavista Construction Group SAS	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		0
	2024, 9:34	<altavistacgsas@outlook.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, "consorcioventura.snr@gmail.com"		
			<consorcioventura.snr@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: RE: Solicitud cargue de póliza actualizada	

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Magaly Caycedo Molano		
			<magaly.caycedo@supernotariado.gov.co>, Felipe Andrés Ríos Franco		
			<felipe.rios@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Claudia Marnie Rodríguez Daza		
			<claudia.rodriguez@supernotariado.gov.co>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
141	fecha: 19 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		3
	2024, 8:58	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CV-SNR-042-2024 INFORME SEMANAL No. 4	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	ORIP ITUANGO	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
142	fecha: 19 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		3
	2024, 9:18	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CV-SNR-043-2024 INFORME SEMANAL No. 5	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	ORIP YARUMAL	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
143	fecha: 19 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		1
	2024, 15:29	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: CV-SNR-044-2024	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	INFORME INSPECCION	
			<altavistacgsas@outlook.com>	DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y	
				SERVIDAS ORIP YARUMAL	
144	fecha: 23 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		6
	2024, 8:49	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc:	asunto: CV-SNR-045-2024	
			Altavista Construction Group SAS	INFORME SEMANAL No. 5	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	ORIP ITUANGO y No. 6 ORIP YARUMAL	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
145	fecha: 23 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: "consorcioventura.snr@gmail.com"		0
	2024, 11:50	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, "altavistacgsas@outlook.com"	asunto: RV: RADICADO SNR2023ER158642	
			<altavistacgsas@outlook.com>		
			Cc: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández		

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Oscar Alberto Serna Valencia		
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>		
146	fecha: 23 ene	de: Altavista Construction Group SAS	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		0
	2024, 17:45	<altavistacgsas@outlook.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, "consorcioventura.snr@gmail.com"	asunto: RE: RADICADO	
			<consorcioventura.snr@gmail.com>	SNR2023ER158642	
			Cc: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Oscar Alberto Serna Valencia		
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>		
147	fecha: 24 ene	de: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		0
	2024, 8:16	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: Re: RADICADO	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso	SNR2023ER158642	
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, Oscar Alberto Serna Valencia		
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>, ceileralbertos@gmail.com, maxielnavarro@gmail.com		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>		
148	fecha: 24 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		0
	2024, 13:10	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Re: REENVIO DE	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	INFORMACION	
			<altavistacgsas@outlook.com>	DOCUMENTAL	
				CORRESPONDIENTE AL	
				CORTE 1	
149	fecha: 25 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		0
	2024, 11:08	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: Solicitud de horario extendido Titiribí	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
150	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		0
	2024, 9:36	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: CAMBIO DE	
			Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	GUARDA PUERTA PRINCIPAL	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	ORIP YARUMAL	

			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
151	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		1
	2024, 10:34	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: CUADRO DE	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	EJECUCIÓN DE OBRA A	
			<altavistacgsas@outlook.com>	CORTE 26/01/2024	
152	fecha: 26 ene 2024, 16:19	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: correspondencia@supernotariado.gov.co, siifnacion.facturaelectronica@minihacienda.gov.c		0
			o	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	2392 DE 2023 AGRUPACION	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	4, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 ORIP AMALFI CORTE 1	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
153	fecha: 25 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		0
	2024, 16:55	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS	asunto: RE: OFICINAS	
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA	REGISTRO - PRIMER PAGO DEL CONTRATISTA	
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	CONSORCIO VENTURA-CORREGIDO	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, "ceileralbertos@gmail.com"		
			<ceileralbertos@gmail.com>, "maxielnavarro@gmail.com"		
			<maxielnavarro@gmail.com>		
			Cc: "ingenierosoficina@gmail.com"		
			<ingenierosoficina@gmail.com>, Oscar Alberto Serna Valencia		
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>		
154	fecha: 25 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		0
	2024, 21:48	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Re: OFICINAS	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	REGISTRO - PRIMER PAGO	
			<altavistacgsas@outlook.com>,	DEL CONTRATISTA	
			Cesar Augusto Martinez Hernández	CONSORCIO VENTURA-	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	CORREGIDO	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
155	fecha: 26 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: CONSORCIO VENTURA		0
	2024, 12:24	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RE: OFICINAS	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	REGISTRO - PRIMER PAGO	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	DEL CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA-	

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Oscar Alberto Serna Valencia	CORREGIDO	
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
156	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		0
	2024, 16:23	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
			Cc: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS	asunto: Re: OFICINAS REGISTRO - PRIMER PAGO	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	DEL CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA-	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Oscar Alberto Serna Valencia	CORREGIDO	
			<oscar.serna@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
157	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 17:02	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	No. 1 ORIP AMALFI CORTE 1	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
158	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 17:07	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	No. 2 ORIP AMALFI CORTE 2	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
159	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 17:13	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	No. 1 ORIP AMALFI CORTE 1	
			<altavistacgsas@outlook.com>,		
			CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
160	fecha: 26 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 17:15	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	No. 2 ORIP AMALFI CORTE 2	

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
161	fecha: 27 ene	de: Altavista Construction Group SAS	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		0
	2024, 10:29	<altavistacgsas@outlook.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	asunto: SOLICTUD RECHAZO	
			Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com"	FACTURA No. CVE79 EN LA	
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com"	PLATAFORMA DEL SECOP II	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
162	fecha: 27 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		1
	2024, 13:27	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: Re: Solicitud de seguridad social	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>		
163	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		1
	2024, 8:26	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Remisión formato permiso TAR	
164	fecha: 29 ene	de: Altavista Construction Group SAS	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		0
	2024, 9:17	<altavistacgsas@outlook.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
			Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	asunto: REITERACION PLANOS DE CADA ORIP	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, "consorcioventura.snr@gmail.com"		
			<consorcioventura.snr@gmail.com>		
165	fecha: 29 ene	de: Altavista Construction Group SAS	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		0
	2024, 9:20	<altavistacgsas@outlook.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: REITERACION CRONOGRAMA DE ENTREGA	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	DE OBRAS ORIP CONTRATO 2392 DE 2023	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
166	fecha: 29 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		1
	2024, 10:23	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: Formato reserva presupuestal	
	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 12:32	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
167			<altavistacgsas@outlook.com>,	No. 1 ORIP ANDES CORTE 1	
			Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
168	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1

	2024, 12:34	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	No. 2 ORIP ANDES CORTE 2	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
169	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 12:35	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	No. 1 ORIP CAUCASIA CORTE 1	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
170	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 12:36	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	No. 1 ORIP MARINILLA CORTE 1	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
171	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 12:39	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	No. 1 ORIP SEGOVIA CORTE 1	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
172	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 14:18	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	No. 1 ORIP SEGOVIA CORTE 1	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
173	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 14:19	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	2392 DE 2023 AGRUPACION	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	4, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 ORIP AMALFI CORTE 2	

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
174	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 12:37	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	No. 2 ORIP MARINILLA CORTE 2	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
175	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: correspondencia@supernotariado.gov.co		1
	2024, 12:40	<consorcioventura.snr@gmail.com>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	asunto: CONTRATO DE OBRA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	2392 DE 2023 AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	No. 2 ORIP SEGOVIA CORTE 2	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
176	fecha: 29 ene	de: Correspondencia SNR	para: CONSORCIO VENTURA		0
	2024, 18:30	<correspondencia@supernotariado.gov.	<consorcioventura.snr@gmail.com>	asunto: RE: CONTRATO DE	
		co>	Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	OBRA 2392 DE 2023	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 ORIP	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	SEGOVIA CORTE 2	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
177	fecha: 29 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: Correspondencia SNR		1
	2024, 18:34	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<correspondencia@supernotariado.gov.co>		
			Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS	asunto: Re: CONTRATO DE OBRA 2392 DE 2023	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández	AGRUPACION 4, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 ORIP	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	SEGOVIA CORTE 2	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
178	fecha: 30 ene	de: CONSORCIO VENTURA	para: Correspondencia SNR		12
	2024, 10:36	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<correspondencia@supernotariado.gov.co>		
			Cc: Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: CONTRATO DE OBRA 2392 DE 2023 AGRUPACION	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández	4, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 ORIP SEGOVIA CORTE	
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	2	

			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>		
179	fecha: 31 ene	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		1
	2024, 11:50	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Formato de reservas	
			Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO FEBRERO 2024					
180	fecha: 2 feb	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		0
	2024, 13:26	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Visitas de recibo	
			Cc: "consorcioventura.snr@gmail.com"	final	
			<consorcioventura.snr@gmail.com>, "altavistacgsas@outlook.com"		
			<altavistacgsas@outlook.com>, "ingenierosoficina@gmail.com"		
			<ingenierosoficina@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
181	fecha: 3 feb	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC		2
	2024, 16:51	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: DOCUMENTOS	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	CORRESPONDIENTES A LA	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	FACTURACION No. 2 CONSORCIO VENTURA	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
182	fecha: 5 feb	de: Oficina de Registro Amalfi	para: CONSORCIO VENTURA		0
	2024, 9:19	<ofiregisamalfi@supernotariado.gov.co>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com"		
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Altavista Construction Group SAS	asunto: Imágenes de Hallazgos en oficina Amalfi	
			<altavistacgsas@outlook.com>, "ingenierosoficina@gmail.com"		
			<ingenierosoficina@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez		
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Gilberto Eliecer Yepes Puerta		
			<gilberto.yepes@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
183	fecha: 6 feb	de: CONSORCIO VENTURA	para: Correspondencia SNR		0
	2024, 17:21	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<correspondencia@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	asunto: CONTRATO DE OBRA 2392 DE 2023 AGRUPACION	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	4 CV-SNR-046-2024	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	RESPUESTA INGRESO DE	
			<altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sánchez	AGUAS LLUVIAS ORIP AMALFI	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		

			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, ingenierosoficina@gmail.com		
184	fecha: 7 feb	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	asunto: CV-SNR-048-2023	8
	2024, 0:26	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	Correcciones de planilla de	
			Cc: Altavista Construction Group SAS	Seguridad social	
			<altavistacgsas@outlook.com>		
185	fecha: 8 feb 2024, 18:01	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Solicitud cargue de informes	0
			Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso		
			<maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>		
186	fecha: 8 feb	de: CONSORCIO VENTURA	para: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	asunto: APU PUERTA TITIRIBÍ	3
	2024, 20:45	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	+ COTIZACIÓN	
			Cco: consorcioedificaciondicac@gmail.com		
187	fecha: 9 feb 2024, 8:39	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Actas de visita firmadas	10
188	fecha: 9 feb 2024, 8:43	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RE: Actas de visita firmadas	1
189	fecha: 12 feb 2024, 15:35	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RE: Hoja de vida SST interventoría	0
190	fecha: 12 feb 2024, 16:43	de: Licitaciones y presupuestos <licitacionesfga@gmail.com>	para: oficina <ingenierosoficina@gmail.com>, consorcioedificaciondicac@gmail.com	asunto: Fwd: SEGUIMIENTO CONTRATO DE	2
				INTERVENTORIA 2467-2023	
191	fecha: 13 feb	de: CONSORCIO VENTURA	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC	asunto: SOLICITUD REUNION	0
	2024, 8:34	<consorcioventura.snr@gmail.com>	<consorcioedificaciondicac@gmail.com>	ACLARACION ACTA DE	
			Cc: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	COBRO No. 2	
			<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>		
192	fecha: 13 feb	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez	para: CONSORCIO VENTURA	asunto: RE: SOLICITUD	1
	2024, 12:21	<ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	<consorcioventura.snr@gmail.com>, CONSORCIO EDIFICACION DICAC	REUNION ACLARACIÓN ACTA DE COBRO No. 2	
			<consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Bayardo Bustos Linares		
			<bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>		
			Cc: Cesar Augusto Martinez Hernández		
			<cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS		
			<altavistacgsas@outlook.com>		
193	fecha: 14 feb 2024, 13:36	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RV: Nueva PQRS asignada: SNR2024ER013255	1

194	fecha: 15 feb 2024, 14:24	de: Ceiler Alberto Salazar Sánchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Doc. Estudios Previos	1
195	fecha: 16 feb 2024, 11:10	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Re: Hallazgo constructivo - Titiribí	0
CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO FEBRERO 2024					
197	16 feb 2024, 11:10	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Re: Hallazgo constructivo - Titiribí	0
198	fecha: 17 feb 2024, 7:34	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	asunto: CV-SNR-049-2024 INSTALACION DE MOTOBOMBAS DE 2 HP EN LAS ORIPS DE SEGOVIA E ITUANGO	1
199	fecha: 18 feb 2024, 17:01	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: BALANCES Y PRESUPUESTOS AJUSTADOS DE ACUERDO A LAS VISITAS A LAS ORIPS DE SEGOVIA, CAUCASIA, YARUMAL E ITUANGO	4
200	fecha: 19 feb 2024, 13:33	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: BALANCES RECORRIDO INICIAL DE VISITA Y DIAGNOSTICO AMALFI, CAUCASIA, SEGOVIA, YARUMAL E ITUANGO	5
201	fecha: 19 feb 2024, 17:21	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: ACTA PARCIAL Y MEMORIAS AJUSTADAS AMALFI DE ACUERDO A OBSERVACIONES DE SUPERVISION	2
202	fecha: 20 feb 2024, 8:22	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Re: Solicitud de seguridad social	2
203	fecha: 20 feb 2024, 15:15	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: AJUSTE BALANCE AJUSTADO ORIP ITUANGO	1
204	fecha: 20 feb 2024, 21:42	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: CRONOGRAMA VISITAS PARA SUPERVISION	0
205	fecha: 21 feb 2024, 11:05	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Programación de visitas	0
206	fecha: 22 feb 2024, 13:55	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: BALANCES, PRESUPUESTOS Y FORMATO DE JUSTIFICACION DE LAS VISITAS INICIALES DE INSPECCION Y DIAGNOSTICO ZONA NORTE	0

207	fecha: 23 feb 2024, 9:54	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RV: Pago interventoría	1
208	fecha: 23 feb 2024, 10:24	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: Instrucciones Factura Electrónica	0
209	fecha: 23 feb 2024, 14:48	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: BALANCE Y PRESUPUESTO AJUSTADO DE ACUERDO A LA VISITA ORIP DE CAUCASIA V2	0
210	fecha: 23 feb 2024, 15:22	de: CONSORCIO VENTURA (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	asunto: Carpeta compartida contigo: "INICIAL - SANTUARIO RISARALDA"	0
211	fecha: 23 feb 2024, 15:23 "	de: CONSORCIO VENTURA (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	asunto: Carpeta compartida contigo: "INICIAL - ANDES	0
212	fecha: 23 feb 2024, 15:56	de: CONSORCIO VENTURA (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	asunto: Carpeta compartida contigo: "SNR"	0
213	fecha: 23 feb 2024, 16:00	de: CONSORCIO VENTURA (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> responder a: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: consorcioedificaciondicac@gmail.com	asunto: Carpeta compartida contigo: "SNR"	1
214	fecha: 26 feb 2024, 13:59	de: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>, "ceileralbertos@gmail.com" <ceileralbertos@gmail.com>	asunto: RE: VISITAS DE RECIBO FINAL CON LA SUPERVISION	0
215	fecha: 27 feb 2024, 16:47	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RE: ACTAS DE JUSTIFICACION DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES INICIALES	9
216	fecha: 28 feb 2024, 8:20	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: ACTAS DE VECINDAD, APERTURA Y CIERRE DE AMALFI, CAUCASIA, SEGOVIA, YARUMAL E ITUANGO	1
217	fecha: 14 feb 2024, 13:02	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>,	asunto: CV-SNR-047-2024 INFORME MENSUAL No. 2 PERIODO DEL 17 DE DIC 2023 AL 16 DE ENE DE 2024 CV	3

			Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>		
218	fecha: 28 feb 2024, 15:00	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>	asunto: RE: BALANCES Y PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS 11 ORIP	24
219	fecha: 29 feb 2024, 12:07	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: Oficina de Registro Segovia <ofiregissegovia@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Caucasia <ofiregiscaucasia@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Yarumal <ofiregisyarumal@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Ituango <ofiregisituango@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Titiribí <ofiregistitiribi@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Jericó <ofiregisjerico@supernotariado.gov.co>, Oficina de Registro Santuario <ofiregissantuario@supernotariado.gov.co> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, "consorcioventura.snr@gmail.com" <consorcioventura.snr@gmail.com>, "altavistacgsas@outlook.com" <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: Visitas para recibo final de obras	0
CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO MARZO 2024					
220	fecha: 1 mar 2024, 13:34	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "CONSORCIO EDIFICACION ..." <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, "ceileralbertos@gmail.com" <ceileralbertos@gmail.com>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>, "maxielnavarro@gmail.com" <maxielnavarro@gmail.com>	asunto: RE: Carpeta compartida contigo: "PRIMER COBRO INTERVENTORÍA"	0
221	fecha: 6 mar 2024, 8:37	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER023943	0
222	fecha: 6 mar 2024, 8:37	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER023951	0
223	fecha: 6 mar 2024, 8:37	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER023962	0
224	fecha: 6 mar 2024, 8:37	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER023976	0

225	fecha: 6 mar 2024, 8:38	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER024034	0
226	fecha: 6 mar 2024, 8:39	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER024037	0
227	fecha: 6 mar 2024, 8:39	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Fwd: RADICADO SNR2024ER024043	0
228	fecha: 8 mar 2024, 8:40	de: Oficina de Registro Amalfi <ofiregisamalfi@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: RV: OFICINAS REGISTRO - ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES AMALFI	2
229	fecha: 14 mar 2024, 7:46	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP SEGOVIA Y CAUCASIA	2
230	fecha: 14 mar 2024, 9:56	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP YARUMAL	2
231	fecha: 14 mar 2024, 9:58	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Actas firmadas	2
232	fecha: 14 mar 2024, 11:13	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP ITUANGO	2
233	fecha: 14 mar 2024, 12:36	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP MARINILLA	2
234	fecha: 14 mar 2024, 17:48	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP AMALFI	2
235	fecha: 14 mar 2024, 18:15	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP JERICO	2
236	fecha: 14 mar 2024, 19:19	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP TITIRIBÍ	1
237	fecha: 15 mar 2024, 4:43	de: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> Cc: altavistacgsas@aol.com	asunto: INFORME DE SUBSANACIONES VISITA DE RECORRIDO DE RECIBO DE OBRAS ORIP SANTUARIO	2
238	fecha: 15 mar 2024, 14:38	de: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>	para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>	asunto: Actas de recibo parcial firmadas	1

Tabla 8 Correspondencia recibida

Ver Carpeta de Liquidación Técnica de la interventoría y Contratista – Anexo 23 Control de correspondencia (correos y oficios)

6 ASPECTOS FINANCIEROS CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACION

6.1 CONTRATISTA DE OBRA


6.1.1 Programación financiera, Programado vs ejecutado


Se presenta valores ejecutados en el contrato de obra, donde se ejecutó un valor $609.822.501,80 (SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS UN PESOS Y OCHENTA CENTAVOS) alcanzando un porcentaje presupuestal ejecutado del 98,34% frente al valor contractual, este valor ejecutado se raparte por la 11 Orip como se muestra a continuación.

Para el contrato de obra número 2392 DE 2023 cuyo objeto es "*CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4)."* Se presenta un saldo a favor de la supervisión y entidad contratante SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO de $ 10.280.283,68 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y SESENTA Y OCHO CENTAVOS), con este saldo a favor de la entidad y el valor ejecutado mencionado anteriormente se da un cierre del 100% del valor contractual.

Se resalta que, el cobro final se presentó una gran cantidad de variaciones a lo previsto, esto después que la interventoría realizara la verificación final y encontrara que algunas actividades no se habían realizado a cabalidad y no se contaba con los respectivos soportes para el cobro de las misma, esto dejando un saldo mayor al contrato, pero en común acuerdo con los registrados y a solicitud de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO se trasladaron algunos recursos de unas ORIPS a otras, para alcanzar a cumplir el objeto contractual y dejar las oficinas en óptimas condiciones, en el ítem 6.1.3 de equilibrio económico se profundizara en este tema, y se relacionara que recursos fueron utilizados y en qué actividades.

CUADRO RESUMEN CONTRATISTA AGRUPACION No. 4					
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR OBRA	VALOR CORTE FINAL
1	ANDINA	RISARALDA	SANTUARIO	$ 66.672.176,13	$ 66.672.176
2		ANTIOQUIA	ITUANGO	$ 42.970.314,85	$ 40.764.644
3			TAMESIS	$ 46.777.361,25	$ 46.539.850
4			TITIRIBI	$ 49.775.878,73	$ 49.775.879
5			MARINILLA	$ 28.963.700,33	$ 28.742.640
6			AMALFI	$ 27.427.856,35	$ 27.427.856
7			CAUCASIA	$ 50.778.684,14	$ 50.778.683
8			SEGOVIA	$ 94.006.694,87	$ 91.816.753
9			YARUMAL	$ 68.694.802,30	$ 68.694.802
10			JERICO	$ 117.097.056,63	$ 111.670.958
11			ANDES	$ 26.938.259,90	$ 26.938.260
	TOTAL			**$ 620.102.785,48**	**$ 609.822.501,80**
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL				**100%**	98,34%
SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO					**$ 10.280.283,68**

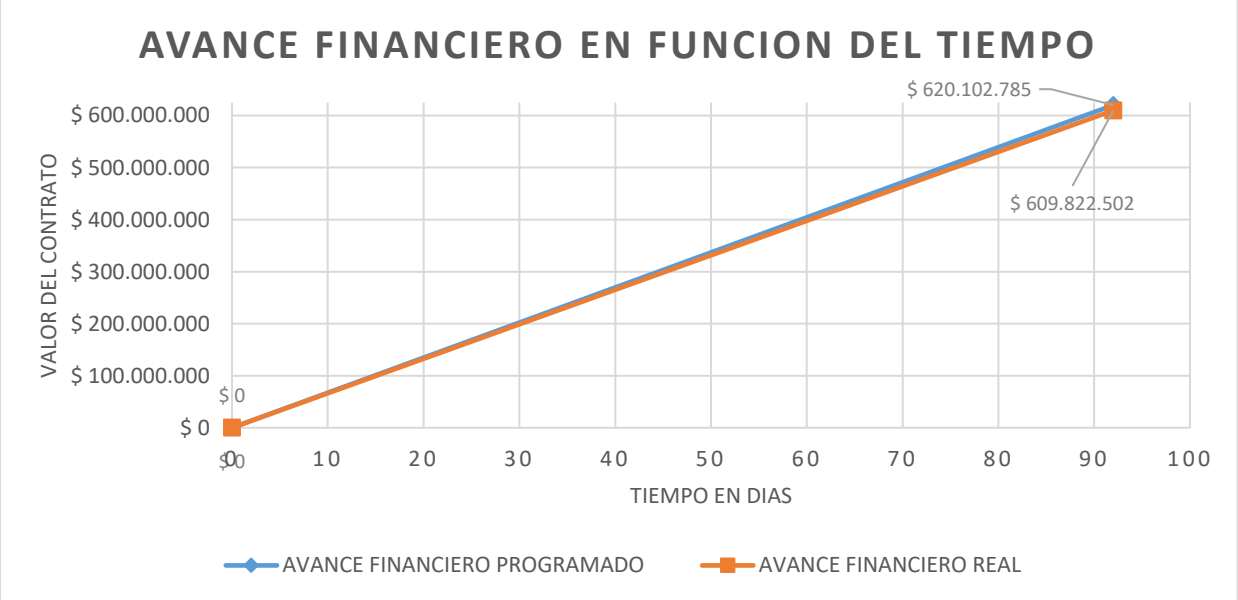

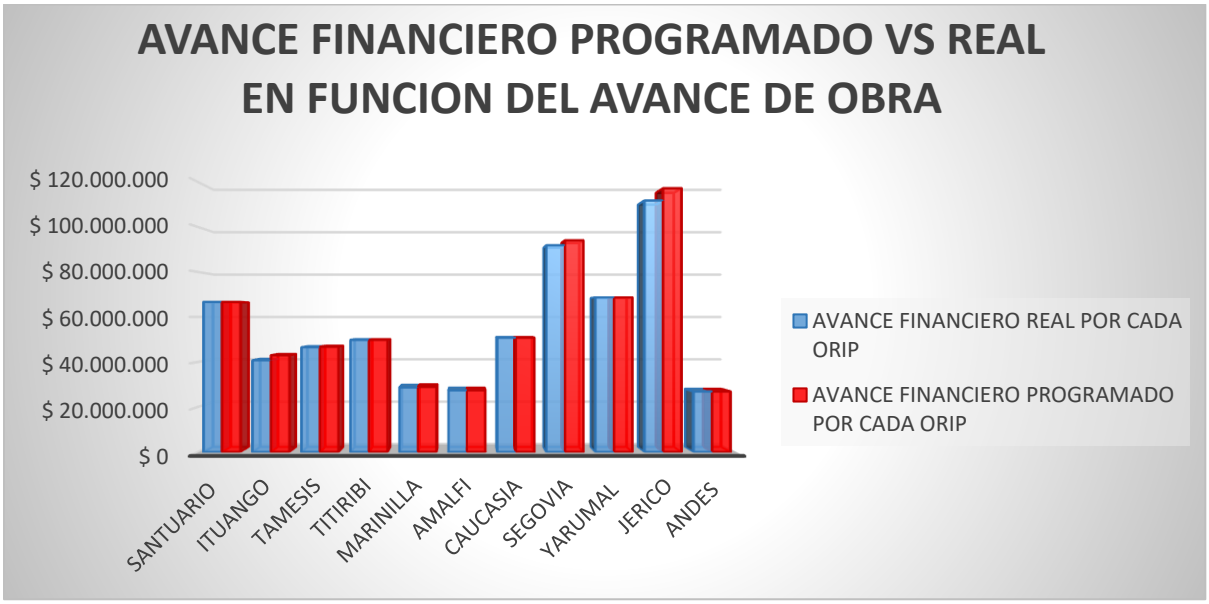

6.1.2 Relación de pagos realizados

En el contrato de obra se realizaron un total de 3 pagos que se relacionan en la tabla a continuación.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

CUADRO RESUMEN CONTRATISTA AGRUPACION No. 4

N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR OBRA	PAGO 1	VALOR	PAGO 2	VALOR	PAGO 3	VALOR PENDIENTE POR COBRAR	VALOR CORTE FINAL
1	ANDINA	RISARALDA	SANTUARIO	$ 66.672.176,13			90%	$ 60.004.959	10,00%	$ 6.667.218	$ 66.672.176
2		ANTIOQUIA	ITUANGO	$ 42.970.314,85			90%	$ 38.673.283	4,87%	$ 2.091.361	$ 40.764.644
3			TAMESIS	$ 46.777.361,25			90%	$ 42.099.625	9,49%	$ 4.440.225	$ 46.539.850
4			TITIRIBI	$ 49.775.878,73			0%	$ 0	100,00%	$ 49.775.879	$ 49.775.879
5			MARINILLA	$ 28.963.700,33	60%	$ 17.378.220	30%	$ 8.689.110	9,24%	$ 2.675.309	$ 28.742.640
6			AMALFI	$ 27.427.856,35	60%	$ 16.456.714	30%	$ 8.228.357	10,00%	$ 2.742.786	$ 27.427.856
7			CAUCASIA	$ 50.778.684,14	30%	$ 15.233.605	60%	$ 30.467.210	10,00%	$ 5.077.867	$ 50.778.683
8			SEGOVIA	$ 94.006.694,87	60%	$ 56.404.017	30%	$ 28.202.008	7,67%	$ 7.210.728	$ 91.816.753
9			YARUMAL	$ 68.694.802,30			90%	$ 61.825.322	10,00%	$ 6.869.480	$ 68.694.802
10			JERICO	$ 117.097.056,63			90%	$ 105.387.351	5,37%	$ 6.283.607	$ 111.670.958
11			ANDES	$ 26.938.259,90	60%	$ 16.162.956	30%	$ 8.081.478	10,00%	$ 2.693.826	$ 26.938.260
	TOTAL			$ 620.102.785,48		$ 121.635.512,11		$ 391.658.704		$ 96.528.285,72	$ 609.822.501,80
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL						19,62%		63,16%		15,57%	98,34%
				SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO							$ 10.280.283,68

6.1.3 Equilibrio económico o financiero del contrato de obra

Al momento de realizar la revisión para el pago final se observó inconsistencia con las memorias de cálculos y sus respectivos soportes, la interventoría realizo la revisión de las actividades, a razón de esto el contrato de obra número 2392 DE 2023 cuyo objeto es "*CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4)."* Se presenta un saldo a favor de la supervisión y entidad contratante SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO de $ 10.280.283,68 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y SESENTA Y OCHO CENTAVOS), no cerraba en un 100% su avance presupuestal, debido a esto y a solicitud de la SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO se destinaron estos recursos a actividades que no se habían podido ejecutar por la falta de recursos que serán mencionadas a continuación:

- **ALMALFI.**

Se Realizaron visitas de campo en las oficinas de ORIP AMALFI, donde se realiza se revisan las actividades realizadas por el contratista para el mejoramiento locativo de la ORIP.


En esta visita se verifica un problema de filtración de agua por la viga canal frontal en días anteriores.

ASPECTOS RELEVANTES:

Se revisa en la cubierta el estado de la impermeabilización realizada en la viga canal y se observa que fue realizada acorde a las indicaciones de la interventoría, en esta revisión se observó que el bajante de aguas lluvias se encontraba obstruido por materiales plásticos, esto ocasiono el rebosamiento de la viga canal y su posterior filtración al interior de las instalaciones de la ORIP.
Se anexa registro fotográfico de lo antes mencionado.

La interventoría y el contratista observan que los bajantes de aguas lluvias y las dimensiones de la viga canal son insuficientes (Demasiado pequeñas) para la evacuación del volumen de agua proveniente de la cubierta, esto se observa en el registro fotográfico.

Para subsanar esta actividad se plantea la instalación de dos bajantes de aguas lluvias de 4 pulgadas por la parte interna que desagüen al exterior en el andén y no conectarlos al sistema de alcantarillado como se encuentra actualmente como se presenta en el siguiente gráfico.

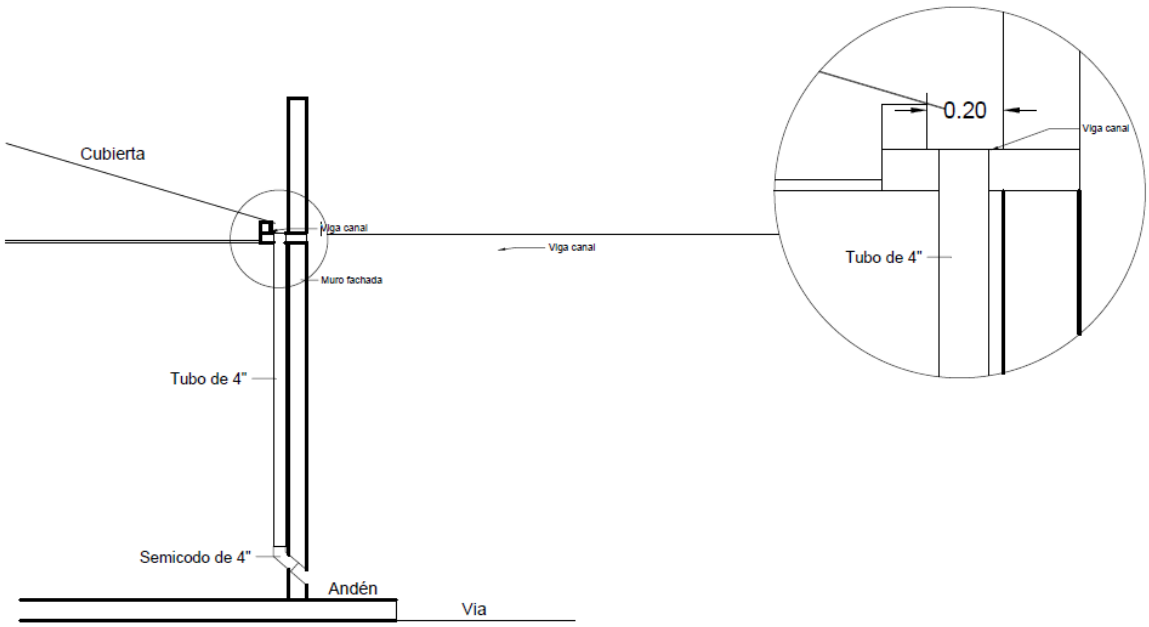

El diseño anterior aplica para los dos bajantes ubicados en cada esquina de la oficina en su parte frontal.

OBSERVACIONES:

Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo y periódico a los canales para evitar la obstrucción de los bajantes de aguas lluvias y futuras inundaciones.

La interventoría solicita que en la viga canal se suba 40 cm el manto asfaltico con soplete, esto dado que se observó un pequeño recorrido sobre el muro y esto a futuro puede ocasionar filtraciones.

Se verificaron las cantidades ejecutas y estipuladas en el balance final, las cuales se realizaron acorde a lo pactado.

Se cumple con el objeto para esta ORIP

ANEXO FOTOGRAFICO














Se anexa registro de la actividad realizada

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

- **SANTUARIO**

La viga canal en la orip de Santuario presentaba humedades debido al rebosamiento de la misma, esto se debía a que las dimensiones de esta, no eran las adecuadas para garantizar el desagüe óptimo de las aguas lluvias recolectadas por la cubierta, por esto se hizo necesario la intervención de esta actividad que no estaba contemplada dentro del presupuesto inicial.

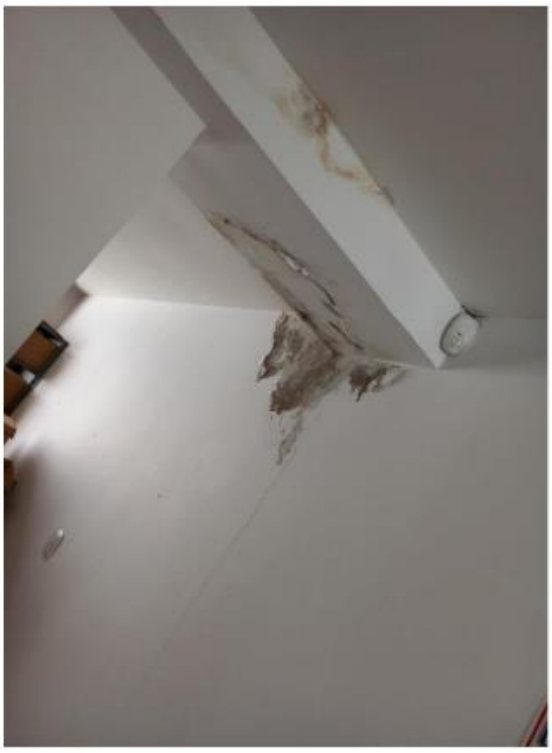

SUBSANACIÓN. Se realiza la actividad de acuerdo a la solicitud, se instala viga canal en lámina, se corrigen humedades y filtraciones, se impermeabiliza, se desmonta cubierta en mal estado y se instala cubierta nueva en fibrocemento.



















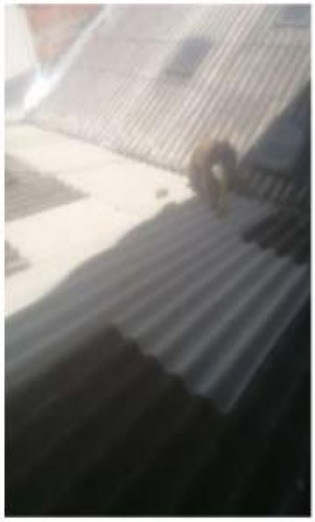

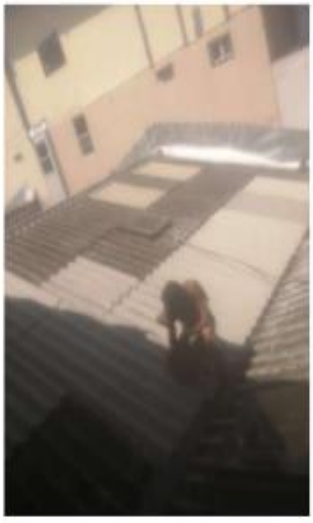

Se ver la **Carpeta del Contratista Liquidación Tecnica - Anexo 34 Informes Subsanaciones,** donde se deja constancias de las actividades antes mencionadas y muchas más con las que balanceo el contrato dando como resultado un saldo a favor de la SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO de $ 10.280.283,68 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y SESENTA Y OCHO CENTAVOS).

6.2 Relación de Actas de mayores y menores cantidades

Se relacionan las actas de mayores y menores cantidades de las 11 ORIP que resulto de las visitas diagnóstico y las actas que dan por resultado luego de la visita de recibo por parte de la supervisión.

Ver Carpeta del Contratista Liquidación Tecnica - Anexo 14 Acta de mayores y menores cantidades e items No previstos (PDF Y EXCEL) por cada orip.

6.3 Relación de actas de recibo parcial y/o final

Se relacionan las actas del cobro #1, cobro #2 y cobro #3 final.

Ver Carpeta del Contratista Liquidación Tecnica - Anexo 15 Acta de recibo parcial por cada corte de la orip.

6.4 Actas de justificación de cantidades mayores y menores

Se relacionan las actas de justificación de cantidades mayores y menores de las 11 ORIP, esta variación en cantidades son el resultado de las visitas de diagnóstico inicial, donde se presentó modificaciones a los presupuestos iniciales, esto debido que son presupuestos que se hicieron hace mucho tiempo y algunas de las actividades contempladas ya se habían realizado por parte de las oficinas y se encontraban necesidades nuevas que se debían subsanar, por esto se hace la actualización de los presupuestos para garantizar las óptimas condiciones de las oficinas de registro público a intervenir.

Al igual se adjuntan las actas de justificación de cantidades mayores y menores que se realizaron durante toda la ejecución del contrato de cada ORIP, resultado de las revisiones y mediciones hechas por esta interventoría en campo.

Ver Carpeta del Contratista Liquidación Técnica – Anexo 35 Acta de justificación de cantidades mayores y menores.

6.5 Memorias de cantidades de campo

Se relacionan las memorias de los cobros #1, cobro #2 y cobro #3 final.

Ver Carpeta del Contratista Liquidación Técnica – Anexo 35 Memorias de cantidades de obra.

6.6 INTERVENTORÍA

6.6.1 Relación de pagos realizados

El valor contractual de la interventoría es de $ 101.514.920,64 (CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS Y SESENTA Y CUATRO CENTAVOS), para este proyecto la interventoría con contrato 2467 DE 2023 cuyo objeto es: "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE RESGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)". 4).*" Alcanzo un 100% de su alcance presupuestal cerrando en 0 el saldo del contrato.

Se realizaron 3 cobros descritos a continuación:

CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 4											
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR	PAGO 1	VALOR	PAGO 2	VALOR	PAGO 3	VALOR	TOTAL PAGADO
1	ANDINA	RISARALDA	SANTUARIO	$ 10.912.853,97		$ 0,00	90%	$ 9.821.568,57	10%	$ 1.091.285,40	$ 10.912.853,97
2		ANTIOQUIA	ITUANGO	$ 7.034.984,00		$ 0,00	90%	$ 6.331.485,60	10%	$ 703.498,40	$ 7.034.984,00
3			TAMESIS	$ 7.654.225,02		$ 0,00	90%	$ 6.888.802,51	10%	$ 765.422,50	$ 7.654.225,02
4			TITIRIBI	$ 8.151.648,13		$ 0,00		$ 0,00	100%	$ 8.151.648,13	$ 8.151.648,13
5			MARINILLA	$ 4.740.746,79	60%	$ 2.844.448,08	30%	$ 1.422.224,04	10%	$ 474.074,68	$ 4.740.746,79
6			AMALFI	$ 4.486.959,49	60%	$ 2.692.175,70	30%	$ 1.346.087,85	10%	$ 448.695,95	$ 4.486.959,49
7			CAUCASIA	$ 8.314.072,00	30%	$ 2.494.221,60	60%	$ 4.988.443,20	10%	$ 831.407,20	$ 8.314.072,00
8			SEGOVIA	$ 15.389.661,97	60%	$ 9.233.797,18	30%	$ 4.616.898,59	10%	$ 1.538.966,20	$ 15.389.661,97
9			YARUMAL	$ 11.247.853,21		$ 0,00	90%	$ 10.123.067,89	10%	$ 1.124.785,32	$ 11.247.853,21
10			JERICO	$ 19.166.017,02		$ 0,00	90%	$ 17.249.415,32	10%	$ 1.916.601,70	$ 19.166.017,02
11			ANDES	$ 4.415.899,05	60%	$ 2.649.539,43	30%	$ 1.324.769,71	10%	$ 441.589,90	$ 4.415.899,05
	TOTAL			**$ 101.514.920,64**		**$ 19.914.181,98**		**$ 64.112.763**		**$ 17.487.975,38**	**$ 101.514.920,64**
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL						19,62%		63,16%		17,23%	100%

Ver Carpeta de la Interventoría Liquidación Técnica – Anexo 16 Cobros realizados por cada orip.

7 ASPECTOS LEGALES

7.1 Actualización del estado de las pólizas

7.1.1 Pólizas contratista

7.1.1.1 Pólizas propuestas inicial

ANEXO 0 - PÓLIZAS INICIALES			
Fecha	**11/09/2023**		
No de póliza	**21-44-101424254**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
SERIEDAD DE LA OFERTA	$ 67.997.489,35	15/09/2023	15/01/2024
Fecha	**25/10/2023**		
No de póliza	**21-44-101428422**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 124.020.557,00	23/10/2023	30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 31.005.139,25	23/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 124.020.557.557,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Fecha			
No de póliza	**21-40-101221175**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 348.000.000,00	23/10/2023	31/12/2023
CONSTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 174.000.000,00	23/10/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 174.000.000,00	23/10/2023	31/12/2023

Tabla 9 Pólizas iniciales constructor

7.1.1.2 Pólizas contratista con el acta de inicio

ANEXO 1 - PÓLIZAS ACTA DE INICIO			
Fecha	**22/11/2023**		
No de póliza	**21-44-101428422**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 124.020.557,00	16/11/2023	24/07/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 31.005.139,25	16/11/2023	24/01/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 124.020.557.557,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS	
Fecha	**22/11/2023**		
No de póliza	**21-40-101221175**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 348.000.000,00	16/11/2023	24/01/2024

CONSTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 174.000.000,00	16/11/2023	24/07/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 174.000.000,00	16/11/2023	24/07/2024

Tabla 10 Pólizas iniciales ajustadas al acta de inicio constructor

7.1.1.3 Pólizas contratista con la prorroga

ANEXO 2 - PÓLIZAS OTRO SÍ No. 1			
Fecha	**17/01/2024**		
No de póliza	**21-44-101428422**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 124.020.557,00	16/11/2023	15/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 31.005.139,25	16/11/2023	15/02/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 124.020.557.557,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS	
Fecha	**17/01/2024**		
No de póliza	**21-40-101221175**		
SEGUROS DEL ESTADO S. A			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 348.000.000,00	16/11/2023	15/03/2024
CONSTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 174.000.000,00	16/11/2023	15/03/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 195.000.000,00	16/11/2023	15/03/2024

7.1.2 Pólizas de la interventoría

7.1.2.1 Pólizas iniciales

ANEXO 0 - PÓLIZAS INICIALES			
Fecha	**9/11/2023**		
No de póliza	**M-100214622**		
SEGUROS MUNDIAL			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 20.302.984,20	00:00 horas del 9/11/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.075.746,05	00:00 horas del 25/01/2027	24:00 Horas Del 31/12/2026

Tabla 11 Pólizas iniciales interventoría

7.1.2.2 Pólizas actualizadas con el acta de inicio

ANEXO 1 - PÓLIZAS ACTA DE INICIO			
Fecha	**16/11/2023**		
No de póliza	**M-100214622**		
SEGUROS MUNDIAL			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 20.302.984,20	00:00 horas del 14/11/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.075.746,05	00:00 horas del 25/01/2027	24:00 Horas Del 05/01/2027

Tabla 12 Pólizas ajustadas al acta de inicio interventoría

7.1.2.3 Pólizas actualizadas con el acta de inicio

ANEXO 2 - PÓLIZAS OTRO SÍ No.1			
Fecha	**24/01/2023**		
No de póliza	**M-100214622**		
SEGUROS MUNDIAL			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 20.302.984,20	00:00 horas del 05/01/2024	24:00 Horas Del 15/09/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.075.746,05	00:00 horas del 25/01/2027	24:00 Horas Del 15/03/2027

Tabla 13 Pólizas ajustadas a la prórroga interventoría

Ver Carpeta de la Interventoría y Contratista Liquidación Técnica – Anexo 5 Pólizas del contrato y actualizadas al acta de terminación.

7.2 Informe detallado de incumplimiento del contratista de obra en caso de que se aplique

Para la fecha del presente informe no aplica ningún tipo de sanción al contratista, esto debido a que la ejecución transcurre con normalidad como se puede apreciar en los numerales anteriores, que se presenta el avance del proyecto y su ejecución.

Se hace la salvedad que desde la parte de SST se han hecho varias observaciones al consultor respecto a los pagos de seguridad social y afiliaciones que a la fecha actual se encuentran en subsanación.

7.3 Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de obra

Para la fecha del presente informe no aplica ningún tipo de sanción o incumplimiento al contratista, esto debido a que la ejecución transcurre con normalidad como se puede apreciar en los numerales anteriores, que se presenta el avance del proyecto y su ejecución.

ASPECTOS AMBIENTALES

7.4 Impactos generados

Se concluyó que según el manual ambiental para procesos constructivos establecido en el área metropolitana del Valle de Aburrá, las intervenciones realizadas en las diferentes oficinas de instrumentos públicos de registro y notariado son clasificadas en TIPOLOGIA III;

las cuales, por su bajo impacto, sólo adoptaron los requerimientos mínimos de buenas y optimas prácticas de manejo ambiental y social.

Así mismo desde las obligaciones contractuales, el ente contratante estableció que para el proyecto se implementaron medidas que permitieron el control de los impactos derivados de los procesos constructivos.

A continuación, se enlistan los impactos más representativos generados durante la ejecución del proyecto:

IMPACTO	MEDIDAS APLICADAS
Generación de emisiones atmosféricas	Se evidenció cumplimiento parcial de las acciones planteadas desde las fichas ambientales; dado que las evidencias de la gestión ambiental fueron mínimas.
Contaminación visual	
Generación de residuos ordinarios	
Generación de residuos reciclables	
Generación de RCD	La contratación de mano de obra se ve limitada a que el personal con las competencias para el desarrollo del contrato este compuesto por una cuadrilla fija del constructor.
Generación de empleo	

Tabla 13 Principales impactos ambientales

7.5 Tratamiento y manejo de RCD

En los diferentes recorridos de obra, durante la ejecución del proyecto se identificó que los RCD fueron almacenados en áreas de patios en sacos tipo costal hasta conseguir un volumen considerable la disposición final, lo cual es respaldado al finiquitarse el contrato en las remisiones emitidas por el centro de disposición final de dichos residuos y algunos otros fueron donados por lo tanto no hay certificado de emisión de los mismos.

7.6 Fichas ambientales

Las fichas ambientales que se contemplaron en los parámetros y procedimientos para la mitigación de los impactos ambientales generados se enuncian en los informes presentados;

Adicional, se enlista evidencia de las fichas adoptadas y se anexan con su debido registro fotográfico:

- Capacitación del personal.
- Jornadas de orden y aseo.

- Instalación de puntos ecológicos
- Separación de residuos en la fuente.
- Almacenamiento de materiales en obra.
- Evacuación de residuos ordinarios de obra.
- Seguimiento e inspección de puntos ecológicos en frentes de la obra.
- Seguimiento del área de trabajo y toma de registro fotográfico de las áreas a intervenir.

Ver Carpeta 3. ANEXOS AMBIENTALES INFORME FINAL

7.7 Control conservación materiales Orden y aseo

El constructor estableció puntos de acopio temporales en cada una de las ORIP intervenidas, donde había baja circulación, por lo general, el día de arribo a obra se consumieron los insumos a cabalidad.

Las condiciones de orden y aseo se realizaban limpieza periódica y finalizando la jornada laboral; del mismo modo cada vez que se finaliza la intervención de un proceso constructivo se realiza limpieza general de los espacios intervenidos, dejando en óptimas condiciones cada espacio.

7.8 Otras actividades realizadas

7.8.1 Seguridad y salud en el trabajo

En el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, reglamenta el sector trabajo y regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia; el cual, es de obligatorio cumplimiento por todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza y tamaño.

En su Artículo 1.1.1.1 establece: - “El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones”-. Es por esto por lo que, todas las actividades enmarcadas en este componente se implementaron con la finalidad de prevenir la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales y cualquier situación que pudiese afectar la integridad de las instituciones participantes en este proyecto, lo cual se cumplió a cabalidad.

En el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales, el equipo interventor apoyó la identificación de condiciones inseguras, validación de los requisitos normativos aplicables a los procesos constructivos, validación de la seguridad social, que salvaguardan la integridad del ordenador del gasto y del personal que lidera el desarrollo del contrato.

Acatando lo establecido anteriormente, el constructor desarrolló las siguientes actividades durante la ejecución del proyecto:

- Capacitaciones.
- Gestión documental.
- Inspecciones de seguridad.
- Afiliaciones a la seguridad social.
- Registro y actualización de indicadores.
- Suministro parcial de exámenes médicos.
- Uso de guardas de seguridad en equipos.
- Suministro y seguimiento de uso de elementos de protección personal.
- Acompañamiento y supervisión de actividades de bajo impacto y alto riesgo.
- Diligenciamiento de permisos de trabajo y elaboración de análisis de trabajo seguro.
- Auto reporte de estándares mínimos, según lo establecido en la Resolución 0312 de 13 de febrero del 2019.

7.8.1.1 Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

Los Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo… (Artículo 1 Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019).

A continuación de relacionan las calificaciones de dichos estándares de las razones sociales involucradas en la ejecución del proyecto:

RAZÓN SOCIAL	NIT	% DE CUMPLIMIENTO
Consorcio Edificación DICAC (DICAC Ingenieros Consultores S.A.S.)	901.228.088	94
AltaVista Construction S.A.S	901.340.813	100
María José Herrera Guzmán	52.452.955	100

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 03. ESTANDARES MINIMOS R. 0312 2019

7.8.2 Relación de actividades de alto riesgo

Durante la ejecución del proyecto, las tareas consideradas de alto; son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a

las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Observación: Se identificó que los formatos de permisos de TAR manejados cumplieron parcialmente con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021; ya que, no hubo procedimiento de trabajo seguro que respalda los análisis de trabajo seguro, ni hojas de vida de equipos contra caídas, sistemas de acceso certificados con su certificado de inspección anual según la vida útil del equipo.

A continuación, se consolida las actividades ejecutadas en las ORIP con breve descripción del desarrollo en obra:

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Támesis	7 mts	Recorrido de cubierta	Trabajo en alturas
		Pintura fachada	Trabajo en alturas
		Pintura en patios	Trabajo en alturas
		Cambio de láminas en fibrocemento	Trabajo en alturas

Tabla 14 TAR Támesis

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Santuario (Risaralda)	4 mts	Cambio de luminarias	Trabajo en alturas
		Pintura fachada	Trabajo en alturas

Tabla 15 TAR Santuario – Risaralda

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Ituango	10 mts	Cambio de luminarias	Trabajo en alturas
		Pintura fachada	Trabajo en alturas

Tabla 16 TAR Ituango

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Titiribí	4 mts	Cambio de cubiertas	Trabajo en alturas
		Cambio de fachada	Trabajo en alturas

Tabla 17 TAR Titiribí

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Caucasia	5 mts	Intervención de cubierta y pintura	Trabajo en alturas

Tabla 18 TAR Caucasia

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Segovia	5 mts	Intervención de cubierta y pintura	Trabajo en alturas

Tabla 19 TAR Segovia

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Yarumal	3 mts	Mantenimiento de fachada	Trabajo en alturas

Tabla 20 TAR Yarumal

ORIP	ALTURA APROXIMADA MÁXIMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERMISO APLICABLE
Jericó	3 mts	Mantenimiento de cubierta	Trabajo en alturas
		Mantenimiento de canales	Trabajo en alturas
		Pintura en interiores	Trabajo en alturas

Tabla 21 TAR Jericó

Del mismo modo se, se relaciona el personal formado en alturas para el desarrollo de actividades de esta índole en las diferentes ORIP:

FORMACIÓN EN TRABAJO DE ALTURA						
No.	**MUNICIPIO**	**CÉDULA**	**NOMBRE**	**CARGO**	**INICIO**	**VIGENCIA**
1	Marinilla - Titiribí	1077711933	Leiner Murillo Moreno	Oficial	11-12-2023	3-06-2025
2	Amalfi - Caucasia	1005325732	Édison Fabian Torres Rodríguez	Oficial	02-12-2023	25-05-2025
3	Jericó	71877341	Ricardo De Jesús Zapata Hernández	Oficial	06-12-2023	29-05-2025
4	Segovia	13.720.260	Erwin Eduardo Ardila	Oficial	06-12-2023	29-05-2025
5	Támesis	70.852.926	Abel Antonio Tirado Bermúdez	Ayudante	06-12-2023	29-05-2025
6	Yarumal	70.577.265	Jesús Darío Toro Giraldo	Oficial	10-12-2023	02-06-2025
7	Santuario	16.055.428	Jhon Mario Pérez Otalvaro	Oficial	13-12-2023	05-06-2025

Tabla 22 Personal formado en alturas

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 04. PERMISOS DE TRABAJO Y CURSOS TSA

7.8.3 Programa de capacitaciones, inducción y reinducción

Se visualiza el cumplimiento a cabalidad del cronograma de capacitaciones planteadas por el constructor durante la ejecución del proyecto, los registros reposan en los anexos correspondientes a capacitación SSTA:

CAPACITACION	RESPONSABLE O LÍDER	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES			
		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Autocuidado y uso de EPP	PROFESIONAL SST				
Identificación de peligros y evaluación de riesgos	PROFESIONAL SST				
Riesgo mecánico	PROFESIONAL SST				
Manejo de sustancias quimicas	PROFESIONAL SST				
Calistenia	PROFESIONAL SST/PERSONAL EN OBRA				
Cuidado de manos	PROFESIONAL SST				
Manipulacion de cargas	PROFESIONAL SST				
	PLANEADA				
	REALIZADA				

Tabla 23. Cronograma de capacitación del constructor

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 05. PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACIONES.

7.8.4 Reunión COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que constituye un medio importante para promocionar la Salud laboral, buscó acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros.

La Resolución No.2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). El artículo 35 del Decreto No.1295 de 1994 establece para empresas de menos de 10 trabajadores, tienen la obligación de nombrar un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumpliendo lo antes mencionado la empresa constructora realizó la actualización de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de enero del año 2024 y llevo a cabo la divulgación de responsabilidades y promoción de la salud laboral.

A continuación, la relación de las reuniones de los grupos de apoyo, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral y brigada de emergencia.

REUNIÓN COPASST		
FECHA	**No. DE ASISTENTES**	**TEMÁTICA**
29 diciembre 2023	23	Conformación del COPASST
03 enero 2024	3	Elección vigía de seguridad y salud en el trabajo
21 enero 2024	3	Acta mensual reunión vigía enero
21 febrero 2024	3	Acta mensual reunión vigía febrero

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 06. COPASST

Reunión Comité de Convivencia Laboral

La Resolución No. 2646 del 17 de julio de 2008 en su artículo 14, contempla la conformación de un Comité de Convivencia laboral y el establecimiento de un procedimiento interno confidencial conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral y que, para empresas de menos de 10 trabajadores, tienen la obligación de nombrar un Vigía.

Cumpliendo lo antes mencionado la empresa constructora realizó la actualización de Comité de Convivencia Laboral en el mes de 11 de diciembre del 2023 y se efectuaron las siguientes reuniones:

REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA		
FECHA	**No. DE ASISTENTES**	**TEMÁTICA**
11 diciembre 2023	11	Elección presidente del comité de convivencia laboral
21 diciembre 2023	11	Autocuidado y uso de EPP
12 enero 2024	6	Cuidado de medio ambiente y residuos

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 07. COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

LISTADO DE CAPACITACIONES		
FECHA	**No. DE ASISTENTES**	**TEMÁTICA**
16 diciembre 2023	11	Identificación de peligros
21 diciembre 2023	11	Autocuidado y uso de EPP
12 enero 2024	6	Cuidado de medio ambiente y residuos
18 enero 2024	4	Cuidado de manos
18 enero 2024	2	Manejo de sustancias químicas
22 enero 2024	2	Manejo de sustancias químicas
29 enero 2024	2	Manejo de sustancias químicas
01 febrero 2024	4	Riesgo mecánico – manipulación de cargas

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 09. INDICADORES SST

7.8.5 Personal del contrato y verificación de aportes SST

La interventoría mes a mes recopiló y verificó las afiliaciones y pagos de la seguridad social del personal que intervino en el proyecto y realizó un control de asistencia, según lo indicado en los pliegos de condiciones.

A continuación, se muestra el seguimiento realizado por la interventoría, según lo establecido en la en el Decreto 780 del 2016, donde se señalan los plazos para la realización del pago a la seguridad y los aportes parafiscales:

SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL			
N°	**RAZÓN SOCIAL**	**NIT**	**DÍA HABIL**
1	Constructora Visión Futuro S.A.S.	90170706<u>7</u>	11
2	Consorcio Ventura	90155090<u>7</u>	2
3	Edimer Rojas Sánchez	9147431<u>9</u>	4
4	Camilo Andrés Flórez Orejuela	109872305<u>9</u>	10

Tabla 24 Seguimiento de la seguridad social

Según lo establecido en el pliego de condiciones, se relaciona el personal contractual que se vinculó al proyecto:

PERSONAL	CANT.	DEDICACIÓN	NOMBRE	TÍTULO
Director de interventoría	1	50%	Federico García Arbeláez	Ingeniero civil
Ingeniero residente de interventoría 1	1	100%	Nilce Gisel Perea Rentería	Ingeniera civil
Ingeniero residente de interventoría 2	1	100%	José Gregorio Pineda Alonso	Ingeniero civil
Ingeniero residente de interventoría 3		100%	Darío Londoño González	Ingeniero civil
Residente SST interventoría	1	100%	María Lucia Ocampo Tabares	Profesional en salud ocupacional
Apoyo técnico 1	1	No aplica	Juan Andrés Castaño Zapata	Ingeniero civil
Apoyo técnico 2	1	No aplica	Yesica Estefanía Zuluaga Guevara	Tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo

Tabla 25 Relación personal del interventor Consorcio DICAC Edificación

PERSONAL	CANT.	DEDICACIÓN	NOMBRE	TÍTULO
Director de obra	1	50%	Luis Domingo Herrera Guzmán	Ingeniero civil
Ingeniero residente 1	1	100%	Aníbal Carbajal Kalil	Arquitecto
Ingeniero residente 2	1	50%	Jonathan Guevara Soto	Ingeniero civil
Residente SST	1	100%	Argenis López	Ingeniera ambiental
Residente SST	1	100%	Nanny Rocío Lizcano Castellanos	Ingeniera ambiental especialista en SST

Tabla 26 Relación personal del constructor Consorcio Ventura

Anteriormente se había enunciado que en las planillas de seguridad social se liquidaba al personal contractual con IBC que no correspondía a lo establecido en el rubro de la administración y se presentan los reajustes correspondientes.

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - 1. INTERVENTORIA

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 01. DOCUMENTOS PERSONAL CONTRACTUAL Y OPERATIVO

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 08. HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL

Personal de mano de obra vinculado:

En la documentación de ingreso inicial (exámenes de ingreso, ARL, EPS, CCF, AFP, documento de identidad), se subsanan los registros aplicables al personal vinculado desde la Constructora Visión Futuro, los cuales son anexados en los informes del constructor y se realiza una recopilación en el informe final de interventoría:

7.8.6 Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la ejecución del contrato

Al corte del presente informe no se presentan accidentes ni incidentes en las ORIP intervenidas, durante la ejecución del proyecto.

Adicional se realiza medición de los indicadores de ausentismo, frecuencia, incidencia, mortalidad, prevalencia y severidad.

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 09. INDICADORES SST

7.8.7 Registro de entrega EPP y dotación

Según lo establecido en la Ley 9na del 24 de enero de 1979, se registra la necesidad de brindarle cobertura total en la protección mediante elementos de protección personal a los colabores a cargo; del mismo modo en el Decreto 1072 del 26 mayo del 2015 se nombra nuevamente la obligatoriedad de dotación de estos elementos.

Solo se identificó una entrega inicial de EPP, y una reposición de estos elementos en el mes de noviembre.

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 10. SOPORTE ENTREGA DE EPP

7.8.8 Inspecciones planeadas

Según lo contemplado en Norma Técnica Colombiana NTC 4114 inspecciones planeadas, en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto Ley 1072 de 2015 se establece como requisito la aplicación de este tipo de inspecciones con el propósito de identificar condiciones inseguras o subestándar.

A continuación, se relacionan las inspecciones realizadas por el constructor, cumpliendo lo programado en el Plan de Trabajo del constructor durante la ejecución del proyecto.

		Tipo de inspección										
Fecha	Municipio	Orden y aseo	Hallazgos	Corregido	Fecha	Herramientas manuales	Hallazgos	Corregido	Fecha	Equipos	Hallazgos	Corregido
4/01/2024	Yarumal	X	Sin novedad	No aplica					16/12/2023	X	Sin novedad	No aplica
27/12/2023	Caucasia	X	Sin novedad	No aplica	27/12/2023	X	Sin novedad	No aplica				
28/12/2023	Segovia	X	Sin novedad	No aplica			28/12/2023	No aplica				
6/01/2024	Yarumal				6/01/2024	X	Sin novedad	No aplica				
28/12/2023	Marinilla				28/12/2023	X	Sin novedad	No aplica				
29/12/2023	Jericó				29/12/2023	X	Sin novedad	No aplica				
23/12/2023	Santuario	X	Mejorar condiciones de orden y aseo	Si	23/12/2023	X	Sin novedad	No aplica				
18/12/2023	Tamesis				18/12/2023	X	Sin novedad	No aplica				
29/12/2023	Titiribi				20/12/2023	X	Sin novedad	No aplica				
	Ituango				4/01/2024	X	Sin novedad	No aplica				

Tabla Relación de inspecciones planeadas

Ver Carpeta 2. ANEXOS SST INFORME FINAL - ANEXO 11. INSPECCIONES PLANEADAS

8 LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Ficha de interventoría 6
Tabla 2 Ficha del Constructor 7
Tabla 3 Relación avance por ORIP 9
Tabla 4 Personal contractual constructor vinculado al proyecto 25
Tabla 5 Personal vinculado durante la ejecución del proyecto 26
Tabla 6 Personal contractual interventoría vinculado al proyecto 27
Tabla 7 Correspondencia enviada 45
Tabla 8 Correspondencia recibida 76
Tabla 9 Pólizas iniciales constructor 89
Tabla 10 Pólizas iniciales ajustadas al acta de inicio constructor 90
Tabla 11 Pólizas iniciales interventoría 90
Tabla 12 Pólizas ajustadas al acta de inicio interventoría 91
Tabla 13 Principales impactos ambientales 92
Tabla 14 TAR Támesis 95
Tabla 15 TAR Santuario – Risaralda 95
Tabla 16 TAR Ituango 95
Tabla 17 TAR Titiribí 96
Tabla 18 TAR Caucasia 96
Tabla 19 TAR Segovia 96
Tabla 20 TAR Yarumal 96
Tabla 21 TAR Jericó 96
Tabla 22 Personal formado en alturas 97
Tabla 23. Cronograma de capacitación del constructor 98

Tabla 24 Seguimiento de la seguridad social 100
Tabla 25 Relación personal del interventor Consorcio DICAC Edificación 101
Tabla 26 Relación personal del constructor Consorcio Ventura 101

9 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS 11 ORIP

SANTUARIO












2024/3/12 14:18


2024/3/12 14:18

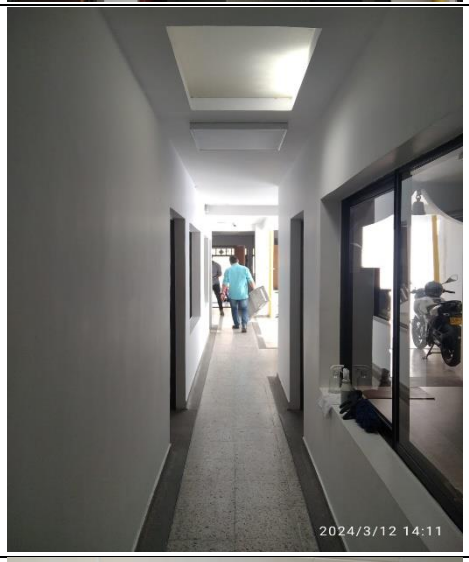
2024/3/12 14:11

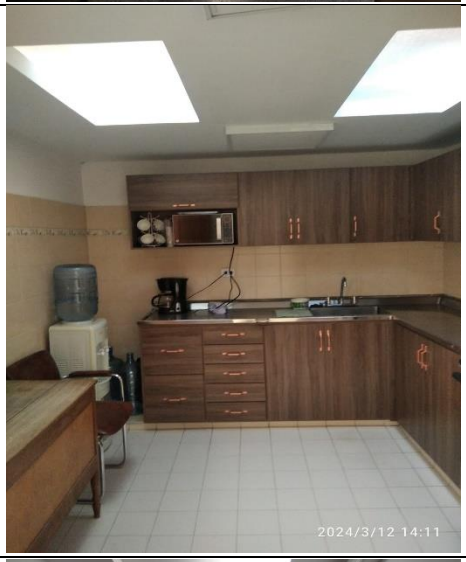
2024/3/12 14:11


2024/3/12 14:10


2024/3/12 14:10

ITUANGO


SNR
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Ituango
Antioquia
REDMI NOTE 12
05/03/2024 13:42


REDMI NOTE 12
05/03/2024 13:42



REDMI NOTE 12


REDMI NOTE 12


REDMI NOTE 12
05/03/2024 13:40


BANDEJA 1
BANDEJA 2
BANDEJA 3
REDMI NOTE 12
05/03/2024 13:40


REDMI NOTE 12

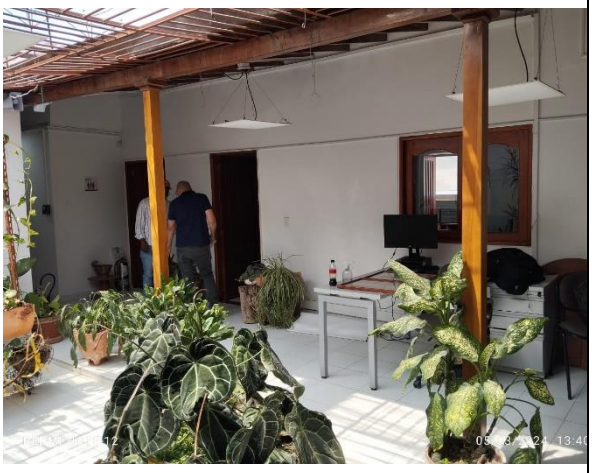

TAMESIS


Támesis
REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:13



REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:14





REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:14


REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:14


REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:13

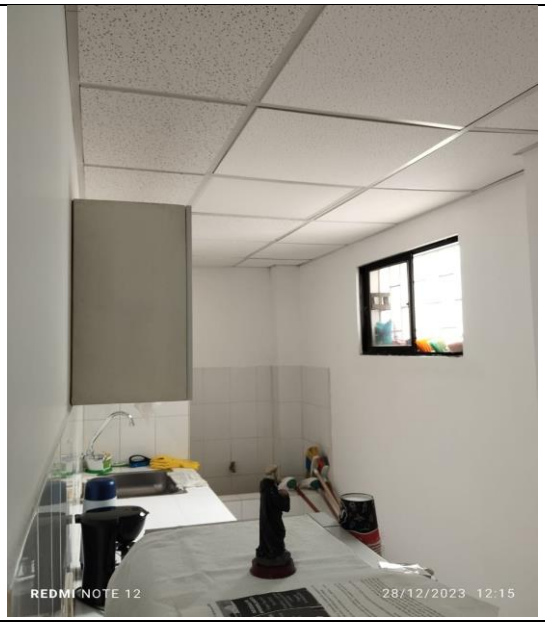
REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:15


REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:15

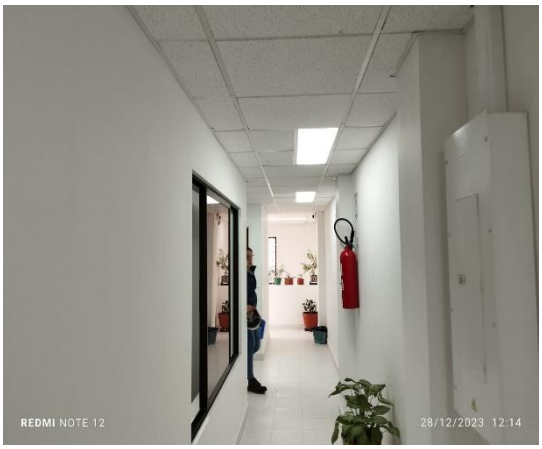
REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:14



REDMI NOTE 12
28/12/2023 12:15


AMALFI








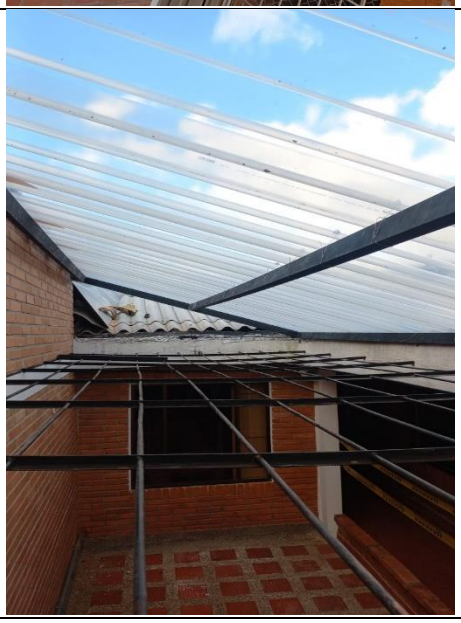


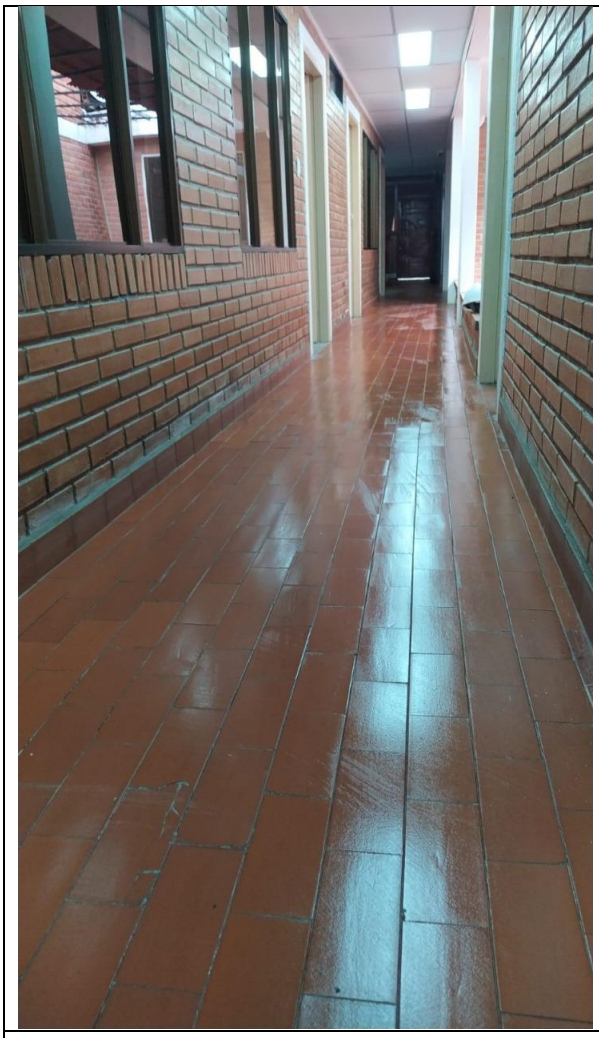






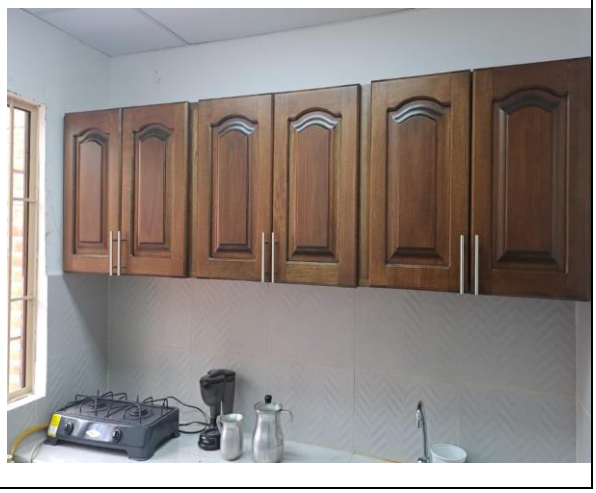


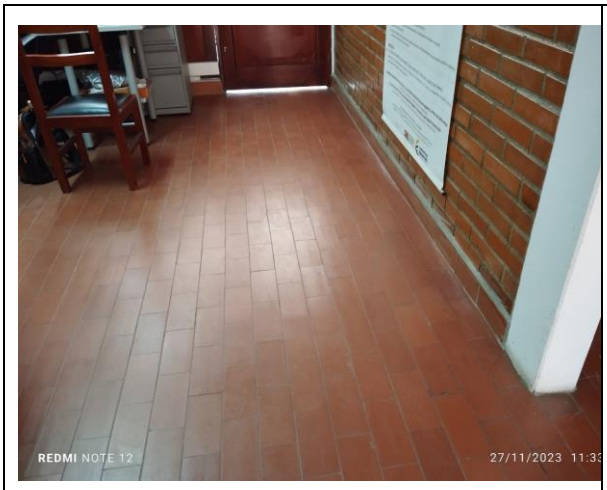




YARUMAL

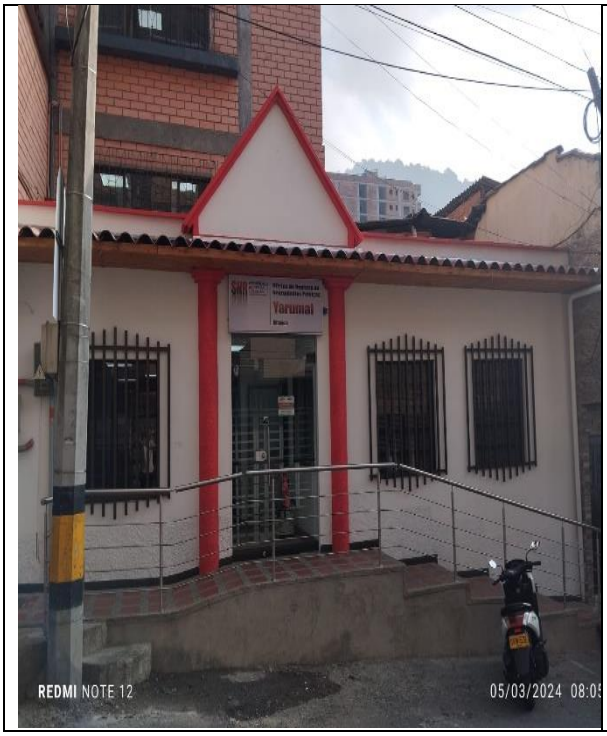

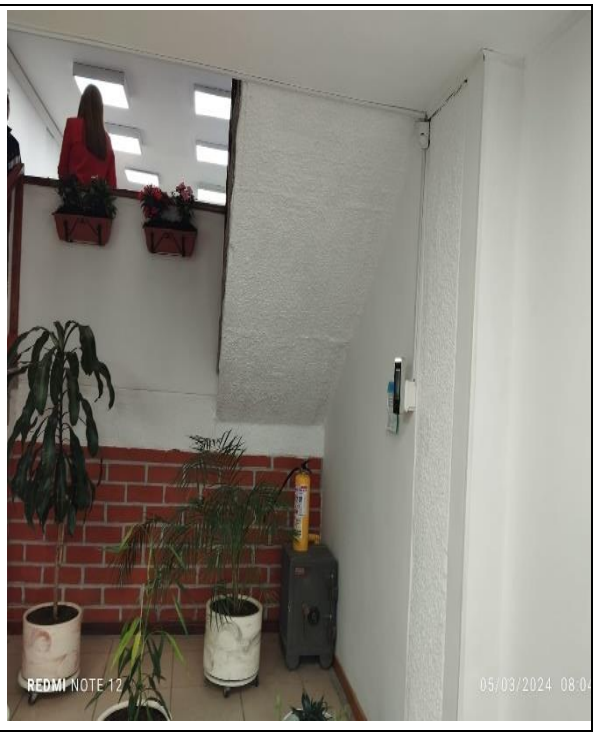

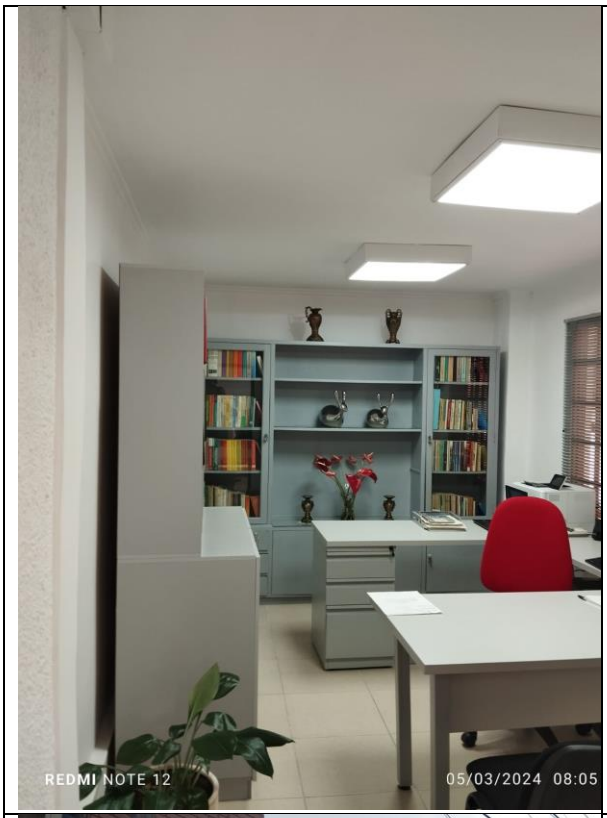
REDMI NOTE 12
05/03/2024 08:05


REDMI NOTE 12
05/03/2024 08:03


Varumal
REDMI NOTE 12
05/03/2024 08:05



VIDRIO
MATERIAL NO RECICLABLE
REDMI NOTE 12
05/03/2024 08:03



REDMI NOTE 12
05/03/2024 08:04
REDMI NOTE 12
05/03/2024 08:04
2024/3/5 08:15
2024/3/5 08:15


JERICO






REDMI NOTE 12

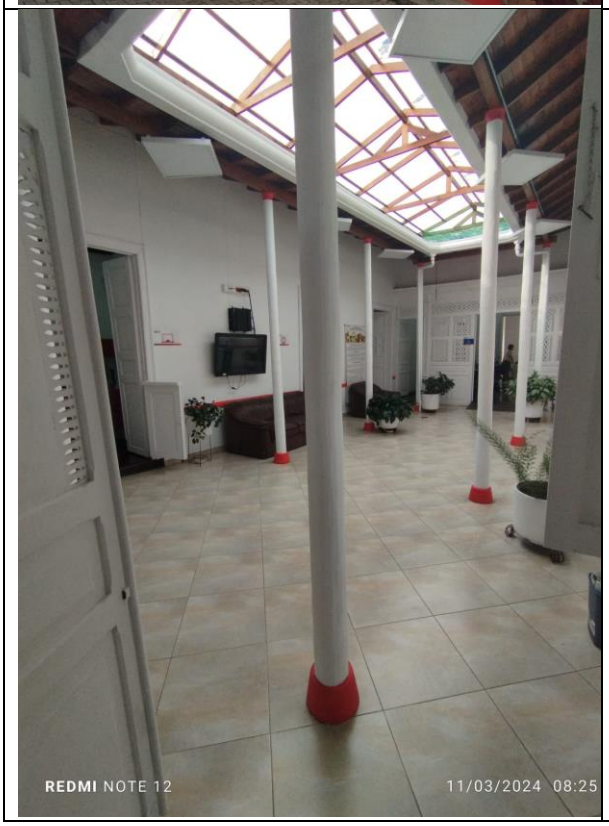

REDMI NOTE 12
11/03/2024 08:25

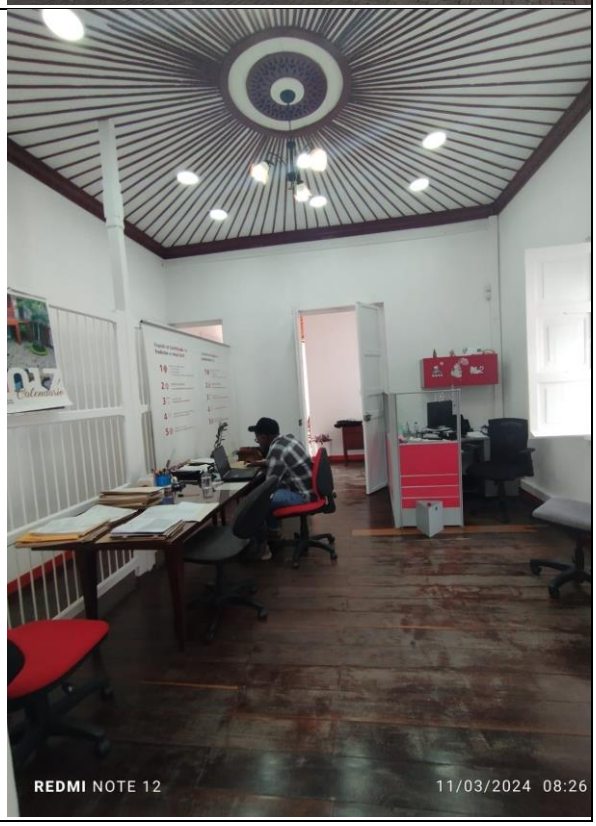
REDMI NOTE 12
11/03/2024 08:26

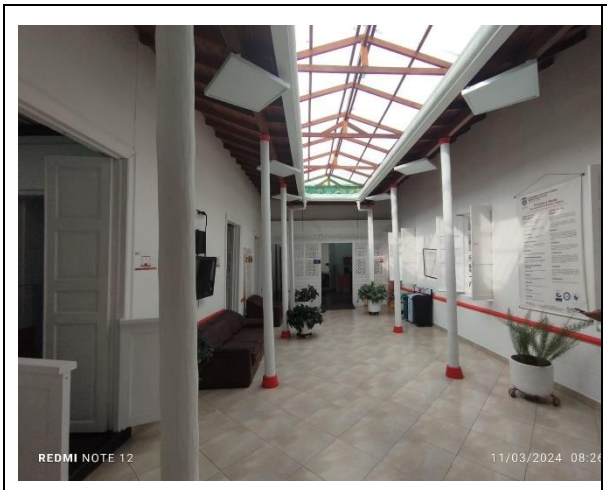
REDMI NOTE 12

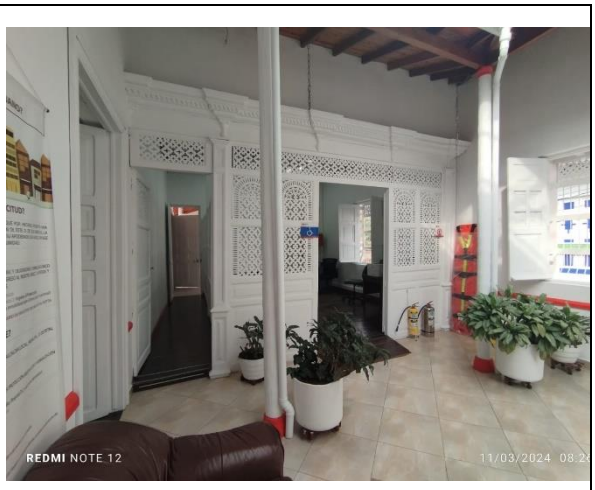
REDMI NOTE 12

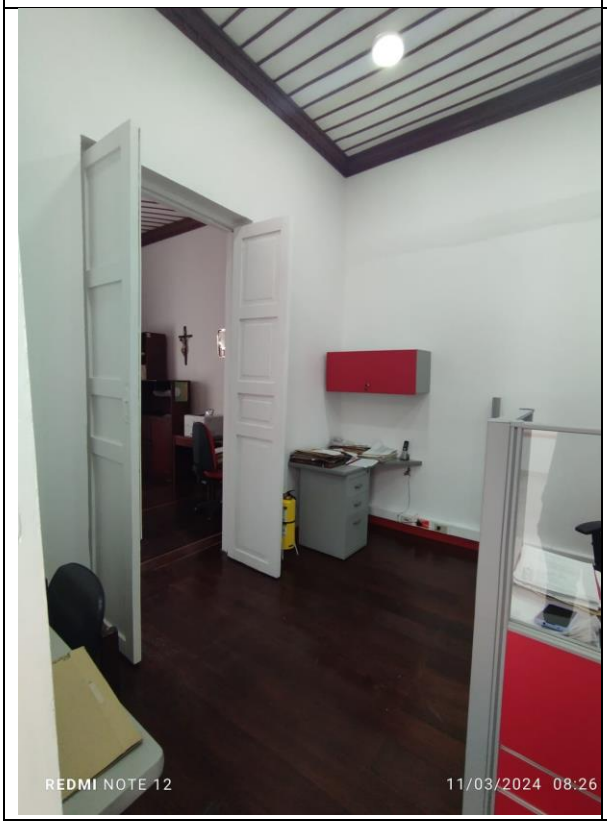
REDMI NOTE 12
11/03/2024 08:26

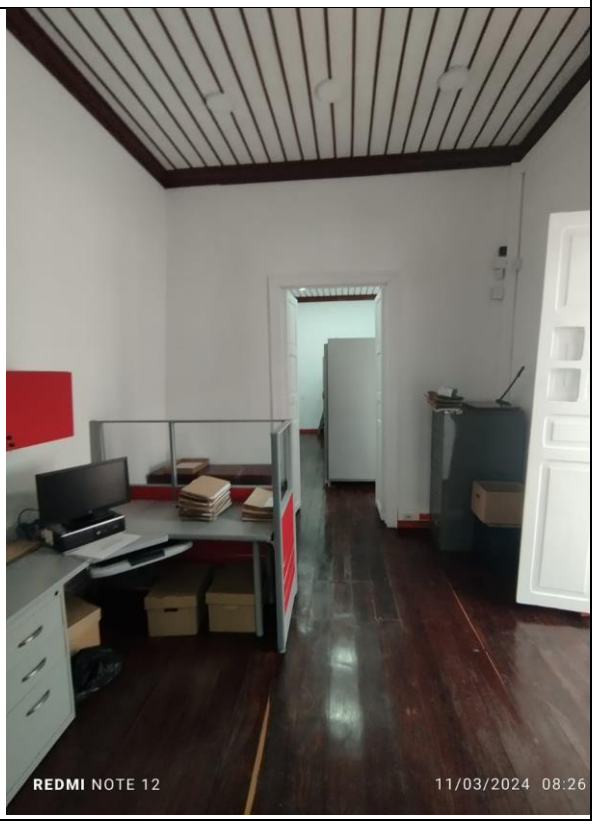

REDMI NOTE 12
11/03/2024 08:26


 REDMI NOTE 12 11/03/2024 08:27	 REDMI NOTE 12 11/03/2024 08:27

ANDES

	 REDMI NOTE 12 20/12/2023 15:41


REDMI NOTE 12 20/12/2023 15:40	REDMI NOTE 12 20/12/2023 15:40

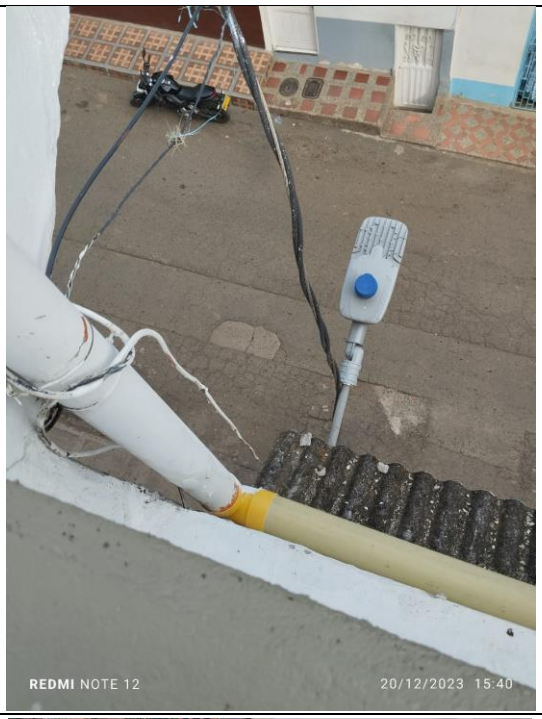
REDMI NOTE 12
20/12/2023 15:40

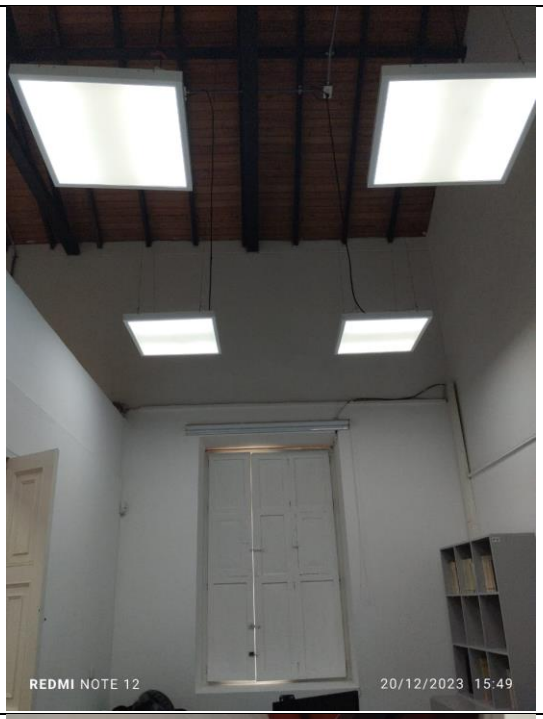
REDMI NOTE 12
20/12/2023 15:49


REDMI NOTE 12
20/12/2023 15:40


REDMI NOTE 12
20/12/2023 15:41

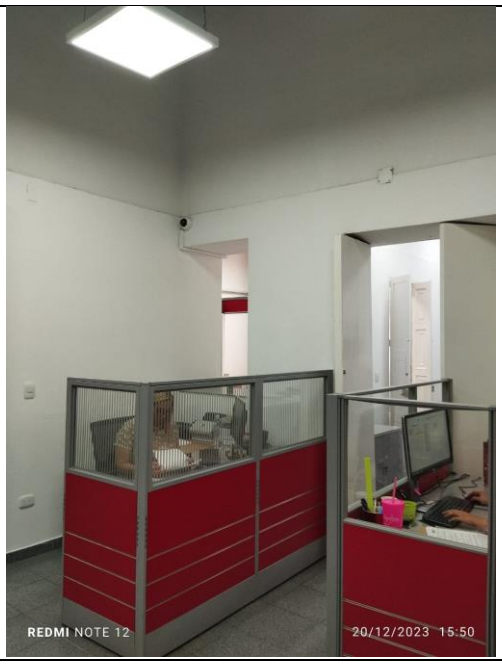
REDMI NOTE 12
20/12/2023 15:50


REDMI NOTE 12
20/12/2023 15:50

MARINILLA


Marinilla












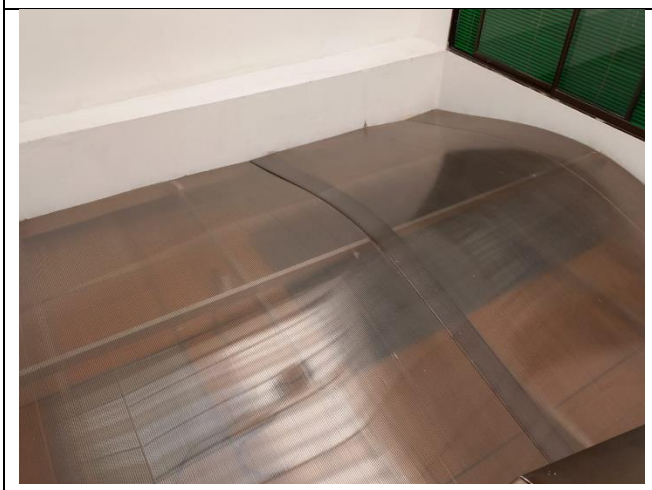








TITIRIBI


Titiribí
2024/3/11 13:58


Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Titiribí
Antioquia
2024/3/11 13:58


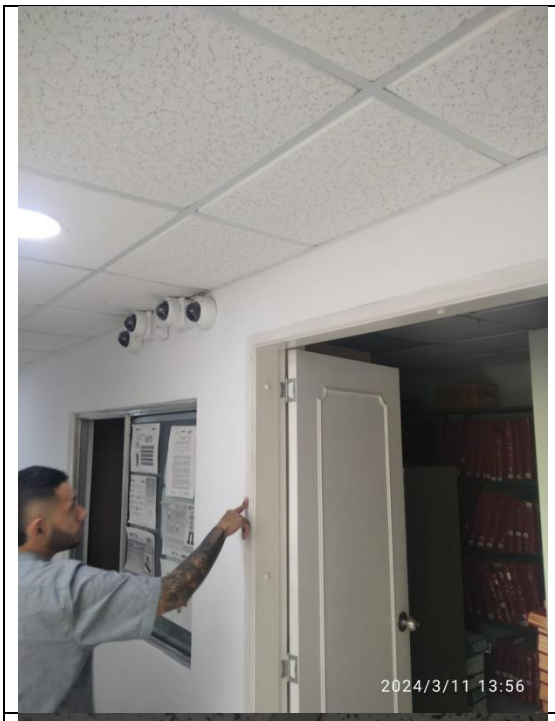

2024/3/11 13:56


2024/3/11 13:47


2024/3/11 13:52


2024/3/11 13:54


SEGOVIA

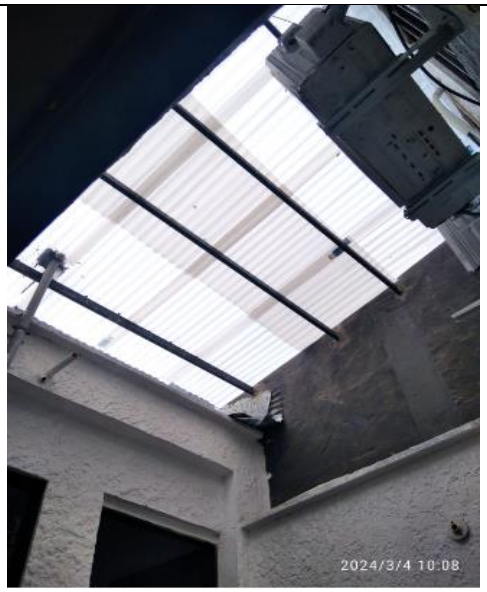
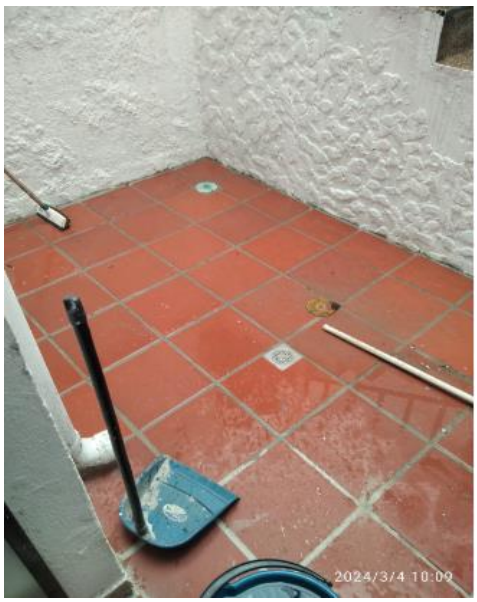
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>












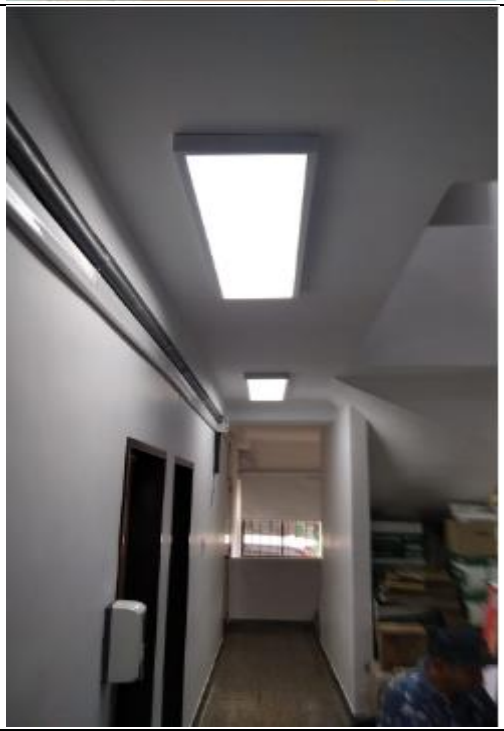

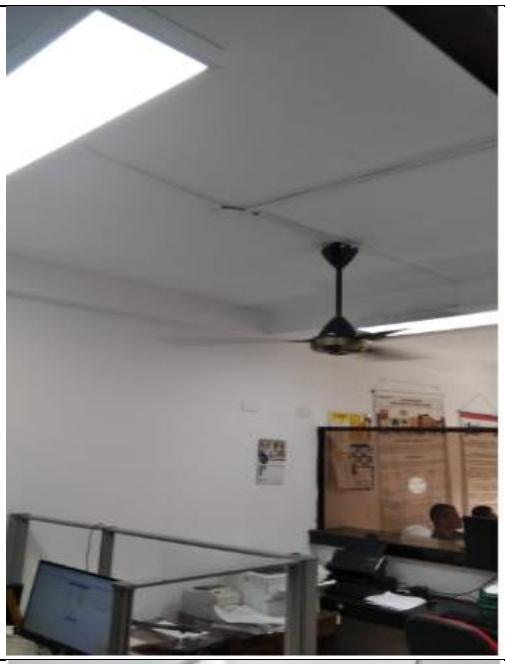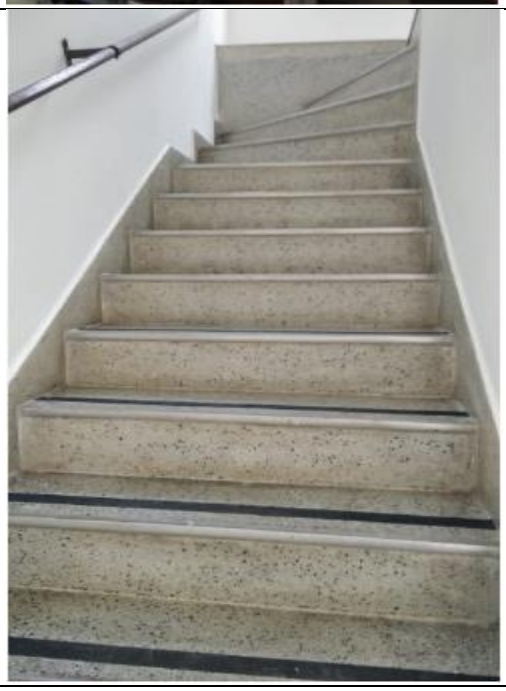
	
	

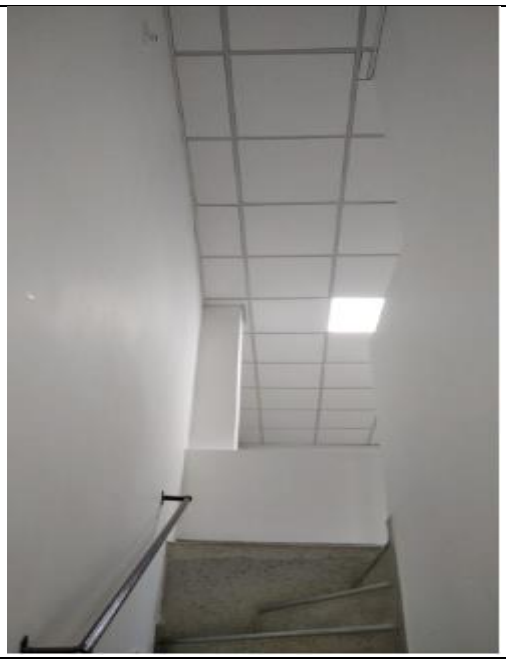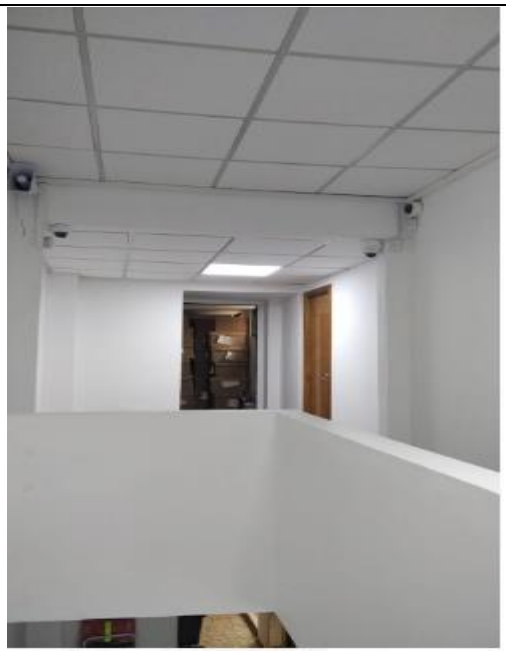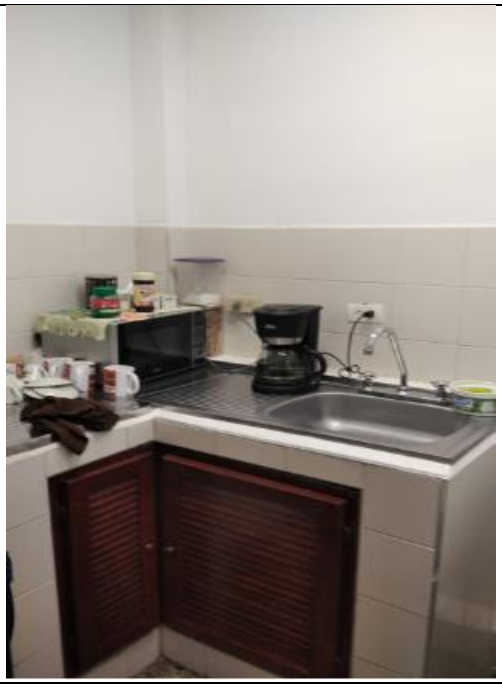
	
	

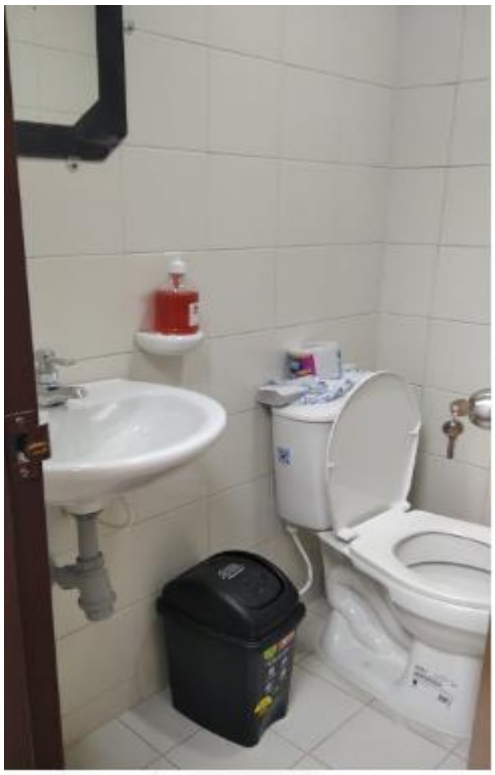

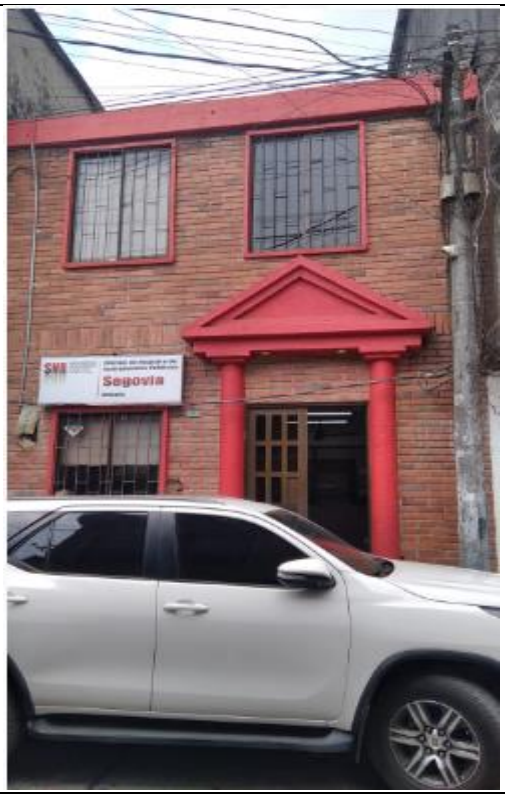


CAUCASIA

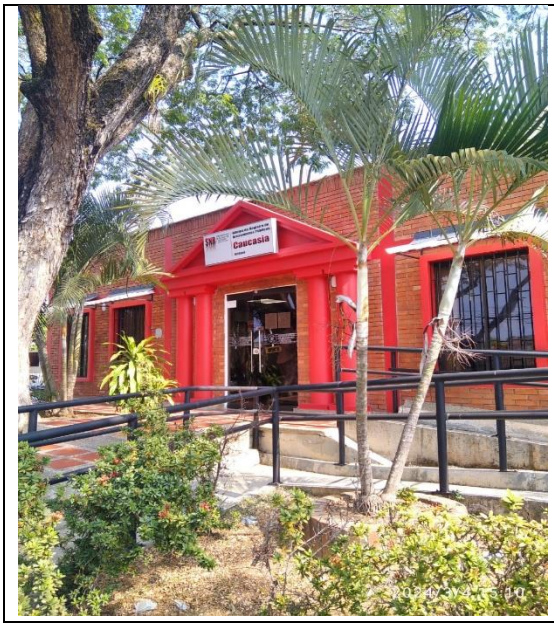


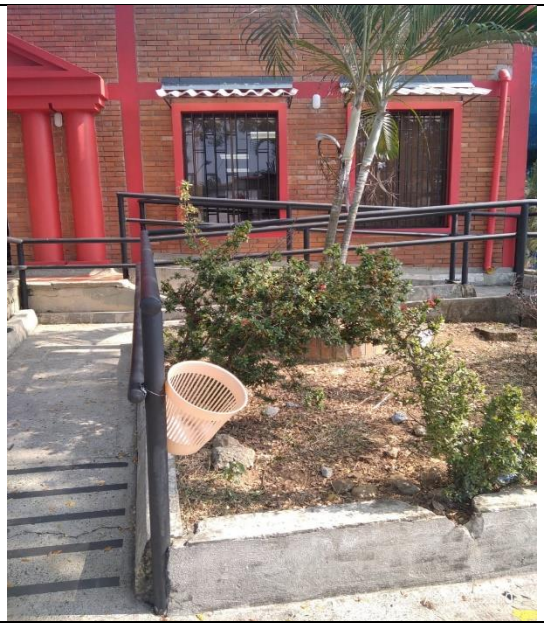


2024/3/4 15:10



2024/3/4 15:10

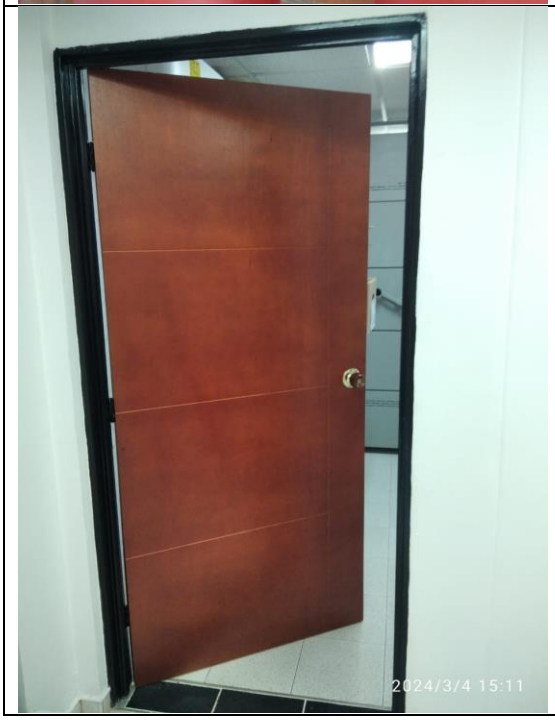
2024/3/4 15:11

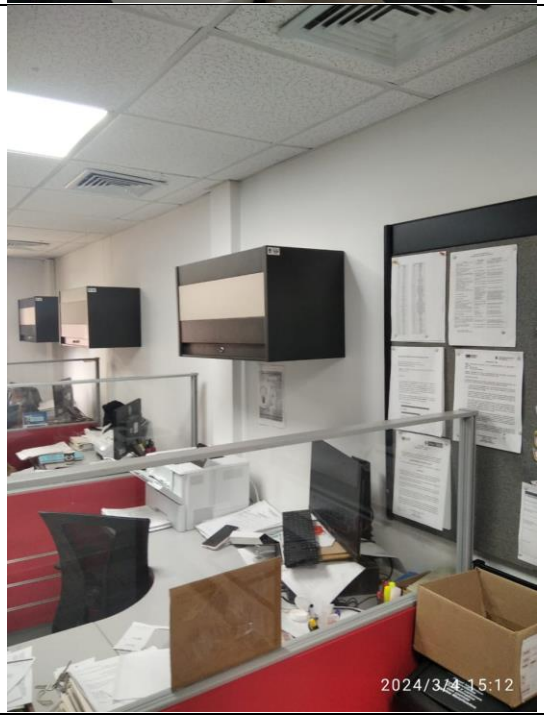
2024/3/4 15:12



10 ANEXOS



Para el informe final se anexa la liquidación del contratista e interventoría, cuyas carpetas técnicas forman parte integral de los anexos del presente informe.

El componen SST y Ambiental crea una carpeta independiente, que hace parte integral de los anexos del presente informe.

2. ANEXOS SST INFORME FINAL

- 1. INTERVENTORIA
- ANEXO 01. DOCUMENTOS PERSONAL CONTRACTUAL Y OPERATIVO
- ANEXO 03. ESTANDARES MINIMOS R. 0312 2019
- ANEXO 04. PERMISOS DE TRABAJO Y CURSOS TSA
- ANEXO 05. PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACIONES
- ANEXO 06. COPASST
- ANEXO 07. COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
- ANEXO 08. HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL
- ANEXO 09. INDICADORES SST
- ANEXO 10. SOPORTE ENTREGA DE EPP
- ANEXO 11. INSPECCIONES PLANEADAS

3. ANEXOS AMBIENTALES INFORME FINAL

- 2. LICENCIA Y PLAN MANEJO AMBIENTAL
- 3. CERTIFICADO MATERIAL PETREO
- 4. LICENCIA AMBIENTAL DE ESCOMBRERA
- 5. CERTIFICADO PAZ Y SALVO CANTERA
- 6. FICHAS AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO
- 7. CERTIFICACIÓN FINAL DE ESCOMBROS
- 8. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DISPOSICIÓN ESCOMBROS
- 9. ACTAS DE VECINDAD APERTURA Y CIERRE

4. LIQUIDACION CONTRATISTA DE OBRA

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION.

ITEM	DESCRIPCIÓN LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS	OBSERVACIONES
1	Informes tecnicos final, mensuales y semanales.	ok
2	Convenio interadministrativo	EL ING. CEILER DEBE EMITIR EL ARCHIVO
3	Contrato de obra.	ok
4	Cronograma y flujo de inversión	ok
5	Pólizas del contrato y actualizadas al acta de terminacion.	ok
6	Propuesta inicial	ok
7	Presupuesto general del contrato (PDF Y EXCEL)	ok
8	Apus de ITEMS originales (PDF Y EXCEL)	ok
9	Aprobación de ítems no previstos	ok
10	Apus de Items no previstos (PDF Y EXCEL)	ok
11	Comparación y fijación de precios no previstos.	NO APLICA ESTA REPETIDO
12	Especificaciones técnicas ÍTEMS no previstos.	ok
13	Cotizaciones Items No previstos	ok
14	Acta de mayores y menores cantidades E items No previstos (PDF Y EXCEL) por cada orip	ok
15	Acta de recibo parcial por cada corte de la orip.	ok
16	Cobros realizados por cada orip.	ok
17	Especificaciones técnicas	ok
18	Fichas tecnicas de los materiales utilizados.	ok
19	Control equipos de medición (si aplica).	NO APLICA
20	Certificación de calibración de los equipos de medición (si aplica).	NO APLICA
21	Control de inspección y ensayos (si aplica).	NO APLICA
22	Resultados de ensayos de laboratorio (si aplica).	NO APLICA
23	Control de correspondencia (correos y oficios)	ok
24	Planos record, medio magnético (DWG), impreso y suscrito por el municipio, contratista e interventoría.	ok
25	Libro bitácora.	ok
26	Manual de USO y MANTENIMIENTO , con acta de entrega y socializacion de ese manual.	ok
27	Registro fotográfico. (Antes, durante y después).	ok
28	Acta de inicio de obra	ok
29	Actas de comité	ok
30	Solicitud de adición presupuestal o prórrogas.	ok
31	Acta de terminación de contrato de obra.	ok
32	Acta de entrega y recibo de las orip (con observaciones y recibo final de la obra por parte de la supervision)	ok
33	Acta de cambio de especificaciones	NO APLICA
34	Informes Subsanaciones	
35	Acta de justificación de cantidades mayores y menores	
36	Memorias de cantidades de obra.	

LISTA DE DOCUMENTOS SST		
1	Informe final SST que contenga consolidado de indicadores de cumplimiento de planes de trabajo y programas ejecutados durante el proyecto.	ok
2	Paz y salvo y copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador.(Personal contractual)	ok
3	Paz y salvo mano de obra. Personal operativo relacionado en el control del personal, se hace enfasis en esta debido a quejas presentadas por los registradores, donde los oficiales presentan saldos pendientes por liquidar.)	ok
4	Paz y salvo proveedores, empresas de servicios públicos. (se hace enfasis en esta debido a quejas presentadas por los registradores, donde los proveedores presentan saldos pendientes por liquidar.)	NO APLICA
5	Directorio de contactos direcciones de subcontratistas proveedores.	NO APLICA
6	Control de personal (Listado de personal incorporado durante el periodo de ejecución y planillas de pago mes a mes)	ok
7	Pagos de FIC propios y de subcontratista.	ok
8	Registro fotográfico mes a mes de las actividades ejecutadas en materia SST separadas por carpeta.	ok
9	Paquete completo accidentes laborales (Incluye: Furat, lección aprendida, investigación, aplicación del plan de acción, seguimiento de recomendaciones y cierre del accidente.)	NO APLICA
10	Certificado de reincorporación laboral después de quince días de incapacidad	NO APLICA
11	Planillas de seguridad social propias y de subcontratistas, con su respectivo cuadro de seguimiento	ok
12	Copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador. (Relacionarlo con listado de personal con nombres, apellidos, número de cédula, cargo, fecha ingreso y fecha de retiro).	OK
13	Cartas de continuidad del personal que es trasladada para otro proyecto (Propios y de Subcontratistas, adjuntar adicional un listado del personal)	OK
14	Soportes de autorización de examen de egreso o renuncia del mismo, y si lo realizaron adjuntar dichos exámenes.	OK
15	Control de maquinaria y equipos (Certificados e inspeciones)	OK
16	Paz y salvo Ministerio de trabajo: Certificación de no reclamaciones, investigaciones y sanciones laborales de empresas expedido por dirección territorial de Ministerio del trabajo.	OK
19	Certificado de paz y salvo de parafiscales, nómina, seguridad social, SENA,ICBF, CCF emitido por contador(a) y/o revisor fiscal adjuntando copia de tarjeta profesional y cédula.	OK

5. LIQUIDACION INTERVENTORÍA

LISTA:CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION INTERVENTORÍA.

ITEM	DESCRIPCIÓN LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS	OBSERVACIONES
1	Informes tecnicos final, mensuales y semanales.	Final
2	Convenio interadministrativo	Se debe solicitar a la super
3	Contrato de obra.	OK
4	Cronograma y flujo de inversión	Se cargo en la carpeta del contratista
5	Pólizas del contrato y actualizadas al acta de terminacion.	OK
6	Propuesta inicial	OK
7	Presupuesto general del contrato (PDF Y EXCEL)	OK
8	Apus de ITEMS originales (PDF Y EXCEL)	Se cargo en la carpeta del contratista
9	Aprobación de ítems no previstos	Se cargo en la carpeta del contratista
10	Apus de Items no previstos (PDF Y EXCEL)	Se cargo en la carpeta del contratista
11	Comparación y fijación de precios no previstos.	NO APLICA ESTA REPETIDO
12	Especificaciones técnicas ÍTEMS no previstos.	Se cargo en la carpeta del contratista
13	Cotizaciones Items No previstos	Se cargo en la carpeta del contratista
14	Acta de mayores y menores cantidades E items No previstos (PDF Y EXCEL) por cada orip	Se cargo en la carpeta del contratista
15	Acta de recibo parcial por cada corte de la orip.	OK
16	Cobros realizados por cada orip.	OK
17	Especificaciones técnicas	Se cargo en la carpeta del contratista
18	Fichas tecnicas de los materiales utilizados.	Se cargo en la carpeta del contratista
19	Control equipos de medición (si aplica).	NO APLICA
20	Certificación de calibración de los equipos de medición (si aplica).	NO APLICA
21	Control de inspección y ensayos (si aplica).	NO APLICA
22	Resultados de ensayos de laboratorio (si aplica).	NO APLICA
23	Control de correspondencia (correos y oficios)	OK
24	Planos record, medio magnético (DWG), impreso y suscrito por el municipio, contratista e interventoría.	Se cargo en la carpeta del contratista
25	Libro bitácora.	OK
26	Manual de USO y MANTENIMIENTO , con acta de entrega y socializacion de ese manual.	Se cargo en la carpeta del contratista
27	Registro fotográfico. (Antes, durante y después).	Ok
28	Acta de inicio de obra	Ok
29	Actas de comité y/o visita	Ok
30	Solicitud de adición presupuestal o prórrogas.	Ok
31	Acta de terminación de contrato de obra.	Ok
32	Acta de entrega y recibo de las orip (con observaciones y recibo final de la obra por parte de la supervision)	OK
33	Acta de cambio de especificaciones	NO APLICA

LISTA DE DOCUMENTOS SST		
1	Informe final SST que contenga consolidado de indicadores de cumplimiento de planes de trabajo y programas ejecutados durante el proyecto.	ESTE INFORME SE ENTREGA EN CONSOLIDADO DEL INFORME FINAL TECNICO SE PUEDE OBSERVAR EN EL PUNTO 1 TECNICO
2	Paz y salvo mano de obra. Copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador.(Personal contractual)	OK
3	Paz y salvo mano de obra. Copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador.(Personal operativo relacionado en el control del personal, se hace enfasis en esta debido a quejas presentadas por los registradores, donde los oficiales presentan saldos pendientes por liquidar.)	Se cargo en la carpeta del contratista
4	Paz y salvo proveedores, empresas de servicios públicos. (se hace enfasis en esta debido a quejas presentadas por los registradores, donde los proveedores presentan saldos pendientes por liquidar.)	NO APLICA
5	Directorio de contactos direcciones de subcontratistas proveedores.	NO APLICA
6	Control de personal (Listado de personal incorporado durante el periodo de ejecución y planillas de pago mes a mes)	Se anexa tambien las hojas de vida del personal contractual de la interventoría
7	Pagos de FIC propios y de subcontratista.	Se cargo en la carpeta del contratista
8	Registro fotográfico mes a mes de las actividades ejecutadas en materia SST separadas por carpeta.	Se cargo en la carpeta del contratista
9	Paquete completo accidentes laborales (Incluye: Furat, lección aprendida, investigación, aplicación del plan de acción, seguimiento de recomendaciones y cierre del accidente.)	NO APLICA
10	Certificado de reincorporación laboral después de quince días de incapacidad	NO APLICA
11	Planillas de seguridad social propias y de subcontratistas, con su respectivo cuadro de seguimiento	NO APLICA
12	Copias de liquidación de prestaciones sociales con firma y huella del trabajador. (Relacionarlo con listado de personal con nombres, apellidos, número de cédula, cargo, fecha ingreso y fecha de retiro).	OK
13	Cartas de continuidad del personal que es trasladada para otro proyecto (Propios y de Subcontratistas, adjuntar adicional un listado del personal)	NO APLICA
14	Soportes de autorización de examen de egreso o renuncia del mismo, y si lo realizaron adjuntar dichos exámenes.	La renuncia a los examnes de egreso esta en los paz y salvos
15	Control de maquinaria y equipos (Certificados e inspeciones)	Se cargo en la carpeta del contratista
16	Paz y salvo Ministerio de trabajo: Certificación de no reclamaciones, investigaciones y sanciones laborales de empresas expedido por dirección territorial de Ministerio del trabajo.	OK
17	Certificado de paz y salvo de parafiscales, nómina, seguridad social, SENA,ICBF, CCF emitido por contador(a) y/o revisor fiscal adjuntando copia de tarjeta profesional y cédula.	OK
LISTA DE DOCUMENTOS AMBIENTAL		
1	Informe final y consolidado de indicadores con registro fotográfico.	ESTE INFORME SE ENTREGA EN CONSOLIDADO DEL INFORME FINAL TECNICO SE PUEDE OBSERVAR EN EL PUNTO 1 TECNICO
2	Licencia Ambiental: Planes manejo ambiental, informes e inversión de PMA.	Se cargo en la carpeta del contratista
3	Certificado de materiales petreos (Cantera).	NO APLICA
4	Licencia ambiental de la escombrera	NO APLICA
5	Certificado de paz y salvo canteras	NO APLICA
6	Fichas ambientales y las evidencias de su cumplimiento	Se cargo en la carpeta del contratista
7	certificacion sitio de disposición final de escombros	Se cargo en la carpeta del contratista
8	Certificación de paz y salvo disposición de escombros	NO APLICA
9	Actas de vecindad (apertura y cierre).	Se cargo en la carpeta del contratista

NOTA	Se debe montar la documentación en drive para su revisión, una vez aprobada se deben subir los documentos de liquidación al secop II

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

Se realiza el recibo final de las ORIP en compañía de la supervisión y los registradores.

El contratista VENTURA realiza todas las subsanaciones solicitadas por la supervisión SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y esta INTERVENTORÍA.

Se reciben todos los documentos de liquidación solicitados por la supervisión SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y esta INTERVENTORÍA a la fecha se encuentran pendientes de aprobación por parte de supervisión.

Para el contrato de obra número 2392 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4)." Se presenta un saldo a favor de la supervisión y entidad contratante SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO de $ 10.280.283,68 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y SESENTA Y OCHO CENTAVOS), con este saldo a favor de la entidad y el valor ejecutado mencionado anteriormente se da un cierre del 100% del valor contractual.

La interventoría con contrato 2467 DE 2023 cuyo objeto es: "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE RESGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)". 4)."* Alcanzo un 100% de su alcance presupuestal correspondiente a $ 101.514.920,64 (CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS Y SESENTA Y CUATRO CENTAVOS), cerrando en 0 el saldo del contrato.

En conclusión, el contrato de obra número 2392 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4)." Y el contrato de interventoría numero 2467 DE 2023 cuyo objeto es: "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE RESGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN*

AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)". 4)." Cumplieron a cabalidad con el objeto contractual.

Administrativo

Se solicita al contratista subir los documentos del contrato al SECOP II, como son actas de cobro, informes mensuales y semanales.

Se solicita al contratista el cargue de toda la liquidación una vez aprobada por la supervisión SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

Ambientales

Se identifica que los residuos ordinarios generados en todas las ORIP intervenidas fueron dispuestos con los generados en estas oficinas por los funcionarios.

Se acuerda que el certificado de la disposición de los residuos RCD se suministrará a modo de donación ya que; los escombros y material desechable fue donado a una obra vecina.

SST

Durante la ejecución del proyecto no se presentan accidentes ni incidentes laborales
Se presentan estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019 en el portal del ministerio de trabajo y de la ARL.

Se realizó una identificación real de los riesgos derivados de los procesos constructivos a ejecutar; permitiendo gestionar de manera oportuna y eficiente la seguridad del personal.

Se mejoraron los formatos de permisos de trabajo en alturas y se evidencia cumplimiento del 100% del reentrenamiento siendo certificados con empresa.

Como conclusión en este componente, se identifica el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo

FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO EDIFICACION DICAC
