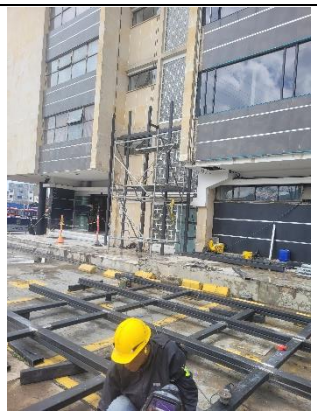
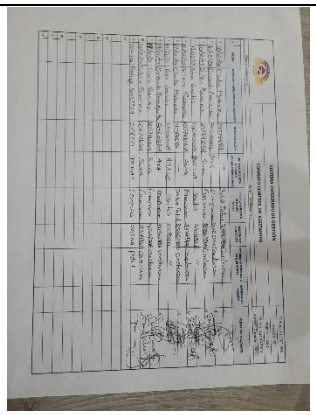
| | |
|---|---|
|  | ALISTAMIENTO IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE LA FACHADA FLOTANTE EN LAMINA MICROPERFOADA |
|  | ESTRUCTURA METALICA DE FIJACION, LA CUAL SE INCORPORA A LA FACHADA. ESTE ELEMENTO SE PREFABRICA EN OBRA, SE VERIFICAN ASPECTOS DE SOLDADORAS, SECCIONES DE LOS ANGULOS, GEOMETRIA, RECOMENDACIONES DE FIJACION Y APOYO EN LA ZONA DE PRIMER PISO |
|  | SOBRE EL ACCESO, PEATONAL QUE DA POR LA CALLE SEXTA, SE GENERA UN MURO DE MEDIANA ALTURA, DEBIDAMENTE CONFINADO, COMO ELEMENTO ARQUITECTONICO, COMPLEMENTARIO A ESTA ZONA DE CIRCULACION |
|  | EN LA PARTE DE LA TERRAZA, ELEMENTO DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIO, METALICO PARA ADECUACION TERRAZA E INSTALACION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICO, TIPO MEMBRANA ARQUITECTONICA. |


| | |
|---|---|
|  | OTRA VISTA DE ESTE ELEMENTO METALICO |
|  | REUNIONES EN LA OBRA, ZONA DE OFICINA CON EL FIN DE VERIFICAR ASPECTOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE LA EJECUCION DE ESTE MANTENIMIE NTO |
|  | SECUENCIA DE LA PREFABRICACION DEL ELEMENTO METALICO DE SOPORTE DE LA MALLA MICROPERFORADA |
|  | OTRA VISTA DE ESTE TRABAJO, SECUENCIAL, EL CUAL POSTERIORMENTE, SE HARA LA RESPECTIVA PINTURA DE PROTECCION Y EL IZAJE PARA COLOCARLO SOBRE LA FACHADA, EN LA ZONA EXTERIOR DEL PUNTO FIJO, ZONA DE ENCHAPE PIEDRA MUÑECA |


| | |
|---|---|
|  | RECORRIDOS DENTRO DE LA OBRA, VERIFICACION DE ASPECTOS DE AVANCE, CALIDAD DE LAS OBRAS, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, RENDIMIENTOS, PERSONAL EN EJECUCION. ETC. |
|  | MURO SOBRE LA ZONA PEATONAL, YA CON ACABADO, EL CUAL CORRESPONDE A LA MISMA TABLETA DE FACHADA Y COLOCADA SOBRE LAS COLUMNAS |
|  | ACABADO SOBRE LA FACHADA, PRIMER PISO, ZONA PEATONAL |
|  | AVANCE DE LA COLOCACION DE LAS ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, VISTA DE LA FACHADA, TERMINADA |

| | |
|---|---|
|  | OTRA PANORAMICA DE ESTE PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE FACHADA FLOTANTE |
|  | PLANILLA DE ACTAS DE REUNION EN LA OBRA |
|  | PLANILLA DE ACTA DE REUNION EN LA OBRA |
|  | ZONA DE ACCESO, DONDE SE INDICARON LOS ACABADO, DEL MESON. |

| | |
|---|---|
|  | EN LA PARTE DE ALOJAMIENTOS, BAÑO MESON DE LAVAMANOS, PARA INCORPORAR EL ACABADO, EL CUAL CORRESPONDERA A MARMO, SE SOLICITO LAS PRUEBAS DE PRESION NIVELACION, REVENTILZACION PARA DAR SECUENCA A LA FASE DE ACABADOS |
|  | COLOCACION DE LAS PUERTAS, EN ALUMINIO, BATERIA SANITARIA, ZONA DE ALOJAMIENTOS |
|  | OTRA PANORAMICA, DE ESTA FASE DE ACABADOS, SOBRE LA BATERIA SANITARIA, SEGUNDO PIOS |
|  | OBSERVACIONES CALIDAD DEL PAVIMENTOS, FISURACION, EN LA PARTE SUPERFICIAL, MUY POSIBLEMENTE POR CONTRACCION DEL CONCRETO EN LA FASE DE FUNDIDA. DEBEN GENERAR UN RAPARAICION SOBRE LA ZONA DE FISURACION, MEDIANTE INYECCION CON EPOXICOS, ELASTOPLASTICOS, DADO QUE SE PUEDEN PRESENTAR DAÑOS PREMATUROS, A LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. |

| | |
|---|---|
|  | OBSERVACIONES CALIDAD DEL PAVIMENTOS, FISURACION, EN LA PARTE SUPERFICIAL, MUY POSIBLEMENTE POR CONTRACCION DEL CONCRETO EN LA FASE DE FUNDIDA. DEBEN GENERAR UN RAPARAICION SOBRE LA ZONA DE FISURACION, MEDIANTE INYECCION CON EPOXICOS, ELASTOPLASTICOS, DADO QUE SE PUEDEN PRESENTAR DAÑOS PREMATUROS, A LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. |
|  | OBSERVACIONES CALIDAD DEL PAVIMENTOS, FISURACION, EN LA PARTE SUPERFICIAL, MUY POSIBLEMENTE POR CONTRACCION DEL CONCRETO EN LA FASE DE FUNDIDA. DEBEN GENERAR UN RAPARAICION SOBRE LA ZONA DE FISURACION, MEDIANTE INYECCION CON EPOXICOS, ELASTOPLASTICOS, DADO QUE SE PUEDEN PRESENTAR DAÑOS PREMATUROS, A LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. |
|  | DE MANERA ALEATORIA, SE REPITE ESTE PATRON DE FISURAS, EN LA ZONA DE ACCESO, POR LA CALLE SEXTA |
|  | INSPECCIONES RUTINARIAS A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION, ZONA DE BAÑOS DE ALOJAMIENTOS VERIFICACION DE CALIDAD DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS |
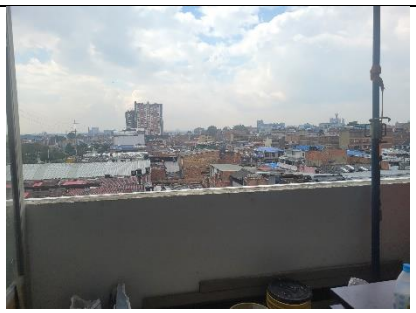
| | |
|---|---|
|  | VERIFICACION DE ACTIVIDAD DE IZAJE ESTRUCTURA METALICA, FINALIZANDO ESTA ACTIVIDAD |
|  | DESMONTE DE VENTANERIA, ACTIVIDAD, CRITICA, LA CUAL A REPERCUTIDO EN EL AVANCE DE LA EJECUCION Y REPRESENTO UN RETRASO. |
|  | PANORAMICA DE ZONA DONDE SE DESMONTO LA VENTANERIA, PARA HACER EL CAMBIO A VENTANERIA EN ALUMINIO |
|  | ACABADOS ULTIMO NIVEL, ZONA DE AUDITORIO, DONDE SE INTESIFICARON LAS ACTIVIDADES DE REMATES FINALES, DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFIFACIONES PARA ESTA ZONA |
|  | ACABADOS ULTIMO NIVEL, ZONA DE AUDITORIO, DONDE SE INTESIFICARON LAS ACTIVIDADES DE REMATES FINALES, DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFIFACIONES PARA ESTA ZONA |
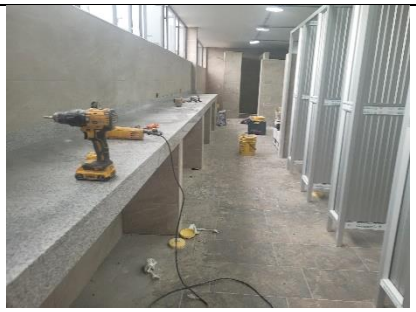
| | |
|---|---|
|  | VERIFICACION ANCLAJE ULTIMO NIVEL, PARA FACHADA FLOTANTE |
|  | MODELO DE SANITARIO, DISPUESTO, ES DE TIPO INSTITUCIONAL, COLOR, BLANCO, EL CUAL SE INSTALARA EN CADA UNA DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE ALOJAMIENTOS, LAMENTABLEMENTE LA PUERA SU GIRO DE APERTURA SERA AL EXTERIRO, GENERANDO AFECTACIONES A LA CIRCULACION, CASO FORZADO, POR EL ESPACIO DISPONIBLE. |
|  | PANORAMICA DE LA CIRCULACION DISPONIBLE, ENTRT EL MESON DE LAVAMANOS Y LA BATERIA DE BAÑOS, LO CUAL EN LA VERIFICACIONDE FUNCIONAMIENTO POR APERTURA DE PUERA, LA ZONA DE |
|  | PANORAMICA DE LA CIRCULACION DISPONIBLE, ENTRT EL MESON DE LAVAMANOS Y LA BATERIA DE BAÑOS, LO CUAL EN LA VERIFICACIONDE FUNCIONAMIENTO POR APERTURA DE PUERA, LA ZONA DE |

| | |
|---|---|
|  | VERIFICACION DE LA ESPECIFICACION DEL MATERIAL A COLOCAR EN LA ZONA DE AUDITORIO, A MANERA DE ACABADO, SIMULARA MADERA, ES UN ELEMENTO ARQUITECTONICO, PARA MEJORA ASPECTOS DE ACABADOS Y RESONANCIA ACUSTICA |
|  | ZONA DE DUCHA, MESON DE SERVICIO, PARA OPERACIÓN DE ESTA ZONA, BATERIA SANITARIA |
|  | SE RECOMENDAO MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA ZONA DE PUNTO FIJO, ESCALERA DONDE SE INCORPORO CONTRUIR UN ANTIDESLIZANTE, CON EL MISMO ELEMENTO DE ACABADO |
|  | FACHADA CARRERA QUINCE, DONDE SE FINALIZO EL ENCHAPE Y DESMONTE DE VENTANERIA |
|  | OTRA PANORAMICA DE ESTA FASE DE TERMINACION DE FACHADA EN LA CARRERA QUINCE |

| | |
|---|---|
|  | ESCALERA EN PROCESO DE ACABADO, CON PULIDA Y COLOCACION DE ANTIDESLIZANTE |
|  | PANORAMICA DE LOS ALOJAMIENTOS FINALIZADOS. SE RECOMENDO ASEO PERMANNETE. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE REDES ELCTRICAS |
|  | VERIFICACION E INSPECCION DE ZONA DE DESMONTE Y COLOCACION DE VENTANERIA. ITEM REPRESENTATIVO DEL CONTRATO, ESTO TANTO POR EL VALOR DEL ITEM, COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS, DESMONTE, LUEGO CORRECCION DE VANOS Y FINALMENTE MONTAJE, CON LA SIMULTANEIDAD DEL VIDRIO. |
|  | PANORAMICA FINALIZACION OBRAS DE ACABADOS ALOJAMIENTOS |
|  | PANORAMICA FINALIZACION OBRAS DE ACABADOS ALOJAMIENTOS |

| | |
|---|---|
|  | TRABAJO SOBRE LA ESCALERA, CON LA INCORPORACION DE ACABADOS |
|  | BATERIAS SANITARIAS |
|  | SE VERIFICA AVANCE DEL COMPLEMENTO SOBRE LA HUELLA DE LA ESCALERA, EL CUAL DA UN MEJOR DETALLES ARQUITECTONICO Y DE ACABADO Y A SU VEZ, COMO ELEMENTOS DE PROTECCION |
|  | SE VERIFICA AVANCE DEL COMPLEMENTO SOBRE LA HUELLA DE LA ESCALERA, EL CUAL DA UN MEJOR DETALLES ARQUITECTONICO Y DE ACABADO Y A SU VEZ, COMO ELEMENTOS DE PROTECCION |
