Alcaldía de Aguazul

150.24.17

ALCALDÍA DE AGUAZUL
COMUNICADO DE SALIDA
FECHA: 2025-01-09 18:14
RAD: TRD:150.11-0017
ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD
ORIGEN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - YIBETH TORRES TORRES
DESTINO: MANUEL ANTONIO MINISTER DEL INTERIOR

Aguazul, 08 de enero del 2025

Arquitecto
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del convenio 1405 de 2024
Ministerio del interior
Manuel.linares@mininterior.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO Nº 1405-2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

Asunto: Remisión de documentación, INFORME No. 08 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 y INFORME No. 09 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cordial saludo, Arquitecto Linares,

A través de la presente me permito hacer entrega del informe mensual No. 08 Y No. 09, alusivo a las actividades realizadas por el municipio de Aguazul, estipuladas en el convenio 1405 de 2024 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".**

Atentamente,

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura.

Proyecto:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional contratado SIA

CC: karen.ramirez@mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO No. 1405 DE 2024, MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE** DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE Calle 11 N 11-35 Barrio las Ferias		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**		**$ 5.289.859.889,67**
	APORTES MUNICIPIO DE AGUAZUL		**$ 933.504.686,41**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$ 6.223.364.576,08**
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2025 11:59 PM		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON	10/09/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.202400297	22/03/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	01/02/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 5,784,981,922.06	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 438,382,654.02	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

 Convenio interadministrativo/ Contrato *(adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42) contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio.	NO APLICA	03/06/2024	$1.322.464.972,42
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/ AAAA	$0,0
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/ AAAA	$0,0

ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.	100%	DD/MM/ AAAA	$0,0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.322.464.972,42
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME POR EL MUNICIPIO				$ 933.504.686,41
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$0.0**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS *FECHA*	VIGENCIAS *FECHA*
605-47-994000105956	Cumplimiento	$ 1.244.672.915,20	15/04/2024	01/02/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
MA-SI-LP-005-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**$ 5.784.981.922,06 COP**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL**	**Representante Legal:** Deyder Eufranio Cocunbo Vargas
Fecha de Acta de inicio del contrato	**11 de Octubre del 2024**	
Fecha de terminación del contrato	**10 de Mayo del 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$5.777.609.266,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS Nit. 860.002.527-9
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO No. 400057195
FECHA DE LA PÓLIZA	05/08/2024

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
MA-CMA-SI-008-2024	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	**$438.382.652,96 COP**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**	**Representante Legal:** Andrea Viviana Castellanos Pinto
Fecha de Acta de inicio del contrato	**11 de Octubre del 2024**	
Fecha de terminación del contrato	**10 de Mayo del 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$438.382.652,96**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No.	CUMPLIEMIENTO No.57-44101005773	
FECHA DE LA PÓLIZA	03/10/2024	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	**SI**	**NO**	**DESCRIPICION**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X		NOVIEMBRE-2024
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X		
INFORME FINANCIERO	X		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	X		$ 233.893.575,31
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	X		$ 11.063,42
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X		

OTROS		X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:

AVANCE CTO 474 DE 2024 SEGUN ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
PROGRAMADO %	100%	$240.731.986,00
EJECUTADO MES %	23%	$55.368.356,78
EJECUTADO ACUMULADO%	90%	$216.658.787,40

Los anteriores datos muestran un atraso en la ejecucion del contrato,en etapa de de ejecucion de obra.

COMPONENTE TÉCNICO.

OBRA:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de obra publica No 0474 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL:	10 DE MAYO DEL 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA I: Estudios y diseños

Para el periodo comprendido 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 del presente informe el Contratista de Obra continua en la ejecución de la Etapa I ; Estudios y diseños, en el cual se adelantaron la revisión y aprobación de los siguientes productos:

PRODUCTO 6. DISEÑO HIDROSANITARIO: se realizo la revisión del diseño hidraulico, sanitario y alcantarillado pluvial, en las mesas de trabajo realizadas de manera presencial y virtual, con ajustes en los ductos, adicionalmente se solicito revisar en el presupuesto el ítem de lavamanos y sanitarios para personas con movilidad reducida (PMR), así como las barras de seguridad, y asegurarse que los orinales sean adecuados para facilitar su mantenimiento.

PRODUCTO 7. DISEÑO RED DE INCENDIOS: en el periodo comprendido del mes de diciembre se realizo la revisión y ajustes pertinentes del sistema de red contra incencios presentado por el contratista, se realizaron ajustes a según lo planteado en los comités de seguimiento de la etapa I de estudios y diseños, se solicita los debidos certificados de compromisos para

PRODUCTO 8. RED DE GAS: durante la ejecucion de la etapa de estudios y diseños se realizo la primera revisión de este producto, teniendo encuenta que el diseño inicial de los puntos de café se realizo con estufas eléctricas, se ajusto los mismos a puntos de gas natural, adicionalmente el 18 de diciembre fue expedido el certificado de disponibilidad de servicio de gas natural domiciliario No 110 de 2024 por parte de la empresa Cusianagas prestadora de servicio en el municipio de aguazul, esto como cumplimiento de los compromisos pactados como municipio para el desarrollo del componente.

PRODUCTO 9. DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION: Instalar sensores para iluminación en los baños, según la solicitud de la supervisión del Ministerio del Interior, con el fin de que se genere ahorro de energia dentro de la edificación.

PRODUCTO 10. DISEÑO VOZ Y DATOS: comité realizado el día cuatro (4) de diciembre de 2024 con contratista de obra, contratista de interventoría y supervisión del municipio de Aguazul; Por parte del Municipio La Ingeniera de Sistemas Patricia Calderón, indicó que se debe proyectar un mayor número de Access Points con el fin de aumentar la cobertura de la red de voz y datos para la nueva sede administrativa, se determinó que el diseño de la red de voz y datos, se debe contemplar la inclusión de los gabinetes y pasamuros son necesarios para la correcta instalación de los equipos de red de voz y datos.

PRODUCTO 11. DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMATICO: se presento la propuesta de diseño de climatización mecánica según los índices de calor del interior de la edificación, los cuales fueron mitigados con la instalación de aires acondicionados uno a uno mini Split para general ahorro energético y un fácil mantenimiento en un futuro de los mismo, se instalan en áreas cerradas como salas de reuniones aires tipo cassette.

INTERVENTORIA

El contrato de interventoria **MA-CMA-SI-008-2024** cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". Cuyo contratista es el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM representado legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS identificada con cedula de ciudadanía 33.645.882 de Aguazul, quienes son los encargados de la revisión, verificación y aval para la ejecucion del contrato.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de interventoria No 0735 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ".
VALOR INICIAL	$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Diseños

Para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre del 2024 y el 31 de diciembre del 2024 la interventoria efectua el acompañamiento a la revisión detallada de los productos, con los respectivos ajustes realizados por la supervisión los cuales hacen parte de la etapa I : Estudios y diseños.

Dado que la interventoria tiene como objeto supervisar, verificar y aprobar con el fin de que se cumplan con las especificaciones y normas técnicas, actividades administrativas, técnicas, financieras, contables, ambientales, legales, fiscales y de control para verificar, controlar e intervenir la revisión de planos y demás estudios según lo establecido en el Clausulado del contrato.

Se realizan diferentes comités de verificación de avances de los diseños emitidos por el contratista de obra, durante el .

COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

ACTAS GENERASAS CONTRATO No 474 DEL 2024:

A la fecha de corte del 31 de diciembre del 2024 se han generado las siguientes Actas del contrato:

Legales:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses

No 03 ANTICIPO	23 / Octubre / 2024	$2.022.163.243,10

El contrato No 474 del 2024 no genero actas en el presente periodo .

ACTAS GENERASAS CONTRATO DE CONSULTORIA No 735 DEL 2024:

A la fecha de corte del 31 de diciembre del 2024 se han generado las siguientes Actas del contrato:

LEGALES:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses
No 03 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	04 / Diciembre / 2024	Correccion del valor del contrato

El contrato No 735 del 2024 generó una acta en el presente periodo.

COMITES Y/O REUNIONES

No	DESCRIPCION	FECHA	ENTIDAD	LUGAR	OBSERVACION
1	Acta de comite	04/ Diciembre / 2024	Obra, Interventoria y Supervision Alcaldia (TICS).	Secretaria de Infraestructura – Alcaldia de Aguazul	Citacion comite de diseños virtual revisión componente Voz y Datos.
2	Acta de comite	10/ Diciembre / 2024	Obra, Interventoria, Supervision Alcaldia y Supervision Ministerio del Interior.	Presencial – Ministerio del Interior	Citacion comite recibo de estudios y diseños convenio 1405 de 2024 Aguazul - Casanare
3	Acta de comite	19/ Diciembre / 2024	Obra, Interventoria, Supervision Alcaldia y Supervision Ministerio del Interior.	Presencial – Ministerio del Interior	Comite recibo de estudios y diseños convenio 1405 de 2024 Aguazul - Casanare

PERSONAL CONTRATO OBRA No 0474 DEL 2024:

ETAPA I : ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	NOMBRES Y APELLIDOSS
1	Arquitecto Especialista	Luis Manuel Rojas Gil
2	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	Deyder Eufranio Cocunubo Vargas
3	Ingeniero Geotecnista	Diego Fernando Venegas Rivera
4	Ingeniero Hidrosanitario	Leonardo Arcos Avilez
5	Ingeniero Ambiental	Leydi Johanna Bahamon Trigos
6	Ingeniero Electromecanico	Gloria Stefany Lagos Tiria

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA No 0735 DEL 2024:

ETAPA I : INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA	NOMBRES Y APELLIDOSS
1	Director Ingeniero Civil Especialista	Joan Sebastian Galindo Valderde
2	Residente Ingeniero Civil Especialista	Luis Ernesto Acuña Camargo
3	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	Andres Felipe Goez Garcia

COMPONENTE FINANCIERO.

OBRA:

En el mes de enero el municipio de Aguazul, No suscribió actas .

BALANCE FINANCIERO CTO DE OBRA			
Valor inicial del contrato	$5.777.609.266,00		
Valor anticipo 35%		$2.022.163.243,10	
Valor pendiente por amortizar			$2.022.163.243,10
Valor pendiente por pagar		$3.755.446.022,90	$3.755.446.022,90
Totales	**$5.777.609.266,00**	**$5.777.609.266,00**	**$5.777.609.266,00**

Se adjunta los estractos de las dos cuentas bancarias en las cuales se encuentra el deposito del dinero del covenio.

Cuenta Aperturada para aporte del Ministerio del Interior:
Numero de cuenta: 001300770200001753
Fecha de corte: 31-12-2024

Saldo: $11.063,42

Cuenta Aperturada para aporte del Municipio:
Numero de cuenta: 001300770200002023
Fecha de corte: 31-12-2024
Saldo: $ 233.898.638,31

Se genero el informe financiero del mes de Diciembre con ajuste en el valor del contrato de interventoria ya que por error involuntario se digito de manera errónea en el acta de inicio y el informe financiero de octubre y noviembre.

COMPONENTE JURÍDICO.

En el mes de Diciembre del 2024 se suscribió el acta No 03 aclaratoria No 02 del contrato 0735 del 2024 el cual aclara que por error involuntario de digito de manera errónea el valor del contrato de la interventoria.

Se adelanto el llamado de atención con el fin de alertar un posible incumplimiento por parte de los contratistas, esto generando un atraso en el cumplimiento del objeto contractual del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE:

A la fecha del presente informe se encuentra ejecutada en un 90% la Etapa I: Estudios y Diseños, realizando la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoria del Producto 6. Diseño hidrosanitario, Producto 7. Diseño red de incendio, Producto 8. Diseño de red de gas, Producto 9. Diseño eléctrico e iluminación, Producto 10 diseño voz y datos y Producto 11. Diseño mecánico y bioclimático, adicionalmentr se realiza avance en memorias de cantidades con ajustes a los formatos presentados por los contratistas.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/05/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVALGUTIERREZ
Supervisor Municipio Convenio No. 1405-2024
Municipio de Aguazul Casanare

Proyecto: Jessica Fernanda Garcia Garzon
Profesional Contratado SIA

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA ACLARATORIA**	

ACTA No. 03 – ACLARATORIA No02 AL ACTA DE INICIO No.01 del 11 de Octubre de 2024

CONTRATO:	0735 de 2024-10-02
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)
MODALIDAD:	CONCURSO DE MÉRITOS
PROCESO:	MA-CMA-SI-008-2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT.:	901875652-5
VALOR:	$438.382.653,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA INICIO:	2024-10-11
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2025-09-10
PLAZO ACTUAL:	SIETE (07) MESES
FECHA TERMINACION FINAL:	2025-05-10

ACLARACIÓN: Mediante la presente acta se procede a realizar aclaración No. 02 al Acta de Inicio de fecha 11/10/2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En el Municipio de Aguazul Casanare, se reunieron el **Ing. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ**, Secretario de Infraestructura, quien ejerce la supervisión del contrato de INTERVENTORÍA, la Arq. JESSICA FERNANDA GARCÍA GARZÓN, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No.735 del 2024, por parte del contratista interventor **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** el representante legal Arq. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, con el fin de aclarar el acta de inicio del contrato de interventoria suscrita por los siguientes motivos.

1. Que teniendo en cuenta que se suscribió ACTA No 1 del 11 de octubre de 2024, por un error involuntario de digitación se escribió de manera errónea el valor del contrato de interventoria cuyo valor según lo descrito en el Clausulado del contrato de interventoria es: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($438.382.653.00) M/CTE.

2. Los demás literales y numerales del acta de inicio del 11 de octubre de 2024 se conservan en su integralidad.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA ACLARATORIA**	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 04 de diciembre del 2024.

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Apoyo a la supervisión

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

Reviso: JUAN RAUL NOCUA
PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: YIBETH TORRES TORRES

MUNICIPIO DE AGUAZUL .
.
CLL 11 # 11-35 PALACIO MUNICPAL .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA

370 189 Oficina: 0077

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-12-2024 HASTA: 31-12-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300770200002023
Fecha de corte	31-12-2024
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		233,896,065.31	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	2,573.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	233,898,638.31

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	30-12-2024	30-12-2024	ABONO INTERESES GANADOS		2,573.00	233,898,638.31

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA

EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-12-2024	SIN MOVMNTOS PERIOD2024-12-012024-12-31	01-12-2024		

PERIODO: Desde 01-12-2024 **Hasta** 31-12-2024

TITULAR
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Saldo anterior	Cargos	Abonos
11,063.42	.00	.00

Nuevo Saldo
11,063.42

OFICINA	FECHA CORTE
AGUAZUL	31-12-2024

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0077	64	0200001753

HOJA
1

Diciembre

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE COMITÉ TECNICO**	
	Código: M-GI-F-01 | Versión: 02	
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

CONTRATO DE OBRA No:	0474 del 2024
OBJETO:	Estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal del municipio de Aguazul Casanare.
CONTRATISTA:	Consorcio Centro Administrativo Aguazul
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	0735 del 2024
OBJETO:	Interventoria tecnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica a los "Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal de municipio de Aguazul Casanare.
CONTRATISTA:	Consorcio Interventoria CAM.
DEPENDENCIA:	Secretaria de Infraestructura.
SUPERVISOR:	Juan Miguel Sandoval Gutierrez.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Jessica Fernanda Garcia Garzón

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	**EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA**	**INSTITUCIÓN**	**FIRMA**
Deyder Cocunubo	Repreventante Legal	Consorcio Centro Administrativo Aguazul	Virtual
Leonardo Miranda	Diseñador Componente	Consorcio Centro administrativo Aguazul	Virtual.
Yuli Cardenas	Arquitecta	Consorcio Centro Administrativo Aguazul	Virtual
Andrea Castellanos P.	Representante Legal	Consorcio Interventoria (Aguazul CAM)	Virtual
Patricia Calderon	Profesional Area TIC Sec. General	Alcaldia de Aguazul	Virtual
Juan A. Gonzales	Ing. Sistemas Area TIC Sec. General	Alcaldia de Aguazul	Virtual
Jessica F. Garcia	Profesional Apoyo Super.	Alcaldia de Aguazul	

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar Comite tecnico Revision Diseños CAM componente voz y datos

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

TEMAS TRATADOS

Revisar los Diseño de Voz y Datos con el personal encargado de las TICS- Alcaldia Municipal.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se da inicio via plataforma Meet siendo las 2:30 pm con asistencia virtual de las partes involucradas en el proceso de revisión del componente Producto 10 Diseño Voz y Datos del contratto de obra nº 0474 del 2024 cuya interventoria es 0735 del 2024.

Se realiza la presentación de los asistentes a la reunión a la cual asiste: por parte de la Obra el representante Legal el Ing. Deyder Cocunubo quien toma la palabra presentando a su equipo

de trabajo, toma la palabra la Ing. Patricia Calderon del Area TIC de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía Municipal donde expone todas las dudas respecto a la formulación del contrato y el desarrollo hasta fecha del avance del componente voz y datos del Centro administrativo, toma la palabra la Arq. Andrea Castellanos interventora del contrato quien expone que dentro de los avances se ha considerado las observaciones del Ministerio de interior enmarcando que Aguazul debe direccionar su desarrollo tecnologico disminuyendo los puntos fijos de conexión y aumentando la conexión wifi teniendo encuenta que la gran mayoría del personal se encuentra contratado por Prestación de servicios.

Toma la palabra el Ing. Diseñador Leonardo Miranda el cual presenta la distribución de las tres plantas de la Edificación, dentro del diseño se contempla una area de reserva para ser utilizada en un futura de ser necesario para el funcionamiento de la red de voz y datos.

Adicionalmente el diseño de la red de voz debe contemplar la inclusión de gabinetes y pasamuros necesarios para conectar los equipos.

Se finaliza recomendando que se realice en la etapa constructiva una instalación organizada de la red de voz y datos, esto con el fin de realizar un mantenimiento adecuado de la red.


COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Enviar planimetria Final del Diseño de Voz y Datos	Consorcio Interventoria CAM.

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: A convenir.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 04 días del mes de Diciembre de 2024

Original Oficina Jurídica
1era Copia Interventor o Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

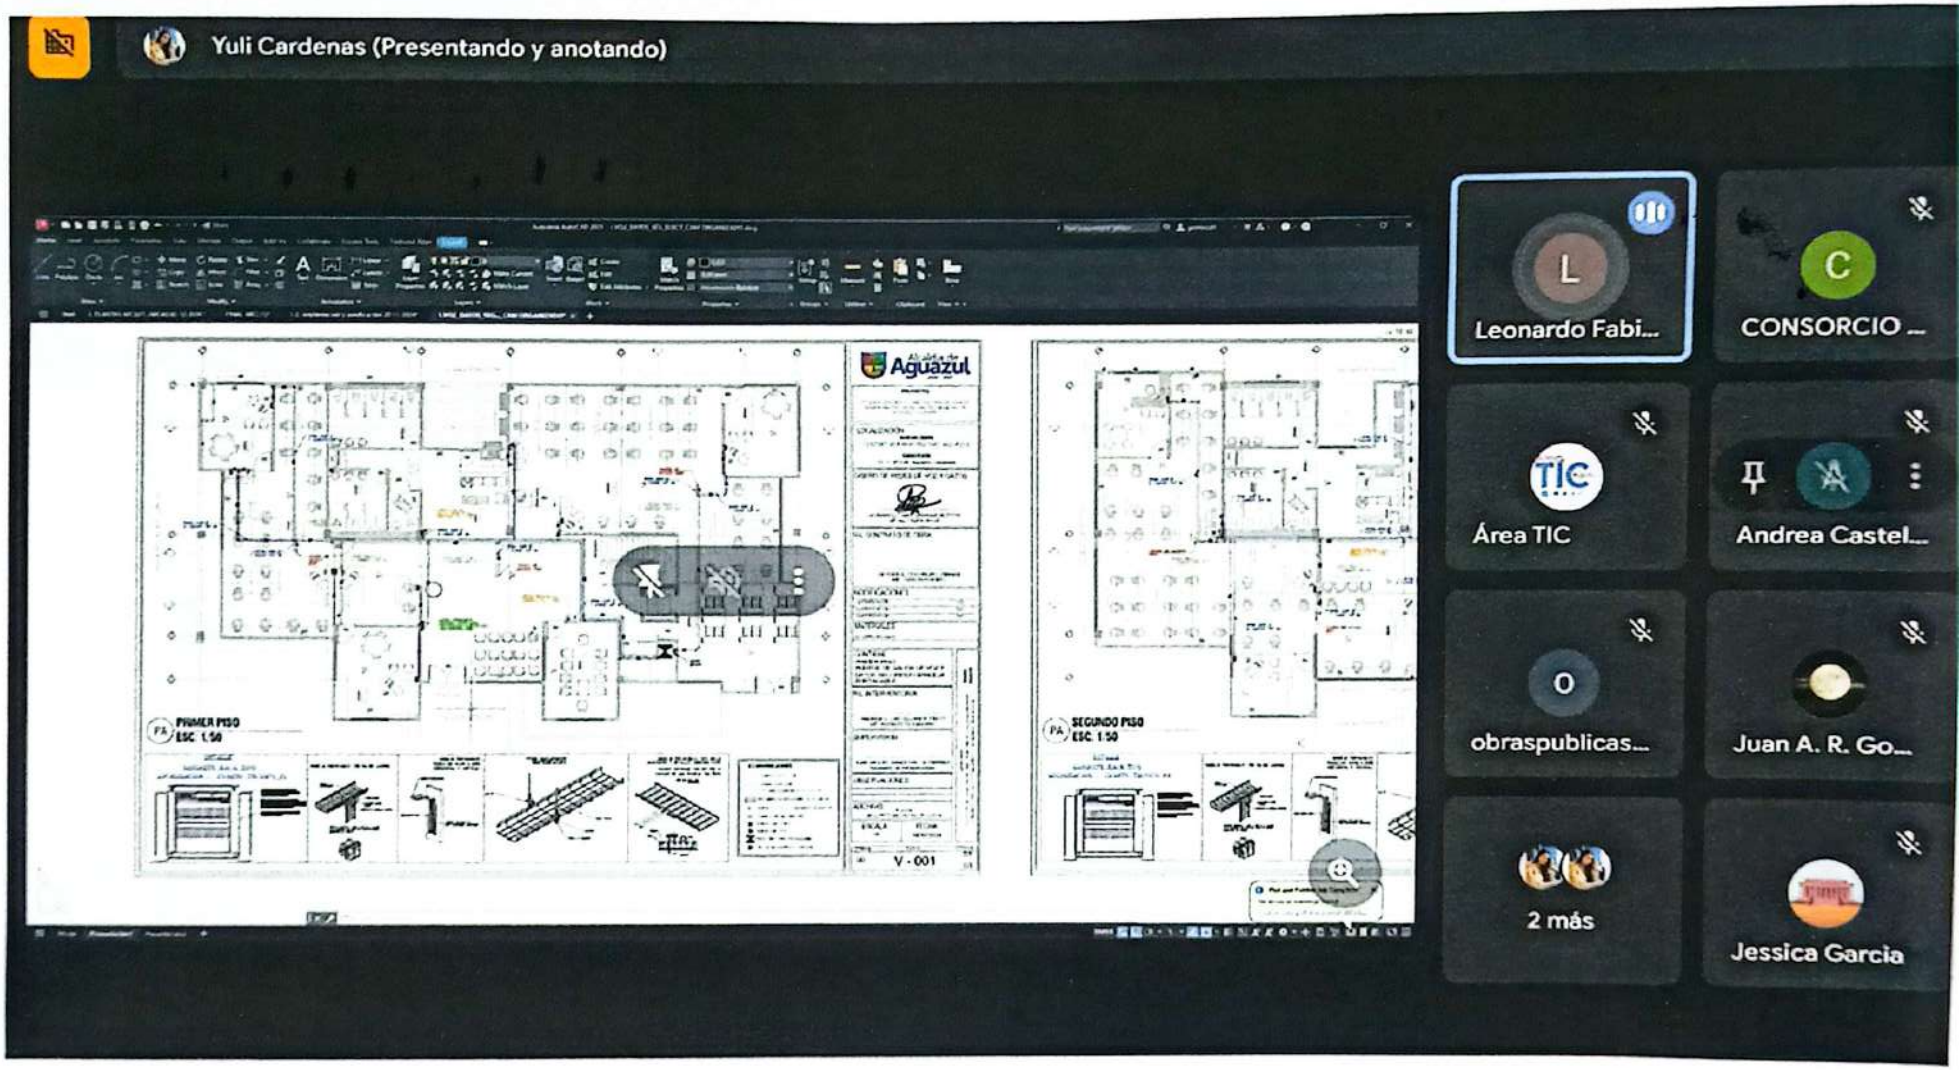

Anexo Comité 04 de diciembre del 2024 / VIRTUAL.

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Comité de Recibo Estudios y diseños Convenio 1405-2024 AGUATUL -CASANARE.

Responsable u organizador: Ministerio Interior. Dependencia: Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ciudad: Bogotá. Lugar y/o enlace: Ministerio del Interior ☐ Presencial ☐ Virtual

Fecha: Día 10 | Mes 12 | Año 2024 — Hora inicial: 8:00am. — Hora final: 7:00pm.

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Gloria Stefany Lagos Tirso	1052391960	34					X		Consorcio CAA	Diseñadora Electrica	ing.stefany.lagos@gmail.com	3114576718	
2	Yulitza Cárdenas	1115917555						X		Consorcio CAA	Arquitecta	yulicardenas@gmail.com	3143963136	Yulitza C.
3	Jessica F. Garcia Garzón	1116551510	28					X		Alcaldia de Aguazul	Apoyo Prof.	siajessicag@gmail.com	3144182220	
4	Andrea V. Castellanos P.	33695882	43					Y		Consejo Interv. com	Representante Legal	consorcioterra@gmail.com	3143130161	ANDREA CASTELLANOS P.
5	Jan M Sandoval	74794011	44					Y		Alcaldia	Sec. Infraestructura	obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co	3179342059	
6	Dayler Coronado V.	1049607835	37					X		Consorcio Centro Nto	Ing. Residente Vial	consorciocado2@gmail.com	3150859920	
7	Karen Ramirez	1019133021	27					X		Ministerio	Apoyo Supervisión	Karen.ramirez@mininterior.gov.co	3228598886	
8	MANUEL LENNIES	71796245	95					X		MININTERIOR	SUPERV.	manuel.linnes		
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se desarrolló comité preficial con el Municipio de Aguazul - Casanare con el fin de llevar a cabo el recibo del componente de estudios y diseños y la suscripción del anexo 22 (acta de recibo de estudios y diseños), se avanza en la revisión del cumplimiento del anexo 24C (entregables mínimos de estudios y diseños) en donde el Municipio socializó documentos de los siguientes documentos: levantamientos topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de redes hidraúlicas, diseño de red contraincendios diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos, los cuales presentaron observaciones que fueron puestas en conocimiento del Municipio de Aguazul.

El contratista de obra, estudios y diseños, presentó subsanación de observaciones arquitectónicas, estructurales topográficas. y de red contra incendios que se habían expuesto durante el comité del 27 y 28 de noviembre de 2024. El Municipio no presentó componente de presupuesto, Cronograma ni flujo de caja.

El Municipio se compromete a realizar la entrega de los estudios y diseños para el 18 de diciembre de 2024

La supervisión por parte del Ministerio del Interior recordó al Municipio que la entrega de los estudios y diseños se debió llevar a cabo el pasado 27 de noviembre de 2024.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. El Municipio realizará la entrega del componente de estudios y diseños el 18 de diciembre de 2024.
2. Subsanar observaciones emitidas a los estudios y diseños por parte del Municipio de Aguazul.
3.
4.

- . En el Item "2. *Observaciones y/o conclusiones generales*", se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Raven Ramirez
Cargo o Rol: Apoyo Supervisión
Área: SDS. Mininterior

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Comité de Recibo Estudios y diseños Convenio 1405-2024 Aguazul - Casanare.

Responsable u organizador: Ministerio del Interior | Dependencia: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Ciudad: Bogotá | Lugar y/o enlace: Ministerio del Interior. | ☒ Presencial ☐ Virtual | Fecha: Día 19, Mes 12, Año 2024 | Hora inicial 9:00am | Hora final 5:00pm

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Juan M. Sandoval	79754011	44					X		Alcaldía Aguazul	Sec Infraestructura	obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co	3175742059	
2	Jessica F. García Garzón	1.116.551.510	28					X		Alcaldía de Aguazul	Apoyo a la Supervisión	sigjessicag@gmail.com	3144182220	
3	Andrea Viviana Castellanos P.	33695882	43					X		Consorcio Interventoría Cam	RL Interventor	consorintercam@gmail.com	3143130161	
4	Dayder Cocuyo V.	1049607835						X		Consorcio Centro Administrativo Aguazul	Proyectista Eléctrico	Consorciocentroaguazul@gmail.com	3115085970	
5	Yulitza Cárdenas	1115917555						X		Consorcio Centro Admon.	Apoyo Predial	yulicardenas1228@gmail.com	3143963186	
6	Karen Ramirez	1019133021	27					X		Mininterior	Apoyo Supervisión	Karen.ramirez@mininterior.gov.co	3228549996	
7	[illegible]	7172796795	45					X		MINISTERIO	SUPERV.	manuel.lizcano		
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se desarrolló Comité presencial con el Municipio de [redacted]. Aquatul Con el fin de dar revisión al componente de estudios y diseños el Municipio socializó el componente de levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño de red contraincendios, diseño de redes eléctricas, diseño de voz y datos, diseño de gas, en donde se emitieron observaciones al componente eléctrico y se sugirió al Municipio adelantar un estudio para analizar la carga actual que está consumiendo la construcción actual del centro administrativo Municipal debido que este estudio puede ayudar a evidenciar. Si es necesario repotenciar o cambiar el transformador, en caso de no realizar el estudio el Municipio deberá presentar los soportes que argumenten la carga que se usó para el estudio realizado. De la misma manera el Municipio no presentó Presupuesto, ni Cronograma, Interventoría, indico que no ha realizado la Validación correspondiente y que no cuenta con la documentación completa.

La Supervisión por parte del Ministerio del Interior no puede dar revisión a los estudios y diseños, y recuerda al Municipio que podría estar incurriendo en un presunto incumplimiento a las obligaciones. Pues debían entregar el 27 de noviembre de 2024. todo el paquete documental.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. Subsanar las observaciones emitidas a los estudios y diseños.
2. Realizar la entrega del componente de estudios y diseños en el menor tiempo posible.
3.
4.

- . En el Item *"2. Observaciones y/o conclusiones generales"*, se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Karen Ramírez
Cargo o Rol: Apoyo a la Supervisión
Área: SPS - Mininterior.
