Ingeniería & Visión S.A.S

Maceo, Abril 08 del 2025

Señores

ALCALDIA DE MACEO - ANTIOQUIA

SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL

INDEPORTES ANTIOQUIA
Interventoría

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SAMC-SP-001-2025

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL PARA EL CONTRATO NO SAMC-SP-001-2025

OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON INDEPORTES ANTIOQUIA

En virtud de mi función como representante legal de INGENIERIA Y VISION S.A.S, me permito solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del contrato SAMC-SP-001-2025, suscrito el MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA DE ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON INDEPORTES ANTIOQUIA

La solicitud obedece a causas ajenas a nuestra voluntad, en particular las siguientes condiciones:

- Durante el año 2025 en el transcurso del mes de marzo se presentó el paro minero (*Ilustración 1. Noticia de cierre vial. Fuente: www.viasdelnus.com.co; Ilustración 2. Paro minero. Fuente: Notivisión*) generando atrasos en material como el suministro y transporte de la teja de la cubierta, se han presentado bloqueos en las vías de acceso del municipio de Maceo. Estos eventos han afectado significativamente nuestro progreso y nos ha impedido obtener el material y recurso necesarios para continuar con el proyecto según lo previsto.

A pesar de nuestros esfuerzos para minimizar los retrasos, aún requerimos más tiempo para cumplir con todos los parámetros de la obra.




Ilustración 1. Noticia de cierre vial. Fuente: www.viasdelnus.com.co




Ilustración 2. Paro minero. Fuente: Notivisión

Maceo-Antioquia
Email: ingenieriayvisionsas@gmail.com
Cel: +57 314 597 74 32

- Condiciones climáticas adversas durante el año 2025 en el transcurso del mes de marzo y abril como se observa en las *gráficas 1, 2*, e ilustraciones 1 y 2 caracterizadas por constantes lluvias que han impedido el normal desarrollo de la actividad de **Mantenimiento cubierta "Teja PVC o Termoacústica", debidamente instalada Reemplazo del 70% de tejas, en mal estado(incluye elementos de fijación).** Dicha situación ha generado retrasos en la ejecución del proyecto, ya que las condiciones de seguridad y técnicas no han permitido llevar a cabo las actividades programadas en el tiempo establecido inicialmente.

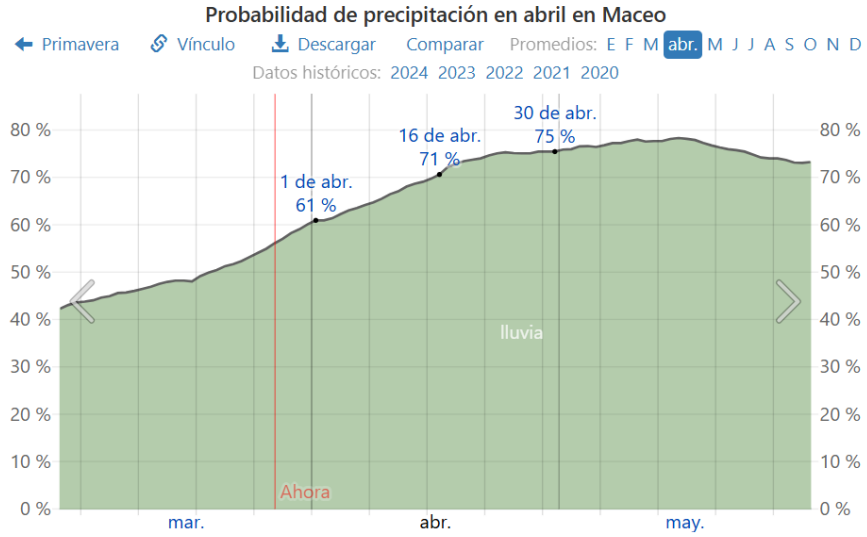

Grafica 1.Precipitacion de lluvias en Maceo 2025. Fuente: https://es.weatherspark.com/m/23411/4/Tiempo-promedio-en-abril-en-Maceo-Colombia

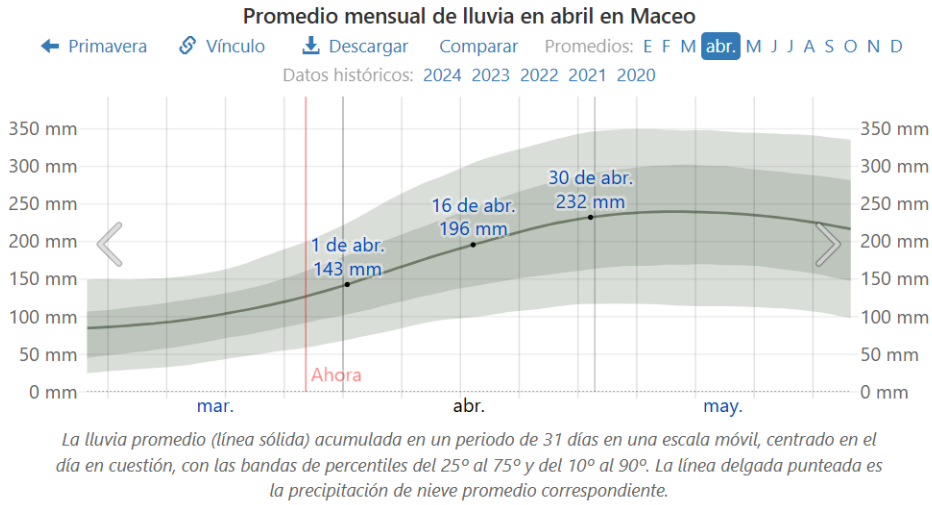

Grafica 2. Promedio mensual lluvias en Maceo. fuente: https://es.weatherspark.com/m/23411/4/Tiempo-promedio-en-abril-en-Maceo-Colombia

Maceo-Antioquia
Email: ingenieriayvisionsas@gmail.com
Cel: +57 314 597 74 32



lustración 3. Coliseo durante fuerte lluvia. fuente: propia



Ilustración 4. Interior del coliseo durante fuerte lluvia, canoa desbordada. Fuente: propia


Maceo-Antioquia
Email: ingenieriayvisionsas@gmail.com
Cel: +57 314 597 74 32

En virtud de lo anterior, solicitamos una prórroga de **20 días hábiles**, con el fin de culminar adecuadamente los trabajos y garantizar la correcta ejecución del contrato, conforme a las especificaciones establecidas.

Adjuntamos reportes climáticos que evidencian la situación descrita.

Agradecemos su comprensión y gestión para la aprobación de esta solicitud. Quedamos atentos a sus comentarios y a la notificación formal de su decisión.

Cordialmente,



_____

INGENIERIA & VISION S.A.S
REPRESENTANTE: VICTOR HUGO SANCHEZ TEJADA
C.C:
E-mail: ingenieriayvisionsas@gmail.com
Teléfono: +57 314 597 74 32
