ACTA PARCIAL N°22

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	23	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	22/04/2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	1784	FECHA : (dd/mm/aa)	27/08/2021
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II	SECOP II: LPO-2021-043
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		NIT:	901.505.619-5
VALOR INICIAL:		$ 46.209.359.460,00		PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		2299/20/05/2021 - 2015/27/04/2021		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	10848/05/10/2021 - -10849/05/10/2021 -
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		JULIO CESAR GALLO ORTIZ		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	RESOLUCIÓN No. 004
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		direccion.infraestructura@tolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		12/10/2021		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	26/10/2021

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)		BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO	ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INGECON S.A	822.000.138-1	25%
ANDCOL SAS	901.524.202-9	25%
CONSTRUCTORA FG SA	800.209.530-3	25%
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ	79946569	25%

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica)

(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	CO1.CTRMOD.6792742	15/10/2021	ACTA MODIFICATORÌA N° 001 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021	N/A
ACTA ADICIONAL N°001	CO1.CTRMOD.8145504	21/04/2022	SE REQUIERE ADICIONAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN TRES MESES	N/A
ACTA ADICIONAL N°002	CO1.CTRMOD.8787257	21/07/2022	LA SECRETARIA EJECUTORA SOLICITA MODIFICACION, PARA PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN SEIS (6) DÍAS CALENDARIO, PARA UN PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (9) MESES Y SEIS (6)DIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE FINALIZACION EL 31 DE JULIO DE 2022	N/A
N/A	CO1.CTRMOD.8908427	4/08/2022	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICATORIA CON EL FIN DE CORRER EL RELOJ EN LA FECHA DE TERMINACION DEL ACTO CONTRACTUAL	N/A

ACTA ADICIONAL N°003	CO1.CTRMOD. 8918677	5/08/2022	La Secretaría ejecutora remite solicitud de prórroga por 148 días calendario, quedando como plazo total de ejecución de 9 meses y 5 días; y fecha de finalización el 31/12/2022	N/A
ACTA ADICIONAL N°004	CO1.CTRMOD. 9167012	23/11/2022	ACTA ADICIONAL No 004 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021	26/03/2023
ACTA ADICIONAL N°005	CO1.CTRMOD. 9802923	23/11/2022	Que por error de digitación en la minuta del ACTA ADICIONAL N° 004 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 se omitió incluir la descripción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual es el siguiente:	N/A
ACTA N° 6 ACLARATORIA AL ACTA MODIFICATORIA N°5	CO1.CTRMOD. 9890066	30/11/2022	Que por error de digitación en el ACTA MODIFICATORIA N° 05 DEL CONTRATO N°. 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 en 01) MODIFICATORIA no se afectaron de manera correcta los Certificados de Disponibilidad Presupuestal	N/A
N/A	CO1.CTRMOD. 9929073	2/12/2022	SE HACE NECESARIA LA PRESENTE MODIFICATORIA, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ADICION ANTERIOR, NO SE REFLEJO EL VALOR TOTAL A AFECTAR EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	N/A
ACTA ADICIONAL N°007	CO1.CTRMOD. 11312028	29/05/2023	SE REQUIERE PRORROGAR EN DOS MESES EL PLAZO DEL CONTRATO	N/A
RESOLUCIÓN 154		15/05/2023	Por medio del cual se sustituye la imputacion presupuestal del contrato de obra	15/05/2023
ACTA ADICIONAL N°008	CO1.CTRMOD. 12021823	28/07/2023	SE REQUIERE ADICIONAR EN DOS (2) MESES EL PRESENTE CONTRATO SE ANEXA SOLICITUD, ACTA DE INVIAS Y ACTA	N/A
ACTA No. 8 Modificatoria	CO1.CTRMOD. 12232576	10/08/2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MODIFICA FORMA DE PAGO	N/A
ACTA NO. 10 Aclaratoria	CO1.CTRMOD. 12688131	22/09/2023	Aclárese que el número del acta de fecha 10 de agosto de 2023 por medio de la cual se modificó la forma de pago del presente contrato es la N°9.	N/A
ACTA NO. 11 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 12796035	27/09/2023	Desmontaje y traslado de estructuras metálicas:El contrato de obra incluye el apartado contractual titulado "CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, Ítem 4: Desmontaje y traslado de estructuras	N/A
ACTA NO. 12 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 13297150	31/10/2023	SE REQUIERE PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO	31/10/2023
ACTA NO. 13	CO1.CTRMOD. 13805846	30/11/2023	SE REQUIERE PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO	N/A
ACTA NO. 14	CO1.CTRMOD. 14255624	28/12/2023	El ordenador y el supervisor solicitan prorrogar en 3 meses y adicionar $3.152.777.269,79 teniendo como fecha próxima de finalizacion el 31 de marzo de 2024	30/01/2024
ACTA NO. 15	CO1.CTRMOD. 14288189	29/12/2023	Que por error en la elaboración del acta No. 014 prorroga No. 0010 y adición al contrato de obra No. 1784 del 27 de agosto de 2021, se transcribió de forma incorrecta el valor a adicionar, por ello se hace necesario, aclarar que el valor a adicionar corresponde a TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($3.152.777.269,79)	N/A
N/A	CO1.CTRMOD. 15476122	6/05/2024	Se ajusta fecha de Terminación, según acta de reinicio	N/A
ACTA NO. 16	CO1.CTRMOD. 16037221	5/07/2024	secretaria ejecutora raliza prorroga	N/A
ACTA NO. 17	CO1.CTRMOD. 16518050	30/08/2024	secretataria de infraestructura realiza prorroga	N/A
ACTA NO. 18	CO1.CTRMOD. 16814321	30/09/2024	INFRAESTRUCTURA,REALIZA ADICION Y PRORROGA	30/09/2024
Acta N. 19	CO1.CTRMOD. 16819013	30/09/2024	nte como NIT 900.505.619-5, siendo el correcto NIT 901.505.619-5. Por lo tanto, se solicita realizar la ac	N/A
Acta N. 20	CO1.CTRMOD. 17849491	CO1.CTRMOD.178 49491	SE REALIZO PRORROGA	N/A
Acta N. 21	CO1.CTRMOD. 18499281	14/03/2025	SE REALIZA PRORRIGA DE 15 DIAS CALENDARIO	N/A
RESOLUCIÓN 231		21/10/2024	Por medio del cual se sustituye la imputacion presupuestal del contrato de obra	21/10/2024
RESOLUCIÓN No. 004		13/01/2025	Reasignacion de supervision	13/01/2025

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
ACTA ADICIONAL N°001	CO1.CTRMOD. 8145504	21/04/2022		3 MESES		21/04/2022
ACTA ADICIONAL N°002	CO1.CTRMOD. 8787257	21/07/2022		6 DÍAS CALENDARIO		21/07/2022
ACTA ADICIONAL N°003	CO1.CTRMOD. 8918677	5/08/2022		148 DIAS CALENDARIO		5/08/2022
ACTA ADICIONAL N°004	CO1.CTRMOD. 9167012	21/11/2022	$ 11.063.040.907,84	5 MESES	16806/7060 y 16808/5376	21/11/2022
ACTA ADICIONAL N°007	CO1.CTRMOD. 11312028	29/05/2023	$ -	2 MESES		24/11/2022
RESOLUCIÓN 154		15/05/2023	$ -		5891 y 3694	15/05/2023
ACTA ADICIONAL N°008	CO1.CTRMOD. 12021823	28/07/2023	$ -	2 MESES		28/07/2023
ACTA NO. 11 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 12796035	27/09/2023	$ -	1 MES Y 3 DIAS		27/09/2023
ACTA NO. 12 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 13297150	31/10/2023	$ -	1 MES		31/10/2023
ACTA NO. 13 PRORROGA	CO1.CTRMOD. 13805846	30/11/2023	$ -	1 MES Y 1 DIA		30/11/2023

ACTA NO. 14 PRORROGA Y ADICION	CO1.CTRMOD. 14255624	28/12/2023	$ 3.152.777.269,79	3 MESES	CDP´S 7785, 7786, 7787 Y RP´S 16998, 16999, 17000	30/01/2024
ACTA NO. 16	CO1.CTRMOD. 16037221	5/07/2024		2 MESES		N/A
ACTA NO. 17	CO1.CTRMOD. 16518050	30/08/2024		23 DIAS		N/A
ACTA NO. 18	CO1.CTRMOD. 16814321	30/09/2024	$ 8.888.861.501,13	3 MESES Y 1 DIA	CDP 4678 Y RP 11063	21/10/2024
RESOLUCIÓN 231		21/10/2024	$ -	-	13614 y 13615	21/10/2024
Acta N. 20	CO1.CTRMOD. 17849491	CO1.CTRMOD.178 49491		2 MESES Y 15 DIAS		N/A
Acta N. 21	CO1.CTRMOD. 18499281	45730		15 DIAS		N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
29/07/2022	N°01	29/07/2022		3/08/2022	N°01	3/08/2022
29/01/2024	N°02	29/01/2024		6/05/2024	N°02	6/05/2024

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	01-11-2024 al 22-03-2025	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	CHAPARRAL
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FEV-26	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	16/04/2025

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Planilla Juan Camilo Silva: 7953986234, 79946569, 79946569, 79946569	MES DE COTIZACIÓN:	01-11-2024 al 22-03-2025
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	07/04/2025	MES DE COTIZACIÓN:	certificación de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales pagados por la compañía durante los 6 meses anteriores a esta certificación

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE DE LA OBRA:	OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	SI
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ 60.425.177.637,63
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	N/A
EDIFICACIÓN	$ -	N/A
MEJORAS	$ -	N/A
OTROS _____	$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03 - 38.24.2402.0600.01 - 2.3.2.02.02.005 - 0531	11063		$4.840.291.986,50
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			$ 4.840.291.986,50

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 4.840.291.986,50
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 4.840.291.986,50
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 4.840.291.986,50

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ANTICIPO	$ -	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	$ -	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	$ 13.862.807.838,00	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ 13.862.807.838,00
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ 13.862.807.838,00	$ 13.862.807.838,00

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 46.209.359.460,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ 23.104.679.678,76	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 13.862.807.838,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 47.143.539.949,52
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 4.840.291.986,50
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 3.467.399.364,74
SUMAS IGUALES	**$ 69.314.039.138,76**	**$ 69.314.039.138,76**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	69000002008

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) JULIO CESAR GALLO ORTIZ

FIRMA(s):

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" **EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"**

11. Consultar oportunamente y por escrito a la Secretaría de Infraestructura y hábitat, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos de la obra. Los cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista.	CUMPLE			
12. Hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, formaletas, o materiales similares que le pertenezcan o que se haya usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el DEPARTAMENTO realizará los trabajos y cargará su costo al contratista, desmontando su valor de la cuenta final.	CUMPLE			
13. Revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la obra y ordenará la remoción de cualquier parte o elemento de construcción que no cumpla con lo estipulado en las cantidades de obra o especificaciones consignadas en las condiciones para contratar.	CUMPLE	Se evidencia en los informes mensuales		
14. Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripción de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realización de las actividades propuestas. (Las fotos deberán tener fecha en la que se tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregará en medio físico y magnético en CD ROM. 15. Revisar dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto.	CUMPLE	Se evidencia registro fotografico en los informes mensuales		
15. Cumplir dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto.	CUMPLE			
16. Colocar avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas o a las cosas.	CUMPLE	Registros fotograficos		
17. Utilizar personal idóneo y experimentado en la ejecución de la obra.	CUMPLE	INFORME		
18. Todo el personal que participe en las actividades que refiera la ejecución de las mismas en altura, deberá estar certificado para la realización de trabajo en alturas vigente en el momento de la realización de la actividad.	CUMPLE			
19. Instalar una valla informativa según especificaciones del supervisor e interventor, en un tramo de la vía, en la que se señale en sus dos caras: objeto del contrato, plazo de ejecución y valor del mismo.	CUMPLE	Se instaló valla		
20. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el interventor y supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato.	CUMPLE	Reposa en la oficina de contratacion		
21. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	CUMPLE			
22. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales), El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría.	CUMPLE			
23. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.	CUMPLE	Reposa en la oficina de contratacion		
24. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantía.				

25. Presentar informe técnico al supervisor e interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago.	CUMPLE	Se evidencia en los informes mensuales		
26. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.	CUMPLE			
27. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, este último cuando corresponda.	CUMPLE	Se evidencia en las planillas de pago del personal a cargo del contratista		
28. El CONTRATISTA debe presentar, además de los informes que le solicite expresamente el interventor y/o supervisor, los siguientes informes: a) Informes de avance: Debe contener debidamente aprobados por la interventoría el avance de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo toda la documentación técnica, a saber, Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	CUMPLE	INFORME		
29. El CONTRATISTA, entregara al interventor, Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y duración de cada una de las actividades, programación de los trabajos que incluya todas las actividades, flujo mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación lógica con la obra a recibir por interventoría, durante el mismo período, programa de suministros detallados, programa de equipos.	CUMPLE			
30. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el interventor y Supervisor o la Entidad Contratante.	CUMPLE			
31. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra, interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante.	CUMPLE	Se evidencia en los informes mensuales		
32. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos y/o licencias necesarias en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público.	CUMPLE			
33. Reintegrar al Departamento los excedentes y los saldos que no llegaran a ejecutar parcialmente, este debe reintegrarlo al tesoro del Departamento del Tolima.	CUMPLE			

34. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO para el cumplimiento del objeto del presente contrato y reintegrar al Departamento los dineros que no se ejecuten en el desarrollo del contrato y los rendimientos financieros que estos generen.	CUMPLE	Se presenta certificacion banacaria		
35. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas.	CUMPLE			
36. El contratista debe dar estricto cumplimiento a las políticas de inclusión de genero motivadas por el INSTITUTO.	CUMPLE			
37. Garantizar e implementar los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente.	CUMPLE			
38. Deberá garantizar durante la ejecución del contrato el desarrollo de actividades, procedimientos y medidas necesarias para el cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno Nacional.	CUMPLE			
39. El contratista queda obligado a cumplir cabalmente con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO "INVIAS", Gobernación del Tolima o terceros por esta causa.	CUMPLE			
40. El contratista se obliga a mantener al INSTITUTO "INVIAS" y a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecución del contrato.	CUMPLE			
41. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato.				

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.	1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernacion mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual	Informes de Supervisión	Informes de Supervisión	N/A

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : JULIO CESAR GALLO ORTIZ

FIRMA: _____

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2800616
Número del Contrato	1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021
Versión del contrato	26
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	26/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	22 días de tiempo transcurrido *(30/03/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	15 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	Sí No
Fecha de inicio de liquidación	12/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Identificación Entidad contratante

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuer
CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	6900000200

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BENJAMIN FIGUEROA MOLINA* **Fecha de aprobación:** *6/09/2021 3:27:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Claudia Paola Muñoz Barreto* **Fecha de aprobación:** *9/09/2021 3:35:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2800616_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2800616_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Número del proceso	LP0-2021-043 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Descripción	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Duración del contrato	38 (Meses)
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Título de la oferta	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	69.314.039.138,76 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato			
% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Pago de salarios			
% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24 días de tiempo transcurrido *(28/03/2025 12:00:00 PM(UTC-(*
Estabilidad y calidad de la obra			
% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Calidad del servicio			
% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

% del valor de la oferta	5

Fecha límite para entrega de garantías: 31/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 30/12/2024 5:36:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.12877127	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	31.708.070.202,27 COP	Seguros mundial	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogot Quito)*
CO1.WRT.7449211	Seriedad de la oferta		4.911.999.889 COP	-	4/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá*

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario: LPO-2021-042

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima

Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué

País COLOMBIA

Departamento Tolima

Municipio Ibagué

Dirección: carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima

Código postal: 57

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	COLOMBIA > Tolima > Chaparral

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2800616

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario
1	72141000	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1,00	UN		46.209.359.460,00
1	72141000	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1,00	UN		11.063.040.907,84
1	72141000	Contratar la obra de mejoramiento de la vía chaparral rioblanco	1,00	UN		3.152.777.269,79
4	72141000	ADICION	1,00	UN		8.888.861.501,13

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
MINUTA CONTRATO CHAPARRAL-RIOBLANCO.pdf	MINUTA CONTRATO CHAPARRAL-RIOBLANCO.pdf
ACTA MODIFICATORIA No.001 CONTRATO CHAPARRAL-RIOBLANCO.pdf	ACTA MODIFICATORIA No.001 CONTRATO CHAPARRAL-RIOBLANCO.pdf
CVCH 01 ACUERDO CONSORCIAL FX3_211025_101149 (firm_221122_194502.pdf	CVCH 01 ACUERDO CONSORCIAL FX3_211025_101149 (firm_221122_194

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? Sí No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	38.211.641
Supervisor	FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	93206130

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA	9/09/2021 3:35:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA PAOL
Expenditure Approver	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO	9/09/2021 3:35:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA PAOL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	60.425.177.637,63

Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	8.888.861.501,13
Total	69.314.039.138,76

Código BPIN 2020004730049 **Año de vigencia** 2025

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecut
☐	2015	CDP	No se ha iniciado	15.089.359.460 COP	15.089.359.460 COP	00-00-00
☐	2299	CDP	No se ha iniciado	31.120.000.000 COP	31.120.000.000 COP	00-00-00
☐	7060	CDP	No se ha iniciado	8.152.400.371,84 COP	8.152.400.371,84 COP	00-00-00
☐	5376	CDP	No se ha iniciado	2.910.640.540 COP	2.910.640.536 COP	00-00-00
☐	7785	CDP	No se ha iniciado	2.152.777.269,79 COP	2.152.777.269,79 COP	00-00-00
☐	7786	CDP	No se ha iniciado	521.688.027,87 COP	521.688.027,87 COP	00-00-00
☐	7787	CDP	No se ha iniciado	478.311.972,13 COP	478.311.972,13 COP	00-00-00
☐	4678	CDP	No se ha iniciado		8.888.861.501,13 COP	00-00-00

Saldo de CDP 60.425.177.641,63 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 60.425.177.637,63 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Pos
☐	10848	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.120.000.000 COP	31.120.000.000 COP	0 COP	-
☐	10849	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.089.359.460 COP	15.089.359.460 COP	-	-
☐	16806	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.152.400.371,84 COP	8.152.400.371,84 COP	-	-
☐	16808	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.910.640.536 COP	2.910.640.536 COP	-	-

Saldo de compromisos CDP 57.272.400.367,84 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 57.272.400.367,84 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje	Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
21 INFOME SUPERVISION - 1784.pdf	21 INFOME SUPERVISION - 1784.pdf
21. FACTURA FEV25 - 1784.pdf	21. FACTURA FEV25 - 1784.pdf
21. INFORME DETALLADO SUPERVISOR - 1784.pdf	21. INFORME DETALLADO SUPERVISOR - 1784.pdf
21. SEGURIDAD SOCIAL - 1784.pdf	21. SEGURIDAD SOCIAL - 1784.pdf
ACTA DE INICIO 1784-21.pdf	ACTA DE INICIO 1784-21.pdf
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES 3 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES 3 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf
Acta Modificaciòn de Cantidades 1.pdf	Acta Modificaciòn de Cantidades 1.pdf
Acta Modificaciòn de Cantidades 2.pdf	Acta Modificaciòn de Cantidades 2.pdf
ACTA MODIFICATORIA 1784-21.pdf	ACTA MODIFICATORIA 1784-21.pdf
ACTA PARCIAL 10.pdf	ACTA PARCIAL 10.pdf
ACTA PARCIAL 11.pdf	ACTA PARCIAL 11.pdf
ACTA PARCIAL 6 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL 6 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf
ACTA PARCIAL 7 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL 7 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf
ACTA PARCIAL 8 CHAPARRAL RIO Parte 1.pdf	ACTA PARCIAL 8 CHAPARRAL RIO Parte 1.pdf
ACTA PARCIAL 8 CHAPARRAL RIO Parte 2.pdf	ACTA PARCIAL 8 CHAPARRAL RIO Parte 2.pdf
ACTA PARCIAL 9.pdf	ACTA PARCIAL 9.pdf
Acta parcial de Obra 2 No chaparral-Rio blanco.pdf	Acta parcial de Obra 2 No chaparral-Rio blanco.pdf
ACTA PARCIAL DE OBRA 001.rar	ACTA PARCIAL DE OBRA 001.rar
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 CHAPARRAL RIO BLANCO.pdf
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 CHAPARRAL.pdf	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 CHAPARRAL.pdf
ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 CHAPARRAL.pdf	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 CHAPARRAL.pdf
ACTA PARCIAL DE OBRA N°5 CHAPARRAL.pdf	ACTA PARCIAL DE OBRA N°5 CHAPARRAL.pdf
Acta Parcial N 17 Chaparral tomo 01.pdf	Acta Parcial N 17 Chaparral tomo 01.pdf
Acta Parcial N 17 Chaparral tomo 02.pdf	Acta Parcial N 17 Chaparral tomo 02.pdf
ACTA PARCIAL Nº 12 CHAPARRAL - RIO BLANCO_compressed.pdf	ACTA PARCIAL Nº 12 CHAPARRAL - RIO BLANCO_compressed.pdf
ACTA PARCIAL Nº 13 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL Nº 13 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf
ACTA PARCIAL Nº 14 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL Nº 14 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf
ACTA PARCIAL Nº 15 CHAPARRAL - RIO BLANCO TOMO 1.pdf	ACTA PARCIAL Nº 15 CHAPARRAL - RIO BLANCO TOMO 1.pdf
ACTA PARCIAL Nº 15 CHAPARRAL - RIO BLANCO TOMO 2.pdf	ACTA PARCIAL Nº 15 CHAPARRAL - RIO BLANCO TOMO 2.pdf
ACTA PARCIAL Nº 16 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 1.pdf	ACTA PARCIAL Nº 16 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 1.pdf
ACTA PARCIAL Nº 16 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 2.pdf	ACTA PARCIAL Nº 16 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 2.pdf
ACTA PARCIAL Nº 18 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 1.pdf	ACTA PARCIAL Nº 18 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 1.pdf
ACTA PARCIAL Nº 18 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 2.pdf	ACTA PARCIAL Nº 18 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 2.pdf

ACTA PARCIAL Nº 19 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 1.pdf	ACTA PARCIAL Nº 19 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 1.pdf
ACTA PARCIAL Nº 19 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 2.pdf	ACTA PARCIAL Nº 19 CHAPARRAL - RIO BLANCO tomo 2.pdf
ACTA PARCIAL Nº 20 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL Nº 20 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf
ACTA PARCIAL Nº 21 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf	ACTA PARCIAL Nº 21 CHAPARRAL - RIO BLANCO.pdf
ACTUALIZACION DE POLIZAS 1784-21.pdf	ACTUALIZACION DE POLIZAS 1784-21.pdf
ACTUALIZACION DE POZAS 1784-21.pdf	ACTUALIZACION DE POZAS 1784-21.pdf
LEGALIZACION 1784-2021_1.PDF	LEGALIZACION 1784-2021_1.PDF
LEGALIZACION 1784-21.pdf	LEGALIZACION 1784-21.pdf
LEGALIZACION ADICIONAL 1784-2022.pdf	LEGALIZACION ADICIONAL 1784-2022.pdf
Legalizacion contrato 1784.pdf	Legalizacion contrato 1784.pdf
RESOLUCION 004 DE 2025.pdf	RESAOLUCION 004 DE 2025.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Ver
CO1.CTRMOD.18499281	Modificar el contrato	14/03/2025 10:22 AM *(UTC -5 horas)*	14/03/2025 11:52 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	26
CO1.CTRMOD.17849491	Modificar el contrato	27/12/2024 7:36 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2024 12:17 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	25
CO1.CTRMOD.16819013	Modificar el contrato	30/09/2024 2:17 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 4:02 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	24
CO1.CTRMOD.16814321	Modificar el contrato	30/09/2024 8:14 AM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 9:48 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	23
CO1.CTRMOD.16518050	Modificar el contrato	28/08/2024 8:57 PM *(UTC -5 horas)*	30/08/2024 5:39 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	22
CO1.CTRMOD.16037221	Modificar el contrato	5/07/2024 11:43 AM *(UTC -5 horas)*	5/07/2024 1:05 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	21
CO1.CTRMOD.15476122	Modificar el contrato	6/05/2024 3:23 PM *(UTC -5 horas)*	6/05/2024 4:41 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	20
CO1.CTRMOD.15472186	Reactivar el contrato	6/05/2024 11:10 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2024 3:11 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	19
CO1.CTRMOD.14582192	Suspender el contrato	29/01/2024 7:58 PM *(UTC -5 horas)*	30/01/2024 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	19
CO1.CTRMOD.14288189	Modificar el contrato	29/12/2023 10:23 AM *(UTC -5 horas)*	29/12/2023 10:45 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	19
CO1.CTRMOD.14255624	Modificar el contrato	28/12/2023 1:38 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2023 3:02 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	18
CO1.CTRMOD.13805846	Modificar el contrato	30/11/2023 9:02 AM *(UTC -5 horas)*	30/11/2023 11:08 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	17
CO1.CTRMOD.13297150	Modificar el contrato	31/10/2023 8:52 AM *(UTC -5 horas)*	31/10/2023 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	16
CO1.CTRMOD.12796035	Modificar el contrato	27/09/2023 3:46 PM *(UTC -5 horas)*	27/09/2023 8:53 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	
CO1.CTRMOD.12688131	Modificar el contrato	20/09/2023 11:59 AM *(UTC -5 horas)*	22/09/2023 12:16 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	14
CO1.CTRMOD.12232576	Modificar el contrato	10/08/2023 10:22 AM *(UTC -5 horas)*	10/08/2023 4:16 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	13
CO1.CTRMOD.12021823	Modificar el contrato	28/07/2023 11:20 AM *(UTC -5 horas)*	28/07/2023 4:23 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	12
CO1.CTRMOD.11312028	Modificar el contrato	29/05/2023 4:51 PM *(UTC -5 horas)*	29/05/2023 7:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	11
CO1.CTRMOD.9929073	Modificar el contrato	2/12/2022 10:33 AM *(UTC -5 horas)*	2/12/2022 2:40 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	10
CO1.CTRMOD.9890066	Modificar el contrato	30/11/2022 10:40 AM *(UTC -5 horas)*	30/11/2022 12:14 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	9
CO1.CTRMOD.9802923	Modificar el contrato	23/11/2022 5:28 PM *(UTC -5 horas)*	23/11/2022 7:17 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	8
CO1.CTRMOD.9167012	Modificar el contrato	6/09/2022 10:34 AM *(UTC -5 horas)*	23/11/2022 10:03 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	7
CO1.CTRMOD.8918677	Modificar el contrato	5/08/2022 9:54 AM *(UTC -5 horas)*	5/08/2022 2:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	6
CO1.CTRMOD.8908427	Modificar el contrato	3/08/2022 5:19 PM *(UTC -5 horas)*	4/08/2022 11:42 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	5
CO1.CTRMOD.8886169	Reactivar el contrato	1/08/2022 10:26 AM *(UTC -5 horas)*	3/08/2022 5:19 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	4
CO1.CTRMOD.8868874	Suspender el contrato	29/07/2022 3:42 PM *(UTC -5 horas)*	29/07/2022 4:41 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	4
CO1.CTRMOD.8787257	Modificar el contrato	21/07/2022 11:59 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2022 3:19 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	4
CO1.CTRMOD.8145504	Modificar el contrato	21/04/2022 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	26/04/2022 10:39 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	3
CO1.CTRMOD.6792742	Modificar el contrato	30/09/2021 9:57 AM *(UTC -5 horas)*	15/10/2021 11:02 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	2

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO DE OBRA N°1784 DE 2021	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	46,209,359,460
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%)	$	13,862,807,838
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 22	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL, R.L. (S) JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ.	VALOR ADICIÓN 1	$	11,063,040,907.84
		VALOR ADICIÓN 2	$	3,152,777,269.79
	INTERVENTORIA: CONSORCIO IC & CB NIT. 901.521.515-5	VALOR ADICIÓN 3	$	8,888,861,501.13
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	69,314,039,138.76
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1570 DE 2021	FECHA DE INICIO	martes, 26 de octubre de 2021	
22/3/2025	SUPERVISOR: ING. JUIO CESAR GALLO ORTIZ	PLAZO: 38.1 MESES	domingo, 30 de marzo de 2025	

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS POR ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 15			ACTA PARCIAL DE OBRA N°22		VALORES ACUMULADOS	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFIC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VÍA														
1	CAPITULO 1. EXPLANACIONES		Capitulo 1. Explanaciones											
1	1P		Localización y replanteo	Ha	7.00	$ 1,150,000.00	$ 8,050,000	22.41	$ 1,150,000.00	$ 25,771,500.00		$ -	20.46	$ 23,529,000.00
2	201.2		Demolición de Estructuras	m3	56.00	$ 230,000.00	$ 12,880,000	812.64	$ 230,000.00	$ 186,907,200.00	13.32	$ 3,063,600.00	812.64	$ 186,906,629.05
3	210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	13566.00	$ 95,000.00	$ 1,288,770,000	0.00	$ 95,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4	210.2.2		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	27132.00	$ 16,500.00	$ 447,678,000	19026.01	$ 16,500.00	$ 313,929,165.00	7487.00	$ 123,535,500.00	19026.00	$ 313,929,000.00
5	211.1		Remoción de Derrumbes	m3	450.00	$ 13,500.00	$ 6,075,000	25039.00	$ 13,500.00	$ 338,026,500.00		$ -	20309.00	$ 274,171,450.00
6	2P		Conformación de sitios de disposicion de sobrantes	m3	50873.00	$ 6,000.00	$ 305,238,000	89392.66	$ 6,000.00	$ 536,355,960.00		$ -	76344.06	$ 458,064,360.00
7	3P		Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (incluye	m3	26600.00	$ 167,000.00	$ 4,442,200,000	45723.47	$ 167,000.00	$ 7,635,819,490.00	8813.00	$ 1,471,771,000.00	44546.99	$ 7,439,347,330.00
Subtotal							$ 6,510,891,000			$ 9,036,809,815.00		$ 1,598,370,100.00		$ 8,695,947,769.05
2	CAPITULO 2. BASES, SUBBASES Y AFIRMA		Capitulo 2. Bases, Subbases y Afirmados											
8	310.1		Conformacion de la calzada existente	m2	66500.00	$ 1,300.00	$ 86,450,000	153090.00	$ 1,300.00	$ 199,017,000.00	14353.00	$ 18,658,900.00	153090.00	$ 199,017,000.00
9	320.1		Subbase granular	m3	20249.00	$ 205,000.00	$ 4,151,045,000	556.10	$ 205,000.00	$ 114,000,500.00		$ -	556.10	$ 114,000,500.00
10	330.1		Base granular	m3	12642.00	$ 225,000.00	$ 2,844,450,000	11039.91	$ 225,000.00	$ 2,483,979,750.00	4121.30	$ 927,292,500.00	11039.90	$ 2,483,977,500.00
11			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido (separación de granulares)	m2		$ 12,000.00	$ -	24885.00	$ 12,000.00	$ 298,620,000.00	15855.00	$ 190,260,000.00	24885.00	$ 298,620,000.00
Subtotal							$ 7,081,945,000			$ 3,095,617,250.00		$ 1,136,211,400.00		$ 3,095,615,000.00
3	CAPITULO 3. PAVIMENTOS ASFALTICOS		Capitulo 3. Pavimentos Asfalticos											
12	420.1		Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	m2	44835.00	$ 4,000.00	$ 179,340,000	38107.00	$ 4,000.00	$ 152,428,000.00	14412.00	$ 57,648,000.00	37735.00	$ 150,940,000.00
13	421.3		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	44835.00	$ 3,500.00	$ 156,922,500	218.00	$ 3,500.00	$ 763,000.00		$ -	218.00	$ 763,000.00
14	450P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	5662.00	$ 1,050,000.00	$ 5,945,100,000	0.00	$ 1,050,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal							$ 6,281,362,500			$ 153,191,000.00		$ 57,648,000.00		$ 151,703,000.00
4	CAPITULO 4. ESTRUCTURAS PARA ESTAB		Capitulo 4. Estructuras para Estabilización de Taludes y Recuperación de Banca											
15	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	19360.00	$ 53,000.00	$ 1,026,080,000	27994.52	$ 53,000.00	$ 1,483,709,560.00		$ -	27937.10	$ 1,480,666,300.00
16	600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3	35.00	$ 115,000.00	$ 4,025,000	0.00	$ 115,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17	600.2.3P		Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	827.00	$ 83,000.00	$ 68,641,000	7.90	$ 83,000.00	$ 655,700.00		$ -	7.90	$ 655,700.00
18	610.2		Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	10500.00	$ 164,000.00	$ 1,722,000,000	13232.83	$ 164,000.00	$ 2,170,151,320.00		$ -	13209.66	$ 2,166,384,240.00
19	630.3		Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	1336.00	$ 980,000.00	$ 1,309,280,000	2875.45	$ 980,000.00	$ 2,817,941,000.00		$ -	2875.45	$ 2,817,937,496.50
20	621.1P		Caisaons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	1850.00	$ 2,800,000.00	$ 5,180,000,000	5457.17	$ 2,800,000.00	$ 15,280,076,000.00		$ -	5457.17	$ 15,280,066,874.41
21	630.4		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	4300.00	$ 920,000.00	$ 3,956,000,000	0.00	$ 920,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22	630.5		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	251.00	$ 700,000.00	$ 175,700,000	166.57	$ 700,000.00	$ 116,599,000.00		$ -	166.57	$ 116,599,000.00
23	630.7		Concreto clase G	m3	1200.00	$ 530,000.00	$ 636,000,000	6.40	$ 530,000.00	$ 3,392,000.00		$ -	6.40	$ 3,392,000.00
24	640.1		Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	358768.00	$ 8,000.00	$ 2,870,144,000	804021.25	$ 8,000.00	$ 6,432,170,000.00		$ -	804021.25	$ 6,432,170,000.00
25	673.2		Material Granular Drenante	m3	2800.00	$ 175,000.00	$ 490,000,000	39.00	$ 175,000.00	$ 6,825,000.00		$ -	39.00	$ 6,825,000.00
26	673.1.1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	19950.00	$ 12,000.00	$ 239,400,000	80.00	$ 12,000.00	$ 960,000.00		$ -	80.00	$ 960,000.00
27			Tubería perforada corrugada de 4"	m	0.00	$ 81,000.00	$ -	796.60	$ 81,000.00	$ 64,524,600.00		$ -	796.60	$ 64,524,600.00
28	681.1		Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1: recubrimiento de	m3	825.00	$ 350,000.00	$ 288,750,000	0.00	$ 350,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
29	674.1P		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	800	$ 245,000.00	$ 196,000,000	0.00	$ 245,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal							$ 18,162,020,000			$ 28,377,004,180.00		$ -		$ 28,370,181,210.91
5	CAPITULO 5. DRENAJES		Capitulo 5. Drenajes											
30	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	700.00	$ 57,000.00	$ 39,900,000	14086.05	$ 57,000.00	$ 802,904,850.00		$ -	12787.73	$ 727,780,510.25
31	600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3	10.00	$ 115,000.00	$ 1,150,000	73.01	$ 115,000.00	$ 8,396,150.00		$ -	73.01	$ 8,396,150.00
32	600.2.3P		Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	50.00	$ 83,000.00	$ 4,150,000	41.40	$ 83,000.00	$ 3,436,200.00		$ -	41.40	$ 3,436,200.00
33	610.2		Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	310.00	$ 179,000.00	$ 55,490,000	9961.90	$ 179,000.00	$ 1,783,180,100.00		$ -	8870.95	$ 1,587,900,050.00
34	630.4		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	150.00	$ 959,000.00	$ 143,850,000	30.22	$ 959,000.00	$ 28,980,980.00		$ -	30.22	$ 28,985,583.20
35			Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	0.00	$ 980,000.00	$ -	1138.55	$ 980,000.00	$ 1,115,779,000.00		$ -	1125.23	$ 1,102,725,400.00
36	630.5		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	75.00	$ 700,000.00	$ 52,500,000	203.55	$ 700,000.00	$ 142,485,000.00		$ -	203.55	$ 142,484,300.00
37	630.7		Concreto clase G	m3	246.00	$ 550,000.00	$ 135,300,000	36.50	$ 550,000.00	$ 20,075,000.00		$ -	36.50	$ 20,075,000.00
38	640.1		Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	8000.00	$ 8,100.00	$ 64,800,000	78166.85	$ 8,100.00	$ 616,951,485.00		$ -	74579.55	$ 604,094,355.00
39	661.1		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	225.00	$ 805,000.00	$ 181,125,000	0.00	$ 805,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
40	671.3P		Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo,	m3	680.00	$ 880,000.00	$ 598,400,000	0.00	$ 880,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
41	673.2		Material Granular Drenante	m3	350.00	$ 182,000.00	$ 63,700,000	4290.12	$ 182,000.00	$ 780,801,840.00		$ -	3334.02	$ 606,791,640.00
42	673.1.1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	3950.00	$ 12,000.00	$ 47,400,000	12033.00	$ 12,000.00	$ 144,396,000.00		$ -	12033.00	$ 144,396,000.00
43			Tubería de PVC perforada D=4"	m	0.00	$ 81,000.00	$ -	7078.00	$ 81,000.00	$ 573,318,000.00		$ -	5305.00	$ 429,705,000.00
44			Rellenos para estructuras con suelo	m3		$ 75,000.00	$ -	0.00	$ 75,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
45			Subbase granular	m3	0.00	$ 205,000.00	$ -	0.00	$ 205,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal							$ 1,387,765,000			$ 6,020,704,605.00		$ -		$ 5,406,750,188.45
6	CAPITULO 6. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		Capitulo 6. Señalización y Seguridad											
46	700.1		Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	21000.00	$ 2,800.00	$ 58,800,000	21938.00	$ 2,800.00	$ 61,426,400.00		$ -	11207.00	$ 31,379,600.00
47	700.3		Marca Vial con pintura en frio	m2	500.00	$ 47,800.00	$ 23,900,000	226.00	$ 47,800.00	$ 10,802,800.00		$ -	161.00	$ 7,695,800.00
48	701.1		Tacha Reflectiva	Und	1750.00	$ 14,000.00	$ 24,500,000	3029.00	$ 14,000.00	$ 42,406,000.00		$ -	1676.00	$ 23,464,000.00
49	710.1		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	Und	50.00	$ 625,000.00	$ 31,250,000	222.00	$ 625,000.00	$ 138,750,000.00		$ -	141.00	$ 88,125,000.00
50	720.1P		Señal Poste de referencia SI - 04	Und	7.00	$ 602,000.00	$ 4,214,000	0.00	$ 602,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
51	730.1		Defensa metalica	m	310.00	$ 273,000.00	$ 84,630,000	568.10	$ 273,000.00	$ 155,091,300.00		$ -	419.10	$ 114,414,300.00
52	730.2		Sección final	Und	25.00	$ 276,000.00	$ 6,900,000	16.00	$ 276,000.00	$ 4,416,000.00		$ -	16.00	$ 4,416,000.00
53	740.1		Captafaros	Und	130.00	$ 18,000.00	$ 2,340,000	166.00	$ 18,000.00	$ 2,988,000.00		$ -	104.00	$ 1,872,000.00
Subtotal							$ 236,534,000			$ 415,880,500.00		$ -		$ 271,366,700.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO DE OBRA N°1784 DE 2021	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	46,209,359,460
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%)	$	13,862,807,838
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 22	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL, R.L. (S) JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ.	VALOR ADICIÓN 1	$	11,063,040,907.84
		VALOR ADICIÓN 2	$	3,152,777,269.79
	INTERVENTORIA: CONSORCIO IC & CB NIT. 901.521.515-5	VALOR ADICIÓN 3	$	8,888,861,501.13
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	89,314,039,138.76
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1570 DE 2021	FECHA DE INICIO	martes, 26 de octubre de 2021	
22/3/2025	SUPERVISOR: ING. JUIO CESAR GALLO ORTIZ	PLAZO: 38.1 MESES	domingo, 30 de marzo de 2025	

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS POR ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 15			ACTA PARCIAL DE OBRA N°22		VALORES ACUMULADOS	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VÍA													
7	CAPITULO 7. TRANSPORTES	Capítulo 7. Transportes											
54	900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación.	M3-KM	14536.00	$ 1,050.00	$ 15,262,800	2196.54	$ 1,050.00	$ 2,306,367.00		$ -	2196.54	$ 2,306,367.00
55	900.2P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	M3-KM	439650.00	$ 1,350.00	$ 593,527,500	2396189.51	$ 1,350.00	$ 3,234,855,838.50		$ -	1708706.70	$ 2,306,754,042.52
56	900.3P	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM	313800.00	$ 1,550.00	$ 486,390,000	94167.00	$ 1,550.00	$ 145,958,850.00		$ -	94167.00	$ 145,958,850.00
Subtotal						$ 1,095,180,300			$ 3,383,121,055.50		$ -		$ 2,455,019,259.52
8	CAPITULO 8. OBRAS VARIAS	Capítulo 8. Obras Varias											
57	800.2	Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto	m	2000.00	$ 29,000.00	$ 58,000,000	2924.00	$ 29,000.00	$ 84,796,000.00		$ -	2804.00	$ 81,316,000.00
Subtotal						$ 58,000,000			$ 84,796,000.00		$ -		$ 81,316,000.00
9	TULO 9. NO PREVISTOS	Capítulo 9. No Previstos											
NP1	465.13	Demolición de la carpeta asfáltica	m3	0.00	$ 135,419.00	$ -	164.52	$ 135,419.00	$ 22,279,133.88		$ -	164.52	$ 22,279,133.88
NP2	671.3P	Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la	m3	0.00	$ 968,374.00	$ -	1910.53	$ 968,374.00	$ 1,850,107,578.22		$ -	1086.20	$ 1,051,847,838.80
NP3	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 28 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	0.00	$ 889,932.00	$ -	651.00	$ 889,932.00	$ 579,345,732.00		$ -	651.00	$ 579,345,732.00
NP4	683.50	Geodren vial	m2		$ 109,677.00	$ -	6525.80	$ 109,677.00	$ 715,730,166.60		$ -	4752.80	$ 521,272,845.60
NP5	802.40	Poda de la parte aérea de árboles tipo IV	Un	0.00	$ 60,270.00	$ -	37.00	$ 60,270.00	$ 2,229,990.00		$ -	37.00	$ 2,229,990.00
NP6	802.80	Poda de la parte radicular de árboles tipo IV	Un	0.00	$ 232,208.00	$ -	110.00	$ 232,208.00	$ 25,542,880.00		$ -	110.00	$ 25,542,880.00
NP7	683.10	Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada	m2	0.00	$ 30,089.00	$ -	2349.00	$ 30,089.00	$ 70,679,061.00		$ -	2349.00	$ 70,679,061.00
NP8	683.20	Geotextil de refuerzo tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada	m2	0.00	$ 37,497.00	$ -	2393.70	$ 37,497.00	$ 89,756,568.90		$ -	2393.70	$ 89,756,568.90
NP9	683.30	Geoceldа tipo HDPE 8" de fachada para muros de tierra estabilizada	m2	0.00	$ 90,866.00	$ -	2614.03	$ 90,866.00	$ 237,526,449.98		$ -	2577.92	$ 234,245,278.72
NP10	683.40	Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m3	0.00	$ 189,199.00	$ -	3820.29	$ 189,199.00	$ 722,795,047.71		$ -	3780.89	$ 715,340,607.11
NP11	741.13	Delineadores de curva horizontal SP-75 doble	Und	0.00	$ 858,663.00	$ -	155.00	$ 858,663.00	$ 133,092,765.00		$ -	52.00	$ 44,650,476.00
NP12	200.	Rocería y limpieza ancho max. 2m a lado y lado de la vía. y retiro material	Ha	0.00	$ 778,289.00	$ -	2.12	$ 778,289.00	$ 1,649,972.68		$ -	2.12	$ 1,649,972.68
NP13	200.1P	Limpieza alcantarillas Existentes	Un	0.00	$ 258,279.00	$ -	5.00	$ 258,279.00	$ 1,291,395.00		$ -	5.00	$ 1,291,395.00
NP14	200.2P	Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes	ml	0.00	$ 4,138.00	$ -	26100.00	$ 4,138.00	$ 108,001,800.00		$ -	14100.00	$ 58,345,800.00
NP21		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	m3	0.00	$ -	$ -	2925.70	$ 1,813,247.00	$ 5,305,016,747.90	$ 1,129.50	$ 2,048,062,486.50	2897.80	$ 5,254,427,156.60
NP22		Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo, con Fibra	M3		$ 1,127,205.00	$ -	570.14	$ 1,127,025.00	$ 642,562,033.50		$ -	439.10	$ 494,876,077.50
Subtotal									$ 10,507,607,322.37		$ 2,048,062,486.50		$ 9,167,781,413.79
SUBTOTAL VIA						$ 40,813,697,800.00			$ 61,074,731,727.87		$ 4,840,261,986.50		$ 57,695,880,541.72
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA													
CAPITULO 1. PRELIMINARES	CAPITULO 1. PRELIMINARES												
1	4P	Localización y replanteo puente	m2	9034.20	$ 2,000.00	$ 18,068,400.00	2271.89	$ 2,000.00	$ 4,543,780.00			2271.89	$ 4,543,780.00
Subtotal						$ 18,068,400.00			$ 4,543,780.00				$ 4,543,780.00
CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS													
2	200.2P	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	m2	4000.00	$ 20,000.00	$ 80,000,000.00	2271.89	$ 20,000.00	$ 45,437,800.00			2271.89	$ 45,437,800.00
3	201.2P	Demolición de estructuras de concreto reforzado	m3	88.00	$ 197,000.00	$ 17,336,000.00	59.43	$ 197,000.00	$ 11,707,710.00			59.43	$ 11,707,710.00
4	201.11	Desmontaje y traslado de estructuras metálicas	kg	97650.00	$ 5,000.00	$ 488,250,000.00	29270.00	$ 5,000.00	$ 146,350,000.00			29270.00	$ 146,350,000.00
5	220.1	Terraplen	m3	2465.00	$ 20,000.00	$ 49,300,000.00	2465.00	$ 20,000.00	$ 49,300,000.00			2465.00	$ 49,300,000.00
6	210.1.1	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales	m3	680.00	$ 14,000.00	$ 9,520,000.00	0.00	$ 14,000.00	$ -			0.00	$ -
Subtotal						$ 644,406,000.00			$ 252,795,510.00				$ 252,795,510.00
CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
7	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3	85.00	$ 980,000.00	$ 83,300,000.00	62.16	$ 980,000.00	$ 60,916,800.00			62.16	$ 60,916,800.00
8	640.1	Acero de refuerzo 420MPA	kg	7705.00	$ 8,000.00	$ 61,640,000.00	0.00	$ 8,000.00	$ -			0.00	$ -
9	330.1	Base granular clase A	m3	573.00	$ 182,000.00	$ 104,286,000.00	0.00	$ -	$ -			0.00	$ -
10	450.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC19	m3	40.00	$ 1,100,000.00	$ 44,000,000.00	0.00	$ 1,100,000.00	$ -			0.00	$ -
11	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1	m2	420.00	$ 4,000.00	$ 1,680,000.00	0.00	$ 4,000.00	$ -			0.00	$ -
12	673.1.2	Geotextil tipo T2400	m2	450.00	$ 12,000.00	$ 5,400,000.00	0.00	$ 12,000.00	$ -			0.00	$ -
13	230.1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	500.00	$ 112,000.00	$ 56,000,000.00	266.10	$ 112,000.00	$ 29,803,200.00			266.10	$ 29,803,200.00
14	810.1	Protección de taludes con bloques de césped	m2	1382.00	$ 18,000.00	$ 24,876,000.00	0.00	$ 18,000.00	$ -			0.00	$ -
15	311.1	Afirmado	m3	93.00	$ 128,000.00	$ 11,904,000.00	1495.39	$ 128,000.00	$ 191,409,920.00			1495.39	$ 191,409,920.00
Subtotal						$ 393,086,000.00			$ 282,129,920.00				$ 282,129,920.00
CAPITULO 4. ESTRUCTURAS ADICIONALES Y DRENAJES													
16	610.5	Rellenos con material filtrante	m3	67.00	$ 257,000.00	$ 17,219,000.00	0.00	$ 257,000.00	$ -			0.00	$ -
17	673.1.1	Geotextil tipo NT-2500	m2	310.00	$ 12,000.00	$ 3,720,000.00	0.00	$ 12,000.00	$ -			0.00	$ -
18	663.1.1P	Tubería de PVC perforada D=4"	m	44.00	$ 81,000.00	$ 3,564,000.00	159.60	$ 81,000.00	$ 12,927,600.00			159.60	$ 12,927,600.00
19	663.1.2P	Tubería de PVC D=1"	m	28.00	$ 45,000.00	$ 1,260,000.00	20.55	$ 45,000.00	$ 924,750.00			20.55	$ 924,750.00
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230.00	$ 57,000.00	$ 13,110,000.00	195.40	$ 57,000.00	$ 11,137,800.00			195.40	$ 11,137,800.00
21	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3	95.00	$ 75,000.00	$ 7,125,000.00	717.00	$ 75,000.00	$ 53,775,000.00			717.00	$ 53,775,000.00
22	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3	85.00	$ 984,000.00	$ 83,640,000.00	43.76	$ 984,000.00	$ 43,059,840.00			43.76	$ 43,059,840.00
23	630.6	Concreto resistencia 14MPA	m3	16.00	$ 643,000.00	$ 10,288,000.00	7.33	$ 643,000.00	$ 4,713,190.00			7.33	$ 4,713,190.00
24	640.1	Acero de refuerzo 420MPA	kg	7190.00	$ 8,000.00	$ 57,520,000.00	3299.46	$ 8,000.00	$ 26,395,680.00			3299.46	$ 26,395,680.00
Subtotal						$ 197,448,000.00			$ 152,933,860.00				$ 152,933,860.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO DE OBRA N°1784 DE 2021	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	46,209,359,460
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%)	$	13,862,807,838
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 22	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL. R.L. (S) JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ.	VALOR ADICIÓN 1	$	11,063,040,907.84
		VALOR ADICIÓN 2	$	3,152,777,269.79
	INTERVENTORIA: CONSORCIO IC & CB NIT. 901.521.515-5	VALOR ADICIÓN 3	$	8,888,861,501.13
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	89,314,039,138.76
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1570 DE 2021	FECHA DE INICIO	martes, 26 de octubre de 2021	
22/3/2025	SUPERVISOR: ING. JUIO CESAR GALLO ORTIZ	PLAZO: 38.1 MESES	domingo, 30 de marzo de 2025	

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS POR ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 15			ACTA PARCIAL DE OBRA N°22		VALORES ACUMULADOS	
Nº VÍA	ITEM DE PAGO	ESPECIFIC.	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 5. ESTRUCTURA PRINCIPAL														
25	630.3		Concreto resistencia 28MPA	m3	1.00	$ 984,000.00	$ 984,000.00	2.52	$ 984,000.00	$ 2,479,680.00			2.52	$ 2,479,680.00
26	630.3.1P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa	m3	79.00	$ 2,050,000.00	$ 161,950,000.00	7.31	$ 2,050,000.00	$ 14,985,500.00			7.31	$ 14,985,500.00
27	630.3.2P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de cuña de apoyo	m3	2.45	$ 1,380,000.00	$ 3,381,000.00	1.37	$ 1,380,000.00	$ 1,890,600.00			1.37	$ 1,890,600.00
28	630.3.3P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga diafragma intermedia	m3	10.83	$ 1,730,000.00	$ 18,735,900.00	0.00	$ 1,730,000.00	$ -			0.00	$ -
29	630.3.4P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa de aproximación	m3	30.66	$ 1,400,000.00	$ 42,924,000.00	13.29	$ 1,400,000.00	$ 18,606,000.00			13.29	$ 18,606,000.00
30	630.3.5P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de barrera de protección	m3	13.69	$ 1,320,000.00	$ 18,070,800.00	0.00	$ 1,320,000.00	$ -			0.00	$ -
31	630.3.6P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Mensula de apoyo	m3	4.95	$ 1,360,000.00	$ 6,732,000.00	0.00	$ 1,360,000.00	$ -			0.00	$ -
32	630.3.7P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga cabezal	m3	41.59	$ 1,550,000.00	$ 64,464,500.00	74.02	$ 1,550,000.00	$ 114,731,000.00			74.02	$ 114,731,000.00
33	630.3.8P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro espaldar	m3	16.40	$ 1,380,000.00	$ 22,632,000.00	14.24	$ 1,380,000.00	$ 19,651,200.00			14.24	$ 19,651,200.00
34	630.3.9P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro pantalla	m3	34.65	$ 1,520,000.00	$ 52,668,000.00	80.60	$ 1,520,000.00	$ 122,512,000.00			80.60	$ 122,512,000.00
35	630.3.10P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro aleta	m3	24.17	$ 1,490,000.00	$ 36,013,300.00	11.20	$ 1,490,000.00	$ 16,688,000.00			11.20	$ 16,688,000.00
36	630.3.11P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Tope sismico	m3	2.88	$ 1,350,000.00	$ 3,888,000.00	0.84	$ 1,350,000.00	$ 1,134,000.00			0.84	$ 1,134,000.00
37	630.3.12P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pila de cimentación, no incluye acero	m3	47.71	$ 1,430,000.00	$ 68,225,300.00	0.00	$ 1,430,000.00	$ -			0.00	$ -
38	621.1P		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pilote de concreto vaciado In Situ, de diametro 1,2m. (incluye excavación en roca bajo agua no incluye acero de refuerzo)	m3	78.00	$ 2,950,000.00	$ 230,100,000.00	150.00	$ 2,950,000.00	$ 442,500,000.00			150.00	$ 442,500,000.00
39	621.5.1		Concreto resistencia 28MPA para construcción de Camisa permanente de diametro exterior 1,5m . En concreto	m3	78.00	$ 1,175,000.00	$ 91,650,000.00	40.00	$ 1,175,000.00	$ 47,000,000.00			40.00	$ 47,000,000.00
40	630.6		Concreto resistencia 14MPA	m3	26.00	$ 642,000.00	$ 16,692,000.00	25.30	$ 642,000.00	$ 16,242,600.00			25.30	$ 16,242,600.00
41	630.1P		Concreto resistencia 35MPApara construcción de VIGA POSTENSADA	m3	92.00	$ 3,200,000.00	$ 294,400,000.00	0.00	$ 3,200,000.00	$ -			0.00	$ -
42	640.1		Acero de refuerzo 420mMPA	kg	108156.00	$ 8,000.00	$ 865,248,000.00	72263.48	$ 8,000.00	$ 578,107,840.00			72067.26	$ 576,538,080.00
43	663.1.3P		Tuberia de PVC D=4"	m	6.30	$ 80,000.00	$ 504,000.00	55.80	$ 80,000.00	$ 4,464,000.00			55.80	$ 4,464,000.00
44	663.1.2P		Tuberia de PVC D=1"	m	10.00	$ 45,000.00	$ 450,000.00	0.00	$ 45,000.00	$ -			0.00	$ -
45	663.1.1P		Tuberia de PVC Perforada D=4"	m	10.00	$ 81,000.00	$ 810,000.00	0.00	$ 81,000.00	$ -			0.00	$ -
46	673.1.1		Geotextil tipo NT-2500	m2	140.00	$ 12,000.00	$ 1,680,000.00	536.80	$ 12,000.00	$ 6,441,600.00			536.80	$ 6,441,600.00
47	632P		Baranda peatonal metálica (H=1,15m)	m	70.00	$ 672,000.00	$ 47,040,000.00	0.00	$ 672,000.00	$ -			0.00	$ -
48	5P		Platina de acero laminada ASTM A36(370mmX430mmX1/8")	u	32.00	$ 125,000.00	$ 4,000,000.00	0.00	$ 125,000.00	$ -			0.00	$ -
49	642.1P		Elastometro D60 (450mmX400mm)	u	0.80	$ 595,000.00	$ 476,000.00	6.00	$ 595,000.00	$ 3,570,000.00			6.00	$ 3,570,000.00
50	642.2P		Elastometro D60 (300mmX250mm)	u	0.05	$ 545,000.00	$ 27,250.00	4.00	$ 545,000.00	$ 2,180,000.00			4.00	$ 2,180,000.00
51	6P		Cable postensado (10 torones)	m	280.20	$ 232,000.00	$ 65,006,400.00	0.00	$ 232,000.00	$ -			0.00	$ -
52	7P		Cable postensado (9 torones)	m	280.76	$ 193,000.00	$ 54,186,680.00	0.00	$ 193,000.00	$ -			0.00	$ -
53	8P		Anclaje activo postensado (170mmX170mm)	u	32.00	$ 328,000.00	$ 10,496,000.00	0.00	$ 328,000.00	$ -			0.00	$ -
54	9P		Tuberia metalica D=2"	m	5.20	$ 108,000.00	$ 561,600.00	0.00	$ 108,000.00	$ -			0.00	$ -
55	10P		Sellador elastico (junta de dilatación)	m	22.00	$ 625,000.00	$ 13,750,000.00	19.40	$ 625,000.00	$ 12,125,000.00			0.00	$ -
56	11P		Bolsacreto de volumen 1m3	un	210.00	$ 111,000.00	$ 23,310,000.00	0.00	$ 111,000.00	$ -			0.00	$ -
57	610.5		Rellenos con material filtrante	m3	32.50	$ 255,000.00	$ 8,287,500.00	132.50	$ 255,000.00	$ 33,787,500.00			132.50	$ 33,787,500.00
58	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1692.97	$ 57,000.00	$ 96,499,290.00	1915.50	$ 57,000.00	$ 109,183,500.00			1915.50	$ 109,183,500.00
59	600.2.2		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	128.58	$ 144,000.00	$ 18,515,520.00	0.00	$ 144,000.00	$ -			0.00	$ -
Subtotal							$ 2,344,359,040.00			$ 1,568,280,020.00				$ 1,554,585,260.00
CAPITULO 6. TRANSPORTES														
60	900.2		Transporte de material provenientes de la excavación	m3-km	16519.00	$ 1,380.00	$ 22,796,220.00	51.99	$ 1,380.00	$ 71,746.20			51.99	$ 71,746.20
61			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	M3-KM	0.00	$ 1,350.00	$ -	38809.95	$ 1,350.00	$ 52,393,432.50			38809.95	$ 52,393,432.50
62			Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM	0.00	$ 1,550.00	$ -	8377.11	$ 1,550.00	$ 12,984,520.50			8377.11	$ 12,984,520.50
Subtotal							$ 22,796,220.00			$ 65,449,699.20				$ 65,449,699.20

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONTRATO DE OBRA N°1784 DE 2021	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	46,209,359,460
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	OBJETO: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%)	$	13,862,807,838
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 22	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL. R.L. (S) JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ.	VALOR ADICIÓN 1	$	11,063,040,907.84
		VALOR ADICIÓN 2	$	3,152,777,269.79
	INTERVENTORIA: CONSORCIO IC & CB NIT. 901.521.515-5	VALOR ADICIÓN 3	$	8,888,861,501.13
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	69,314,039,138.76
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1570 DE 2021	FECHA DE INICIO	martes, 26 de octubre de 2021	
22/3/2025	SUPERVISOR: ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ	PLAZO: 38.1 MESES	domingo, 30 de marzo de 2025	

				CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS POR ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 15			ACTA PARCIAL DE OBRA N°22		VALORES ACUMULADOS	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC.		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIA															
Capitulo 7. No Previstos															
NP15	810.P			Enrocado con roca >.8 del mismo rio	m3	0.00	$ 44,813.00	$ -	4357.00	$ 44,813.00	$ 195,250,241.00			4357.00	$ 195,250,241.00
NP16	642.00			Junta elastomerica empalme placa - estribo	m	0.00	$ 5,460,156.00	$ -	0.00	$ 5,460,156.00	$ -			0.00	$ -
NP17	650.1P			Acero ASTM A709 Gr. 50W para viga metálica (Incluye, Transporte, fabricación	kg	0.00	$ 28,303.00	$ -	76619.24	$ 28,303.00	$ 2,168,554,349.72			76619.24	$ 2,168,554,336.33
NP18	650.2P			Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, Tuberia, transporte,	kg	0.00	$ 23,524.00	$ -	2090.05	$ 23,524.00	$ 49,166,336.20			2090.05	$ 49,166,336.20
NP19				Plantación de plantulas nativas (Incluye mantenimiento)	Und	0.00	$ -	$ -		$ -	$ -			0.00	$ -
NP20	630.3.1P			Concreto resistencia 28MPA con fibras para construcción de losa	m3	0.00	$ 3,096,794.00	$ -	86.20	$ 3,096,794.00	$ 266,943,642.80			84.74	$ 262,422,323.56
														0.00	$ -
Subtotal								$ -			$ 2,679,914,569.72				$ 2,675,393,237.09
				AJUSTE AL PESO				$ -			$ 1.97		$ -		$ -
				SUBTOTAL VIA + PUENTE				$ 44,433,859,460.00			$ 66,080,779,088.76		$ 4,840,291,986.50		$ 62,683,511,808.01
				PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				$ 1,240,000,000.00			$ 775,553,050.00				$ 724,181,316.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 450,000,000.00			$ 2,085,300,000.00				$ 2,049,535,000.00
				IVA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 85,500,000.00			$ 392,407,000.00				$ 389,411,650.00
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 46,209,359,460.00			$ 69,314,039,138.76		$ 4,840,291,986.50		$ 65,846,639,774.01
				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA											

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$46,209,359,460.00	
ADICIONAL 1	$11,063,040,907.84	
ADICIONAL 2	$3,152,777,269.79	
ADICIONAL3	$8,888,861,501.13	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	Acta parcial N°01	$14,290,236,116.91
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	Acta parcial N°02	$3,718,178,256.85
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03	Acta parcial N°03	$3,433,623,335.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 04	Acta parcial N°04	$3,381,114,582.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 05	Acta parcial N°05	$3,144,483,866.85
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 06	Acta parcial N°06	$5,330,248,148.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 07	Acta parcial N°07	$3,838,703,200.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 08	Acta parcial N°08	$4,384,228,155.20
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 09	Acta parcial N°09	$4,008,541,761.85
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 10	Acta parcial N°10	$1,793,580,703.58
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 11	Acta parcial N°11	$579,776,622.50
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 12	Acta parcial N°12	$2,337,862,544.42
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 13	Acta parcial N°13	$159,878,491.50
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 14	Acta parcial N°14	$1,038,011,242.90
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 15	Acta parcial N°15	$1,854,552,555.70
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 16	Acta parcial N°16	$1,115,355,055.30
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 17	Acta parcial N°17	$2,013,872,370.45
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 18	Acta parcial N°18	$981,326,021.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 19	Acta parcial N°19	$2,549,963,048.70
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 20	Acta parcial N°20	$469,312,120.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 21	Acta parcial N°21	$583,499,567.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 22	Acta parcial N°22	$4,840,291,986.50
OBRA POR EJECUTAR	Saldo por ejecutar	$3,467,399,364.75
SUMAS IGUALES	$69,314,039,138.76	$69,314,039,138.76

BALANCE ANTICIPO

ANTICIPO CONCEDIDO (30%)	$ 13,862,807,838.00	
AMORTIZACION ACTA No. 01 (30%)		$ 4,287,070,835.07
AMORTIZACION ACTA No. 02 (30%)		$ 1,115,453,477.60
AMORTIZACION ACTA No. 03 (30%)		$ 1,030,087,000.50
AMORTIZACION ACTA No. 04 (33.52%)		$ 1,133,348,817.39
AMORTIZACION ACTA No. 05 (30%)		$ 943,345,160.06
AMORTIZACION ACTA No. 06 (30%)		$ 1,599,074,444.40
AMORTIZACION ACTA No. 07 (30%)		$ 1,151,610,960.00
AMORTIZACION ACTA No. 08 (30%)		$ 1,315,268,446.56
AMORTIZACION ACTA No. 09 (30%)		$ 1,202,562,534.56
AMORTIZACION ACTA No. 10 (Saldo)		$ 84,986,161.87
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 13,862,807,838.00	$ 13,862,807,838.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$ 4,840,291,986.50
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0.00
VALOR A CANCELAR PRESENTA ACTA	$ 4,840,291,986.50

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Por medio de la presente se certifica que CONTRATISTA e INTERVENTOR han verificado las cantidades de obra ejecutada desde el 01 de Noviembre de 2024 hasta el 22 de Marzo de 2025 y se firma como constancia en el Municipio de Ibagué - Tolima a los 25 días del mes de Marzo de 2025

Por EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Por EL CONTRATANTE:

ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADORA DEL GASTO

Interventor: ING. GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
Representante Legal CONSORCIO IC & CB
INTERVENTOR

PREACTA N°22

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
CONTRATO DE OBRA N°1784 DE 2021
CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL -RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PREACTA N°22

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD TOTAL OBRA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIA						
Capitulo 1. Explanaciones						
1	1P	Localización y replanteo	Ha		$ 1,150,000.00	$ 0.00
2	201.2	Demolición de Estructuras	m3	13.32	$ 230,000.00	$ 3,063,600.00
3	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 95,000.00	$ 0.00
4	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	7487.00	$ 16,500.00	$ 123,535,500.00
5	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		$ 13,500.00	$ 0.00
6	2P	Conformación de sitios de disposicion de sobrantes	m3		$ 6,000.00	$ 0.00
7	3P	Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	m3	8813.00	$ 167,000.00	$ 1,471,771,000.00
Subtotal						**$ 1,598,370,100.00**
Capitulo 2. Bases, Subbases y Afirmados						
8	310.1	Conformacion de la calzada existente	m2	14,353.00	$ 1,300.00	$ 18,658,900.00
9	320.1	Subbase granular	m3		$ 205,000.00	$ 0.00
10	330.1	Base granular	m3	4121.3	$ 225,000.00	$ 927,292,500.00
11		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido (separación de granulares)	m2	15855.0	$ 12,000.00	$ 190,260,000.00
Subtotal						**$ 1,136,211,400.00**
Capitulo 3. Pavimentos Asfalticos						
12	420.1	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	m2	14412	$ 4,000.00	$ 57,648,000.00
13	421.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2		$ 3,500.00	$ 0.00
14	450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 1,050,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 57,648,000.00**
Capitulo 4. Estructuras para Estabilización de Taludes y Recuperación de Banca						
15	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 53,000.00	$ 0.00
16	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 115,000.00	$ 0.00
17	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3		$ 83,000.00	$ 0.00
18	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3		$ 164,000.00	$ 0.00
19	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3		$ 980,000.00	$ 0.00
20	621.1P	Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase	m3		$ 2,800,000.00	$ 0.00
21	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3		$ 920,000.00	$ 0.00
22	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3		$ 700,000.00	$ 0.00
23	630.7	Concreto clase G	m3		$ 530,000.00	$ 0.00
24	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg		$ 8,000.00	$ 0.00
25	673.2	Material Granular Drenante	m3		$ 175,000.00	$ 0.00
26	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 12,000.00	$ 0.00
27	663.1.1P	Tubería perforada diametro 4"	m		$ 81,000.00	$ 0.00
28	681.1	Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1;	m3		$ 350,000.00	$ 0.00
29	674.1P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		$ 245,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 5. Drenajes						
30	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 57,000.00	$ 0.00
31	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 115,000.00	$ 0.00
32	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3		$ 83,000.00	$ 0.00
33	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3		$ 179,000.00	$ 0.00
34	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3		$ 959,000.00	$ 0.00
35		Concreto Resistencia 28MPa (C)	M3		$ 980,000.00	$ 0.00
36	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3		$ 700,000.00	$ 0.00
37	630.7	Concreto clase G	m3		$ 550,000.00	$ 0.00
38	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg		$ 8,100.00	$ 0.00
39	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m		$ 805,000.00	$ 0.00
40	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformacion de	m3		$ 880,000.00	$ 0.00
41	673.2	Material Granular Drenante	m3		$ 182,000.00	$ 0.00
42	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 12,000.00	$ 0.00
43		Tuberia de PVC perforada D=4"	m		$ 81,000.00	$ 0.00
44	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3		$ 75,000.00	$ 0.00
45	320.1	Subbase granular	m3		$ 205,000.00	$ 0.00
						$ 0.00
Capitulo 6. Señalización y Seguridad						
46	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	m		$ 2,800.00	$ 0.00
47	700.3	Marca Vial con pintura en frío	m2		$ 47,800.00	$ 0.00
48	701.1	Tacha Reflectiva	Und		$ 14,000.00	$ 0.00
49	710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x	Und		$ 625,000.00	$ 0.00
50	720.1P	Señal Poste de referencia SI - 04	Und		$ 602,000.00	$ 0.00
51	730.1	Defensa metalica	m		$ 273,000.00	$ 0.00
52	730.2	Sección final	Und		$ 276,000.00	$ 0.00
53	740.1	Captafaros	Und		$ 18,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 7. Transportes						
54	900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	M3-KM		$ 1,050.00	$ 0.00
55	900.2P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	M3-KM		$ 1,350.00	$ 0.00
56	900.3P	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM		$ 1,550.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 8. Obras Varias						
57	800.2	Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.	m		$ 29,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 9. No Previstos						
NP1	465.13	Demolición de la carpeta asfáltica	m3		$ 135,419.00	$ 0.00
NP2	671.3P	Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo,	m3		$ 968,374.00	$ -

NP3	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 28 Mpa de 900 mm de diametro interior	m		$ 889,932.00	$ 0.00
NP4	683.5	Geodren vial	m2		$ 109,677.00	$ 0.00
NP5	802.4	Poda de la parte aérea de árboles tipo IV	Un		$ 60,270.00	$ 0.00
NP6	802.8	Poda de la parte radicular de árboles tipo IV	Un		$ 232,208.00	$ 0.00
NP7	683.1	Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 30,089.00	$ 0.00
NP8	683.2	Geotextil de refuerzo tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 37,497.00	$ 0.00
NP9	683.3	Geocelda tipo HDPE 6" de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 90,866.00	$ 0.00
NP10	683.4	Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m3		$ 189,199.00	$ 0.00
NP11	741.13	Delineadores de curva horizontal SP-75 doble	Und		$ 858,663.00	$ 0.00
NP12	200.	Roceria y limpieza ancho max. 2m a lado y lado de la vía, y retiro	Ha		$ 778,289.00	$ 0.00
NP13	200.1P	Limpieza alcantarillas Existentes	Un		$ 258,279.00	$ 0.00
NP14	200.2P	Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes	ml		$ 4,138.00	$ 0.00
NP21		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	m3	1129.5	$ 1,813,247.00	$ 2,048,062,486.50
NP22		Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo, con Fibra	m3		$ 1,127,025.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 2,048,062,486.50**
SUBTOTAL						**$ 4,840,291,986.50**
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
Capitulo 1. Preliminares						
1	4P	Localización y replanteo puente	m2		$ 2,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 2. Movimiento de Tierras						
2	200.2P	Demoste y limpieza de zonas no boscosas	m2		$ 20,000.00	$ 0.00
3	201.2P	Demolición de estructuras de concreto reforzado	m3		$ 197,000.00	$ 0.00
4	201.11	Desmontaje y traslado de estructuras metálicas	kg		$ 5,000.00	$ 0.00
5	220.1	Terraplen	m3		$ 20,000.00	$ 0.00
6	210.1.1	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 14,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 3. Estructura de Pavimento						
7	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3		$ 980,000.00	$ 0.00
8	640.1	Acero de refuerzo 420MPA	kg		$ 8,000.00	$ 0.00
9	330.1	Base granular clase A	m3		$ 182,000.00	$ 0.00
10	450.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC19	m3		$ 1,100,000.00	$ 0.00
11	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1	m2		$ 4,000.00	$ 0.00
12	673.1.2	Geotextil tipo T2400	m2		$ 12,000.00	$ 0.00
13	230.1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 112,000.00	$ 0.00
14	810.1	Protección de taludes con bloques de césped	m2		$ 18,000.00	$ 0.00
15	311.1	Afirmado	m3		$ 128,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 4. Estructuras Adicionales y Drenajes						
16	610.5	Rellenos con material filtrante	m3		$ 257,000.00	$ 0.00
17	673.1.1	Geotextil tipo NT-2500	m2		$ 12,000.00	$ 0.00
18	663.1.1P	Tuberia de PVC perforada D=4"	m		$ 81,000.00	$ 0.00
19	663.1.2P	Tuberia de PVC D=1"	m		$ 45,000.00	$ 0.00
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 57,000.00	$ 0.00
21	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3		$ 75,000.00	$ 0.00
22	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3		$ 984,000.00	$ 0.00
23	630.6	Concreto resistencia 14MPA	m3		$ 643,000.00	$ 0.00
24	640.1	Acero de refuerzo 420MPA	kg		$ 8,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 5. Estructura Principal						
25	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3		$ 984,000.00	$ 0.00
26	630.3.1P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa	m3		$ 2,050,000.00	$ 0.00
27	630.3.2P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de cuña de apoyo	m3		$ 1,380,000.00	$ 0.00
28	630.3.3P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga diafragma	m3		$ 1,730,000.00	$ 0.00
29	630.3.4P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa de aproximación	m3		$ 1,400,000.00	$ 0.00
30	630.3.5P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de barrera de protección	m3		$ 1,320,000.00	$ 0.00
31	630.3.6P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Mensula de apoyo	m3		$ 1,360,000.00	$ 0.00
32	630.3.7P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga cabezal	m3		$ 1,550,000.00	$ 0.00
33	630.3.8P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro espaldar	m3		$ 1,380,000.00	$ 0.00
34	630.3.9P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro pantalla	m3		$ 1,520,000.00	$ 0.00
35	630.3.10P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro aleta	m3		$ 1,490,000.00	$ 0.00
36	630.3.11P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Tope sismico	m3		$ 1,350,000.00	$ 0.00
37	630.3.12P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pila de cimentación,	m3		$ 1,430,000.00	$ 0.00
38	621.1P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pilote de concreto	m3		$ 2,950,000.00	$ 0.00
39	621.5.1	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Camisa permanente	m3		$ 1,175,000.00	$ 0.00
40	630.6	Concreto resistencia 14MPA	m3		$ 642,000.00	$ 0.00
41	630.1P	Concreto resistencia 35MPApara construcción de VIGA POSTENSADA	m3		$ 3,200,000.00	$ 0.00
42	640.1	Acero de refuerzo 420mMPA	kg		$ 8,000.00	$ 0.00
43	663.1.3P	Tuberia de PVC D=4"	m		$ 80,000.00	$ 0.00
44	663.1.2P	Tuberia de PVC D=1"	m		$ 45,000.00	$ 0.00
45	663.1.1P	Tuberia de PVC Perforada D=4"	m		$ 81,000.00	$ 0.00
46	673.1.1	Geotextil tipo NT-2500	m2		$ 12,000.00	$ 0.00
47	632P	Baranda peatonal metálica (H=1.15m)	m		$ 672,000.00	$ 0.00
48	5P	Platina de acero laminada ASTM A36(370mmX430mmX1/8")	u		$ 125,000.00	$ 0.00
49	642.1P	Elastometro D60 (450mmX400mm)	u		$ 595,000.00	$ 0.00
50	642.2P	Elastometro D60 (300mmX250mm)	u		$ 545,000.00	$ 0.00
51	6P	Cable postensado (10 torones)	m		$ 232,000.00	$ 0.00
52	7P	Cable postensado (9 torones)	m		$ 193,000.00	$ 0.00

53	8P	Anclaje activo postensado (170mmX170mm)	u		$ 328,000.00	$ 0.00
54	9P	Tuberia metalica D=2"	m		$ 108,000.00	$ 0.00
55	10P	Sellador elastico (junta de dilatación)	m		$ 625,000.00	$ 0.00
56	11P	Bolsacreto de volumen 1m3	un		$ 111,000.00	$ 0.00
57	610.5	Rellenos con material filtrante	m3		$ 255,000.00	$ 0.00
58	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 57,000.00	$ 0.00
59	600.2.2	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3		$ 144,000.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 6. Transportes						
60	900.2	Transporte de material provenientes de la excavación	m3-km		$ 1,380.00	$ 0.00
61		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	M3-KM		$ 1,350.00	$ 0.00
62		Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM		$ 1,550.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 7. No Previstos						
NP15	810.P	Enrocado con roca >.8 del mismo rio	m3		$ 44,813.00	$ 0.00
NP16	642	Junta elastomerica empalme placa - estribo	m		$ 5,460,156.00	$ 0.00
NP17	650.1P	Acero ASTM A709 Gr. 50W para viga metálica (Incluye, Transporte,	kg		$ 28,303.00	$ 0.00
NP18	650.2P	Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, Tubería,	kg		$ 23,524.00	$ 0.00
		LOSA DE CONCRETO PUENTE	m3		$ 3,096,794.00	$ 0.00
Subtotal						$ 0.00
SUBTOTAL						**$ 0.00**
					SUBTOTAL VIA + PUENTE	**$ 4,840,291,986.50**
					PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)	
					REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	
					IVA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	
					SUBTOTAL OTRAS OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 0.00**
					TOTAL	**$ 4,840,291,986.50**

Firma
Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-090894

Firma
Nombre: Fredy Enrique Cortés Rubio
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202-78951 CND

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		ING JULIO GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22		PERIODO MARZO
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 201.2	CAP 1 - EXPLANACIONES	DESCRIPCION	2 - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA INICIAL	ABSCISADO REFERENCIA FINAL	LONGITUD	ESPESOR	ALTURA MAYOR	ALTURA MENOR	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACTA ANTERIOR	REGISTRO FOTOGRAFICO
EL HELECHAL TUBERÍA	K22+225		6.80				1.50		1.50	-	1.50	
	K22+275		6.80				1.50		1.50	-	1.50	
	K23+150		6.50				1.43		1.43	-	1.43	
	K23+520		6.50				1.43		1.43	-	1.43	
	K23+575		6.50				1.43		1.43	-	1.43	
	K23+730		6.50				1.43		1.43	-	1.43	
EL HELECHAL CAJA ENCOLES	K22+225		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K22+275		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+150		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+520		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+575		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+730		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
EL HELECHAL CAJA DESCOLES	K22+225		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K22+275		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+150		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+520		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+575		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K23+730		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
ALETAS EL HELECHAL ENCOLES Y DESCOLES	K22+225		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
	K22+275		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
	K23+150		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
	K23+520		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
	K23+575		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
	K23+730		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
EL HELECHAL PLACAS DE CONTRAPISO	K22+225		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
	K22+275		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
	K23+150		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
	K23+520		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
	K23+575		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
	K23+730		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
LA GUANABANERA DEMOLICION CAJA ENCOLE	K11+608		1.20	0.30	1.00		0.36	1.00	0.36	-	0.36	
LA GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K11+608		6.00	0.10			1.32		1.32	-	1.32	
GUANABANERA DEMOLICION MURO DESCOLE	K11+608		1.25	0.30	1.10		0.41		0.41	-	0.41	
LA GUANABANERA DEMOLICION CAJA ENCOLE	K11+665		1.20	0.30	1.20		0.43	1.00	0.43	-	0.43	
LA GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K11+665		6.00	0.10			1.32		1.32	-	1.32	
GUANABANERA DEMOLICION MURO DESCOLE	K11+665		1.20	0.30	1.20		0.43		0.43	-	0.43	
LA GUANABANERA DEMOLICION CAJA ENCOLE	K11+815		1.20	0.30	1.20		0.43	1.00	0.43	-	0.43	
LA GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K11+815		7.00	0.10			1.54		1.54	-	1.54	
GUANABANERA DEMOLICION MURO DESCOLE	K11+815		1.25	0.30	1.20		0.45		0.45	-	0.45	
LA GUANABANERA DEMOLICION CABEZOTE DESCOLE	K11+930		2.50	0.40	2.30		2.30	1.00	2.30	-	2.30	
LA GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K11+930		5.00	0.10			1.10		1.10	-	1.10	
GUANABANERA DEMOLICION MURO ENCOLE	K11+930		1.10	0.30	1.10		0.36		0.36	-	0.36	
LA GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K12+035		5.00	0.10			1.10		1.10	-	1.10	
GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K12+150		6.00	0.10			1.32		1.32	-	1.32	
GUANABANERA DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE	K12+255		6.00	0.10			1.32		1.32	-	1.32	
SITIO CRITICO 1 DEMOLICION MURO EXISTENTE ZAPATA	K15+900- K16+026		40.00	0.90	0.35		12.60		12.60	-	12.60	
SITIO CRITICO 1 DEMOLICION MURO EXISTENTE CUERPO			40.00	1.30	0.25		13.00		13.00	-	13.00	
SITIO CRITICO 1 CUNETA PLACA	K15+900-K16+000		100.00	1.00	0.10		10.00		10.00	-	10.00	
SITIO CRITICO 1 CUNETA SARDINEL			100.00	0.15	0.18		2.70		2.70	-	2.70	
SITIO CRITICO 2 ALETA IZQUIERDA	K16+514 - K16+528		5.05	0.40	2.80		5.66		5.66	-	5.66	
SITIO CRITICO 2 ALETA DERECHA			6.10	0.40	2.80		6.83		6.83	-	6.83	
SITIO CRITICO 2 MURO GUARDA RUEDA			4.50	0.40	2.80		5.04		5.04	-	5.04	
TRAMO 1 - SITIO CRÍTICO UNO CUNETA LATERAL DERECHO	K15+900				130.00			0.21	27.30	-	27.30	
TRAMO 2 - SITIO CRÍTICO UNO CUNETA LATERAL DERECHO	K16+400				160.00			0.21	33.60	-	33.60	
TRAMO 1 - SITIO CRÍTICO DOS TUBERÍA	K16+675		10.50				2.31		2.31	-	2.31	









MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		ING JULIO GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22		PERIODO MARZO
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 201.2	CAP 1 - EXPLANACIONES	DESCRIPCION	2 - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA INICIAL	ABSCISADO REFERENCIA FINAL	LONGITUD	ESPESOR	ALTURA MAYOR	ALTURA MENOR	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACTA ANTERIOR	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 - SITIO CRÍTICO DOS CAJAS ENCOLES	K16+675		2.50	0.25		1.60	1.00		1.00	-	1.00	
TRAMO 1 - SITIO CRÍTICO DOS CAJAS DESCOLES	K16+675		2.50	0.25		1.60	1.00		1.00	-	1.00	
TRAMO 1 - SITIO CRÍTICO DOS ALETAS ENCOLES Y DESCOLES	K16+675		1.90	0.25	2.10	1.90	0.95	4.00	3.80	-	3.80	
TRAMO 1 - SITIO CRÍTICO DOS PLACAS DE CONTRAPISO	K16+675		1.60	0.25	1.70	1.50	0.64	4.00	2.56	-	2.56	
ENCOLES SITIO CRÍTICO 2 TUBERÍA	K16+675		7.50				1.65		1.65	-	1.65	
	K16+835		7.00				1.54		1.54	-	1.54	
CAJAS DESCOLES SITIO CRÍTICO 2	K16+675		2.40	0.30		1.60	1.15		1.15	-	1.15	
	K16+835		2.50	0.25		1.60	1.00		1.00	-	1.00	
ENCOLES SITIO CRÍTICO 2 ALETAS DESCOLES	K16+675		2.20	0.30	2.00	1.60	1.19	2.00	2.38	-	2.38	
	K16+835		2.30	0.25	2.00	1.60	1.04	2.00	2.07	-	2.07	
ENCOLES SITIO CRÍTICO 2 PLACAS CONTRAPISO DESCOLE	K16+675		2.40	0.30		1.70	1.22		1.22	-	1.22	
	K16+835		2.50	0.25		1.50	0.94		0.94	-	0.94	
EL HELECHAL TUBERÍA	K22+393		6.80				1.50		1.50	-	1.50	
	K22+455		6.80				1.50		1.50	-	1.50	
	K22+665		6.50				1.43		1.43	-	1.43	
EL HELECHAL CAJAS ENCOLES	K22+393		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K22+455		2.40	0.30		1.80	1.30		1.30	-	1.30	
	K22+665		2.30	0.25		1.80	1.04		1.04	-	1.04	
EL HELECHAL CAJAS DESCOLES	K22+393		2.35	0.25		1.60	0.94		0.94	-	0.94	
	K22+455		2.40	0.30		1.80	1.30		1.30	-	1.30	
	K22+665		2.30	0.25		1.80	1.04		1.04	-	1.04	
ALETAS EL HELECHAL ENCOLES Y DESCOLES	K22+393		1.80	0.25	2.10	1.90	0.90	4.00	3.60	-	3.60	
	K22+455		1.80	0.30	2.20	2.00	1.13	4.00	4.54	-	4.54	
	K22+665		1.80	0.25	2.00	1.80	0.86	4.00	3.42	-	3.42	
EL HELECHAL PLACAS DE CONTRAPISO	K22+393		1.50	0.25	1.70	1.50	0.60	4.00	2.40	-	2.40	
	K22+455		1.60	0.30	1.80	1.60	0.82	4.00	3.26	-	3.26	
	K22+665		1.60	0.25	1.30	1.10	0.48	4.00	1.92	-	1.92	
ALETA IZQUIERDA DESCOLE	K23+005		2.00	0.50	2.40		2.40		2.40	-	2.40	
ALETA DERECHA DESCOLE			2.00	0.50	2.40		2.40		2.40	-	2.40	
CABEZOTE DESCOLE			1.60	0.80	2.40		3.07		3.07	-	3.07	
CABEZOTE DESCOLE			0.32	0.80					-0.25	-	-0.25	
SOLERA DESCOLE			2.55	0.35	1.10		0.98		0.98	-	0.98	
DEMOLICION TUBERÍA			10.00	0.10		0.23	2.32		2.32	-	2.32	
DEMOLICION ATRAQUE			10.00			0.30	3.00		3.00	-	3.00	
DEMOLICION LOSA INFERIOR			2.00	0.25	1.60		0.80		0.80	-	0.80	
DEMOLICION PAREDES CAJA ENCOLE derecha			1.80	0.25	1.60		0.72		0.72	-	0.72	
DEMOLICION PAREDES CAJA ENCOLE muro Frontal			1.80	0.25	1.60		0.72		0.72	-	0.72	
AREA TUBO			0.32	0.25					-0.08	-	-0.08	
DEMOLICION PAREDES CAJA ENCOLE izquierrda			1.80	0.25	1.50		0.68		0.68	-	0.68	
OBRA 63 ALETAS DESCOLE	K39+833		2.40	0.30	4.00	4.00	2.88		2.88	-	2.88	
OBRA 63 SOLERA DESCOLE			2.00	0.30	1.00	1.00	0.60		0.60	-	0.60	
OBRA 63 CABEZOTE Y TUBERIA DESCOLE			2.30	0.30	1.50	1.50	1.04		1.04	-	1.04	
OBRA 63 CABEZOTE ENCOLE			2.30	0.30		1.80	1.24		1.24	-	1.24	
OBRA 63 ALETA DERECHA ENCOLE			1.90	0.30		1.60	0.91		0.91	-	0.91	
OBRA 63 ALETA IZQUIERDA ENCOLE			1.90	0.30		1.60	0.91		0.91	-	0.91	
OBRA 63 PLACA DE FONDO ENCOLE			2.30	0.30		1.50	1.04		1.04	-	1.04	
OBRA 63 DEMOLICION DE TUBERIA			4.00			0.31	1.26		1.26	-	1.26	
OBRA 63 DEMOLICION DE ATRAQUE			8.00	0.25		0.40	0.80		0.80	-	0.80	
OBRA 62 ALETAS DESCOLE	K39+515		2.00	0.30	1.10	1.30	1.44		1.44	-	1.44	
OBRA 62 CABEZOTE DESCOLE			1.20	0.30	1.60		0.58		0.58	-	0.58	
OBRA 62 SOLERA DESCOLE			1.20	0.30	2.50	1.20	0.67		0.67	-	0.67	
OBRA 62 CABEZOTE ENCOLE			1.30	0.30	1.00		0.39		0.39	-	0.39	
OBRA 62 ALETAS ENCOLE			1.60	0.30	1.30	1.10	1.15		1.15	-	1.15	
OBRA 62 DEMOLICION TUBERIA			16.00	0.66		0.60	0.24		0.24	-	0.24	










MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		ING JULIO GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22		PERIODO MARZO
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 201.2	CAP 1 - EXPLANACIONES	DESCRIPCION	2 - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA INICIAL	ABSCISADO REFERENCIA FINAL	LONGITUD	ESPESOR	ALTURA MAYOR	ALTURA MENOR	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACTA ANTERIOR	REGISTRO FOTOGRAFICO
DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE OH 61	K39+402		8.00	0.10			1.76		1.76	-	1.76	
OBRA 60 CABEZOTE DESCOLE	K39+206		2.30	0.30	1.80		1.24		1.24	-	1.24	
OBRA 60 ZARPA DESCOLE			2.00	1.80	0.30		1.08		1.08	-	1.08	
OBRA 60 ALETAS DESCOLE			2.00	0.30	4.90	1.80	2.01		2.01	-	2.01	
OBRA 60 CABEZOTE ENCOLE			2.00	0.30	1.60		0.96		0.96	-	0.96	
OBRA 60 ALETAS ENCOLE			1.60	0.35	1.40	1.20	1.46		1.46	-	1.46	
OBRA 60 TUBERIA			10.00	0.70		0.60	0.26		0.26	-	0.26	
OBRA 59 DEMOLICION DE TUBERIA	K39+055		7.00	0.10			2.91		2.91	-	2.91	
OBRA 59 DEMOLICION CAJA DE ENCOLE			1.20	0.30	1.20	1.20	1.73		1.73	-	1.73	
OBRA 58 CABEZOTE DESCOLE	K38+943		2.10	0.40	2.10		1.76		1.76	-	1.76	
OBRA 58 ALETAS DESCOLE			2.00	0.40	2.00	1.90	3.12		3.12	-	3.12	
OBRA 58 SOLERA DESCOLE			2.50	0.40	2.50	2.10	2.30		2.30	-	2.30	
OBRA 58 VASTAGO ENCOLE			2.10	0.40	2.10		1.76		1.76	-	1.76	
OBRA 58 ZARPA ENCOLE			2.00	0.40	2.00		1.60		1.60	-	1.60	
OBRA 57 VASTAGO ENCOLE	K38+916		2.00	2.00	0.40		1.60		1.60	-	1.60	
OBRA 57 ZARPA ENCOLE			1.50	0.40	1.10		0.66		0.66	-	0.66	
OBRA 56A CABEZOTE DESCOLE	K38+805		1.30	0.30	1.30		0.51		0.51	-	0.51	
OBRA 56A SOLERA DESCOLE			1.20	0.30	1.20		0.43		0.43	-	0.43	
OBRA 56A ALETAS DESCOLE			1.50	0.30	2.50	1.50	0.90		0.90	-	0.90	
OBRA 56A CAJA ENCOLE			1.20	0.30	1.20		1.73		1.73	-	1.73	
OBRA 56A LOSA ENCOLE			0.90	0.30	0.90		0.24		0.24	-	0.24	
OBRA 56 CABEZOTE DESCOLE	K38+654		2.00	0.40	1.90		1.52		1.52	-	1.52	
OBRA 56 ALETAS DESCOLE			1.70	0.40	1.70	1.60	1.12		1.12	-	1.12	
OBRA 56 SOLERA DESCOLE			2.00	0.40	2.00		1.60		1.60	-	1.60	
OBRA 56 CAJA ENCOLE			1.50	0.30	1.50		2.70		2.70	-	2.70	
OBRA 56 LOSA ENCOLE			1.20	0.30	1.20		0.43		0.43	-	0.43	
OBRA 55 CABEZOTE DESCOLE	K38+557		1.90	0.40	2.10		1.60		1.60	-	1.60	
OBRA 55 ALETAS DESCOLE			1.80	0.40	2.00	1.80	2.74		2.74	-	2.74	
OBRA 55 SOLERA DESCOLE			2.10	0.40	2.10		1.76		1.76	-	1.76	
OBRA 55 DEMOLICION DE TUBERIA			7.00				1.54		1.54	-	1.54	
OBRA 54 CABEZOTE DESCOLE	K38+496		2.20	0.40	2.10		1.85		1.85	-	1.85	
OBRA 54 ALETAS DESCOLE			1.80	0.40	2.00	1.80	1.44		1.44	-	1.44	
OBRA 54 SOLERA DESCOLE			2.20	0.40	2.10	2.20	3.78		3.78	-	3.78	
OBRA 54 DEMOLICION DE TUBERIA			7.00				1.54		1.54	-	1.54	
OBRA 53A CABEZOTE DESCOLE	k38+433		1.80	0.40	2.00		1.44		1.44	-	1.44	
OBRA 53A ALETAS DESCOLE			1.80	0.40	2.00	1.60	2.59		2.59	-	2.59	
OBRA 53A SOLERA DESCOLE			2.00	0.40	2.00		1.60		1.60	-	1.60	
OBRA 53A DEMOLICION DE TUBERIA			6.00				1.32		1.32	-	1.32	
OBRA 53 CABEZOTE DESCOLE	K38+285		2.20	0.30	2.00		1.32		1.32	-	1.32	
OBRA 53 ALETAS DESCOLE			1.80	0.30	2.00	1.60	1.94		1.94	-	1.94	
OBRA 53 SOLERA DESCOLE			2.20	0.30	2.20	2.00	2.77		2.77	-	2.77	
OBRA 53 CAJA ENCOLE			1.60	0.30	1.70		3.26		3.26	-	3.26	
OBRA 53 LOSA ENCOLE			1.30	0.30	1.30		0.51		0.51	-	0.51	
OBRA 52 CABEZOTE	K38+216		1.50	0.30	1.60		0.72		0.72	-	0.72	
OBRA 52 DEMOLICION DE TUBERIA			6.50				1.43		1.43	-	1.43	
OBRA 50 DEMOLICION TUBERIA	K37+640		3.70				1.53		1.53	-	1.53	
OBRA 50 ATRAQUE TUBERIA			3.70	0.25			1.85		1.85	-	1.85	
OBRA 50 CABEZOTE TUBERIA			3.70	0.80	2.00		5.92		5.92	-	5.92	
OBRA 50 DEMOLICION TUBERIA ENCOLE			4.30	0.10			1.51		1.51	-	1.51	
			3.70	0.80	2.00		5.92		5.92	-	5.92	
DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE OH 49	K37+595		8.00	0.10			1.76		1.76	-	1.76	
DEMOLICION CABEZOTE EXISTENTE OH 49 DESCOLE			2.00	0.30	1.20		1.44		1.44	-	1.44	
ALETAS EXISTENTES OH 49 DESCOLE			1.00	0.30	1.10		0.33		0.33	-	0.33	
SOLERA EXISTENTE OH 49 DESCOLE			2.00	0.30	1.00		0.60		0.60	-	0.60	
CAJA EXISTENTE ENCOLE OH 49			1.20	0.30	1.20		1.73		1.73	-	1.73	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		ING JULIO GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22		PERIODO MARZO
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 201.2	CAP 1 - EXPLANACIONES	DESCRIPCION	2 - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA INICIAL	ABSCISADO REFERENCIA FINAL	LONGITUD	ESPESOR	ALTURA MAYOR	ALTURA MENOR	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACTA ANTERIOR	REGISTRO FOTOGRAFICO
LOSA INFERIOR ENCOLE OH 49	K37+595		1.20	0.20	1.20		0.29		0.29	-	0.29	
DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE OH 48	K37+540		7.00	0.10			1.54		1.54	-	1.54	
DEMOLICION CABEZOTE EXISTENTE OH 48 DESCOLE			2.00	0.30	1.50		1.80		1.80	-	1.80	
ALETAS EXISTENTES OH 48 DESCOLE			1.00	0.30	1.25		0.38		0.38	-	0.38	
SOLERA EXISTENTE OH 48 DESCOLE			2.00	0.30	1.10		0.66		0.66	-	0.66	
CAJA EXISTENTE ENCOLE OH 48			1.20	0.30	1.20		1.73		1.73	-	1.73	
LOSA INFERIOR ENCOLE OH 48			1.20	0.20	1.20		0.29		0.29	-	0.29	
OBRA 47 DEMOLICION DE TUBERIA	K37+427		6.00	0.30			2.50		2.50	-	2.50	
OBRA 47 DEMOLICION DE CABEZOTE DESCOLE			1.50	0.30	1.20		0.54		0.54	-	0.54	
OBRA 47 DEMOLICION DE ALETAS DESCOLE			1.00	0.30	1.10		0.66		0.66	-	0.66	
OBRA 47 DEMOLICION CICLOPEO ENCOLE			3.50	0.75	2.00		5.25		5.25	-	5.25	
OBRA 47 SOLERA ENCOLE			3.50	0.20	1.50		1.05		1.05	-	1.05	
OBRA 47 ALETAS ENCOLE IZQUIERDA			1.60	0.40	1.50		0.96		0.96	-	0.96	
OBRA 47 ALETAS ENCOLE DERECHA			1.60	0.40	1.50		0.96		0.96	-	0.96	
OBRA 46 DEMOLICION DE ALETAS	K37+348		2.00	0.25	1.50		1.50		1.50	-	1.50	
OBRA 46 DEMOLICION DE CABEZOTE CICLOPEO			3.00	0.80	2.20		5.28		5.28	-	5.28	
OBRA 46 DEMOLICION DE SOLERA CICLOPEO			3.00	1.60	0.20		0.96		0.96	-	0.96	
OBRA 46 DEMOLICION DE ALETAS			1.60	0.40	1.60		2.05		2.05	-	2.05	
OBRA 45 DEMOLICION DE TUBERIA	K37+316		6.00	0.10			1.25		1.25	-	1.25	
OBRA 45 DEMOLICION DE CABEZOTE			1.20	0.30	1.20		0.43		0.43	-	0.43	
OBRA 45 DEMOLICION DE ALETAS			1.00	0.30	1.10		0.66		0.66	-	0.66	
OBRA 45 DEMOLICION PAREDES DE CAJA ENCOLE			1.50	0.30	1.50		2.55		2.55	-	2.55	
OBRA 45 DEMOLICION LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE			1.50	0.30	1.50		0.68		0.68	-	0.68	
OBRA 44 DEMOLICION DE TUBERIA	K37+260		8.00	0.10			1.76		1.76	-	1.76	
OBRA 44 DEMOLICION ATRAQUE DE TUBERIA			8.00	0.20			1.84		1.84	-	1.84	
OBRA 44 LOSA INFERIOR			2.00	1.80	0.30		1.08		1.08	-	1.08	
OBRA 44 MUROS CAJA DE ENCOLE			1.70	0.30	2.20		4.49		4.49	-	4.49	
OBRA 43 DEMOLICION DE TUBERIA EXISTENTE	K37+205		8.00	0.10			1.19		1.19	-	1.19	
DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE OH 41	K36+728		8.00	0.10			1.76		1.76	-	1.76	
DEMOLICION CABEZOTE EXISTENTE OH 41 DESCOLE			2.00	0.30	1.10		1.32		1.32	-	1.32	
ALETAS EXISTENTES OH 41 DESCOLE			1.10	0.30	1.25		0.41		0.41	-	0.41	
SOLERA EXISTENTE OH 41 DESCOLE			2.00	0.30	1.00		0.60		0.60	-	0.60	
CAJA EXISTENTE ENCOLE OH 41			1.20	0.30	1.20		1.45		1.45	-	1.45	
LOSA INFERIOR ENCOLE OH 41			1.20	0.20	1.20		0.29		0.29	-	0.29	
OH 37 DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE FRACCION	K36+490		1.00	0.60	1.40		0.84		0.84	-	0.84	
OH 37 DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE LADO DESCOLE			7.00	0.15			4.45		4.45	-	4.45	
DEMOLICION DE TUBERIA EXISTENTE OH 31	K35+504		5.00	0.10			1.10		1.10	-	1.10	
DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE OH 27	K35+178		8.00	0.10			1.76		1.76	-	1.76	
MUROS CAJA EXISTENTE ENCOLE OH 27			1.00	0.30	1.00		0.92		0.92	-	0.92	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE OH 27			1.60	0.30	1.60		0.77		0.77	-	0.77	
ALETA IZQUIERDA DESCOLE OH 17	K34+570		1.80	0.30	1.60		0.86		0.86	-	0.86	
ALETA DERECHA DESCOLE OH 17			1.80	0.30	1.60		0.86		0.86	-	0.86	
CABEZOTE DESCOLE OH 17			1.55	0.30	1.90		0.88		0.88	-	0.88	
DEMOLICION TUBERIA OH 17			6.00	0.10			0.71		0.71	-	0.71	
DEMOLICION DE TUBERIA EXISTENTE OH 15	K34+405		8.00	1.00			1.76		1.76	-	1.76	
MUROS CAJA EXISTENTE ENCOLE OH 15			1.20	0.30	1.20		1.45		1.45	-	1.45	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE OH 15			1.50	0.30	1.50		0.68		0.68	-	0.68	
DEMOLICION DE TUBERIA EXISTENTE OH 5	K33+657		10.00	0.10			2.20		2.20	-	2.20	
MUROS CAJA EXISTENTE ENCOLE OH 5			1.20	0.40	1.80		3.43		3.43	-	3.43	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE OH 5			1.60	0.30	1.60		0.77		0.77	-	0.77	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		ING JULIO GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22		PERIODO MARZO
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 201.2	CAP 1 - EXPLANACIONES	DESCRIPCION	2 - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ESPESOR	ALTURA MAYOR	ALTURA MENOR	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACTA ANTERIOR	REGISTRO FOTOGRAFICO
		INICIAL	FINAL										
ANILLOS DE DESCABECE											-		
CALIBIO- MURO 1	TRAMO 2	K33+230	K33+230			8.55	0.47			4.02	-	4.02	
CALIBIO- MURO 3		K33+650	K33+650			12.72	0.47			5.98	-	5.98	
BARIALOZA- MURO 5		K34+400	K34+400			13.01	0.47			6.11	-	6.11	
ICARCO - MURO 8		K35+168	K35+186			8.15	0.47			3.83	-	3.83	
ICARCO - MURO 9		K35+935	K36+053			46.15	0.47			21.69	-	21.69	
ICARCO- MURO 9C		K36+377	K36+418			18.87	0.42			7.93	-	7.93	
ICARCO - MURO 10		K36+518	K36+582			32.64	0.47			15.34	-	15.34	
EL VISO - MURO 11		K36+931	K36+962			22.30	0.47			10.48	-	10.48	
EL VISO- MURO 12		K37+200	K37+220			10.00	0.47			4.70	-	4.70	
EL VISO - MURO 13		K37+626	K37+661			6.80	0.47			3.20	-	3.20	
LOS MESONES MURO 13B		K38+850	K38+870			10.31	0.47			4.85	-	4.85	
LOS MESONES - MURO 14		K39+050	K39+065			5.90	0.47			2.77	-	2.77	
LOS MESONES - MURO 15		K39+820	K39+877			17.90	0.47			8.41	-	8.41	
SECTOR GUANABANERA	TRAMO 1	K12+150				32.30	0.47			15.18	-	15.18	
SITIO CRÍTICO 1		K12+220				18.85	0.47			8.86	-	8.86	
SITIO CRÍTICO 2		K15+800	K16+026			98.95	0.47			46.51	-	46.51	
EL HELECHAL		K16+400	K16+780			83.10	0.47			39.06	-	39.06	
EL HELECHAL		K22+250				18.00	0.47			8.46	-	8.46	
EL HELECHAL		K22+375				32.94	0.47			15.48	-	15.48	
EL HELECHAL		K22+580	K22+620			90.61	0.47			42.59	-	42.59	
EL HELECHAL		K22+880				41.20	0.47			19.36	-	19.36	
EL HELECHAL		K23+150	K23+180			26.20	0.47			12.31	-	12.31	
EL HELECHAL		K23+360	K23+400			37.50	0.47			17.63	-	17.63	
DEMOLICION DE CUNETAS											-		
Guanabeera		K12+335		4.00		0.96	0.12			0.46	-	0.46	
Guanabeera		K11+280	K11+314	30.00		1.00	0.15			4.50	-	4.50	
Guanabeera		K11+280	K11+314	30.00		1.00	0.15			4.50	-	4.50	
Guanabeera- Entrada Vereda		K11+314		45.45		2.00	0.15			13.64	-	13.64	
Critico 2		K16+400		2.52		1.10	0.15			0.42	-	0.42	
Critico 2		K16+400		2.30		1.10	0.15			0.38	-	0.38	
Critico 1		K16+000		5.20		1.05	0.15			0.82	-	0.82	
Tramo w		K40+040		4.00		0.70	0.15			0.42	-	0.42	
DEMOLICION ENTRADA ALCANTARILLAS										-	-	-	
Guanabeera	tramo 1	K11+368	De	0.30		0.30	0.30	0.03	2.00	0.05	-	0.05	
Guanabeera		K11+510	los dos	0.30		0.30	0.30	0.03	2.00	0.05	-	0.05	
Guanabeera		K12+005	de	0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Guanabeera		K12+260	De	0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Critico 1		K16+005		1.50		0.30	0.30	0.14	1.00	0.14	-	0.14	
Critico 1		K16+030		0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Critico 2		K16+520		0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Critico 2		K16+575		0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Critico 2		K16+635		0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Critico 2		K16+765		0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
Meson	Tramo 2	K39+540		0.30		0.30	0.30	0.03	1.00	0.03	-	0.03	
MURO 9		K35+935		0.50		0.50	0.30	0.08	1.00	0.08	-	0.08	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING JULIO GALLO ORTIZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22	PERIODO MARZO	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 201.2	CAP 1 - EXPLANACIONES	DESCRIPCION	2 - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA INICIAL	ABSCISADO REFERENCIA FINAL	LONGITUD	ESPESOR	ALTURA MAYOR	ALTURA MENOR	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACTA ANTERIOR	REGISTRO FOTOGRAFICO
DEMOLICION ENTRADA ALCANTARILLAS										-	-		
ICARCO	tramo 2	K36+680		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	-	1.08	
ICARCO	tramo 2	K36+242		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	-	1.08	
ICARCO	tramo 2	K36+242		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	-	1.08	
ICARCO	tramo 2	K36+242		1.00	0.72			0.72	8.00	5.79	-	5.79	
DEMOLICION ENTRADA ALCANTARILLAS										-	-		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	1.08		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	1.08		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	1.08		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	1.08		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	1.08		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.80	0.30	2.10	1.90	1.08	1.00	1.08	1.08		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		0.30	0.72			0.22	2.00	-0.43	-0.43		
HELECHALES	tramo 2	K23+321		1.00	0.72			0.72	10.00	7.24	7.24		
									Cantidad Acumulada	813.00			
									Cantidad Paga Actas Anteriores	799.68		799.68	
									Cantidad Para Pago Presente Acta	13.32	-		

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: FREDY CORTES RUBIO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:


Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**			
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capítulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ABSCISA		DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
HELECHAL MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE		K22+210		5.89				
			10.00		50.66	50.66	50.66	
		K22+220		4.24				
			10.00		42.11	42.11	92.77	
		K22+230		4.18				
			10.00		37.76	37.76	130.52	
		K22+240		3.37				
			10.00		31.85	31.85	162.37	
		K22+250		3.00				
			10.00		26.63	26.63	189.00	
		K22+260		2.32				
			10.00		27.08	27.08	216.07	
		K22+270		3.09				
			10.00		30.06	30.06	246.13	
		K22+280		2.92				
			10.00		27.59	27.59	273.72	
		K22+290		2.60				
			10.00		26.54	26.54	300.26	
		K22+300		2.71				
			10.00		31.74	31.74	332.00	
		K22+310		3.64				
			10.00		30.27	30.27	362.27	
		K22+320		2.42				
			10.00		32.85	32.85	395.12	
		K22+330		4.15				
			10.00		41.16	41.16	436.27	
		K22+340		4.08				
			10.00		28.63	28.63	464.90	
		K22+350		1.65				
			10.00		17.64	17.64	482.54	
		K22+360		1.88				
			10.00		15.48	15.48	498.01	
		K22+370		1.22				
			10.00		20.17	20.17	518.18	
		K22+380		2.82				
			10.00		29.80	29.80	547.98	
		K22+390		3.14				
			10.00		28.33	28.33	576.31	
		K22+400		2.53				
			10.00		24.78	24.78	601.08	
		K22+410		2.43				
			10.00		20.55	20.55	621.63	
		K22+420		1.68				
			10.00		17.98	17.98	639.61	
		K22+430		1.92				
			10.00		22.19	22.19	661.80	
HELECHAL MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE		K22+440		2.52				
			10.00		32.77	32.77	694.57	
		K22+450		4.03				
			10.00		58.04	58.04	752.61	
		K22+460		7.58				
			10.00		57.98	57.98	810.58	

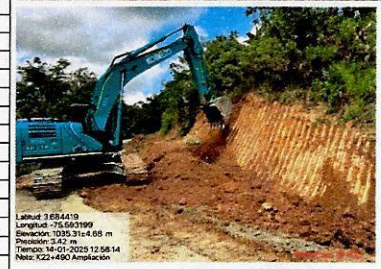

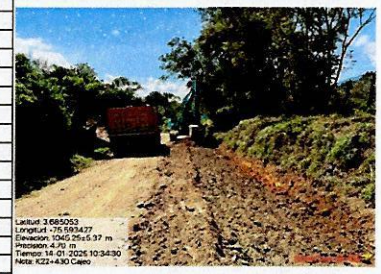



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
			AREA	VOL			
	K22+470		4.02				
		10.00		40.88	40.88	851.46	
	K22+480		4.16				
		10.00		36.95	36.95	888.41	
	K22+490		3.23				
		10.00		29.86	29.86	918.26	
	K22+500		2.74				
		10.00		21.98	21.98	940.24	
	K22+510		1.66				
		10.00		17.57	17.57	957.81	
	K22+520		1.86				
		10.00		18.98	18.98	976.78	
	K22+530		1.94				
		10.00		18.03	18.03	994.81	
	K22+540		1.67				
		10.00		15.77	15.77	1010.57	
	K22+550		1.49				
		10.00		19.65	19.65	1030.22	
	K22+560		2.44				
		10.00		20.07	20.07	1050.29	
	K22+570		1.57				
		10.00		16.78	16.78	1067.07	
	K22+580		1.78				
		10.00		22.51	22.51	1089.58	
	K22+590		2.72				
		10.00		21.94	21.94	1111.51	
	K22+600		1.67				
		10.00		15.13	15.13	1126.64	
	K22+610		1.36				
		10.00		19.73	19.73	1146.37	
	K22+620		2.59				
		10.00		24.24	24.24	1170.61	
	K22+630		2.26				
		10.00		24.56	24.56	1195.16	
	K22+640		2.65				
		10.00		20.40	20.40	1215.56	
	K22+650		1.43				
		10.00		14.72	14.72	1230.28	
	K22+660		1.52				
		10.00		13.02	13.02	1243.29	
	K22+670		1.09				
		10.00		13.56	13.56	1256.85	
	K22+680		1.63				
		10.00		14.75	14.75	1271.59	
	K22+690		1.32				
		10.00		13.55	13.55	1285.14	
	K22+700		1.39				
		10.00		22.31	22.31	1307.45	
	K22+710		3.08				
		10.00		34.48	34.48	1341.93	
	K22+720		3.82				
		10.00		36.21	36.21	1378.14	

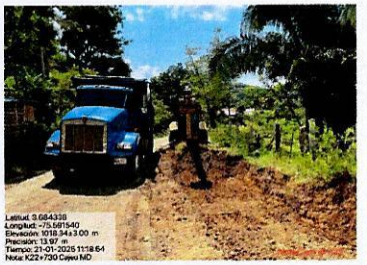

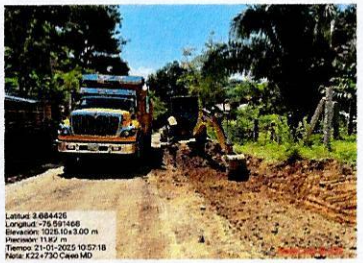




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**			
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
			AREA	VOL			
	K22+730		3.42				
		10.00		33.64	33.64	1411.78	
	K22+740		3.31				
		10.00		31.69	31.69	1443.47	
	K22+750		3.03				
		10.00		34.08	34.08	1477.54	
	K22+760		3.78				
		10.00		37.30	37.30	1514.84	
	K22+770		3.68				
		10.00		36.99	36.99	1551.83	
	K22+780		3.72				
		10.00		34.53	34.53	1586.35	
	K22+790		3.19				
		10.00		37.61	37.61	1623.96	
	K22+800		4.34				
		10.00		50.77	50.77	1674.73	
	K22+810		5.82				
		10.00		41.70	41.70	1716.43	
	K22+820		2.52				
		10.00		35.83	35.83	1752.26	
	K22+830		4.64				
		10.00		44.56	44.56	1796.82	
	K22+840		4.27				
		10.00		44.66	44.66	1841.48	
	K22+850		4.66				
		10.00		42.30	42.30	1883.77	
	K22+860		3.80				
		10.00		40.97	40.97	1924.74	
	K22+870		4.40				
		10.00		46.93	46.93	1971.66	
	K22+880		4.99				
		10.00		56.46	56.46	2028.12	
	K22+890		6.30				
		10.00		57.91	57.91	2086.03	
	K22+900		5.28				
		10.00		52.51	52.51	2138.53	
	K22+910		5.22				
		10.00		53.27	53.27	2191.80	
	K22+920		5.43				
		10.00		49.80	49.80	2241.60	
	K22+930		4.53				
		10.00		43.06	43.06	2284.66	
	K22+940		4.08				
		10.00		42.91	42.91	2327.56	
	K22+950		4.50				
		10.00		40.88	40.88	2368.44	
	K22+960		3.68				
		10.00		40.93	40.93	2409.37	
	K22+970		4.51				
		10.00		42.04	42.04	2451.41	
	K22+980		3.90				
		10.00		41.00	41.00	2492.41	
	K22+990		4.30				
		10.00		46.49	46.49	2538.89	
	K23+000		5.00				
		10.00		24.99	24.99	2563.88	
	K23+010		0.00				



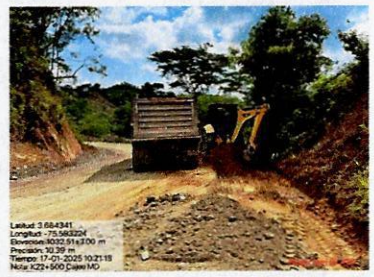

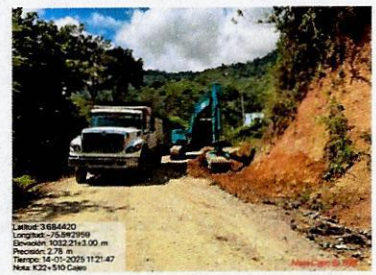

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**ABSCISADO REFERENCIA**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**VOLUMEN (M3)**	**TOTAL ACUMULADO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	ABSCISA	**DISTANCIA**	**EXCAVACION**				
			AREA	**VOL**			
		130.00		0.00	0.00	2563.88	
	K23+140		0.00				
		10.00		20.30	20.30	2584.17	
	K23+150		4.06				
		10.00		42.49	42.49	2626.66	
	K23+160		4.44				
		10.00		42.46	42.46	2669.12	
	K23+170		4.05				
		10.00		40.91	40.91	2710.02	
	K23+180		4.13				
		10.00		39.90	39.90	2749.92	
	K23+190		3.85				
		10.00		37.18	37.18	2787.10	
	K23+200		3.59				
		10.00		37.28	37.28	2824.38	
	K23+210		3.87				
		10.00		41.08	41.08	2865.46	
	K23+220		4.35				
		10.00		48.08	48.08	2913.53	
	K23+230		5.27				
		10.00		47.75	47.75	2961.28	
	K23+240		4.28				
		10.00		42.12	42.12	3003.40	
	K23+250		4.14				
		10.00		40.72	40.72	3044.11	
	K23+260		4.00				
		10.00		40.25	40.25	3084.36	
	K23+270		4.05				
		10.00		43.11	43.11	3127.47	
	K23+280		4.57				
		10.00		47.53	47.53	3175.00	
	K23+290		4.93				
		10.00		44.60	44.60	3219.60	
	K23+300		3.99				
		10.00		40.79	40.79	3260.38	
	K23+310		4.17				
		10.00		42.86	42.86	3303.24	
	K23+320		4.40				
		10.00		43.35	43.35	3346.59	
	K23+330		4.27				
		10.00		43.97	43.97	3390.56	
	K23+340		4.53				
		10.00		43.86	43.86	3434.42	
	K23+350		4.25				
		10.00		42.95	42.95	3477.37	
	K23+360		4.34				
		10.00		46.80	46.80	3524.16	
	K23+370		5.02				
		10.00		46.12	46.12	3570.28	
	K23+380		4.21				
		10.00		42.91	42.91	3613.19	
	K23+390		4.37				
		10.00		21.87	21.87	3635.06	
	K23+400		0.00				
		10.00		0.00	0.00	3635.06	
	K23+410		0.00				







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**			
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA ABSCISA	LONGITUD DISTANCIA	ANCHO EXCAVACION AREA	ALTO EXCAVACION VOL	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ICARCO	K36+360		0.00				
		10.00		0.00	0.00	3635.06	
	K36+370		0.00				
		10.00		13.90	13.90	3648.95	
	K36+380		2.78				
		10.00		25.67	25.67	3674.62	
	K36+390		2.36				
		10.00		26.92	26.92	3701.54	
	K36+400		3.03				
		10.00		42.32	42.32	3743.85	
	K36+410		5.44				
		10.00		51.51	51.51	3795.36	
	K36+420		4.87				
		10.00		48.32	48.32	3843.67	
	K36+430		4.80				
		10.00		48.04	48.04	3891.71	
	K36+440		4.81				
		10.00		48.04	48.04	3939.74	
	K36+450		4.80				
		10.00		23.99	23.99	3963.73	
	K36+460		0.00				
ICARCO (MODIFICACIÒN DE DISEÑO AJUSTE VIVIENDA)	K37+210		1.57				
		10.00		15.68	15.68	3979.40	
	K37+220		1.57				
		10.00		15.40	15.40	3994.80	
	K37+230		1.51				
		10.00		15.73	15.73	4010.52	
	K37+240		1.63				
		10.00		15.61	15.61	4026.13	
	K37+250		1.49				
		10.00		14.87	14.87	4041.00	
	K37+260		1.49				
		10.00		14.74	14.74	4055.74	
	K37+270		1.46				
		10.00		20.85	20.85	4076.59	
	K37+280		2.71				
		10.00		25.79	25.79	4102.37	
	K37+290		2.45				
		10.00		18.39	18.39	4120.76	
	K37+300		1.23				
		10.00		12.29	12.29	4133.05	
	K37+310		1.23				
		10.00		12.28	12.28	4145.32	
	K37+320		1.23				
		10.00		12.22	12.22	4157.54	
	K37+330		1.22				
		10.00		10.99	10.99	4168.53	
	K37+340		0.98				
		10.00		10.83	10.83	4179.36	
	K37+350		1.19				
		10.00		11.99	11.99	4191.34	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** / ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22** / **PERIODO MARZO 2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales / **UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
			AREA	VOL			
	K37+360		1.21				
		10.00		11.85	11.85	4203.19	
	K37+370		1.16				
		10.00		11.62	11.62	4214.81	
	K37+380		1.17				
		10.00		11.37	11.37	4226.18	
	K37+390		1.11				
		10.00		10.61	10.61	4236.79	
	K37+400		1.01				
		10.00		10.65	10.65	4247.43	
	K37+410		1.12				
		10.00		11.50	11.50	4258.93	
	K37+420		1.19				
		10.00		5.93	5.93	4264.86	
	K37+430		0.00				
	K38+110		1.70				
		10.00		17.35	17.35	4282.21	
	K38+120		1.77				
		10.00		18.08	18.08	4300.29	
	K38+130		1.84				
		10.00		47.31	47.31	4347.60	
	K38+140		7.62				
		10.00		76.40	76.40	4424.00	
	K38+150		7.66				
		10.00		81.36	81.36	4505.36	
	K38+160		8.61				
		10.00		59.00	59.00	4564.36	
	K38+170		3.19				
		10.00		25.68	25.68	4590.03	
	K38+180		1.95				
		10.00		26.37	26.37	4616.40	
	K38+190		3.33				
		10.00		49.60	49.60	4666.00	
	K38+200		6.59				
		10.00		53.11	53.11	4719.11	
	K38+210		4.03				
		10.00		44.15	44.15	4763.26	
	K38+220		4.80				
		10.00		42.57	42.57	4805.82	
	K38+230		3.71				
		10.00		37.00	37.00	4842.82	
	K38+240		3.69				
		10.00		36.42	36.42	4879.24	
	K38+250		3.60				
		10.00		32.39	32.39	4911.63	
	K38+260		2.88				
		10.00		28.52	28.52	4940.15	
	K38+270		2.82				
		10.00		29.97	29.97	4970.12	
	K38+280		3.17				
		10.00		30.72	30.72	5000.84	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capítulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**ABSCISADO REFERENCIA**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**VOLUMEN (M3)**	**TOTAL ACUMULADO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	ABSCISA	**DISTANCIA**	**EXCAVACION**				
			AREA	**VOL**			
TRAMO 2 - EL VISO NIVELACIÒN SUBRASANTE	K38+290		2.97				
		10.00		33.72	33.72	5034.55	
	K38+300		3.77				
		10.00		37.02	37.02	5071.57	
	K38+310		3.64				
		10.00		36.32	36.32	5107.89	
	K38+320		3.63				
		10.00		38.16	38.16	5146.05	
	K38+330		4.00				
		10.00		40.39	40.39	5186.44	
	K38+340		4.07				
		10.00		35.36	35.36	5221.79	
	K38+350		3.00				
		10.00		32.80	32.80	5254.59	
	K38+360		3.56				
		10.00		34.00	34.00	5288.59	
	K38+370		3.24				
		10.00		32.80	32.80	5321.39	
	K38+380		3.32				
		10.00		34.35	34.35	5355.74	
	K38+390		3.55				
		10.00		34.89	34.89	5390.63	
	K38+400		3.43				
		10.00		34.17	34.17	5424.80	
	K38+410		3.40				
		10.00		32.14	32.14	5456.93	
	K38+420		3.03				
		10.00		31.84	31.84	5488.77	
	K38+430		3.34				
		10.00		31.15	31.15	5519.92	
	K38+440		2.89				
		10.00		34.66	34.66	5554.58	
	K38+450		4.05				
		10.00		37.95	37.95	5592.53	
	K38+460		3.54				
		10.00		36.61	36.61	5629.13	
	K38+470		3.78				
		10.00		34.41	34.41	5663.54	
	K38+480		3.11				
		10.00		33.18	33.18	5696.72	
	K38+490		3.53				
		10.00		32.24	32.24	5728.96	
	K38+500		2.92				
		10.00		29.68	29.68	5758.64	
	K38+510		3.02				
		10.00		32.11	32.11	5790.74	
	K38+520		3.40				
		10.00		31.69	31.69	5822.43	
	K38+530		2.93				
		10.00		27.28	27.28	5849.70	
	K38+540		2.52				
		10.00		32.85	32.85	5882.55	
	K38+550		4.05				
		10.00		44.22	44.22	5926.76	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Río Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**ABSCISADO REFERENCIA**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**VOLUMEN (M3)**	**TOTAL ACUMULADO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	ABSCISA	**DISTANCIA**	**EXCAVACION**				
			AREA	**VOL**			
	K38+560		4.80				
		10.00		39.33	39.33	5966.09	
	K38+570		3.07				
		10.00		31.43	31.43	5997.52	
	K38+580		3.22				
		10.00		36.93	36.93	6034.45	
	K38+590		4.17				
		10.00		40.72	40.72	6075.16	
	K38+600		3.97				
		10.00		42.30	42.30	6117.46	
	K38+610		4.49				
		10.00		43.27	43.27	6160.73	
	K38+620		4.17				
		10.00		44.82	44.82	6205.54	
	K38+630		4.80				
		10.00		47.47	47.47	6253.01	
	K38+640		4.70				
		10.00		49.20	49.20	6302.21	
	K38+650		5.14				
		10.00		52.13	52.13	6354.33	
	K38+660		5.28				
		10.00		26.41	26.41	6380.74	
	K38+670		0.00				
	K38+740		0.00				
		10.00		17.07	17.07	6397.80	
	K38+750		3.41				
		10.00		42.82	42.82	6440.62	
	K38+760		5.15				
		10.00		41.62	41.62	6482.23	
	K38+770		3.17				
		10.00		31.99	31.99	6514.22	
	K38+780		3.22				
		10.00		34.88	34.88	6549.10	
	K38+790		3.75				
		10.00		38.55	38.55	6587.64	
	K38+800		3.96				
		10.00		39.73	39.73	6627.37	
	K38+810		3.99				
		10.00		40.04	40.04	6667.41	
	K38+820		4.02				
		10.00		40.26	40.26	6707.66	
	K38+830		4.03				
		10.00		56.69	56.69	6764.35	
	K38+840		7.31				
		10.00		51.84	51.84	6816.19	
	K38+850		3.06				
		10.00		27.10	27.10	6843.28	
EL VISO MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE	K38+860		2.36				
		10.00		27.57	27.57	6870.85	
	K38+870		3.16				
		10.00		38.01	38.01	6908.86	
	K38+880		4.45				
		10.00		38.06	38.06	6946.92	
	K38+890		3.17				





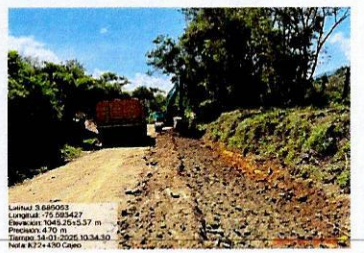

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2024**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ABSCISA		DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
		10.00		40.42	40.42	6987.34	
	K38+900		4.92				
		10.00		55.12	55.12	7042.46	
	K38+910		6.11				
		10.00		64.38	64.38	7106.84	
	K38+920		6.77				
		10.00		75.19	75.19	7182.03	
	K38+930		8.27				
		10.00		88.26	88.26	7270.29	
	K38+940		9.38				
		10.00		90.59	90.59	7360.88	
	K38+950		8.74				
		10.00		85.07	85.07	7445.95	
	K38+960		8.28				
		10.00		41.39	41.39	7487.34	
	K38+970		0.00				
		10.00		0.00	0.00	7487.34	

Cantidad Acumulada Redondeada	**7,487.34**
Cantidad Paga Actas Anteriores	**-**
Cantidad Para Pago Presente Acta	**7,487.00**

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: FREDY CORTÉS RUBIO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ


DIRECTOR DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Río Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**ABSCISADO REFERENCIA**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**VOLUMEN (M3)**	**TOTAL ACUMULADO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		ABSCISA	**DISTANCIA**	**EXCAVACION**				
				AREA	VOL			
HELECHAL MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE		K22+210		3.27				
			10.00		32.06	32.06	32.06	
		K22+220		3.14				
			10.00		30.37	30.37	62.43	
		K22+230		2.93				
			10.00		28.92	28.92	91.34	
		K22+240		2.85				
			10.00		28.57	28.57	119.91	
		K22+250		2.86				
			10.00		25.21	25.21	145.12	
		K22+260		2.18				
			10.00		21.51	21.51	166.63	
		K22+270		2.12				
			10.00		23.18	23.18	189.81	
		K22+280		2.52				
			10.00		25.08	25.08	214.89	
		K22+290		2.50				
			10.00		27.73	27.73	242.61	
		K22+300		3.05				
			10.00		30.43	30.43	273.04	
		K22+310		3.04				
			10.00		29.88	29.88	302.92	
		K22+320		2.93				
			10.00		33.23	33.23	336.15	
		K22+330		3.71				
			10.00		34.64	34.64	370.79	
		K22+340		3.22				
			10.00		26.41	26.41	397.20	
		K22+350		2.07				
			10.00		22.56	22.56	419.76	
		K22+360		2.45				
			10.00		18.63	18.63	438.39	
		K22+370		1.28				
			10.00		20.24	20.24	458.62	
		K22+380		2.77				
			10.00		25.30	25.30	483.92	
		K22+390		2.29				
			10.00		20.83	20.83	504.75	
		K22+400		1.87				
			10.00		22.27	22.27	527.01	
		K22+410		2.58				
			10.00		22.91	22.91	549.92	
		K22+420		2.00				
			10.00		21.57	21.57	571.48	
		K22+430		2.31				
			10.00		24.54	24.54	596.02	
		K22+440		2.60				
			10.00		29.16	29.16	625.18	
		K22+450		3.23				
			10.00		42.98	42.98	668.16	

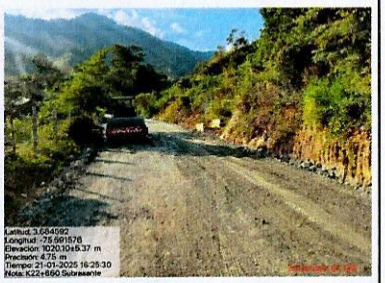



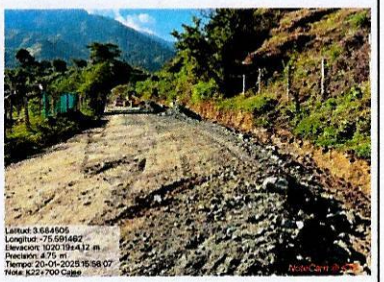





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
		K22+460		5.36				
			10.00		52.38	52.38	720.53	
		K22+470		5.11				
			10.00		52.27	52.27	772.80	
		K22+480		5.34				
			10.00		50.10	50.10	822.90	
		K22+490		4.68				
			10.00		37.58	37.58	860.48	
		K22+500		2.84				
			10.00		22.57	22.57	883.05	
		K22+510		1.68				
			10.00		19.39	19.39	902.43	
		K22+520		2.20				
			10.00		26.96	26.96	929.39	
		K22+530		3.19				
			10.00		31.58	31.58	960.97	
		K22+540		3.13				
			10.00		29.52	29.52	990.49	
		K22+550		2.78				
			10.00		29.14	29.14	1019.63	
		K22+560		3.05				
			10.00		27.36	27.36	1046.99	
		K22+570		2.42				
			10.00		23.00	23.00	1069.98	
		K22+580		2.18				
			10.00		21.95	21.95	1091.93	
		K22+590		2.21				
			10.00		21.62	21.62	1113.55	
		K22+600		2.11				
			10.00		22.00	22.00	1135.54	
		K22+610		2.29				
			10.00		31.99	31.99	1167.53	
		K22+620		4.11				
			10.00		39.70	39.70	1207.23	
		K22+630		3.83				
			10.00		36.96	36.96	1244.19	
		K22+640		3.56				
			10.00		27.18	27.18	1271.36	
		K22+650		1.87				
			10.00		20.30	20.30	1291.66	
		K22+660		2.19				
			10.00		22.32	22.32	1313.98	
		K22+670		2.28				
			10.00		23.66	23.66	1337.64	
		K22+680		2.46				
			10.00		23.26	23.26	1360.90	
		K22+690		2.20				
			10.00		24.86	24.86	1385.75	
		K22+700		2.78				
			10.00		37.18	37.18	1422.93	



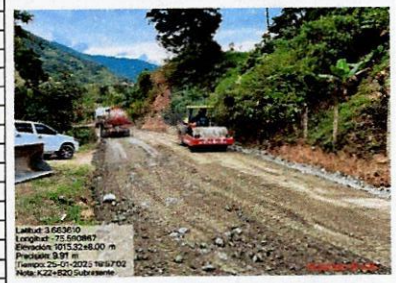

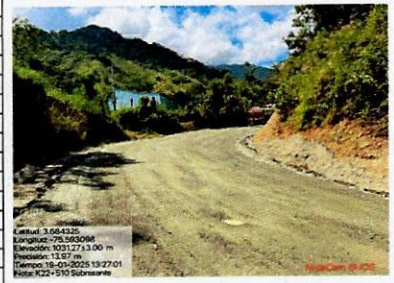





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**ABSCISADO REFERENCIA**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**VOLUMEN (M3)**	**TOTAL ACUMULADO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		ABSCISA	**DISTANCIA**	**EXCAVACION**				
				AREA	VOL			
HELECHAL MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	K22+710			4.66				
			10.00		42.50	42.50	1465.43	
	K22+720			3.84				
			10.00		41.13	41.13	1506.56	
	K22+730			4.39				
			10.00		43.85	43.85	1550.41	
	K22+740			4.38				
			10.00		40.08	40.08	1590.49	
	K22+750			3.63				
			10.00		42.48	42.48	1632.96	
	K22+760			4.86				
			10.00		47.88	47.88	1680.84	
	K22+770			4.71				
			10.00		44.48	44.48	1725.31	
	K22+780			4.18				
			10.00		33.54	33.54	1758.85	
	K22+790			2.52				
			10.00		30.07	30.07	1788.91	
	K22+800			3.49				
			10.00		37.39	37.39	1826.30	
	K22+810			3.99				
			10.00		33.75	33.75	1860.05	
	K22+820			2.76				
			10.00		37.78	37.78	1897.83	
	K22+830			4.79				
			10.00		46.93	46.93	1944.75	
	K22+840			4.59				
			10.00		47.52	47.52	1992.27	
	K22+850			4.91				
			10.00		47.88	47.88	2040.15	
	K22+860			4.66				
			10.00		47.30	47.30	2087.44	
	K22+870			4.80				
			10.00		48.80	48.80	2136.24	
	K22+880			4.96				
			10.00		49.10	49.10	2185.34	
	K22+890			4.86				
			10.00		48.88	48.88	2234.21	
	K22+900			4.92				
			10.00		46.84	46.84	2281.05	
	K22+910			4.45				
			10.00		46.17	46.17	2327.22	
	K22+920			4.78				
			10.00		48.99	48.99	2376.21	
	K22+930			5.01				
			10.00		51.01	51.01	2427.22	
	K22+940			5.19				
			10.00		49.89	49.89	2477.11	
	K22+950			4.79				
			10.00		46.17	46.17	2523.27	
	K22+960			4.44				
			10.00		50.25	50.25	2573.52	
	K22+970			5.61				
			10.00		51.43	51.43	2624.95	
	K22+980			4.68				



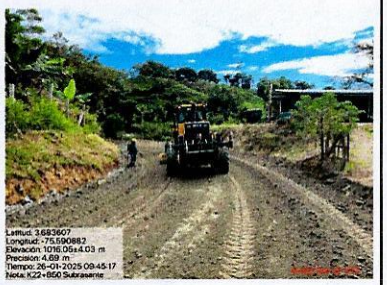

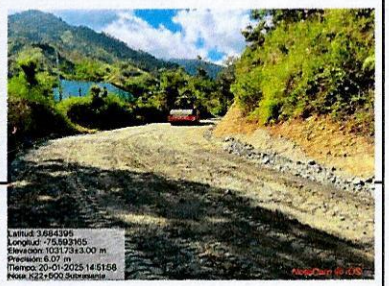



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
			10.00		45.02	45.02	2669.97	
		K22+990		4.33				
			10.00		44.05	44.05	2714.01	
		K23+000		4.48				
			10.00		22.42	22.42	2736.43	
		K23+010		0.00				
			10.00		0.00	0.00	2736.43	
		K23+140		0.00				
			10.00		27.75	27.75	2764.17	
		K23+150		5.55				
			10.00		54.24	54.24	2818.41	
		K23+160		5.30				
			10.00		46.77	46.77	2865.18	
		K23+170		4.06				
			10.00		41.12	41.12	2906.29	
		K23+180		4.17				
			10.00		44.28	44.28	2950.57	
		K23+190		4.69				
			10.00		50.34	50.34	3000.91	
		K23+200		5.38				
			10.00		57.20	57.20	3058.11	
		K23+210		6.06				
			10.00		57.46	57.46	3115.56	
		K23+220		5.43				
			10.00		55.36	55.36	3170.92	
		K23+230		5.64				
			10.00		55.54	55.54	3226.46	
		K23+240		5.46				
			10.00		54.73	54.73	3281.18	
		K23+250		5.48				
			10.00		53.23	53.23	3334.41	
		K23+260		5.16				
			10.00		50.99	50.99	3385.40	
		K23+270		5.03				
			10.00		51.23	51.23	3436.63	
		K23+280		5.21				
			10.00		58.03	58.03	3494.65	
		K23+290		6.39				
			10.00		68.70	68.70	3563.35	
		K23+300		7.35				
			10.00		70.91	70.91	3634.26	
		K23+310		6.84				
			10.00		63.83	63.83	3698.08	
		K23+320		5.93				
			10.00		54.57	54.57	3752.65	
		K23+330		4.98				
			10.00		52.30	52.30	3804.95	
		K23+340		5.48				
			10.00		51.38	51.38	3856.33	
		K23+350		4.80				
			10.00		44.24	44.24	3900.57	
		K23+360		4.05				
			10.00		41.93	41.93	3942.50	
		K23+370		4.34				
			10.00		41.76	41.76	3984.25	
		K23+380		4.01				
			10.00		43.82	43.82	4028.07	

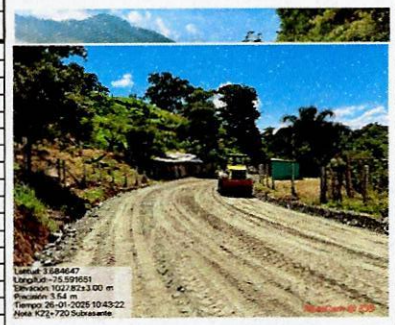

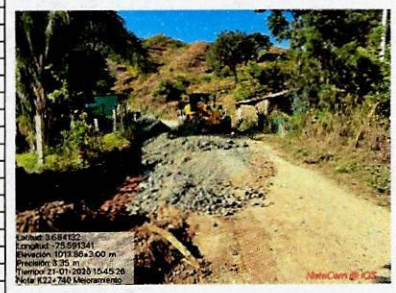

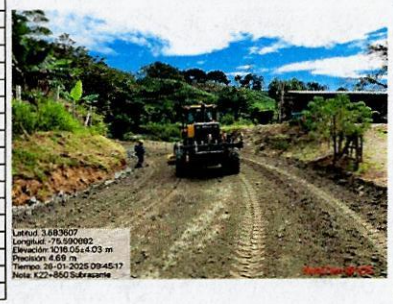

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3


LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
		K23+390		4.75				
			10.00		23.75	23.75	4051.82	
		K23+400		0.00				
			10.00		0.00	0.00	4051.82	
		K23+410		0.00				
MANTENIMIENTO (BALASTRERA)						103.85	4155.66	
		K36+360		0.00				
			10.00		0.00	0.00	4155.66	
		K36+370		0.00				
			10.00		21.65	21.65	4177.31	
		K36+380		4.33				
			10.00		38.39	38.39	4215.70	
		K36+390		3.35				
			10.00		30.07	30.07	4245.76	
		K36+400		2.66				
			10.00		29.96	29.96	4275.72	
		K36+410		3.33				
			10.00		29.01	29.01	4304.73	
		K36+420		2.48				
			10.00		26.73	26.73	4331.46	
		K36+430		2.87				
			10.00		29.18	29.18	4360.63	
		K36+440		2.96				
			10.00		29.18	29.18	4389.81	
		K36+450		2.87				
			10.00		14.36	14.36	4404.16	
		K36+460		0.00				
		K37+210		1.57				
			10.00		15.68	15.68	4419.84	
		K37+220		1.57				
			10.00		15.40	15.40	4435.23	
		K37+230		1.51				
			10.00		15.73	15.73	4450.96	
		K37+240		1.63				
			10.00		15.61	15.61	4466.56	
		K37+250		1.49				
			10.00		14.87	14.87	4481.43	
		K37+260		1.49				
			10.00		14.74	14.74	4496.17	
		K37+270		1.46				
			10.00		18.90	18.90	4515.07	
		K37+280		2.32				
			10.00		23.74	23.74	4538.80	
		K37+290		2.43				
			10.00		18.29	18.29	4557.09	
		K37+300		1.23				
			10.00		12.29	12.29	4569.38	
		K37+310		1.23				
			10.00		12.28	12.28	4581.66	
ICARCO MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE								
ICARCO (MODIFICACIÒN DE DISEÑO AJUSTE		K37+320		1.23				









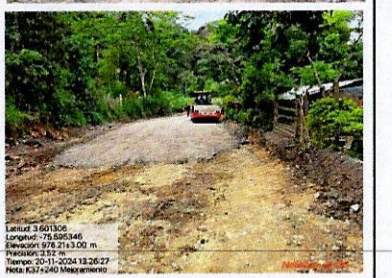

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** ING JULIO GALLO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22 — PERIODO MARZO 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capítulo 1. Explanaciones — **DESCRIPCION**: 7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)		**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
VIVIENDA)			10.00		12.22	12.22	4593.88	
		K37+330		1.22				
			10.00		10.99	10.99	4604.87	
		K37+340		0.98				
			10.00		10.83	10.83	4615.69	
		K37+350		1.19				
			10.00		11.99	11.99	4627.68	
		K37+360		1.21				
			10.00		11.85	11.85	4639.52	
		K37+370		1.16				
			10.00		11.62	11.62	4651.14	
		K37+380		1.17				
			10.00		11.37	11.37	4662.51	
		K37+390		1.11				
			10.00		10.61	10.61	4673.12	
		K37+400		1.01				
			10.00		10.65	10.65	4683.77	
		K37+410		1.12				
			10.00		11.50	11.50	4695.27	
		K37+420		1.19				
			10.00		5.93	5.93	4701.19	
		K37+430		0.00				
		K38+110		2.23				
			10.00		22.29	22.29	4723.48	
		K38+120		2.22				
			10.00		23.47	23.47	4746.95	
		K38+130		2.47				
			10.00		20.20	20.20	4767.15	
		K38+140		1.57				
			10.00		15.36	15.36	4782.51	
		K38+150		1.50				
			10.00		19.44	19.44	4801.95	
		K38+160		2.39				
			10.00		24.41	24.41	4826.36	
		K38+170		2.50				
			10.00		24.65	24.65	4851.01	
		K38+180		2.43				
			10.00		38.80	38.80	4889.80	
		K38+190		5.33				
			10.00		57.38	57.38	4947.18	
		K38+200		6.15				
			10.00		57.27	57.27	5004.44	
		K38+210		5.30				
			10.00		51.70	51.70	5056.14	
		K38+220		5.04				
			10.00		52.45	52.45	5108.59	
		K38+230		5.45				
			10.00		57.58	57.58	5166.17	
		K38+240		6.06				


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Río Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
				AREA	VOL			
TRAMO 2 -EL VISO NIVELACIÒN SUBRASANTE			10.00		60.45	60.45	5226.62	
		K38+250		6.03				
			10.00		57.84	57.84	5284.45	
		K38+260		5.54				
			10.00		53.71	53.71	5338.16	
		K38+270		5.20				
			10.00		53.41	53.41	5391.57	
		K38+280		5.48				
			10.00		53.80	53.80	5445.37	
		K38+290		5.28				
			10.00		54.41	54.41	5499.78	
		K38+300		5.60				
			10.00		55.57	55.57	5555.35	
		K38+310		5.51				
			10.00		56.27	56.27	5611.62	
		K38+320		5.74				
			10.00		57.46	57.46	5669.07	
		K38+330		5.75				
			10.00		55.88	55.88	5724.95	
		K38+340		5.42				
			10.00		54.54	54.54	5779.49	
		K38+350		5.49				
			10.00		55.77	55.77	5835.25	
		K38+360		5.67				
			10.00		56.82	56.82	5892.07	
		K38+370		5.70				
			10.00		57.64	57.64	5949.71	
		K38+380		5.83				
			10.00		56.39	56.39	6006.10	
		K38+390		5.45				
			10.00		53.88	53.88	6059.98	
		K38+400		5.33				
			10.00		54.45	54.45	6114.43	
		K38+410		5.56				
			10.00		51.48	51.48	6165.90	
		K38+420		4.74				
			10.00		46.46	46.46	6212.36	
		K38+430		4.56				
			10.00		47.17	47.17	6259.52	
		K38+440		4.88				
			10.00		53.75	53.75	6313.27	
		K38+450		5.87				
			10.00		60.90	60.90	6374.17	
		K38+460		6.31				
			10.00		60.29	60.29	6434.46	
		K38+470		5.75				
			10.00		54.11	54.11	6488.57	
		K38+480		5.07				
			10.00		51.65	51.65	6540.21	
		K38+490		5.26				
			10.00		53.22	53.22	6593.43	












MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	ABSCISA	LONGITUD DISTANCIA	ANCHO EXCAVACION AREA	ALTO EXCAVACION VOL	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		K38+500		5.39				
			10.00		55.15	55.15	6648.58	
		K38+510		5.64				
			10.00		58.03	58.03	6706.60	
		K38+520		5.96				
			10.00		57.73	57.73	6764.33	
		K38+530		5.58				
			10.00		54.31	54.31	6818.64	
		K38+540		5.28				
			10.00		59.65	59.65	6878.29	
		K38+550		6.65				
			10.00		66.86	66.86	6945.15	
		K38+560		6.72				
			10.00		63.02	63.02	7008.16	
		K38+570		5.88				
			10.00		59.98	59.98	7068.14	
		K38+580		6.11				
			10.00		60.73	60.73	7128.87	
		K38+590		6.03				
			10.00		55.33	55.33	7184.20	
		K38+600		5.03				
			10.00		48.49	48.49	7232.69	
		K38+610		4.67				
			10.00		46.21	46.21	7278.90	
		K38+620		4.58				
			10.00		47.26	47.26	7326.16	
		K38+630		4.88				
			10.00		48.45	48.45	7374.60	
		K38+640		4.81				
			10.00		47.85	47.85	7422.45	
		K38+650		4.76				
			10.00		51.09	51.09	7473.54	
		K38+660		5.46				
			10.00		27.31	27.31	7500.84	
		K38+670		0.00				
MANTENIMIENTO (CALIBIO)	K33+300	K3+400				84.00	7584.84	
MANTENIMIENTO (ICARCO)	K35+000	K35+790				60.00	7644.84	
MANTENIMIENTO (HELECHALES)	K22+230	K23+400				108.00	7752.84	
		K38+750		6.06				
			10.00		64.81	64.81	7817.65	
		K38+760		6.90				
			10.00		61.48	61.48	7879.12	
		K38+770		5.40				
			10.00		54.36	54.36	7933.48	
		K38+780		5.48				
			10.00		55.93	55.93	7989.41	
		K38+790		5.71				
			10.00		49.57	49.57	8038.98	
		K38+800		4.20				
			10.00		38.18	38.18	8077.15	
		K38+810		3.43				
			10.00		35.57	35.57	8112.72	
		K38+820		3.68				

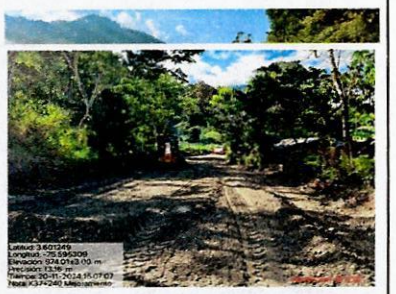



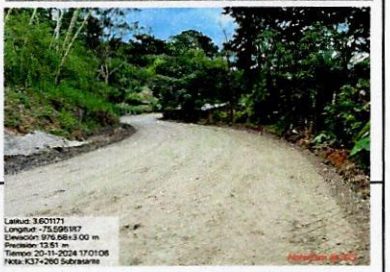




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 210.2.2	Capitulo 1. Explanaciones	**DESCRIPCION**	7. Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	**UNIDAD**	M3

EL VISO MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION				
			AREA	VOL			
		10.00		34.25	34.25	8146.97	
	K38+830		3.17				
		10.00		46.21	46.21	8193.18	
	K38+840		6.08				
		10.00		50.53	50.53	8243.71	
	K38+850		4.03				
		10.00		44.13	44.13	8287.83	
	K38+860		4.80				
		10.00		46.44	46.44	8334.27	
	K38+870		4.49				
		10.00		48.41	48.41	8382.68	
	K38+880		5.19				
		10.00		47.19	47.19	8429.87	
	K38+890		4.25				
		10.00		44.68	44.68	8474.55	
	K38+900		4.69				
		10.00		48.67	48.67	8523.21	
	K38+910		5.05				
		10.00		51.87	51.87	8575.08	
	K38+920		5.33				
		10.00		52.41	52.41	8627.49	
	K38+930		5.15				
		10.00		52.00	52.00	8679.49	
	K38+940		5.25				
		10.00		52.57	52.57	8732.06	
	K38+950		5.27				
		10.00		53.71	53.71	8785.77	
	K38+960		5.47				
		10.00		27.37	27.37	8813.14	
	K38+970		0.00				





Cantidad Acumulada Redondeada	**8,813.14**
Cantidad Paga Actas Anteriores	-
Cantidad Para Pago Presente Acta	**8,813.00**

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: FREDY CORTES RUBIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		22 de marzo de 2025	ACTA No. 22	PERIODO MARZO 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 310.1	Capitulo 2. Bases, Subbases y Afirmados	DESCRIPCION	8. Conformacion de la calzada existente	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 2 - MURO 9	K36+080		20.00	6.00		120.00	120.00	
TRAMO 2 - LIMON 1	K28+610	K28+507	103.00	7.00		721.00	841.00	
TRAMO 2 - LIMON 2	K29+300	K29+100	200.00	7.00		1400.00	2,241.00	
TRAMO 1 HELECHALES (MANTENIMIENTO)	K22+210	K22+902	692.00	8.00		5536.00	7,777.00	
TRAMO 2 ICARCO 1	K35+790	K37+160	1370.00	8.00		10960.00	18,737.00	
TRAMO 2 ICARCO 2	K37+160	K37+720	560.00	8.00		4480.00	23,217.00	
TRAMO 2 EL VISO 1	K38+200	K38+660	460.00	8.00		3680.00	26,897.00	
TRAMO 2 EL VISO 2	K38+757	K38+960	203.00	8.00		1624.00	28,521.00	
TRAMO 1 HELECHALES 1 (CEREO SUB-RASANTE)	K22+207	K23+000	793.00	8.00		6344.00	34,865.00	
TRAMO 1 HELECHALES 2 (CEREO SUB-RASANTE)	K23+135	K23+400	265.00	8.00		2120.00	36,985.00	
VENTANA EL VISO	K38+660	K38+750	90.00	6.50		585.00	37,570.00	
							-	
							-	





Cantidad Acumulada Redondeada	37,570.00
Cantidad Paga Actas Anteriores	23,217.00
Cantidad Para Pago Presente Acta	14,353.00

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: FREDY CORTES RUBIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING JULIO GALLO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		**22 de marzo de 2025**	**ACTA No. 22**	**PERIODO MARZO 2025**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 330.1	Capítulo 2. Bases, Subbases y Afirmados	**DESCRIPCION**	10. Base granular	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	TOTAL (m3)
Critico 2	K16+400	K16+782					668.50
La Guanabanera	K11+280	K12+325					1758.43
Tramo 2	K39+360	K40+040					1,193.50
CRITICO 1	K15+890	K16+040					271.25
Critico 2, Zona Cuneta	K16+640	K16+680	40.00	1.00	0.25	0.25	10.00
Tramo 2	K38+960	K39+230	248.00			1.75	434.00
	K38+960	K39+230	22.00			1.75	38.50
TRAMO 2 - ICARCO	K36+880	K36+500	380.00	7.5	0.25	1.88	712.50
	K36+370	K36+330	40.00	7.5	0.25	1.88	75.00
TRAMO 2 - ICARCO	K37+270	K36+880	390.00	7.5	0.25	1.88	731.25
	K36+500	K36+480	20.00	7.5	0.25	1.88	37.50
	K36+330	K36+070	260.00	7.5	0.25	1.88	487.50
	K36+057	K35+790	267.00	7.5	0.25	1.88	500.63
TRAMO 2 - ICARCO 2	K37+270	K37+700	430.00	7.5	0.25	1.88	806.25
TRAMO 2 - ICARCO	K36+370	K36+420	50.00	7.5	0.25	1.88	93.75
TRAMO 1 HELECHALES 1	K22+210	K23+000	790.00	7.5	0.25	1.88	1,481.25
TRAMO 1 HELECHALES 2	K23+135	K23+400	265.00	7.5	0.25	1.88	496.88
TRAMO 2 EL VISO 1	K38+200	K38+660	460.00	7.5	0.25	1.88	862.50
TRAMO 2 EL VISO 2	K38+757	K38+960	203.00	7.5	0.25	1.88	380.63

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cantidad Acumulada Redondeada	11,039.80
Cantidad Paga Actas Anteriores	6,918.55
Cantidad Para Pago Presente Acta	4,121.30

INTERVENTOR

Firma:

Nombre: FREDY CORTES RUBIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING JULIO GALLO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		22 de marzo de 2025	ACTA No. 22	PERIODO MARZO 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO	CAPITULO 2. Bases, Subbases y Afirmados	DESCRIPCION	11 - Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido (separación de granulares)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	TOTAL
TRAMO 2 - ICARCO	K36+870	K36+480	390.00	7		2,730.00	2,730.00
TRAMO 2 - ICARCO	K36+370	K36+070	300.00	7		2,100.00	4,830.00
TRAMO 2 - ICARCO	K36+057	K35+940	117.00	7		819.00	5,649.00
TRAMO 2 - ICARCO	K35+940	K35+790	150.00	7		1,050.00	6,699.00
TRAMO 2 - ICARCO	K37+203	K36+870	333.00	7		2,331.00	9,030.00
TRAMO 2 - ICARCO 2	K37+700	K37+203	497.00	7		3,479.00	12,509.00
TRAMO 2 - ICARCO	K36+370	K36+420	50.00	7		350.00	12,859.00
TRAMO 1 - HELECHALES 1	K22+210	K23+000	790.00	7		5,530.00	18,389.00
TRAMO 1 - HELECHALES 2	K23+135	K23+400	265.00	7		1,855.00	20,244.00
TRAMO 2 - EL VISO 1	K38+200	K38+660	460.00	7		3,220.00	23,464.00
TRAMO 2 - EL VISO 2	K38+757	K38+960	203.00	7		1,421.00	24,885.00
						-	-
							-
							-
							-
							-
							-

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cantidad Acumulada Redondeada	24,885.00
Cantidad Paga Actas Anteriores	9,030.00
Cantidad Para Pago Presente Acta	15,855.00

INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: FREDY CORTES RUBIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.			
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING JULIO GALLO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	22 de marzo de 2025	ACTA No. 22	PERIODO MARZO 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			
ITEM DE PAGO 420.1	CAPITULO 3. PAVIMENTOS ASFALTICOS	DESCRIPCION	12. Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	TOTAL
Critico 2	K16+400	K16+782				2,292.00	2,292.00
La Guanabanera	K11+280	K12+325				6,542.06	6,542.06
Tramo 2	K39+360	K40+042				3,702.00	3,702.00
	K39+360	K40+042				390.00	390.00
CRITICO 1	K15+890	K16+040				930.00	930.00
Tramo 2	K38+970	K39+195	MI	225	3.00	675.00	675.00
	K38+970	K39+010	MD	40	3.10	124.00	124.00
	K39+010	K39+220	MD	215	3.00	645.00	645.00
	K39+195	K39+220	MI	30	3.10	93.00	93.00
ICARCO	K37+155	K36+480		675	6.40	4,320.00	4,320.00
ICARCO	K36+367	K36+070		297	6.40	1,900.80	1,900.80
ICARCO	K36+057	K35+790		267	6.40	1,708.80	1,708.80
HELECHAL 1	K23+000	K22+207		793	6.40	5,075.20	5,075.20
HELECHAL 2	K23+140	K23+400		260	6.40	1,664.00	1,664.00
ICARCO 2	K37+155	K37+695		540	6.40	3,456.00	3,456.00
EL VISO 1	K38+200	K38+651		451	6.40	2,886.40	2,886.40
EL VISO 2	K38+762	K38+970		208	6.40	1,331.20	1,331.20
ICARCO 1	K36+367	K36+420			6.40	-	-
							-

REGISTRO FOTOGRAFICO

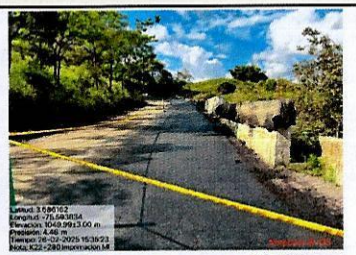

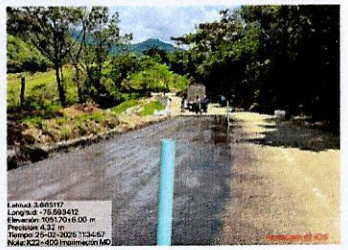

Cantidad Acumulada Redondeada	37,735.00
Cantidad Paga Actas Anteriores	23,323.00
Cantidad Para Pago Presente Acta	14,412.00

INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre:FREDY CORTES RUBIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ


DIRECTOR DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING JULIO CESAR GALLO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		22 de marzo de 2025	ACTA No. 22	PERIODO MARZO 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 683.4	Capitulo No Previstos	DESCRIPCION	NP 21 - MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	AREA SECCION	ALTO	VOLUMEN		REGISTRO FOTOGRAFICO
Critico 2	K16,400	K16+782	382.00		183.36	183.36		
La Guanabanera	K11+280	K12+325	1,045.00		514.98	514.98		
Tramo 2	K39+360	K40+040	680.00		327.36	327.36		
CRITICO 1	K15+890	K16+040	150.00		74.40	74.40		
Tramo 2	K38+970	K39+010	40.00	3.10	0.08	9.92		
Tramo 2	K39+010	K39+223	213.00	3.00	0.08	51.12		
Tramo 2	K38+970	K39+195	225.00	3.00	0.08	54.00		
Tramo 2	K39+195	K39+223	28.00	3.10	0.08	6.94		
Tramo 2 ICARCO	K37+054	K36+480	574.00	6.00	0.08	275.52		
Tramo 2 ICARCO	K36+367	K36+070	297.00	6.00	0.08	142.56		
Tramo 2 ICARCO	K36+057	K35+790	267.00	6.00	0.08	128.16		
Tramo 2 ICARCO	K37+155	K37+054	101.00	6.00	0.08	48.48		
TRAMO 1 HELECHAL	K22+207	K23+000	793.00	6.00	0.08	380.64		
TRAMO 1 HELECHAL	K23+140	K23+400	260.00	6.00	0.08	124.80		
Tramo 2 ICARCO 1	K36+367	K36+420		6.00	0.08	-		
TRAMO 2 ICARCO 2	K37+155	K37+695	540.00	6.00	0.08	259.20		
TRAMO 2 VISO 1	K38+200	K38+651	451.00	6.00	0.08	216.48		
TRAMO 2 VISO 2	K38+762	K38+970	208.00	6.00	0.08	99.84		
			Presente Acta.			2,897.80	-	
			Pago Actas Anteriores			1,768.30		
			Pago Presente Acta			1,129.50		

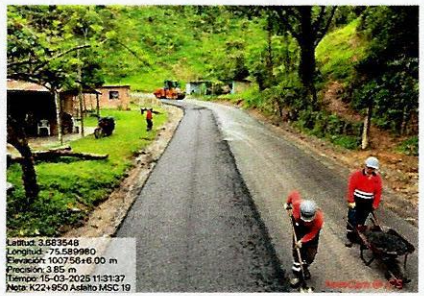

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: FREDY CORTES RUBIO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 15

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERANACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

el Tolima nos une

PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA No: 15

X

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 25 MM 2 2025

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901.505.619-5**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR : **CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5**

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACION: 26/10/2021

FECHA DE REANUDACIÓN 2: 6/05/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 69,314,039,138.76

PLAZO ACUMULADO: 38.1 meses

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2025

VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84

VALOR ADICIÓN No.2 : $ 3,152,777,269.79

VALOR ADICIÓN No.3 : $ 8,888,861,501.13

VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 23,104,679,678.76

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 14 CANTIDAD	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 14 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15 + -	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15 CANTIDAD	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15 VALOR TOTAL
VIA													
Capítulo 1. Explanaciones													
1	1P	Localización y replanteo	Ha	7.00	$ 1,150,000.00	$ 8,050,000.00	22.46	$ 25,829,000.00	-	0.05	$ 57,500.00	22.41	$ 25,771,500.00
2	201.2	Demolición de Estructuras	m3	56.00	$ 230,000.00	$ 12,880,000.00	812.32	$ 186,833,029.05	+	0.32	$ 74,170.95	812.64	$ 186,907,200.00
3	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	13,566.00	$ 95,000.00	$ 1,288,770,000.00	780.14	$ 74,113,347.50	-	780.14	$ 74,113,347.50	0.00	$ 0.00
4	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	27,132.00	$ 16,500.00	$ 447,678,000.00	18755.58	$ 309,467,070.00	+	270.43	$ 4,462,095.00	19026.01	$ 313,929,165.00
5	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	450.00	$ 13,500.00	$ 6,075,000.00	33939.00	$ 458,176,450.00	-	8,900.00	$ 120,149,950.00	25039.00	$ 338,026,500.00
6	2P	Conformación de sitios de disposicion de sobrantes	m3	50,873.00	$ 6,000.00	$ 305,238,000.00	78988.63	$ 473,931,783.00	+	10,404.03	$ 62,424,177.00	89392.66	$ 536,355,960.00
7	3P	Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	m3	26,600.00	$ 167,000.00	$ 4,442,200,000.00	37622.42	$ 6,282,944,457.39	+	8,101.05	$ 1,352,875,032.61	45723.47	$ 7,635,819,490.00
Subtotal						**$ 6,510,891,000.00**		**$ 7,811,295,136.94**			**$ 1,225,514,678.06**		**$ 9,036,809,815.00**
Capítulo 2. Bases, Subbases y Afirmados													
8	310.1	Conformacion de la calzada existente	m2	66,500.00	$ 1,300.00	$ 86,450,000.00	141112.00	$ 183,445,600.00	+	11,978.00	$ 15,571,400.00	153090.00	$ 199,017,000.00
9	320.1	Subbase granular	m3	20,249.00	$ 205,000.00	$ 4,151,045,000.00	4628.10	$ 948,760,500.00	-	4,072.00	$ 834,760,000.00	556.10	$ 114,000,500.00
10	330.1	Base granular	m3	12,642.00	$ 225,000.00	$ 2,844,450,000.00	10610.90	$ 2,387,452,500.00	+	429.01	$ 96,527,250.00	11039.91	$ 2,483,979,750.00
11		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido (separación de granulares)	m2	0.00	$ 12,000.00	$ 0.00	9030.00	$ 108,380,000.00	+	15,855.00	$ 190,260,000.00	24885.00	$ 298,620,000.00
Subtotal						**$ 7,081,945,000.00**		**$ 3,628,018,600.00**			**-$ 532,401,350.00**		**$ 3,095,617,250.00**
Capítulo 3. Pavimentos Asfalticos													
12	420.1	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	m2	44,835.00	$ 4,000.00	$ 179,340,000.00	37545.00	$ 150,180,000.00	+	562.00	$ 2,248,000.00	38107.00	$ 152,428,000.00
13	421.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	44,835.00	$ 3,500.00	$ 156,922,500.00	218.00	$ 763,000.00	=	0.00	$ 0.00	218.00	$ 763,000.00
14	450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	5,662.00	$ 1,050,000.00	$ 5,945,100,000.00	1527.00	$ 1,603,350,000.00	-	1,527.00	$ 1,603,350,000.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 6,281,362,500.00**		**$ 1,754,293,000.00**			**-$ 1,601,102,000.00**		**$ 153,191,000.00**
Capítulo 4. Estructuras para Estabilización de Taludes y Recuperación de Banca													
15	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	19,360.00	$ 53,000.00	$ 1,026,080,000.00	28142.10	$ 1,491,531,300.00	-	147.58	$ 7,821,740.00	27994.52	$ 1,483,709,560.00
16	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	35.00	$ 115,000.00	$ 4,025,000.00	30.75	$ 3,536,250.00	-	30.75	$ 3,536,250.00	0.00	$ 0.00
17	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	827.00	$ 83,000.00	$ 68,641,000.00	18.15	$ 1,506,450.00	-	10.25	$ 850,750.00	7.90	$ 655,700.00
18	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	10,500.00	$ 164,000.00	$ 1,722,000,000.00	13414.66	$ 2,200,044,240.00	-	182.03	$ 29,852,920.00	13232.63	$ 2,170,151,320.00
19	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	1,336.00	$ 980,000.00	$ 1,309,280,000.00	2875.45	$ 2,817,937,496.50	+	0.00	$ 3,503.50	2875.45	$ 2,817,941,000.00
20	621.1P	Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C, incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	1,850.00	$ 2,800,000.00	$ 5,180,000,000.00	5457.17	$ 15,280,066,874.41	+	0.00	$ 9,125.59	5457.17	$ 15,280,076,000.00
21	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	4,300.00	$ 920,000.00	$ 3,956,000,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
22	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	251.00	$ 700,000.00	$ 175,700,000.00	166.57	$ 116,599,000.00	=	0.00	$ 0.00	166.57	$ 116,599,000.00
23	630.7	Concreto clase G	m3	1,200.00	$ 530,000.00	$ 636,000,000.00	6.40	$ 3,392,000.00	=	0.00	$ 0.00	6.40	$ 3,392,000.00
24	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	358,788.00	$ 8,000.00	$ 2,870,144,000.00	804021.25	$ 6,432,170,000.00	=	0.00	$ 0.00	804021.25	$ 6,432,170,000.00
25	673.2	Material Granular Drenante	m3	2,800.00	$ 175,000.00	$ 490,000,000.00	39.00	$ 6,825,000.00	=	0.00	$ 0.00	39.00	$ 6,825,000.00
26	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	19,950.00	$ 12,000.00	$ 239,400,000.00	80.00	$ 960,000.00	=	0.00	$ 0.00	80.00	$ 960,000.00
27	663.1.1P	Tubería perforada diametro 4"	m		$ 81,000.00	$ 0.00	857.60	$ 69,465,600.00	-	61.00	$ 4,941,000.00	796.60	$ 64,524,600.00
28	681.1	Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	825.00	$ 350,000.00	$ 288,750,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
29	674.1P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	800.00	$ 245,000.00	$ 196,000,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 18,162,020,000.00**		**$ 28,423,994,210.91**			**-$ 46,990,030.91**		**$ 28,377,004,180.00**
Capítulo 5. Drenajes													
30	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	700.00	$ 57,000.00	$ 39,900,000.00	13710.58	$ 781,502,960.25	+	375.47	$ 21,401,889.75	14086.05	$ 802,904,850.00
31	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	10.00	$ 115,000.00	$ 1,150,000.00	144.69	$ 16,639,177.50	-	71.68	$ 8,243,027.50	73.01	$ 8,396,150.00
32	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	50.00	$ 83,000.00	$ 4,150,000.00	48.00	$ 3,984,000.00	-	8.60	$ 547,800.00	41.40	$ 3,436,200.00
33	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	310.00	$ 179,000.00	$ 55,490,000.00	9222.47	$ 1,650,822,130.00	+	739.43	$ 132,357,970.00	9961.90	$ 1,783,180,100.00
34	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	150.00	$ 959,000.00	$ 143,850,000.00	30.22	$ 28,985,583.20	-	0.00	$ 4,603.20	30.22	$ 28,980,980.00
35	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	0.00	$ 980,000.00	$ 0.00	1132.40	$ 1,109,747,100.00	+	6.15	$ 6,031,900.00	1138.55	$ 1,115,779,000.00
36	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	75.00	$ 700,000.00	$ 52,500,000.00	206.68	$ 144,675,300.00	-	3.13	$ 2,190,300.00	203.55	$ 142,485,000.00
37	630.7	Concreto clase G	m3	246.00	$ 550,000.00	$ 135,300,000.00	72.50	$ 39,875,000.00	-	36.00	$ 19,800,000.00	36.50	$ 20,075,000.00
38	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	8,000.00	$ 8,100.00	$ 64,800,000.00	75372.95	$ 610,520,895.00	+	793.90	$ 6,430,590.00	76166.85	$ 616,951,485.00
39	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	225.00	$ 805,000.00	$ 181,125,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
40	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	m3	680.00	$ 880,000.00	$ 598,400,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
41	673.2	Material Granular Drenante	m3	350.00	$ 182,000.00	$ 63,700,000.00	4436.25	$ 807,397,500.00	-	146.13	$ 26,595,660.00	4290.12	$ 780,801,840.00
42	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	3,950.00	$ 12,000.00	$ 47,400,000.00	12033.00	$ 144,396,000.00	=	0.00	$ 0.00	12033.00	$ 144,396,000.00
43	663.1.1P	Tubería de PVC perforada D=4"	m	0.00	$ 81,000.00	$ 0.00	8162.50	$ 661,162,500.00	-	1,084.50	$ 87,844,500.00	7078.00	$ 573,318,000.00
44	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3		$ 75,000.00	$ 0.00	1018.00	$ 76,350,000.00	-	1,018.00	$ 76,350,000.00	0.00	$ 0.00
45	320.1	Subbase granular	m3	0.00	$ 205,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERANACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

el Tolima nos une

PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT** — ACTA No: **15** — X — FECHA DE ELABORACIÓN: DD 25 MM 2 2025

CONTRATO DE OBRA No :
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901.505.619-5**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
INTERVENTOR : **CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5**

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIACION: 26/10/2021
FECHA DE REANUDACIÓN 2: 6/05/2024
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 69,314,039,138.76

PLAZO ACUMULADO: 38.1 meses
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2025
VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84
VALOR ADICIÓN No.2 : $ 3,152,777,269.79
VALOR ADICIÓN No.3 : $ 8,888,861,501.13
VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 23,104,679,678.76

CONDICIONES ORIGINALES							PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 14		MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal						$ 1,387,765,000.00		$ 6,076,058,145.95			-$ 55,353,540.95		$ 6,020,704,605.00
Capitulo 6. Señalización y Seguridad													
46	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	21,000.00	$ 2,800.00	$ 58,800,000.00	22304.00	$ 62,451,200.00	-	366.00	$ 1,024,800.00	21938.00	$ 61,426,400.00
47	700.3	Marca Vial con pintura en frio	m2	500.00	$ 47,800.00	$ 23,900,000.00	486.00	$ 23,230,800.00	-	260.00	$ 12,428,000.00	226.00	$ 10,802,800.00
48	701.1	Tacha Reflectiva	Und	1,750.00	$ 14,000.00	$ 24,500,000.00	3068.00	$ 42,952,000.00	-	39.00	$ 546,000.00	3029.00	$ 42,406,000.00
49	710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	Und	50.00	$ 625,000.00	$ 31,250,000.00	213.00	$ 133,125,000.00	+	9.00	$ 5,625,000.00	222.00	$ 138,750,000.00
50	720.1P	Señal Poste de referencia SI - 04	Und	7.00	$ 602,000.00	$ 4,214,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
51	730.1	Defensa metalica	m	310.00	$ 273,000.00	$ 84,630,000.00	1256.10	$ 342,915,300.00	-	688.00	$ 187,824,000.00	568.10	$ 155,091,300.00
52	730.2	Sección final	Und	25.00	$ 276,000.00	$ 6,900,000.00	16.00	$ 4,416,000.00	=	0.00	$ 0.00	16.00	$ 4,416,000.00
53	740.1	Captafaros	Und	130.00	$ 18,000.00	$ 2,340,000.00	384.67	$ 6,924,000.00	-	218.67	$ 3,936,000.00	166.00	$ 2,988,000.00
Subtotal						$ 236,534,000.00		$ 616,014,300.00			-$ 200,133,800.00		$ 415,880,500.00
Capitulo 7. Transportes													
54	900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	M3-KM	14,536.00	$ 1,050.00	$ 15,262,800.00	2196.54	$ 2,306,367.00	=	0.00	$ 0.00	2196.54	$ 2,306,367.00
55	900.2P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	M3-KM	439,650.00	$ 1,350.00	$ 593,527,500.00	2514503.44	$ 3,394,579,638.14	-	118,313.93	$ 159,723,799.64	2396189.51	$ 3,234,855,838.50
56	900.3P	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM	313,800.00	$ 1,550.00	$ 486,390,000.00	94167.00	$ 145,958,850.00	=	0.00	$ 0.00	94167.00	$ 145,958,850.00
Subtotal						$ 1,095,180,300.00		$ 3,542,844,855.14			-$ 159,723,799.64		$ 3,383,121,055.50
Capitulo 8. Obras Varias													
57	800.2	Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.	m	2,000.00	$ 29,000.00	$ 58,000,000.00	4376.00	$ 126,904,000.00	-	1,452.00	$ 42,108,000.00	2924.00	$ 84,796,000.00
Subtotal						$ 58,000,000.00		$ 126,904,000.00			-$ 42,108,000.00		$ 84,796,000.00
Capitulo 9. No Previstos													
NP1	465.13	Demolición de la carpeta asfáltica	m3	0.00	$ 135,419.00	$ 0.00	164.52	$ 22,279,133.88	=	0.00	$ 0.00	164.52	$ 22,279,133.88
NP2	671.3P	Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo,	m3	0.00	$ 968,374.00	$ 0.00	1916.70	$ 1,856,084,382.55	-	6.17	$ 5,976,804.33	1910.53	$ 1,850,107,578.22
NP3	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 28 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	0.00	$ 889,932.00	$ 0.00	651.00	$ 579,345,732.00	=	0.00	$ 0.00	651.00	$ 579,345,732.00
NP4	683.5	Geodren vial	m2		$ 109,677.00	$ 0.00	7610.30	$ 834,674,873.10	-	1,084.50	$ 118,944,706.50	6525.80	$ 715,730,166.60
NP5	802.4	Poda de la parte aérea de árboles tipo IV	Un	0.00	$ 60,270.00	$ 0.00	37.00	$ 2,229,990.00	=	0.00	$ 0.00	37.00	$ 2,229,990.00
NP6	802.8	Poda de la parte radicular de árboles tipo IV	Un	0.00	$ 232,208.00	$ 0.00	140.00	$ 32,509,120.00	-	30.00	$ 6,966,240.00	110.00	$ 25,542,880.00
NP7	683.1	Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 30,089.00	$ 0.00	2451.50	$ 73,763,183.50	-	102.50	$ 3,084,122.50	2349.00	$ 70,679,061.00
NP8	683.2	Geotextil de refuerzo tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 37,497.00	$ 0.00	2393.70	$ 89,756,568.90	=	0.00	$ 0.00	2393.70	$ 89,756,568.90
NP9	683.3	Geoceldа tipo HDPE 6" de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 90,866.00	$ 0.00	4367.97	$ 396,899,638.94	-	1,753.94	$ 159,373,188.96	2614.03	$ 237,526,449.98
NP10	683.4	Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m3	0.00	$ 189,199.00	$ 0.00	4346.89	$ 822,427,241.11	-	526.60	$ 99,632,193.40	3820.29	$ 722,795,047.71
NP11	741.13	Delineadores de curva horizontal SP-75 doble	Und	0.00	$ 858,663.00	$ 0.00	259.00	$ 222,393,717.00	-	104.00	$ 89,300,952.00	155.00	$ 133,092,765.00
NP12		Roceria y limpieza ancho max. 2m a lado y lado de la vía, y retiro material vegetal	Ha	0.00	$ 778,289.00	$ 0.00	18.12	$ 14,102,596.68	-	16.00	$ 12,452,624.00	2.12	$ 1,649,972.68
NP13		Limpieza alcantarillas Existentes	Un	0.00	$ 258,279.00	$ 0.00	55.00	$ 14,205,345.00	-	50.00	$ 12,913,950.00	5.00	$ 1,291,395.00
NP14		Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes	ml	0.00	$4,138.00	$ 0.00	62878.56	$ 260,191,481.28	-	36,778.56	$ 152,189,681.28	26100.00	$ 108,001,800.00
NP21		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	m3	0.00	$1,813,247.00	$ 0.00	1768.34	$ 3,206,437,199.98	+	1,157.36	$ 2,098,579,547.92	2925.70	$ 5,305,016,747.90
NP22		Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo, con Fibra	M3	0.00	$1,127,025.00	$ 0.00	515.38	$ 580,844,341.26	+	54.76	$ 61,717,692.24	570.14	$ 642,562,033.50
Subtotal						$ 0.00		$ 9,008,144,545.18			$ 1,499,462,777.19		$ 10,507,607,322.37
SUBTOTAL						$ 40,813,697,800.00		$ 60,987,586,794.12			$ 87,164,933.75		$ 61,074,731,727.87
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA													
Capitulo 1. Preliminares													
1	4P	Localización y replanteo puente	m2	9,034.20	$ 2,000.00	$ 18,068,400.00	2271.89	$ 4,543,780.00	=	0.00	$ 0.00	2271.89	$ 4,543,780.00
Subtotal						$ 18,068,400.00		$ 4,543,780.00			$ 0.00		$ 4,543,780.00
Capitulo 2. Movimiento de Tierras													
2	200.2P	Demoste y limpieza de zonas no boscosas	m2	4,000.00	$ 20,000.00	$ 80,000,000.00	2271.89	$ 45,437,800.00	=	0.00	$ 0.00	2271.89	$ 45,437,800.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERANACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

el Tolima nos Une

PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | ACTA No: 15 | X | FECHA DE ELABORACIÓN | DD 25 | MM 2 | 2025

CONTRATO DE OBRA No :
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901.505.619-5**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
INTERVENTOR : **CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5**

PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO ACUMULADO:	38.1 meses
FECHA DE INICIACION:	26/10/2021	FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	29/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN 2:	6/05/2024	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/03/2025
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 46,209,359,460.00	VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 11,063,040,907.84
		VALOR ADICIÓN No.2 :	$ 3,152,777,269.79
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 69,314,039,138.76	VALOR ADICIÓN No.3 :	$ 8,888,861,501.13
		VALOR TOTAL DE ADICIONES :	$ 23,104,679,678.76

CONDICIONES ORIGINALES							PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 14		MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	201.2P	Demolición de estructuras de concreto reforzado	m3	88.00	$ 197,000.00	$ 17,336,000.00	59.43	$ 11,707,710.00	=	0.00	$ 0.00	59.43	$ 11,707,710.00
4	201.11	Desmontaje y traslado de estructuras metálicas	kg	97,650.00	$ 5,000.00	$ 488,250,000.00	29270.00	$ 146,350,000.00	=	0.00	$ 0.00	29270.00	$ 146,350,000.00
5	220.1	Terraplen	m3	2,465.00	$ 20,000.00	$ 49,300,000.00	2465.00	$ 49,300,000.00	=	0.00	$ 0.00	2465.00	$ 49,300,000.00
6	210.1.1	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales	m3	680.00	$ 14,000.00	$ 9,520,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 644,406,000.00**		**$ 252,795,510.00**			**$ 0.00**		**$ 252,795,510.00**
Capitulo 3. Estructura de Pavimento													
7	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3	85.00	$ 980,000.00	$ 83,300,000.00	62.16	$ 60,916,800.00	=	0.00	$ 0.00	62.16	$ 60,916,800.00
8	640.1	Acero de refuerzo 420MPA	kg	7,705.00	$ 8,000.00	$ 61,640,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9	330.1	Base granular clase A	m3	573.00	$ 182,000.00	$ 104,286,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10	450.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC19	m3	40.00	$ 1,100,000.00	$ 44,000,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
11	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1	m2	420.00	$ 4,000.00	$ 1,680,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
12	673.1.2	Geotextil tipo T2400	m2	450.00	$ 12,000.00	$ 5,400,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13	230.1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	500.00	$ 112,000.00	$ 56,000,000.00	266.10	$ 29,803,200.00	=	0.00	$ 0.00	266.10	$ 29,803,200.00
14	810.1	Protección de taludes con bloques de césped	m2	1,382.00	$ 18,000.00	$ 24,876,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
15	311.1	Afirmado	m3	93.00	$ 128,000.00	$ 11,904,000.00	1495.39	$ 191,409,920.00	=	0.00	$ 0.00	1495.39	$ 191,409,920.00
Subtotal						**$ 393,086,000.00**		**$ 282,129,920.00**			**$ 0.00**		**$ 282,129,920.00**
Capitulo 4. Estructuras Adicionales y Drenajes													
16	610.5	Rellenos con material filtrante	m3	67.00	$ 257,000.00	$ 17,219,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
17	673.1.1	Geotextil tipo NT-2500	m2	310.00	$ 12,000.00	$ 3,720,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
18	663.1.1P	Tuberia de PVC perforada D=4"	m	44.00	$ 81,000.00	$ 3,564,000.00	159.60	$ 12,927,600.00	=	0.00	$ 0.00	159.60	$ 12,927,600.00
19	663.1.2P	Tuberia de PVC D=1"	m	28.00	$ 45,000.00	$ 1,260,000.00	20.55	$ 924,750.00	=	0.00	$ 0.00	20.55	$ 924,750.00
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230.00	$ 57,000.00	$ 13,110,000.00	195.40	$ 11,137,800.00	=	0.00	$ 0.00	195.40	$ 11,137,800.00
21	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3	95.00	$ 75,000.00	$ 7,125,000.00	717.00	$ 53,775,000.00	=	0.00	$ 0.00	717.00	$ 53,775,000.00
22	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3	85.00	$ 984,000.00	$ 83,640,000.00	43.76	$ 43,059,840.00	=	0.00	$ 0.00	43.76	$ 43,059,840.00
23	630.6	Concreto resistencia 14MPA	m3	16.00	$ 643,000.00	$ 10,288,000.00	7.33	$ 4,713,190.00	=	0.00	$ 0.00	7.33	$ 4,713,190.00
24	640.1	Acero de refuerzo 420MPA	kg	7,190.00	$ 8,000.00	$ 57,520,000.00	3299.46	$ 26,395,680.00	=	0.00	$ 0.00	3299.46	$ 26,395,680.00
Subtotal						**$ 197,446,000.00**		**$ 152,933,860.00**			**$ 0.00**		**$ 152,933,860.00**
Capitulo 5. Estructura Principal													
25	630.3	Concreto resistencia 28MPA	m3	1.00	$ 984,000.00	$ 984,000.00	2.52	$ 2,479,680.00	=	0.00	$ 0.00	2.52	$ 2,479,680.00
26	630.3.1P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa	m3	79.00	$ 2,050,000.00	$ 161,950,000.00	7.31	$ 14,985,500.00	=	0.00	$ 0.00	7.31	$ 14,985,500.00
27	630.3.2P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de cuña de apoyo	m3	2.45	$ 1,380,000.00	$ 3,381,000.00	1.37	$ 1,890,600.00	=	0.00	$ 0.00	1.37	$ 1,890,600.00
28	630.3.3P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga diafragma intermedia	m3	10.83	$ 1,730,000.00	$ 18,735,900.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
29	630.3.4P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa de aproximación	m3	30.66	$ 1,400,000.00	$ 42,924,000.00	13.29	$ 18,606,000.00	=	0.00	$ 0.00	13.29	$ 18,606,000.00
30	630.3.5P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de barrera de protección	m3	13.69	$ 1,320,000.00	$ 18,070,800.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
31	630.3.6P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Mensula de apoyo	m3	4.95	$ 1,360,000.00	$ 6,732,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
32	630.3.7P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga cabezal	m3	41.59	$ 1,550,000.00	$ 64,464,500.00	74.02	$ 114,731,000.00	=	0.00	$ 0.00	74.02	$ 114,731,000.00
33	630.3.8P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro espaldar	m3	16.40	$ 1,380,000.00	$ 22,632,000.00	14.24	$ 19,651,200.00	=	0.00	$ 0.00	14.24	$ 19,651,200.00
34	630.3.9P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro pantalla	m3	34.65	$ 1,520,000.00	$ 52,668,000.00	80.60	$ 122,512,000.00	=	0.00	$ 0.00	80.60	$ 122,512,000.00
35	630.3.10P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro aleta	m3	24.17	$ 1,490,000.00	$ 36,013,300.00	11.20	$ 16,688,000.00	=	0.00	$ 0.00	11.20	$ 16,688,000.00
36	630.3.11P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Tope sismico	m3	2.88	$ 1,350,000.00	$ 3,888,000.00	0.84	$ 1,134,000.00	=	0.00	$ 0.00	0.84	$ 1,134,000.00
37	630.3.12P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pila de cimentación, no incluye acero	m3	47.71	$ 1,430,000.00	$ 68,225,300.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
38	621.1P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pilote de concreto vaciado In Situ, de diametro 1,2m. (incluye excavación en roca bajo agua no incluye acero de refuerzo)	m3	78.00	$ 2,950,000.00	$ 230,100,000.00	150.00	$ 442,500,000.00	=	0.00	$ 0.00	150.00	$ 442,500,000.00
39	621.5.1	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Camisa permanente de diametro exterior 1,5m . En concreto	m3	78.00	$ 1,175,000.00	$ 91,650,000.00	40.00	$ 47,000,000.00	=	0.00	$ 0.00	40.00	$ 47,000,000.00
40	630.6	Concreto resistencia 14MPA	m3	26.00	$ 642,000.00	$ 16,692,000.00	25.30	$ 16,242,600.00	=	0.00	$ 0.00	25.30	$ 16,242,600.00
41	630.1P	Concreto resistencia 35MPApara construcción de VIGA POSTENSADA	m3	92.00	$ 3,200,000.00	$ 294,400,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
42	640.1	Acero de refuerzo 420mMPA	kg	108,156.00	$ 8,000.00	$ 865,248,000.00	72067.26	$ 576,538,080.00	+	196.22	$ 1,569,760.00	72263.48	$ 578,107,840.00
43	663.1.3P	Tuberia de PVC D=4"	m	6.30	$ 80,000.00	$ 504,000.00	55.80	$ 4,464,000.00	=	0.00	$ 0.00	55.80	$ 4,464,000.00
44	663.1.2P	Tuberia de PVC D=1"	m	10.00	$ 45,000.00	$ 450,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
45	663.1.1P	Tuberia de PVC Perforada D=4"	m	10.00	$ 81,000.00	$ 810,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
46	673.1.1	Geotextil tipo NT-2500	m2	140.00	$ 12,000.00	$ 1,680,000.00	536.80	$ 6,441,600.00	=	0.00	$ 0.00	536.80	$ 6,441,600.00
47	632P	Baranda peatonal metálica (H=1.15m)	m	70.00	$ 672,000.00	$ 47,040,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
48	5P	Platina de acero laminada ASTM A36(370mmX430mmX1/8")	u	32.00	$ 125,000.00	$ 4,000,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
49	642.1P	Elastometro D60 (450mmX400mm)	u	0.80	$ 595,000.00	$ 476,000.00	6.00	$ 3,570,000.00	=	0.00	$ 0.00	6.00	$ 3,570,000.00
50	642.2P	Elastometro D60 (300mmX250mm)	u	0.05	$ 545,000.00	$ 27,250.00	4.00	$ 2,180,000.00	=	0.00	$ 0.00	4.00	$ 2,180,000.00
51	6P	Cable postensado (10 torones)	m	280.20	$ 232,000.00	$ 65,006,400.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
52	7P	Cable postensado (9 torones)	m	280.76	$ 193,000.00	$ 54,186,680.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERANACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

el Tolima nos Une

PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA No: **15**

X

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 25 MM 2 2025

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901.505.619-5**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR : **CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5**

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACION: 26/10/2021

FECHA DE REANUDACIÓN 2: 6/05/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 69,314,039,138.76

PLAZO ACUMULADO: 38.1 meses

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2025

VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84

VALOR ADICIÓN No.2 : $ 3,152,777,269.79

VALOR ADICIÓN No.3 : $ 8,888,861,501.13

VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 23,104,679,678.76

CONDICIONES ORIGINALES							PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 14		MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+-		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
53	8P	Anclaje activo postensado (170mmX170mm)	u	32.00	$ 328,000.00	$ 10,496,000.00	0.00	$ 0.00	=		0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
54	9P	Tuberia metalica D=2"	m	5.20	$ 108,000.00	$ 561,600.00	0.00	$ 0.00	=		0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
55	10P	Sellador elastico (junta de dilatación)	m	22.00	$ 625,000.00	$ 13,750,000.00	0.00	$ 0.00	+		19.40	$ 12,125,000.00	19.40	$ 12,125,000.00
56	11P	Bolsacreto de volumen 1m3	un	210.00	$ 111,000.00	$ 23,310,000.00	0.00	$ 0.00	=		0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
57	610.5	Rellenos con material filtrante	m3	32.50	$ 255,000.00	$ 8,287,500.00	132.50	$ 33,787,500.00	=		0.00	$ 0.00	132.50	$ 33,787,500.00
58	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,692.97	$ 57,000.00	$ 96,499,290.00	1915.50	$ 109,183,500.00	=		0.00	$ 0.00	1915.50	$ 109,183,500.00
59	600.2.2	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	128.58	$ 144,000.00	$ 18,515,520.00	0.00	$ 0.00	=		0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 2,344,359,040.00**		**$ 1,554,585,260.00**				**$ 13,694,760.00**		**$ 1,568,280,020.00**
Capitulo 6. Transportes														
60	900.2	Transporte de material provenientes de la excavación	m3-km	16,519.00	$ 1,380.00	$ 22,796,220.00	51.99	$ 71,746.20	-		0.00	$ 0.00	51.99	$ 71,746.20
61	900.2P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	M3-KM	0.00	$ 1,350.00	$ 0.00	38809.95	$ 52,393,432.50	=		0.00	$ 0.00	38809.95	$ 52,393,432.50
62	900.3P	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM	0.00	$ 1,550.00	$ 0.00	8377.11	$ 12,984,520.50	=		0.00	$ 0.00	8377.11	$ 12,984,520.50
Subtotal						**$ 22,796,220.00**		**$ 65,449,899.20**				**$ 0.00**		**$ 65,449,899.20**
Capitulo 7. No Previstos														
NP 15	810.P	Enrocado con roca >.8 del mismo rio	m3	0.00	$ 44,813.00	$ 0.00	4357.00	$ 195,250,241.00	=		0.00	$ 0.00	4357.00	$ 195,250,241.00
NP 16	642	Junta elastomerica empalme placa - estribo	m	0.00	$ 5,460,156.00	$ 0.00	19.30	$ 105,381,010.80	-		19.30	$ 105,381,010.80	0.00	$ 0.00
NP 17	650.1P	Acero ASTM A709 Gr. 50W para viga metálica (Incluye, Transporte, fabricación y montaje)	kg	0.00	$ 28,303.00	$ 0.00	76619.24	$ 2,168,554,336.33	+		0.00	$ 13.39	76619.24	$ 2,168,554,349.72
NP18	650.2P	Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, Tubería, transporte, fabricación y montaje)	kg	0.00	$ 23,524.00	$ 0.00	2090.05	$ 49,166,336.20	=		0.00	$ 0.00	2090.05	$ 49,166,336.20
NP 20	630.3.1P	Concreto resistencia 28MPA con fibras para construcción de losa	m3	0.00	$ 3,096,794.00	$ 0.00	84.74	$ 262,422,323.56	+		1.46	$ 4,521,319.24	86.20	$ 266,943,642.80
Subtotal						**$ 0.00**		**$ 2,780,774,247.89**				**$ 100,859,678.17**		**$ 2,879,914,569.72**
					AJUSTE AL PESO	$ 0.00		$ 17.55	+			-$ 15.58		$ 1.97
					SUBTOTAL	**$ 3,620,161,660.00**		**$ 5,093,212,294.64**				**-$ 87,164,933.75**		**$ 5,006,047,360.89**
					SUBTOTAL VIA + PUENTE	**$ 44,433,859,460.00**		**$ 66,080,779,088.76**	=			**$ 0.00**		**$ 66,080,779,088.76**
					PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)	$ 1,240,000,000.00		$ 775,553,050.00	=			$ 0.00		$ 775,553,050.00
					REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 450,000,000.00		$ 2,065,300,000.00	=			$ 0.00		$ 2,065,300,000.00
					IVA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 85,500,000.00		$ 392,407,000.00	=			$ 0.00		$ 392,407,000.00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 1,775,500,000.00**		**$ 3,233,260,050.00**				**$ 0.00**		**$ 3,233,260,050.00**
					VALOR TOTAL	**$ 46,209,359,460.00**		**$ 69,314,039,138.76**				**$ 0.00**		**$ 69,314,039,138.76**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)

Se realiza modifcacion a cantidades proyectadas en el modificatorio No. 14 por balance de cantidades de obra

NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron

FIRMA

ING. JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

Representante Legal Consorcio Vial Chaparral

Firma

Interventor: ING. GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA

Representante Legal CONSORCIO IC & CB

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma

Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ORDENADORA DEL GASTO

FIRMA

Nombre: Ing. JULIO GALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Original: Archivo de Gestión (Direccion de Contratacòn)

Copias:

FACTURA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NIT 901505619 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764073351057 del 20/06/2024 al 20/06/2025
Habilita numeración de:
FEV-20 al FEV-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 110 9 25 ED TORRE EMPRESARIAL
PACIFIC OF 911
BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV26

Fecha de emisión:	16/04/2025 10:06:40 AM
Fecha de validación DIAN:	16/04/2025 10:11:44 AM
Fecha de vencimiento:	16/05/2025
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	GOBERNACION DEL TOLIMA
	NIT 800113672 - 7
Dirección:	Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 5
Codigo Cliente	001
Teléfono:	2611111
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Ibagué
Departamento:	Tolima
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	Acta parcial de obra No 22 Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima- periodo de:1 de noviembre de 2024 al 22 de marzo de 2025	1,00	Suma global	COP 4,840,291,986.50	COP 0.00			COP 4,840,291,986.50

Total de items: 1
Observaciones
INTEGRANTES DEL CONSORCIO
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ NIT 79.946.569-6 25%
INGECON S.A NIT 822.000.138-1 25%
CONSTRUCTORA FG S.A. NIT 800.209.530-3 25%
ANDCOL SAS NIT 901.524.202-9 25%

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 69000002008

Subtotal:	COP 4,840,291,986.50

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,840,291,986.50
Neto a pagar	COP 4,840,291,986.50

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 64db46244e36c5b35021fd0271e0a360b79df26c895c3a793d487e3d641a49d1bf873e3a955eb84373f75d24475bb899

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951785649			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1103769783

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 576.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.500	$ 0	$ 576.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.677.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.677.400	$ 0	$ 2.677.400
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.744.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.744.000	$ 0	$ 3.744.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 628.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.400	$ 0	$ 628.400
SUBTOTALES:										**$ 7.626.300**	**$ 0**	**$ 7.626.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 889.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.600	$ 0	$ 0	$ 889.600
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.400	$ 0	$ 0	$ 193.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 252.800
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.100	$ 0	$ 0	$ 264.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 305.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.800	$ 0	$ 0	$ 305.800
SUBTOTALES:													**$ 1.905.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.905.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.218.800	$ 3.218.800	$ 0	$ 0	$ 3.218.800
SUBTOTALES:									**$ 3.218.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.218.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	21	$ 1.853.600	$ 0	$ 1.853.600
SUBTOTALES:			**$ 1.853.600**	**$ 0**	**$ 1.853.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
1	CC 1007289474	OVIEDO MORALES MONICA FERNANDA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.595.326	$ 255.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 255.300	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.595.326	$ 63.900	$ 0	$ 63.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.595.326		$ 111.100	30	$ 1.595.326	CCF48-CONFATOLIMA	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1054553114	RAMIREZ DUÑONES LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1075242622	GALLEGO MEJIA HANER ALBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 3.448.370	$ 551.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 551.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.448.370	$ 138.000	$ 0	$ 138.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.448.370		$ 240.100	30	$ 3.448.370	CCF48-CONFATOLIMA	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1106768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.677.283	$ 268.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.677.283	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.677.283		$ 116.800	30	$ 1.677.283	CCF48-CONFATOLIMA	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1106773608	MOTTA RUBIO JAIVER ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	05								05-30									230301-PORVENIR	26	$ 1.273.624	$ 203.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 203.800	NUEVA EPS CM	26	$ 1.273.624	$ 51.000	$ 0	$ 51.000	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.273.624		$ 88.700	26	$ 1.273.624	CCF48-CONFATOLIMA	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1106774146	ASENCIO JIMENEZ YIBER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.750.761	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.761	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.761		$ 121.900	30	$ 1.750.761	CCF48-CONFATOLIMA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1111043073	CABRERA MENDOZA BERLY DANITH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									13-30									25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.720.145	$ 275.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.300	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.720.145	$ 68.900	$ 0	$ 68.900	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.720.145		$ 119.800	29	$ 1.720.145	CCF48-CONFATOLIMA	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1111043073	CABRERA MENDOZA BERLY DANITH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										12-12								25-14 COLPENSIONES	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 0	1	$ 43.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1111334696	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 3.271.168	$ 523.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 523.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.271.168	$ 130.900	$ 0	$ 130.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.271.168		$ 227.700	30	$ 3.271.168	CCF48-CONFATOLIMA	$ 130.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1113688617	CALLEJO RIVERA CRHISTIAN DAVID	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1121937769	CASTELLANOS RUIZ ANGIE ALEXANDRA	DEPEND		$ 3.250.000	FIJO			SI													13-30					25-14 COLPENSIONES	18	$ 1.300.001	$ 208.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.100	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.300.001	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.300.001		$ 0	18	$ 1.300.001	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951785649		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103769783

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1121937769	CASTELLANOS RUIZ ANYUI ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.250.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	12	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	12	$ 1.300.000		$ 90.500	12	$ 1.300.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.880.761	$ 301.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.000	EPS CM	30	$ 1.880.761	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.880.761		$ 131.000	$30	$ 1.880.761	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 14011118	PEÑA NAVARRO GUILLERMO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.287.717	$ 366.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 366.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.287.717	$ 91.600	$ 0	$ 91.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.287.717		$ 159.300	$30	$ 2.287.717	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 14012923	RODRIGUEZ MENDEZ LAUREANO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.263.696	$ 362.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 362.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.263.696	$ 90.600	$ 0	$ 90.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.263.696		$ 157.600	$30	$ 2.263.696	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 14191696	MONTEALEGRE VARGAS CARLOS ESNEIDER	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI	08									08-30								231001-COLFONDOS	23	$ 1.426.377	$ 228.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.300	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 1.426.377	$ 57.100	$ 0	$ 57.100	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.426.377		$ 99.300	23	$ 1.426.377	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 14279827	RUBIO VALENCIA BAUDELINO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.868.478	$ 299.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 299.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.868.478	$ 74.800	$ 0	$ 74.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.868.478		$ 130.100	$30	$ 1.868.478	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 14280084	RUBIO RUBIO JOBE EDWIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.851.793	$ 296.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.300	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.851.793	$ 74.100	$ 0	$ 74.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.851.793		$ 128.900	$30	$ 1.851.793	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.946.087	$ 311.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 311.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.946.087	$ 77.900	$ 0	$ 77.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.946.087		$ 135.500	$30	$ 1.946.087	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 38360956	VALLE HERNANDEZ LORENA LIZETH	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI														L-18-18				231001-COLFONDOS	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 83.334		$ 0	1	$ 83.334	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 38360956	VALLE HERNANDEZ LORENA LIZETH	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	29	$ 2.416.667	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.700	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 96.700	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.416.667		$ 168.300	$29	$ 2.416.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 7550851	LOZADA RAMOS WILLIAM	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 208.800	$30	$ 3.000.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 93129015	GUZMAN SANCHEZ JOAQUIN MARCELO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.353.696	$ 376.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.353.696	$ 94.200	$ 0	$ 94.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.353.696		$ 163.900	$30	$ 2.353.696	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.604.400

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada
