	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 28 del 1/7/2024 al 7/7/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

• VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
•VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES			INTERVENTOR:	INCONPLAN IN S.A.S		
INTEGRANTES:	INPROTEKTO LIMITADA Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S			INTEGRANTES:	INCONPLAN IN S.A.S		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.743.524.155,00	CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.743.524.155,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.465.146.349,00	22,91%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 335.678.580,00	38,49%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 129.211.604,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 335.678.580,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 129.211.604,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 08/ 05 / 2024.
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 57.485.568,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.242.569,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.825.532,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.825.532,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 27.825.532,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 732.573.174,50
Amortizado $	$ 38.645.760,00
Saldo $	$ 693.927.414,50

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	AVANCE		
	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	PESO % VOLUMEN	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	Análisis de la información y antecedentes	9,64%	25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS			
	Metodología aprobada por Interventoria	6,42%	50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA			
	Metodología aprobada por Interventoria	12,85%	50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA			
	Metodología aprobada por Interventoria	13,92%	50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.			
	Metodología aprobada por Interventoria	20,34%	50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.			
	Metodología aprobada por Interventoria	7,49%	50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.			
	Metodología aprobada por Interventoria	10,71%	50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.			
	Metodología aprobada por Interventoria	6,85%	50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD			
	Metodología aprobada por Interventoria	6,42%	50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA			
	Metodología aprobada por Interventoria	5,35%	50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria	0,00%		
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 01/07/24 al 07/07/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-085 del 2 de julio de 2024,se remito oficio con la actualizacion de las polizas de cumplimiento de acuerdo a la prorroga No. 2 del contrato 4925 de 2023 .
2. Mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-086 el día 02 de julio de 2024, la consultoría hace entrega del informe semanal Nº 27 periodo correspondiente del 24 al 30 de junio del 2024, para su posterior revisión y/o aprobación por parte de la interventoría.
3. Mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-087 el día 5 de julio de 2024, la consultoría envía solicitud de aprobación de los sitios priorizados, teniendo en cuenta el Orto mosaico satelital adquirido, al cual realizamos revisión y procesamiento desde el componente geotécnico e hidráulico, y como resultado de ésta y de las mesas de trabajo interno realizadas en conjunto con la Interventoría, se socializaron 11 centros poblados los cuales presentan mayor susceptibilidad a niveles de alto, los cuales son: Taparal, Los Pereas, Munguidó. Barrios Unidos, Bella Victoria, Cucurrupí., Puerto Murillo, Negria, Dipurdú, Chaqui y Primavera.
4. El día 02 de julio se asistió a la reunión presencial, en las instalaciones del INVIAS para conocer el avance del proyecto. (Socialización visita técnica, ajustes actas de costos de la consultoría).
5. El día 04 de julio se realizó mesa de trabajo técnica conjunta entre Interventoría y consultoría para definir la priorización de los sitios críticos a partir de la visita técnica realizada por la consultoría.
6. El día 05 de julio se realizó comité de seguimiento semanal virtual la cual conto con la presencia del Invias, Interventoría y la Consultoría para revisar el avance del proyecto, en el cual se definieron 6 centros poblados priorizados los cuales son: 1. Primavera, 2. Negria, 3. Puerto Murillo, 4.Cucurrupi, 5.Bella Victoria, 6.Barrios Unidos y en los cuales se desarrollará los estudios y diseños de las obras de protección.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Actividades programadas para semana del 08/07/24 al 14/07/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Realizar el Informe semanal Nº 29 y radicar los informes 25, 26, 27 y 28 del contrato de Interventoría 4922 del 2023.
2. Revisar el informe semanal No. 29 periodo comprendido entre el 08 al 014 de julio de 2024 del contrato de consultoría 4925 del 2024.
3. Revisar acta de costos Nº 7 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2024 del contrato 4925 de la consultoría.
4. Realizar comité de seguimiento semanal virtual entre la Interventoría, Invias y la Consultoría para revisar el avance del proyecto.
5. Revisar entrega de metodologías definitivas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

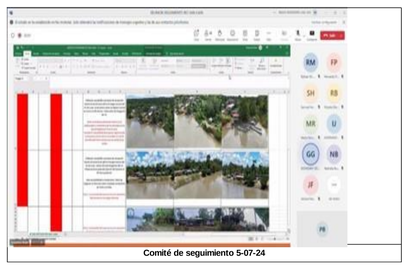

Comité de seguimiento 5-07-24



Comité de seguimiento 5-07-24



Comité de seguimiento 5-07-24

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-205471

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
