
“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÒN EN EL RIO SAN JUAN,DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA ”

Id	ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	COSTO DIRECTO TOTAL	DURACION (dias)	Comienzo	Fin	SUCESORAS	PREDECESORAS
0		**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**		**1**	**$ 1.465.146.349,00**	**200 días**	**mié 27/12/23**	**lun 30/09/24**		
1		**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**	**UND**	**1**	**$ 1.465.146.349,00**	**200 días**	**mié 27/12/23**	**lun 30/09/24**		
2	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	UND	1	$ 0,00	157 días	mié 27/12/23	mié 31/07/24		
3	1.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 13.500.000,00	11 días	mié 14/02/24	mié 28/02/24	5	4
4	1.2	Análisis de la información y antecedentes	UND	1	$ 27.000.000,00	36 días	mié 27/12/23	mar 13/02/24	5;3	
5	1.3	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.	UND	1	$ 40.500.000,00	21 días	mar 5/03/24	mié 3/04/24	;18;22;26;30;34	4;3
6	1.4	Visita tècnica	UND	1	$ 0,00	3 días	mié 26/06/24	lun 1/07/24	;22;26;30;16;1	7
7	1.5	Informe de avance	UND	1	$ 54.000.000,00	4 días	mié 3/04/24	mar 9/04/24	;29;33;37;18;22	5
8	2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	UND	1	$ 0,00	27 días	lun 1/07/24	mié 7/08/24		6
9	2.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 18.000.000,00	9 días	lun 1/07/24	vie 12/07/24	10	
10	2.2	Revisión y Aprobación Interventoria	UND	0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24		9
11	2.3	Trabajo de Campo		0	$ 0,00	13 días	vie 12/07/24	mié 31/07/24	12	6
12	2.4	Informe de avance	UND	1	$ 72.000.000,00	5 días	jue 1/08/24	mié 7/08/24		7;11
13	3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1	$ 0,00	27 días	lun 1/07/24	mié 7/08/24		5;6
14	3.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 81.900.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	15	
15	3.2	Revisión y Aprobación Interventoria	UND	0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24		14
16	3.3	Trabajo de Campo		0	$ 0,00	13 días	vie 12/07/24	mié 31/07/24	17	6
17	3.4	Informe de avance	UND	1	$ 171.000.000,00	5 días	mié 31/07/24	mié 7/08/24	42	7;16
18	4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	UND	1	$ 0,00	43 días	lun 1/07/24	jue 29/08/24		7;5;6
19	4.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 175.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	20	
20	4.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24	21	19
21	4.3	Informe de avance	UND	1	$ 20.000.000,00	10,75 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;20
22	5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6
23	5.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 57.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	24	
24	4.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24	25	23
25	4.3	Informe de avance	UND	1	$ 228.000.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	7;24
26	6	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6
27	6.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 10.500.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	28	
28	6.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	29	27
29	6.3	Informe de avance	UND	1	$ 94.500.000,00	11 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;28
30	7	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6
31	7.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 15.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	32	
32	7.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	33	31
33	7.3	Informe de avance	UND	1	$ 135.000.000,00	11 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;32
34	8	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	UND	1	$ 0,00	44 días	vie 28/06/24	jue 29/08/24		7;5
35	8.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 9.600.000,00	10 días	lun 1/07/24	vie 12/07/24	36	
36	8.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	5 días	lun 15/07/24	vie 19/07/24	37	35
37	8.3	Informe de avance	UND	1	$ 86.400.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	7;36
38	9	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		6
39	9.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 9.000.000,00	10 días	lun 1/07/24	lun 15/07/24	40	6
40		Revisión y Aprobación Interventoria	UND	1	$ 0,00	5 días	lun 15/07/24	lun 22/07/24	41	39
41	9.2	Informe de avance	UND	1	$ 8.100.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	40
42	10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	UND	1	$ 0,00	8 días	vie 30/08/24	mar 10/09/24	43	;37;33;29;25;21;
43	10.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 7.500.000,00	2 días	mié 11/09/24	jue 12/09/24	44	42
44	10.2	Informe de avance	UND	1	$ 67.500.000,00	5 días	vie 13/09/24	jue 19/09/24	45	43
45	11	INFORME FINAL EJECUTIVO	UND	1	$ 64.146.349,00	11 días	vie 13/09/24	lun 30/09/24		44

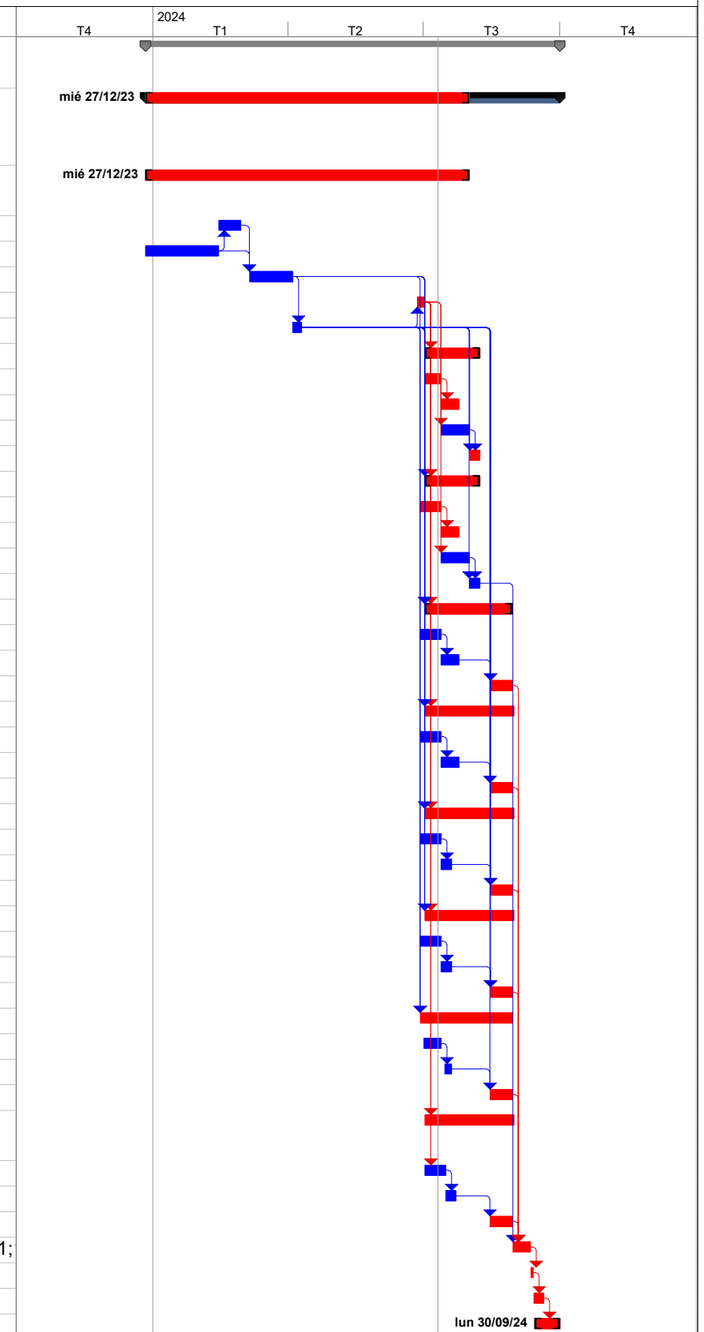

PROGRAMACION DE OBRA (GANTT

Tarea	Tarea resumida	División	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin			
Tarea crítica	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso			
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Resumen manual	Fecha límite			
Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual			

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
RL.MAURICIO FERNANDO PRIETO SÀNCHEZ
