INFORME DE INTERVENTORÍA No 07

GESTION AMBIENTAL (PMA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN – MARCO FIDEL SUAREZ BAJO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

CONTRATANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA (FAC) / EMAVI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN °MARCO FIDEL SUAREZ". BAJO EL CONTRATO INTERVENTORIA: 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023

ELABORO	APROBO
Katerine Chamorro Sandoval	Eduardo Andres Acero Cajigas
Residente de Interventoria SISOMA	Director de Interventoria

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETO DEL INFORME 5

2.1 Objetivo General 5

2.2 Objetivos Específicos 5

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

3.1 Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto 6

3.2 Localización del Proyecto 8

3.3 Relación y control de permisos, licencias o solicitudes de orden ambiental y SST 9

Tabla 2. Relación de permisos o solicitudes de orden ambiental y SST. 9

Tabla 3. Personal vinculado al componente socioambiental y SST de interventoría. 10

Tabla 4. Personal vinculado al componente socioambiental y SST del contratista. 10

Tabla 5 Seguimiento plan de manejo ambiental (PMA) en obra 10

Tabla 6 soporte del contratista entregados a la interventoría en la gestión ambiental del periodo reportado 19

4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS PERIODO REPORTADO. (Concientización Ambiental). 20

5. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (INDICADORES AMBIENTALES) 20

6. Tabla de seguimiento Manual /programa de seguridad y salud en el trabajo (SST). 24

7. Soportes del contratista entregados a la interventoría en la gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del periodo reportado 33

8. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES SST REALIZADAS PERIODO REPORTADO. 34

9. SEGUIMIENTO PROGRAMA / MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (SST-INDICADORES). 35

10. DISCRIMINACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA 36

11. CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE GRUPOS DE APOYO. 37

12. ANÁLISIS DE AUSENTISMO 37

13. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 38

14. PROCESO DE COMUNICADOS INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PERIODO REPORTADO. 38

15. CONCLUSIONES, ANÁLISIS DE INDICADORES Y RECOMENDACIONES GENERALES. 39

16. SOPORTES INFORME DE INTERVENTORIA N° 6 PERIODO AGOSTO 2024..... 40

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra la gestión Ambiental y SST en la OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION – MARCO FIDEL SUÁREZ, CALI VALLE DEL CAUCA bajo el contrato No 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 y conforme a lo establecido en los documentos de cumplimiento como: GUIA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL SERVICIO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, Versión N°5, Código: GH-JERLA-GUI-003, ANEXO CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, CONDICIONES GENERALES ALOJAMIENTO CADETES V 1.0, GA-JELOG-MN-009 MANUAL DE INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE OBRA (MAINT), ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA y demás documentos aplicables que sean necesarios durante el proceso constructivo. Incluyendo la adición estipulada desde el 30 julio 2024.

En el desarrollo del informe se encuentra la descripción y las evidencias de las actividades realizadas por el contratista de obra LAM CONSTRUCCIONES para dar cumplimiento con los requerimientos establecidos por la EMAVI y normatividad vigente relacionada a las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto de acuerdo a las estrategias planteadas, revisadas y aprobadas por esta Interventoría en relacion al Plan y/o manual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de manejo ambiental (PMA).

La interventoría realiza inspecciones periódicas en obra, realizando el seguimiento continuo de cada uno de los programas descritos en el Plan y/o manual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de manejo ambiental (PMA), registrando evidencia fotográfica y soporte de los programas, verificación de planillas de control ingreso y retiro de personal, revisión minuciosa de documentos relacionados al contrato mencionado ante el debido cumplimiento de la gestión SISOMA.

2. OBJETO DEL INFORME

2.1 Objetivo General

Realizar seguimiento, control e inspección de la gestión ambiental y SST aplicable para el proyecto de acuerdo a las estrategias de prevención, control y mitigación presentadas en Plan y/o manual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de manejo ambiental (PMA) y demás documentos exigidos por la EMAVI-FAC.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar seguimiento a cada uno de los programas establecidos por el contratista según el Plan de manejo Ambiental (PMA) aprobado.
- Registrar y medir las actividades del proyecto, ejecutadas en función de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados.
- Verificar la documentación legal requerida sobre canteras, disposición de RCD y demás sitios de disposición final de residuos requeridos.
- Vigilar la implementación y el mantenimiento del Plan y/o manual de seguridad y salud en el trabajo con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores en el en el desarrollo del proyecto.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, aportes a para fiscales y demás obligaciones laborales requeridas en el desarrollo del proyecto.
- Garantizar un ambiente seguro para los transeúntes, visitantes y demás actores que se encuentran en el área de influencia directa o indirecta del proyecto.
- Evidenciar en campo gestión Ambiental y SST según normatividad legal vigente y requerimientos exigidos por la EMAVI-FAC.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto realizar OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION – MARCO FIDEL SUÁREZ, CALI VALLE DEL CAUCA bajo el contrato No 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023. En relacion con el componente SST y Ambiental para mitigar las consecuencias a la exposición de condiciones y/o acciones inseguras que se pueda presentar durante la ejecución de las diferentes actividades en el proyecto se tendrá en cuenta esencialmente las siguientes acciones:

- Seguimiento, control e inspección de la gestión ambiental y SST aplicable para el proyecto de acuerdo a las estrategias de prevención, control y mitigación presentadas en Plan y/o manual de seguridad y salud en el trabajo y Plan de manejo ambiental (PMA) y demás documentos exigidos por la EMAVI-FAC.
- Cumplimiento de los programas establecidos por el contratista según el Plan de manejo Ambiental (PMA) aprobado.
- Efectividad de las actividades del proyecto, ejecutadas en función de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados.
- Verificación de la documentación legal requerida sobre canteras, disposición de RDC y demás sitios de disposición final de residuos requeridos.
- Vigilar la implementación y el mantenimiento del Plan y/o manual de seguridad y salud en el trabajo con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores en el en el desarrollo del proyecto.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, aportes a para fiscales y demás obligaciones laborales requeridas en el desarrollo del proyecto.
- Garantizar un ambiente seguro para los transeúntes, visitantes y demás actores que se encuentran en el área de influencia directa o indirecta del proyecto.
- Evidenciar en campo gestión Ambiental y SST según normatividad legal vigente y requerimientos exigidos por la EMAVI.

3.1 Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto

CONTRATO DE CONSULTORÍA:	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, económica, jurídica, financiera, administrativa y contable de la obra pública para la construcción del alojamiento de cadetes en la escuela militar de aviación °MARCO FIDEL SUAREZ".
CONTRATANTE:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATISTA:	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA – Medellín / Antioquia
NIT:	8.291.216
DIRECCIÓN:	Calle 53 No 45-112, Edificio Colseguros oficina 1801
TELÉFONO:	(604) – 4447432
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 458.726.198 IVA incluido
ADICIONES:	$ 181.234.768,75 IVA Incluido
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 639.960.966,75 IVA Incluido
PLAZO INICIAL	12 meses: 1 mes administrativo; 11 meses ejecución de obra.
SUSPENSIÓN N° 1	17 días calendario: del 9 de febrero de 2024 al 25 de febrero de 2024, inclusive
REINICIO N° 1	26 de febrero de 2024
MODIFICATORIO N° 1 - ADICIÓN	30 de julio de 2024
PLAZO ACTUAL:	12 meses sin superar la vigencia del año 2024
FECHA DE INICIO:	11 enero 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 diciembre 2024.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20-diciembre-2020
OBJETO DEL CONTRATO:	Obra pública para la construcción del alojamiento de cadetes en la escuela militar de aviación – MARCO FIDEL SUAREZ
CONTRATANTE:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" CARRERA 8 No. 58-67 BARRIO LA BASE, UBICADA EN EL PERÍMETRO URBANO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	LAM Construcciones S.A.S - Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL:	Jairo Villamizar Salcedo
NIT:	900356860-0
DIRECCIÓN:	Calle 97 N° 70 C 95 Torre 3 OFC 302 Portal Pontevedra V Etapa
TELÉFONO:	Tel: 321 234 44 77
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4.503.371.902,00
ADICIONES:	$ 2.523.441.151,96
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.026.813.053,96
PLAZO INICIAL:	12 meses sin superar la vigencia del año 2024.
SUSPENSIÓN N° 1	17 días calendario: del 9 de febrero de 2024 al 25 de febrero de 2024, inclusive

REINICIO N° 1	26 de febrero de 2024
MODIFICATORIO N° 1 - NPs 1 y 2	07 de julio de 2024
MODIFICATORIO N° 2 - ADICIÓN	30 de julio de 2024
FECHA DE INICIO:	11 enero 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 diciembre 2024.

3.2 Localización del Proyecto

El proyecto se ejecutará en la escuela militar de aviación "marco fidel Suárez" carrera 8 no. 58-67 barrio la base, ubicada en el perímetro urbano de Santiago de Cali – valle del cauca

Santiago de Cali, es un distrito de Colombia y capital del departamento de Valle del Cauca. Es la tercera ciudad más poblada y el tercer centro económico de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca. Geográficamente, la ciudad se ubica en el valle del río Cauca, formado por la cordillera occidental y la cordillera central de la Región Andina, con una altura promedio de 1000 msnm. La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional después de Bogotá y Medellín. Sitio web de consulta (https://es.wikipedia.org/wiki/Cali).

Base Aérea Marco Fidel Suárez (OACI: **SKGB**) es una base militar asignada a la Fuerza Aérea Colombiana *(FAC) conocida también como Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" (EMAVI). La base está ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca Colombia . Lleva el nombre de Marco Fidel Suárez, ex presidente de Colombia . Sitio web de consulta (https://es.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_Marco_Fidel_Su%C3%A1rez)*

Ilustración 1. Ubicación geográfica del municipio de Santiago de Cali, EMAVI, Valle del cauca Colombia





Fuente Google imágenes https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_Santiago_de_Cali.svg

3.3 Relación y control de permisos, licencias o solicitudes de orden ambiental y SST

La interventoría realiza seguimiento a cada uno de los tramites citados en la tabla 2. Relacion de permisos o solicitudes de orden Ambiental y SST. A la fecha se encuentra ejecutado los cinco tramites exigidos durante el avance del proyecto. Cabe mencionar que el seguimiento se realiza oportunamente de los soportes solicitados en físico según aplique de forma mensual en cada informe del contratista LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Tabla 2. Relación de permisos o solicitudes de orden ambiental y SST.

Trámite	Responsable	Estado	Fecha cierre
Autorización ambiental para extracción o aprovechamiento de material pétreo.	Contratista LAM	Verificado	31-diciembre-2024
Certificado de disposición final a sitio autorizado RCD	Contratista LAM	Ejecutado	31-diciembre-2024
Aprovechamiento, recolección y/o disposición final adecuada bolsas de cemento	Contratista LAM	Ejecutado	31-diciembre-2024

Tabla 3. Personal vinculado al componente socioambiental y SST de interventoría.

Cargo	Interventoría
Residente SST-Ambiental	Katerine Chamorro Sandoval

Tabla 4. Personal vinculado al componente socioambiental y SST del contratista.

Cargo	Contratista
Residente SST - Ambiental	Jhon Edgar Reyes Talero

Tabla 5 Seguimiento plan de manejo ambiental (PMA) en obra

- Programa LAM 01 manejo de materiales de construcción y obras de concreto
- Programa LAM 02 manejo integral de residuos solidos
- Programa LAM 03 Manejo de sustancias químicas
- Programa LAM 04 Control de emisiones atmosféricas
- Programa LAM 05 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros
- Programa LAM 06 Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote
- Programa LAM 07 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
- Programa LAM 08 Señalización de seguridad

Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 01 manejo de materiales de construcción y obras de concreto**
Gestión Interventoría	Se verifica durante el periodo reportado que contratista LAM continúa conservando los puntos de acopio temporal de insumos de obra. Teniéndose en cuenta la no obstrucción locativa ante el desplazamiento vehicular o de personal directo, indirecto relacionado con el proyecto mencionado. Se tiene las siguientes zonas de acopio y/o almacenamiento temporal: - Cemento protegido de lluvia bajo techo - Contenedor con equipo y herramientas. - Localización de materiales pétreos sin obstrucción locativa con protección de los mismos en la posible contaminación del aire o esparcimiento no controlado del mismo.
Anexos o Formatos	- Inspección locativa, orden y aseo - Inspección Ambiental - Inspección Planeada

Registro fotográfico









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 02 manejo integral de residuos solidos**
Gestión Interventoría	- A través de las inspecciones ambientales y plan de trabajo en relación al Plan de Manejo Ambiental aprobado (PMA) se verifica en obra cumplimiento de este programa. - El Contratista realiza mantenimiento de los puntos ecológicos en obra con: actualización de señalización. - Durante el periodo reportado se cumple con los temas ambientales registrados en el Plan de trabajo.
Anexos o Formatos	- Soporte inspección ambiental - Soporte inspección locativa - Soportes charlas de concientización Ambiental. - Soporte de aprovechamiento de papel.
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 03 Manejo de sustancias químicas**
Gestión Interventoría	- Se verifica etiquetado y rotulado de contenedores por medio del Sistema Globalmente Armonizado SGA. - Disponibilidad de insumos de emergencia en caso de un evento no deseado en este caso: extintor multipropósito ABC y camillas de emergencia con inmovilizadores y arnés en perfecto estado - Disponibilidad de Kit Antiderrames - Mantenimiento zona temporal de acopio
Anexos o Formatos	- Inspección Ambiental - Charlas de seguridad productos químicos - Inventario de productos químicos - Registro fotográfico Interventoria SISOMA
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 04 Control de emisiones atmosféricas**
Gestión Interventoría	- Se verifica en obra protección de material de cantera con plástico - Se revisa previamente por vehículos relacionado en el proyecto documentación reglamentaria como: soat, Tecnomecanica, licencia de conducción y para conductores planilla de seguridad social y/o afiliación a la ARL, EPP, correspondiente. - Se verifica en obra que los vehículos de carga no sean llenados por encima de su capacidad a su vez respetándose las rutas establecidas por la EMAVI - Humectación zonas de excavación
Anexos o Formatos	- Soporte socialización riesgos y peligros personal externo - Control vehículos mes reportado.

Registro fotográfico









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 05 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros**
Gestión Interventoría	- A la fecha se continúa con el mantenimiento adecuado en la zona temporal de baterías sanitarias para personal de obra donde las aguas residuales entregan al sistema existente de alcantarillado de la EMAVI. - Se mantiene señalización de concientización ambiental en el ahorro y cuidado de los recursos naturales. - Protección de cajas de inspección sanitarias aledañas al proyecto. - Protección zona verdes aledañas en punto temporal de lavado de tolvas de camión mezclador. Actividad técnica del mes reportado
Anexos o Formatos	- Inspección Ambiental - Inspección locativa, orden y aseo

Registro fotográfico









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 06 Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote**
Gestión Interventoría	- Validación de certificación del gestor contratamos y suministramos del gestor de transporte Obras civiles de ingeniería SAS. En los predios: El pescador sentado, los becerros, palmaseca donde se realiza recuperación geomorfológica. - Desde el 31 julio 2024 que inicio proceso descapote en Edificio N°1 con la aprobación de la adición en esta misma fecha en el segundo Edificio. A la fecha se cuenta solo con avance estructural
Anexos o Formatos	- Planilla de control de remisión de residuos salientes de excavación - Remisiones de material (corte quincenal.) - Registro fotográfico Interventoria SISOMA
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 07 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos**
Gestión Interventoría	- Socialización de riesgos y medidas preventivas en obra en trabajos simultaneo entre vehículos y personal operarios de volquetas, personal contratista y subcontratista. - Revisión en el diligenciamiento de preoperacionales de equipos en obra. - Verificación de documentación reglamentario previa al ingreso de vehículos a obra. - Acompañamiento permanente en las diferentes actividades que involucra relación trabajadora equipo y/o maquinaria y/o vehículo. - Verificación en mantenimiento de señalización de tráfico.
Anexos o Formatos	- Soporte de inspección de EPP en obra - Soporte de socialización riesgos, peligros y medidas preventivas - Control ingresos vehículos periodo reportado
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) en Obra	
Programa	**Programa LAM 08 Señalización de seguridad**
Gestión Interventoría	- Se verifica que a la fecha contratista conserva cerramiento del perímetro donde se realiza el proceso constructivo del proyecto. - Para este mes se verifico mantenimiento de las señales instaladas en el mes anterior - Se conserva señalización ambiental en relación a orden y aseo en áreas de trabajo, ahorro y cuidado de los recursos naturales. - Se verifica demarcación de individuo arbóreo que se encuentra dentro del perímetro de obra con la expansión de cerramiento realizada el 24 mayo 2024.
Anexos o Formatos	- Registro fotográfico interventora SISOMA - Inspecciones de Seguridad y Ambiental.
Registro fotográfico	





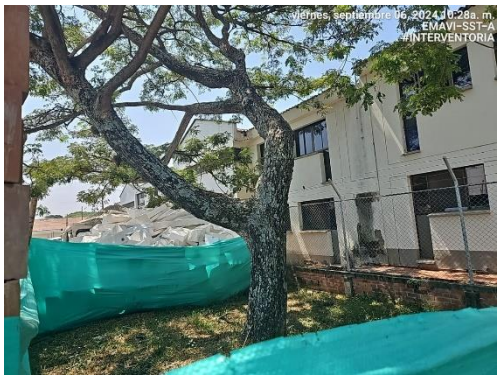




Tabla 6 soporte del contratista entregados a la interventoría en la gestión ambiental del periodo reportado

Formatos del contratista entregados a la interventoría		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista gestión ambiental	X	
Hojas de seguridad de productos químicos según inventario FT-LAM03	X	
Verificación de permisos y autorización ambiental RCD	X	
Soporte de charlas / capacitación ambiental	X	
Soporte de inspección ambiental periodo reportado FT LAM-PMA	X	
Soporte planilla de materiales de construcción FT-LAM01	X	
Soporte planilla relacion de residuos de construcción y demolición FT-LAM02	N/A	N/A
Soporte planilla de inventario químicos FT -LAM03	X	
Soporte cronograma de mantenimiento FT -LAM04	X	
Cronograma / Plan de trabajo ambiental actualizado periodo reportado FT LAM	X	
Soporte de preoperacionales de equipos, maquinas del periodo reportado	X	
Soporte socialización de riesgos, peligros y medidas preventivas en trabajos simultáneos entre personal y vehículos del periodo reportado en el mes.	X	
Entrega documentación de vehículos y operario relacionados en el periodo reportado como: Soat, Tecnomecanica, licencia de conducción, planilla de seguridad social.	X	
Soporte y/o constancia de aprovechamiento residuos de cartón salientes del proceso constructivo.	X	
Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista		
Nota: Esta interventoría SISOMA realiza seguimiento a los 8 programas descriptos en este documento y presentados en el Plan de manejo Ambiental (PMA) aprobado el 05 marzo 2024.		

OBERVACIONES / PENDIENTE:

Para este periodo no se reportó o presento evento o emergencia ambiental en no se generó residuos peligrosos o de disposición de residuos especiales.

4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS PERIODO REPORTADO. (Concientización Ambiental).

Muestra de soportes entregados por contratista LAM.

N°	Tema de capacitación	Fecha (dd-mm-aaaa)	N° Asistentes
1	Manejo de residuos sólidos y RCD	28-09-2024	22
2	Acopios temporales en obra	27-09-2024	22

- Se realiza recomendación al contratista LAM CONSTRUCCIONES por parte de esta interventoría en ***abarcar todo el personal en obra contratista y subcontratista***. A la fecha se cumple con el plan de capacitación en relación al Plan de manejo Ambiental.

5. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (INDICADORES AMBIENTALES)

En este periodo se reportan los siguientes indicadores ambientales para las actividades constructiva.

INDICADOR	MES	GESTION
Maquinaria y equipos en obra		
$\frac{No\ de\ Mantenimientos\ Realizados}{No\ de\ Mantenimientos\ Programados} x100$	Marzo	3/3 = 100%
	Abril	4/4 = 100%
	Mayo	4/4 = 100%
	Junio	1/1= 100%

	Julio	3/3=100%
	Agosto	2/2= 100%
	Septiembre	2/2= 100%
Señalización		
$\frac{No\ de\ Frentes\ de\ Obra\ Señalizados}{No\ de\ Frentes\ de\ Obra\ Intervenidos} x100 =$	Marzo	5/5 = 100%
	Abril	8/8 = 100%
	Mayo	10/10=100%
	Junio	9/9= 100%
	Julio	10/10=100%
	Agosto	11/11 = 100%
	Septiembre	4/4 = 100%
Recipientes en obra		
$\frac{Numero\ de\ Recipientes\ Instalados\ (NRO)}{No\ de\ Recipientes\ Requerido\ (NRQ)} x100$	marzo	6/6 = 100%
	Junio	9/9 = 100%
	A la fecha se continua con los 6 recipientes que conforman los dos puntos ecológicos en obra. Para el mes de junio se instaló nuevo punto ecológico en lado derecho de la obra.	
Disposición adecuada de residuos de obra		
	marzo	RCD (material de excavación – 334,4 Toneladas) 334400 kg / 334400kg
	Abril	RCD (material de excavación – 144 Toneladas) 144000 kg / 144000kg

$\frac{Residuos\ Generados\ \ (Kg)}{Residuos\ Dispuestos\ Correctamente\ (Kg)} x100$	Mayo	Mayo y agosto: 233.6 Toneladas
	Junio	Para este periodo no se realiza disposición de RCD.
	Julio	Remoción tierra 26 mt
	Agosto	448 toneladas
	Septiembre	Para este periodo no se realiza disposición de RCD.
$\frac{No\ de\ sitios\ autorizados}{No\ de\ sitios\ utilizados} x100$	marzo	3/3 = 100%
	A la fecha se cuenta con el gestor contratamos y suministramos desde el mes de marzo.	
$\frac{Residuos\ ordinarios\ dispuestos\ \ (Kg)}{Residuos\ ordinarios\ \ generados\ (Kg)} x100$	marzo	Aprox punto ecológico 20kg/20kg
	A la fecha el estimado de generación de residuos ordinarios es de 20 kg en el mes. Dispuestos directamente en la zona de acopio de residuos no aprovechables de la EMAVI, donde el recolector ingresa para disposición final adecuada de estos residuos.	
Zonas de depósito demarcadas y protegidas		
$\frac{No\ de\ zonas\ de\ dépositos\ demarcados\ y\ protegidos}{No\ de\ zonas\ de\ dépositos\ en\ obra} x100$	marzo	4/4 = 100%
	Abril	4/4 = 100%
	Mayo	6/6 = 100%
	junio	4/4= 100%
	Julio	5/5=100%
	Agosto	4/4= 100%

	Septiembre	3/3 = 100%
Emisiones atmosféricas		
$\frac{\#\ Vehiculos\ con\ RTM}{\#\ Vehiculos\ empleados} x100$y	marzo	19 / 19 = 100%
	Abril	27 / 27 = 100%
	Mayo	21/21= 100%
	junio	9/9= 100%
	Julio	24/24= 100%
	Agosto	25/25 = 100%
	Septiembre	13/13 = 100%
Servicios sanitarios en obra		
$\frac{\#\ Unidades\ moviles\ o\ fijas}{\#\ Empleados\ en\ el\ frente} x100$	marzo	3/3 = 100%
• A la fecha se conservan las 3 baterías sanitarias acondicionadas en el perímetro interno en obra. Desde el mes de inicio de construcción (marzo-2024).		

6. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AMBIENTAL. (Plan de manejo Ambiental).

Con respecto a los recursos necesarios para la implementación del PMA, se informa que actualmente el contrato cuenta con un presupuesto de **$ 750.000,00** para la implementación del mismo, adicionalmente las condiciones del presente contrato no exigen entregar un desglose de inversión del plan en mención.

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA GESTION AMBIENTAL.

Durante la ejecución de las actividades constructivas que se tuvieron en el periodo evaluado por esta interventoría SISOMA se evidencio la buena gestión en el cumplimiento de los diferentes programas que conforman el Plan de manejo Ambiental (PMA) del contratista LAM Construcciones. Siendo el total de programas 8.

- Cabe mencionar abastecer insumos de señalización para el caso de materiales pétreos o agregados

6. Tabla de seguimiento Manual /programa de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Esta interventoria SISOMA realiza seguimiento a los 8 programas presentado por el contratista en el Manual de Seguridad SST.

1. Reglamento de seguridad e higiene
2. Medicina preventiva y del trabajo
3. Entrega de dotación y Elementos de protección personal
4. Plan de inducción, socialización y capacitación
5. Orden y aseo
6. Ausentismo Laboral (ATEL)
7. Afiliación seguridad social
8. Seguimiento actividades de alto riesgo (Altura).

Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 1	**Reglamento de higiene y seguridad industrial**
Gestión Interventoría	A la fecha se continúa realizando publicación y socialización de cartelera informativa en obra que contiene: - Política SST - Política de no consumo de alcohol, sustancias psicoactivas - Personal que conformar el Comité operativo de emergencia COE, - flujograma de plan de evacuación de emergencia. - Reglamento de higiene - Números de emergencia, tipo de RH o alergia de personal en obra
Anexos o Formatos	- Registro fotográfico interventora SISOMA - Registro socialización cartelera informativa de obra
Registro fotográfico	
	

Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 2	**Medicina preventiva y del trabajo**
Gestión Interventoría	- Se verifica la toma de examen médico de ingreso por trabajador con el objetivo de conocer el estado de salud y las condiciones especiales que puedan tener, a su vez de forma continua contratista realiza charlas diarias donde se promueve las bases para continuar con la prevención y promoción de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades. - De igual forma a la fecha se cuenta con representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), quien promueve la gestión y promoción de buenas prácticas seguras y hábitos saludables. - Se cuenta con cartelera informativa en obra, que promueve el no consumo de alcohol, sustancias psicoactivas o tabaquismo. - Socialización de comportamiento seguro, hábitos saludables en proceso de inducción.
Anexos o Formatos	- Soporte de exámenes médicos de ingreso del periodo reportado. - Cartelera informativa en obra. - Charlas de promoción de la salud, inducción, calistenia etc. - Soporte reunión COPASST
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 3	**Entrega de dotación y elementos de protección personal**
Gestión Interventoría	- Desde el inicio de las labores le son asignados a cada trabajador los EPP para el buen desarrollo de su labor, al igual que la dotación que los identifica como trabajadores de la obra. - Personal externo se le exige uso de EPP y visitantes se les otorga EPP para autorizar el ingreso a obra con socialización de medidas preventivas en el riesgo existente en obra. - Se cuenta con punto de acopio temporal de EPP, destinados para disposición final adecuada.
Anexos o Formatos	- Soporte entrega de dotación y EPP. - Charla de seguridad sobre cuidado y uso correcto de los EPP - Registro fotográfico SISOMA Interventoría
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 4	**Plan de inducción, socialización y capacitación**
Gestión Interventoría	- Se verifica que personal que ingresa nuevo al proyecto cuente con inducción de seguridad, a su vez diariamente se realizan charlas según necesidades del proyecto, acompañadas de pausas activas. - En el caso de personal externo como visitantes, asesores se realiza socialización de riesgos, peligros y medidas preventivas previas a la ejecución de actividades o ingreso en obra.
Anexos o Formatos	- Registro de asistencia a socialización, inducción y/o capacitación - Registro de charlas de seguridad - Registro fotográfico SISOMA Interventoría

Registro fotográfico










Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 5	**Orden y aseo frentes de trabajo**
Gestión Interventoría	- Durante el periodo de este informe **(del 01 al 30 de septiembre 2024)** se evidencio en obra la realización de jornadas de orden y aseo en las zonas: administrativas, almacén, baterías sanitarias, frente o zonas de trabajo, zonas temporales de acopio de insumos de obra cumpliéndose con los estándares locativos en Edificio 1 y 2.
Anexos o Formatos	- Inspecciones locativas, orden y ase, Ambiental y SST. - Registro de charlas de seguridad ambiental - Registro fotográfico SISOMA Interventoría

Registro fotográfico





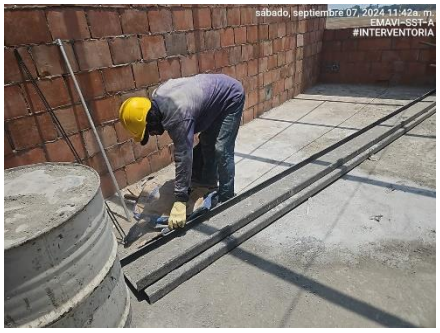



Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 6	**Ausentismo laboral (Accidente y/ Enfermedad Laboral)**
Gestión Interventoría	- Desde esta interventoría se le hace seguimiento a los acontecimientos que ocurran en obra como accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral o común. - Para este mes de ***septiembre* 2024** no se reportó o registro novedades en relación a ausentismo por accidente o enfermedad laboral. Se ha realizado seguimiento exhaustivo sobre las medidas preventivas en campo lo que ha garantizado la no ocurrencia de eventos no deseados. **Algunas acciones como**: - Supervisión continua en las diferentes actividades ejecutadas en obra - Socialización de cartelera informativa en obra en especial reglamento de higiene y seguridad - Charlas e inspecciones de seguridad - Evaluación de riesgos y peligros por medio de matriz GTC45
Anexos o Formatos	- Inspecciones locativas, orden y ase, Ambiental y SST. - Registro de charlas de seguridad ambiental - Registro fotográfico SISOMA Interventoría
Registro fotográfico	
	
	

Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 7	**Afiliación sistema de seguridad social**
Gestión Interventoría	- Desde esta interventoría se hace seguimiento de forma continua y exhaustiva la revisión reglamentaria previa al ingreso de personal a obra que cumpla con los soportes de pago o afiliación de seguridad social vigente. Personal propio, subcontratado, visitante, asesores. - Se rectifica información de personal en obra y se realiza socialización de seguridad a la vez de riesgos y peligros. - De forma periódica personal de la EMAVI del área SST también realiza inspecciones y socialización de seguridad según los riesgos de la obra.
Anexos o Formatos	- Soporte planillas contratista, subcontratista - Soporte planillas control vehículos periodo reportado - Registro fotográfico SISOMA Interventoría - Visita por supervisión del proyecto (FAC-EMAVI)
Registro fotográfico	









Seguimiento Plan / manual seguridad y salud en el trabajo (SST)	
Requerimiento 8	**Seguimiento actividades de Alto riesgo (Altura) y otros**
Gestión Interventoría	- Desde esta interventoría se hace seguimiento de forma continua y exhaustiva a nivel documental y en campo
Anexos o Formatos	- Certificados de competencia laboral TSA - Soporte permiso de Alturas - Actas comité SISOMA - Comunicados de seguimiento TSA. - Registro fotográfico SISOMA Interventoría

Registro fotográfico









7. Soportes del contratista entregados a la interventoría en la gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del periodo reportado

Formatos del contratista entregados a la interventoría SST		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista gestión SST periodo reportado	X	
Soportes de afiliación personal nuevo en obra con antecedentes	X	
Soporte de pago de planilla de seguridad social	X	
Soporte entrega dotación y EPP personal en obra	X	
Soporte de inducción personal contratista periodo reportado	X	
Soporte de inducción personal subcontratista periodo reportado	X	
Soporte diligenciamiento de Análisis de riesgo en obra (ATS)	X	
Soporte registro de asistencia a charlas / capacitación SST	X	
Soporte registro de asistencia en la identificación de riesgos, peligros y medidas de prevención en obra, personal propio.	X	
Soporte registro de asistencia en la identificación de riesgos, peligros y medidas de prevención en obra, personal subcontratado o indirecto.	X	
Soporte socialización y publicación política de seguridad y salud en el trabajo	X	
Soporte socialización y publicación política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo	X	
Soporte socialización y publicación reglamento higiene	X	
Soporte inspección de equipos de emergencia (camilla, extintor, botiquín)	X	
Soporte inspección locativa, orden y aseo	X	
Soporte inspección planeada y locativas	X	
Soporte inspección de Elementos de protección personal (EPP)	X	
Soporte de inspección mensual de herramientas y equipos eléctricos	X	
Soportes preoperacionales de equipos utilizados en el mes reportado	X	
Perfil sociodemográfico actualizado periodo reportado	X	
Matriz de riesgo GTC 45 (Actualizada)	X	
Plan de trabajo / anual actualizado al periodo reportado	X	

Permisos de trabajo (caliente)	X	
Paz y salvo personal retirado en el mes (abril 2 retiros) (mayo 1 retiro)		X
Cronograma de capacitación COPASST y COCOLAB	X	
Planillas profesionales asesores del proyecto	X	
Soporte de inspección de equipos de protección contra caída (2 revisión de equipos en stock).		X

Calificación Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista
• Desde el periodo de mayo se inicia actividades a diferente nivel en relación al armado, uso de andamio y equipo de protección personal para actividades en altura de personal propio del contratista LAM CONSTRUCCIONES. Cabe mencionar que esta Interventoría continúa realizando seguimiento con cuadro de personal autorizado descripto desde el acta de mesa de trabajo inicial N**o 7 realizada el sábado 20 abril 2024.**
• A la fecha se ha remitido comunicados en relación al cumplimiento de normas de seguridad en actividades a diferente nivel o Trabajo Seguro en Alturas (TSA) (IFA-057-IFA-080, IFA-082, IFA-090). Esta interventoria continúa realizando seguimiento esencial a este tipo de actividad en obra.
• Para este periodo reportado se debe continuar reforzando tema de autocuidado en la identificación de riesgos y peligros en las diferentes actividades ejecutadas en obra.
• Para este periodo no se registra ausentismo por accidente o enfermedad laboral. (ATEL).

8. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES SST REALIZADAS PERIODO REPORTADO.

Para este periodo se registró el total de **08 soportes** de inducción y **05 soportes de asistencia** se resaltan los siguientes temas tratados en obra en la prevención de los riesgos SST.

N°	Tema de capacitación	Fecha (dd-mm-aaaa)	N° Asistentes
1	socialización de riesgos y peligros en obra	19-09-2024	4
2	socialización de riesgos y peligros en Altura	11-09-2024	19
3	socialización de riesgos y peligros locativos	10-09-2024	16
4	socialización de personal no autorizado en obra	06-09-2024	5

9. SEGUIMIENTO PROGRAMA / MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (SST-INDICADORES).

Seguimiento programa de salud y seguridad en el trabajo	Descripción al seguimiento
1. Actividades de Alto riesgo	
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Alturas, Soldadura, espacios confinados) entregar a certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio.	Durante el periodo reportado se utilizó andamios y se ejecutó actividades en losa de entre piso a una altura promedio de 2.70 metros lo que involucro el uso adecuado de los equipos de protección contra caídas. **Se requirió al contratista por esta interventoría los siguientes documentos:** - Certificados de altura TSA - Permisos de TSA - Hoja de vida equipos TSA - Inspección mensual equipos TSA - Charlas de seguridad enfatizada al riesgo a diferente nivel. - Acompañamiento 100% SISOMA
2. **Uso y entrega Elementos de protección personal**	
Solicitar registro de entrega y de uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar	Durante el tiempo de realización de este informe se realizaron los registros de entregas de los EPP y de la dotación.
3. **Reporte e Investigación Accidente de Trabajo**	
Realizar oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la resolución vigente, en caso de presentarse anexar el reporte.	Para el periodo reportado 2024, no se reportó accidente o Enfermedad laboral.
4 indicadores de ausentismo por Accidente o Enfermedad Laboral ATEL	
Consolidar indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra de acuerdo con la formulación establecida por la norma.	Para el mes reportado 2024, estos indicadores se encuentran en 0%. Ya que no se reportó eventos de origen laboral adversos en el proyecto
5 Paz y salvo personal retirado	
Presentar paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal	**PENDIENTE:** A la fecha se encuentra pendiente 4 paz y salvos formalizados. 2 corresponde mes de abril 2 corresponde mes de mayo
6 inspecciones realizadas en el periodo	
Numero Inspecciones de seguridad realizadas / número de inspecciones programadas * 100	4/4 = 100%

7 inducción personal	
Número de inducciones realizadas/número total personas contratadas *100	08/08= 100%
8 charlas de seguridad realizadas	
Número de capacitaciones / charlas de seguridad realizadas/número de capacitaciones / charlas programadas*100	05/05= 100%

10. DISCRIMINACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

Población	Hombres (Local)	Mujeres (Local)	Hombres (Externo)	Mujeres (Externo)	Total
Director de obra			1		1
Residente			1		1
Arquitecto Asesor			1		1
Auxiliar Ingeniería			1		1
Coord Adm			1		1
Aux Arquitecto	1				1
Ambiental-SST	1				1
Ayudantes	40		12		52
Sub. volquetas	3				3
Asesores subcontratista			1		1
Sub Casetones	6				6
TOTAL	**49**		**18**		**69**

- **Observación 1:** A través del comunicado **LAM-138-118-2024** enviado por el Contratista LAM CONSTRUCCIONES el día miércoles 27 marzo se informó a esta interventoría los nuevos cargos del personal operativo quedando a nivel general. (Ayudantes).
- **Observación 2:** A la fecha Contratista cuenta con **4 asesores** en las áreas de: Hidrosanitario, Electrico, Electrónico y Estructural. Cabe mencionar que de los asesores anteriormente nombrados solo el Ingeniero Marcelo Medina Martínez Profesional Estructural es quien ha estado en obra. ***A la fecha Contratista no ha suministrado planillas de personal asesor externo de: Electrico, Electrónico, Hidrosanitario*.**

11. CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE GRUPOS DE APOYO.

A la fecha Contratista LAM Construcciones realizo la gestión en la elección de integrantes de los comités como: COPASST y COCOLAB. A su vez se cuenta con un temario realizado según las necesidades o requerimiento de las condiciones actuales de la obra. Cabe mencionar que se cuenta con un profesional con dedicación en obra del 100%.

COMITE	Fecha de conformación	Integrantes Trabajadores	Integrantes Empresa
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).	20-abril-2024	Francisco Morales	Miguel Felipe Ríos Luis Eduardo Aguirre
Comité de convivencia Laboral (COCOLAB)	09-mayo-2024	Oscar Sinesterra David de los Ríos Diaz	Luis Eduardo Aguirre Cesar Alejandro Ruales

12. ANÁLISIS DE AUSENTISMO.

Contratista LAM CONSTRUCCIONES consolida indicadores de ausentismo laboral general y laboral en el informe No 1 del mes de marzo 2024. **En el periodo reportado no se presenta ninguna novedad en relación a ausentismo laboral por Accidente o Enfermedad calificada y/o casos médicos de seguimiento.**

Mes	Novedad	Descripción evento	Días de ausentismo AT	Estado del seguimiento
Marzo	Accidente de trabajo 14 marzo 2024	Lesión dedo medido mano izquierda por manipulación de material dentro de excavación de zapata	5 días Incapacidad medica laboral	Caso cerrado subsanado por medio de los siguientes soportes: - Reporte FURAT - Investigación de AT - Socialización lesión aprendida - Reinducción de la persona accidentada
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A

Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A

13. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Con respecto a los recursos necesarios para la implementación del Plan de seguridad y salud en el trabajo, se informa que actualmente LAM Construcciones presenta un esquema aproximado de inversión por un valor de: **$ 29"857.500** para implementación del mismo, adicionalmente las condiciones del presente contrato no exigen entregar un desglose de inversión del plan en mención, seguimiento exhaustivo o cifra de inversión del mismo.

Nota: Este presupuesto se anexo en el periodo inicial del proceso constructivo (marzo 2024).

14. PROCESO DE COMUNICADOS INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PERIODO REPORTADO.

FECHA	ASUNTO	RESPUESTA CONTRATISTA	RESPUESTA INTERVENTORIA
06-09-2024	Certificados RCD periodo de agosto 2024	LAM-138-290-2024	Verificado correo interventoria
26-09-2024	Reiteración, seguimiento y gestión medidas de seguridad para trabajos a diferente nivel.	A la fecha sin repuesta. (Tema en seguimiento por esta Interventoria)	IFA-152

15. TRAZABILIDAD MESAS DE TRABAJO SISOMA

FECHA	N° ACTA MESA SISOMA	PARTICIPANTES	ESTADO DE COMPROMISOS
07-09-2024	N° 27 Seguimiento a requerimientos SST y Ambiental en obra (mesa de trabajo)	Jhon Reyes Talero SISOMA Contratista	1 cumple parcialmente 3 en gestión 8 en seguimiento 8 cumplidos

14-09-2024	N° 28 Seguimiento a requerimientos SST y Ambiental en obra (mesa de trabajo)	Jhon Reyes Talero SISOMA Contratista	1 cumple parcialmente 3 en gestión 8 seguimiento
21-09-2024	N° 29 Seguimiento a requerimientos SST y Ambiental en obra (mesa de trabajo)	Jhon Reyes Talero SISOMA Contratista	1 cumple parcialmente 7 seguimiento 2 cumplidos 9 nuevos compromisos
28-09-2024	N° 30 Seguimiento a requerimientos SST y Ambiental en obra (mesa de trabajo)	Jhon Reyes Talero SISOMA Contratista	12 cumplidos 6 oficiados – IFA 132 12 cumplidos 2 seguimiento 1 nuevos compromisos

15. CONCLUSIONES, ANÁLISIS DE INDICADORES Y RECOMENDACIONES GENERALES.

- Se hace necesario que el contratista LAM CONSTRUCCIONES presente con anterioridad o dentro del plazo que otorga ley a esta interventoría los documentos de personal que se tiene previsto el ingreso a obra. Soportes como: Planilla de seguridad social y/o soportes de afiliación, antecedentes, documentos de vehículos y todos aquellos soportes que sean aplicables a personal propio, subcontratado o de proveedores de servicio o insumos.
- Se da cumplimiento en la gestión de las acciones de implementación del Plan de manejo ambiental (PMA) verificadas en obra por esta interventoría.
- Se da cumplimiento de las acciones de mitigación, prevención y/o control de riesgos y peligros en relación al Plan de salud y seguridad (SST) verificadas en obra por esta interventoría.
- LAM Construcciones debe continuar con la gestión adecuada en la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de salud y seguridad (SST).
- A la fecha LAM Construcciones no ha suministrado a esta interventoría planillas de asesores externos como: Eléctrico, Electrónico, Hidrosanitario.

- El Contratista de obra debe continuar reforzando la identificación de riesgos, peligros y medidas preventivas en actividades a diferente nivel, bajo cumplimiento de la norma 4272/2021 en relación a Trabajo Seguro en Alturas (TSA).

16. SOPORTES INFORME DE INTERVENTORIA N° 6 PERIODO AGOSTO 2024

1 soportes gestión SST

1. Ingresos
2. Permiso TSA
3. Inspección de extintores
4. Inspección de Botiquín
5. Inspección Planeada locativa
6. Inducción personal
7. ATS (Riesgos)
8. Registro de asistencia SST
9. Entrega dotación y EPP
10. Permiso Trabajo en caliente
11. Inspección de EPP
12. Acta COPASST
13. Acta COCOLAB
14. Plan anual SST Actualizado
15. Perfil sociodemográfico
16. Plan Capacitación COPASST-COCOLAB
17. Planillas SS

2. soportes gestión Ambiental

1. Control vehículos
2. Charlas Ambientales
3. Inspección Ambiental
4. inventario productos Químicos
5. Preoperacionales equipos
6. Inspección locativa orden y aseo
7. Inspección planeada locativa

8. Mantenimiento de equipos y herramientas
9. Plan de Trabajo Ambiental
10. Planillas materiales de Construcción
11. Constancia aprovechamiento ASOTRIUNFO

3. **soporte actas mesa trabajo Interventoría SISOMA**

- Acta N°22 Mesa de Trabajo SISOMA 29 al 03 agosto
- Acta N°23 Mesa de Trabajo SISOMA 05 al 09 agosto
- Acta N°24 Mesa de Trabajo SISOMA 12 al 17 agosto
- Acta N°25 Mesa de Trabajo SISOMA 20 al 24 agosto
- Acta No 26 Mesa de Trabajo SISOMA 26 al 31 agosto

4. **soportes comunicados SISOMA Interventoría y Contratista**

- 12-08-2024 Certificados RCD (mayo)
- 15-08-2024 Medidas de seguridad para TSA
- 21-08-2024 Antecedentes personal CEMEX
- 23-08-2024 Antecedentes personal CEMEX
- 26-08-2024 Certificados RCD (agosto)
- 28-08-2024 Compromisos pendientes SISOMA

5. **Registro fotográfico interventoría gestión SISOMA**

- Semana 23 del 05 al 09 agosto
- Semana 24 del 12 al 17 agosto
- Semana 25 del 19 al 24 agosto
- Semana 26 del 26 al 31 agosto

6. **Planillas de Interventoría**
7. **Informe Contratista (agosto)**
