COMITÉ/ GRUPO	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA		
COCOLAB	10:00 A:m	11:00 Am	21	septiembre	2024

ACTA # 6
ORDEN DEL DÍA

Temas

- Reunir al grupo para la reunión mensual de COPASST
- Recolección de todos los equipos de altura de la Obra
- Reconocimiento de equipos de alturas en mal estado
- Relacionar los equipos a retirar de funcionamiento para actividades de la Obra
- Método que se aplica para retirar
- Socializar con almacenista la no operatividad de estos equipos.

Acciones

1. Se realiza recorrido por el área externa e interna de la estructura para observar cuantos equipos de alturas hay y proceder agruparlos con los equipos que se encuentran en el contendor del almacén
2. Se organizan los equipos y se verifica el número total de equipos de alturas
3. A continuación se procede a inspeccionar y verificar el estado de cada uno de los equipos de alturas para retirar los que están no están aptos para la actividad
4. Al retirar los equipos se coloca cinta peligro y se hace embalaje del equipo para ser retirado de los que se encuentran en buenas condiciones para la labor.
5. Los equipos retirados son relacionados en su documento de hoja de vida para tener constancia y cumplimiento a la Resolución 4272 y de esta manera socializar en el almacén para no hacer entrega de ellos
6. Los equipos retirados quedan a disposición de la empresa LAM CONSTRUCCIONES SAS para determinar sobre ellos.
7. Se deja constancia de estas acciones en acompañamiento de la interventoría y como representante de la firma la profesional SST y por parte de LAM CONSTRUCCIONES SAS, el profesional SST
8. Queda registrado en el ACTA COPASST. Como acciones de seguridad enfocado en las tareas de alto riesgo en trabajo en alturas, como medida responsable por parte de LAM CONSTRUCCIONES SAS frente al cumplimiento de la resolución.

Anexos

Fotografías de la actividad:



Equipos agrupados para la inspección por parte de LAM CONSTRUCCIONES SAS















Se dejan evidencias fotográficas de las 3 eslingas y 3 arnés que se retiran de funcionalidad para la actividad de trabajo en alturas


Arnés N°1 de baja

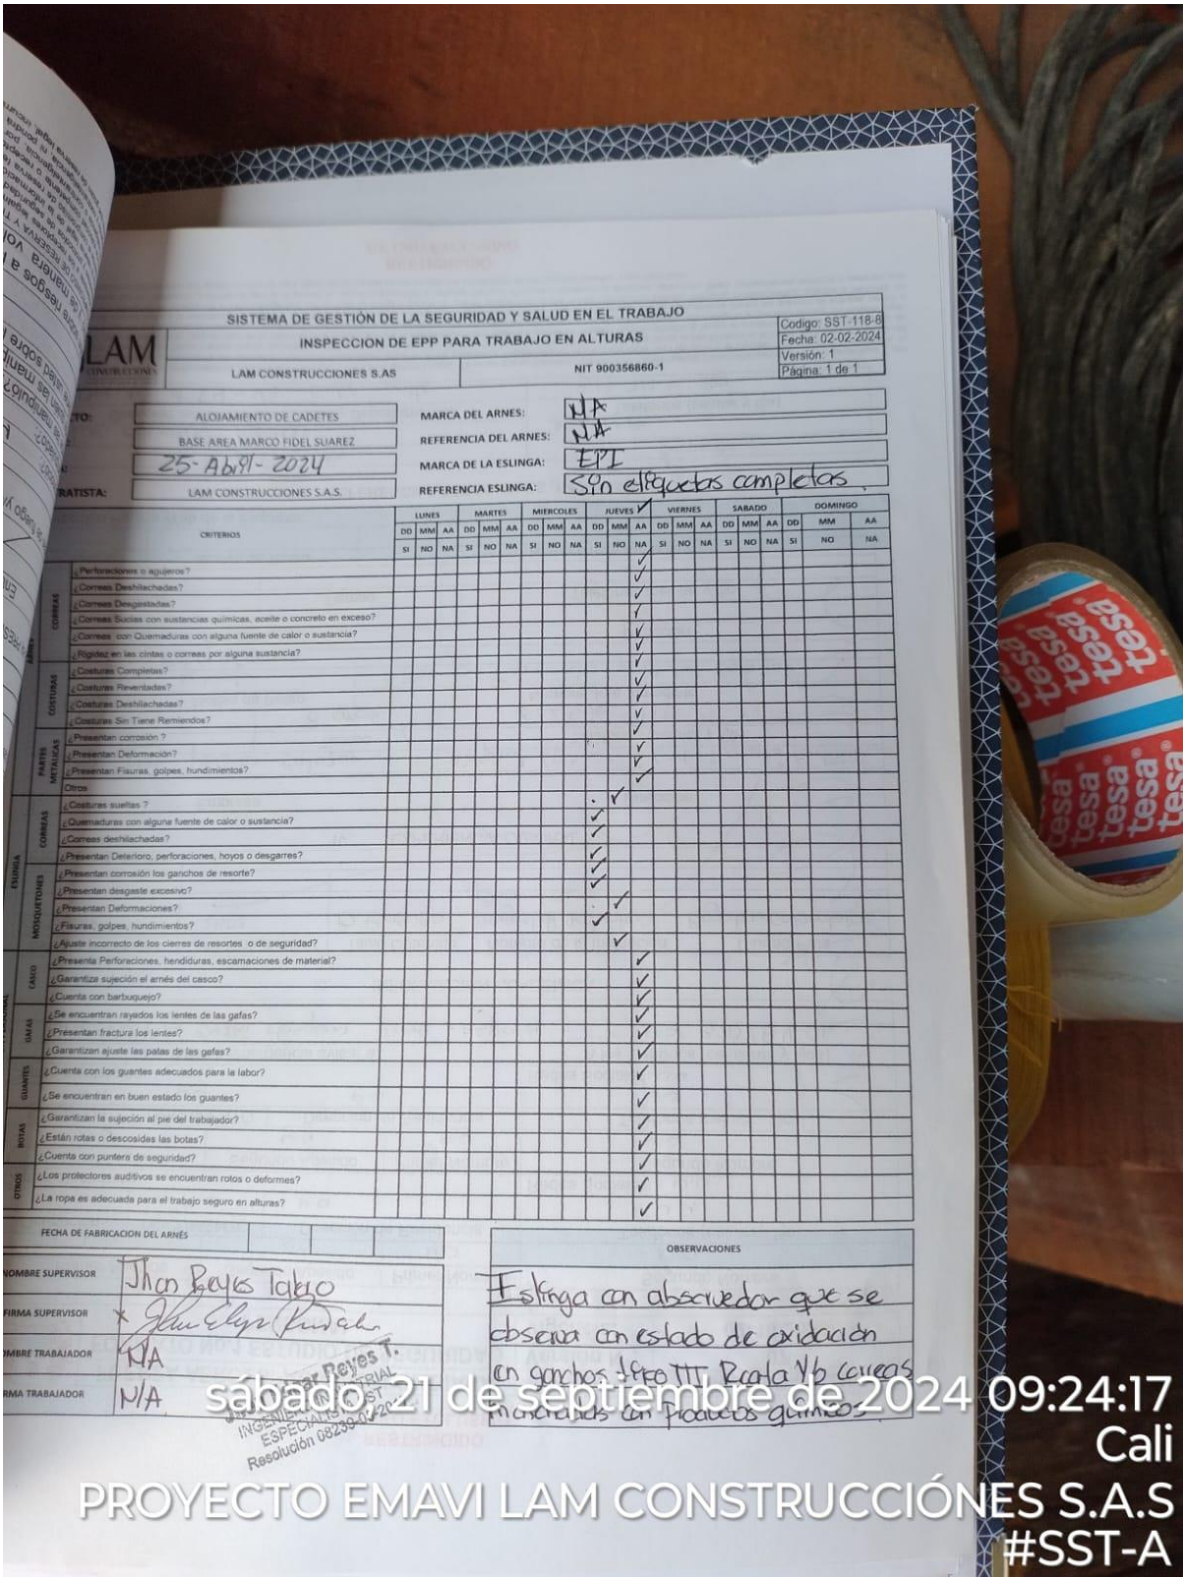


Arnés N°2 de baja

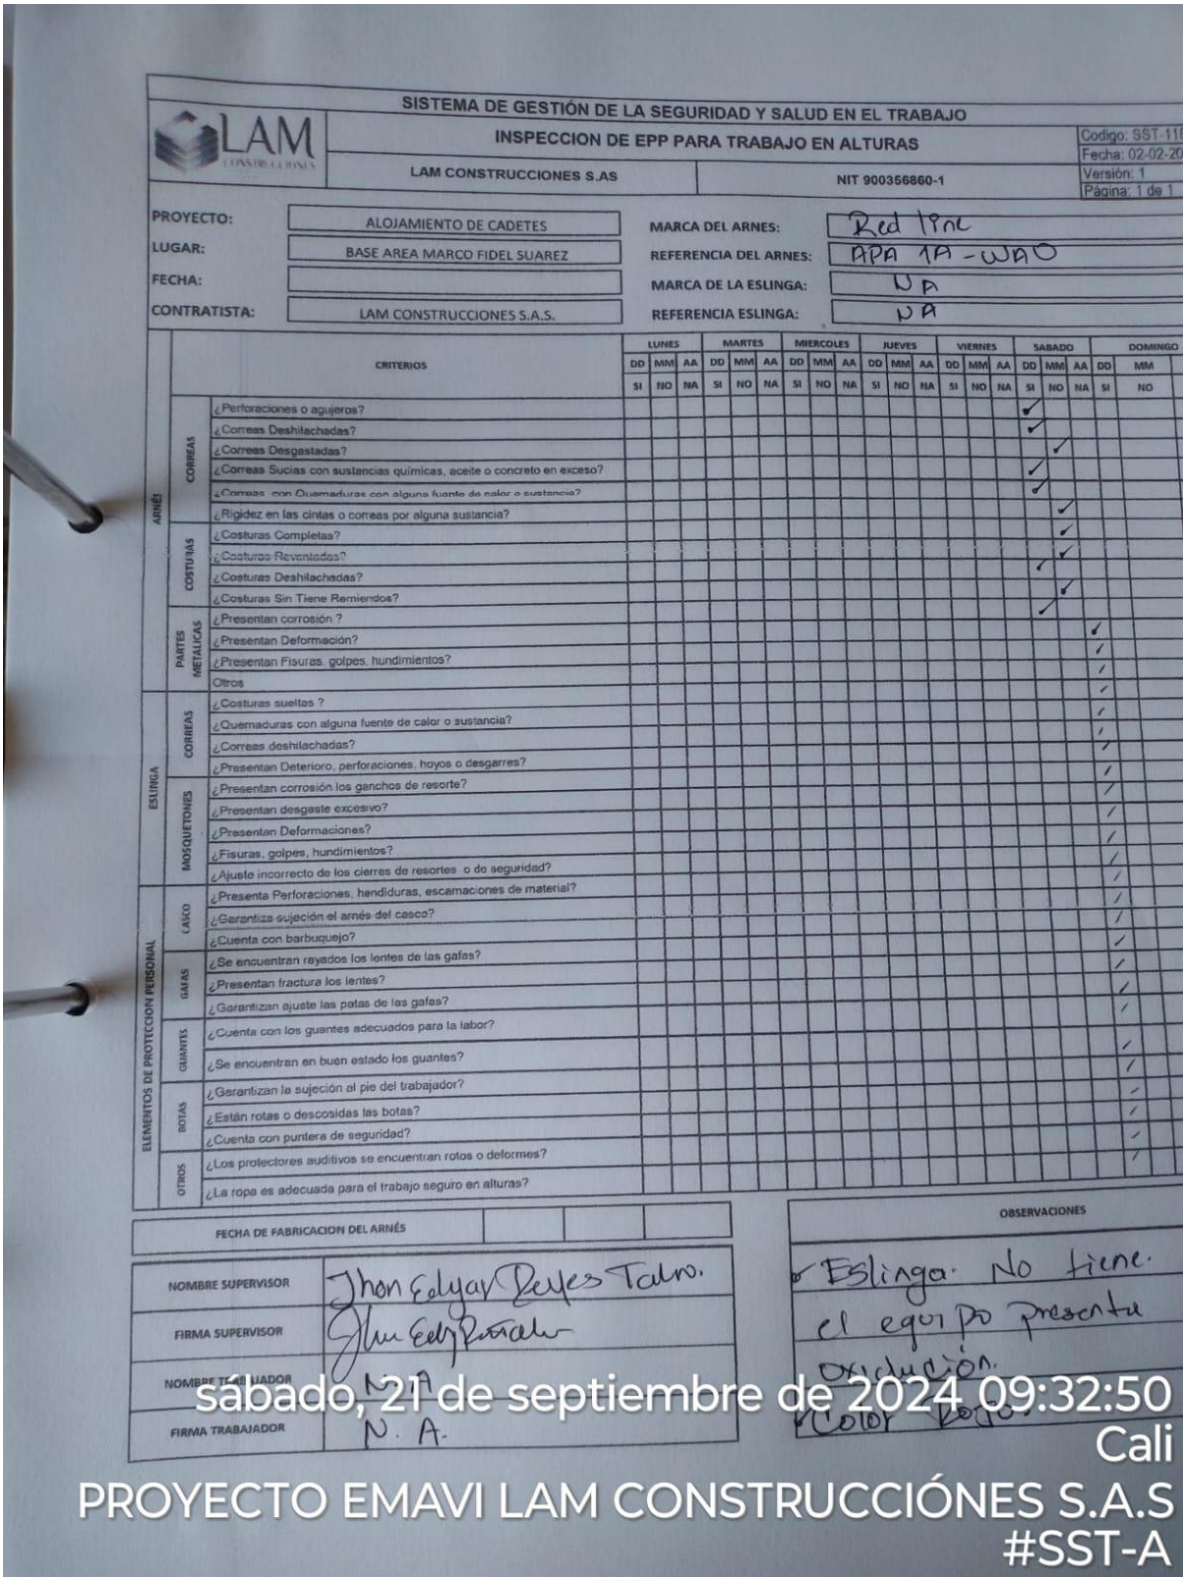

Arnés N°3 de baja

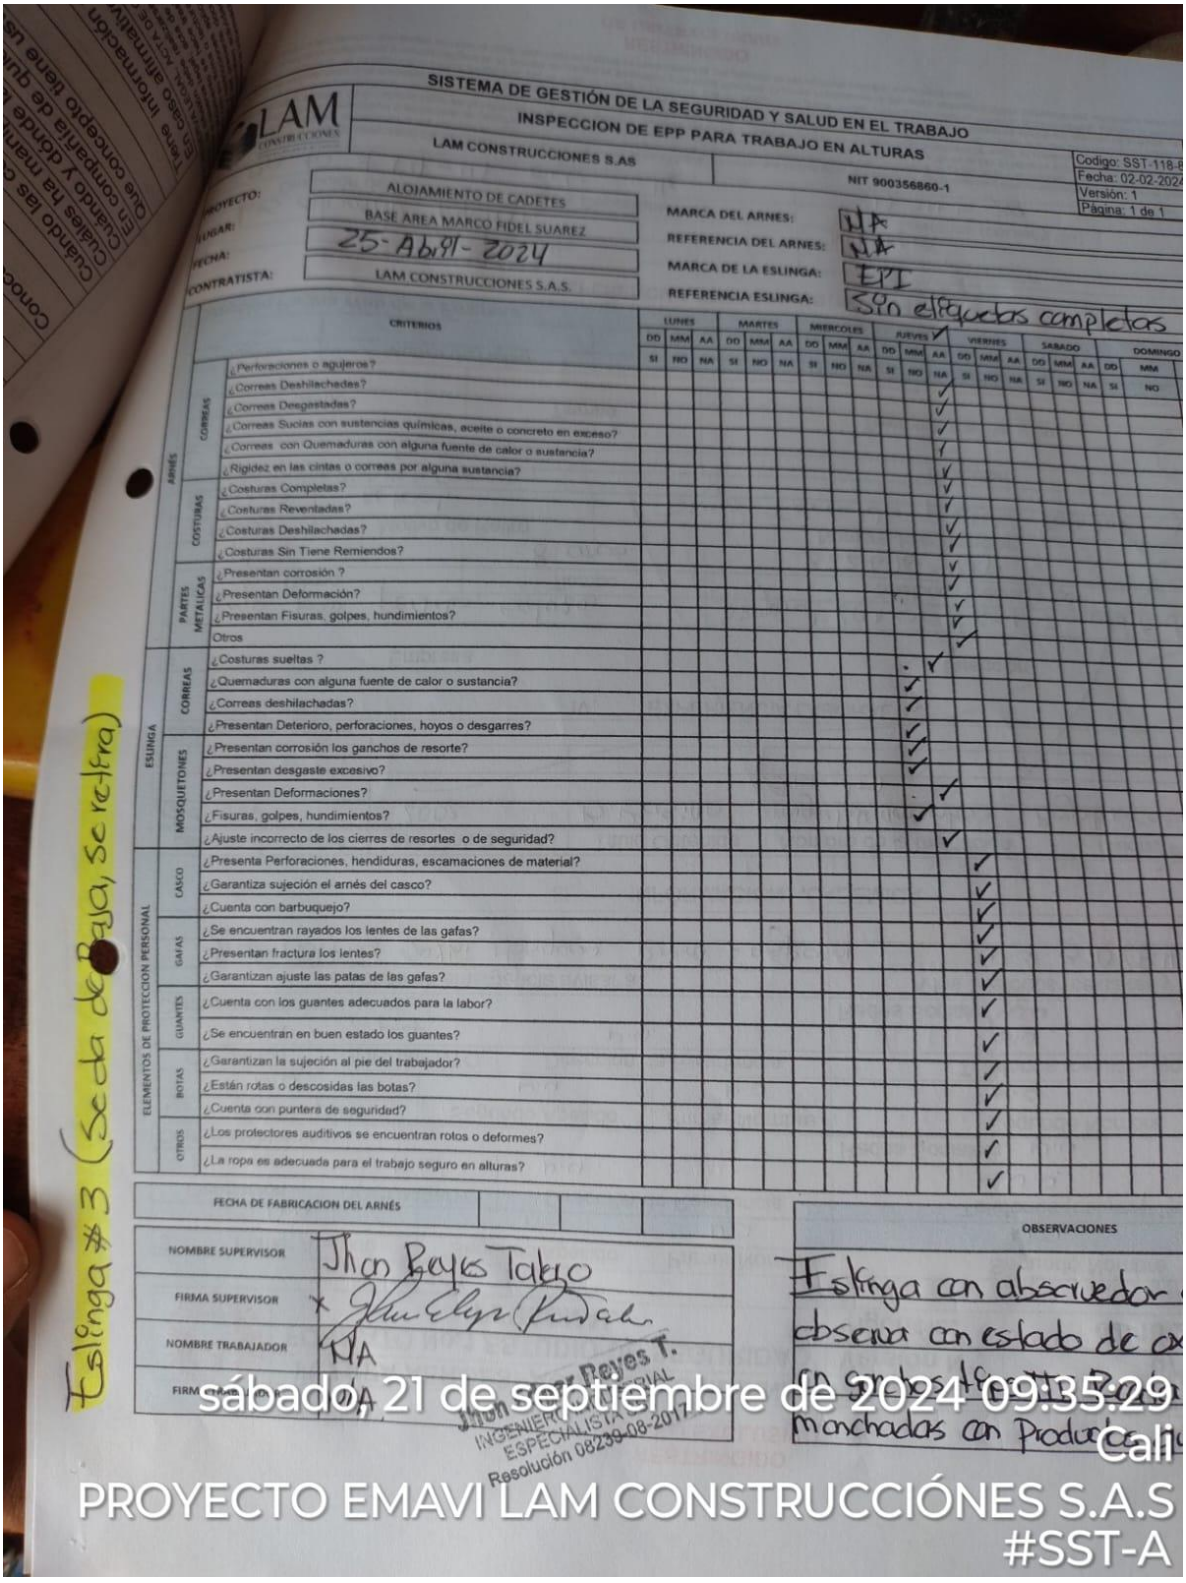

Eslinga N°1 de baja

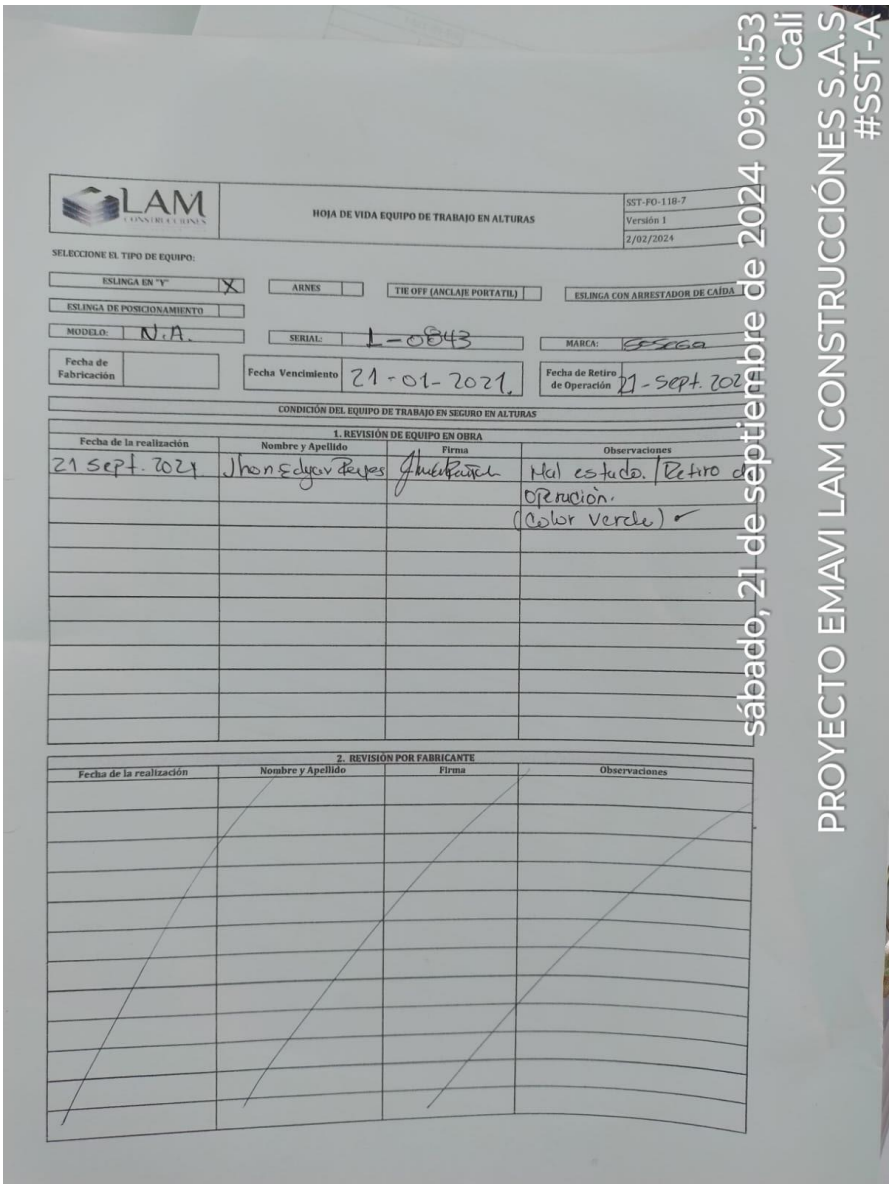

LAM CONSTRUCCIONES

HOJA DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

SST-FO-118-7
Versión 1
2/02/2024

SELECCIONE EL TIPO DE EQUIPO:

ESLINGA EN "Y" X	ARNES	TIE OFF (ANCLAJE PORTATIL)	ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAÍDA
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			

MODELO:	N.A.	SERIAL:	L-0843	MARCA:	[illegible]
Fecha de Fabricación		Fecha Vencimiento	21-01-2021	Fecha de Retiro de Operación	21-Sept. 202

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS


1. REVISIÓN DE EQUIPO EN OBRA

Fecha de la realización	Nombre y Apellido	Firma	Observaciones
21 sept. 2024	Jhon Edyar Reyes	[signature]	Mal estado. Retiro de operación. (Color Verde)


2. REVISIÓN POR FABRICANTE

Fecha de la realización	Nombre y Apellido	Firma	Observaciones

Eslinga N°2 de baja

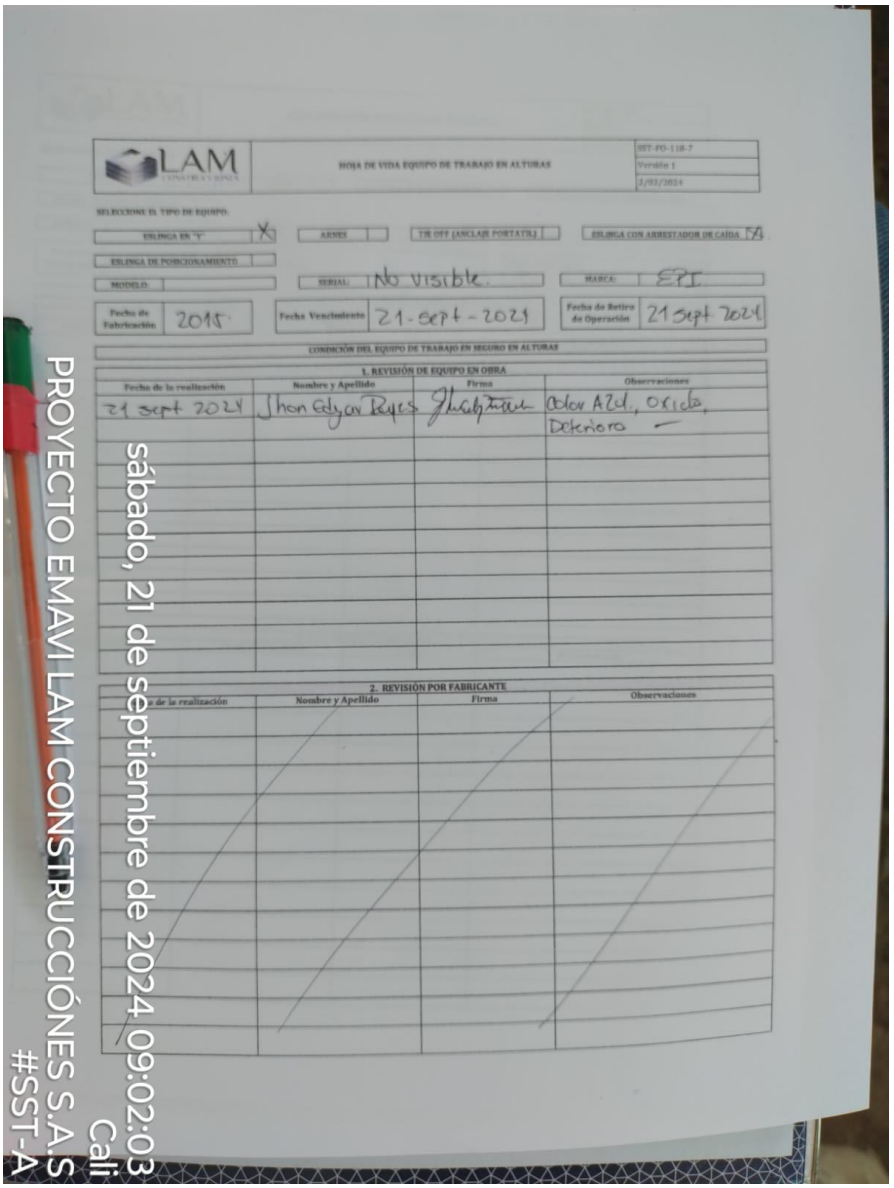

Eslinga N°3 de baja

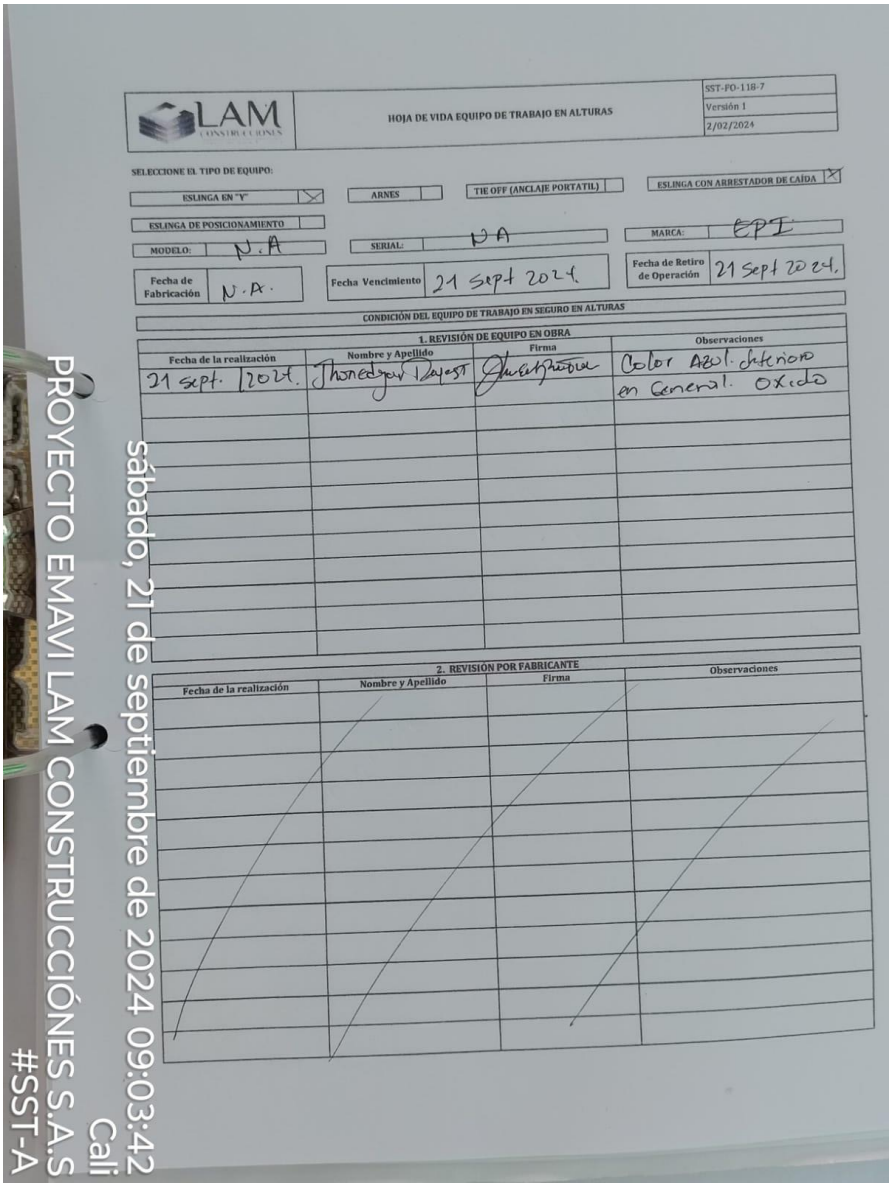

Anexo 2

Seguimiento al cumplimiento de los trabajadores al uso de los equipos de alturas








miércoles, 25 de septiembre de 2024 08:53:39
Cali
PROYECTO EMAVI LAM CONSTRUCCIÓNES S.A.S
#SST-A


viernes, 27 de septiembre de 2024 13:36:13
Cali
PROYECTO EMAVI LAM CONSTRUCCIÓNES S.A.S
#SST-A
