INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

Informe correspondiente al periodo entre el 6 de marzo y el 21 de abril de 2025


Fecha de elaboración: 21 de abril de 2025

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio No.	Convenio solidario No. 003-2025
Fecha del contrato	3 de febrero de 2025
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DEL SOCORRO DE SABANAS, EL PESCADO Y VEREDA PEDREGAL.
Contratista	Junta de Acción Comunal Vereda La Tolda
NIT	811.025.815-6
Representante Legal	Juan de la Rosa Pino Silva
Contratante	Municipio de Santa Fe de Antioquia
NIT	890.907.569-1
Plazo inicial	2 meses y 15 días
Costo inicial	$281.107.748
Fecha de inicio	5 de febrero de 2025
Fecha de terminación	20 de abril de 2025

LOCALIZACIÓN

Las actividades de mantenimiento vial se desarrollan en las vías terciarias que comunican los corregimientos del Socorro de Sabanas hacia la Vereda Pedregal, en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia.

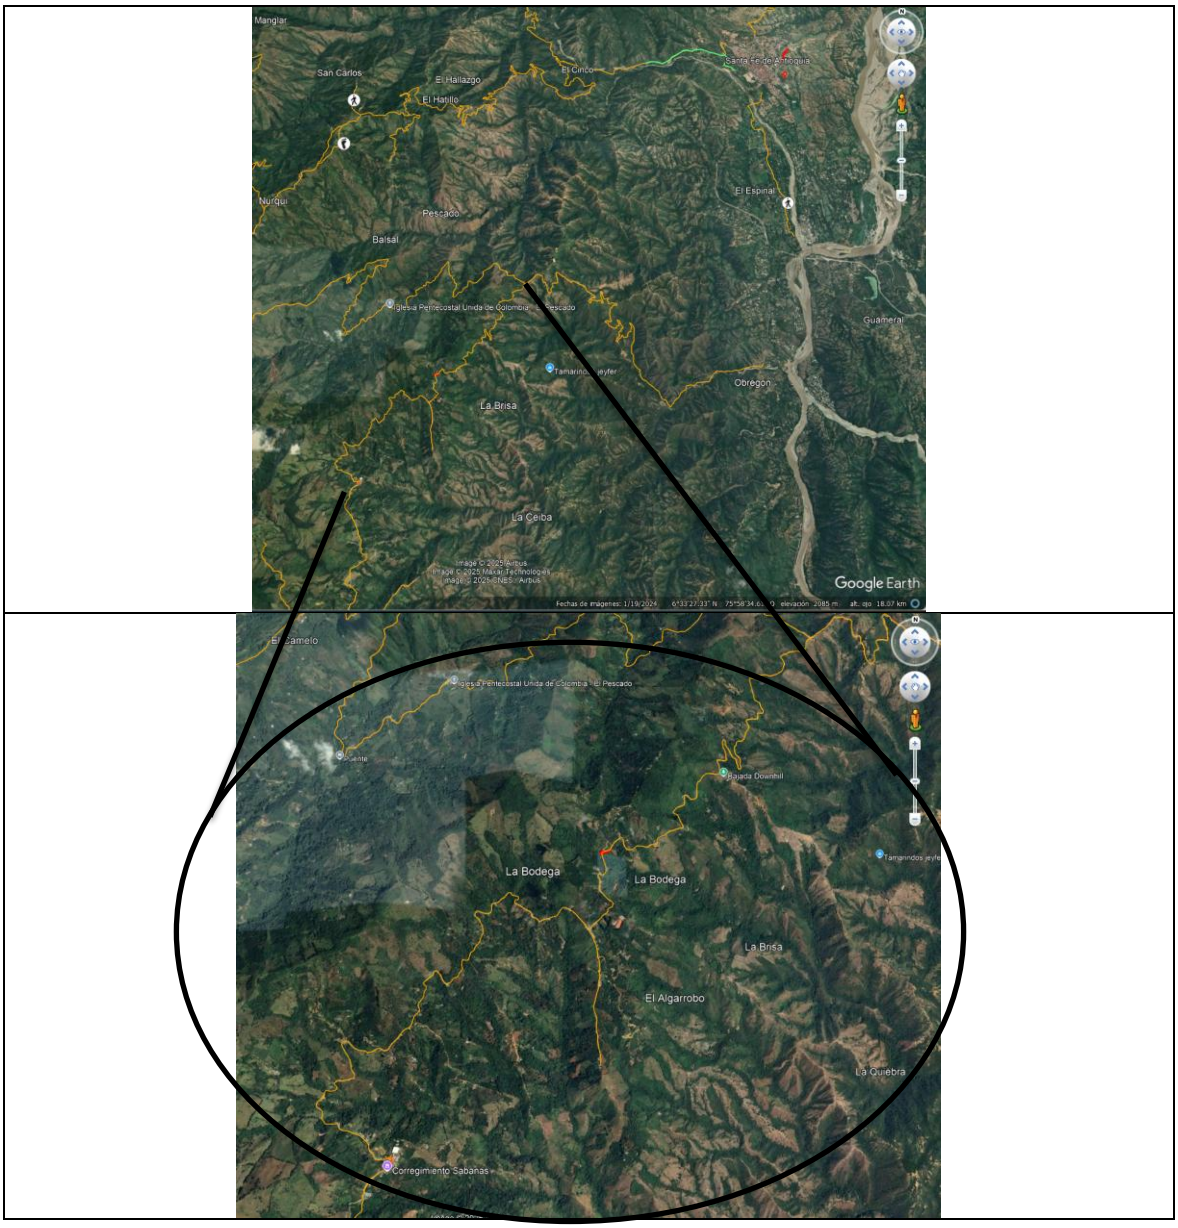

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Ítem	Descripción	Un	Cantidad ejecutada
1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m²	34250,05
2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención	m³	900

Total acumulado:

Ítem	Descripción	Un	Cantidad ejecutada
1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m²	62992
2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención	m³	900

Durante el periodo, se ejecutaron actividades de renivelación de la banca, que incluyeron la escarificación del material existente y la conformación de la vía para mejorar su transitabilidad. También se realizó el mejoramiento con material de afirmado no procesado, con su respectivo transporte del material nivelación y compactación.

Esta intervención corresponde al 70% del total contratado para los ítems.

ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

COSTO DIRECTO: $239.324.666

ADMINISTRACIÓN (17.46%): $41.783.081

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $281.107.748

APORTE EN ESPECIE JAC: $1.107.748

APORTE MUNICIPIO: $280.000.000

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA: $84.849.467

% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1: 30%

APORTE MUNICIPIO ACTA #1: $84.000.000

APORTE OAC ACTA #1: $332.334

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA: $84.849.467

% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2: 70%

APORTE MUNICIPIO ACTA #2: $196.000.000

APORTE OAC ACTA #2: $775.424

VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA: 281.107.748

% TOTAL ACUMULADO: 100%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $0

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante el desarrollo del primer mes de ejecución del convenio, se avanzó en la renivelación de la banca en puntos críticos previamente identificados. Las labores incluyeron:


- Escarificación del material existente con maquinaria.

- Conformación de la vía con pendiente transversal adecuada para drenaje.

- Compactación inicial de la superficie intervenida.

- Aplicación de afirmado no procesado, en diferentes puntos críticos de la vía, con su respectiva nivelación y compactación del material.

Estas actividades se ejecutaron con el apoyo de mano de obra de la comunidad y maquinaria contratada.




JUAN DE LA ROSA PINO SILVA
Representante legal
Junta de Acción Comunal Vereda La Tolda



CARLOS ARTURO HERRERA MOSQUERA
Arquitecto



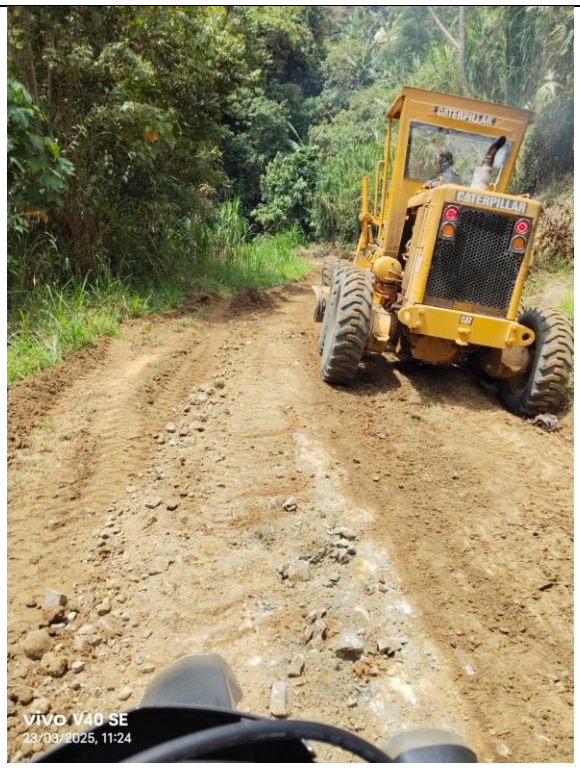


CATERPILLAR
CATERPILLAR
vivo V40 SE
23/03/2025, 11:24



CASE
vivo V40 SE
25/03/2025, 8:55


CASE
vivo V40 SE
25/03/2025, 8:40



YAB 5884
vivo V40 SE
26/03/2025, 15:29


CASE
vivo V40 SE
25/03/2025, 8:40


vivo V40 SE
1/04/2025, 7:56

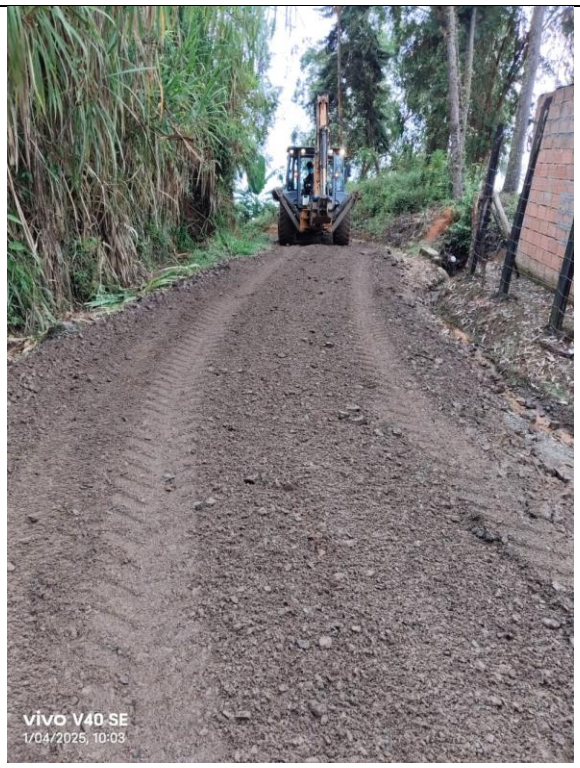
vivo V40 SE
1/04/2025, 10:03


vivo V40 SE
1/04/2025, 10:03

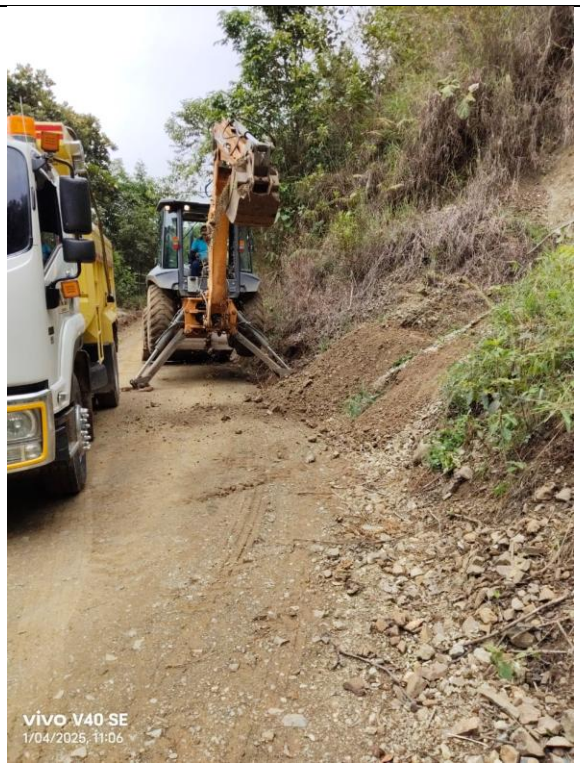

vivo V40 SE
1/04/2025, 11:06








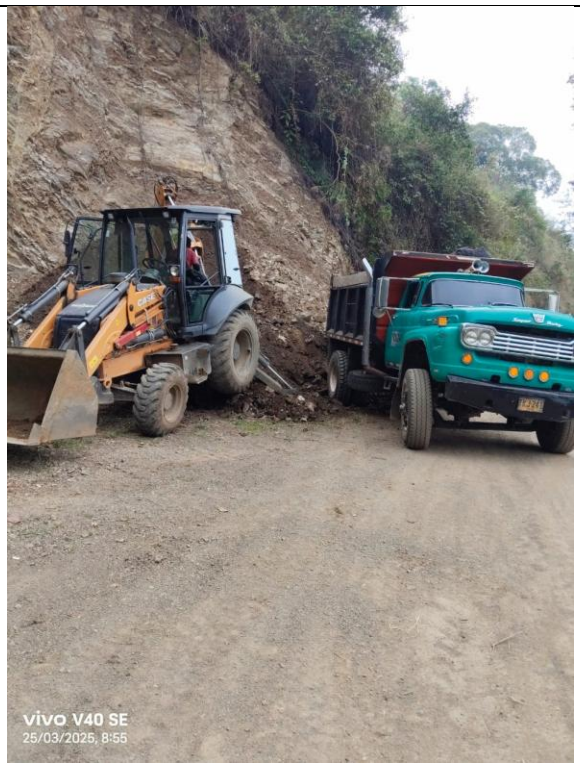


vivo V40 SE
25/03/2025, 8:55


vivo V40 SE
18/03/2025, 8:05

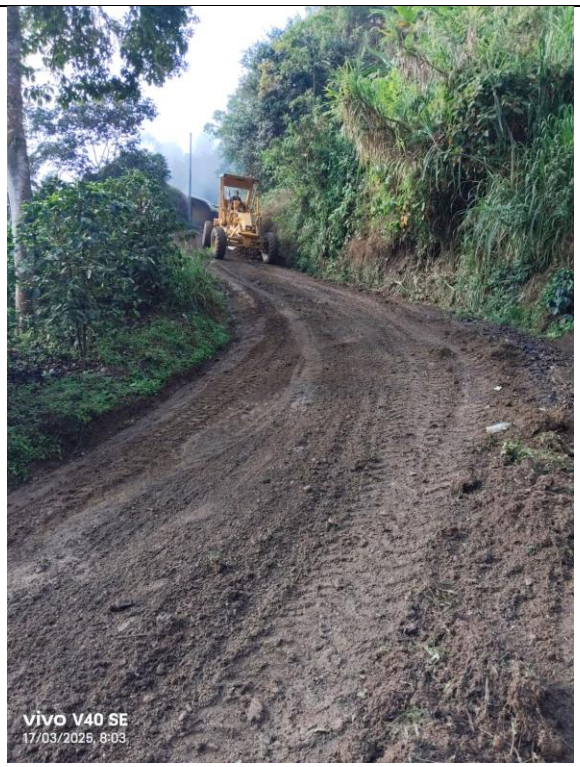
vivo V40 SE
17/03/2025, 8:03


vivo V40 SE
17/03/2025, 8:03
