GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE SUSPENSION No 1
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473-2024

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
OBJETO:	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
PLAZO PACTADO:	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 507.281.339,60
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-00187 2025-00408
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

En Arauca, a los veintidós (22) días de abril de 2025, se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el Ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO,** Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, según Resolución No 001 de 2025, el Señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** Representante Legal del **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN,** en calidad de Interventor Externo, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de interventoría de la referencia en atención a las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Las obras objeto del contrato de obra 481 de 2024 consisten en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SEGUNDA: El Contrato tuvo inicio el día 31 de diciembre del año 2024, con la suscripción del Acta de Inicio del mismo día, donde se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, **JHONN FREDY GARCIA BELTRAN,** para esa fecha fungiendo como Representante Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA** como Contratista de Obra. La ejecución física del Contrato inició con las actividades de prealistamiento consistentes en las adecuaciones, campamento, valla informativa, movimiento de equipos, EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 02 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL, MANEJO DE AGUAS, FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8) entre otras, actividades acordadas según el Cronograma de Trabajo o Programación de Obra para la ejecución física. Estas actividades se adelantan mientras se surten los procesos iniciados por la administración departamental sobre el permiso de concesión de aguas y ocupación de cauce para las actividades que requieran de la utilización del recurso natural.

TERCERA: Que el día 25 de noviembre de 2024, la unidad ejecutora solicito permisos ambientales de OCUPACIÓN DE CAUCE Y CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES ante la autoridad ambiental Corporinoquia para el proyecto objeto del contrato de obra 481 de 2024, Que a la fecha la corporación autónoma regional no se ha pronunciado con respecto a la solicitud elevada por parte de la administración departamental, situación por el cual se hace necesario suspender el contrato teniendo en cuanta la culminación de las actividades que no requerían la utilización de los recursos naturales y quedando por ejecutar actividades que si requieren como actividades que contienen la ejecución de concretos, morteros y rellenos entre otros ; dichas actividades no se pueden ejecutar hasta tanto o se obtenga la autorización por parte de la corporación.

CUARTA: Que mediante comité técnico de obra realizado el día 22 de abril presente año, se analizo entre las partes intervinientes del contrato de obra 481 de 2024, unidad ejecutora, firma contratista e interventoría externa, el avance del proceso administrativo ante la corporación de la solicitud de los permisos ambientales, y se pudo determinar que se presenta una demora en dicho proceso.

Por lo anterior se concluye entre los participantes del comité, realizar acta de suspensión del contrato de referencia en un periodo de treinta (30) días calendario a partir de la firma del presente comité.

QUINTA: Una vez verificado los motivos expuestos en el comité técnico de obra No. 05, la interventoría externa del contrato de obra 481 de 2024, considera viable y procedente efectuar la suspensión respectiva.

SESTA: En virtud de lo expuesto, las partes consideran prudente suspender el contrato de interventoría No. 473 de 2024, por el término de (30) días o antes si se superan las motivaciones expuestas.

SÉPTIMA: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes, las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las actividades se reiniciarán oportunamente en el término establecido o antes si son superados los inconvenientes que motivaron la suspensión, para lo cual, se suscribirá de manera inmediata la respectiva acta de reinicio en donde se hará constar la nueva fecha de terminación y se procederá a la actualización de las garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días de abril de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No 1 por quienes en ella intervinieron.

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Contratista De Interventoria

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor Contrato de Interventoría No. 473/2024
Resolución No. 001 del 03/01/2025

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Dptal

MESA TÉCNICA 005

Fecha: 22 de abril del 2025
Hora: 10:00 am
Lugar: Sala de juntas de la Secretaría de Gobierno Departamental

1. *Verificación del Quorum.*
2. *Inicio por parte del Supervisor – Cristian Alexander Murillo Osorio*
3. *Control y seguimiento de la ejecución de CTO 481-2024 y 473-2024:* ***"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"***.
4. Proposiciones, varios
5. Conclusiones y cierre.

participantes:

1. Supervisor del contrato según Resolución N° 001-2025. **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO**
2. Equipo de Profesionales de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
3. CONTRATISTA DE OBRA **CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA**
4. INTERVENTORÍA **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN**
5. PROFESIONALES DE APOYO de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
6. Delegados de la secretaria de planeación departamental

Muy buenos días para todos yo CRISTIAN ALEXANDER MURILLO con función de Supervisor del Contrato de Interventoría473-2024, según Resolución No. 001-2025 y en representación del Secretario de Gobierno doy inicio a la mesa técnica número 005 con respecto al Control y Seguimiento de la ejecución de CTO 481-2024 y 473-2024.

Planeación: reiteramos la función de nuestra área con respecto al proyecto, que es de control, ya en el oficio remitido manifestamos nuestra visión ante el proceso.

Interventoría: buenos días para todos, nosotros como interventoría tenemos puntos específicos a tratar en este comité, los cuales son la aclaración del oficio emitido por planeación, la proposición nuevamente de suspender los contratos en ejecución que nos atañe, aclarando que los permisos se encuentran en trámite, por lo cual aun no se lograra avanzar en las actividades descritas en el documento técnico.

Contratista: sí, se requieren los permisos ambientales, para avanzar con las actividades que lo ameritan, nosotros estamos de acuerdo en suspender, ya que comprendemos en el entendido que debemos ejecutar obras que requieren la utilización de los recursos naturales.

Secretaría de gobierno: Según el ajuste informado que se presentó ante la oficina de planeación departamental y la revisión del proyecto, si cuenta con presupuesto y fase de planeación para los permisos ambientales; se ha realizado la solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia – CORPORINOQUIA y el proceso se encuentra en espera de la liquidación.

Ahora bien, comprendemos la necesidad de suspender para dar espera a que se cuente con los permisos ambientales.

Planeación: normativamente y con relación a la parte técnica es una acción que, en caso de un disciplinario, por más que lo sustente debe ser muy claro, recomendamos seguir los lineamientos y reprogramar en Gesproy.

Interventoría: nuevamente tomamos la palabra para que sea suspendido este contrato de obra ya que, hay actividades que requieren estos permisos ambientales y licencias y no vamos a incurrir en sanciones por ello.


Supervisión: desde la supervisión se solicitan las correcciones de los informes hasta la fecha con respecto a los avances de ejecución, así mismo, veo viable y prudente la recomendación de la interventoría, quienes sugieren la suspensión de los contratos de obra e interventoría, dejando como justificación que, a la fecha, sin los permisos ambientales no se validará la continuación en la ejecución de las actividades del Contrato de Obra No. 481 de 2024.

Para concluir concordamos en trabajar de manera conjunta para agilizar los trámites pertinentes. Y cómo compromisos tenemos:

1. Suscripción el día de hoy, del Acta de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra No. 481 de 2024 y al Contrato de Interventoría No. 473 de 2024.
2. Subsanar las observaciones realizadas a los informes de interventoría y seguimiento de obra.

Siendo las 11:50 am damos por finalizada esta reunión, muchas gracias por haber asistido.

SE ADJUNTA FORMATO DE ASISTENCIA PARA CONFORMIDAD DE LOS ASISTENTES

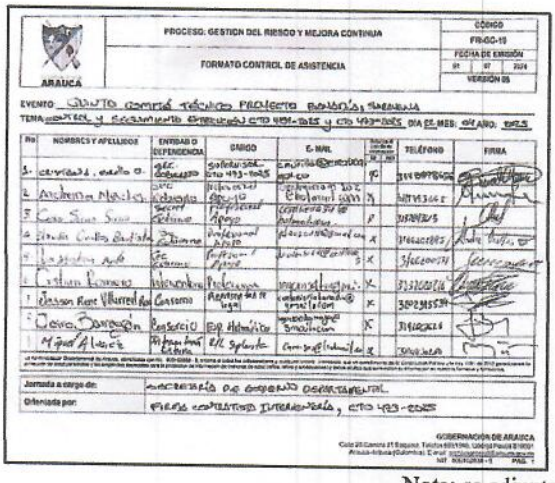

PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA — CODIGO FR-GC-10 — FECHA DE EMISIÓN 01 07 2024 — VERSION 05

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA

ARAUCA

EVENTO: Quinto comité técnico PROYECTO BANANA


TEMA: control y seguimiento ejecución cto 481-2024 y cto 473-2024 DIA 22 MES: 01 AÑO: 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Jesson René Villarreal	Gobierno	Asesor de la [illegible]	[illegible]	3092855[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Jornada a cargo de: SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Orientada por: PUNTO COMITE DE INTERVENTORÍA, CTO 473-2024

GOBERNACION DE ARAUCA

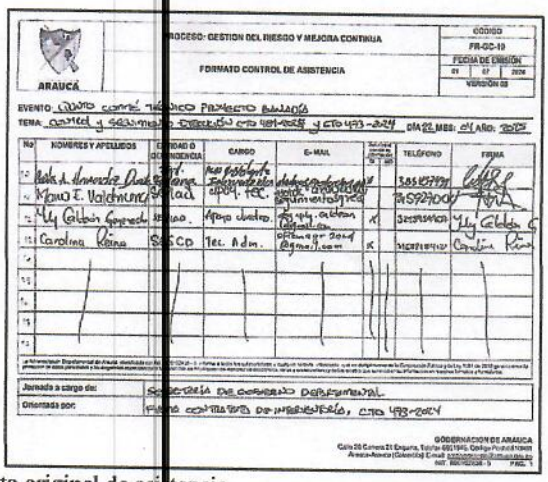

PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA — CODIGO FR-GC-10 — FECHA DE EMISIÓN 01 07 2024 — VERSION 05

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA

ARAUCA

EVENTO: QUINTO COMITÉ TÉCNICO PROYECTO BANANA

TEMA: control y seguimiento ejecución cto 481-2024 y cto 473-2024 DIA 22 MES: 01 AÑO: 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Mario E. Valdivieso	[illegible]	apoyo [illegible]	[illegible]	3152920007	[illegible]
3	Yuly Gelvan Gonzalez	[illegible]	Apoyo técnico	[illegible]	3133[illegible]	[illegible]
4	Carolina Reina	SGG CD	Tec. Adm.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5						
6						
7						
8						
9						

Jornada a cargo de: SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Orientada por: PUNTO COMITE DE INTERVENTORÍA, CTO 473-2024

GOBERNACION DE ARAUCA

Nota: se adjunta formato original de asistencia.

Proyectó: Yesika Carolina Reina Hurtado
Técnico Administrativo - CTO 095 de 2025

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Arauca 21 de abril de 2025

Señores:
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
ATTE. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud comité técnico de obra presencial

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos convocar a comité técnico de obra en donde se socialice el avance y estado de la solicitud de licencias y permisos ambientales ante la corporación CORPORINOQUIA del contrato de obra nombrado anteriormente, por parte de la secretaria ejecutora. Esto con el fin de analizar y llevar a cabo los posibles actos administrativos que dieran lugar ante el mismo.

Extendemos la invitación para la realización del comité técnico de manera presencial para el día **martes 22 de abril a las 10:00 am en instalaciones de la sala de junta de la secretaria de gobierno y seguridad ciudadana departamental**.

Agradeciendo su puntual asistencia. Cordialmente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa

Arauca, 21 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca - Arauca

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Confirmación de Asistencia a Invitación del Quinto Comité Técnico programado para el 22/04/2025.

Cordial Saludo;

Por medio del presente, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, nombrado mediante Resolución No. 001 del 03 de enero de 2025, deseo confirmar asistencia de la Administración Departamental al desarrollo del Tercer Comité Técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACION SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual se desarrollará el día martes 22 de abril de 2025, a las 10:00 am en las instalaciones de la sala de junta de la Secretaría de Gobierno Departamental.

Cordialmente,

ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	31/12/2024 19/01/2025	20/01/2025 26/01/2025	27/01/2025 02/02/2025	03/02/2025 09/02/2025	10/02/2025 16/02/2025	17/02/2025 23/02/2025	24/02/2025 02/03/2025	03/03/2025 09/03/2025	10/03/2025 16/03/2025	17/03/2025 23/03/2025
PRELIMINARES (consolidación de la información contractual técnica, localización y replanteo topográfico, socialización, verificación de las propiedades de los suelos presentes en obra y tramite ambiental		GLB	31/12/2024	19/01/2025										
CAP 1.	OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIDA													
1.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.02	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.03	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	5/03/2025	15/06/2025										
1.04	GEOTEXTIL NT 2400	M2	5/03/2025	31/05/2025										
1.05	GEOTEXTIL NT 3000	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.06	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.07	MANEJO DE AGUAS	MES	3/01/2025	30/06/2025										
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	15/03/2025	18/06/2025										
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	20/03/2025	20/06/2025										
1.10	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8 M)	M	24/02/2025	15/06/2025										
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	5/03/2025	15/06/2025										
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA		GLB	31/12/2024	30/06/2025										

ING JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
Residente de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	02/06/2025 08/06/2025	09/06/2025 15/06/2025	16/06/2025 22/06/2025	23/06/2025 30/06/2025
CAP 1.	**OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIDA**							
1.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	20/01/2025	4/05/2025				
1.02	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	20/01/2025	4/05/2025				
1.03	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	5/03/2025	15/06/2025				
1.04	GEOTEXTIL NT 2400	M2	5/03/2025	31/05/2025				
1.05	GEOTEXTIL NT 3000	M2	5/03/2025	15/06/2025				
1.06	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	5/03/2025	15/06/2025				
1.07	MANEJO DE AGUAS	MES	3/01/2025	30/06/2025				
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	15/03/2025	18/06/2025				
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	20/03/2025	20/06/2025				
1.10	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8 M)	M	24/02/2025	15/06/2025				
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	5/03/2025	15/06/2025				
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA		GLB	31/12/2024	30/06/2025				

ING JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
Residente de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	24/03/2025 30/03/2025	31/03/2025 06/04/2025	07/04/2025 13/04/2025	14/04/2025 20/04/2025	21/04/2025 27/04/2025	28/04/2025 04/05/2025	05/05/2025 11/05/2025	12/05/2025 18/05/2025	19/05/2025 25/05/2025	26/05/2025 01/06/2025
CAP 1.	OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIDA													
1.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.02	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.03	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	5/03/2025	15/06/2025										
1.04	GEOTEXTIL NT 2400	M2	5/03/2025	31/05/2025										
1.05	GEOTEXTIL NT 3000	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.06	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.07	MANEJO DE AGUAS	MES	3/01/2025	30/06/2025										
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	15/03/2025	18/06/2025										
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	20/03/2025	20/06/2025										
1.10	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8 M)	M	24/02/2025	15/06/2025										
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	5/03/2025	15/06/2025										
	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	GLB	31/12/2024	30/06/2025										

ING JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
Residente de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA
